

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA									
Actividad	Conc	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2019 Mar	2019 Mar	2019 Mar	2019 May
0		RESTAURACION DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	13/Mar/2019	121c	11/Jul/2019				
10		San Juan Bautista Etapa 3	13/Mar/2019	121c	11/Jul/2019				
20	01	Preliminares	13/Mar/2019	44c	25/Abr/2019				
30	1.01	TOMA DE MUESTRAS Y CARACTERIZACIÓN DE PIEDRA DE MUROS PARA ANÁLISIS ESTRUCTURAL. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13/Mar/2019	10c	22/Mar/2019				
40	1.02	MONITOREO DE GRIETAS Y DESPLAZAMIENTOS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TESTIGOS Y PUNTOS GEO-REFERENCIADOS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, VISITAS DE TOPOGRAFO Y REGISTRO, ASI COMO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	14/Mar/2019	7c	20/Mar/2019				
50	1.03	PROTECCIÓN Y REGISTRO DE CUADROS E IMÁGENES, SE ENVOLVERAN ESCULTURAS Y CUADROS CON PELLÓN DELGADO, PELÍCULA DE AIRE SELLADO (POLIBURBUJA) Y CINTA CANELA, PARA LA PROTECCIÓN DE IMPACTOS Y POLVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13/Mar/2019	3c	15/Mar/2019				
60	1.04	RETIRO DE BANCAS Y MOBILIARIO CON HULE NEGRO Y CINTA CANELA Y TRASLADO A UN AREA SEGURA DURANTE EL PROCESO DE INTERVENCIÓN. INCLUYE: MANO DE	13/Mar/2019	3c	15/Mar/2019				


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL


FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA									
Actividad	Conc	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2019 Mar	2019 Mar	2019 Mar	2019 Mar
70	1.05	OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROTECCIÓN DE PISO EXISTENTE Y VENTANAS, POR UNA PELÍCULA DE HULE ESPUMA DE 5MM DE ESPESOR, Y TRIPLEY DE 5/8" EN ÁREAS DONDE SE ESTE TRABAJANDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	14/Mar/2019	2c	15/Mar/2019				
80	1.06	PROTECCIÓN DE CARPINTERÍA Y ORNAMENTOS A BASE DE HULE NEGRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13/Mar/2019	2c	14/Mar/2019				
90	1.07	DEMOLICION PISO DE 15CM DE ESPESOR, CONFORMADO POR CERAMICA, LOSETA Y CONCRETO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	15/Mar/2019	13c	27/Mar/2019				
100	1.08	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA CON MAQUINA O A MANO, RETIRO HASTA TIRADERO MÁS CERCANO Y KILOMETROS SUBSIGUIENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	26/Mar/2019	11c	05/Abr/2019				
110	1.09	RELLENO CON MATERIAL CALICHE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	06/Abr/2019	12c	17/Abr/2019				

ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA												
Actividad	Conc	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2019 Mar	2019 Mar	2019 Mar	2019 Abr	2019 Abr	2019 May	2019 May
120	1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO A VUELTA DE PLANA PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: CIMBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZOS, CALZADO DE LA MALLA, VIBRADO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	18/Abr/2019	8c	25/Abr/2019							
130	1.11	EXCAVACIÓN DE 27CM PARA RETIRAR MATERIAL DE MADERA Y TIERRA, POR MEDIOS MANUALES, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A PIE DE CAMION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22/Mar/2019	10c	31/Mar/2019							
140	03	Muros	01/May/2019	60c	29/Jun/2019							
150	2.01	RAJUELEO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, SE CONSIDERA 20% DEL TOTAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, MORTERO A BASE DE CAL, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	01/May/2019	12c	12/May/2019							
160	2.02	INYECCIÓN DE PEQUEÑAS GRIETAS (1-5 MM). INCLUYE: MORTERO A BASE DE CAL, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	09/May/2019	7c	15/May/2019							



ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA									
Actividad	Conc	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2019 Mar	2019 Mar	2019 Abr	2019 Abr
170	2.03	INTEGRACIÓN DE ENJARRES DE CAL Y ARENA EN SALÓN SAN CRISTOBAL Y SAGRARIO. INCLUYE: LIMPIEZAS, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22/May/2019	22c	12/Jun/2019				
180	2.04	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN ÁREAS AFECTADAS DURANTE LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN. INCLUYE: SALÓN SAN CRISTOBAL Y SAGRARIO, LIMPIEZAS, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	17/Jun/2019	13c	29/Jun/2019				
190	2.05	RETIRO DE APLANADOS DE CEMENTO Y CAL EN PRETILES Y COLUMNAS DE SALÓN SAN CRISTOBAL Y SAGRARIO. INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	12/May/2019	16c	27/May/2019				
200	2.06	RECONSTRUCCIÓN DE REMATE DE LADRILLO EN PRETIL. INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	08/Jun/2019	7c	14/Jun/2019				
210	04	Pisos	15/Mar/2019	62c	15/May/2019				
220	3.01	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO PARA CANAL DE RESPIRACIÓN. INCLUYE: CORTES, LIMPIEZA, RETIRO	15/Mar/2019	18c	01/Abr/2019				

ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA											
Actividad	Conc	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2019 Mar	2019 Mar	2019 Mar	2019 Abr	2019 Abr	2019 May
230	3.02	DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	02/Abr/2019	25c	26/Abr/2019						
		RELLENO DE CANAL DE RESPIRACIÓN A BASE DE PIEDRA DE RÍO DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS. INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									
240	3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CANTERA DEL BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	07/May/2019	5c	11/May/2019						
250	3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DEMARMOL DE 2CM DE ESPESOR, COLOR CREMA DEL DESIERTO DEL BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	26/Abr/2019	20c	15/May/2019						
260	05	Cantera	17/May/2019	56c	11/Jul/2019						
270	4.01	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ELEMENTOS DE CANTERA EN INTERIOR DE TEMPLO A BASE DE BROCHAS Y CEPILLOS DE CERDA DE PLÁSTICO. INCLUYE: CALAFATEO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	17/May/2019	10c	26/May/2019						

ING JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA									
Actividad	Conc	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2019 Mar	2019 Mar	2019 Abr	2019 Abr
280	4.02	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA DETALLADA DE ELEMENTOS DE CANTERA EN EXTERIOR DEL TEMPLO. INCLUYE: AGUA DETILADA, JABÓN NEUTRO, HIDROLAVADORA, CALAFATEO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	28/Jun/2019	7c	04/Jul/2019				
290	4.03	RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA DE ARCO SUPERIOR DE FACHADA. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	15/Jun/2019	9c	23/Jun/2019				
300	4.04	RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA DE RODAPIÉ DE FACHADA. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	27/Jun/2019	5c	01/Jul/2019				
310	4.05	REINTEGRACIÓN DE ALMOHADILLADO A BASE DE PIEZAS DE CANTERA EN ESQUINAS DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	23/Jun/2019	5c	27/Jun/2019				
320	4.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CANTERA A BASE DE DIÓXIDO DE SILICIO. INCLUYE: MATERIALES,	05/Jul/2019	7c	11/Jul/2019				


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA													
Actividad	Conc	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2019			2019			2019	
						Mar	Mar	Mar	Abr	Abr	Abr	May	May
		LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											
						3.32%	5.17%	5.93%	6.51%	7.26%	8.11%	12.69%	27.56%
												46.79%	57.44%


% ACUMULADO:

% ACUMULADO:


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA

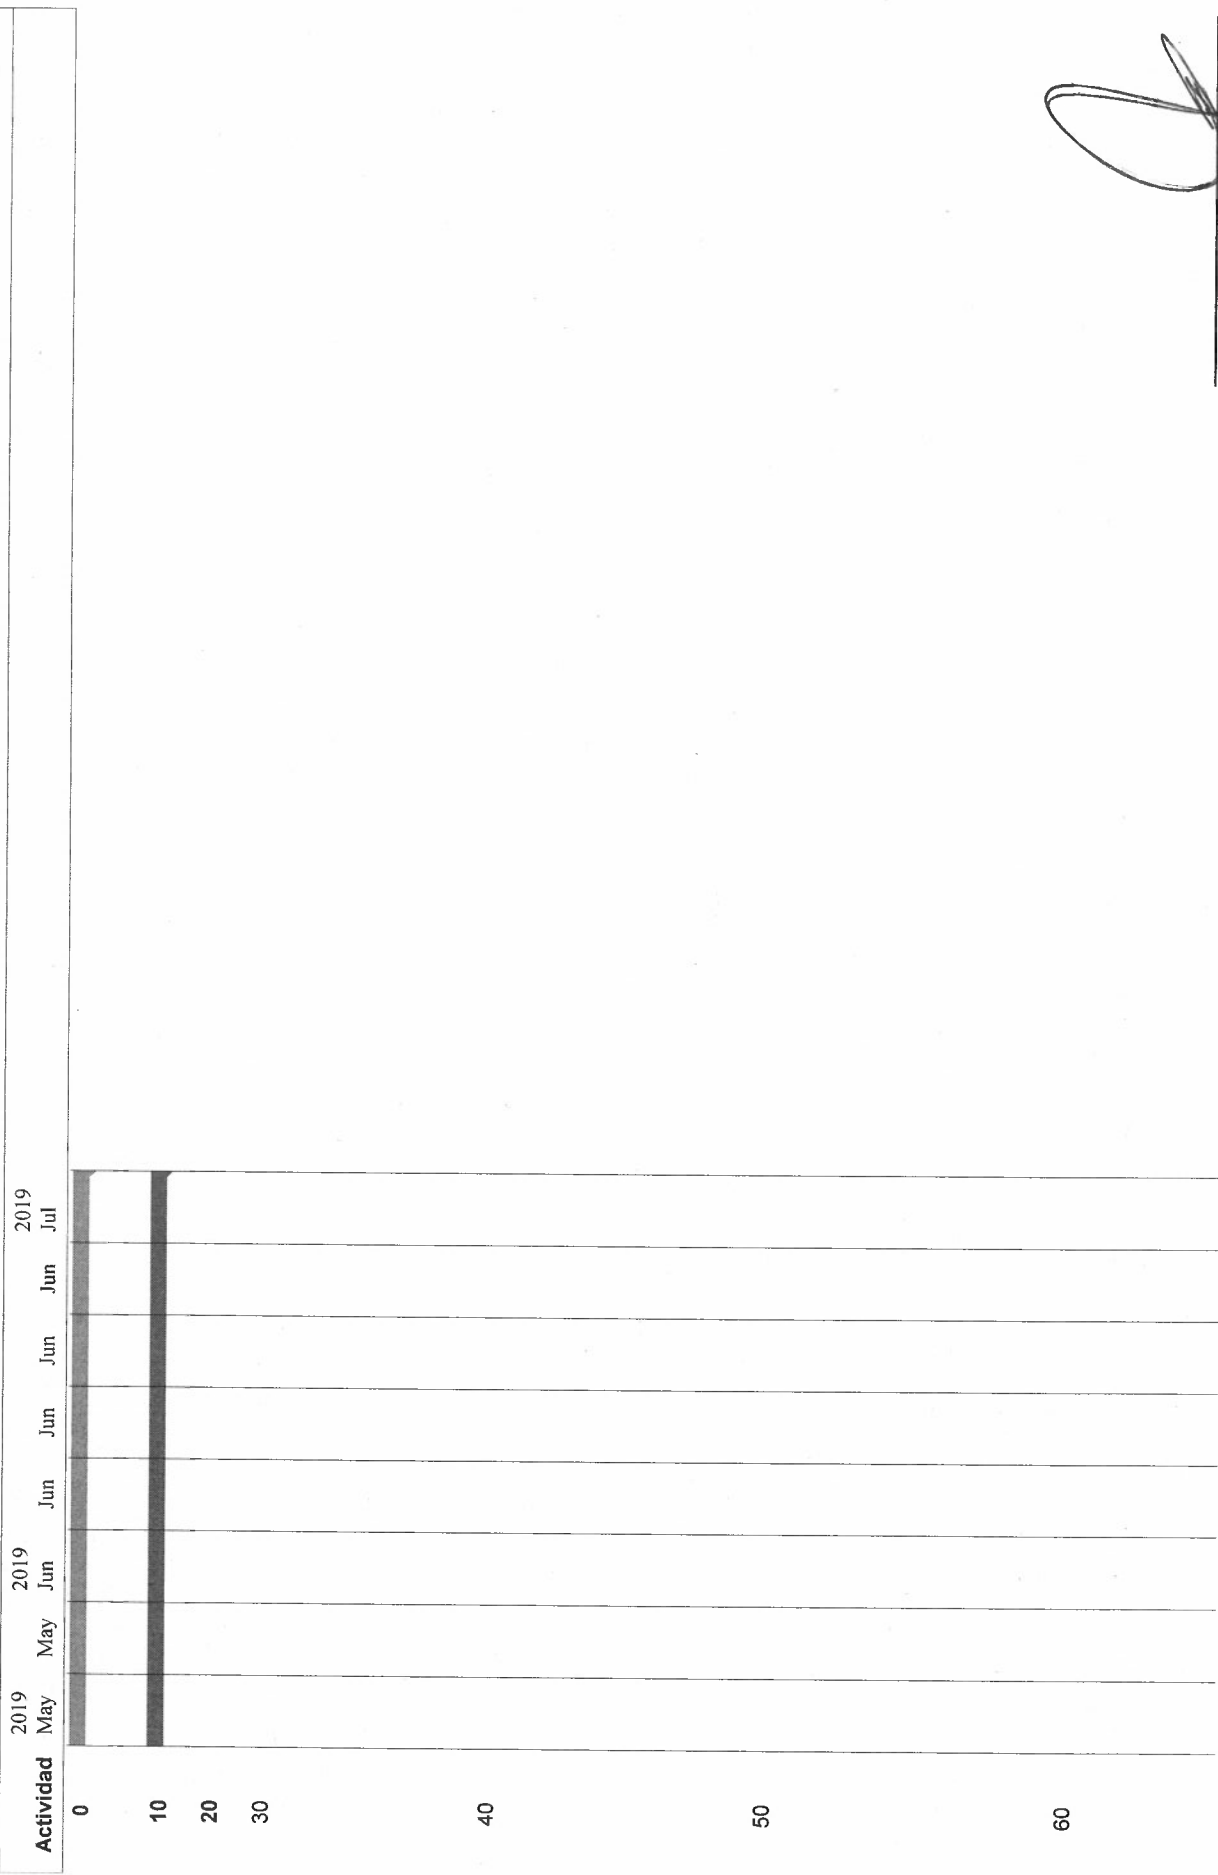


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA


Actividad	2019		2019		2019		2019		2019	
	May	May	Jun	Jun	Jun	Jun	Jun	Jun	Jul	Jul
70										
80										
90										
100										
110										


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES


PROGRAMA DE OBRA

Actividad	2019		2019		2019		2019		2019	
	May	May	Jun	Jun	Jun	Jun	Jun	Jun	Jul	Jul

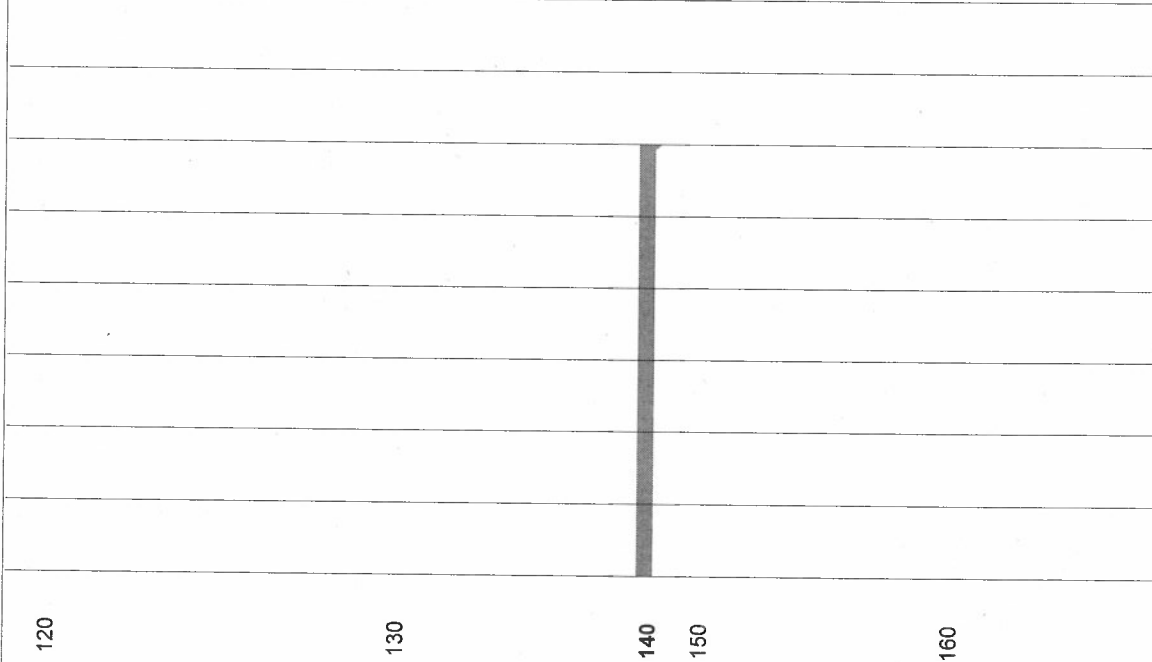


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL


FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

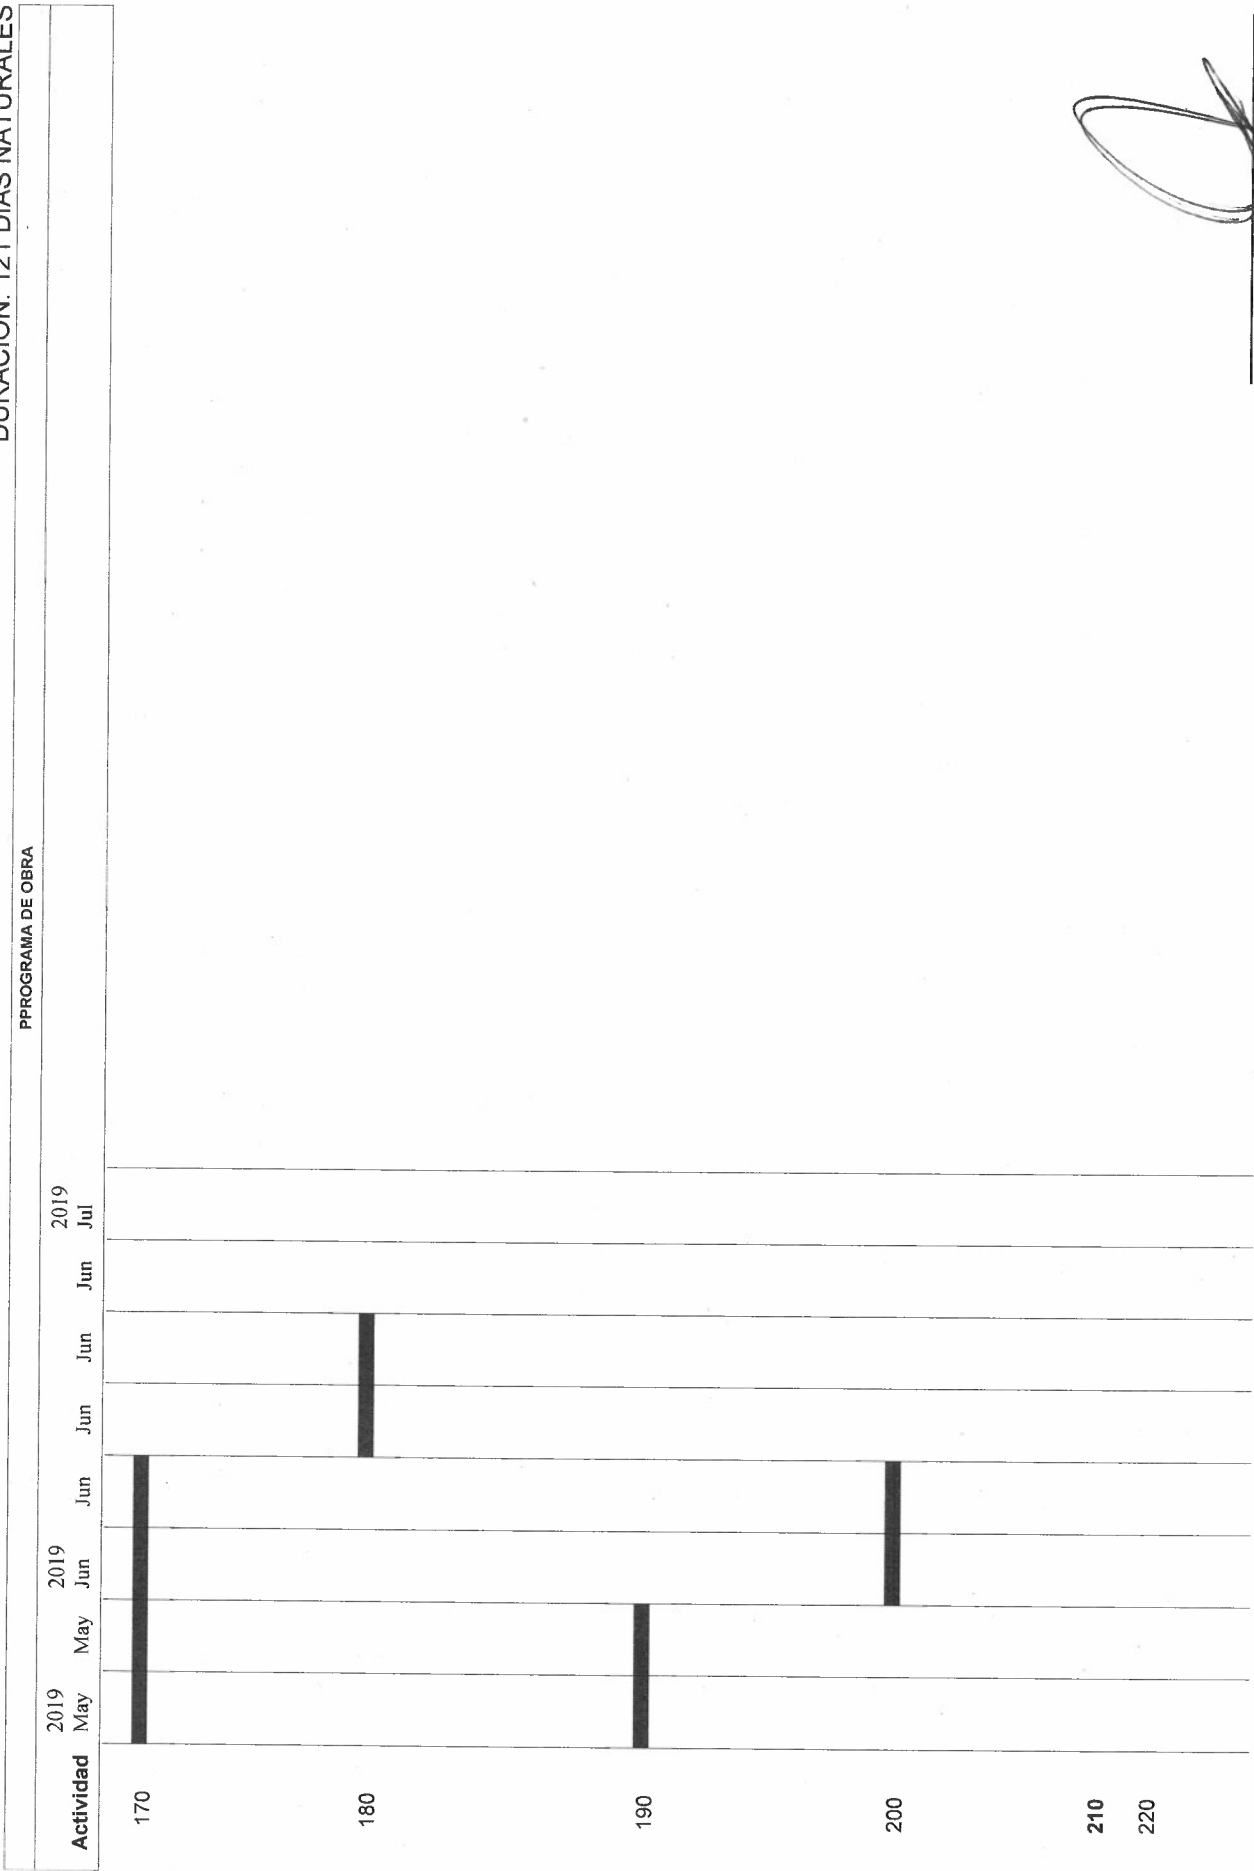


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES


PROGRAMA DE OBRA

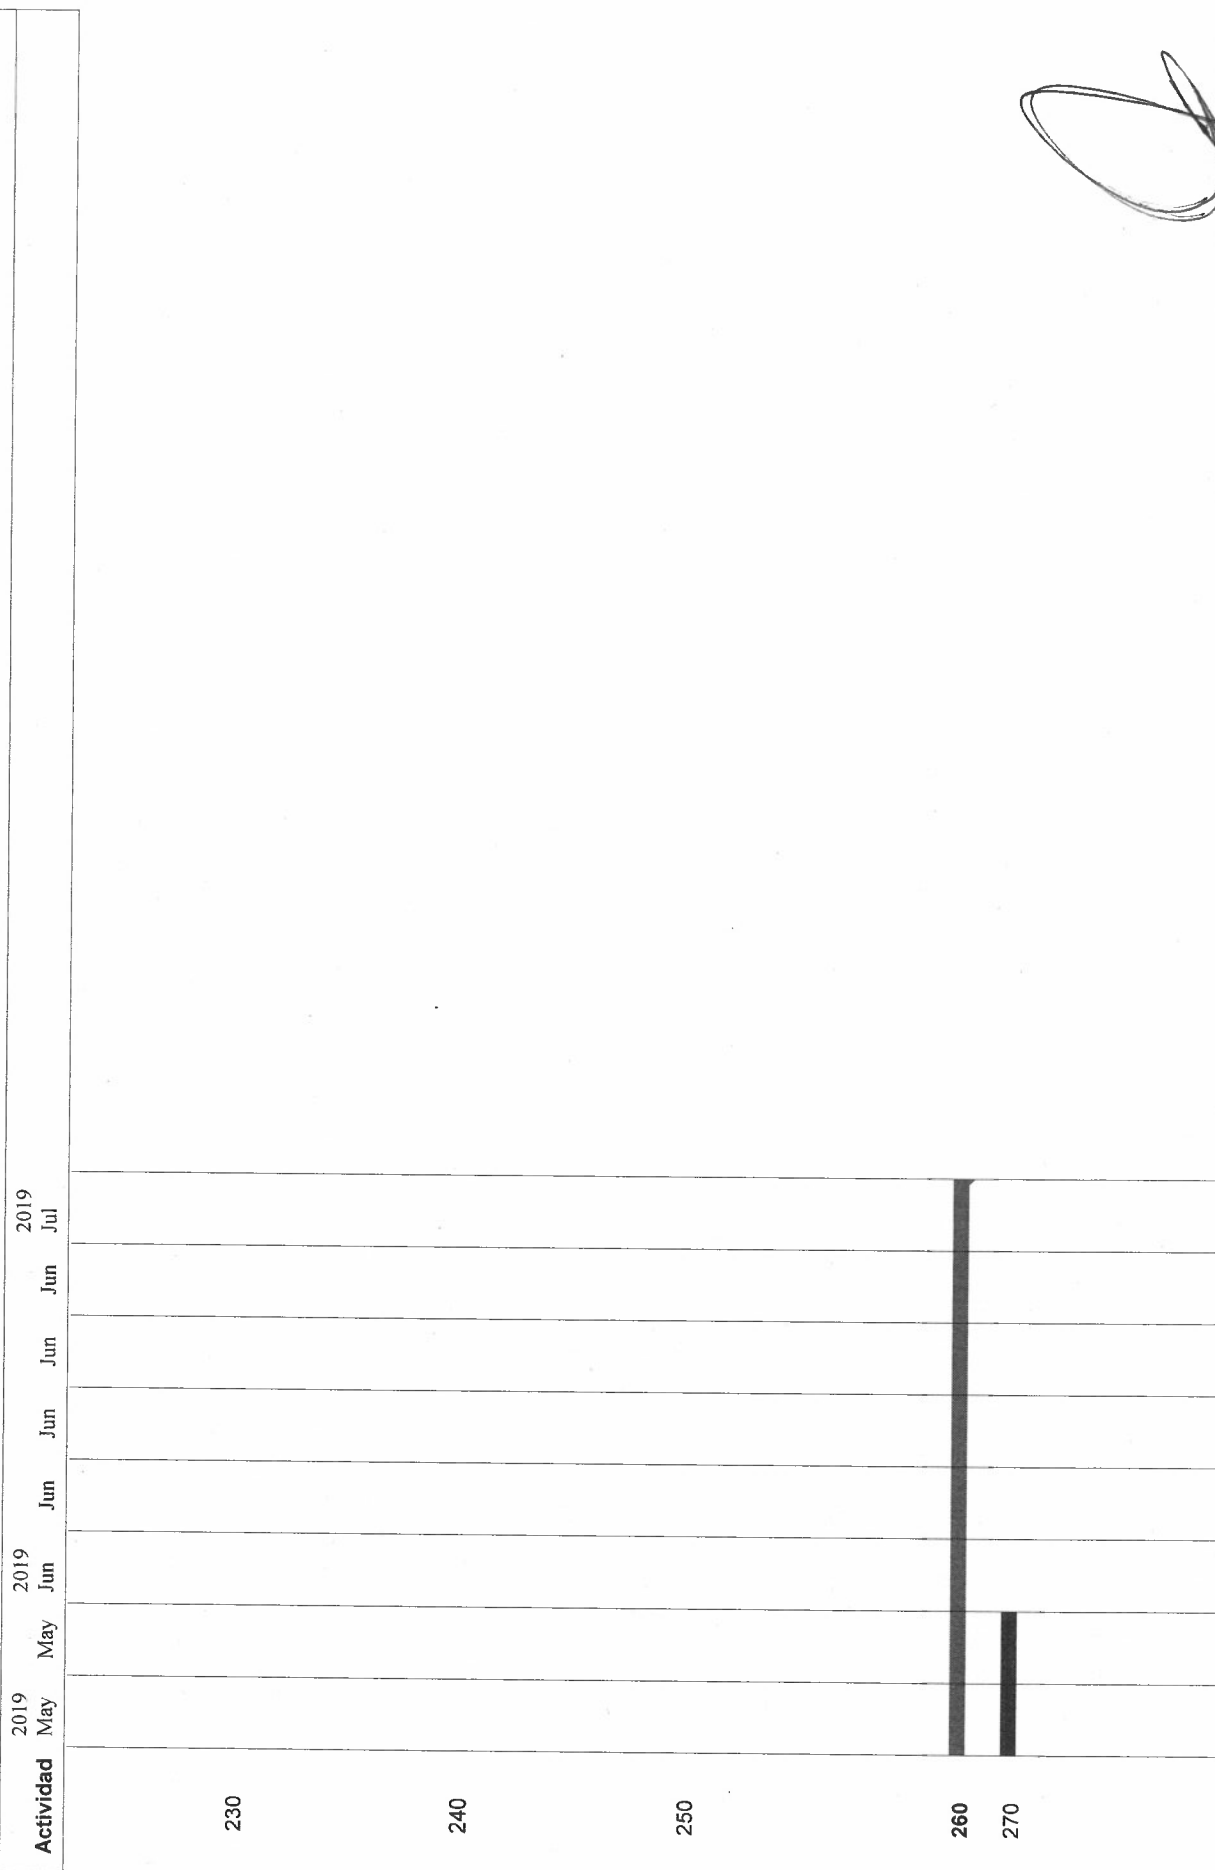


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DE 2019
 FECHA TERMINO: 11 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 121 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA

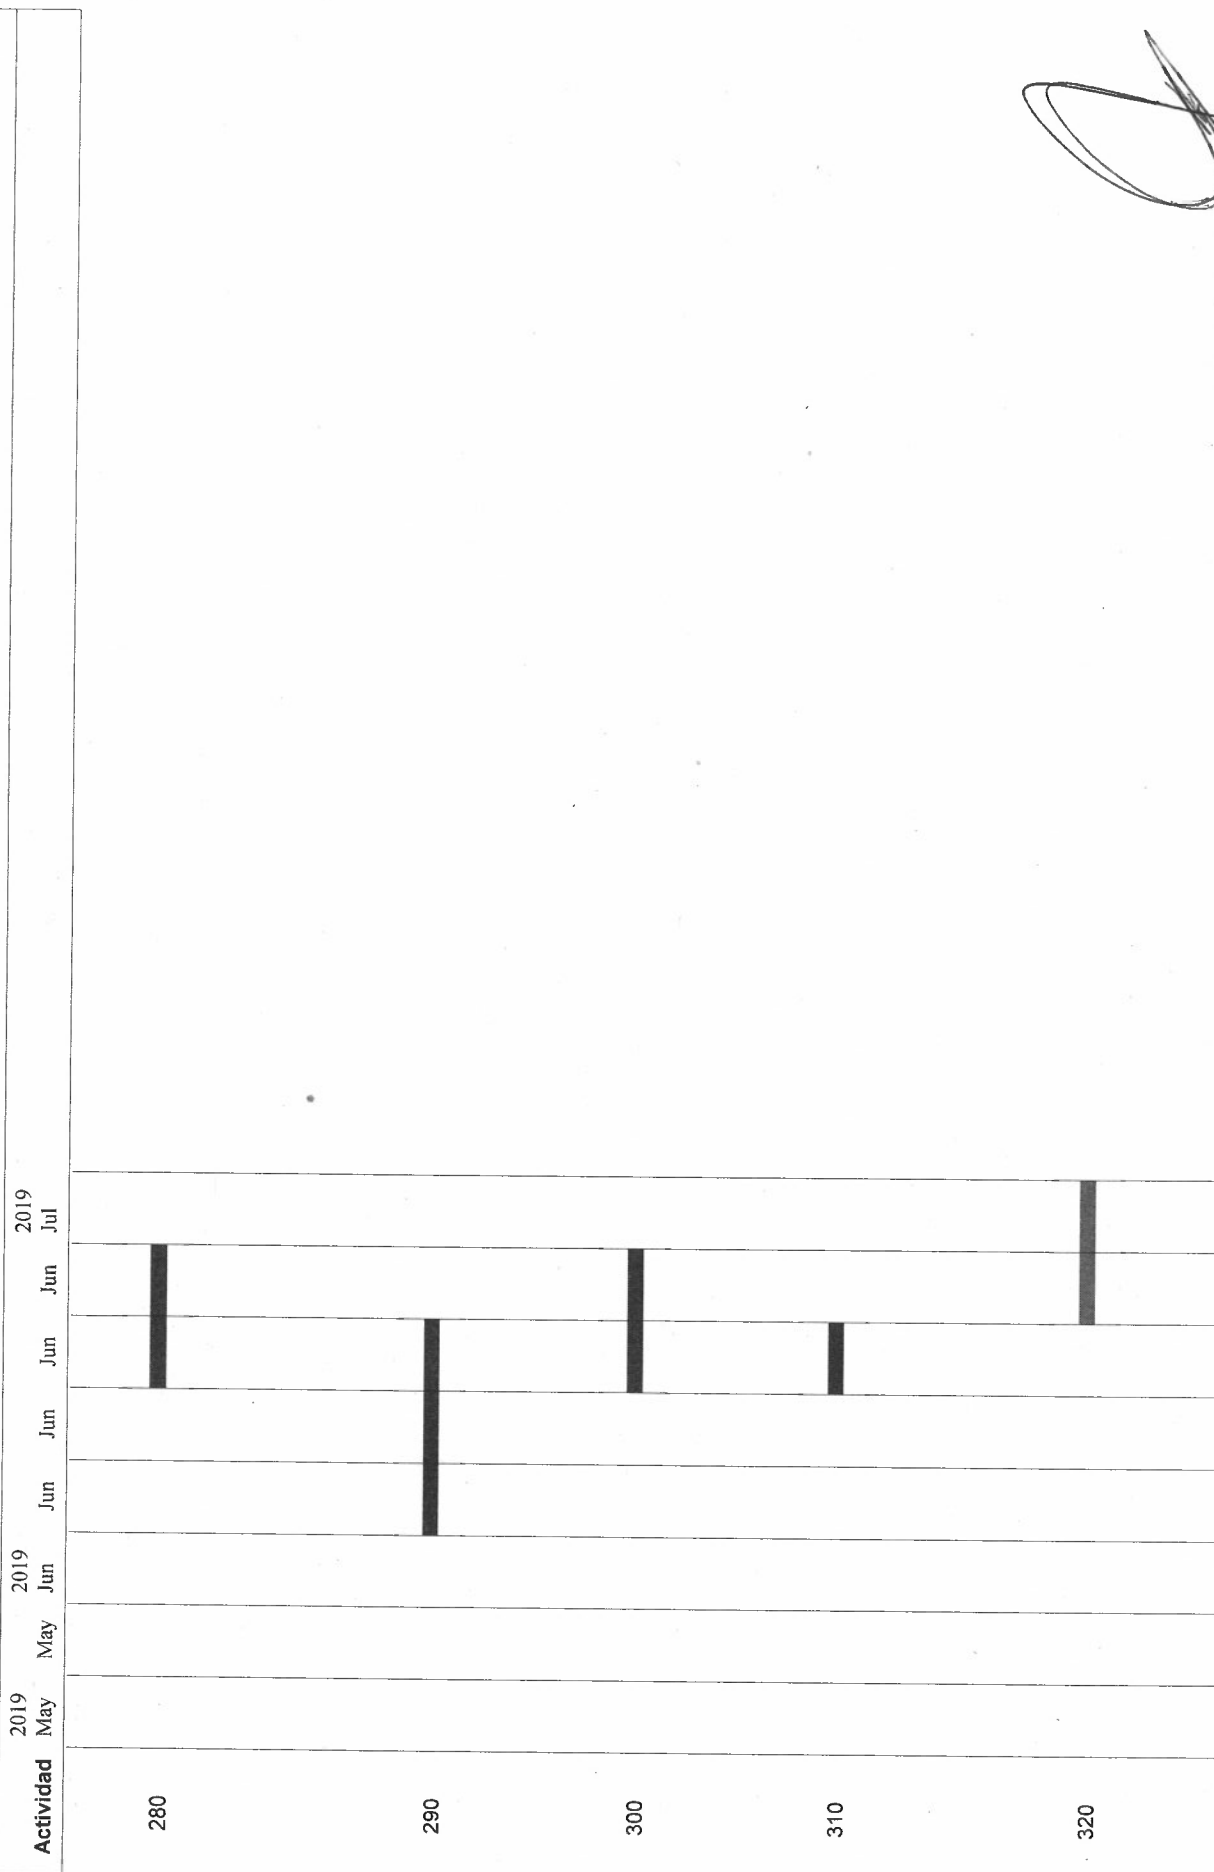


 ING JESUS JUAREZ CALVILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA DE OBRA

PROGRAMA DE OBRA

ING JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL
