

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONVERSION AEREO MT A SUBTERRANEO MT. EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR JUNIO
No CONTRATO 057/2018

CARACTERISTICAS: OFICIO DE AUTORIZA 2018-PDM-0P-008
OBRA ELECTROMECANICA DE MEDIA TENSION, OBRA ELECTROMECANICA DE BAJA TENSION, TRABAJOS DE PERFORACION DIRECCIONAL, ALUMBRADO Y RETIRO DE LINEA AEREA.

MONTO DE CONTRATO: \$15,072,608.62 CON IVA


CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 07 DE JUNIO DEL 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL									
PROGRAMADO:		\$	2,977,427.90	19.75%					
REAL:		\$	-	0.00%					
POR PARTIDA					PROGR.	REAL	POR PARTIDA		
1							9		
2							10		
3							11		
4							12		
5							13		
6							14		
7							15		
8									

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

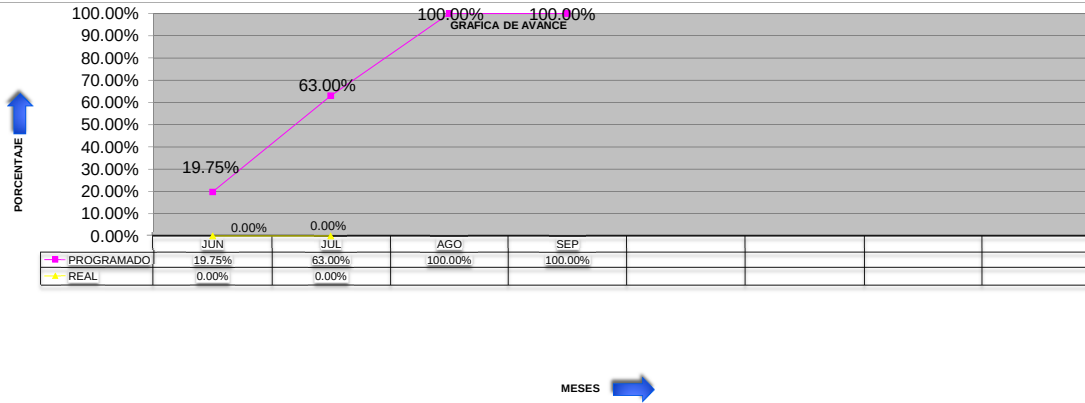

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

NOTAS:

SE REALIZAN REUNIONES CON REPRESENTANTES DEL COMITÉ PRO MEJORA Y DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LAS LINEAS AEREAS SOBRE ESTRUCTURA DE LA C.F.E. PARA SU REUBICACION

NO SE ENCUENTRA TERMINADA INSTALACION DE TUBERIAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

NO ES POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS DEL CONTRATO (OBRA ELECTROMECANICA) POR LO QUE SE REALIZARA UNA SUSPENSION TEMPORAL

