



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

**OBRA:** REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO (AV. DE LA CANTERA), EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.


**CARACTERÍSTICAS:** REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO, UBICADO EN LA AV. LA CANTERA Y AV. SAN FELIPE DE LA COL. SICOMORO, INCLUYE: 1,931.21 M2 DE PASO EN ROLLO, 190.74 ML DE CERCA PERIMETRAL, 1 SISTEMA DE RIEGO QUE INCLUYE 396.00 ML DE TUBO DE PVC, 7.00 CABALLETES DE TIRO, 1.00 CISTERNA DE 5000 LTS DE CAPACIDAD HECHA A BASE DE MUROS DE BLOCK Y LOSA DE CONCRETO, 1.00 ASETA DE HIDRONEUMÁTICO, 1.00 ESTACIONAMIENTO CON 20.00 CAJONES HECHO A BASE DE CARPET ASFALTICA, 1.00 SISTEMA DE ALUMBRADO QUE INCLUYE 2.00 SUPER POSTES Y 6.00 REFLECTORES.

**CONTRATO:** 122/2017  
**MONTO DE CONTRATO:** \$1,370,227.74  
**CONTRATISTA:** ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

**CALENDARIZACIÓN**

**FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO:** 24/08/2017  
**FECHA DE INICIO REAL:** 24/08/2017  
**FECHA DE TÉRMINO, SEGÚN CONTATO:** 21/11/2017  
**FECHA DE TÉRMINO REAL:** OBRA EN PROCESO

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

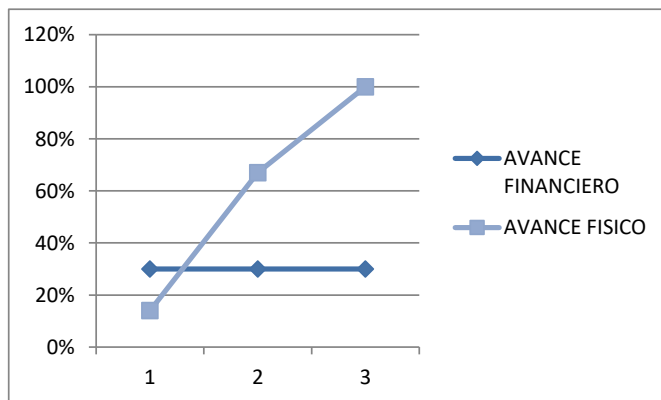

| MES        | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------|---------------|-------------------|
| OCTUBRE:   | 14.00%        | 30%               |
| NOVIEMBRE: | 67.00%        | 30%               |
| DICIEMBRE: | 100.00%       | 30%               |
| TOTAL:     | 100.00%       | 30%               |
