



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE LERDO


CARACTERÍSTICAS: REMODELACIÓN DEL PARQUE LERDO, INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE MURETES DE LADRILLO Y CON CANTERA DAÑADA, REPOSICIÓN DE MURETES Y GUARNICIONES POR LAS CALZADAS PERIMETRALES DEL PARQUE, BANCAS LINEALES DE CONCRETO EN ÁREA DE KIOSCO, COLOCACIÓN DE MALLA ANTIAVES EN KIOSCO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA POR AV. OCAMPO DE PENDIENTE ADECUADA, RECONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS POR LA PASEO BOLIVAR, RELLENO DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN ROLLO EN DIVERSAS ÁREAS DE JARDÍN, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN POR CALLE EN PASEO BOLIVAR, COLOCACIÓN DE BANCAS NUEVAS DE FIERRO FUNDIDO IGUALES A LAS EXISTENTES.

CONTRATO: 126/2017
MONTO DE CONTRATO: \$1,394,774.04
CONTRATISTA: CASTRO CHÁVEZ HÉCTOR ING.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 18/08/2017
FECHA DE INICIO REAL: 18/08/2017
FECHA DE TÉRMINO, SEGÚN CONTATO: 16/10/2017
FECHA DE TÉRMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

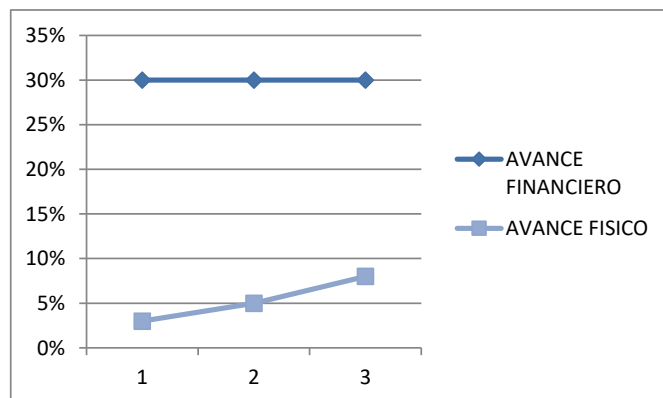

MES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OCUBRE:	3.00%	30%
NOVIEMBRE:	5.00%	30%
DICIEMBRE:	8.00%	30%
TOTAL:	8.00%	30%
