



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN VIVERO MUNICIPAL**


CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DONDE SE ALBERGARÁN LOS CAMIONES DE ASEO URBANO Y MAQUINARIA DE DICHA DEPENDENCIA EN UN ÁREA ALEDAÑA AL VIVERO MUNICIPAL. CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BAÑOS PARA EMPLEADOS, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGAS, ÁREA DE MANTENIMIENTO TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y 2 FOSAS DE CAMBIOS DE ACEITE, UN ACCESO CON PORTÓN DE HERRERÍA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, BORDA PERIMETRAL DE BLOQUE DE CONCRETO, ALUMBRADO CON POSTES DE 15 M. Y REFLECTORES. SUPERFICIE DEL PATIO DE 9,190 M², EDIFICIO NUEVO DE 92.4 M², ÁREA DE TECHUMBRE DE 240.6 M², 244.9 M DE BORDA PERIMETRAL, 443.73 M DE MALLA CICLÓNICA, 470 M² DE FIRME Y BANQUETAS DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN.

CONTRATO: 194/2017
MONTO DE CONTRATO: \$2,949,513.85
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTACTO: 15/12/2017
FECHA DE INICIO REAL: 15/12/2017
FECHA DE TÉRMINO, SEGÚN CONTACTO: 30/04/2018
FECHA DE TÉRMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

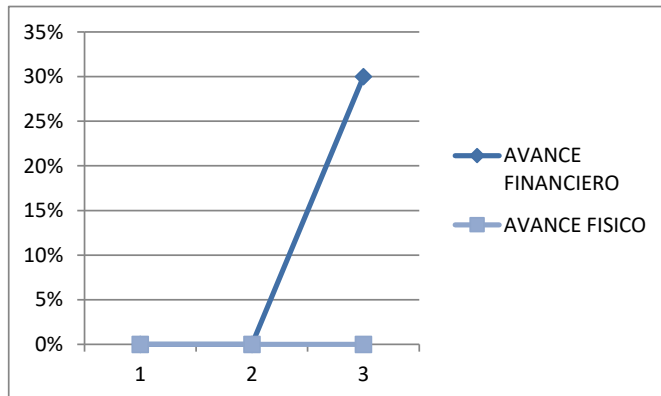

MES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OCTUBRE:	0.00%	0%
NOVIEMBRE:	0.00%	0%
DICIEMBRE:	0.00%	30%
TOTAL:	0.00%	30%
