

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JO PISTOLAS MENESES, UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA CON MALLA SOMBRA SOBRE LA CANCHA Y LAS GRADAS EXISTENTES. ASÍ MISMO SE RETIRARÁ EL PASEO DE DESECHO Y SE NIVELARÁ PARA COLOCAR PASTO SINTÉTICO NUEVO DE LAS ESPECIFICACIONES. INCLUYE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS GRADAS, PINTURA, ETC., ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES NUEVOS PARA EL ÁREA DE JUEGO EN LA NUEVA TECHUMBRE.**

CONTRATO: 084/2018

MONTO DE CONTRATO: \$2,292,361.16

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN


FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTRATO: 17/09/2018

FECHA DE INICIO REAL: 17/09/2018

FECHA DE TÉRMINO, SEGÚN CONTRATO: 14/01/2019

FECHA DE TÉRMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

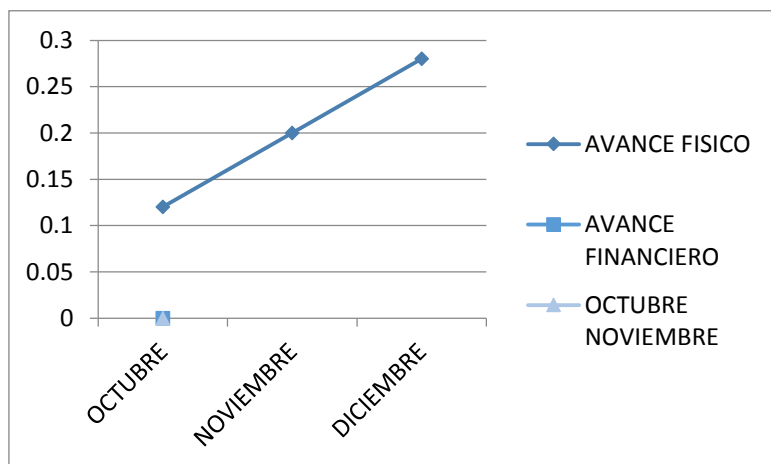

MES	AVANCE FÍSICO
OCTUBRE	12.00%
NOVIEMBRE	20.00%
DICIEMBRE	28.00%
TOTAL:	60.00%



SÉ PISTOLAS

D DEPORTIVA
E EN LA
TODA EL ÁREA
TO EXISTENTE
AS ÓPTIMAS
S, APLANADOS,
ILUMINACIÓN



AVANCE FINANCIERO
10%
20%
20%
50%
