

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA**
 CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL, A BASE DE 2 EJES, 20 ZAPATAS AISLADAS Y 20 DADOS DE CONCRETO ARMADO, 10 COLUMNAS DE ACERO DE TIPO IPR Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA AUTOSOPORTANTE CAL 22. ()
 CONTRATO: 097/2018
 MONTO DE CONTRATO: \$901,513.51
 CONTRATISTA: INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 17/10/2018
 FECHA DE INICIO REAL: 17/10/2018
 FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 30/11/2018
 FECHA DE TERMINO REAL: 30/11/2018

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

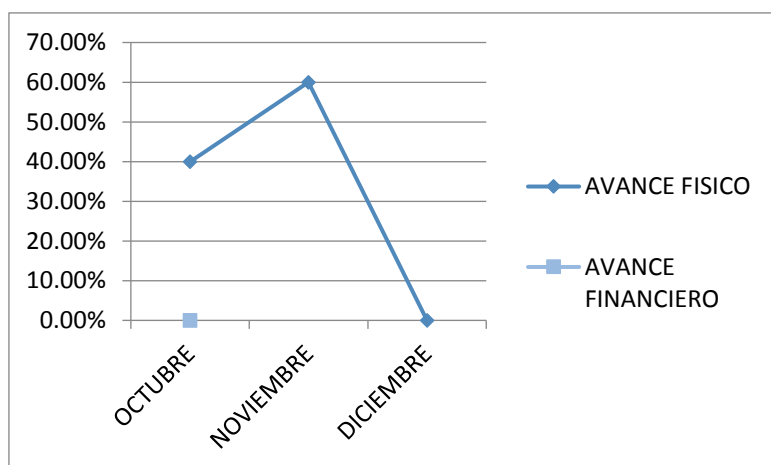

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	40.00%
NOVIEMBRE	60.00%
DICIEMBRE	0.00%
TOTAL:	100.00%



RIA IGNACIO
ES, CON 10
ACERO, VIGAS
AREA 444.55 M2



AVANCE FINANCIERO	
	21%
	79%
	0%
	100%
