

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BÁSICA


OBRA: **ESC. PRIM. FED. EDELMIRA TORRES IBARRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁL**
 CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL, A BASE DE 2 EJ
 ZAPATAS AISLADAS Y 20 DADOS DE CONCRETO ARMADO, 10 COLUMNAS DE /
 TIPO IPR Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA AUTOSOPORTANTE CAL 22. (/
)

CONTRATO: 107/2018
 MONTO DE CONTRATO: \$2,027,407.05
 CONTRATISTA: INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE 25/10/2018
 INICIO, SEGÚN CONTATO:
 FECHA DE INICIO REAL: 25/10/2018
 FECHA DE TERMINO , 03/12/2018
 SEGÚN CONTATO:
 FECHA DE TERMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

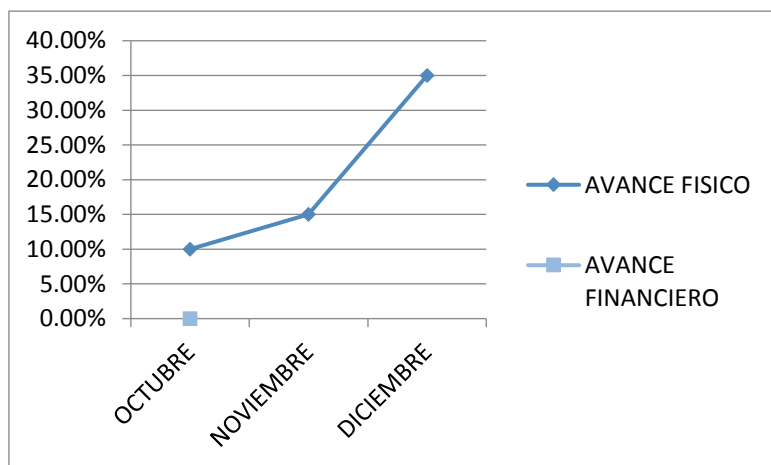

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	10.00%
NOVIEMBRE	15.00%
DICIEMBRE	35.00%
TOTAL:	60.00%



JICA TIPO DOMO
ES, CON 10
ACERO, VIGAS
AREA 488.60 M2



AVANCE FINANCIERO
30%
36%
0%
66%
