



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA

jun-17

DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VIAS FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKYY VIAS FFCC"

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2016-PDM-OP-030

CARACTERÍSTICAS:

2 ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: LA CUANTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (TIEMPO DE BLOQUEO POR EL FERROCARRIL Y AFORO VEHICULAR), EL CÁLCULO DE OFERTA, DEMANDA Y COSTOS EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO SE LLEVE A CABO (LO CUAL ABARCA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, EN OFICINAS DE TRÁNSITO Y DE FERROMEX, MEDICIÓN POR MUESTREO Y CONTEO DEL AFORO VEHICULAR), EL CAPÍTULO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COMPLETO CON MEMORIA DE CÁLCULO DEL PROYECTO, INCLUYENDO LOS FLUJOS ANUALES QUE PRESCRIBEN LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP.

MONTO DE CONTRATO:

\$218,422.20

CON IVA

CONTRATO

007/2017

CONTRATISTA:

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

27 DE MARZO 2017

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

27 DE MARZO 2017


FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

25 DE MAYO 2017

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE DE ENTREGA EN %

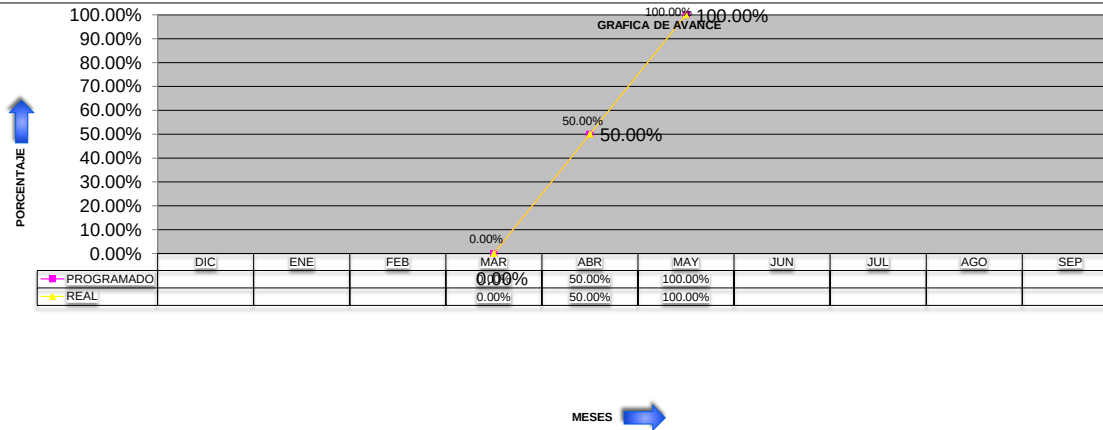

ACTIVIDADES

2 ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: LA CUANTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (TIEMPO DE BLOQUEO POR EL FERROCARRIL Y AFORO VEHICULAR), EL CÁLCULO DE OFERTA, DEMANDA Y COSTOS EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO SE LLEVE A CABO (LO CUAL ABARCA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, EN OFICINAS DE TRÁNSITO Y DE FERROMEX, MEDICIÓN POR MUESTREO Y CONTEO DEL AFORO VEHICULAR), EL CAPÍTULO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COMPLETO CON MEMORIA DE CÁLCULO DEL PROYECTO, INCLUYENDO LOS FLUJOS ANUALES QUE PRESCRIBEN LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP.
