

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV, TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA **No CONTRATO 061/2017**

CARACTERÍSTICAS: COLOCACIÓN DE 46 POSTES CON SUS RESPECTIVAS LAMPARAS, ASI COMO 2 SUBESTACIONES DE 25 KVA

MONTO DE CONTRATO: \$1,677,590.40 **CON IVA**

MONTO DE CONVENIO: **CON IVA**

MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: STHAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 25 DE MAYO DE 2017

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCION: 20 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO LE HAN DADO EL ANTICIPO

DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ -

REAL: \$ 126,508.95


PROGR. REAL

POR PARTIDA

POR PARTIDA

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

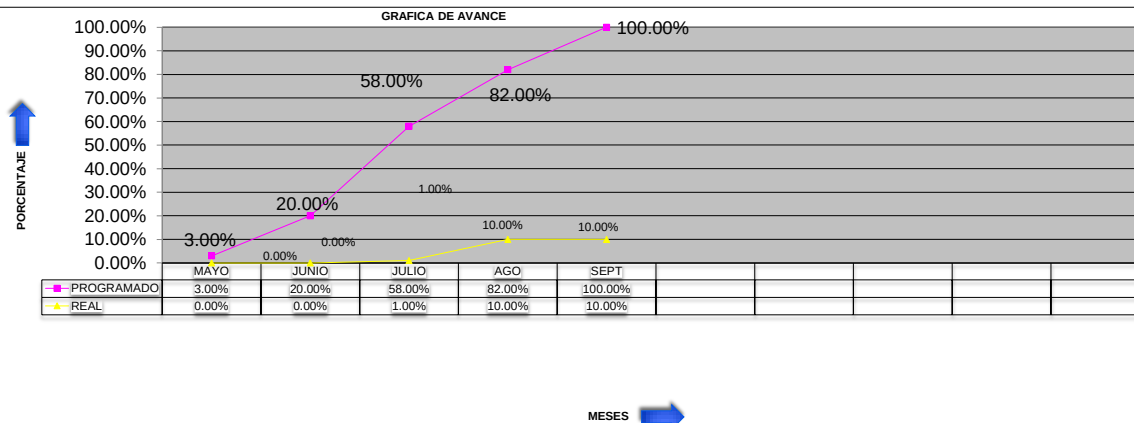

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA

NOTA: Se tienen comprados todos los postes, todas la bases



PROGRAMA DIFERIDO

MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT

PROGRAMADO 3.00% 20.00% 58.00% 82.00% 100.00%

REAL 0.00% 0.00% 1.00% 10.00% 10.00%
