

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No CONTRATO 097/2017

CARACTERISTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-170
CORTE Y APERTURA DE UN CARRIL, CON BANQUETA Y CUNETA, AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTE Y SEÑALIZACION.

MONTO DE CONTRATO: \$24,472,513.74 CON IVA MONTO MODIFICADO


CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 24 DE JULIO DEL 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTIPO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL					
PROGRAMADO:	\$	10,768,594.15	44.00%		
REAL:	\$	4,200,000.00	17.16%		
POR PARTIDA		PROGR.	REAL	POR PARTIDA	
1				9	
2				10	
3				11	
4				12	
5				13	
6				14	
7				15	
8					

AVANCE DE CONSTRUCCION EN %

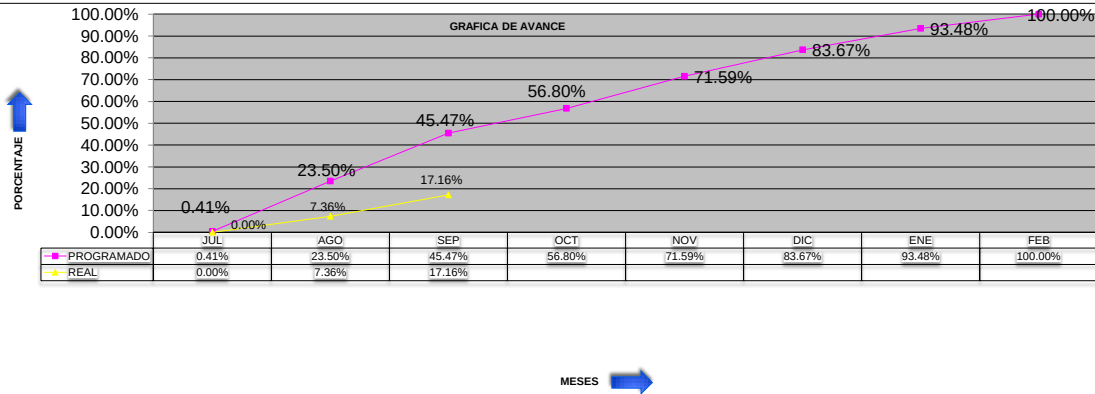

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

NOTAS:

SE REALIZAN EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRIBO 4, EN ESPERA DE QUE EL PROYECTISTA DEFINA EL AUMENTO DEL ESTRIBO Y LAS NUEVAS SECCIONES PARA ESTE, YA QUE NO SE VA A DESPLANTAR DESD PISO FIRME.
HABILITADO DE TUBERIA PARA OBRA DE DRENAJE DEL KM 0+330.00.

SE PROTEGE AREA DE CORTE DEL KM 0+160.00 AL 0+320.00 CON BARRERAS DE CONCRETO Y SE PUSO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE LINEAS LOGARITMICAS Y LIMITES DE VELOCIDAD EN EL PISO.

SE CONSIDERA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1" 1/2" RD-19 A LO LARGO DE LA BANQUETA PARA ALUMBRADO PBLICO.

SE REVISAN NIVELES DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES CON RESPECTO A LA PROYECCION DE LA AMPLIACION DEL CARRIL.

SE TIENE TRAMO IMPRENADO DEL KM 0+100 AL 0+400, CON GUARNICION, BANQUETAS Y CUNETAS TERMINADAS.

COLADO PARA LOSA SUPERIOR EN BOBEDA DE LA OBRA DE DRENAJE DEL KM 0+450.00



COLADO DE LOSA EN OBRA DEL KM 0+450.00



GUARNICION, BANQUETA Y CUNETA DEL KM 1+300 AL 1+400



PANORAMICA DE AMPLIACION DE PUENTE DEL 0+100 AL 1+180



CORTE DEL KM 0+280 AL 0+320
