

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CARRETERA A ALDAMA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No CONTRATO 102/2017
OFICIO DE AUTORIZACION No. 082/2017
CARACTERISTICAS: AMPLIACION Y CORTE DE MATERIAL PARA HABILITAR CARRIL DE ACCESO A RESIDENCIAL,
SEÑALAMIENTO DE OBRA Y PINTURA PARA DELIMITAR TRAFICO

MONTO DE CONTRATO: \$446,784.44 CON IVA PRIMERA ASIGNACION (ANTICIPO) \$154,063.60

CONTRATISTA: TRITURACION, EQUIPOS, MAQUINARIA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 16 DE AGOSTO DEL 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN


ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: 7.00%
REAL: 7.00%
PROGR. **REAL**

POR PARTIDA

1	7.00%	7.00%
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

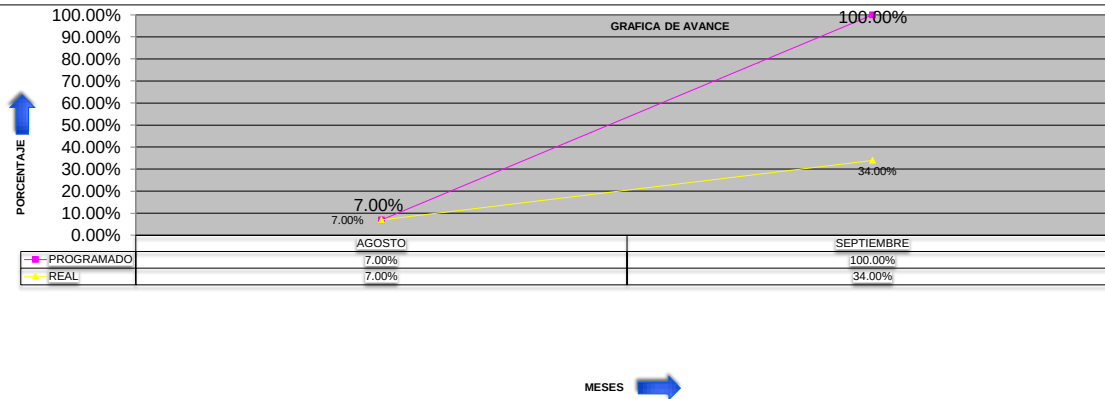

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

HASTA LA FECHA NO SE RECIBE EL ANTICIPO DE LA OBRA

NO SE HA TRABAJADO DURANTE LA SEMANA, TENIENDO YA 2 SEMANAS SIN TRABAJAR , EN ESPERA LA LLEGADA

ES ESPERA LA LLEGADA DE LAS BARRERAS DE CONCRETO



INICIO DEL TRAMO DEL KM 0+190



TRAMO DEL KM 0+140.00 AL 0+180.00



MICROCARPETA DEL KM 0+000.00 AL 0+010.00



MICROCARPETA DEL LKM 0+010.00 AL 0+040.00
