



DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE
MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.

No CONTRATO:

119/2024

CARACTERÍSTICAS:

RESTAURACION DEL TEMPLO, ESCAVACIONES PARA RETIRAR RELLENOS,
COLOCACION DE DUELA, RESTAURACION DE FRESCO, IMPERMEABILIZACION Y
COLOCACION DE PLAFON A BASE DE MANTA

OFICIO DE
AUTORIZACION
No.

MONTO DE
CONTRATO:

\$3,444,907.82

CON IVA

\$3,996,093.07

CONVENIO

\$0.00

CON IVA

CONTRATISTA:

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

06 DE DICIEMBRE DEL 2024

PRORROGA

SI

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL (REPROGRAMADO)

PROGRAMADO:

100.00%

REAL:


98.00%

POR PARTIDA

POR PARTIDA

A LA PRIMERA SEMANA DE OCT

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

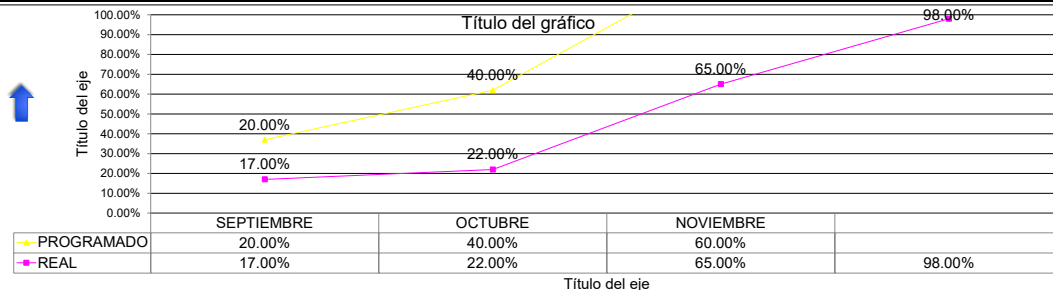


ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

OBSERVACIONES

SE APLICA PINTURA EXTERIOR EN FACHADA Y MUROS DENTRO DE LA EXHACIENDA

SE HACE LIMPIEZA EN AREAS EXTERNAS

PARA LLEGAR AL 100% SE NECESITA INSTALAR ZOCLO EN CAPILLA Y LAS 14 ESTACIONES
DEL VIACRUSIS EN LOS MURO LATERALES DE LA CAPILLA

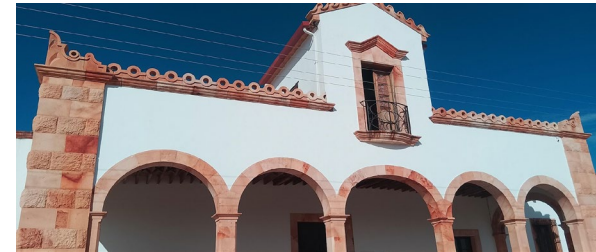

SE APLICA PINTURA EXTERIOR EN FACHADA Y MUROS DENTRO DE LA EXHACIENDA



SE HACE LIMPIEZA EN AREAS EXTERNAS

ELABORO: ARQ. HIRAM LOZANO HERNANDEZ
