

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: **INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. NOGALES** No CONTRATO 135/2017

CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES

MONTO DE CONTRATO: **\$2,079,793.56** CON IVA
MONTO DE CONVENIO: CON IVA

MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A DE C.V
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO LE HAN DADO EL ANTICIPO
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	\$	REAL:	\$	628,885.87	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL
POR PARTIDA								

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

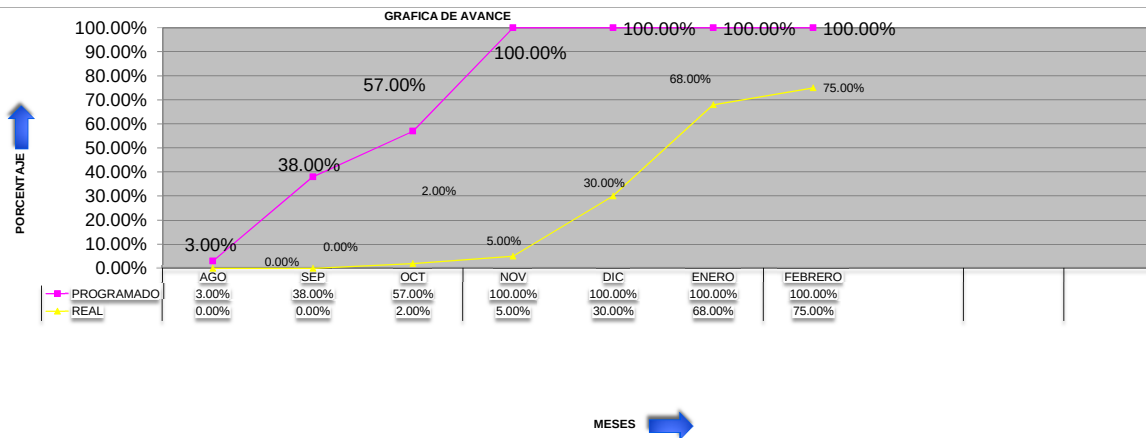

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS

