

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA 2018/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON**
 CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 22.00 X 30.00 MTS. EN CI
 BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 122 " JOSE
 PALACIOS" UBICADO EN C. 20a. (SALVADOR ALMANZA BUSTILLOS) No. 9008
 DIVISION DEL NORTE
 CONTRATO: 106/2018
 MONTO DE CONTRATO: \$1,231,865.23
 CONTRATISTA: AD CONSTRUCCIONES Y ACEROS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE 22/10/2018
 INICIO, SEGÚN CONTATO:
 FECHA DE INICIO REAL: 22/10/2018
 FECHA DE TERMINO , 31/12/2018
 SEGÚN CONTATO:
 FECHA DE TERMINO REAL: 07/12/2018

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

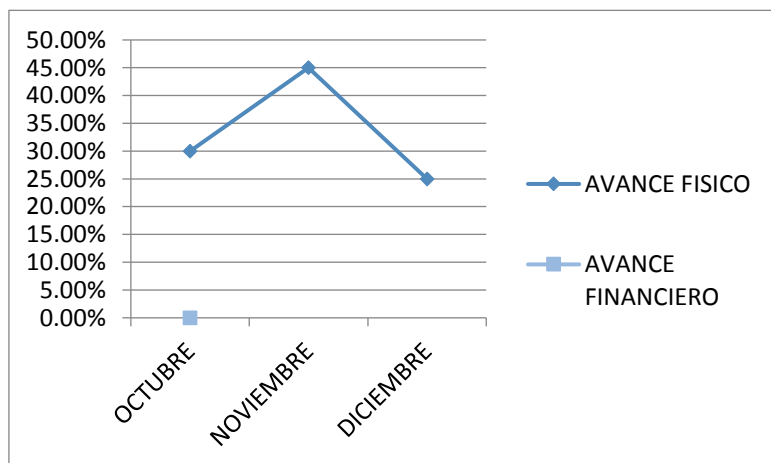

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	30.00%
NOVIEMBRE	45.00%
DICIEMBRE	25.00%
TOTAL:	100.00%



APOYO PARA
ENTRO DE
FELIX TRES
DE LA COL.



AVANCE FINANCIERO
30%
50%
20%
100%
