

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BÁSICA


OBRA: **JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA 2018/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON**
CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCION DE DOMO EN EXPLANADA, A BASE DE 2 EJES, CON 12 ZAPAT
24 DADOS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE ACERO, VIGAS TIPO IPR Y
LAMINA GALVANIZADA AUTOSOPORTANTE CAL 22. (AREA 590.52 M

CONTRATO: 113/2018
MONTO DE CONTRATO: \$1,618,663.19
CONTRATISTA:

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 01/11/2018
FECHA DE INICIO REAL: 01/11/2018
FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 25/12/2018
FECHA DE TERMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

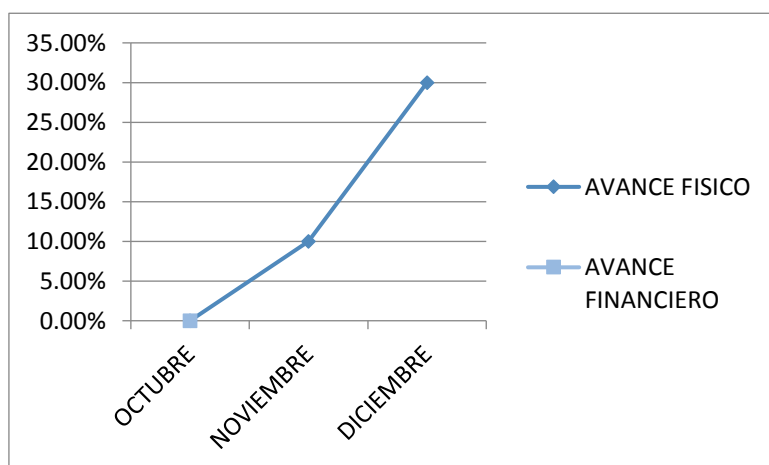

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	0.00%
NOVIEMBRE	10.00%
DICIEMBRE	30.00%
TOTAL:	40.00%



APOYO PARA

AS AISLADAS Y
CUBIERTA DE
(M2)



AVANCE FINANCIERO	
	1%
	1%
	1%
	3%
