

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR DE 106.26 M2 A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y LOSAS DE CONCRETO, EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE RAMÓN GUZMÁN DE LA COL. GRANJAS EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.


CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR DE 106.26M2 A BASE DE MAMPOSTERÍA Y LOSAS DE CONCRETO, EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE RAMÓN GUZMÁN DE LA COL. GRANJAS EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CONTRATO: 117/2018
MONTO DE CONTRATO: \$950,572.87
CONTRATISTA: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTRATO: 01/11/2018
FECHA DE INICIO REAL: 01/11/2018
FECHA DE TÉRMINO, SEGÚN CONTRATO: 29/01/2019
FECHA DE TÉRMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

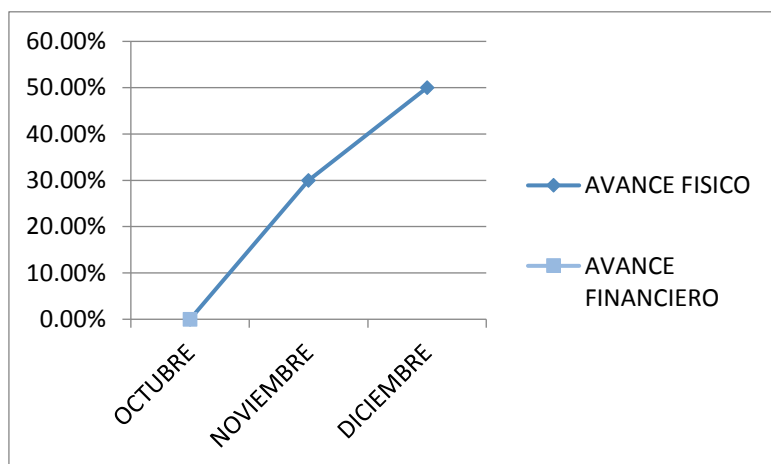

MES	AVANCE FÍSICO
OCTUBRE	0.00%
NOVIEMBRE	30.00%
DICIEMBRE	50.00%
TOTAL:	80.00%



AMPOSTERÍA Y
AMÓN GUZMÁN

JROS DE
BINO BARRERA
JAHUA.



AVANCE FINANCIERO
30%
55%
0%
85%
