



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA

**OBRA: REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA Y
C. VICTORIA**


CARACTERÍSTICAS: REMODELACIÓN DE LAS SIGUIENTES ÁREAS DEL EDIFICIO: PLANTA BAJA CON ACCESO A AV. INDEPENDENCIA 151 M2, 2DO NIVEL DE EDIFICIO EN ESQUINA 588 M2, MEZZANINE DE LA TORRE PRINCIPAL 594 M2, 2DO NIVEL DE LA TORRE PRINCIPAL 712 M2 Y 5TO NIVEL DE LA TORRE PRINCIPAL 712 M2. LA SUPERFICIE TOTAL DE LA REMODELACIÓN ES DE 2,757 M2. LA OBRA CONSISTE EN DEMOLICIONES DE MUROS, RETIRO DE PISOS, TABLARROCAS, PLAFONES, INSTALACIONES EXISTENTES ELÉCTRICAS, DE CLIMA, ETC. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA, COLOCACIÓN DE PISO, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, MUEBLES DE BAÑO, FALSO PLAFÓN EN CIERTAS ÁREAS, ACABADOS DIVERSOS Y PINTURA. ASÍ COMO LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y SISTEMA HIDROSANITARIO PARA SANITARIOS.

CONTRATO:	065/2017
MONTO DE CONTRATO:	\$5,525,166.95
CONTRATISTA:	ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO:	19/06/2017
FECHA DE INICIO REAL:	19/06/2017
FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO:	01/09/2017
FECHA DE TERMINO REAL:	OBRA EN PROCESO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

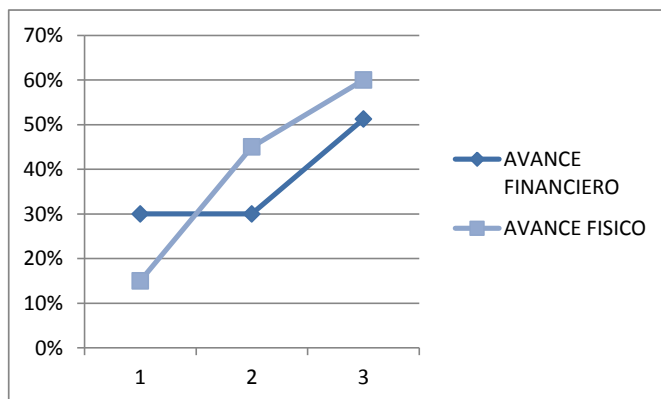

MES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
JULIO	15.00%	30%
AGOSTO	45.00%	30%
SEPTIEMBRE	60.00%	51%
TOTAL:	60.00%	51%
