



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DE LA OBRA: **RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE "QUINTA TOUCHE"**

DIRECCION

CENTRO HISTÓRICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMÓN BOLIVAR Y
AVENIDA INDEPENDENCIA, II ETAPA.

MUNICIPIO

CHIHUAHUA

DEPENDENCIA O INSTANCIA EJECUTORA:

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

I.- ANTECEDENTE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

	AÑO	OFICIOS	C/I.V.A.
IMPORTE TOTAL DE LA REHABILITACIÓN	2016	2016-PDM-33FM-OP-015 2016-PDM-33FM-OP-059	\$6,964,472.22

II.- TIPO DE OBRA O ACCIÓN APROBADA:

RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO

III.- FORMA DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN:

(X) POR CONTRATO

ADMINISTRACIÓN

() MIXTA

CONTRATO No. 035/2016
28 DE MARZO AL 25 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TÉRMINO REAL
09 DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR Y/O EMPRESA

AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

IV.- SITUACION FISICA DE LA OBRA O ACCIÓN Y CONDICIONES DE SERVICIO.

LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA QUINTA TOUCHE. LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ANEXO AL DOCUMENTO SE DESCRIBE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS DURANTE LA REHABILITACIÓN.

V.- SITUACION ACTUAL DE SERVICIO

TERMINADA Y EN OPERACIÓN

VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA O ACCIÓN POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TERMINADA, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SERVICIO POR LO QUE PUEDE SER RECIBIDA POR LA INSTANCIA RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


SE ACLARA QUE ESTA ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA O PROVEEDOR DE LOS BIENES O SERVICIOS DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN POSTERIORMENTE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA A CARGO EN LO QUE SE ESTIPULA EN LA POLIZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

VII.- FORMALIZACION DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2017

MEDIANTE ESTE ACTO, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, HACE ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, COMO SON LOS ABAJO FIRMANTES.

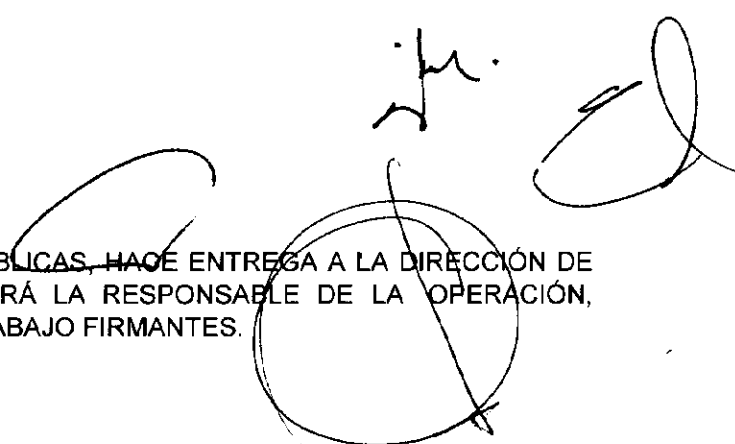


VIII.- OBSERVACIONES

RESPECTO A LAS 12 PUERTAS DE MADERA, 3 VENTANAS, 5 LATERALES, 2 MOSQUITEROS Y 2 MARCOS EN EL SOTANO SE LES PIDE UN RESGUARDO EN EL EDIFICIO MINIMO DE SEIS MESES, PASADO ESTE PERIODO SOLICITAR AL DEPARTAMENTO BIENES PATRIMONIALES PARA SU RETIRO, ESTO A DEBIDO A POSIBLES OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA. CON LO REFERENTE A LOS CLIMAS DEBIDO QUE LA GARANTIA DE LA EMPRESA YA EXPIRO, QUEDA DE USTEDES SU MANTENIMIENTO. CON RELACION AL CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SE LES NOTIFICA QUE YA SE CUENTA CON UN CONTRATO PARA EL SERVICIO.

ENTREGA



ING. CARLOS CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

RECIBE


M.A. MARIA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

TESTIGOS


ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN


ARQ. C. GABRIEL FLOREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE "QUINTA TOUCHE", UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMÓN BOLÍVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA, II ETAPA.


ANEXO A

N°		CONCEPTOS	VOLUMENES	P.UNITARIO
			EJERCIDOS	
1	1.1	PRELIMINARES		


2	1.2	Desmantelamiento de aplanado existente en bovedas de ladrillo, sin recuperacion. Incluye mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	0.00
3	1.3	Limpieza de caldera existente. Incluye mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	0.00
4	1.4	Limpieza en techo de escalera. Incluye mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	0.00
5	1.5	Limpieza de muros de mampostería existentes, a base de agua con cal. Incluye mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	0.00
6	1.6	Demolición de jardinera existente. Incluye mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	36.32
7	1.7	Limpieza en vigas existentes a base de madera de 6"x8". Incluye lijado y aplicación de un sellador para exteriores. Incluye material de mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.	m	0.00
8	1.8	Limpieza de estructura de madera existentes en ático en a base de madera de 4"x4". Incluye lijado y aplicación de un sellador para exteriores. Incluye material de mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.	m	0.00
9	1.9	Limpieza en cubierta del ático a base de tableta de madera. Incluye lijado y aplicación de un sellador para exteriores. Incluye material de mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.	m2	0.00
		Fumigación de ático. Incluye material de mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.	m2	207.63

2 MUROS


10	2.1	Muro de 0.30 mts. de espesor a base de block de concreto de 0.15x0.20x0.40 mts. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
----	-----	--	----	------



11	2.2	Muro de 0.12 mts. de espesor, a base de tablero de yeso contrahumedad en area de banos marca tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 3 5/8", poste metálico 3 5/8" a cada 0.60 mts. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	16.00
	EXT011	Restauración de columna de cantera con dimensiones de 0.325 x 0.325 x (0.00 a 2.80) m de altura a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de columna, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	7.00
	EXT012	Restauración de columna de cantera con dimensiones de 0.325 x 0.325 x (0.00 a 0.60) m de altura a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de columna, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	21.00
	3	ACABADOS EN MUROS		
12	3.1	Pintura vinil-acrílica en muros interiores, color BLANCO, código 7013, marca SHERWIN WILLIAMS, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	498.85
13	3.2	Limpieza de ladrillo industrial Incluye calafateos, perfiles, resanes, andamios, material, pintura lijado mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
14	3.3	Tratamiento de juntas o grietas en muro de ladrillo en fachadas a base de ca(calhidra) arena (no muy fina)pigmento color rojo (color ladrillo)y agua proporcion 1/3 incluye andamios material mano de obra tape para enmascarillar3" , brochas para su aplicacion suministree instalacion limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	0.00
15	3.4	Limpieza de tuberías en sótano. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	0.00




16	3.5	Limpieza en mampostería de piedra en sótano en muros por medio de agua de cal aplicada con atomizador, secando con estopa el excedente que no sea absorbido, aplicando en tantas ocasiones como la piedra absorba, para finalmente enjuagar la superficie con agua potable y secando con estopa limpia. Incluye reposición de piezas dañadas, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
17	3.6	Pintura vinil-acrílica en muros interiores de ático, color BLANCO, código 7013, marca SHERWIN WILLIAMS, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	51.85
18	3.7	Suministro y colocación de aplanado de yeso en muros de 0.015 m. de espesor, en ático, muestreado dispuesto con muestras a cada 1.50 m. para después complementar con el resto del aplanado. Incluye perfilados y remates, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	51.85
19	3.8	Suministro y colocación de placa de marmol, color crema Marfil, de 60x60 mts, , ver planos A25, A26, A27. Incluye aplanado para recibir cerámica, boquilla, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	138.98
	4	ACABADOS EN PISOS		
20	4.1	Pulido, resanado y acabado de madera incluye poliuretano de alto trafico a color natural, Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	193.92
21	4.2	Suministro y colocación de duela de madera de encino de 3/4" de espesor x 2 1/4" de ancho, clavada sobre triplay de 1/2", acabado pulido y 3 manos de poliuretano, estructura inferior a base de viguetas de madera. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	22.09



Handwritten signature or initials.

22	4.3	Suministro y colocación de mosaico hidráulico de 0.30x0.30 mts, de 3 cms de espesor colocada sobre mortero cemento arena, emboquillada con cemento blanco. Incluye aplanado para recibir cerámica, boquilla, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
23	4.4	Limpieza de piso existente con pulidora, retiro de material sobrante, limpieza, colocación de acrílico para sello. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	31.95
24	4.5	Acabado pulido sobre firme de concreto, a vuelta de llana lisa y/o pulidora mecánica de concreto. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
25	4.6	Suministro y colocación de acrílico blanco de 6 mm sobre terrado existente en alero. Incluye material de mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.	m2	0.00
	EXT008	Sobrefirme de concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$ con espesor de 0.08 m reforzado con malla electrosoldada calibre 6-6/10-10, acabado floteado, en área de baños planta alta, incluye cimbra muerta a base de madera de triplay de 3/4" anclada a polineria actual, impermeabilizado de cimbra, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	23.93
	EXT016	Suministro e instalación de huella de madera de caoba en escalones acceso a cafetería P.A., con dimensiones de 0.90 m x 0.35 m, incluye materiales, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00
	EXT018	Enchapado de peralte de escalones sección de 0.12 x 1.21 mts, en acceso a cafetería planta alta a base de hoja de triplay de 1/4", incluye: resanes, m.o, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00
	EXT037.	Colocación de mosaico de cantera con medidas de 0.30x0.30 mts, recuperado y colocado con adhesivo piso sobre piso en área de acceso de servicio, Incluye: resane en áreas necesarias, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	25.98
	EXT038.	Restauración de escalones en pórticos de 0.36 x 2.76 mts a base de polvo de cantera y sicalatex, Incluye: resane en áreas requeridas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00



5		PLAFONES		
26	5.1	Lijado y detallado de plafones existentes para recibir pintura Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	192.64
27	5.2	Suministro y colocación de pintura vinil-acrílica en plafones, color por definir, línea Osel Plata, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	191.93
28	5.3	Pintura vinil-acrílica en plafones interiores, en ático, color BLANCO, código 7013, marca SHERWIN WILLIAMS, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	20.43
29	5.4	Suministro y colocación de aplanado de yeso en losa del ático de 0.015 m. de espesor, en ático, muestreado dispuesto con muestras a cada 1.50 m. para después complementar con el resto del aplanado. Incluye perfilados y remates, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	20.43
6		MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO		
30	6.1	Suministro y colocación de sanitario color blanco mca. Kohler Highline Classic. Incluye asiento, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pijas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	0.00
31	6.2	Suministro y colocación de lavabo marca Orión, modelo Vessel KUB. Incluye llave monomando, marca Helvex, modelo E99S, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, pijas, conectores de hule, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	0.00
32	6.3	Suministro y colocación de mingitorio en seco, marca Kohler, modelo Steward. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	0.00

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten "m" and "S" with a checkmark.
- A large circular stamp with "pza" and "0.00" inside, crossed out with a diagonal line.
- A large handwritten signature or mark at the bottom right.


33	6.4	Suministro y colocación de base para soportar lavabos a base de madera, cubierta de marmol travertino. Incluye llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pijas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	0.00
34	6.5	Suministro y colocación de mampara para sanitario a base de acero inoxidable, acabado natural. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00
35	6.6	Suministro y colocación de mampara para mingitorio a base de cristal templado de 6.00 mm., acabado color verde o similar. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00
36	6.7	Suministro y colocación de dispensador de jabon a base de acero inoxidable, modelo IYCO10S, marca Jofel o similar. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	5.00
37	6.8	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico a base de acero inoxidable, modelo AE25000, marca Jofel o similar. Incluye fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	5.00
38	6.9	Suministro y colocación de espejo de 6.00 mm. montado sobre bastidor de madera 3/4", adosado a muro. Incluye fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00

EXT031. Retiro, traslado y reubicación a donde lo indique la supervisión de muebles sanitarios, Incluye: retiro de 2 sanitarios, 2 mamparas, 2 lavabos (con sus muebles), 1 mingitorio (Planta Baja), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.


pza 1.00

EXT034. Cancelación de salida hidráulica en baños planta alta. Incluye: material, mano de obra, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Salida 4.00



EXT035.	Salida hidráulica en baños planta alta, a base de tubo plus de 1/2", Incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	1.00
EXT036.	Salida hidrosanitaria de 2" baños planta alta a base de PVC y CPVC, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	1.00
EXT050	Suministro e instalación de Gabinete para lavabo de 97 x 55 cm SIENNA Sencillo chocolate. Incluye: montaje, equipo, herramienta, fijación, mano de obra y todo lo necesario a su correcta ejecución.	pza	2.00
EXT-109	Suministro e instalación de despachador de toalla interdoblada transparente, Incluye: mano de obra, elementos de fijación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00
EXT-118	Suministro y colocación de sanitario color blanco venus castel eco blanco. Incluye asiento, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pijas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00
EXT-119	Suministro y colocación de lavabo barbados rectangular blanco. Incluye llave monomando oslo alta cromo pulido, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, pijas, conectores de hule, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00
EXT-120	Suministro y colocación de mingitorio en seco, Gobi TDS B. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00
EXT-123	Suministro e instalación de gabinete de 97x55 cm Sienna sencillo color chocolate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
EXT-124	Suministro e instalación de gabinete Coruña.50 Gris/Teka. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00



39	7.1	Suministro y colocación de puerta sencilla P-2 de 0.91x2.49 mts., de madera de pino, molduras de madera, cristal floteado de 6 mm en todos los vanos Incluye pintura, marco, bisagras, cerradura, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	21.00
----	-----	---	-----	-------


40	7.2	Suministro y colocación de puerta 0.90x2.10 mts., de tambor, a base de mdf de 1/2" con chapa de encino en ambos lados y alma de poliestireno de 1", con madera de encino perimetral, marco y vestiduras en madera de encino sólido, acabado en pintura BLANCA, chapa para puerta interior de palanca, marca Yale con llave. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	0.00
----	-----	--	-----	------

41	7.3	Suministro y colocación de puerta de P1 0.85x2.11en area de la cava mts., de tambor, a base de mdf de 1/2" con chapa de encino en ambos lados y alma de poliestireno de 1", con madera de encino perimetral, marco y vestiduras en madera de encino sólido, acabado natural, chapa para puerta interior de palanca, marca Yale con llave. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su	pza	0.00
----	-----	--	-----	------

42	7.4	Suministro y colocación de puerta de P3 0.79x1.94 en area de la cava mts., de tambor, a base de mdf de 1/2" con chapa de encino en ambos lados y alma de poliestireno de 1", con madera de encino perimetral, marco y vestiduras en madera de encino sólido, acabado natural, chapa para puerta interior de palanca, marca Yale con llave. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	0.00
----	-----	---	-----	------

EXT042.	Suministro e Instalación de puerta doble a base de perfil de aluminio natural, con cristal templado de 9 mm, automatizada con sensor de movimiento, medidas de hojas de 1.15 mts x 2.10 mts, ancho total de 2.30 mts. Incluye: material, mano de obra de instalación de puerta, m.o de instalación de sensor, instalación eléctrica y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00
---------	---	-----	------

43	8 8.1	CARPINTERÍA Suministro y colocación de balaustrada a base de madera de pino de 0.90 mts de altura. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.
----	----------	--




44	8.2	Suministro y colocación de zoclo de madera de pino de 7 mm, acabado con barniz. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	124.63
45	8.3	Suministro y colocacion de carpinteria en chimenea. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	0.00
46	8.4	Reparación de carpinteria en molduras. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	0.00
47	8.5	Suministro y colocacion de coronas en puertas interiores. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	40.18
48	8.6	Recubrimiento de marcos de puertas interiores, pintadas, molduras , instalacion y acabados. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	78.70
49	8.7	Suministro y colocacion de molduras en puertas interiores. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	287.18
50	8.8	Suministro y colocacion de coronas de remate para ventanas. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	25.53
51	8.9	Suministro y colocacion de molduras bajo ventanas. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	25.53
52	8.10	Restauración de cava de madera existente a base de lijado, pulido sellado . Incluye mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	0.00
53	8.11	Suministro y colocación de cocineta en planta baja. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	1.00


Handwritten signatures and marks:

- A large circle with a diagonal line through it, labeled "pza".
- A signature "E" next to the circle.
- Handwritten numbers "180" and "185" near the top right.


54	8.12	Suministro y colocación de cocineta en planta alta. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	0.00
55	8.13	Suministro y colocación puente, estructura a base de madera de pino de 2", acabado con barniz para exteriores. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su	m2	2.48
56	8.14	Suministro y colocación de duela de madera de encino de 3/4" de espesor x 2 1/4" de ancho, clavada sobre triplay de 1/2", acabado pulido y 3 manos de poliuretano, estructura interior a base de viguetas de madera. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo,	m2	0.00
57	8.15	Restauracion de madera por debajo de escalera bajando al sotano en cubierta. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
	EXT007	Retiro de duela existente en baños planta superior por medios manuales, Incluye: almacenamiento del material recuperado, traslados, maniobras, resguardo para su posterior reutilizacion.	m2	23.93
	EXT021	Retiro de puerta existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	5.00
	EXT022	Retiro de zoclo existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	34.38
	EXT023.	Suministro y Colocación de repisón en ventana área de baños planta alta a base de madera de pino de 1.20 x 0.30 mt, Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.	pza	2.00
	EXT024.	Suministro y Colocación de moldura de remate entre loseta cerámica y duela a base de madera de pino de 5" x 2.00 mts de largo, Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	12.30
	EXT025.	Restauración de ventana superior de puertas interiores planta alta de 0.35 x 0.90 mts, Incluye: madera para perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, lijado, acabado con pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	15.00



EXT026.	Suministro y Colocación de perilla mca Yale en puertas planta baja y planta alta, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	21.00
EXT051	Restauración de clóset en baños planta alta. Secciones de puertas de 0.45 x 1.82 (2 pzas), 0.45 x 0.62 (2 pzas), entrepaños (2 pzas), Incluye: resane, cepillado, lijado, detallado, pintura, herrajes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-052	Trabajos en puerta P-1 y P-2 a ejecutar en ajuste de dimensiones (1.90 x 2.60 aprox) , resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro e instalación de cerrojo con llave. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
EXT-053	Trabajos en ventana VA2 de 1.40 x 2.50 mts, consistentes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado, pintura derivadas del ajuste, contra chapa superior, contra chapa de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-054	Trabajos en puerta PV-3 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior, suministro y fabricación de durmiente. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-055	Trabajos en puerta PV-4 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, resane y reparación de durmiente, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00




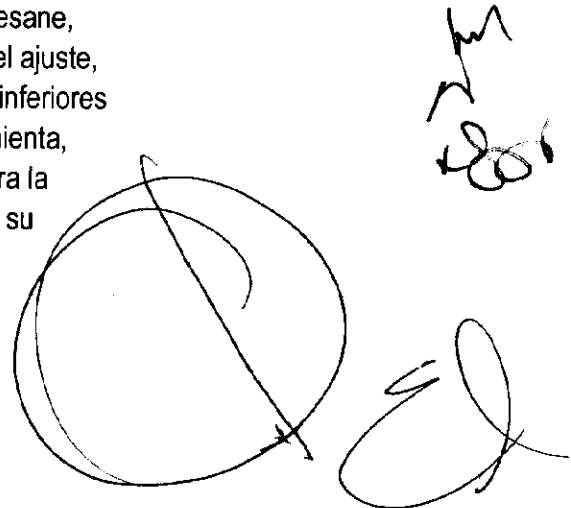

EXT-056	Suministro e instalación de vestidura de 2.37 x 2.20 mts en puerta corrediza, para que no exista juego de la puerta al momento de deslizarse. Incluye: madera de 3" con un ancho de 1/2" en ambos lados de la puerta, lijado, preparación para recibir pintura, pintura, resane, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-057	Trabajos en ventana PV-6 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane inferior de puerta, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-058	Trabajos en puerta PV-7 de 1.40 x 2.50 a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación de pasador inferior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta	pza	1.00
EXT-059	Trabajos en puerta PV-8 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, herrajes de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-060	Trabajos en puerta P-9 y P10 de 1.98 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en puertas, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro y colocación de 3 piezas de herrajes inferiores en P10. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00




Handwritten signature and circular stamp.

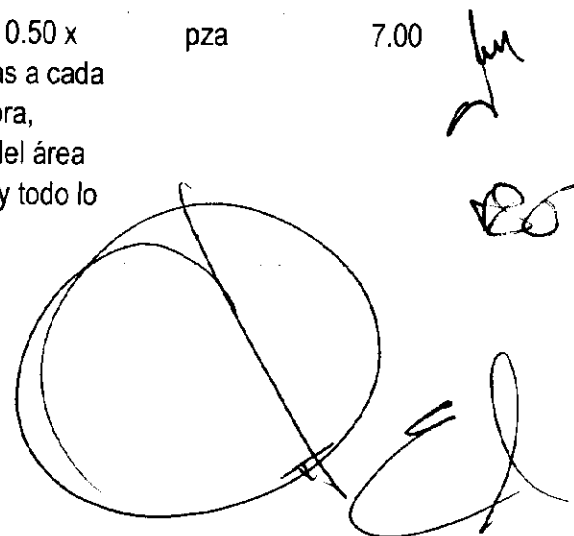EXT-061	Trabajos en Ventana 11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar , resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-062	Trabajos en Ventana 12 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-063	Trabajos en Ventana 13 de 1.27 x 1.98 a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-064	Trabajos en Ventana 14 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de chapa, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-066	Trabajos en ventana VA1 de 1.27 x 1.98 mts, consistentes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-067	Reparación de entramado de madera de 0.50 x 0.60 mts a base de pino de 2" x 3/8" con tablillas a cada 0.20 mts, incluye: pintura, material, mano de obra, instalación, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	7.00



Handwritten signature and initials, including a large circular mark and the letters 'CD'.

EXT-068	Trabajos en Ventana VA-03 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior, suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-069	Trabajos en ventana VA-04 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-070	Trabajos en Puerta PA-05 de 1.40 x 2.5 mts a ejecutar, resane y pintura por exterior, suministro e instalación de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-071	Trabajos en Puerta PA-06 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, instalación de guardapolvo de madera, instalación de cadena pasador superior, instalación de moldura remate en piso, resane y pintura derivadas de los trabajos anteriormente nombrados y aumento en puerta lateral derecha e instalación de postigos. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-072	Trabajos en Puerta PVA-08 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, injerto de puerta despostillada, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas de dichos trabajos, instalación de cadena pasador superior e instalación de pasador inferior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00




EXT-073	Trabajos en ventana VA-09 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse en ajuste de guardapolvo y de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-074	Trabajos en ventana VA-10 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, instalación de cadena pasador superior y contra chapa postigo izquierdo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-075	Trabajos en ventana VA-11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-076	Fabricación de ventana VA-12 de 0.60 x 1.10 mts (seccion completa de puerta ventana 1.27 x 1.98 mts). Incluye elaboración, entramado, 20 cristales, acabado con pintura para ventana de madera con; laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, instalación de pasador inferior, superior, postigos e instalación de cadena pasador superior, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-077	Trabajos en ventana VA-13 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutarse, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y superior e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00

EXT-078	Trabajos en ventana VA-16 1.27 x 1.98 a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resané, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-079	Trabajos en ventana VA-17 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-080	Pintura en puerta de sótano de 0.91 x 2.10 mts y suministro e instalación de Chapa. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-081	Trabajos en ventana en ATICO de 1.17 x 1.60 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura total de la piezas. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	7.00
EXT-082	Trabajos en ventana respiración en ATICO a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, material, mano de obra, montaje y desmontaje, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-083	Pintura en tablero de 1.36 x 1.52 mts en muro interior de madera en SOTANO. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-084	Suministro e instalación de tablero liso en closet de 0.51 x 1.37 mts. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00

EXT-089	Suministro y colocación de vestidura exterior completa para ventana de baño en planta baja de madera de pino de 1" de 2.80 m, hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-090	Suministro y colocación de cabezal superior para ventana de baño de 0.15 x 0.90 mts, en planta baja de madera pino de 1" de .90 m hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-091	Suministro y colocación de vestidura exterior para ventana en ático y planta alta de madera pino de 1" con dimensión de 1.20, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
EXT-092	Suministro y colocación de vestidura exterior para Puerta en planta baja de madera pino de 1" con dimensión de 2.80, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-093	Suministro y colocación de hoja de triplay de pino de 90 x 60 cm de 3/8" para antepecho de puerta en planta baja, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-113	Suministro y colocación de Pasador phillips Zamak de soprano de cuadro para ventana superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	30.00
EXT-114	Suministro e instalación de botaguas de 2x2 para puerta ventana de 0.90 mts de largo, incluye: material, mano de obra, detallado de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta-ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	24.00
EXT-115	Suministro y colocación de pasador retráctil de latón antiguo de 3" tenco modelo 250 en ventana en ático. Incluye: Pasador, mano de obra, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00

126



EXT-116 Trabajos en ventana superior de puertas en planta pza 13.00
 baja de 1.26 x 0.45 mts en ajuste de dimensiones,
 resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del
 ajuste. Incluye: madera para perfilado de aristas en
 marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de
 madera, material, mano de obra, herramienta, equipo,
 limpieza fina del área donde se encuentra la ventana,
 retiro de basura y todo lo necesario para su correcta
 ejecución.

EXT-121 Restauración en balaustrada inferior de 0.73 cm ml 18.52
 consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y
 pintura. Incluye, material, mano de obra, herramienta,
 equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo
 necesario para su correcta ejecución.

EXT-122 Restauración en balaustrada superior de 0.81 cm ml 25.52
 consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y
 pintura. Incluye, material, mano de obra, herramienta,
 equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo
 necesario para su correcta ejecución.


9 HERRERÍA

58 9.1 Reparación de reja del perímetro exterior de hierro Lote 0.00
 forjado. Incluye material, mano de obra, herramienta,
 acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su
 correcta ejecución, P. U. O. T.

59 9.2 Suministro y colocación de barandal tubular para de m 5.20
 0.90x2.mts encubo de atico, a base pasamanos tubular
 mod 160 y cuadrado C150 de 1 1/2' y base de solera de
 1 1/2', terminadas en primario color gris Incluye material,
 mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y
 todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O.

60 9.3 Suministro y colocación puerta tipo reja para vano de pza 1.00
 acceso a sotano de 1.36x1.77 mts estilo mismo de las
 ventanas del sotano a base de varilla de 1/2" . Incluye
 mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo
 necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.


61 9.4 Suministro y colocación de barandal tubular en rampa de m 23.02
 acceso principal de 0.90 mts de altura, a base
 pasamanos tubular mod 160 y cuadrado C150 de 1 1/2' y
 base de solera de 1 1/2', terminadas en primario color
 gris. Incluye material, mano de obra, herramienta,
 acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su
 correcta instalación, P. U. O. T.



62	9.5	Suministro y colocación de barandal tubular para de 0.90x9.9 mts en acceso de servicio en fachada posterior, a base pasamanos tubular mod 160 y cuadrado C150 de 1 1/2' y base de solera de 1 1/2', terminadas en primario color gris. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación bisagras para puerta de .90x.90, P. U. O. T.	pza	1.00
63	9.6	Desmantelamiento de reja perimetral, con recuperacion. Incluye remoción de puntas de maguey, mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	127.08
64	9.7	Instalación de reja recuperada. Incluye acabado SANDBLAST, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	118.30
65	9.8	suministro e instalacion de reja tipo louvers a base de angulo de 1 1/2,x 1 1/2x1 1/4 de pulgada y perfil cuadrado de 3/8' para proteccion de equipos de climas de 3.9mx1.20 alto con puerta para acceso a mantenimiento incluye material, mano de obra,bisagras, pintura electrosoldada primer color asemejandose la cantera del basamento de la construccion , herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	1.00
66	9.9	suministro e instalacion de puerta tipo reja a base de varilla redonda de 1/2" semante a reja de ventanas de sotano para proteccion de equipo hidroneumatico debajo rampa de acceso a edificio de .79x .94cm ver plano H?	pza	1.00
67	9.10	Barandal de fierro, de 1.35 x 0.90 mts de altura, acabado con pintura anticorrosiva, color negro.en ventanas y puertas Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	0.00
	10	CANCELERÍA		
68	10.1	Suministro y colocación de cancel de 1.00x2.00 mts., en el sótano. A base de cristal templado de 9.5 mm de espesor, un fijo y una puerta, acabado con pintura cerámica en color BLANCO. Incluye clip m/v para sujetar fijo (mod. 1144), bisagras m/v (mod. 1036) en puerta y chapa (mod. 1190 y 119000C), ver planos C01, C02, C03, C04. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	0.00


✓

✓




Handwritten signature or initials.


69	10.2	Suministro y colocación de 2 fijos más puerta de 2.02x2.00 mts. en vidrio templado 9.5 mm con pintura cerámica en color blanco, incluye clip m/v para sujetar fijo (mod. 1144), bisagras m/v (mod. 1036) en puerta y chapa (mod. 1190 y 119000C), ver planos C01, C02, C03, C04.. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	0.00
70	10.3	Suministro y colocación de cancel fijo, en ático, fabricado con cristal templado claro de 10 mm de espesor, incluyendo el herraje correspondiente. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
71	10.4	Retiro de cristales de puertas y ventanas de la parte superior con pintura vieja Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	275.00
72	10.5	Retiro de cristales de puerta corrediza con pintura vieja. De .24x.20mtxIncluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	0.00
73	10.6	Retiro de cristales de puerta corrediza de la parte superior de 35x42 con pintura vieja. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	0.00
74	10.7	Suministro y colocacion cristales de puerta corrediza con pintura vieja. De .24x.20CM Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	0.00
75	10.8	Suministro y colocacion de cristales de puerta corrediza de la parte superior de 35x42 con pintura vieja Incluye :material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	0.00
76	10.9	Suministro e instalacion de vidrio de 0.33 x 0.22 con15mm de espesor en ventanas exteriores, incluye, materila, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.O.U.T.	pza	234.00
77	10.10	Suministro e instalacion de vidrio de 0.33 x 0.33 con15mm de espesor en ventanas exteriores, incluye, materila, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.O.U.T.	pza	0.00

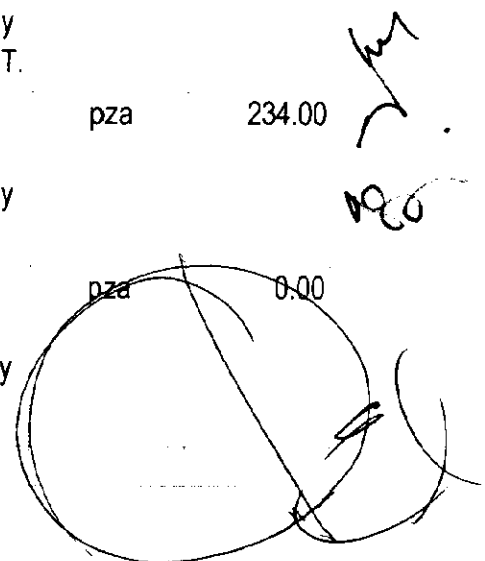


78	11.1	Suministro y colocación de spot con carcasa y base de conexión para empotrar en plafón, marca YD-360-BMP ALHOGENO , ángulo de 15", lp40, diámetro de 90 mm, luz blanca calida. Incluye foco de led 8W ME16 BLANCO materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	19.00
79	11.2	Suministro e instalacion de spot empotrado led 4000k blanco A100-240V Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	20.00
80	11.3	Suministro y colocación de tira de led, marca ECOMILED, rollo de 25m, 120 chips 3528 por metro (600 en 5mts), 8w/m máx, 12v DC, blanco cálido. Incluye	m	0.00
81	11.4	Suministro e instalacion de sopt para colocarse en riel (no lo incluye) modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00
82	11.5	Suministro e instalacion de riel de 2mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje en atico .Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00
83	11.6	Suministro e instalacion de riel de 2mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje en sotano Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00
84	11.7	Suministro e instalacion de riel de 1.5mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje en sotano. Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00
85	11.8	Suministro e instalacion de riel de 1.0mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo sotano voltaje Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00
86	11.9	Suministro e instalacion de reflectores de 10w calido modelo 1673/c marca ADIR en atico .Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00
87	11.10	Suministro e instalacion de reflectores de 10w calido modelo 1673/c marca ADIR en terrazas independencia y bolivar en .Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00
88	11.11	Suministro e instalacion de apagadores en sotano Incluye materiales cableado ,canaleta metalica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	5.00



89	11.12	Suministro e instalacion de apagadores en atico Incluye materiales cableado ,canaleta metalica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00
	12	CLIMAS		
90	12.1	Suministro e instalacion de Mini split, marca YORK, 1.5 ton, frio/ calor con bomba de calor, 12 SEER R22 220 volts. Incluye base metalica, carga de gas, interconexiones: electricas, dren, pruebas de funcionamiento, suministro e instalacion de tuberias de cobre para refrigerante de 1/2, 3/8, aislamiento armaflex y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	1.00
	13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
91		VOZ Y DATOS: INCLUYE SERVICIOS DE VOZ/DATOS		0.00
92	13.1	Category 6, RJ45, 8-position, 8-wire universal module Conector RJ45, categoria 6 marca panduit modelo CJ688TGIW	pza	0.00
93	13.2	Cable UTP Cat 6 marca Panduit modelo PUC6004IGY	rollo	0.00
94	13.3	Panel de parcheo de 24 puertos categoria 6 marca Panduit modelo DP24688TGY	pza	0.00
95	13.4	Cable de parcheo categoria 6 marca Panduit modelo UTPSP5BUY	pza	0.00
96	13.5	Cable de parcheo categoria 6 marca Panduit modelo UTPSP7BUY	pza	0.00
97	13.6	Placas de dos unidades Lutron modelo CW-2-WH	pza	0.00
98	13.7	Tubo conduit pared delgada galvanizada (EMT) de 21 mm. Incluye mano de obra, accesorios para su correcta instalacion y buen funcionamiento.	tramo	0.00
99	13.8	Soporte tipo clip para tubo de 21 mm (3/4in) incluye accesorios tornillos, taquetes, pijas todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	0.00
100	13.9	Caja Galvanizada de 4" x 4"	pza	0.00
	EXT040.	Suministro e instalación de salida de centro para luminarias en sótano, Incluye materiales cableado, canaleta metálica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	3.00
	EXT-094	Suministro e instalación de base de medición trifásica 7- 100 en murete existente. Incluye: instalación de barra coperweld para tierra física, cable de tierra, cableado, ranurado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00



EXT-095	Fabricación, suministro e instalación de gabinete de barras eléctricas para abastecer base de medición, hecha con barra de cobre de 1/4"x1-1/2" pulgadas, incluye: aisladores, zapatas, empotrado en muretes existentes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-096	Suministro e instalación de gabinete de 10x10x70 cms, para interruptor termomagnetico nuevo en murete existente, Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00
EXT-097	Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 3x70 amperes, incluye: interconexión a nueva base de medición, cableado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
EXT-098	Ranurado de banqueta y/o muro para preparar ruta de tendido de tubería eléctrica de 2", incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	25.79
EXT-099	Instalación de tubería eléctrica de 2" de pvc pesado de diámetro desde interruptor termomagnetico principal (itm) en murete hasta centro de carga de planta alta, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	32.98
EXT-100	Manufactura de registro eléctrico de 55 x 55 cms, para cableado de centro de carga en planta baja se detallo con enjarre interior, perfilado y tapa metálica fabricada de acero inoxidable, con ensamble de ángulo de 1/8"x3/4", pintada con esmalte alquidalico en color negro. Incluye: material, mano de obra, herramientas, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
EXT-101	Suministro y tendido de cableado eléctrico calibre 2 desde itm principal hasta centro de carga existente ubicado en planta alta del edificio (4 hilos, 3 fases y un neutro). Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	147.92
EXT-102	Suministro y tendido de cableado eléctrico calibre 8 para tierra física desde base de medición nueva, hasta centro de carga existente ubicado en planta alta del edificio. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	38.13
EXT-105	Desmontaje y montaje de piezas de cantera de 0.25 x 0.25 cms debido a transición eléctrica ubicado debajo de escalera de pasillo de servicio . Incluye: Resanado, emboquillado, material, mano de obra, herramienta, elementos de fijación y todo lo necesario para su	ml	6.00




EXT-106	Reparación de ranurado de banquetta de 0.12 cms, para preparación de ruta de tendido de tubería eléctrica de 2". Incluye: cemento, colocación de piedras de rio , material, mano de obra, herramienta, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	15.23
EXT-107	Suministro e instalación de tubería eléctrica de 2" de conduit pared delgada de diámetro , incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	4.95
EXT-108	Verificación al proyecto y a la instalación eléctrica, Incluye: revisión de dos tableros, análisis del proyecto eléctrico y revisión de cumplimiento de la NOM'S aplicables.	pza	1.00
EXT-110	Suministro e instalación de gabinete para Interruptor termomagnético nuevo en muro de tablaroca existente incluye demolición, sujeción, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00
EXT-111	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x200amperes 600VCA SQUARE D, incluye interconexión a centro de carga existente, cableado calibre 1/0, tubo flexible de 2", tubo de pvc pesado de 2" y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00
EXT-112	Trabajos de entubado de equipo minisplit y tomacorriente de servidor incluye tubería de pvc pesado de 2", caja para registro eléctrico de plástico, cable cal. 12 demolición, conectores, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00


14

OBRA EXTERIOR


101	14.1	Limpieza de piso en portico, reparando boquillas dañadas, ver planos A11, A12. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	61.84
102	14.2	Demolición de banquetta de concreto, ver planos A11, A12. Incluye retiro de material producto de demolición fuera de la obra, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	54.04
103	14.3	Relleno con caliche compactado al 90% de su pvsrn. Incluye agua, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m3	0.00



104	14.4	Suministro y colocación de muro de 0.20 mts. de espesor, a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 mts., asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, en cualquier nivel, ver planos A11, A12. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
105	14.5	Suministro y colocación de aplanado en muros a base de mezcla cemento arena 1:5 de 0.02 m. de espesor, acabado fino. Incluye perfilado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
106	14.6	Pintura vinil-acrítica en muros exteriores, color blanco, marca Sherwin williams, código 7013, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	0.00
107	14.7	Suministro y colocación de adoquin de concreto color negro, 0.30x0.30 mts, color segun diseno. Incluye cama de arena de 5.00 cms. de espesor, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	72.83
108	14.8	Revestimiento de perfiles metálicos en pórtico, recubiertos con lambín a base de madera de pino.ver detalle de carpinteria de columna de portico Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza , pintura y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	m2	33.57
	EXT001	Suministro y colocación de placa base de 12 x 12 cms para posteria de reja perimetral , incluye barrenacion de cantera 15x15x6 cms, placa de 1/4" con 4 anclas a base de varilla No 3, colocación de cemento expansivo sicagrout, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	28.00
	EXT002	Aplicación de pintura en reja perimetral, incluye primario gris y terminado a base de pintura color y línea autorizada por supervisión , m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	116.78
	EXT003	Restauración de cantera de remate, en rodapié de reja perimetral con un desarrollo (huella y peraltes) de 0.70 m, a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de la cantera con cardas y lijas, color imitación cantera, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	74.86

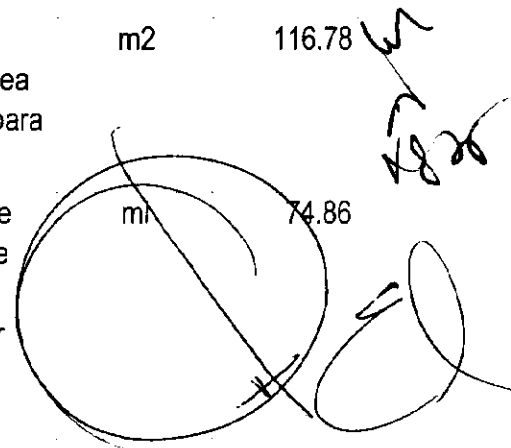

EXT004	Repellado de rodapié a base de mezcla cemento-arena 1:4 y terminado fino con estuco CREST color beige, incluye malla pollera, pernos para fijación de malla, martelinado de repellado actual para garantizar fijación, sica látex, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	52.40
EXT005	Aplicación de pintura en barandal de acceso principal, con 0.90 m de altura, pintura color y línea autorizada por supervisión, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	25.20
EXT006	Aplicación de pintura en barandal de acceso a servicio, con 0.90 de altura pintura color y línea autorizada por supervisión , m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	8.91
EXT009	Firme de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$ de 0.10 m de espesor, acabado escobillado, en área de acceso de servicio, reforzado con malla electro soldada calibre 6-6/10-10, incluye m.o, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.95
EXT013	Excavación por medios manuales en material tipo B en área de banqueta perimetral, Incluye: retiro del material y acarreo al banco de desperdicio que elija el contratista y autorizado por la DDUE.	m3	5.93
EXT014	Firme de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$ de 0.07 m de espesor, acabado floteado, en área de banqueta perimetral, para recibir adoquín de concreto negro, incluye m.o, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	46.94
EXT015	Afine de terreno natural en superficie de banqueta perimetral, incluye m.o, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	46.94
EXT017	Guarnición de concreto de 0.10 ancho x 0.20 m de alto en banqueta perimetral, a base de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$, incluye vibrado, m.o y todo lo necesario para su	ml	52.43
EXT019	Desconexión y conexión de reflector existente debido a demolición de banqueta, incluye m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT027.	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel, en puerta tipo reja a base de varilla redonda de 1/2" de 1.80 x 1.20 mts, semejante a reja de ventanas de sótano para protección de equipo hidroneumático debajo rampa de acceso a edificio, incluye: primario estructural gris, mano de obea, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00

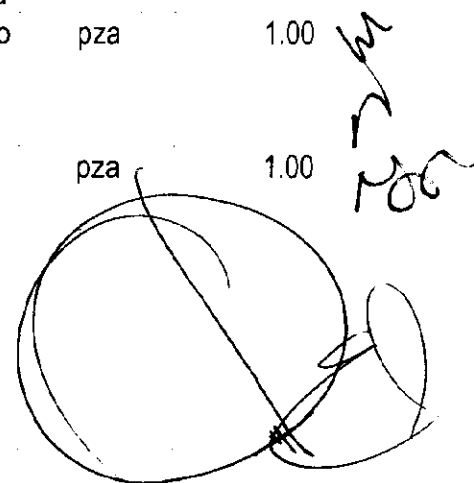

EXT028.	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel en puerta tipo reja para vano de acceso a sótano estilo mismo de las ventanas del sótano a base de varilla de 1/2" . Incluye mano de obra, primario estructural gris, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	1.00
EXT029.	Suministro y aplicación de pintura mca OSEL calidad Oro en reja perimetral, color autorizado por la supervisión, incluye materiales, m.o, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	94.50
EXT030.	Restauración de molduras especiales en reja perimetral, Incluye: herramienta, pintura, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	51.00
EXT039.	Colocación de adoquín triturado en área de jardines, incluye cortes, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución 20 cm de ancho	ml	45.13
EXT043.	Suministro e instalación de piezas faltantes de cantera en fachada para rodapié exterior en segundo nivel en formato 15 x 30 x 2 cm de espesor adherida con pegazulejo, chaffán y limpieza incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	6.00
EXT045	Cimentación para basamento de monumento con excavación de 1.00 x 1.00 x 0.60 mts, zapata de 0.80 x 0.80 x 0.20 mts de concreto F'c=250 kg/cm2, armado con vr #3 @0.20mts en ambos sentidos, sonotubo de 0.61 mts de diámetro con concreto F'c=250 kg/cm2, con armex de 4 puntos. Incluye: acabado con polvo de cantera, material, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, acarreo de residuos fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXT-085	Detallado, lijado en muro de ladrillo en fachada. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	162.13
EXT-086	Limpieza en dintel de cantera de 1.40 x 0.55 mts. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	34.00
EXT-087	Suministro e instalación de sello de penetración de polímeros de uretano base agua en adoquín, se aplicaran tres capas de sello. Incluye: material, mano de obra, herramienta, lavado de adoquín y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	92.81

Handwritten signature and circular stamp over the last row of the table.

EXT-088	Retiro de escombros, en camión fuera de la obra. Incluye: carga de material, traslado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	21.00
---------	--	----	-------

EXT-117	Suministro y colocación de placa de bronce fundida en bastidor de acero al carbón, y pintada para descripción de datos importantes del general Toribio Ortega al calce de la pieza de bronce. Incluye: accesorios de fijación, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
---------	--	-----	------

	15	JARDINERÍA		
--	-----------	-------------------	--	--

109	15.1	Suministro e instalación de Encino siempre verde.	pza	0.00
110	15.2	Suministro e instalación de Encino maple red	pza	0.00
111	15.3	Suministro e instalación de Crespón Bashams party pink	pza	0.00
112	15.4	Suministro e instalación de pasto San Agustín primera calidad.	m2	113.38
113	15.5	Suministro e instalación de arbustos	pza	63.00
114	15.6	Macetas de acero de 60cm de diametro y 100cm de altura	pza	0.00
115	15.7	Suministro y colocación de rodapie de 0.20 mts. de espesor y 0.80 mts de altura, a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 mts., asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, en cualquier nivel, ver planos A11, A12, tapa de concreto de 5 cms de espesor, acabado pulido. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	0.00

	16	SISTEMA CONTRA INCENDIO		
		PLANTA BAJA		

116	16.1	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00
-----	------	--	-----	------

		PLANTA ALTA		
--	--	--------------------	--	--

117	16.2	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00
-----	------	--	-----	------

		ATICO		
--	--	--------------	--	--

118	16.3	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	0.00
			pza	3.00

		SOTANO		
--	--	---------------	--	--

				0.00
--	--	--	--	------

119	16.4	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00
	17	MUSEOGRAFIA		
120	17.1	Suministro y colocación de módulo de información en vestibulo	pza	0.00
121	17.2	Sum. Y Colocación de elemento en vertical (TOTEM) para información, ubicado en el exterior	pza	0.00
122	17.3	Sum. Y Colocación de elemento museográfico	pza	0.00
123	17.4	Sum. Y colocación de figura de cera tamaño al natural de niños entre 6 y 10 años estatura promedio	pza	0.00
124	17.5	Sum. Y colocación de figura de cera tamaño al natural de hombre entre 20 y 30 años de edad yestatura promedio dentre 1.70 y 1.85 m.	pza	0.00
125	17.6	Señalética de información de nombres de espacios, rutas de evacuación, cédulas de información de cada elemento en exposición	pza	0.00

2/4

10/1

