

Contratista: **AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: AAR-901228-868

Contrato No. 035/2016	Monto con Iva \$ 6,964,472.22	Período Contratado: 28 MARZO A 25 DE JULIO DE 2016	Elaborado: Marzo 22 del 2016
Anticipo del 0%	Entregado: Jun 1 del 2016	Acuerdo de Reprogramación: 28 MARZO A 09 DE AGOSTO DE 2016	Acuerdo elaborado: Junio 1 del 2016
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Fecha: Ago 9 del 2016

2016-PDM-33FM-OP-015	\$ 6,500,000.00
2016-PDM-33FM-OP-059	\$ 6,500,000.00
2016-PDM-33FM-OP-C/008	\$ 2,631,210.51

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 3,868,789.49

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 785.569.17

TRÁMITE	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		ESTIMADO		SANCION		REINTEGR		AMORTIZACION		RETENCIONES		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION				
		Anticipo		0.00														
	N° 820	Eximación 1	493,254.03	78,920.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		562,215.14	572,174.67	Abr 11 del 2016
	N° 840	Normales y Exc	1,135,356.26	181,687.00		0.00		0.00		986.51		986.51		986.51		1,317,013.26	1,317,013.26	May 1 del 2016
	N° 841	Eximación 2	573,197.96	91,711.67		0.00		0.00		2,270.71		2,270.71		2,270.71		661,470.43	664,909.63	Jun 30 del 2016
	N° 845	Normales Exc y Ext	238,391.18	38,142.58		0.00		0.00		1,146.40		1,146.40		1,146.40		276,533.76	276,533.76	Jul 1 del 2016
	N° 844	Extras	217,749.14	34,839.86		0.00		0.00		476.78		476.78		476.78		281,282.59	281,282.59	Jul 31 del 2016
	N° 844	Eximación 5 (ULTIMA)	217,749.14	34,839.86		0.00		0.00		435.50		435.50		435.50		252.00	252.00	Agro 9 del 2016

COSTO DE OBRA: 3,083,220.32
POR ESTIMAR: 3,881,251.90

AMORTIZACIÓN: 0.00
POR AMORTIZAR: 0.00

~~EJERCIDO: 3.083.220,32~~
~~POR EJERCER: 785.569,17~~

PERIODO REAL	3,083,270.32	5,315.90	3,067,272.62

Abr 30 del 2016

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. C. GABRIELA FLOREZ HUERTO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

~~ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA~~

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Finiquito de los Trabajos


Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	OLUMENE	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUITAR
----	-----------	--------	---------	-----------	---------	------------------	-------------	------------------------	---------------------

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

[illegible]

[illegible]

25	4.6	Suministro y colocación de acrílico blanco de 6 mm sobre terrado existente en alíco Incluye material de mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	80.00	\$	-	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
	EXT008	Sobretirre de concreto f'c=150kg/cm2 con espesor de 0.08 m reforzado con malla electrosoldada calibre 6.8/10-10, acabado floreado, en área de baños planta alta, incluye cimbra muerta a base de madera de triplay de 3/4" anclada a polinería actual, impermeabilizado de cimbra, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$	564.48	23.93	13,508.00	-23.93	13,508.00	-23.93	-13,508.00
	EXT016	Suministro e instalación de huella de madera de caoba en escalones acceso a cafetería P.A., con dimensiones de 0.90 m x 0.35 m, incluye materiales, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$	3,265.17	3.00	9,795.51	-3.00	9,795.51	-3.00	-9,795.51
	EXT018	Enchapado de peralte de escalones sección de 0.12 x 1.21 mts, en acceso a cafetería planta alta a base de hoja de triplay de 1/4", incluye: resanes, m.o, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza		\$	1,802.00	4.00	7,208.00	-4.00	7,208.00	-4.00	-7,208.00
	EXT037.	Colocación de mosaico de cantera con medidas de 0.30x0.30 mts, recuperado y colocado con adhesivo piso sobre piso en área de acceso de servicio, incluye: resane en áreas necesarias, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$	286.28	25.98	7,437.55	-25.98	7,437.55	-25.98	-7,437.55
	EXT038.	Restauración de escalones en pórticos de 0.36 x 2.76 mts a base de polvo de cantera y sicalatex, incluye: resane en áreas requeridas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$	549.29	11.00	6,042.19	-11.00	6,042.19	-11.00	-6,042.19
	5	PLAFONES										
26	5.1	Lijado y detallado de plafones existentes para recibir pintura Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	220.00	\$	97.89	192.64	18,857.53	27.36	192.64	18,857.53	27.36
27	5.2	Suministro y colocación de pintura vinil-acrílica en plafones, color por definir, línea Osel Plata, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	220.00	\$	49.78	191.93	9,554.28	28.07	191.93	9,554.28	28.07
28	5.3	Pintura vinil-acrílica en plafones interiores, en alíco, color BLANCO código 7013, marca SHERWIN WILLIAMS, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	18.67	\$	49.78	20.43	1,017.00	-1.76	20.43	1,017.00	-1.76
29	5.4	Suministro y colocación de aplastado de yeso en losa del alíco de 0.015 m. de espesor, en alíco, muestreado dispuesto con muestras a cada 1.50 m. para después complementar con el resto del aplastado. Incluye perfilados y remates, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	18.67	\$	185.10	20.43	3,781.80	-1.76	20.43	3,781.80	-1.76
	6	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO										
30	6.1	Suministro y colocación de sanitario color blanco mca. Kohler Highline Classic. Incluye asiento, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pilas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00	\$	4,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	6.2	Suministro y colocación de lavabo marca Orón, modelo Vessel KUB. Incluye llave monomando, marca Helvex, modelo E99S, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, pilas, conectores de hule, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00	\$	6,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	6.3	Suministro y colocación de mingitorio en seco, marca Kohler, modelo Steward. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	10,902.67	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

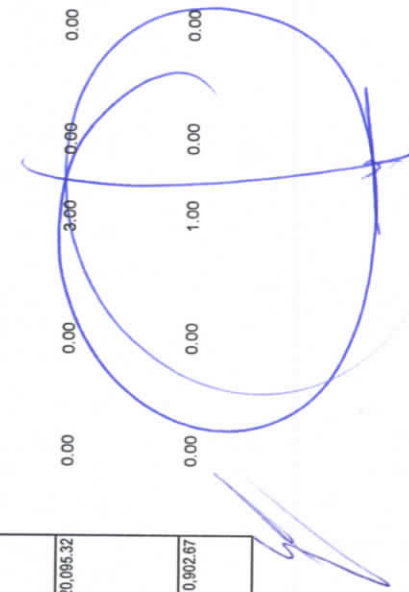

\$952,969.03

\$233,971.81

\$233,971.81

\$3,662.20

\$33,210.41

\$33,210.41

13,818.72

20,095.32

10,902.67

33	6.4	Suministro y colocación de base para soportar lavabos a base de madera, cubierta de marmol travertino. Incluye llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pilas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 7,079.36	\$21,238.08	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	21,238.08
34	6.5	Suministro y colocación de mampara para sanitario a base de acero inoxidable, acabado natural. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 24,648.04	\$49,296.08	3.00	73,944.12	-1.00	3.00	73,944.12	-1.00	-24,648.04
35	6.6	Suministro y colocación de mampara para mingitorio a base de cristal templado de 6.00 mm., acabado color verde o similar. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 6,110.21	\$6,110.21	2.00	12,220.42	-1.00	2.00	12,220.42	-1.00	-6,110.21
36	6.7	Suministro y colocación de dispensador de jabón a base de acero inoxidable, modelo YCO10S, marca Jofel o similar. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	5.00	\$ 1,962.23	\$9,811.15	5.00	9,811.15	0.00	5.00	9,811.15	0.00	0.00
37	6.8	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico a base de acero inoxidable, modelo AE25000, marca Jofel o similar. Incluye fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	5.00	\$ 1,892.51	\$9,462.55	5.00	9,462.55	0.00	5.00	9,462.55	0.00	0.00
38	6.9	Suministro y colocación de espejo de 6.00 mm. montado sobre basculador de madera 3/4", adosado a muro. Incluye fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 1,460.66	\$4,381.98	3.00	4,381.98	0.00	3.00	4,381.98	0.00	0.00
EXT031.		Retiro, traslado y reubicación a donde lo indique la supervisión de muebles sanitarios. Incluye: retiro de 2 sanitarios, 2 mamparas, 2 lavabos (con sus muebles), 1 mingitorio (Planta Baja), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 2,796.52	\$0.00	1.00	2,796.52	-1.00	1.00	2,796.52	-1.00	-2,796.52
EXT034.		Cancelación de salida hidráulica en baños planta alta. Incluye: material, mano de obra, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Salida		\$ 699.13	\$0.00	4.00	2,796.52	-4.00	4.00	2,796.52	-4.00	-2,796.52
EXT035.		Salida hidráulica en baños planta alta, a base de tubo plus de 1/2". Incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida		\$ 1,032.02	\$0.00	1.00	1,032.02	-1.00	1.00	1,032.02	-1.00	-1,032.02
EXT036.		Salida hidrosanitaria de 2" baños planta alta a base de PVC y CPVC. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida		\$ 1,599.26	\$0.00	1.00	1,599.26	-1.00	1.00	1,599.26	-1.00	-1,599.26
EXT050		Suministro e instalación de Gabinete para lavabo de 97 x 55 cm SIENNA Sencillo chocolate. Incluye: montaje, equipo, herramienta, fijación, mano de obra y todo lo necesario a su correcta ejecución.	pza		\$ 3,488.28	\$0.00	2.00	6,976.56	-2.00	2.00	6,976.56	-2.00	-6,976.56
EXT-109		Suministro e instalación de despachador de toalla interdoblaada transparente. Incluye: mano de obra, elementos de fijación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 578.19	\$0.00	5.00	2,890.95	-5.00	5.00	2,890.95	-5.00	-2,890.95
EXT-118		Suministro y colocación de sanitario color blanco venus castel eco blanco. Incluye asiento, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pilas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza		\$ 3,640.95	\$0.00	3.00	10,922.85	-3.00	3.00	10,922.85	-3.00	-10,922.85
EXT-119		Suministro y colocación de lavabo barbaos rectangular blanco. Incluye llave monomando oslo alta cromo pulido, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, pilas, conectores de hule, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza		\$ 4,738.74	\$0.00	2.00	9,477.48	-2.00	2.00	9,477.48	-2.00	-9,477.48
EXT-120		Suministro y colocación de mingitorio en seco, Gobi TDS B. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza		\$ 7,246.64	\$0.00	1.00	7,246.64	-1.00	1.00	7,246.64	-1.00	-7,246.64

EXT-123	Suministro e instalación de gabinete de 97x55 cm Sienna sencillo color chocolate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,153.27	2.00	6,306.54	-2.00	2.00	6,306.54	-2.00	-6,306.54
EXT-124	Suministro e instalación de gabinete Conilla.50 Gris/Teka. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,932.09	1.00	4,932.09	-1.00	1.00	4,932.09	-1.00	-4,932.09
					\$166,797.65			\$166,797.65		-\$21,680.89
7	PUERTAS									
39	7.1 Suministro y colocación de puerta sencilla P-2 de 0.91x2.49 mts., de madera de pino, molduras de madera, cristal floatado de 6 mm en todos los vanos Incluye pintura, marco, bisagras, cerradura, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	19.00 \$ 9,370.96	21.00	196,790.16	-2.00	21.00	196,790.16	-2.00	-18,741.92
40	7.2 Suministro y colocación de puerta 0.90x2.10 mts., de tambor, a base de mdf de 1/2" con chapa de encino en ambos lados y alma de poliestireno de 1", con madera de vestiduras en madera de encino sólido, acabado en pintura BLANCA, chapa para puerta interior de palanca, marca Yale con llave. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	1.00 \$ 9,003.86	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9,003.86
41	7.3 Suministro y colocación de puerta de P1 0.85x2.11en area de la cava mts., de tambor, a base de mdf de 1/2" con chapa de encino en ambos lados y alma de poliestireno de 1", con madera de encino perimetral, marco y vestiduras en madera de encino sólido, acabado natural, chapa para puerta interior de palanca, marca Yale con llave. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	1.00 \$ 9,003.86	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9,003.86
42	7.4 Suministro y colocación de puerta de P3 0.79x1.94 en area de la cava mts., de tambor, a base de mdf de 1/2" con chapa de encino en ambos lados y alma de poliestireno de 1", con madera de encino perimetral, marco y vestiduras en madera de encino sólido, acabado natural, chapa para puerta interior de palanca, marca Yale con llave. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	1.00 \$ 9,003.86	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9,003.86
EXT042.	Suministro e instalación de puerta doble a base de perfil de aluminio natural, con cristal templado de 9 mm, automatizada con sensor de movimiento, medidas de hojas de 1.15 mts x 2.10 mts, ancho total de 2.30 mts. Incluye: material, mano de obra de instalación de puerta, m.o de instalación de sensor, instalación eléctrica y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 176,598.67	1.00	176,598.67	-1.00	1.00	176,598.67	-1.00	-176,598.67
					\$373,388.83			\$373,388.83		-\$168,329.01
8	CARPINTERIA									
43	8.1 Suministro y colocación de balaustrada a base de madera de pino de 0.90 mts de altura. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	35.00 \$ 3,271.07	44.04	144,057.92	-9.04	44.04	144,057.92	-9.04	-29,570.47
44	8.2 Suministro y colocación de zool de madera de pino de 7 mm, acabado con barniz. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	127.00 \$ 258.78	124.63	32,251.75	2.37	124.63	32,251.75	2.37	613.31
45	8.3 Suministro y colocación de carpintería en chimenea. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	1.00 \$ 15,541.18	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	15,541.18
46	8.4 Reparación de carpintería en molduras. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
47	8.5 Suministro y colocación de coronas en puertas interiores. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	65.50 \$ 592.75	40.18	23,816.70	25.32	40.18	23,816.70	25.32	15,008.43
48	8.6 Recubrimiento de marcos de puertas interiores, pintadas, molduras, instalación y acabados. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	95.50 \$ 691.73	78.70	54,439.15	16.80	78.70	54,439.15	16.80	11,621.06

49	8.7	Suministro y colocación de molduras en puertas interiores. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	215.00	\$ 142.34	\$30,603.10	287.18	40,877.20	-72.18	287.18	40,877.20	-72.18	-10,274.10
50	8.8	Suministro y colocación de coronas de remate para ventanas. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	62.31	\$ 758.76	\$47,278.34	25.53	19,371.14	36.78	25.53	19,371.14	36.78	27,907.20
51	8.9	Suministro y colocación de molduras bajo ventanas. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	56.21	\$ 532.39	\$29,925.64	25.53	13,591.92	30.68	25.53	13,591.92	30.68	16,333.72
52	8.10	Restauración de cava de madera existente a base de lijado, pulido sellado. Incluye mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 32,247.76	\$32,247.76	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	32,247.76
53	8.11	Suministro y colocación de cochinetas en planta baja. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 51,373.50	\$51,373.50	1.00	51,373.50	0.00	1.00	51,373.50	0.00	0.00
54	8.12	Suministro y colocación de cochinetas en planta alta. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 46,077.60	\$46,077.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	46,077.60
55	8.13	Suministro y colocación puente, estructura a base de madera de pino de 2", acabado con barniz para exteriores. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	3.50	\$ 11,533.95	\$40,368.83	2.48	28,604.20	1.02	2.48	28,604.20	1.02	11,764.63
56	8.14	Suministro y colocación de dula de madera de encino de 3/4" de espesor x 2 1/4" de ancho, clavada sobre triplay de 1/2", acabado pulido y 3 manos de poliuretano, estructura interior a base de viguetas de madera. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	124.78	\$ 2,977.45	\$371,526.21	0.00	0.00	124.78	0.00	0.00	124.78	371,526.21
57	8.15	Restauración de madera por debajo de escalera bajando al solano en cubierta. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	4.02	\$ 4,707.14	\$18,922.70	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	4.02	18,922.70
EXT007		Retiro de dula existente en baños planta superior por medios manuales. Incluye: almacenamiento del material recuperado, trasladados, maniobras, resguardo para su posterior reutilización.	m2		\$ 178.97	\$0.00	23.93	4,282.75	-23.93	23.93	4,282.75	-23.93	-4,282.75
EXT021		Retiro de puerta existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza		\$ 1,152.21	\$0.00	5.00	5,761.05	-5.00	5.00	5,761.05	-5.00	-5,761.05
EXT022		Retiro de zócalo existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$ 44.42	\$0.00	34.38	1,527.15	-34.38	34.38	1,527.15	-34.38	-1,527.15
EXT023		Suministro y Colocación de repisón en ventana área de baños planta alta a base de madera de pino de 1.20 x 0.30 mt, Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	pza		\$ 933.55	\$0.00	2.00	1,867.10	-2.00	2.00	1,867.10	-2.00	-1,867.10
EXT024		Suministro y Colocación de moldura de remate entre losetas cerámica y dula a base de madera de pino de 5" x 2.00 mts de largo, Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 1,109.11	\$0.00	12.30	13,642.05	-12.30	12.30	13,642.05	-12.30	-13,642.05
EXT025		Restauración de ventana superior de puertas interiores planta alta de 0.35 x 0.90 mts, Incluye: madera para perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, lijado, acabado con pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 926.09	\$0.00	15.00	13,891.35	-15.00	15.00	13,891.35	-15.00	-13,891.35
EXT026		Suministro y Colocación de perilla mca Yale en puertas planta baja y planta alta, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 836.84	\$0.00	21.00	17,573.64	-21.00	21.00	17,573.64	-21.00	-17,573.64
EXT051		Restauración de closet en baños planta alta. Secciones de puertas de 0.45 x 1.82 (2 pzas), 0.45 x 0.62 (2 pzas), enrejados (2 pzas). Incluye: resane, cepillado, lijado, detallado, pintura, herrajes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 4,145.27	\$0.00	1.00	4,145.27	-1.00	1.00	4,145.27	-1.00	-4,145.27


EXT-052	Trabajos en puerta P-1 y P-2 a ejecutar en ajuste de dimensiones (1.90 x 2.60 aprox) , resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro e instalación de carrojo con llave. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 6,643.95	\$0.00	2.00	13,287.70	-2.00	2.00	13,287.70	-2.00	-13,287.70
EXT-053	Trabajos en ventana VA2 de 1.40 x 2.50 mts, consistentes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado, pintura derivadas del ajuste, contra chapa superior, contra chapa de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,974.68	\$0.00	1.00	3,974.68	-1.00	1.00	3,974.68	-1.00	-3,974.68
EXT-054	Trabajos en puerta PV-3 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior, suministro y fabricación de durmiente. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,339.03	\$0.00	1.00	4,339.03	-1.00	1.00	4,339.03	-1.00	-4,339.03
EXT-055	Trabajos en puerta PV-4 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, resane y reparación de durmiente, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,545.88	\$0.00	1.00	4,545.88	-1.00	1.00	4,545.88	-1.00	-4,545.88
EXT-056	Suministro e instalación de vestidura de 2.37 x 2.20 mts en puerta corrediza, para que no exista juego de la puerta al momento de deslizarse. Incluye: madera de 3" con un ancho de 1/2" en ambos lados de la puerta, lijado, preparación para recibir pintura, pintura, resane, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,041.14	\$0.00	1.00	5,041.14	-1.00	1.00	5,041.14	-1.00	-5,041.14
EXT-057	Trabajos en ventana PV-6 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane inferior de puerta, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 6,184.57	\$0.00	1.00	6,184.57	-1.00	1.00	6,184.57	-1.00	-6,184.57
EXT-058	Trabajos en puerta PV-7 de 1.40 x 2.50 a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación de pasador inferior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,101.65	\$0.00	1.00	3,101.65	-1.00	1.00	3,101.65	-1.00	-3,101.65
EXT-059	Trabajos en puerta PV-8 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, herrajes de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,123.09	\$0.00	1.00	2,123.09	-1.00	1.00	2,123.09	-1.00	-2,123.09
EXT-060	Trabajos en puerta P-9 y P10 de 1.98 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en puertas, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro y colocación de 3 piezas de herrajes inferiores en P10. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,529.65	\$0.00	2.00	11,059.30	-2.00	2.00	11,059.30	-2.00	-11,059.30
EXT-061	Trabajos en Ventana 11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,603.85	\$0.00	1.00	3,603.85	-1.00	1.00	3,603.85	-1.00	-3,603.85

todo lo necesario para su correcta ejecución.

EXT-062	Trabajos en Ventana 12 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,176.02	\$0.00	1.00	1,176.02	-1.00	1.00	1,176.02	-1.00	-1,176.02
EXT-063	Trabajos en Ventana 13 de 1.27 x 1.98 a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,324.98	\$0.00	1.00	4,324.98	-1.00	1.00	4,324.98	-1.00	-4,324.98
EXT-064	Trabajos en Ventana 14 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de chapa, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,577.95	\$0.00	1.00	2,577.95	-1.00	1.00	2,577.95	-1.00	-2,577.95
EXT-066	Trabajos en ventana VA1 de 1.27 x 1.98 mts, consistentes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,613.48	\$0.00	1.00	3,613.48	-1.00	1.00	3,613.48	-1.00	-3,613.48
EXT-067	Reparación de entramado de madera de 0.50 x 0.60 mts a base de pino de 2" x 3/8" con tabillas a cada 0.20 mts, incluye: pintura, material, mano de obra, instalación, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,052.26	\$0.00	7.00	21,365.82	-7.00	7.00	21,365.82	-7.00	-21,365.82
EXT-068	Trabajos en Ventana VA-03 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior, suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,169.69	\$0.00	1.00	4,169.69	-1.00	1.00	4,169.69	-1.00	-4,169.69
EXT-069	Trabajos en ventana VA-04 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,088.82	\$0.00	1.00	4,088.82	-1.00	1.00	4,088.82	-1.00	-4,088.82
EXT-070	Trabajos en Puerta PA-05 de 1.40 x 2.5 mts a ejecutar, resane y pintura por exterior, suministro e instalación de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 9,103.62	\$0.00	1.00	9,103.62	-1.00	1.00	9,103.62	-1.00	-9,103.62
EXT-071	Trabajos en Puerta PA-06 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, instalación de guardapolvo de madera, instalación de cadena pasador superior, instalación de moldura remate en piso, resane y pintura derivadas de los trabajos anteriormente nombrados y aumento en puerta lateral derecha e instalación de postigos. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 7,017.97	\$0.00	1.00	7,017.97	-1.00	1.00	7,017.97	-1.00	-7,017.97
EXT-072	Trabajos en Puerta PVA-08 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, injerto de puerta despostillada, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas de dichos trabajos, instalación de cadena pasador superior e instalación de pasador inferior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,608.47	\$0.00	1.00	2,608.47	-1.00	1.00	2,608.47	-1.00	-2,608.47
EXT-073	Trabajos en ventana VA-09 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse en ajuste de guardapolvo y de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,676.51	\$0.00	1.00	5,676.51	-1.00	1.00	5,676.51	-1.00	-5,676.51

EXT-074	Trabajos en ventana VA-10 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, instalación de cadena pasador superior y contra chapa postigo izquierdo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,924.74	\$0.00
EXT-075	Trabajos en ventana VA-11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,086.18	\$0.00
EXT-076	Fabricación de ventana VA-12 de 0.60 x 1.10 mts (sección completa de puerta ventana 1.27 x 1.98 mts). Incluye elaboración, entramado, 20 cristales, acabado con pintura para ventana de madera con: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, instalación de pasador inferior, superior, postigos e instalación de cadena pasador superior, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,881.10	\$0.00
EXT-077	Trabajos en ventana VA-13 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y superior e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,086.15	\$0.00
EXT-078	Trabajos en ventana VA-16 1.27 x 1.98 a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,692.57	\$0.00
EXT-079	Trabajos en ventana VA-17 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,560.42	\$0.00
EXT-080	Pintura en puerta de sotano de 0.91 x 2.10 mts y suministro e instalación de Chapa. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,620.85	\$0.00
EXT-081	Trabajos en ventana en ATICO de 1.17 x 1.60 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura total de la piezas. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 6,544.33	\$0.00
EXT-082	Trabajos en ventana respiración en ATICO a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, material, mano de obra, montaje y desmontaje, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,994.31	\$0.00
EXT-083	Pintura en tablero de 1.36 x 1.52 mts en muro interior de madera en SOTANO. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,582.09	\$0.00
EXT-084	Suministro e instalación de tablero liso en closet de 0.51 x 1.37 mts. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,356.41	\$0.00

1.00	4,924.74	-1.00	1.00	4,924.74	-1.00	-4,924.74
1.00	5,086.18	-1.00	1.00	5,086.18	-1.00	-5,086.18
1.00	5,881.10	-1.00	1.00	5,881.10	-1.00	-5,881.10
1.00	5,086.15	-1.00	1.00	5,086.15	-1.00	-5,086.15
1.00	4,692.57	-1.00	1.00	4,692.57	-1.00	-4,692.57
1.00	5,560.42	-1.00	1.00	5,560.42	-1.00	-5,560.42
1.00	3,620.85	-1.00	1.00	3,620.85	-1.00	-3,620.85
7.00	45,810.31	-7.00	7.00	45,810.31	-7.00	-45,810.31
1.00	3,994.31	-1.00	1.00	3,994.31	-1.00	-3,994.31
1.00	2,582.09	-1.00	1.00	2,582.09	-1.00	-2,582.09
1.00	1,356.41	-1.00	1.00	1,356.41	-1.00	-1,356.41



EXT-089	Suministro y colocación de vestidura exterior completa para ventana de baño en planta baja de madera de pino de 1" de 2.80 m, hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,383.92	\$0.00	1.00	1,383.92	-1.00	1.00	1,383.92	-1.00	-1,383.92
EXT-090	Suministro y colocación de cabezal superior para ventana de baño de 0.15 x 0.90 mts, en planta baja de madera pino de 1" de .90 m hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 978.41	\$0.00	1.00	978.41	-1.00	1.00	978.41	-1.00	-978.41
EXT-091	Suministro y colocación de vestidura exterior para ventana en ático y planta alta de madera pino de 1" con dimensión de 1.20, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 970.96	\$0.00	2.00	1,941.92	-2.00	2.00	1,941.92	-2.00	-1,941.92
EXT-092	Suministro y colocación de vestidura exterior para Puerta en planta baja de madera pino de 1" con dimensión de 2.80, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,383.82	\$0.00	1.00	1,383.82	-1.00	1.00	1,383.82	-1.00	-1,383.82
EXT-093	Suministro y colocación de hoja de triplay de pino de 90 x 60 cm de 3/8" para antepecho de puerta en planta baja, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 864.52	\$0.00	1.00	864.52	-1.00	1.00	864.52	-1.00	-864.52
EXT-113	Suministro y colocación de Pasador phillips Zamak de soprano de cuadro para ventana superior, incluye: material, mano de obra, herramienta, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 462.34	\$0.00	30.00	13,870.20	-30.00	30.00	13,870.20	-30.00	-13,870.20
EXT-114	Suministro e instalación de botaguas de 2x2 para puerta ventana de 0.90 mts de largo, incluye: material, mano de obra, detallado de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta-ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 837.87	\$0.00	24.00	20,108.88	-24.00	24.00	20,108.88	-24.00	-20,108.88
EXT-115	Suministro y colocación de pasador retráctil de latón antiguo de 3" lenco modelo 250 en ventana en ático. Incluye: Pasador, mano de obra, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 432.66	\$0.00	2.00	865.32	-2.00	2.00	865.32	-2.00	-865.32
EXT-116	Trabajos en ventana superior de puertas en planta baja de 1.26 x 0.45 mts en ajuste de dimensiones, resana, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye: madera para perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,879.07	\$0.00	13.00	24,427.91	-13.00	13.00	24,427.91	-13.00	-24,427.91
EXT-121	Restauración en balastrada inferior de 0.73 cm consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$ 2,022.28	\$0.00	18.52	37,452.62	-18.52	18.52	37,452.62	-18.52	-37,452.62
EXT-122	Restauración en balastrada superior de 0.81 cm consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$ 2,068.33	\$0.00	25.52	52,783.78	-25.52	25.52	52,783.78	-25.52	-52,783.78
				\$936,102.71		\$838,714.49			\$838,714.49		\$97,388.22
9	HERRERIA										
58	9.1 Reparación de reja del perímetro exterior de hierro forjado. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	1.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
59	9.2 Suministro y colocación de barandal tubular para de 0.90x2.mts encubo de alíco, a base pasamanos tubular mod 160 y cuadrado C150 de 1 1/2" y base de solera de 1 1/2", terminadas en primario color gris Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O.	m	3.00 \$ 4,283.96	\$12,851.88	5.20	22,276.59	-2.20	5.20	22,276.59	-2.20	-9,424.71
60	9.3 Suministro y colocación puerta tipo reja para vano de acceso a solano de 1.36x1.77 mts estilo mismo de las ventanas del solano a base de varilla de 1/2". Incluye mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	1.00 \$ 4,436.34	\$4,436.34	1.00	4,436.34	0.00	1.00	4,436.34	0.00	0.00

61	9.4	Suministro y colocación de barandal tubular en rampa de acceso principal de 0.90 mts de altura, a base pasamanos tubular mod 160 y cuadrado C150 de 1 1/2" y base de solera de 1 1/2", terminadas en primario color gris. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	m	28.00	\$ 2,063.39	\$57,774.92	23.02	47,499.24	4.98	23.02	47,499.24	4.98	10,275.68
62	9.5	Suministro y colocación de barandal tubular para de 0.90x0.9 mts en acceso de servicio en fachada posterior, a base pasamanos tubular mod 160 y cuadrado C150 de 1 1/2" y base de solera de 1 1/2", terminadas en primario color gris. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación bisagras para puerta de 90x90, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 31,540.21	\$31,540.21	1.00	31,540.21	0.00	1.00	31,540.21	0.00	0.00
63	9.6	Desmantelamiento de reja perimetral, con recuperación. Incluye remoción de puntas de maguey, mano de obra, herramienta, retiro de escombros, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	118.05	\$ 255.73	\$30,188.93	127.08	32,498.17	-9.03	127.08	32,498.17	-9.03	-2,309.24
64	9.7	Instalación de reja recuperada. Incluye acabado SANDBLAST, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	118.05	\$ 510.70	\$60,288.13	118.30	60,415.82	-0.25	118.30	60,415.82	-0.25	-127.69
65	9.8	Suministro e instalación de reja tipo luvers a base de ángulo de 1 1/2"x 1 1/2"x 1/4 de pulgada y perfil cuadrado de 3/8" para protección de equipos de climas de 3.9mx1.20 alto con puerta para acceso a mantenimiento incluye material, mano de obra, bisagras, pintura electrosoldada primer color asemejándose la cantera del basamento de la construcción, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 7,165.19	\$7,165.19	1.00	7,165.19	0.00	1.00	7,165.19	0.00	0.00
66	9.9	Suministro e instalación de puerta tipo reja a base de varilla redonda de 1/2" sementa a reja de ventanas de solano para protección de equipo hidroneumático debajo rampa de acceso a edificio de 79x 94cm ver plano H?	pza	1.00	\$ 2,672.56	\$2,672.56	1.00	2,672.56	0.00	1.00	2,672.56	0.00	0.00
67	9.10	Barandal de fierro, de 1.35 x 0.90 mts de altura, acabado con pintura anticorrosiva, color negro en ventanas y puertas. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	32.00	\$ 1,690.00	\$54,080.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	54,080.00
						\$260,998.16		\$208,504.12			\$208,504.12		\$52,494.04
68	10.1	CANCELERIA Suministro y colocación de cancel de 1.00x2.00 mts., en el solano. A base de cristal templado de 9.5 mm de espesor, un fijo y una puerta, acabado con pintura cerámica en color BLANCO. Incluye clip m/v para sujetar fijo (mod. 1144), bisagras m/v (mod. 1036) en puerta y chapa (mod. 1190 y 119000C), ver planos C01, C02, C03, C04. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 15,453.61	\$15,453.61	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	15,453.61
69	10.2	Suministro y colocación de 2 fijos más puerta de 2.02x2.00 mts. en vidrio templado 9.5 mm con pintura cerámica en color blanco, incluye clip m/v para sujetar fijo (mod. 1144), bisagras m/v (mod. 1036) en puerta y chapa (mod. 1190 y 119000C), ver planos C01, C02, C03, C04. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	Lote	1.00	\$ 26,867.42	\$26,867.42	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	26,867.42
70	10.3	Suministro y colocación de cancel fijo, en alíco, fabricado con cristal templado claro de 10 mm de espesor, incluyendo el herraje correspondiente. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	65.00	\$ 4,353.74	\$282,993.10	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	282,993.10
71	10.4	Retiro de cristales de puertas y ventanas de la parte superior con pintura vieja. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	145.00	\$ 127.85	\$18,666.10	275.00	35,158.75	-129.00	275.00	35,158.75	-129.00	-16,492.65
72	10.5	Retiro de cristales de puerta corrediza con pintura vieja. De 24x20m incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	pza	44.00	\$ 95.90	\$4,219.60	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	4,219.60

73	10.6	Retiro de cristales de puerta corrediza de la parte superior de 35x42 con pintura vieja. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P. U. O. T.	pza	4.00 \$	102.27	\$409.08
74	10.7	Suministro y colocación cristales de puerta corrediza con pintura vieja. De .24x.20CM Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P. U. O. T.	pza	44.00 \$	856.03	\$37,665.32
75	10.8	Suministro y colocación de cristales de puerta corrediza de la parte superior de 35x42 con pintura vieja Incluye :material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P. U. O. T.	pza	4.00 \$	1,084.32	\$4,337.28
76	10.9	Suministro e instalación de vidrio de 0.33 x 0.22 con15mm de espesor en ventanas exteriores, incluye, materia, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.O.U.T.	pza	104.00 \$	240.02	\$24,962.08
77	10.10	Suministro e instalación de vidrio de 0.33 x 0.33 con15mm de espesor en ventanas exteriores, incluye, materia, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.O.U.T.	pza	42.00 \$	221.79	\$9,315.18
						\$424,888.77
	11	ILUMINACION				
78	11.1	Suministro y colocación de spot con carcasa y base de conexión para empotrar en plafón, marca YD-360-BMP ALHOGENO , ángulo de 15°, Ip40, diámetro de 90 mm, luz blanca calida. Incluye foco de led 8W ME16 BLANCO materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	41.00 \$	629.83	\$25,823.03
79	11.2	Suministro e instalación de spot empotrado led 4000k blanco A100-240V Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	11.00 \$	568.10	\$6,249.10
80	11.3	Suministro y colocación de tira de led, marca ECOMILED, rollo de 25m, 120 chips 3528 por metro (600 en 5mts), 8w/m máx, 12v DC, blanco calido. Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	m	25.00 \$	1,160.70	\$29,017.50
81	11.4	Suministro e instalación de sopt para colocarse en riel (no lo incluye) modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	29.00 \$	504.85	\$14,640.65
82	11.5	Suministro e instalación de riel de 2mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje en attico .Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00 \$	1,983.99	\$3,967.98
83	11.6	Suministro e instalación de riel de 2mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje en sotano Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	3.00 \$	1,983.99	\$5,951.97
84	11.7	Suministro e instalación de riel de 1.5mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo voltaje en sotano. Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00 \$	1,662.77	\$3,325.54
85	11.8	Suministro e instalación de riel de 1.0mts modelo ALFA A RIELcolor negro L1731-3E5 50 W bajo sotano voltaje Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	4.00 \$	1,117.83	\$4,471.32
86	11.9	Suministro e instalación de reflectores de 10w calido modelo 1673/c marca ADIR en attico .Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	5.00 \$	847.77	\$4,238.85
87	11.10	Suministro e instalación de reflectores de 10w calido modelo 1673/c marca ADIR en terrazas independencia y bolver en .Incluye materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	6.00 \$	847.77	\$5,066.62
88	11.11	Suministro e instalación de apagadores en sotano Incluye materiales cableado ,canaleta metalica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	5.00 \$	1,449.00	\$7,245.00
89	11.12	Suministro e instalación de apagadores en attico Incluye materiales cableado ,canaleta metalica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	4.00 \$	1,449.00	\$5,796.00
						\$115,813.56
12	CLIMAS					

90	12.1	Suministro e instalación de Mini split, marca YORK, 1.5 ton, frío/ calor con bomba de calor, 12 SEER R22 220 volts. Incluye base metálica, carga de gas, interconexiones: eléctricas, dren, pruebas de funcionamiento, suministro e instalación de tuberías de cobre para refrigerante de 1/2", 3/8, aislamiento armalex y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	pza	4.00	\$ 19,941.19	\$79,784.76				1.00	19,941.19	3.00	1.00	19,941.19	3.00	59,823.57
						\$79,784.76					\$19,941.19			\$19,941.19		\$59,823.57
	13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA														
91		VOZ Y DATOS: INCLUYE SERVICIOS DE VOZ/DATOS														
92	13.1	Category 6, RJ45, 8-position, 8-wire universal module Conector RJ45, categoría 6 marca panduit modelo Cj6887G1W	pza	5.00	\$ 249.86	\$1,249.30				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	13.2	Cable UTP Cat 6 marca Panduit modelo PUC6004IGY	rollo	1.00	\$ 8,673.44	\$8,673.44				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8,673.44
94	13.3	Panel de parcheo de 24 puertos categoría 6 marca Panduit modelo DP246887GY	pza	1.00	\$ 5,063.17	\$5,063.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.17
95	13.4	Cable de parcheo categoría 6 marca Panduit modelo UTPSP58BUY	pza	5.00	\$ 309.08	\$1,545.40				0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	1,545.40
96	13.5	Cable de parcheo categoría 6 marca Panduit modelo UTPSP7BUY	pza	5.00	\$ 309.08	\$1,545.40				0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	1,545.40
97	13.6	Placas de dos unidades Lutron modelo CW-2-WH	pza	5.00	\$ 205.47	\$1,027.35				0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	1,027.35
98	13.7	Tubo conduit pared delgada galvanizada (EMT) de 21 mm. Incluye mano de obra, accesorios para su correcta instalación y buen funcionamiento.	tramo	70.00	\$ 105.98	\$7,418.60				0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	7,418.60
99	13.8	Soporte tipo clip para tubo de 21 mm (3/4in) incluye accesorios tornillos, taquetes, pilas todo lo necesario para su correcta instalación	pza	30.00	\$ 233.36	\$7,000.80				0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	7,000.80
100	13.9	Caja Galvanizada de 4" x 4"	pza	5.00	\$ 24.99	\$124.95				0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	124.95
	EXT040.	Suministro e instalación de salida de centro para luminarias en sótano, Incluye materiales cableado, canalleta metálica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza		\$ 689.49	\$0.00				3.00	2,098.47	-3.00	3.00	2,098.47	-3.00	-2,098.47
	EXT-094	Suministro e instalación de base de medición trifásica 7- 100 en murete existente. Incluye: instalación de barra cooperweld para tierra física, cable de tierra, cableado, ranurado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 3,648.24	\$0.00				1.00	3,648.24	-1.00	1.00	3,648.24	-1.00	-3,648.24
	EXT-095	Fabricación, suministro e instalación de gabinete de barras eléctricas para abastecer base de medición, hecha con barra de cobre de 1/4"x1-1/2" pulgadas, incluye: aisladores, zapatas, empotrado en muretes existentes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 6,414.73	\$0.00				1.00	6,414.73	-1.00	1.00	6,414.73	-1.00	-6,414.73
	EXT-096	Suministro e instalación de gabinete de 10x10x70 cms, para interruptor termomagnético nuevo en murete existente, Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza		\$ 1,701.96	\$0.00				1.00	1,701.96	-1.00	1.00	1,701.96	-1.00	-1,701.96
	EXT-097	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x70 amperes, Incluye: interconexión a nueva base de medición, cableado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 3,809.94	\$0.00				2.00	7,619.88	-2.00	2.00	7,619.88	-2.00	-7,619.88
	EXT-098	Ranurado de banqueta y/o muro para preparar ruta de tendido de tubería eléctrica de 2", Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml		\$ 42.74	\$0.00				25.79	1,102.26	-25.79	25.79	1,102.26	-25.79	-1,102.26
	EXT-099	Instalación de tubería eléctrica de 2" de pvc pesado de diámetro desde interruptor termomagnético principal (lim) en murete hasta centro de carga de planta alta, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml		\$ 60.22	\$0.00				32.98	1,986.05	-32.98	32.98	1,986.05	-32.98	-1,986.05
	EXT-100	Manufectura de registro eléctrico de 55 x 55 cms, para cableado de centro de carga en planta baja se detalle con enjarre interior, perfilado y tapa metálica fabricada de acero inoxidable, con ensamble de ángulo de 1/8"x3/4", pintada con esmalte alquidálico en color negro. Incluye: material, mano de obra, herramientas, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 1,474.97	\$0.00				2.00	2,949.94	-2.00	2.00	2,949.94	-2.00	-2,949.94
	EXT-101	Suministro y tendido de cableado eléctrico calibre 2 desde lim principal hasta centro de carga existente ubicado en planta alta del edificio (4 hilos, 3 fases y un neutro) Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$ 132.75	\$0.00				147.92	19,636.38	-147.92	147.92	19,636.38	-147.92	-19,636.38



EXT-102	Suministro y tendido de cableado eléctrico calibre 8 para tierra física desde base de medición nueva, hasta centro de carga existente ubicado en planta alta del edificio. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	32.38	\$0.00
EXT-105	Desmontaje y montaje de piezas de cantera de 0.25 x 0.25 cms debido a transición eléctrica ubicada debajo de escalera de pasillo de servicio. Incluye: Resanado, emboquillado, material, mano de obra, herramienta, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	141.17	\$0.00
EXT-106	Reparación de ranurado de banqueta de 0.12 cms, para preparación de ruta de tendido de tubería eléctrica de 2". Incluye: cemento, colocación de piedras de río, material, mano de obra, herramienta, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	97.73	\$0.00
EXT-107	Suministro e instalación de tubería eléctrica de 2" de conduit pared delgada de diámetro, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	61.89	\$0.00
EXT-108	Verificación al proyecto y a la instalación eléctrica, Incluye: revisión de dos tableros, análisis del proyecto eléctrico y revisión de cumplimiento de la NOM'S aplicables.	pza	\$	11,013.04	\$0.00
EXT-110	Suministro e instalación de gabinete para interruptor termomagnético nuevo en muro de tablaroca existente incluye demolición, sujeción, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$	3,381.69	\$0.00
EXT-111	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x200amperes 600VCA SQUARE D, incluye interconexión a centro de carga existente, cableado calibre 1/0, tubo flexible de 2", tubo de pvc pesado de 2" y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$	13,372.56	\$0.00
EXT-112	Trabajos de entubado de equipo minisplit y tomacorriente de servidor incluye tubería de pvc pesado de 2", caja para registro eléctrico de plástico, cable cal. 12 demolición, conectores, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$	547.16	\$0.00
					\$33,648.41
					\$83,277.64
					\$83,277.64
					\$49,829.23

14	OBRA EXTERIOR				
101	14.1 Limpieza de piso en portico, reparando boquillas dañadas, ver planos A11, A12. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	36.01	\$	186.59
102	14.2 Demolición de banqueta de concreto, ver planos A11, A12. Incluye retiro de material producto de demolición fuera de la obra, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	89.90	\$	193.42
103	14.3 Relleno con caliche compactado al 90% de su psvm. Incluye agua, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m3	63.32	\$	277.64
104	14.4 Suministro y colocación de muro de 0.20 mts. de espesor, a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 mts., asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, en cualquier nivel, ver planos A11, A12. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	31.58	\$	367.30
105	14.5 Suministro y colocación de aplonado en muros a base de mezcla cemento arena 1:5 de 0.02 m. de espesor, acabado fino. Incluye perfilado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	15.79	\$	203.04
106	14.6 Pintura vinil-acrílica en muros exteriores, color blanco, marca Sherwin williams, código 7013, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	15.79	\$	49.78
107	14.7 Suministro y colocación de adoquín de concreto color negro, 0.30x0.30 mts, color según diseño. Incluye ~~cama de arena~~ de 5.00 cms. de espesor, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	89.90	\$	418.39

38.13	1,234.64	-38.13	38.13	1,234.64	-38.13	-1,234.64
6.00	847.02	-6.00	6.00	847.02	-6.00	-847.02
15.23	1,488.42	-15.23	15.23	1,488.42	-15.23	-1,488.42
4.95	306.35	-4.95	4.95	306.35	-4.95	-306.35
1.00	11,013.04	-1.00	1.00	11,013.04	-1.00	-11,013.04
2.00	6,763.38	-2.00	2.00	6,763.38	-2.00	-6,763.38
1.00	13,372.56	-1.00	1.00	13,372.56	-1.00	-13,372.56
2.00	1,094.32	-2.00	2.00	1,094.32	-2.00	-1,094.32
61.84	11,538.73	-25.83	61.84	11,538.73	-25.83	-4,819.62
54.04	10,452.42	35.86	54.04	10,452.42	35.86	6,936.04
0.00	0.00	63.32	0.00	0.00	63.32	17,580.16
0.00	0.00	31.58	0.00	0.00	31.58	11,599.33
-						
0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	15.79	3,206.00
0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	15.79	786.03
72.83	30,471.34	17.07	72.83	30,471.34	17.07	7,141.92

108	14.8	Revestimiento de perfiles metálicos en pórtico, recubiertos con lamin a base de madera de pino. ver detalle de carpintería de columna de pórtico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación, P. U. O. T.	m2	24.00	\$ 586.47	\$14,075.28	33.57	19,687.80	-9.57	33.57	19,687.80	-9.57	-5,612.52
	EXT001	Suministro y colocación de placa base de 12 x 12 cms para posterior de reja perimetral, incluye barrenación de cantera 15x15x6 cms, placa de 1/4" con 4 anclas a base de varilla No 3, colocación de cemento expansivo sicagROUT, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza		\$ 476.40	\$0.00	28.00	13,339.20	-28.00	28.00	13,339.20	-28.00	-13,339.20
	EXT002	Aplicación de pintura en reja perimetral, incluye primario gris y terminado a base de pintura color y línea autorizada por supervisión, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$ 217.70	\$0.00	116.78	25,423.00	-116.78	116.78	25,423.00	-116.78	-25,423.00
	EXT003	Restauración de cantera de remate, en rodapié de reja perimetral con un desarrollo (huella y peraltes) de 0.70 m, a base de polvo de cantera y cementantes, incluye limpieza de la cantera con cardas y lijas, color imitación cantera, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$ 385.66	\$0.00	74.86	28,870.50	-74.86	74.86	28,870.50	-74.86	-28,870.50
	EXT004	Repellado de rodapié a base de mezcla cemento-arena 1:4 y terminado fino con estuco CREST color beige, incluye malla poliera, pernos para fijación de malla, martillado de repellado actual para garantizar fijación, sica látex, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$ 296.90	\$0.00	52.40	15,557.56	-52.40	52.40	15,557.56	-52.40	-15,557.56
	EXT005	Aplicación de pintura en barandal de acceso principal, con 0.90 m de altura, pintura color y línea autorizada por supervisión, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$ 235.60	\$0.00	25.20	5,937.12	-25.20	25.20	5,937.12	-25.20	-5,937.12
	EXT006	Aplicación de pintura en barandal de acceso a servicio, con 0.90 de altura pintura color y línea autorizada por supervisión, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$ 235.60	\$0.00	8.91	2,099.19	-8.91	8.91	2,099.19	-8.91	-2,099.19
	EXT009	Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.10 m de espesor, acabado escobillado, en área de acceso de servicio, reforzado con malla electro soldada calibre 6-6/10-10, incluye m.o, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$ 250.86	\$0.00	1.95	489.17	-1.95	1.95	489.17	-1.95	-489.17
	EXT013	Excavación por medios manuales en material tipo B en área de banqueta perimetral, incluye: retiro del material y acarreo al banco de desperdicio que elija el contratista y autorizado por la DDUE.	m3		\$ 274.51	\$0.00	5.93	1,627.84	-5.93	5.93	1,627.84	-5.93	-1,627.84
	EXT014	Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.07 m de espesor, acabado fleteado, en área de banqueta perimetral, para recibir adoquín de concreto negro, incluye m.o, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$ 192.76	\$0.00	46.94	9,048.15	-46.94	46.94	9,048.15	-46.94	-9,048.15
	EXT015	Afine de terreno natural en superficie de banqueta perimetral, incluye m.o, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		\$ 16.50	\$0.00	46.94	774.51	-46.94	46.94	774.51	-46.94	-774.51
	EXT017	Guarnición de concreto de 0.10 ancho x 0.20 m de alto en banqueta perimetral, a base de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye vibrado, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml		\$ 120.87	\$0.00	52.43	6,337.21	-52.43	52.43	6,337.21	-52.43	-6,337.21
	EXT019	Desconexión y conexión de reflector existente debido a demolición de banqueta, incluye m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 699.13	\$0.00	1.00	699.13	-1.00	1.00	699.13	-1.00	-699.13
	EXT027.	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel, en puerta tipo reja a base de varilla redonda de 1/2" de 1.80 x 1.20 mts, semejante a reja de ventanas de sótano para protección de equipo hidroneumático debajo rampa de acceso a edificio, incluye: primario estructural gris, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 586.35	\$0.00	1.00	586.35	-1.00	1.00	586.35	-1.00	-586.35
	EXT028.	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel en puerta tipo reja para vano de acceso a sótano estilo mismo de las ventanas del sótano a base de varilla de 1/2". Incluye mano de obra, primario estructural gris, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza		\$ 586.35	\$0.00	1.00	586.35	-1.00	1.00	586.35	-1.00	-586.35
	EXT029.	Suministro y aplicación de pintura mca OSEL calidad Oro en reja perimetral, color autorizado por la supervisión, incluye materiales, m.o, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$ 150.02	\$0.00	94.50	14,176.89	-94.50	94.50	14,176.89	-94.50	-14,176.89
	EXT030.	Restauración de molduras especiales en reja perimetral, incluye: herramienta, pintura, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza		\$ 190.32	\$0.00	51.00	9,706.32	-51.00	51.00	9,706.32	-51.00	-9,706.32

	EXT039	Colocación de adoquín triturado en área de jardines, incluye cortes, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución 20 cm de ancho	ml	\$ 126.68	\$0.00	45.13	5,717.06	-45.13	5,717.06	-45.13	-5,717.06
	EXT043	Suministro e instalación de piezas faltantes de cantera en fachada para rodapié exterior en segundo nivel en formato 15 x 30 x 2 cm de espesor adherida con pegazulejo, chafán y limpieza incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	\$ 899.67	\$0.00	6.00	5,398.02	-6.00	5,398.02	-6.00	-5,398.02
	EXT045	Cimentación para basamento de monumento con excavación de 1.00 x 1.00 x 0.60 mts, zapata de 0.80 x 0.80 x 0.20 mts de concreto F'c=250 kg/cm2, armado con vr #3 @0.20mts en ambos sentidos, sonotubo de 0.61 mts de diámetro con concreto F'c=250 kg/cm2, con armex de 4 puntos. Incluye: acabado con polvo de cantera, material, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, acarreo de residuos fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,191.85	\$0.00	1.00	3,191.85	-1.00	3,191.85	-1.00	-3,191.85
	EXT-085	Detallado, lijado en muro de ladrillo en fachada. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	\$ 23.30	\$0.00	162.13	3,777.62	-162.13	3,777.62	-162.13	-3,777.62
	EXT-086	Limpieza en dintel de cantera de 1.40 x 0.55 mts. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 90.11	\$0.00	34.00	3,063.74	-34.00	3,063.74	-34.00	-3,063.74
	EXT-087	Suministro e instalación de sello de penetración de polímeros de uretano base agua en adoquín, se aplicaran tres capas de sello. Incluye: material, mano de obra, herramienta, lavado de adoquín y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	\$ 186.86	\$0.00	92.81	17,342.47	-92.81	17,342.47	-92.81	-17,342.47
	EXT-088	Retiro de escombros, en camión fuera de la obra. Incluye: carga de material, traslado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	\$ 123.55	\$0.00	21.00	2,594.55	-21.00	2,594.55	-21.00	-2,594.55
	EXT-117	Suministro y colocación de placa de bronce fundida en basidor de acero al carbón, y plintada para descripción de datos importantes del general Toribio Ortega al calce de la pieza de bronce. Incluye: accesorios de fijación, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 8,124.57	\$0.00	1.00	8,124.57	-1.00	8,124.57	-1.00	-8,124.57
					\$108,967.63		\$256,618.66		\$256,618.66		-\$147,651.03
	109	JARDINERIA 15.1 Suministro e instalación de Encino siempre verde.	pza	2.00 \$ 4,566.02	\$9,132.04	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9,132.04
	110	Suministro e instalación de Encino maple red	pza	1.00 \$ 4,566.02	\$4,566.02	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,566.02
	111	Suministro e instalación de Crespon Bashams party pink	pza	3.00 \$ 5,119.13	\$15,357.39	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15,357.39
	112	Suministro e instalación de pasto San Agustín primera calidad.	m2	140.00 \$ 156.26	\$21,876.40	113.38	17,716.76	26.62	113.38	17,716.76	26.62
	113	Suministro e instalación de arbutos	pza	120.00 \$ 115.20	\$13,824.00	63.00	7,257.60	57.00	63.00	7,257.60	57.00
	114	Máculas de acero de 60cm de diámetro y 100cm de altura	pza	3.00 \$ 7,397.81	\$22,193.43	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	22,193.43
	115	Suministro y colocación de rodapié de 0.20 mts. de espesor y 0.80 mts de altura, a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 mts., asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, en cualquier nivel, ver planos A11, A12, tapa de concreto de 5 cms de espesor, acabado pulido. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m	100.00 \$ 523.82	\$52,382.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	52,382.00
					\$139,331.26		\$24,974.36		\$24,974.36		\$114,356.92
	16	SISTEMA CONTRA INCENDIO									
	PLANTA BAJA										
	16.1	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00 \$ 4,497.83	\$13,493.49	3.00	13,493.49	0.00	3.00	13,493.49	0.00
	PLANTA ALTA										
	16.2	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00 \$ 4,497.83	\$13,493.49	3.00	13,493.49	0.00	3.00	13,493.49	0.00
	ATICO										
	16.3	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00 \$ 4,497.83	\$13,493.49	3.00	13,493.49	0.00	3.00	13,493.49	0.00
	SOTANO										
	16.4	Extintor de 10 Libras de CO2 Marca Badger. Incluye: Suministro e Instalación, Soporte en Muro, Señalización, flete, mano de Obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00 \$ 4,497.83	\$4,497.83	1.00	4,497.83	0.00	1.00	4,497.83	0.00
					\$44,978.30		\$44,978.30		\$44,978.30		\$0.00


zacion, liete, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.						\$44,978.30
---	--	--	--	--	--	-------------

[illegible]


necesario para su correcta ejecución.



EXT013	Excavación por medios manuales en material tipo B en área de banqueta perimetral, incluye: retiro del material y acarreo al banco de desperdicio que elija el contratista y autorizado por la DDUE.	m3	\$ 274.51	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT014	Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.07 m de espesor, acabado floatado, en área de banqueta perimetral, para recibir adquin de concreto negro, incluye m.o, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	\$ 192.76	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT015	Afine de terreno natural en superficie de banqueta perimetral, incluye m.o, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	\$ 16.50	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT016	Suministro e instalación de huella de madera de caoba en escalones acceso a cafetería P.A., con dimensiones de 0.90 m x 0.35 m, incluye materiales, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,285.17	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT017	Guarnición de concreto de 0.10 ancho x 0.20 m de alto en banqueta perimetral, a base de concreto f'c=150kg/cm2, incluye vibrado, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$ 120.87	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT018	Enchapado de peralte de escalones seccion de 0.12 x 1.21 mts, en acceso a cafetería planta alta a base de hoja de triplay de 1/4", incluye: resanes, m.o, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 1,802.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT019	Desconexión y conexión de reflector existente debido a demolición de banqueta, incluye m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 699.13	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT021	Retiro de puerta existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 1,152.21	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT022	Retiro de zócalo existente con recuperación, en planta baja, por colocación de cerámica, incluye recortes, colocación de la misma, m.o y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	\$ 44.42	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT023	Suministro y Colocación de repisón en ventana área de baños planta alta a base de madera de pino de 1.20 x 0.30 mt, incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	pza	\$ 933.55	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT024	Suministro y Colocación de moldura de remate entre loseta cerámica y duela a base de madera de pino de 5" x 2.00 mts de largo, incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,109.11	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT025	Restauración de ventana superior de puertas interiores planta alta de 0.35 x 0.90 mts, incluye: madera para perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, lijado, acabado con pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 926.09	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT026	Suministro y Colocación de perfil mca Yale en puertas planta baja y planta alta, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 836.84	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT027	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel, en puerta tipo reja a base de vanilla redonda de 1/2" de 1.80 x 1.20 mts, semejante a reja de ventanas de sótano para protección de equipo hidráulico debajo rampa de acceso a edificio, incluye: primario estructural gris, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 586.35	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT028	Suministro y aplicación de pintura color blanco mca Osel en puerta tipo reja para vano de acceso a sótano estilo mismo de las ventanas del sótano a base de vanilla de 1/2" . Incluye mano de obra, primario estructural gris, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	\$ 586.35	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT029	Suministro y aplicación de pintura mca OSEL calidad Oro en reja perimetral, color autorizado por la supervisión, incluye materiales, m.o, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	\$ 150.02	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT030	Restauración de molduras especiales en reja perimetral, incluye: herramienta, pintura, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 190.32	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT031	Retiro, traslado, y reubicación a donde lo indique la supervisión de muebles sanitarios, incluye: retiro de 2 sanitarios, 2 mamparas, 2 lavabos (con sus muebles), 1 mingitorio (Planta Baja), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,796.52	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

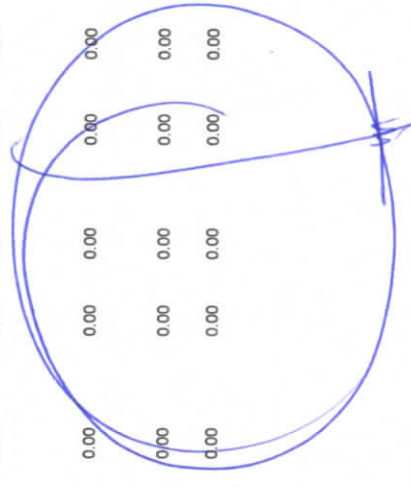


EXT034.	Cancelación de salida hidráulica en baños planta alta. Incluye: material, mano de obra, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	\$ 699.13	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT035.	Salida hidráulica en baños planta alta, a base de tubo plus de 1/2". Incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	\$ 1,032.02	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT036.	Salida hidrosanitaria de 2" baños planta alta a base de PVC y CPVC. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Salida	\$ 1,599.26	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT037.	Colocación de mosaico de cantera con medidas de 0.30x0.30 mts, recuperado y colocado con adhesivo piso sobre piso en área de acceso de servicio. Incluye: resane en áreas necesarias, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	\$ 286.28	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT038.	Restauración de escalones en pórticos de 0.36 x 2.76 mts a base de polvo de cantera y sicalatex. Incluye: resane en áreas requeridas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 549.29	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT039.	Colocación de adoquín triturado en área de jardines, incluye cortes, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución 20 cm de ancho	ml	\$ 126.68	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT040.	Suministro e instalación de salida de centro para luminarias en sótano. Incluye materiales cableado, canaleta metálica abrazaderas de fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	\$ 699.49	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT042.	Suministro e instalación de puerta doble a base de perfil de aluminio natural, con cristal templado de 9 mm, automatizada con sensor de movimiento, medidas de hojas de 1.15 mts x 2.10 mts, ancho total de 2.30 mts. Incluye: material, mano de obra de instalación de puerta, m.o de instalación de sensor, instalación eléctrica y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 176,598.67	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT043.	Suministro e instalación de piezas faltantes de cantera en fachada para rodapié exterior en segundo nivel en formato 15 x 30 x 2 cm de espesor adherida con pegazulejo, chafán y limpieza incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	\$ 899.67	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT045	Cimentación para basamento de monumento con excavación de 1.00 x 1.00 x 0.60 mts, zapala de 0.80 x 0.80 x 0.20 mts de concreto F'c=250 kg/cm2, armado con vr #3 @0.20mts en ambos sentidos, sonolubo de 0.61 mts de diámetro con concreto F'c=250 kg/cm2, con armex de 4 puntos. Incluye: acabado con polvo de cantera, material, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, acarreo de residuos fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,191.85	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT050	Suministro e instalación de Gabinete para lavabo de 97 x 55 cm SIENNA Sencillo chocolate. Incluye: montaje, equipo, herramienta, fijación, mano de obra y todo lo necesario a su correcta ejecución.	pza	\$ 3,488.28	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT051	Restauración de còset en baños planta alta. Secciones de puertas de 0.45 x 1.82 (2 pzas), 0.45 x 0.62 (2 pzas), entrapaños (2 pzas), Incluye: resane, cepillado, lijado, detallado, pintura, herrajes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,145.27	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-052	Trabajos en puerta P-1 y P-2 a ejecutar en ajuste de dimensiones (1.90 x 2.60 aprox) , resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro e instalación de cerrojo con llave. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 6,643.85	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-053	Trabajos en ventana VA2 de 1.40 x 2.50 mts. consistentes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado, pintura derivadas del ajuste, contra chapa superior, contra chapa de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,974.68	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

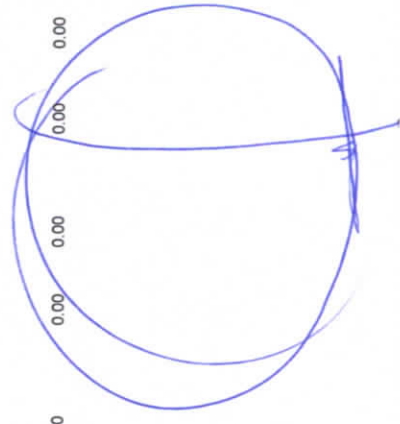

EXT-054	Trabajos en puerta PV-3 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior, suministro y fabricación de durmiente. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,335.03	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-055	Trabajos en puerta PV-4 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, resane y reparación de durmiente, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,545.88	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-056	Suministro e instalación de vestidura de 2.37 x 2.20 mts en puerta corrediza, para que no exista juego de la puerta al momento de deslizarse. Incluye: madera de 3" con un ancho de 1/2" en ambos lados de la puerta, lijado, preparación para recibir pintura, pintura, resane, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,041.14	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-057	Trabajos en ventana PV-6 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane inferior de puerta, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 6,184.57	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-058	Trabajos en puerta PV-7 de 1.40 x 2.50 a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación de pasador inferior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,101.65	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-059	Trabajos en puerta PV-8 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado y pintura derivadas del ajuste, aumento de ancho de durmiente, herrajes de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,123.09	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-060	Trabajos en puerta P-9 y P10 de 1.98 x 2.50 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en puertas, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, suministro y colocación de 3 piezas de herrajes inferiores en P10. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,529.65	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-061	Trabajos en Ventana 11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,603.85	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-062	Trabajos en Ventana 12 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,176.02	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-063	Trabajos en Ventana 13 de 1.27 x 1.98 a ejecutar en ajuste de dimensiones y postigo, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior y contra chapa. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,324.98	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-064	Trabajos en Ventana 14 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de chapa, resane y pintura, instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,577.95	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


EXT-066	Trabajos en ventana VA-1 de 1.27 x 1.98 mts, consistentes en ajuste de dimensiones en ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,613.48	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-067	Reparación de entramado de madera de 0.50 x 0.60 mts a base de pino de 2" x 3/8" con tabillas a cada 0.20 mts, incluye: pintura, material, mano de obra, instalación, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,052.26	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-068	Trabajos en Ventana VA-03 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de cadena pasador superior, suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,169.69	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-069	Trabajos en ventana VA-04 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones en postigo, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de cadena pasador superior y suministro e instalación del otro postigo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,088.82	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-070	Trabajos en Puerta PA-05 de 1.40 x 2.5 mts a ejecutar, resane y pintura por exterior, suministro e instalación de postigos e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 9,103.62	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-071	Trabajos en Puerta PA-06 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, instalación de guardapolvo de madera, instalación de cadena pasador superior, instalación de moldura remate en piso, resane y pintura derivadas de los trabajos anteriormente nombrados y aumento en puerta lateral derecha e instalación de postigos. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 7,017.97	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-072	Trabajos en Puerta PVA-08 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse, injerto de puerta despostillada, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas de dichos trabajos, instalación de cadena pasador superior e instalación de pasador inferior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 2,608.47	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-073	Trabajos en Ventana VA-09 de 1.40 x 2.50 mts a ejecutarse en ajuste de guardapolvo y de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,676.51	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-074	Trabajos en ventana VA-10 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, instalación de cadena pasador superior y contra chapa postigo izquierdo. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,924.74	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-075	Trabajos en ventana VA-11 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, pasador postigo e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 5,086.18	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EXT-076	Fabricación de ventana VA-12 de 0.60 x 1.10 mts (sección completa de puerta ventana 1.27 x 1.98 mts). Incluye elaboración, entramado, 20 cristales, acabado con pintura para ventana de madera con; laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, instalación de pasador inferior, superior, postigos e instalación de cadena pasador superior, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 5,881.10	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-077	Trabajos en ventana VA-13 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y superior e instalación de cadena pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 5,086.15	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-078	Trabajos en ventana VA-16 1.27 x 1.98 a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste, instalación de pasador inferior, superior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 4,692.57	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-079	Trabajos en ventana VA-17 de 1.27 x 1.98 mts a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste e instalación de pasador inferior y cadena de pasador superior. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 5,560.42	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-080	Pintura en puerta de sotano de 0.91 x 2.10 mts y suministro e instalación de Chapa. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 3,620.85	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-081	Trabajos en ventana en ATICO de 1.17 x 1.60 mts a ejecutar, en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura total de la piezas. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 6,544.33	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-082	Trabajos en ventana respiración en ATICO a ejecutar en ajuste de dimensiones de ventana, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, material, mano de obra, montaje y desmontaje, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 3,994.31	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-083	Pintura en tablero de 1.36 x 1.52 mts en muro interior de madera en SOTANO. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 2,582.09	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-084	Suministro e instalación de tablero liso en closet de 0.51 x 1.37 mts. Incluye: laca nitrocelulosa L10101, primer PM0010, Esmalte EK0200.30, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 1,356.41	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-085	Detallado, lijado en muro de ladrillo en fachada. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2		\$ 23.30	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-086	Limpieza en dintel de cantera de 1.40 x 0.55 mts. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 90.11	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-087	Suministro e instalación de sello de penetración de polímeros de uretano base agua en adoquín, se aplicaran tres capas de sello. Incluye: material, mano de obra, herramienta, lavado de adoquín y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		\$ 186.86	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-088	Retiro de escombros, en camión fuera de la obra. Incluye: carga de material, traslado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3		\$ 123.55	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-089	Suministro y colocación de vestidura exterior completa para ventana de baño en planta baja de madera de pino de 1" de 2.80 m, hacia pasillo de servicio incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza		\$ 1,383.92	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EXT-090	Suministro y colocación de cabezal superior para ventana de baño de 0.15 x 0.90 mts, en planta baja de madera pino de 1" de .90 m hacia pasillo de servicio Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	978.41	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-091	Suministro y colocación de vestidura exterior para ventana en ático y planta alta de madera pino de 1" con dimensión de 1.20, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	970.96	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-092	Suministro y colocación de vestidura exterior para Puerta en planta baja de madera pino de 1" con dimensión de 2.80, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	1,383.82	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-093	Suministro y colocación de hoja de triplay de pino de 90 x 60 cm de 3/8" para antepecho de puerta en planta baja, incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijaciones, pintura, lijado, resanado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	864.52	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-094	Suministro e instalación de base de medición trifásica 7- 100 en murete existente. Incluye: instalación de barra cooperweld para tierra física, cable de tierra, cableado, ranurado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	3,648.24	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-095	Fabricación, suministro e instalación de gabinete de barras eléctricas para abastecer base de medición, hecha con barra de cobre de 1/4"x1-1/2" pulgadas, incluye: aisladores, zapatas, empotrado en muretes existentes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	6,414.73	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-096	Suministro e instalación de gabinete de 10x10x70 cms. para interruptor termomagnético nuevo en murete existente. Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$	1,701.96	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-097	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x70 amperes. Incluye: interconexión a nueva base de medición, cableado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	3,809.94	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-098	Ranurado de banqueta y/o muro para preparar ruta de tendido de tubería eléctrica de 2", incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	42.74	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-099	Instalación de tubería eléctrica de 2" de pvc pesado de diámetro desde interruptor termomagnético principal (itm) en murete hasta centro de carga de planta alta, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	60.22	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-100	Manufactura de registro eléctrico de 55 x 55 cms, para cableado de centro de carga en planta baja se detalle con enjarra interior, perfilado y tapa metálica fabricada de acero inoxidable, con ensamble de ángulo de 1/8"x3/4", pintada con esmalte alquídico en color negro. Incluye: material, mano de obra, herramientas, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$	1,474.97	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-101	Suministro y tendido de cableado eléctrico calibre 2 desde itm principal hasta centro de carga existente ubicado en planta alta del edificio (4 hilos, 3 fases y un neutro). Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	\$	132.75	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-102	Suministro y tendido de cableado eléctrico calibre 8 para tierra física desde base de medición nueva, hasta centro de carga existente ubicado en planta alta del edificio. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	32.38	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-105	Desmontaje y montaje de piezas de cantera de 0.25 x 0.25 cms debido a transición eléctrica ubicado debajo de escalera de pasillo de servicio . Incluye: Resanado, emboquillado, material, mano de obra, herramienta, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	141.17	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-106	Reparación de ranurado de banqueta de 0.12 cms, para preparación de ruta de tendido de tubería eléctrica de 2". Incluye: cemento, colocación de piedras de río , material, mano de obra, herramienta, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$	97.73	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

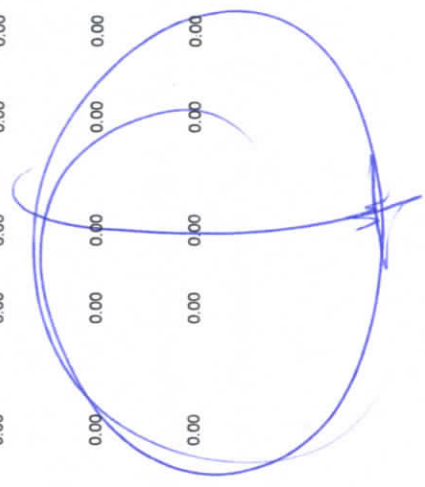

EXT-107	Suministro e instalación de tubería eléctrica de 2" de conduit pared delgada de diámetro , incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$ 61.89	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-108	Verificación al proyecto y a la instalación eléctrica. Incluye: revisión de dos tableros, análisis del proyecto eléctrico y revisión de cumplimiento de la NOM'S aplicables.	pza	\$ 11,013.04	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-109	Suministro e instalación de despachador de toalla interoblada transparente. Incluye: mano de obra, elementos de fijación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 578.19	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-110	Suministro e instalación de gabinete para interruptor termomagnético nuevo en muro de tablaroca existente incluye demolición, sujeción, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 3,381.69	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-111	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x200amperes 600VCA SQUARE D, incluye interconexión a centro de carga existente, cableado calibre 1/0, tubo flexible de 2", tubo de pvc pesado de 2" y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 13,372.56	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-112	Trabajos de entubado de equipo minisplit y tomacorriente de servidor incluye tubería de pvc pesado de 2", caja para registro eléctrico de plástico, cable cal. 12 demolición, conectores, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	\$ 547.16	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-113	Suministro y colocación de Pasador phillips Zamak de soprano de cuadro para ventana superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 462.34	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-114	Suministro e instalación de botaguas de 2x2 para puerta ventana de 0.90 mts de largo, incluye: material, mano de obra, detallado de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta-ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 837.87	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-115	Suministro y colocación de pasador retráctil de latón antiguo de 3" tenco modelo 250 en ventana en álito. Incluye: Pasador, mano de obra, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 432.66	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-116	Trabajos en ventana superior de puertas en planta baja de 1.26 x 0.45 mts en ajuste de dimensiones, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye: madera para perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 1,879.07	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-117	Suministro y colocación de placa de bronce fundida en bastidor de acero al carbón, y pintada para descripción de datos importantes del general Toribio Ortega al calce de la pieza de bronce. Incluye: accesorios de fijación, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 8,124.57	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-118	Suministro y colocación de sanitario color blanco venus castel eco blanco. Incluye asiento, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pilas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	\$ 3,640.95	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-119	Suministro y colocación de lavabo barbaños rectangular blanco. Incluye llave monomando oslo alta cromo pulido, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, pilas, conectores de hule, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	\$ 4,738.74	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-120	Suministro y colocación de mingitorio en seco, Gobi TDS B. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	\$ 7,246.64	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-121	Reaustación en balaustrada inferior de 0.73 cm consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$ 2,022.28	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EXT-122	Restauración en balaustrada superior de 0.81 cm consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	\$ 2,068.33	\$0.00
EXT-123	Suministro e instalación de gabinete de 97x55 cm Siema sencillo color chocolate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 3,153.27	\$0.00
EXT-124	Suministro e instalación de gabinete Coruña 50 Gris/Teka. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$ 4,932.09	\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

1	PRELIMINARES
2	MUROS
3	ACABADOS EN MUROS
4	ACABADOS EN PISOS
5	PLAFONES
6	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO
7	PUERTAS
8	CARPINTERÍA
9	HERRERÍA
10	CANCELERÍA
11	ILUMINACIÓN
12	CLIMAS
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
14	OBRA EXTERIOR
15	JARDINERÍA
16	SISTEMA CONTRA INCENDIO
17	MUSEOGRAFÍA

\$668,351.87
\$34,091.18
\$559,820.61
\$1,186,940.84
\$36,872.61
\$145,116.76
\$205,059.82
\$936,102.71
\$260,998.16
\$424,888.77
\$115,613.56
\$79,764.76
\$33,648.41
\$100,967.63
\$139,331.28
\$44,978.30
\$1,025,108.09

\$16,221.82
\$41,961.71
\$192,041.38
\$233,971.81
\$33,210.41
\$166,797.65
\$373,388.83
\$838,714.49
\$208,504.12
\$91,323.43
\$32,022.77
\$19,941.19
\$83,277.64
\$256,618.66
\$24,974.36
\$44,978.30
\$0.00

\$550,130.05
-\$7,870.53
\$367,779.23
\$952,965.05
\$3,862.20
-\$21,880.89
-\$168,329.01
\$97,388.22
\$52,494.04
\$333,565.34
\$83,790.79
\$59,823.57
-\$49,829.23
-\$147,851.03
\$114,356.92
\$0.00
\$1,025,108.09

SUBTOTAL \$6,003,855.36

IVA \$980,616.86
TOTAL \$6,984,472.22

\$2,657,948.57

\$425,271.75
\$3,083,220.32

\$3,345,906.79

\$635,345.11
\$3,881,251.90

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 035/2016, con un saldo a cancelar de \$3,083,220.32.

POR EL CONTRATISTA

AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. C. GABRIELA FLOREZ HURTADO

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
