

SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

RFC Emisor : VASS7808042RA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PEDRO ROBLES No. Exterior 7116 Colonia INF MEZQUITES Localidad
CHIHUAHUA Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31121

Sucursal- :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Referencia A UN COSTADO DEL PARQUE REVOLUCION Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31150

Folio Fiscal:

E8296F56-C636-42D5-A03B-B17E04EDA163

No de Serie del CSD:

00001000000305985651

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Chihuahua 2017-03-16T10:38:21

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

49 A

Régimen Fiscal:

DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LOTE		RECONSTRUCCION TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN COLONIA NOMBRE DE DIOS	47345.47	47345.47
1	LOTE		ESTIMACION NUMERO 2	0	0.00
1	LOTE		SEGÚN CONTRATO NÚMERO 216/2016	0	0.00
1	LOTE		ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 67,636.39	0	0.00
1	LOTE		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 20,290.92	0	0.00
1	LOTE		RETENCIÓN PACTADAS EN CONTRATO	0	0.00
1	LOTE		I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 135.27	0	0.00
1	LOTE		DER. INSP. Y VIG. DEL 0.5% \$ 338.18	0	0.00
1	LOTE		DIF 0.2% \$ 135.27	0	0.00
1	LOTE		CMIC 0.2% \$ 135.27	0	0.00
1	LOTE		SUMA \$ 743.99	0	0.00
1	LOTE		NETO A RECIBIR \$ 54,176.76	0	0.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: 98 NA

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 47345.47

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 7575.28

TOTAL \$ 54920.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS DE LA AGENCIA

SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

RFC Emisor : VASS7808042RA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PEDRO ROBLES No. Exterior 7116 Colonia INF MEZQUITES Localidad
CHIHUAHUA Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31121

Sucursal :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Referencia A UN COSTADO DEL PARQUE REVOLUCION Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31150

Folio Fiscal:

E8296F56-C636-42D5-A03B-B17E04EDA163

No de Serie del CSD:

00001000000305985651

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Chihuahua 2017-03-16T10:38:21

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

49 A

Régimen Fiscal:

DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Total con letra:

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS, 75/100 MN

Sello digital del CFDI:

GQ0X3jhozJ3U7+U9tTtKc8SA4/LKLSafdmXxb
+RTTTrdoRA0UD/Lrper5ZoGCHtdAFTPOoQ06Pgn9ik4VFjMfWLHxm1584YGVq8aVWMohPBpIjwJkcfmyX BcM60NtdymaaUs9aJihYab/rew3sgfRNuWUhbWQrIjXAg=

Sello del SAT:

MHrtVg1oxWK7UBUsQA4selaoz8zBabe20vupcsBj1st2yZuzaPjbfvM7KYakThixDGWYz014ByTbGPZv6abFKrySkFgb/hunJL
+Q1CDyoynm0eGHPBw2Lb9dGziga299mYRq9YNEN5qFHsai1TYKpUNUK143UGC1ZXnsnbCL55AWNPPWchsPPLMqPzS+CyTOa
+WeV4AmIjvsEIB3P85NPzxOrzSxRV7aBFNxAzpldOaOllqSCsWowpSdsUfrDdmk82uJFTJufNOn8orGDxEbDGHXxuyDOZ/nhkNND/ZfXNVJjm094cWxYdDRWCdux4L5lg7XhAThF2
g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111.01E8296F56-C636-42D5-A03B-B17E04EDA1632017-03-16T10:48:57IGQ0X3jhozJ3U7+U9tTtKc8SA4/LKLSafdmXxb
+RTTTrdoRA0UD/Lrper5ZoGCHtdAFTPOoQ06Pgn9ik4VFjMfWLHxm1584YGVq8aVWMohPBpIjwJkcfmyX BcM60NtdymaaUs9aJihYab/rew3sgfRN
uWUhbWQrIjXAg=00001000000403258748

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-03-16T10:48:57



ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO. A TIENDE A BUALOYIAK
CONCELESA A LOS
A LOS QUE SON DE EL
QUE PARA LOS
INSTANTOS
LOS ESTABLECER
A EL 10 DE MARZO

ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON
RECURSOS PÙBLICOS FEDERALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
VASS7808042RA	SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
E8296F56-C636-42D5-A03B-B17E04EDA163	2017-03-16T10:38:21	2017-03-16T10:48:57	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$54,920.75	ingreso	Vigente	

Imprimir

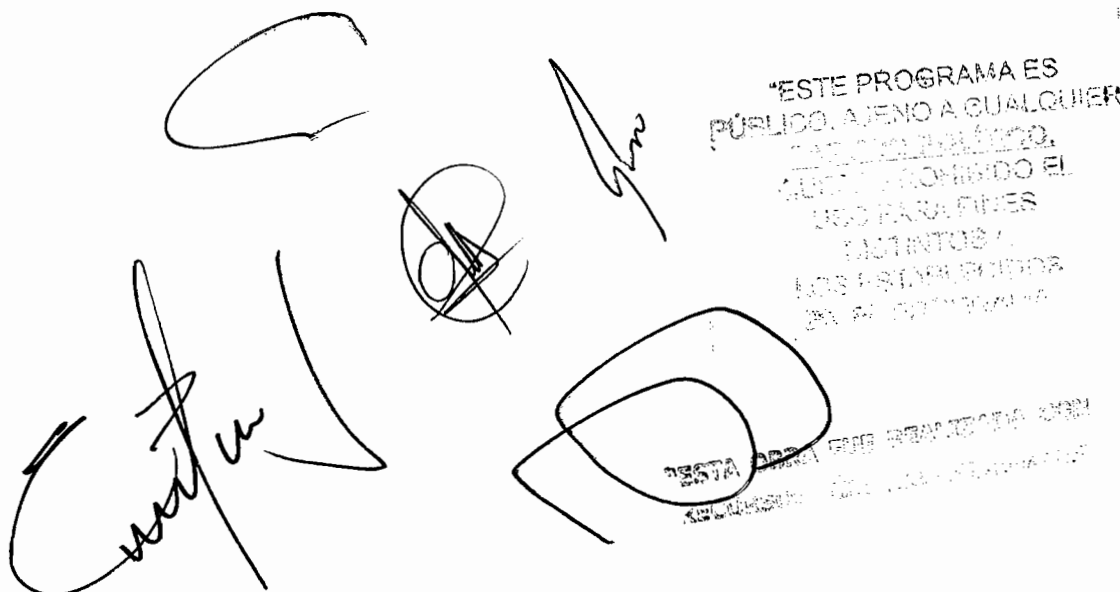

PROGRAMA: FEDERAL	CONTRATO No. 216/2016	CONTRATADOS
OBRA: RECONSTRUCCION TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 700,000.00 CON IVA
REFERENCIA LONG:-106.0784 LAT: 28.6814	PERÍODO EJEC. 15 OCT 2016 - 14 NOV 2016	
UBICACIÓN: COLONIA NOMBRE DE DIOS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 78,458.21 CON IVA
CONTRATISTA: ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 133,609.31 CON IVA
RFC VASS-780804-2RA	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 212,067.52 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 35,982.76	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 31,653.63	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 67,636.39	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 135.27
0.5% INSP. CONTRATOS Y O.P.	\$ 338.18
DIF. 0.2%	135.27
CMIC 0.2%	135.27
SUMA DESCUENTOS	\$ 743.99

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 67,636.39
AMORT ANTICIPO	\$ 20,290.92
SUB-TOTAL	\$ 47,345.47
I.V.A.	\$ 7,575.28
TOTAL	\$ 54,920.75


(CON LETRA)

(CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 743.99
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 54,176.76

AUTORIZO

ELABORO




ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

RESIDENTE D.O.P.M

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.



ING. CARLOS HUMBERTO GABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE PROGRAMA Y / O PROYECTO DE INVERSION , ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO , POR PARTIDO POLITICO ALGUNO , Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA , Y / O PROYECTO DE INVERSION CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS , DE ESTE PROGRAMAY 7 O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA

CHIHUAHUA, CHIH.,

14 de noviembre de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO / DIR. OBRAS PUBLICAS , LA CANTIDAD DE: \$ 54,176.76
(CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PÉOS 76/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 216/201R LA CANTIDAD DE : \$ 700,000.00
SETESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
RECONSTRUCCION TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 67,636.39
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 20,290.92

SUBTOTAL \$ 47,345.47
IVA \$ 7,575.28
TOTAL \$ 54,920.75

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 135.27
DER. INSP. Y VIG. DEL 0.5% 338.18
DIF. 0.2% 135.27
CMIC 0.2% 135.27
SUMA 743.99

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 700,000.00
\$ -
\$ 133,609.31
\$ 78,458.21
\$ 212,067.52
\$ 487,932.48

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ 210,000.00
\$ 40,082.79
\$ 23,537.46
\$ 63,620.25
\$ 146,379.75

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% DER. INSP. Y VIG	DIF. 0.2%	0.2% C.M.I.C.	I.C.I.C. DEL 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 575.90	\$ 230.36	\$ 230.36	230.36
ESTA ESTIMACION	\$ 338.18	\$ 135.27	\$ 135.27	\$ 135.27
ACUMULADO ACTUAL	\$ 914.08	\$ 365.63	\$ 365.63	\$ 365.63

RECIBIMOS

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SÁNCHEZ
VASS-780804-2RA

ESTE PROCESO DE
RECIBIMOS DEL MUNICIPIO
CONTRATO No. 216/201R
LA CANTIDAD DE : \$ 700,000.00
SETESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.
POR TRABAJOS EN LA OBRA:
RECONSTRUCCION TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

ESTA OBRA FUE REALIZADA EN
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO
DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		35,982.76
PRELIMINARES	-38,601.68	
MUROS	0.00	
CUBIERTA	74,584.44	
<u>EXCEDENTES</u>		0.00
MUROS	0.00	
<u>EXTRAS</u>		31,653.63
EXTRAORDINARIOS	31,653.63	

SUBTOTAL 67,636.39

I.V.A. 10,821.82

TOTAL 78,458.21

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, A BIEN PÚBLICO, Y
PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN LA LEY 12345"

"ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

POR EL CONTRATISTA

ARC. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARC. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA:

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

PERIODO: 15 OCT 2016 - 14 NOV 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	
OBRA NORMAL								
PRELIMINARES								
1.7	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INCLUYE DE ARNES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA LINEA DE VIDA DURANTE TODO EL TRASCURSO DE LA OBRA	EQUIPO	0.00	0.00	6.00	-6.00	\$ 1,596.17	-38,601.68
1.8	RENTA DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA ELECTRICA. DURANTE EL PROCESO DE REGISTRO DAIGNÓSTICO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIGAS Y POLINES DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA . INCLUYE TRASLADO, MANTENIMIENTO Y OPERADOR.	MES	0.00	0.00	1.00	-1.00	\$ 19,194.29	-19,194.29
1.11	INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL . INCLUYE CABLE DE ACERO INOXIDABLE , SOPORTES EXTREMOS CON AMORTIGUADOR DE ENERGIA Y TENSOR , SOPORTES INTERMEDIOS Y POLEA DE DOS RUEDAS (PUNTO DE ANCLAJE MOVIL).	PZA	0.00	0.00	1.00	-1.00	\$ 9,830.37	-9,830.37
MUROS								0.00
CUBIERTA								74,584.44
CUBIERTA								
3.1	RETIRO DE LÁMINA GLAVANIZADA DE CUBIERTAS DEL TEMPLO. SE REALIZARA DE MANERA MANUAL DESDE EL EXTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS..	M2	350.00	207.05	44.65	162.60	\$ 8.54	1,387.75
3.2	RETIRO DE TABLETAS DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL DESDE EL EXTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. SE CONTEMPLA EL 100% DE LAS TABLETAS.	M2	350.00	207.05	44.65	162.60	\$ 10.68	1,735.60
3.7	RECUPERACIÓN DE TABLETA INC . LIMPIEZA Y CEPILLADO UNA CARA . APLICACIÓN DE BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA). SE ESTIMA RECUPERAR EL 20%.	PZA	200.00	65.00	25.00	40.00	\$ 60.79	2,431.60
3.11	RECUPERACIÓN DE VIGA CIRCULAR TRIPLE EN LA CUBIERTA. INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN DE 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA). SE ESTIMA RECUPERAR EL 50%.	PZA	4.00	3.00	1.00	2.00	\$ 1,990.18	3,980.32
3.12	SUMINISTRO E IMPREGNACIÓN DE TABLETA INC . APLICACIÓN DE BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 2 MANOS (ACEITE DE LINAZA). INCLUYE DESPERDICIO DEL 10%.	PZA	1,040.00	650.00	350.00	300.00	\$ 107.39	32,217.00
3.21	INSTALACIÓN DE TABLETA DE MADERA EN LA CUBIERTA DEL TEMPLO INC. LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN.	PZA	0.00	0.00	60.00	-50.00	\$ 7.18	-359.00
3.21	INSTALACION DE TABLETA DE MADERA EN LA CUBIERTA DEL TEMPLO. INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU FIJACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,240.00	653.60	0.00	653.60	\$ 60.79	33,191.27
EXCEDENTES								0.00
MUROS								
EXTRAORDINARIOS								
EX-1	REINTEGRACIÓN DE APLANADOS DE MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE EL INTERIOR DE LOS MUROS INTERVENIDOS HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. LA PRIMERA CON UNA PROPORCIÓN 1:3 Y LA SEGUNDA A 1:2. HASTA 8 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	M2	0.00	37.48	0.00	37.48	\$ 224.00	31,653.63 8,395.52
EX-2	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN COLOR BLANCO EN MUROS INTERVENIDOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. SE APLICARA CON BROCHA PARA CAL A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	0.00	74.96	0.00	74.96	\$ 60.17	4,510.34
EX3	DESMONTAJE DE CORTAVIENTOS DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL AYUDADO DE ANDAMIAJE NECESARIO PARA LA ALTURA DE HASTA 15 MTS APROX. DESDE EL INTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	PZA	0.00	12.00	0.00	12.00	\$ 68.41	820.92

POR EL CONTRATISTA

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE PALACIOS

CONTRATISTA:

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

PERIODO: 15 OCT 2016 - 14 NOV 2016

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO		
EX-4	DESMONTAJE DE POLINES SENCILLOS DE MADERA RECTANGULARES DEL CRUCERO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL AYUDADO DE ANDAMIAJE NECESARIO PARA LA ALTURA DE HASTA 15 MTS APROX. DESDE EL INTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	PZA	0.00	12.00	0.00	12.00	\$ 93.63	1,123.56
EX-8	RECUPERACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE LA NAVE A UNA ALTURA DE HASTA 15 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDO (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	PZA	0.00	12.00	0.00	12.00	\$ 232.57	2,790.84
EX-9	RECUPERACIÓN DE POLINES RECTANGULARES DEL CRUCERO A UNA ALTURA DE HASTA 15 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN DE 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDO (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA). MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	PZA	0.00	23.00	0.00	23.00	\$ 241.96	5,565.08
EX-10	INJERTO DE SECCION EN VIGA TRIPLE CIRCULAR Y MONTAJE A UNA ALTURA DE HASTA 15 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS. INCLUYE TORNILLERIA Y PLACAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ 701.23	2,103.69
EX-12	INSTALACIÓN DE POLINES RECTANGULARES DEL CRUCERO HASTA 15 MTS DE ALTURA CON AYUDA DE ANDAMIOS. INC. MENSULAS DE MADERA Y LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	PZA	0.00	12.00	0.00	12.00	\$ 354.36	4,252.32
EX-13	INSTALACIÓN DE CORTAVIENTOS DE MADERA EN LA NAVE Y CRUCERO A UNA ALTURA DE HASTA 15 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.		0.00	12.00	0.00	12.00	\$ 174.28	2,091.36

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE



ESTA OBRA FUE REALIZADA POR RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO



POR EL CONTRATISTA


ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE PALACIOS

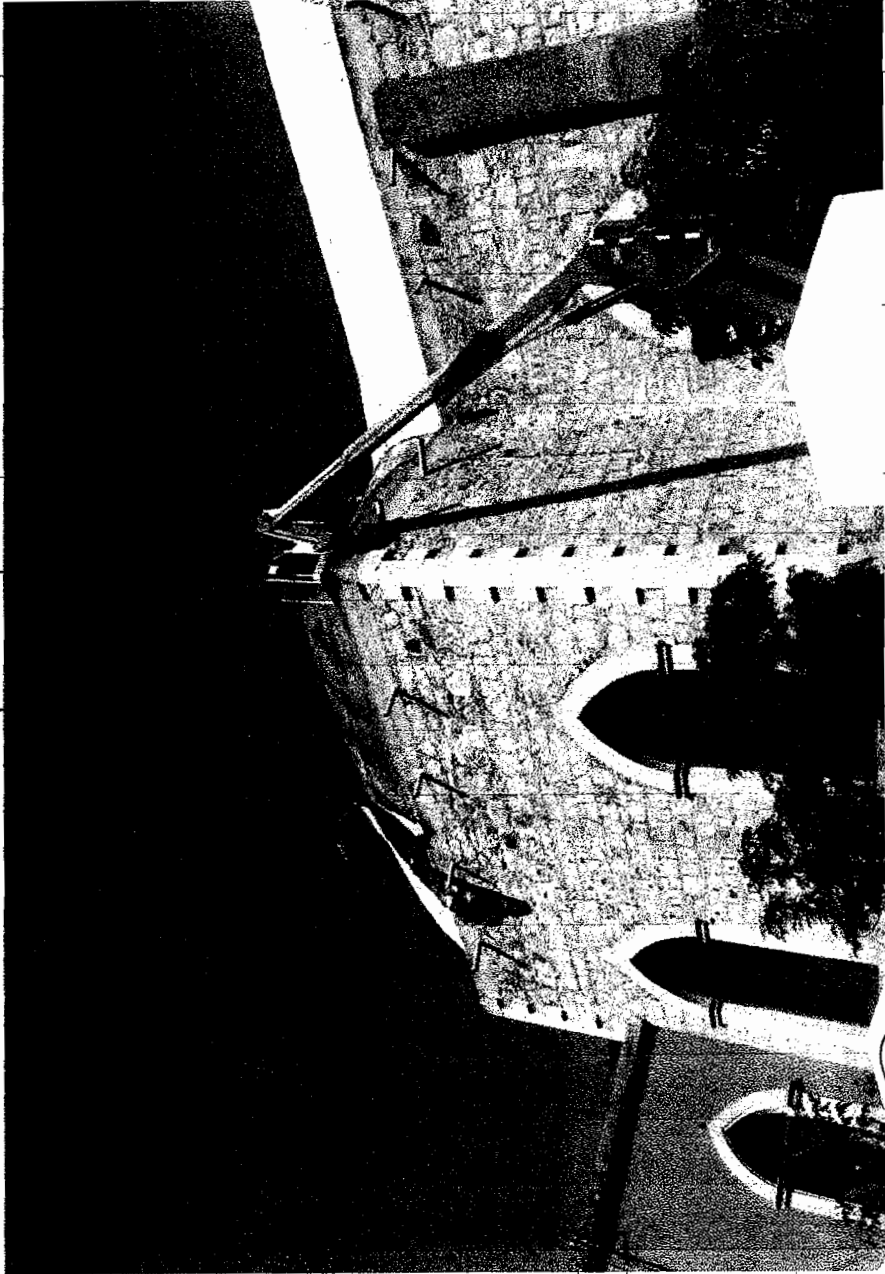504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73										PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: 1 DE 1 FECHA: 08/12/2016											
HOJA GENERADORA																					
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD									
		ESTIMACION 1																			
		PRELIMINARES																			
	1.8	RENTA DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA ELECTRICA. DURANTE EL PROCESO DE REGISTRO, DAIGNOSTICO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIGAS Y POLINES DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO, MANTENIMIENTO Y OPERADOR.	-1.00	-1.0							PZAS	-1.00									
																					

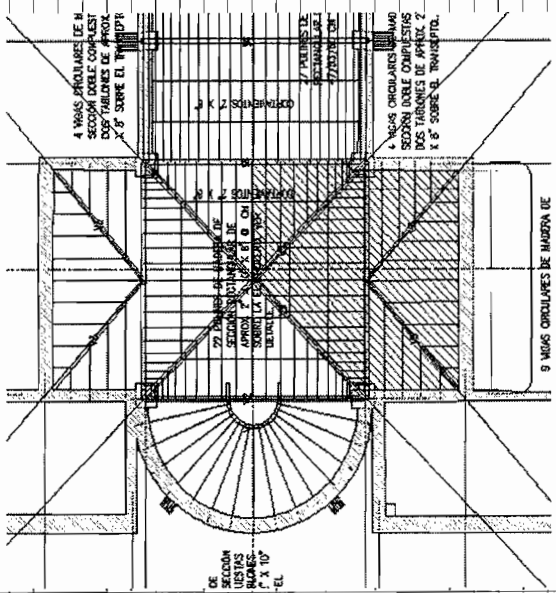504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73				PROYECTO: ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE				SAN JUAN BAUTISTA 1 DE: 2 FECHA: 06/12/2016				504 Arquitectura				
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION				TOTALES		No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura	Pl. 0.5	Profundidad	UNI DAD	CANTIDAD
		ESTIMACION 1														
		CUBIERTA														
3.12		SUMINISTRO E IMPREGNACION DE TABLETA INC. APLICACION DE BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 2 MANOS (ACEITE DE LINAZA). INCLUYE DESPERDICIO DEL 10%.														
		INSTALADAS				300.00		140.0							PZAS	140.00
		PROCESADAS						110.0							PZAS	110.00
		EN PROCESO						50.0							PZAS	50.00
		SUMINISTRADAS														
																
		ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARACTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, Y/O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE														
																
																

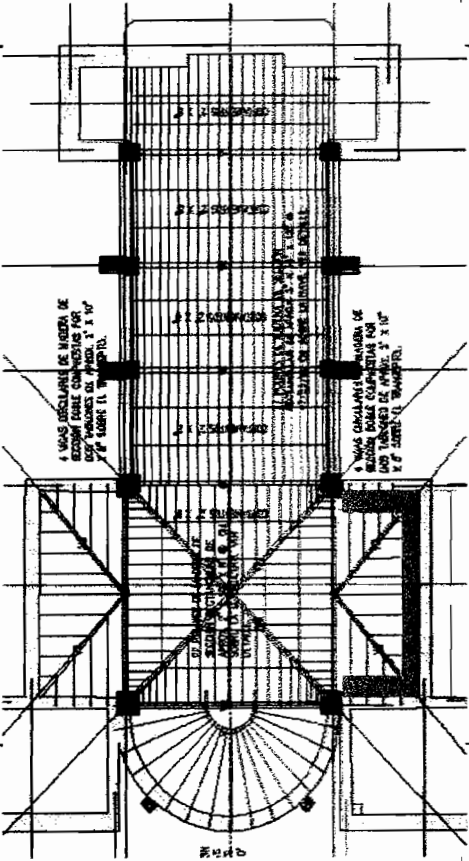504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73 HOJA GENERADORA				PROYECTO: ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: 1 SAN JUAN BAUTISTA 1 DE: 1 FECHA: 06/12/2016				504 1				
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	PI, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD
		ESTIMACION 1										
		CUBIERTA										
	1000/201	INSTALACION DE TABLETA DE MADERA EN LA CUBIERTA DEL TEMPLO INC. LO NECESARIO PARA SU FIJACION.	-50.00	-50.0							PZAS	-50.00
	3.21											
												
												
		ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, Y O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE										

504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73 HOJA GENERADORA		PROYECTO: ESTIMACION No. PARTIDA DE PPTO.: PLANO(S): ELABORO: HOJA:		SAN JUAN BAUTISTA 2 PRELIMINARES ARQ. SERGIO VALVERDE DE: 2 FECHA: 3									
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES		No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profundidad	UNI DAD	CANTIDAD

Confirmar Documento




[Handwritten signature]

ESTEREO
FUALCO A TIGER
2007
QUEDADA PROPIEDAD
USO PARA FINE
DISTINTOS
LOS ESTEREO
EN EL FOTOGRAFIA


604 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73 HOJA GENERADORA		PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: 2 DE: 2 FECHA: 08/12/2016										
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	PI, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD



Confirmar Documento

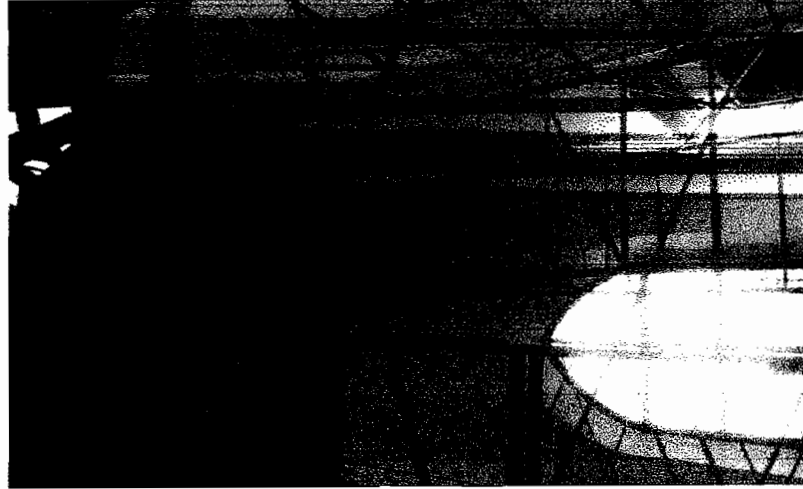

ESTE PROGRAMA DE
 LOS ESTABLECIMIENTOS
 DEL PROGRAMA
 PARA SER REALIZADA CON

504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73				PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: 1 DE: 2 FECHA: 06/12/2016				504 Arquitectura			
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pt, 0.5	Profun- didad	UNI- DAD	CANTIDAD
		ESTIMACION 1									
		CUBIERTA									
EX-3		DESMONTAJE DE CORTAVIENTOS DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO. SE REALIZARA DE MANERA MANUAL AYUDADO DE ANDAMIAJE NECESARIO PARA LA ALTURA DE 13 MTS APROX. DESDE EL INTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS,	12.00	12.0						PZAS	12.00
ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO											

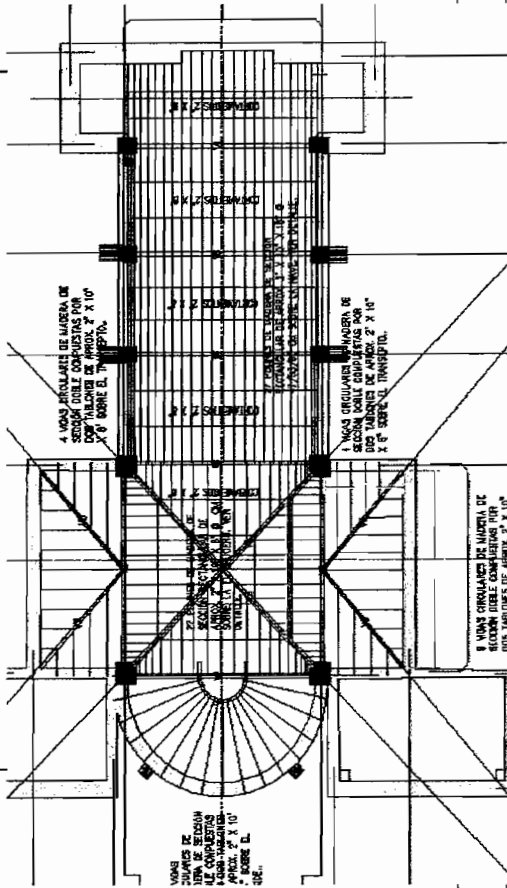504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73				PROYECTO: ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: 1 DE 1				SAN JUAN BAUTISTA 1504			
HOJA GENERADORA				FECHA: 06/12/2016							
CONCEPTO Y LOCALIZACION				TOTALES				UNIDAD			
CLAVE				Var				Radio, base			
No				No Pzas				Long, Base, Diam			
ESTIMACION 1				3				PI, 0.5			
EX-8				12.00				12.00			
CUBIERTA				12.00				PZAS			
RECUPERACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE LA NAVE A UNA ALTURA DE 15' MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE				12.00				12.00			
											

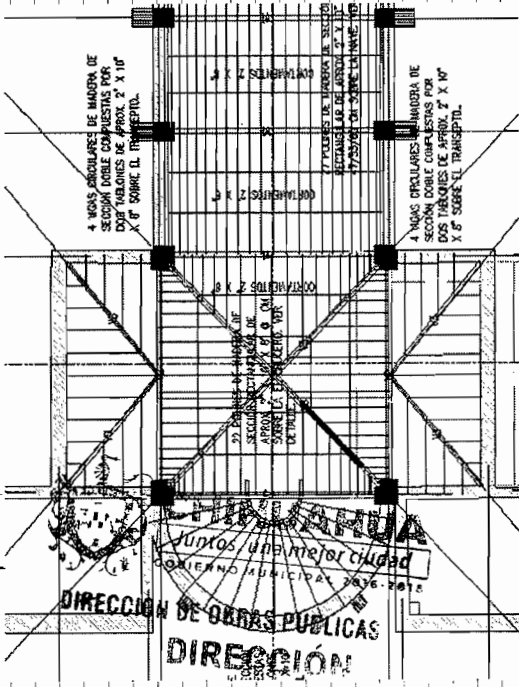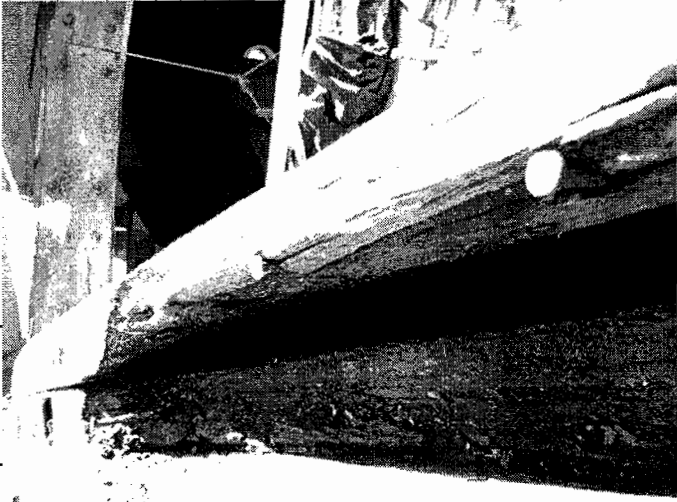504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73 HOJA GENERADORA				PROYECTO: ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ARQ. SERGIO VALVERDE ELABORO: HOJA: 1 DE 2 FECHA: 06/12/2016				SAN JUAN BAUTISTA 			
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	Var No	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura	Pl. 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD
		ESTIMACION 1									
	EX-10	CUBIERTA INJERTO DE SECCION EN VIGA TRIPLE CIRCULAR Y MONTAJE A UNA ALTURA DE 15 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS. INCLUYE TORNILLERIA Y PLACAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE Y RECONSTRUCCION DE BASE CON PIEDRA Y MORTERO DE CAL Y	3.00	3.0						PZAS	3.00
  											
ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO  RECIBIÓ EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA, CHIHUAHUA, EL DIA 12/12/2016 A LAS 10:00 HORAS. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO MUNICIPAL											

504 ARQUITECTURA

PEDRO ROBLES 7116

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

614.4.22.08.73

504

Arquitectura

PROYECTO:

ESTIMACION No. 1

PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES

PLANO(S):

ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE

HOJA: 1

DE: 2

FECHA: 06/12/2016

504 ARQUITECTURA

PEDRO ROBLES 7116

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

614.4.22.08.73

504

Arquitectura

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	Var			Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura	Pl. 0.5	Profundidad	UNI DAD	CANTIDAD
				No Pzas	No	No							
		ESTIMACION 1											
		CUBIERTA											
	EX-12	INSTALACION DE POLINES RECTANGULARES DEL CRUCERO A 17 MTS DE ALTURA CON AYUDA DE ANDAMIOS. INC. MENSULAS DE MADERA Y LO NECESARIO PARA SU FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	12.00	12.0								PZAS	12.00

4 VIGAS CIRCULAR SECCION DOBLE DOS TABLONES X 8" SOBRE EL

22 PUNTES DE MADERA DE SECCION CHIHUAHUA DE APROX 2' X 8" CM SOBRE LA EXISTENTE. VER DETALLE

4 VIGAS CIRCULAR SECCION DOBLE CI DOS TABLONES DE X 8" SOBRE EL TF


CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARACTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO

PRUEBA PARA QUE REALIZADA CON

504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73		PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA 1 PRELIMINARES ARQ. SERGIO VALVERDE DE: 2 FECHA: 06/12/2016		504 Architect	
HOJA GENERADORA		ESTIMACION No. PARTIDA DE PPTO.: PLAN(S): ELABORO:		1 DE: 2 FECHA: 06/12/2016	

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	3					UNI DAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,		
		ESTIMACION 1								
		CUBIERTA								
	EX-13	INSTALACION DE CORTAVIENTOS DE MADERA EN LA NAVE Y CRUCERO A UNA ALTURA DE 13 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	12.00	12.0					PZAS	12.00

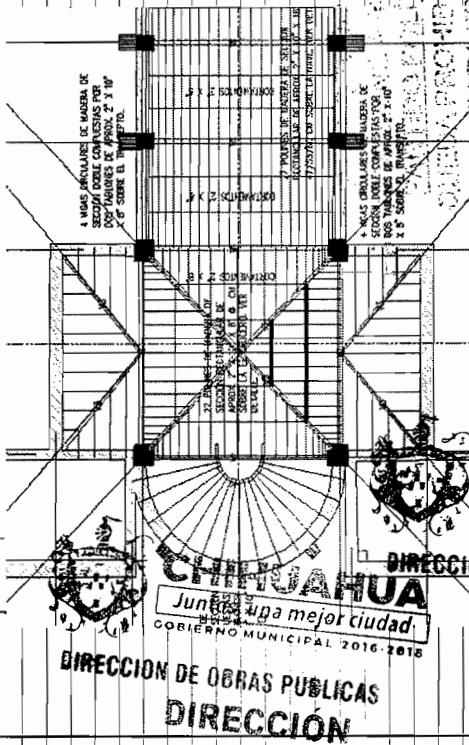

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARACTER PUBLICO NO DESTINADO A FAVOR, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y QUE LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO PARA FAVORECER A PERSONAS O ENTIDADES PARTICULARES.

12-000


CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73		PROYECTO: ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE		SAN JUAN BAUTISTA HOJA: 3 DE: 1 FECHA: 06/12/2016	
---	--	--	--	---	--

HOJA GENERADORA

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	ESTIMACION 1	TOTALES				Var	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura	Pl, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	No	9.88	4.00								
		CUBIERTA													
	WCH	EXT-2	INTEGRACION DE PINTURA A LA CAL EN COLOR BLANCO SOBRE MUROS INTERVENIDOS DEL TEMPLO. SE APLICARA CON BROCHA PARA CAL A DOS MANOS.	74.96	2.0	9.88	4.00							M2	39.52
														M2	35.44

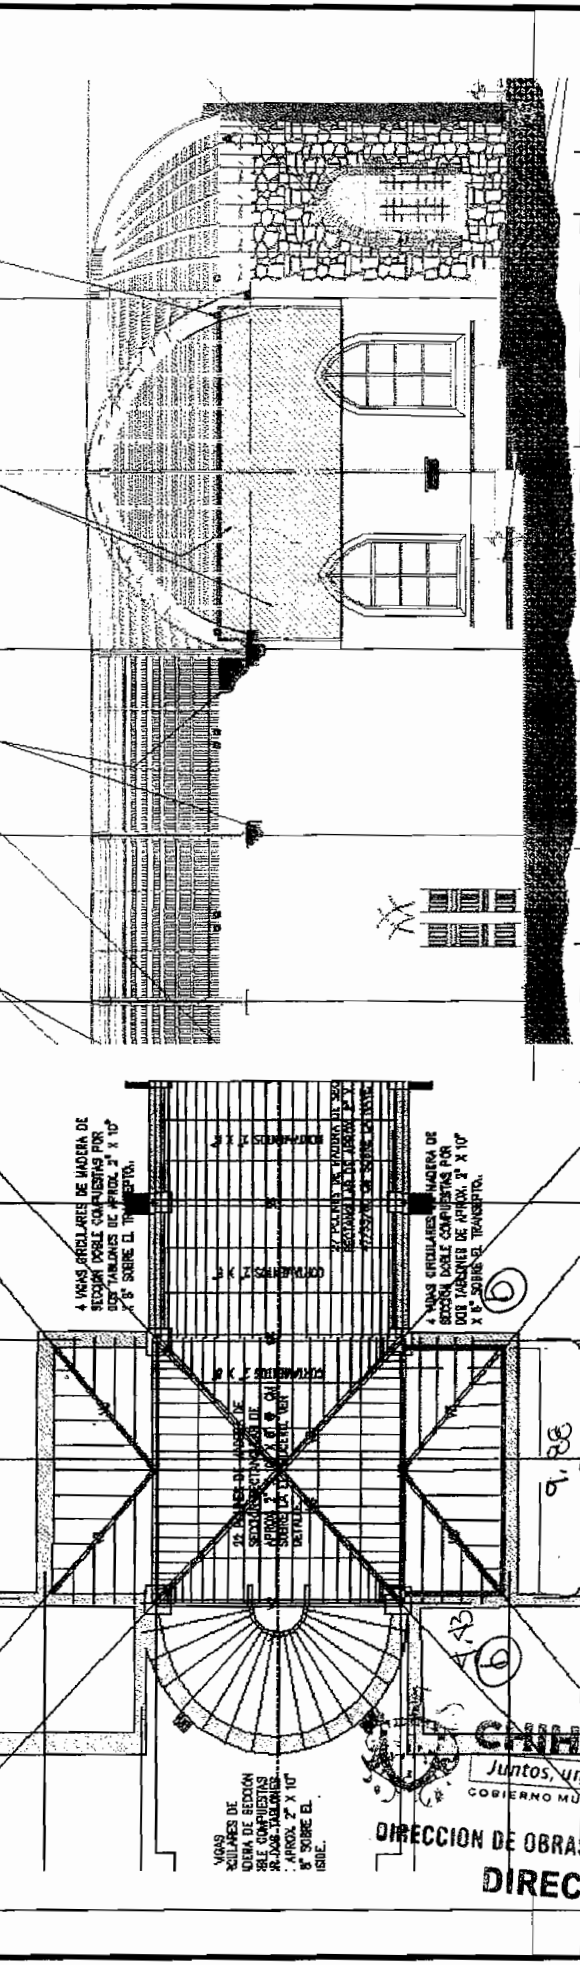

CHIHUAHUA
 Juntos, una mejor ciudad
 GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2013

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION



ESTE PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y NO DE PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO

FECHA DE REVISIÓN: 29-03-2005
 REV. NO.: 3

F.7.4 COS 008

504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73		PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA										
ESTIMACION No. 1		PRELIMINARES										
PLANO(S):		ARQ. SERGIO VALVERDE										
ELABORO:		FECHA: 06/12/2016										
HOJA: 2		DE: 2										
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No. Pzas	Var	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD

Confirmar Documento

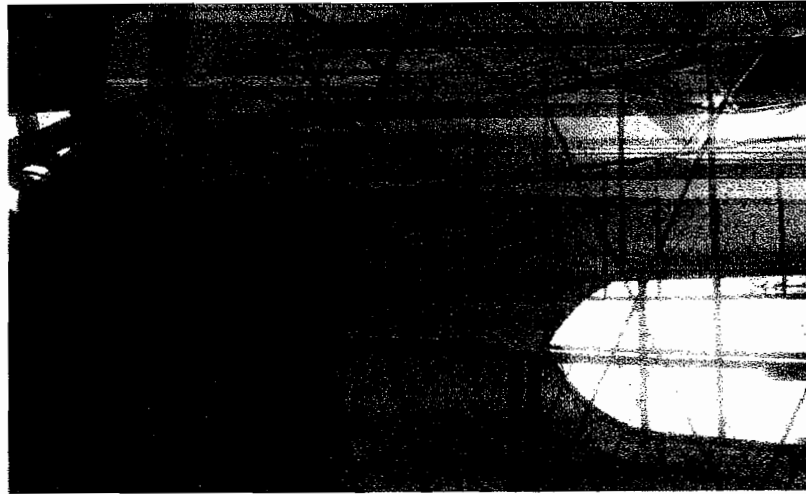

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION


PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA
ESTIMACION No. 1
PLANO(S):
ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE
FECHA: 06/12/2016

PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA
ESTIMACION No. 1
PLANO(S):
ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE
FECHA: 06/12/2016

604 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73		PROYECTO: ESTIMACION No. 2 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: 1 DE 3		SAN JUAN BAUTISTA 2 FECHA:	
---	--	---	--	----------------------------------	--

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profundidad	UNI DAD	CANTIDAD
		ESTIMACION 1										
		CUBIERTA										
WV1	EXT-1	INTEGRACION DE APLANADOS DE MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE EL INTERIOR DE LOS MUROS INTERVENIDOS, LA PRIMERA CON UNA PROPORCION 1:3 Y LA SEGUNDA A 1:2, HASTA 8 M DE ALTURA.	37.48				9.88	2.00			M2	19.76
				2.0			4.43	2.00			M2	17.72

Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO


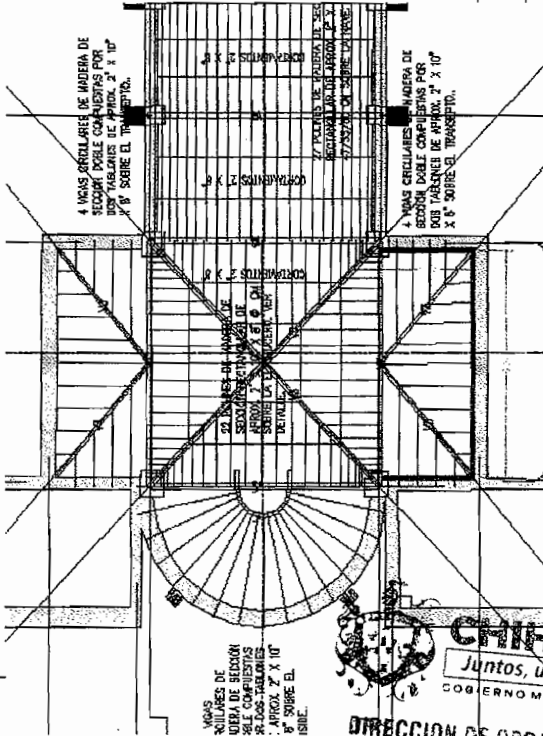


CHIHUAHUA
 Juntos, una mejor ciudad
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION

ESTE PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO

504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73 HOJA GENERADORA				PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA ESTIMACION No. 2 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ARQ. SERGIO VALVERDE ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: 3 DE: 3 FECHA: 3								
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura	Pl, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD



Confirmar Documento

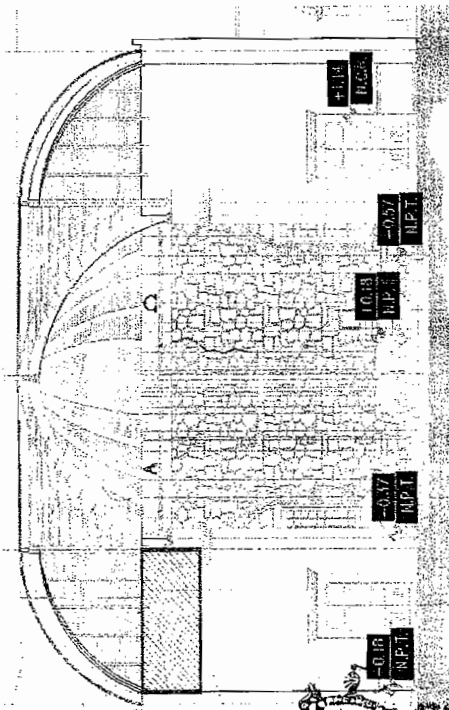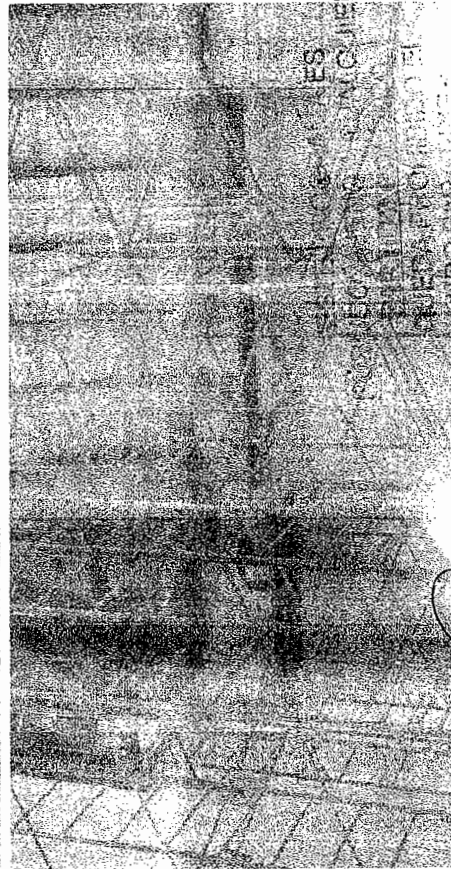

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

Handwritten signature and date: 29-03-2005

Fecha de Rev: 29-03-2005
 Rev. No.: 3

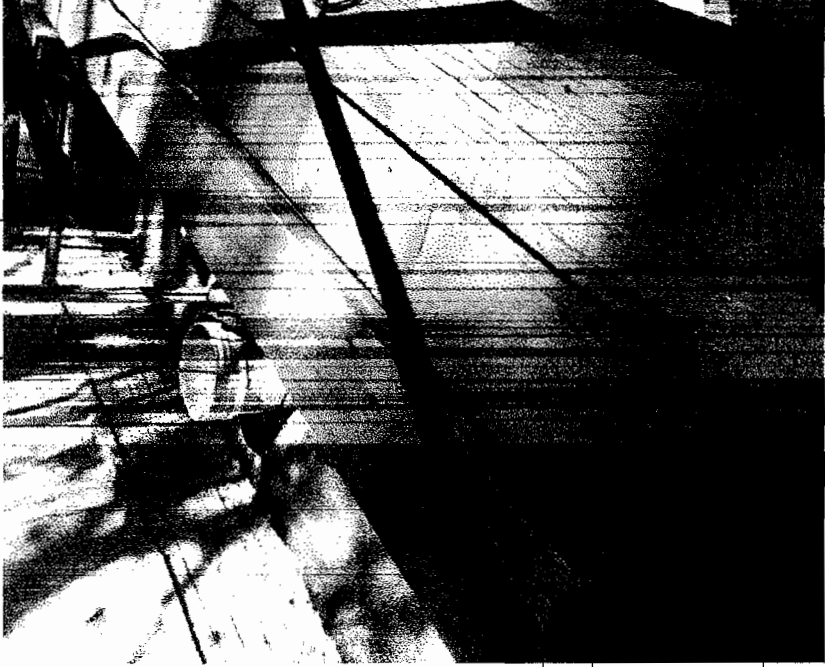504 ARQUITECTURA PEDRO ROBLES 7116 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.4.22.08.73 HOJA GENERADORA										PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA ESTIMACION No. 1 PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES PLANO(S): ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE HOJA: DE: 1 FECHA: 06/12/2016									
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	Var No Pzas	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profun- didad	UNI DAD	CANTIDAD								
		ESTIMACION 1 CUBIERTA																	
	WBA 3.7	RECUPERACIÓN DE TABLETA INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO UNA CARA. APLICACIÓN DE BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA). SE ESTIMA RECUPERAR EL 20%.	40.00	40.0						PZAS	40.00								
																			
																			



SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA OFICIO No. D-4833/2016

10 de Noviembre 2016

ARQ. SERGIO I. VALVERDE SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 08 de Noviembre del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Reconstrucción "Templo San Juan Bautista", en la Col. Nombre de Dios**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato **No. 216/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EX-1	REINTEGRACIÓN DE APLANADOS DE MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE EL INTERIOR DE LOS MUROS INTERVENIDOS HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	15.00	m2	224.00
EXT-2	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN COLOR BLANCO EN MUROS INTERVENIDOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS. SE APLICARA CON BROCHA PARA CAL A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	575.79	m2	60.17
EXT-3	DESMONTAJE DE CORTAVIENTOS DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL AYUDADO DE ANDAMIAJE NECESARIO PARA LA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS APROX. DESDE EL INTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	30.00	pza	68.41



SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA OFICIO No. D-4833/2016

EXT-4	DESMONTAJE DE POLINES SENCILLOS DE MADERA RECTANGULARES DEL CRUCERO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL AYUDADO DE ANDAMIAJE NECESARIO PARA LA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS APROX. DESDE EL INTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	84.00	pza	93.63
EXT-5	DESMONTAJE DE POLINES DE MADERA CIRCULARES DOBLES DEL PRESBITERIO Y LOS BRAZOS, DE MANERA MANUAL DESDE EL INTERIOR CON AYUDA DE ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 15.00 MTS. Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, SE DESMONTARAN LAS VIGAS CON SECCIONES QUE TENGAN DAÑOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	51.00	pza	330.01
EXT-6	RETIRO DE VIGAS CIRCULARES TRIPLES DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO, DE MANERA MANUAL DESDE EL INTERIOR CON ELEVACIONES A BASE DE ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, SE DESMONTARAN LAS VIGAS CON SECCIONES QUE TENGAN DAÑOS ESTRUCTURALES. INCLUYE DEMOLICIÓN EN BASE DE LA COLUMNA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	8.00	pza	689.97
EXT-7	DESMANTELAMIENTO DE TABLETA DE MADERA EXISTENTE EN CUBIERTA DEL TEMPLO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS PARA DESALOJO DE LA MISMA DESDE EL INTERIOR.	350.00	m2	No Procede
EXT-8	RECUPERACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE LA NAVE A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	15.00	pza	232.57
EXT-9	RECUPERACIÓN DE POLINES RECTANGULARES DEL CRUCERO A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN DE 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA). MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	21.00	pza	241.96

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA OFICIO No. D-4833/2016

EXT-10	INJERTO DE SECCION EN VIGA TRIPLE CIRCULAR Y MONTAJE A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS. INCLUYE TORNILLERIA Y PLACAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	4.00	pza	701.23
EXT-11	INJERTO DE SECCION EN POLÍN DOBLE CIRCULAR Y MONTAJE A UNA ALTURA DE 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS. INCLUYE TORNILLERIA Y PLACAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	51.00	pza	321.21
EXT-12	INSTALACIÓN DE POLINES RECTANGULARES DEL CRUCERO HASTA 15.00 MTS DE ALTURA CON AYUDA DE ANDAMIOS. INC. MENSULAS DE MADERA Y LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	84.00	pza	354.36
EXT-13	INSTALACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE MADERA EN LA NAVE Y CRUCERO A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	30.00	pza	174.28
EXT-14	COLOCACION DE TABLETA DE MADERA DE 1"X6" DE DIFERENTES LONGITUDES DE HASTA 8', EN LA CUBIERTA DEL TEMPLO A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, TABLONES DE SEGURIDAD.	1,240.00	pza	No procede
EXT-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO DE SACRIFICIO A BASE DE UNIPLAS APP VG ARENADO 3.00 MM MCA IMPERQUIMIA, PARA RECIBIR SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, EN UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS.	350.00	m2	236.24

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO

\$ 215,707.75 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Arq. Jorge Palacios Ceballos.-Residente de Obra.
C.c.p.- Archivo.

CH/CG/CAG/ELDS/pam* "2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
