

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:




Proporcione los dígitos de la imagen*:



Handwritten signature or mark.

Verificar CFDI

* Datos obligatorios



ESTA VERIFICACIÓN FUE REALIZADA CON REGISTROS FISCLES EN LINEA

RFC del emisor

MOPG641106L62

Nombre o razón social del emisor

Gilberto Ignacio Morales Peña

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

4655F460-FCCA-4713-BE4C-B61107AF229C

Fecha de expedición

2017-11-24T11:54:05

Fecha certificación SAT

2017-11-24T11:59:05

PAC que certificó

FMD100203JSZ

Total del CFDI


\$178,818.38

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente



DIRECCIÓN

Handwritten signature or mark.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL - MUNICIPAL	CONTRATO No. 133/2017	CONTRATADOS
OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 5(CINCO)	\$ 3,703,443.67 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 16/11/2017 AL 23/11/2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 255,454.84 CON IVA
CONTRATISTA: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,684,711.22 CON IVA
RFC MOPG 641106L62	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,940,166.06 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 220,219.69	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 220,219.69

DESCUENTOS		
0.2% DIF		440.44
0.2% C.M.I.C.	\$	440.44
0.5% S.I.V.C.S.		1,101.10
SUMA DESCUENTOS	\$	1,981.98
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	220,219.69
AMORT ANTICIPO	\$	66,065.91
SUB-TOTAL	\$	154,153.78
I.V.A.	\$	24,664.60
TOTAL	\$	178,818.38
(CON LETRA)		
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,981.98
SALDO NETO A RECIBIR	\$	176,836.40

AUTORIZO	ELABORO
ING. VICTOR MIRELES	ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA MUNICIPAL 2016-2018

CHIHUAHUA, CHIH.,

23 de noviembre de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 176,836.40
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 5(CINCO) CONTRATO No. 133/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,703,443.67
(TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 67/100M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 220,219.69
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 66,065.91

SUBTOTAL \$ 154,153.78
IVA \$ 24,664.60
TOTAL \$ 178,818.38

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
DIF DEL 0.2% 440.44
CMIC DEL 0.2% 440.44
S.I.V.C.S. 0.5% 1,101.10

SUMA 1,981.98

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 3,703,443.67
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,684,711.22
ESTA ESTIMACION	\$ 255,454.84
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,940,166.06
POR EJERCER	\$ 1,763,277.61

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,111,033.09
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 505,413.36
ESTA ESTIMACION	\$ 76,636.46
ACUMULADO ACTUAL	\$ 582,049.82
POR AMORTIZAR	\$ 528,983.27

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO


	0.2% DIF	0.2% CMIC	S.I.V.C.S. 0.5%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,904.67	\$ 2,904.67	\$ 7,261.69
ESTA ESTIMACION	\$ 440.44	\$ 440.44	\$ 1,101.10
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3,345.11	\$ 3,345.11	\$ 8,362.79

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

RECIBIMOS

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
MOPG 641106L62



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA

OBRA:

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 133/2017

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

ESTIMACIÓN No. 5(CINCO)

CONTRATIST.ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERÍODO: 16/11/2017 AL 23/11/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

220,219.69

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SUBTOTAL	220,219.69
I.V.A.	35,235.15
TOTAL	255,454.84

POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO I. MORALES PEÑA.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MIRELES

CONTRATISTA:

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERIODO: 16/11/2017 AL 23/11/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								220,219.69
1	DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES							220,219.69
1	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AREAS PARCIALES, INCLUYENDO: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN EL AREA DEFINIDA POR REPONER, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO DE ESCOMBRO, RETIRO EN CASO DE SER NECESARIO DE 25CM DE BASE, COMPACTACION DEL TERRENO EXPUESTO AL 90% PRUEBA PROCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25CM DE BASE MEDIDOS COMPACTOS AL 100% PRUEBA PROCTOR, COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO MR=50KG/CM2 DE 22CM DE ESPESOR.	m2	3,825.00	1,902.99	1,652.43	250.56	790.32	198,022.58
2	EXCAVACION DE CAPA BAJO LA CAPA DE BASE EXISTENTE PARA ALOJAR CAPA FILTRANTE DE PIEDRA, EN ESPESOR VARIABLE INCLUYE CARGA Y ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO	m2	1,915.00	1,902.99	1,652.43	250.56	26.97	6,757.60
3	CAPA FILTRANTE DE PIEDRA DE RIO O TRITURADA DE 3 " DE DIAMETRO MAXIMO Y ESPESOR VARIABLE, EXTENDIDA EN FORMA MANUAL Y ACOMODADA CON RODILLO MECANICO, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, ACARREO, ABUNDAMIENTO, EXTENDIDO MANUAL Y ACOMODO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	1,915.00	1,902.99	1,652.43	250.56	61.62	15,439.51

"ESTA OBRA FUE RELIZADA CON
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MIRELES



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PENA

CALLE ALONDRA # 4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.


GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO
LOCACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16/11/17 A 23/11/17
NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 5 (CINCO)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOSA	TRAMO	CARRIL	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL
1	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo corte con cortadora de disco en el area definida por reponer, demolición de losa de	m2	1-4	4	DER. S-N	17.05	3.49	59.50	250.56
			5-11	4	DER. S-N	31.27	3.50	109.44	
			12-13	4	DER. S-N	10.52	3.50	36.82	
			14-16	4	DER. S-N	12.80	3.50	44.80	
								250.56	

CROQUIS/REFERENCIA

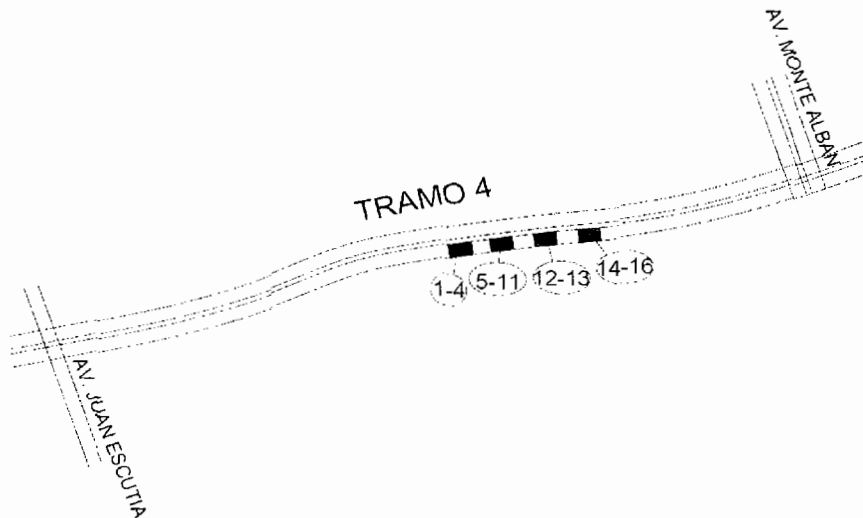

Fernando Carrasco Ortiz
CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZÓ: ING. VICTOR MIRELES

DIRECCION

DE OBRAS PUBLICAS

por ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PENA

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA


OBRA:
LOCACIÓN:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

REHABILITACIÓN CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO
CHIHUAHUA, CHIH.
16/11/17 A 23/11/17
5 (CINCO)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOSA	TRAMO	CARRIL	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL
2	Excavación de capa bajo la capa de base existente para alojar capa filtrante de piedra, en espesor variable incluye carga y acarreo al lugar autorizado	m2	1-4	4	DER. S-N	17.05	3.49	59.50	250.56
			5-11	4	DER. S-N	31.27	3.50	109.44	
			12-13	4	DER. S-N	10.52	3.50	36.82	
			14-16	4	DER. S-N	12.80	3.50	44.80	
								250.56	

CROQUIS/REFERENCIA

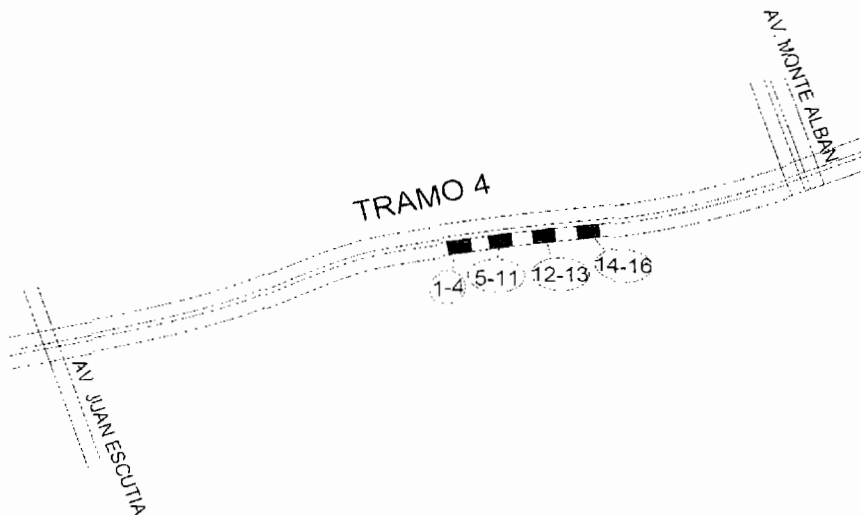

Fernando Carrasco Ortiz
CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

[Signature]
AUTORIZÓ: ING. VICTOR MIRELES



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PENA

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 -CHIHUAHUA, CHIH.

GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA


OBRA:
LOCACIÓN:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO
CHIHUAHUA, CHIH.
16/11/17 A 23/11/17
5 (CINCO)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOSA	TRAMO	CARRIL	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL
3	Capa filtrante de piedra de rio o triturada de 3" de diámetro máximo y espesor variable, extendida en forma manual acomodada con rodillo mecánico, incluye: adquisición,	m2	1-4	4	DER. S-N	17.05	3.49	59.50	250.56
			5-11	4	DER. S-N	31.27	3.50	109.44	
			12-13	4	DER. S-N	10.52	3.50	36.82	
			14-16	4	DER. S-N	12.80	3.50	44.80	
								250.56	

CROQUIS/REFERENCIA

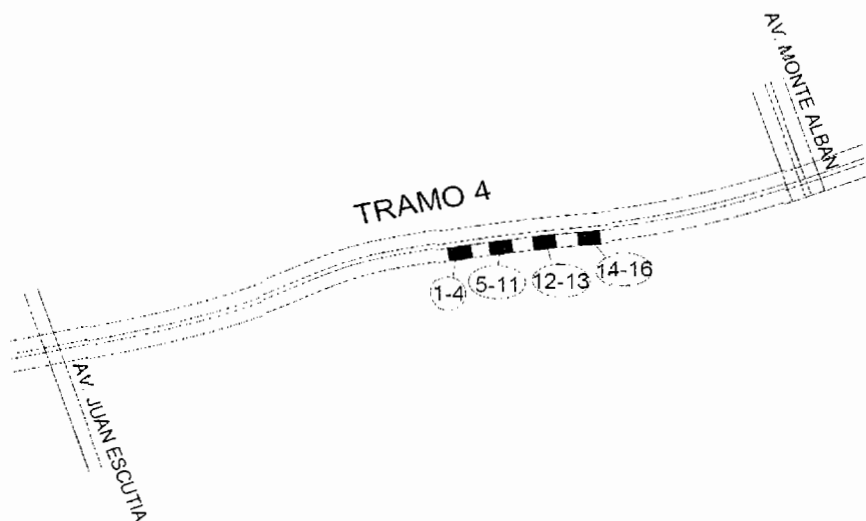

Fernando Carrasco O.

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZO: ING. VICTOR MIRELES



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA


CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACIÓN CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO
LOCACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16/11/17 A 23/11/17
NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 5 (CINCO)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE	CONCEPTO
1	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto incluyendo retiro de escombros, retiro en caso de ser necesario de 25cm de base, compactación del terreno expuesto al 90% prueba proctor, suministro y colocación de 25cm de base medidos compactos al 100% prueba proctor, colocación de losa de concreto MR=50kg/cm2 de 22cm de espesor.

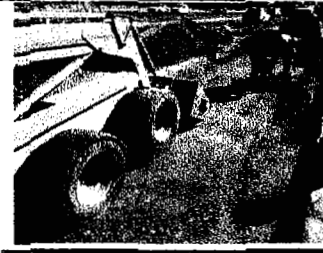

ELABORADO POR: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
CON REVISIÓN DEL: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
FECHA: 23/11/17

REVISADO POR: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
FECHA: 23/11/17
AUTORIZADO POR: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
FECHA: 23/11/17

Fernando Carrasco Ortiz
CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

[Signature]
AUTORIZO: ING. VICTOR MIRELES

CHIHUAHUA
Fuerza y modernidad



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACIÓN CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO
LOCACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16/11/17 A 23/11/17
NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 5 (CINCO)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE	CONCEPTO
2	Excavación de capa bajo la capa de base existente para alojar capa filtrante de piedra, en espesor variable incluye carga y acarreo al lugar autorizado



Fernando Carrasco Ortiz

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZÓ: ING. VICTOR MIRELES



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA


CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACIÓN CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO
LOCACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16/11/17 A 23/11/17
NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 5 (CINCO)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE	CONCEPTO
3	Capa filtrante de piedra de río o triturada de 3" de diámetro máximo y espesor variable, extendida en forma manual acomodada con rodillo mecánico, incluye: adquisición, carga, acarreo, abundamiento, extendido manual y acomodo mecánico y todo lo necesario para su correcta ejecución.

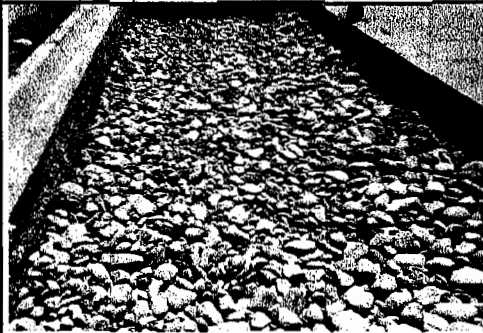

DIRECCION

2018
ad

CHIHUAHUA

Fernando Carrasco O.

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

[Signature]
AUTORIZÓ: ING. VICTOR MIRELES
