

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS. No CONTRATO 0118/2018
OFICIO DE AUTORIZACION No.

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN 48,572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCION CON; BLVD. JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE

MONTO DE CONTRATO: \$24,381,195.43 CON IVA MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.


FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 13 DE AGOSTO 2019
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 13 DE AGOSTO 2019
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:		DICIEMBRE 6.49%			
REAL:		6.00%			
POR PARTIDA		PROGR.	REAL	POR PARTIDA	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13
					14
					15


AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN % 6.0

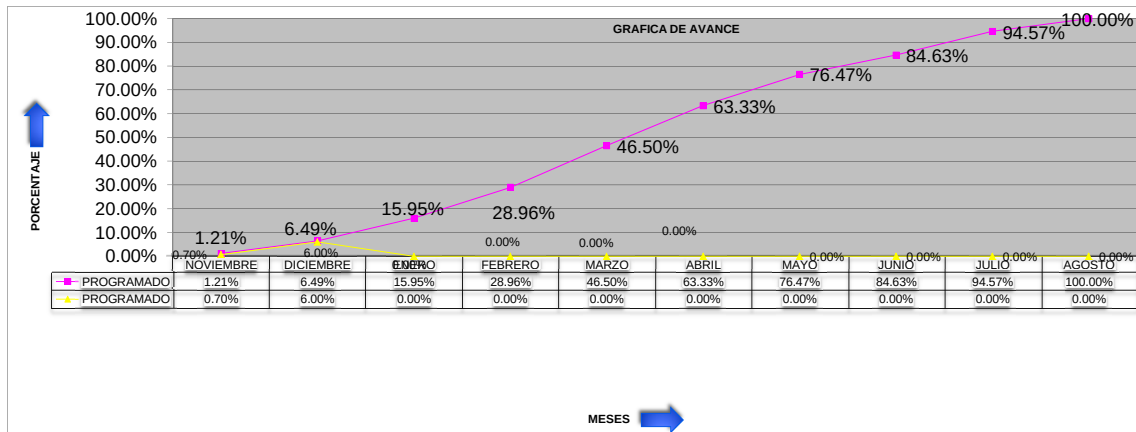

COLADO DE BANQUETAS



ARMADO DE LOSA EN PUENTE



COLADO DE CORONA EN PUENTE



APROCHE EN ESTRIBO IZQUIERDO

