

Factura

FOLIO: 838

FECHA: 27/10/2017 10:32:10

Documento Válido

Expedido en. ESTRADA BOCANEGRA 1702 , SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS
SA DE CV

MET0411185E7 ESTRADA BOCANEGRA No. 1702
SAN FELIPE.
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Régimen Fiscal : General de Ley Personas Morales
601

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408 Teléfono:

Colonia: CENTRO C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA Pais:MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION 8 (OCHO) DEL PERIODO 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 OBRA: Construccion de Gazea en el Periferico de la Juventud y Av. La Cantera CONTRATO No.- 057/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$3,300.958.56 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$6,601.92 0.2% C.M.I.C. \$6,601.92 SUMA DESCUENTOS \$13,203.84 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$3,300,958.56 AMORTIZACION ANTICIPO \$1,320,383.42 DESCUENTOS \$13,203.84 SUB - TOTAL \$1,967,371.30 I.V.A. \$316,892.02 SALDO NETO PARA PAGOS \$2,284,263.32 CON LETRA: (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)	3,300,958.56	3,300,958.56

Importe con letra	
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.	
Información de Pago	
Forma de pago: Otros	Cuenta :
Condiciones :	

SUBTOTAL:	3,300,958.56
DESCUENTOS:	1,320,383.42
I.V.A.:	316,892.02
TOTAL:	2,297,467.16



Este documento es una representación impresa de un CPD

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404399972
Folio fiscal:	67050366-88C6-4719-BE4D-46FAE6920F29
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 27 2017 - 11:32:20

Sello digital del CFDI

RBDNS+M4hQ1xvGpm/Wu2oHm3e/MoeXFBhk+OC9JCcKQXBNESkyKCGTE0A2ZfZgRmUQqdM1BY3KzJf7+1Su
 RRupsnESBmM49EYgJf3hS2Pf1S81XU+xy5ALReH5GKFP0PtIKcAnDUH1Ug7uKv7sewJtH0Y0Yf6XG8TPhOs
 Snp/fF36PfRkXUFE6F5H2GUsPzCaJW9+fqicyU4oK6FWZDwia+0U5Ocm3mSWquaI41bm3n6mPQKfWv50yin
 3nFAc9F5XqB3/Wm4q75LcBzbnadY3z3kLYMEKZCzoaww3UwPaGef2eEMlQoKWhaElbe3m1KfW54Ensdg

Sello del SAT

```

a1vrZ377/5XDC1sCYHrc6f2yDbULaJpDeYg8cMhDscit+g6B13=Jrr2HYQ0mqi5i73lEpiYXv/2hJimo
XUR9H66Gpf09vxd8tTi+eR99PU7kM4JX82kLgHuXTHhLc9bRkGMHhXYiM+QTS5Gq57Vu83QQp92R4c7
57rQT8IPW+BNP5yCze/1h5LdXc09SG8tdgFAK2wn3x8fB12ZC2RyYksM7P004cQCCp749kT/KagpX
SyADPn3J8777LeBl0uDTJCO86L+w0qP6oxZ0qY3k9iZCCCErve7D004NTAGG19EsgA1o0NBEvGhTud
+ftKwZ11rH/e6wtHLYW1Q==

```

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0167050366-86C6-4719-BE4D-46FAE6920F2912017-10-27211:31:20 RBDNS+M4hgixvGcm/

Wu2ohM3e/N6eKFShk+OC9JCcKQCNBNEskykCqTE0A2ZfufgPmCQqnDMIBY3XfJCI7v1SuPRuprsNeSBM
m49EYGjfMSn2Ff1SS1XUvx5yAlNReH50gKRQpTK+CMandU4fuJkvYsevi fTH30Yr6X4GBTPhOsSnb/f
f36PjtRkXKFE6PSHZGuSpcCAjW9+fg1cyU4oKFwZYDwia+OU50rm5SWquaI4lbm5n6Pw2kKfWY50yl
n3pFA2g9f5NgE3/Wm4q75LoBxbnady3zRnLYMEkIZcozawwb3UwPaGe6RfzEMLQcWVhcE1bgjMz3XsV4
iEnsg==00001000000404486074..

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
67050366-88C6- 4719-BE4D- 46FAE6920F29	2017-10- 27T10:32:10	2017-10- 27T11:32:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,297,467.16	ingreso	Vigente	



Imprimir

A large, stylized handwritten signature or stamp.

A smaller handwritten signature or stamp.

A large, stylized handwritten signature or stamp.

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 057/2017	CONTRATADOS
OBRA: Construcción de Gaza en el Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	ESTIMACIÓN No. 8	\$ 69,770,176.67 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
UBICACIÓN: Perif. De la Juventud y Av. La Cantera	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 3,829,111.93 CON IVA
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 40,421,648.85 CON IVA
RFC MET-041118-5E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 44,250,760.78 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMAL</u>	\$ 3,300,614.91	
<u>EXEDENTES</u>	\$ 343.65	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 3,300,958.56

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C \$ 6,601.92
0.2% D.I.F. \$ 6,601.92

SUMA DESCUENTOS \$ 13,203.84

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 3,300,958.56
AMORT ANTICIPO \$ 1,320,383.42
SUB-TOTAL \$ 1,980,575.14
I.V.A. \$ 316,892.02
TOTAL \$ 2,297,467.16

(CON LETRA)

(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

DESCUENTOS \$ 13,203.84
SALDO NETO A RECIBIR \$ 2,284,263.32

AUTORIZO

ELABORO

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE OCTUBRE DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 2,284,263.32
(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 8 CONTRATO No. 057/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 69,770,176.67
SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
Construcción de Gaza en el Periferico de la Juventud y Av. La Cantera

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	3,300,958.56
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	1,320,383.42
	SUBTOTAL	\$	1,980,575.14
	IVA	\$	316,892.02
	TOTAL	\$	2,297,467.16
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$6,601.92		
D.I.F. DEL 0.2%	\$6,601.92		
SUMA	\$13,203.84		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 69,770,176.67
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 40,421,648.85
ESTA ESTIMACION	\$ 3,829,111.93
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 44,250,760.78
POR EJERCER CONVENIO	\$ -
POR EJERCER	\$ 25,519,415.89

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 27,908,070.67
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 16,168,659.52
ESTA ESTIMACION	\$ 1,531,644.76
ACUMULADO ACTUAL	\$ 17,700,304.28
POR AMORTIZAR	\$ 10,207,766.39

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

		0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 69,692.50	\$ 69,692.50
ESTA ESTIMACION	\$ -	\$ 6,601.92	\$ 6,601.92
ACUMULADO ACTUAL	\$ -	\$ 76,294.42	\$ 76,294.42

R E C I B I M O S

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

MET-041118-5B7

OBRA: Construcción de Gaza en el Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

UBICACIÓN Perif. De la Juventud y Av. La Cantera

No. CONTRATO: 057/2017

ESTIMACIÓN No.

8

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

PERÍODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
OBRA NORMAL		3,300,614.91
	OBRAS PRELIMINARES	75.82
	ESTRUCTURAS	3,275,552.95
	TRABAJOS DIVERSOS	24,986.14
OBRA EXCEDENTE		343.65
	OBRAS PRELIMINARES	343.65

SUBTOTAL

3,300,958.56

I.V.A.

528,153.37

TOTAL

3,829,111.93

POR EL CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

OBRA: Construcción de Gaza en el Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

UBICACIÓN: Perif. De la Juventud y Av. La Cantera

No. CONTRATO:

057/2017

ESTIMACIÓN No.

8

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	
OBRA NORMAL								
OBRAS PRELIMINARES								
2	Demolición, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico reforzado. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	130.00	98.50	98.28	0.22	\$344.62	\$75.82
								\$75.82
ESTRUCTURAS								
ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO								
27	Suministro de acero de refuerzo con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm ² para utilizarse en cualquier elemento estructural, puesto en obra por unidad de obra terminada.	kg	276,200.00	258,359.44	248,364.44	9,995.00	\$18.95	\$189,405.25
28	Habilitado y colocación de acero de refuerzo fy= 4200kg/cm ² a base de varillas corrugadas de con un rango de 1 1/2" a 3/8", p.u.o.t. a utilizarse en cualquier elemento estructural incluye: mano de obra, herramienta y equipo, alambre recocido, silletas, amarres, traslapes, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada.	kg	276,200.00	178,223.93	162,427.45	15,796.48	\$6.59	\$104,098.80
MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS								
29	Muro mecánicamente estabilizado, de patente por unidad de obra terminada: incluye: materiales, mano de obra, patente, proyecto y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	630.26	295.87	267.94	27.93	\$1,709.71	\$47,752.20

POR EL CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

OBRA: Construcción de Gaza en el Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

UBICACIÓN: Perif. De la Juventud y Av. La Cantera

No. CONTRATO:

057/2017

ESTIMACIÓN No.

8

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
SUPERESTRUCTURA:								
CONCRETO SUPERESTRUCTURA								
31	Suministro y colocación de concreto hidráulico a cualquier altura, por unidad de obra terminada: Simple, colado en seco en puentes y pasos a desnivel: De $f'c = 280$ Kg/cm ² , utilizado en losas y diafragmas de viga metálica y en viga de concreto, Incluye: materiales, mano de obra, equipo, bombeo, vibrado, desperdicios, obra falsa, cimbra (Aparente) en volados y diafragmas, descimbrados, acabado superficial de losa rayado (terminado rasante), preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, curados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	791.00	84.28	15.99	68.29	\$2,503.78	\$170,983.14
ACERO SUPERESTRUCTURA								
39	Fabricación de elementos estructurales, conforme a proyecto y medido en planos y pesos teóricos: Acero estructural A-709 GRADO 50: utilizado en vigas, contraventeos, diafragmas, (de proyecto) y misceláneos necesarios. Incluye la fabricación completa ó en secciones (además de las conexiones entre partes de las vigas), los acarreo, desperdicios, maniobras, soldadura, placas de conexión, sandblasteo total, primario anticorrosivo y fletes (cargas, descargas, traslados y permisos necesarios) para la puesta de los elementos en obra.	kg	608,300.00	405,065.51	177,675.61	227,389.90	\$9.37	\$2,130,643.36
40	Montaje de elementos estructurales metálicos: vigas cajón, contraventeos, diafragmas y misceláneos necesarios. Incluye maniobras de grúas, transporte, contravientos provisionales para el colado de la losa, andamios u estructuras de obra falsa requeridas para el montaje, fijación y colocación final y todo lo necesario para su correcta instalación (a cualquier altura y terreno).	kg	608,300.00	185,652.77	88,553.38	97,099.39	\$5.44	\$528,220.68
41	Suministro, instalación y montaje conectores de cortante 7/8"x11.5cms	pza	7,080.00	1,988.00	0.00	1,988.00	\$52.54	\$104,449.52
								\$3,275,552.95

POR EL CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

2

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

OBRA: Construcción de Gaza en el Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

UBICACIÓN: Perif. De la Juventud y Av. La Cantera

No. CONTRATO:

057/2017

ESTIMACIÓN No.

8

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	
	TRABAJOS DIVERSOS							
	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
55	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de $f_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$, utilizado en BANQUETAS de 8 cm de espesor según proyecto. Incluye: protección de paramentos, corte de módulos de 1.50 m con cortadora de disco, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,300.00	123.89	0.00	123.89	\$201.68	\$24,986.14
								\$24,986.14
OBRA EXCEDENTE								
	OBRAS PRELIMINARES							
3	Demolición, por unidad de obra terminada de concreto asfáltico de espesor variable, en vialidades. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	25.00	41.78	40.45	1.33	\$258.38	\$343.65
								\$343.65

POR EL CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ROSOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO	2	RESUMEN	CROQUIS
Demolición, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico reforzado. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Demolición parapeto existente para colocación de arbotantes sobre periférico	ANEXO
Anexo 1		0.22 m3	
		0.22 m3 m3	

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRAS PRELIMINALES

CONCEPTO : 2

Demolicion parapeto existente para colocacion de arbotantes sobre periférico

	LONGITUD	BASE	base	(B+b)/2	ALTURA	AREA	PZA	RESULTADO
a		0.25			0.20	0.05		
b		0.40	0.25	0.33	0.20	0.07		
						0.12		
A	1.05					0.12	1.00	0.13 m3
B	0.80					0.12	1.00	0.10 m3

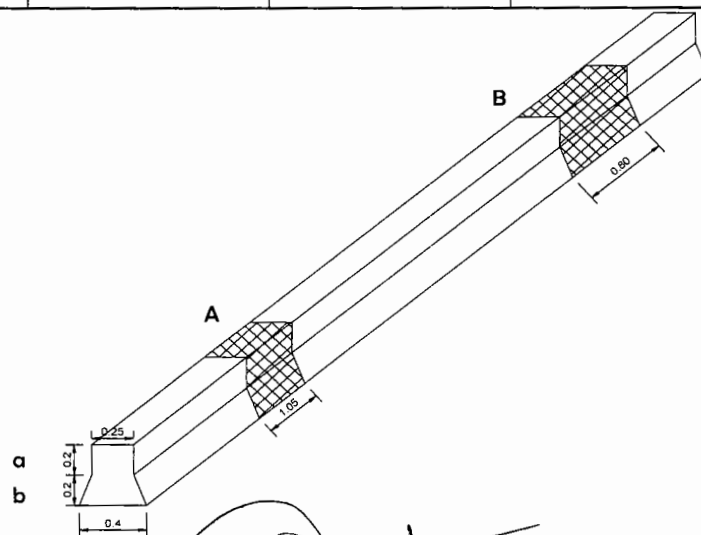

TOTAL 0.22 m3

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8	(OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO	3	RESUMEN	CROQUIS
Demolición, por unidad de obra terminada de concreto asfáltico de espesor variable, en vialidades. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		Demolición de Asfalto para colocación de lavadero sobre Periférico	
		Anexo 1	
		1.33 m3	
		1.33 m3	1.33 m3

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRAS PRELIMINALES

CONCEPTO : 3

Demolicion de Asfalto para colocacion de lavadero sobre Periferico

	LONGITUD	BASE	base	(B+b)/2	ESPESOR	VOLUMEN	PZA	RESULTADO
	3.70	2.08			0.08	0.62	1.00	0.62 m3
	3.60	2.47			0.08	0.71	1.00	0.71 m3

Periférico de la Juventud

Guarnición Nueva



Lavadero

Lavadero

Lavadero

Lavadero

A

B

Periférico de la Juventud

TOTAL 1.33 m3

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017

TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.


No. DE ESTIMACION

8

(OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO

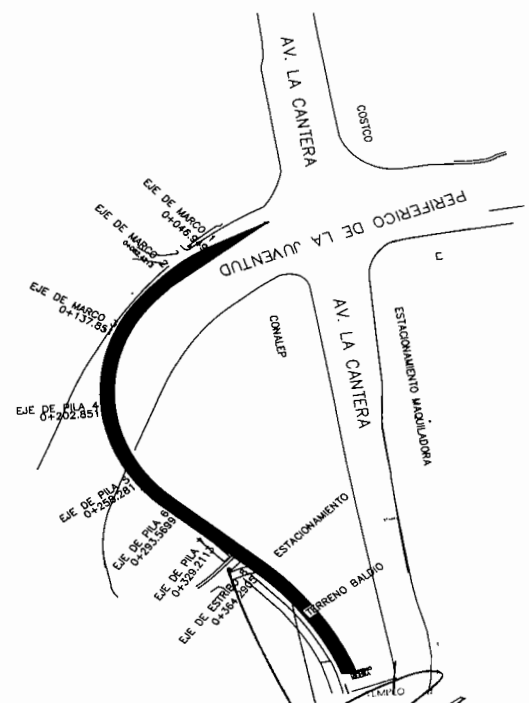CONCEPTO	27	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro de acero de refuerzo con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm² para utilizarse en cualquier elemento estructural, puesto en obra por unidad de obra terminada.	Anexo 1	9,995.00 Kg	ANEXO 	9,995.00 Kg
		9,995.00 Kg		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera													
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.													
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)		DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017													
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO															
CONCEPTO : 27															
Suministro de acero															
<table border="1"><thead><tr><th>No. Factura</th><th>kg</th><th>Acumulado</th><th>Fecha</th></tr></thead><tbody><tr><td>IHGAIE514457</td><td>81.00 kg</td><td>81.00 kg</td><td>19-sep-17</td></tr><tr><td>IHGAIE514449</td><td>9,914.00 kg</td><td>9,995.00 kg</td><td>19-sep-17</td></tr></tbody></table>				No. Factura	kg	Acumulado	Fecha	IHGAIE514457	81.00 kg	81.00 kg	19-sep-17	IHGAIE514449	9,914.00 kg	9,995.00 kg	19-sep-17
No. Factura	kg	Acumulado	Fecha												
IHGAIE514457	81.00 kg	81.00 kg	19-sep-17												
IHGAIE514449	9,914.00 kg	9,995.00 kg	19-sep-17												
			TOTAL 9,995.00 kg												

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Serie y Folio

IHGAIE 514449

No de Serie del Certificado del
CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
2017/09/19T17:59:48

Folio Fiscal

B94BE7AD-69EF-AAAE-69FF-3765AF85C486

No. de Serie del Certificado del
SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:

2017-09-19T17:59:48

Cliente

MIERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

ENTRADA BOCANIGRA #1702

SAN FELIPE C.P. 31203

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. CLIENTE 37190002573

Sucursal

THD-8719 CHIHUAHUA

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6101

HACIENDA DEL VALLE C.P. 31216

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

TEL: (614) 439 8200

09:18:17, Reg:8719, Tran:05422, Caja: 030

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	1	No aplica	MANEJO-EMPAQUE MCTA.	\$0.00	\$0.00
17744	0.314	TONELADA	VARILLA CORR R-42 3/8 TN 12MTS REC	\$11,000.00	\$3,454.00
2	1	No aplica	MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00
17744	0.846	TONELADA	VARILLA CORR R-42 5/8 TN 12MTS REC	\$11,000.00	\$9,306.00
17744	1.677	TONELADA	VARILLA CORR R-42 1/4 TN 12 MTB REC	\$11,000.00	\$18,447.00
17744	5.378	TONELADA	VARILLA CORR R-42 1/2 TN 12MTS REC	\$11,000.00	\$59,156.00
Método de Pago:					
02-Cheque nominalivo				5996	
TOTAL CON LETRA				Subtotal	\$109,054.00
(CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N.)				IVA(16%)	\$17,448.64
				Total	\$126,502.64

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

011701894BE7AD-69EF-AAAE-69FF-3765AF85C486[2017-09-19T17:59:48]S/0BxwNdgGnYucU1233bV0Zku7ozonGpJgnUak68jgyRRj3plpF28vhaiSKfV7svvFxeImfpT4DT15apjU5XtXHf10jql1jopSD0+PVikJdu4CvwF2G/KCtT/020qH5TLudzeJc7cnM9YwmgPK6gYBDu7Sf6geFbJq21QqzmPKHg05DBRKEJmzJen3d+r8sseLY1mNjF+2uXdy7nH9IwLzYGUwLJK00AXD49Vbsd0zSC1/NCx03EdGf+egxAq7v1z0bpJHwckFtYAHILW3oY2M61U0SIT6/CM41ze14y7/u14pgey9EFY874bF7+YcvMh5uHlq1CJt8E+X1w==[00001000000402636111]

Sello Digital del Emisor

0201xwNdgGnYucU1233bV0Zku7ozonGpJgnUak68jgyRRj3plpF28vhaiSKfV7svvFxeImfpT4DT15apjU5XtXHf10jql1jopSD0+PVikJdu4CvwF2G/KCtT/020qH5TLudzeJc7cnM9YwmgPK6gYBDu7Sf6geFbJq21QqzmPKHg05DBRKEJmzJen3d+r8sseLY1mNjF+2uXdy7nH9IwLzYGUwLJK00AXD49Vbsd0zSC1/NCx03EdGf+egxAq7v1z0bpJHwckFtYAHILW3oY2M61U0SIT6/CM41ze14y7/u14pgey9EFY874bF7+YcvMh5uHlq1CJt8E+X1w==

Sello Digital del SAT

011701894BE7AD-69EF-AAAE-69FF-3765AF85C486[2017-09-19T17:59:48]S/0BxwNdgGnYucU1233bV0Zku7ozonGpJgnUak68jgyRRj3plpF28vhaiSKfV7svvFxeImfpT4DT15apjU5XtXHf10jql1jopSD0+PVikJdu4CvwF2G/KCtT/020qH5TLudzeJc7cnM9YwmgPK6gYBDu7Sf6geFbJq21QqzmPKHg05DBRKEJmzJen3d+r8sseLY1mNjF+2uXdy7nH9IwLzYGUwLJK00AXD49Vbsd0zSC1/NCx03EdGf+egxAq7v1z0bpJHwckFtYAHILW3oY2M61U0SIT6/CM41ze14y7/u14pgey9EFY874bF7+YcvMh5uHlq1CJt8E+X1w==



HOMÉ DÉPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

AV. RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605
SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON C.P. 66267
R.F.C.: HDM001017AS1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Serie y Folio

IHGAIE 514457

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
2017/09/19T18:05:42

Folio Fiscal

8B4D2D88-1981-195A-4E25-913A7DD62408

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:

2017-09-19T18:05:42

Cliente

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV
ESTRADA BOCANEGRA #1702
SAN FELIPE I.C.P. 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MET0411185E7
No. Cliente 87190002573

Sucursal

THD-8719 CHIHUAHUA
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6101
HACIENDA DEL VALLE C.P. 31216
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
TEL.: (614) 439 8200
09/18/17, Reg: 8719, Tran: 05455, Caja: 030

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
2	1	No aplica	MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00 im
1	1	No aplica	MANEJO-EMPAQUE MCIA.	\$0.00	\$0.00 im
480919	0.081	TONELADA	VARILLA CORR R-42 3/4 TN 12 MTS REC	\$11,000.00	\$891.00 im
Método de pago:					
02-Cheque nominativo 5996					
TOTAL CON LETRA				Subtotal	\$891.00
(UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)				IVA(16%)	\$142.56
				Total	\$1,033.56

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8B4D2D88-1981-195A-4E25-913A7DD62408|2017-09-19T18:05:42|SZGjvxlFYOPixPR47igc/9ttt5sabbRsfxDQ6Xy/jEzwqkdT9pihg771RhKcei8wY0cW410iOWZg5v2WcqBpd9fPvogrl7aG0I9N4VLvOWUtoF2OqUztMnrL8CLgHH91FstWSKcokPLBGrQuXX9IAK6E/72MGJ/wt2Xz6SBmw08B7wVH2gcvmS/nONlOW+d/ZpQSanmtQMq7DGXRB+6byXiYrKqB0jIBFWbbQzuQe72RYNDmW7Ti+QqA3mAlov0YQ8TuZr9YBapsOxmJjShKWgZdeEOJUExGmVMvs/7mAQg0673r1N4WMPXQc10pHUIagATYb8dw2wT0hsITfgGhQ==|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

SZGjvxlFYOPixPR47igc/9ttt5sabbRsfxDQ6Xy/jEzwqkdT9pihg771RhKcei8wY0cW410iOWZg5v2WcqBpd9fPvogrl7aG0I9N4VLvOWUtoF2OqUztMnrL8CLgHH91FstWSKcokPLBGrQuXX9IAK6E/72MGJ/wt2Xz6SBmw08B7wVH2gcvmS/nONlOW+d/ZpQSanmtQMq7DGXRB+6byXiYrKqB0jIBFWbbQzuQe72RYNDmW7Ti+QqA3mAlov0YQ8TuZr9YBapsOxmJjShKWgZdeEOJUEjxGmVMvs/7mAQg0673r1N4WMPXQc10pHUIagATYb8dw2wT0hsITfgGhQ==


Sello Digital del SAT

CM74wRuy9vsITZL9vzq7CPsv9ueoH03313Q64Ag1+79NLeqXstZDsAhNiUu9RLY3TXPhjMi7IilzteWh2MkjRfOfPf92LEXSOG8HTgAKitkJac4CJPh4naJ+Dc9eayUV7CseGSM9tHyWa0dzgU2/186hQjbpPyIDcIiXxc1bD+P7/nEvEx1qJwBLjF6BZTQrH2Ws2K1b422fb2+AGGsd11zOuPNGTEUBcBtz6ilMZqkQyF9HyNy519QE3GYHWTYQFBOnY3jBr2Heblt263Vi+10ZLxNemaSgSs9my1DPRP0nHL2m6GSVednLAQ6Uc7WpjK/BL3EdJnbPyCGTIPQA==



GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
SUBESTRUCTURA		ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	
CONCEPTO	28	RESUMEN	CROQUIS
Habilitado y colocación de acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ a base de varillas corrugadas de con un rango de 1 1/2" a 3/8", p.u.o.t. a utilizarse en cualquier elemento estructural incluye: mano de obra, herramienta y equipo, alambre recocido, silletas, amarres, traslapes, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada.	Losa Claro 7-8		ANEXO
	Anexo 1	7,898.24	
	Losa Claro 6-7		
	Anexo 2	7,898.24	

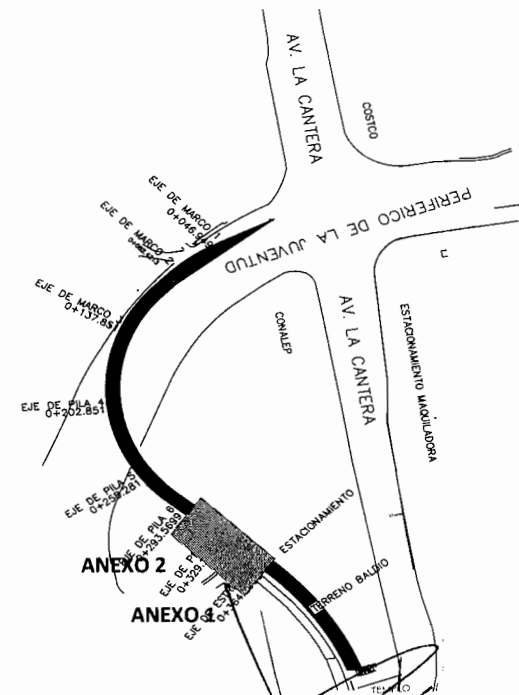

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017					TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera							
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA					CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.							
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)					DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017							
SUBESTRUCTURA ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO												
CONCEPTO : 28												
Losa Claro 7-8												
VAR. TIPO	DIAM.	SEPAR. (m)	PIEZAS	LONGITUD	PESO						No. ELEMENTO:S	PESO TOTAL
					3	4	5	6	8	10		
					0.559	0.993	1.552	2.250	3.973	6.208		
Losa Claro 7-8												
PARRILLA SUPERIOR												
A	4	0.2	49	34.84		1,695.21					1	1,695.21
C	4	0.15	234	9.70		2,253.91					1	2,253.91
PARRILLA INFERIOR												
B	4	0.2	49	34.84		1,695.21					1	1,695.21
D	4	0.15	234	9.70		2,253.91					1	2,253.91
											TOTAL	7,898.24 kg

RESIDENTE


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
SUBESTRUCTURA		ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	
CONCEPTO :	28	Losa Claro 7-8	

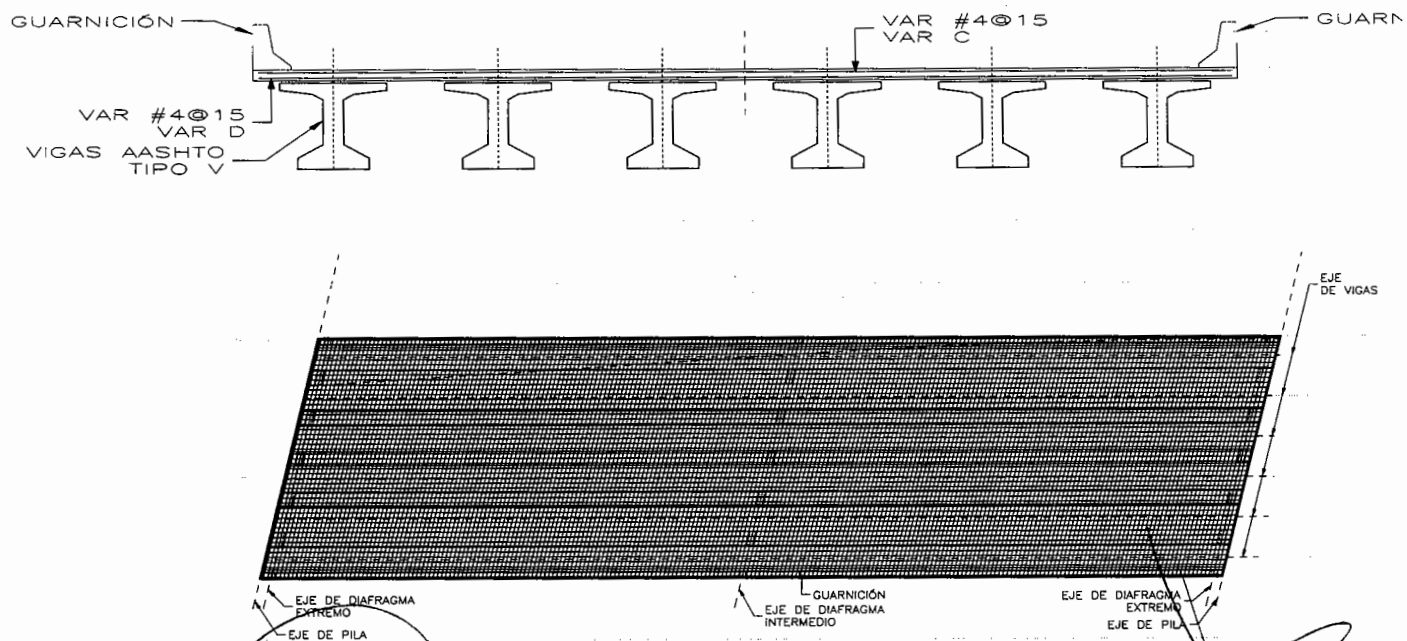

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017					TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera							
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA					CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.							
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)					DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017							
SUBESTRUCTURA					ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO							
CONCEPTO : 28												
Losa Claro 6-7												
VAR. TIPO	DIAM.	SEPAR. (m)	PIEZAS	LONGITUD	PESO						No. ELEMENTO:S	PESO TOTAL
					3	4	5	6	8	10		
					0.559	0.993	1.552	2.250	3.973	6.208		
Losa Claro 6-7												
PARRILLA SUPERIOR												
A	4	0.2	49	34.84		1,695.21					1	1,695.21
C	4	0.15	234	9.70		2,253.91					1	2,253.91
PARRILLA INFERIOR												
B	4	0.2	49	34.84		1,695.21					1	1,695.21
D	4	0.15	234	9.70		2,253.91					1	2,253.91
											TOTAL	7,898.24 kg

RESIDENTE


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
SUBESTRUCTURA		ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	
CONCEPTO :	28	Losa Claro 6-7	

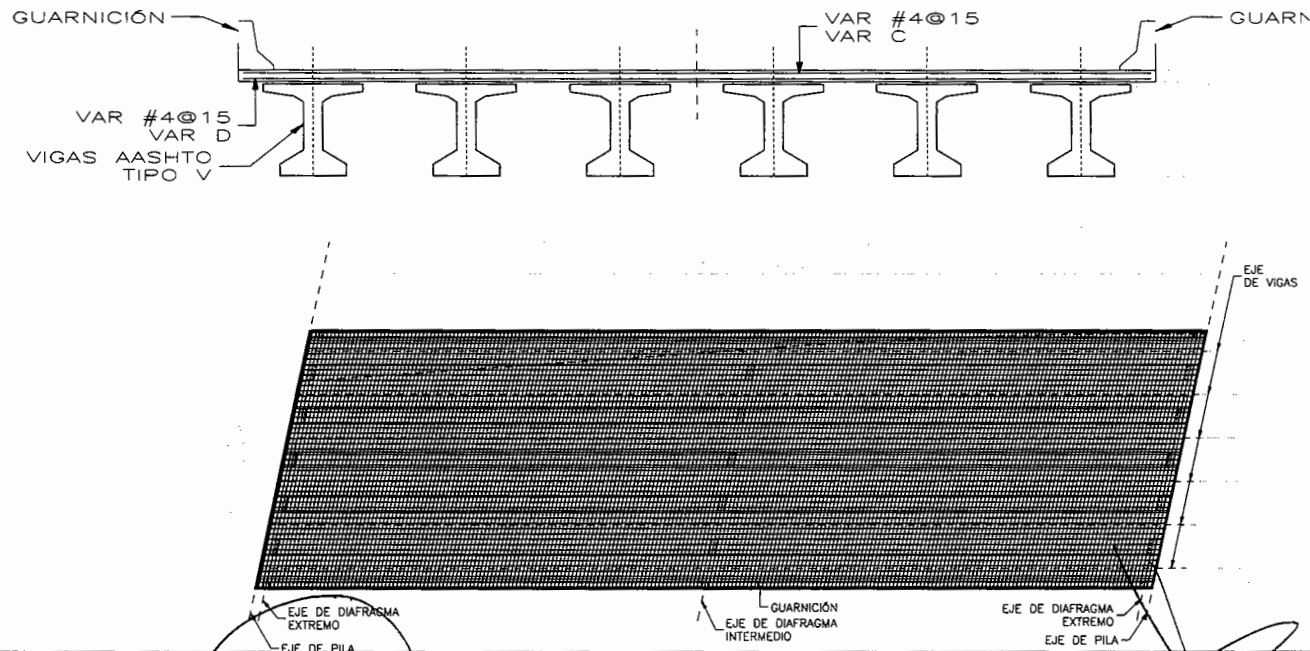

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera		
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.		
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017		
MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS				
CONCEPTO	29	RESUMEN	CROQUIS	
Muro mecánicamente estabilizado, de patente por unidad de obra terminada: incluye: materiales, mano de obra, patente, proyecto y todo lo necesario para su correcta instalación.	Anexo 1	27.93 m2	ANEXO	
				27.93 m2 m2

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS

CONCEPTO : 29

PILA 5 KM 0+292.808

LONGITUD	BASE	BASE MENOR	$((B+B)*0.5)$	ALTURA	Piezas	RESULTADO
88.44				0.15	1	13.27 m2
3.75				0.15	1	0.56 m2
92.33				0.15	1	13.85 m2
1.65				0.15	1	0.25 m2

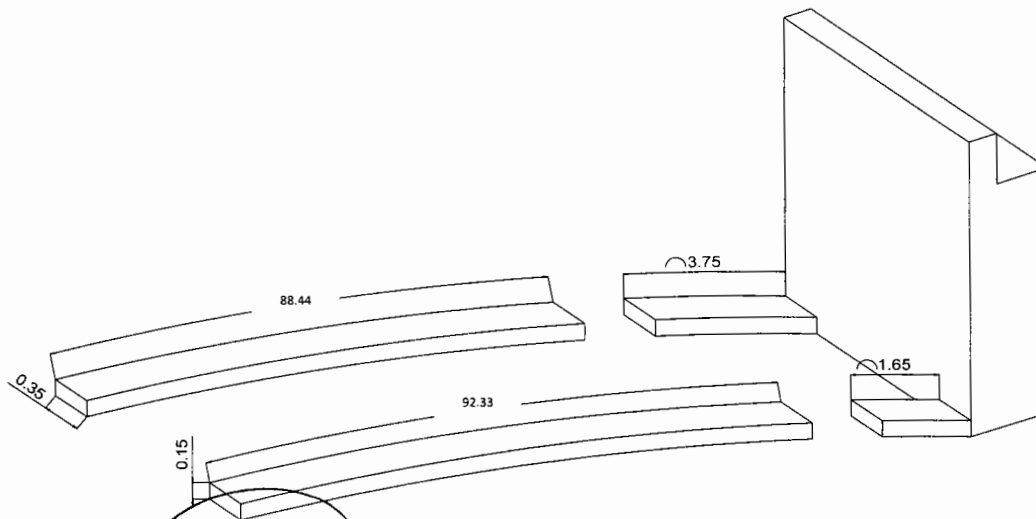

TOTAL 27.93 m2

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
SUPERESTRUCTURA		CONCRETO HIDRÁULICO	
CONCEPTO	31	RESUMEN	CROQUIS
Suministro y colocacion de concreto hidráulico a cualquier altura, por unidad de obra terminada: Simple, colado en seco en puentes y pasos a desnivel: De $f'c = 280 \text{ Kg/cm}^2$, utilizado en losas y diafragmas de viga metalica y en viga de concreto. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, bombeo, vibrado, desperdicios, obra falsa, cimbra (Aparente) en volados y diafragmas, descimbrados, acabado superficial de losa rayado(terminado rasante), preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, curados y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Claro 7-8	ANEXO
		Anexo 1	
		68.29 m3 m3	



RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

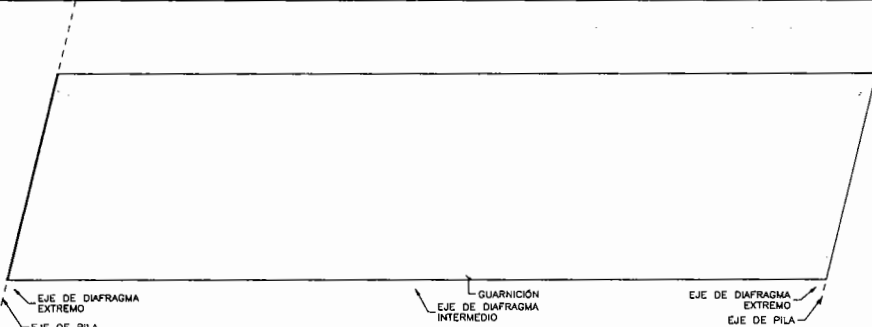CONTRATO : 057/2017		TRAMO: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)		DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
SUPERESTRUCTURA		CONCRETO HIDRÁULICO	
CONCEPTO : 31		Claro 7-8	
LARGO	ANCHO	ESPESOR	RESULTADO
34.84	9.8	0.20	68.29 m3
			
			TOTAL 68.29 m3

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA


CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

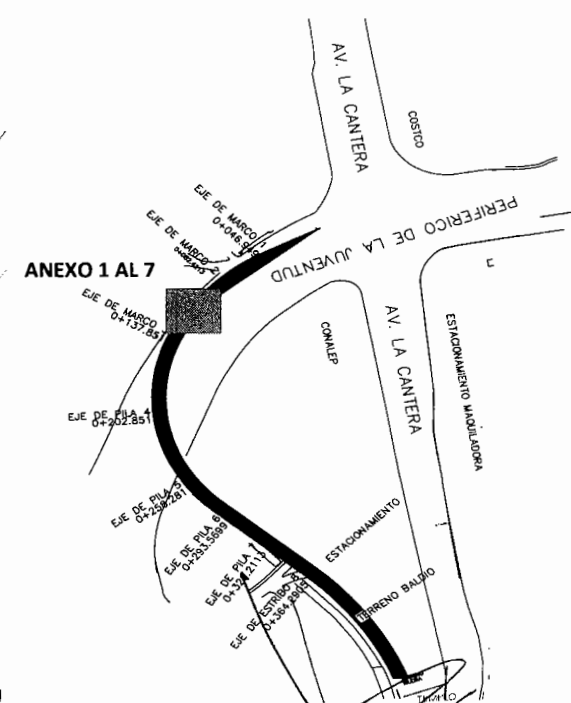CONCEPTO	39	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Fabricación de elementos estructurales , conforme a proyecto y medido en planos y pesos teoricos : Acero estructural A-709 GRADO 50: utilizado en vigas ,contraventeos , diafragmas, (de proyecto) y miscelaneos necesarios. Incluye la fabricacion completa ó en secciones(ademas de las conexiones entre partes de las vigas), los acarreo, desperdicios, maniobras, soldadura, placas de conexion,sandblasteo total, primario anticorrosivo y fletes(cargas, descargas,translados y permisos necesarios) para la puesta de los elementos en obra.		Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2		227,389.90 kg
		Viga 1 Claro 2-3		
		Viga 2 Claro 2-3		
		Viga 1 Claro 3-4		
		Viga 2 Claro 3-4		
		227,389.90 kg		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	BASE (B)	BASE (b)	ALTURA	AREA	PZA	RESULTADO
Alma de diafragma Placa de 3/4" Viga 1	149.38	2.60	1.72	2.09	4.51	2	1,347.41 kg
Alma de diafragma Placa de 3/4" Centro	149.38	3.39	2.60	2.09	6.26	2	1,870.24 kg
Alma de diafragma Placa de 3/4" Viga 2	149.38	2.60	1.72	2.09	4.51	2	1,347.41 kg

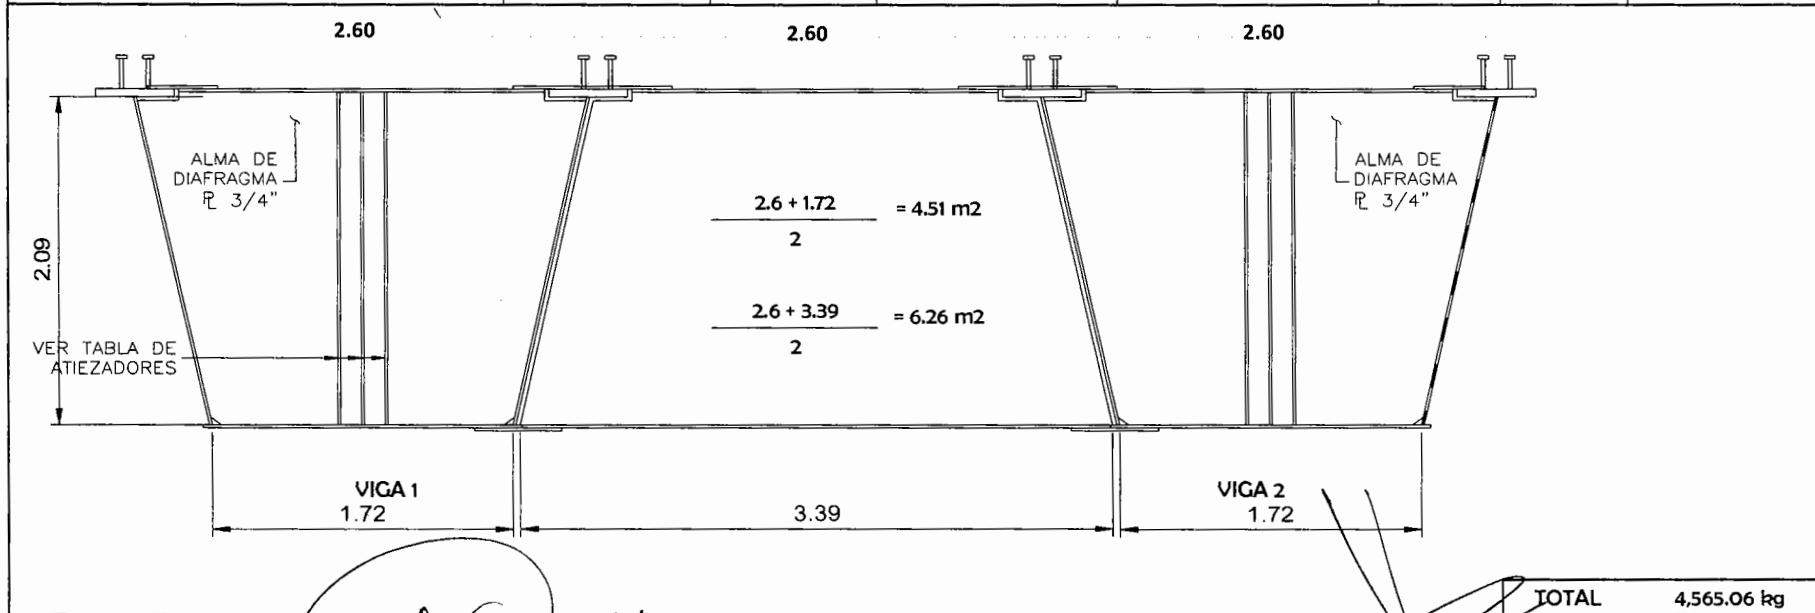

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PIEZAS	RESULTADO
Patin superior Placa 3/4"	149.38	2.13 ✓	0.35 ✓	2	222.73 kg

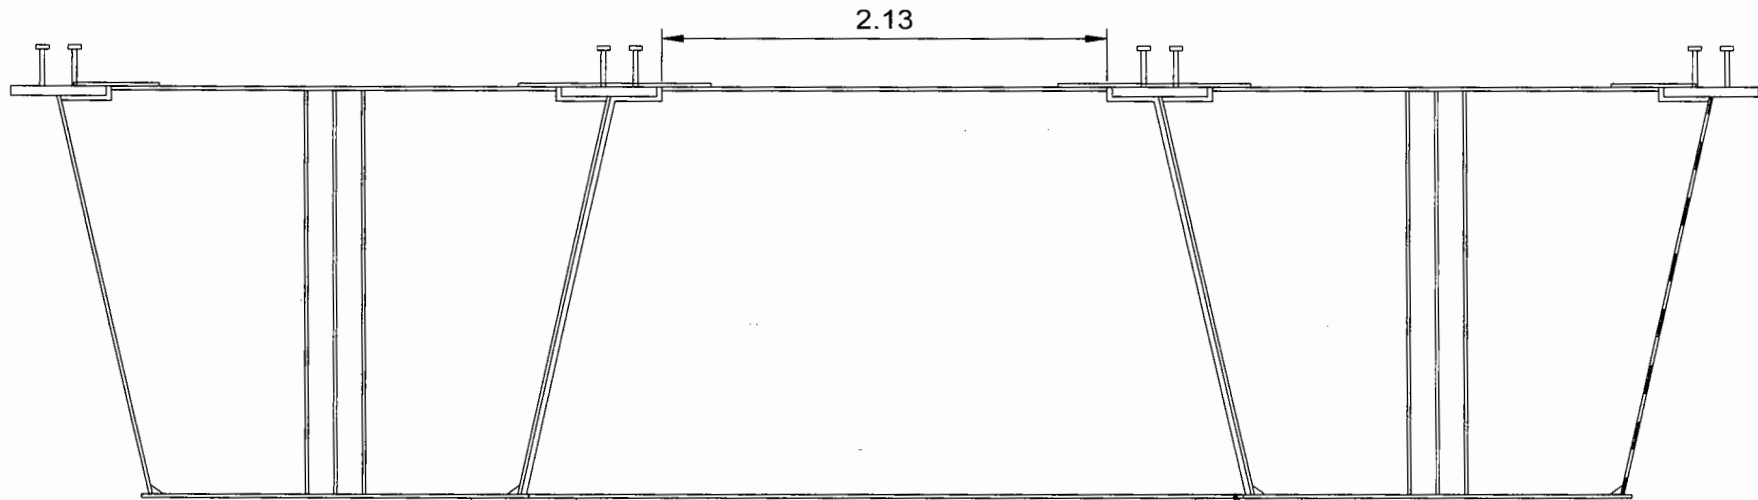

TOTAL 222.73 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3


CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patin inferior Placa 3/4"	149.38	3.36	0.35	2	351.34 kg

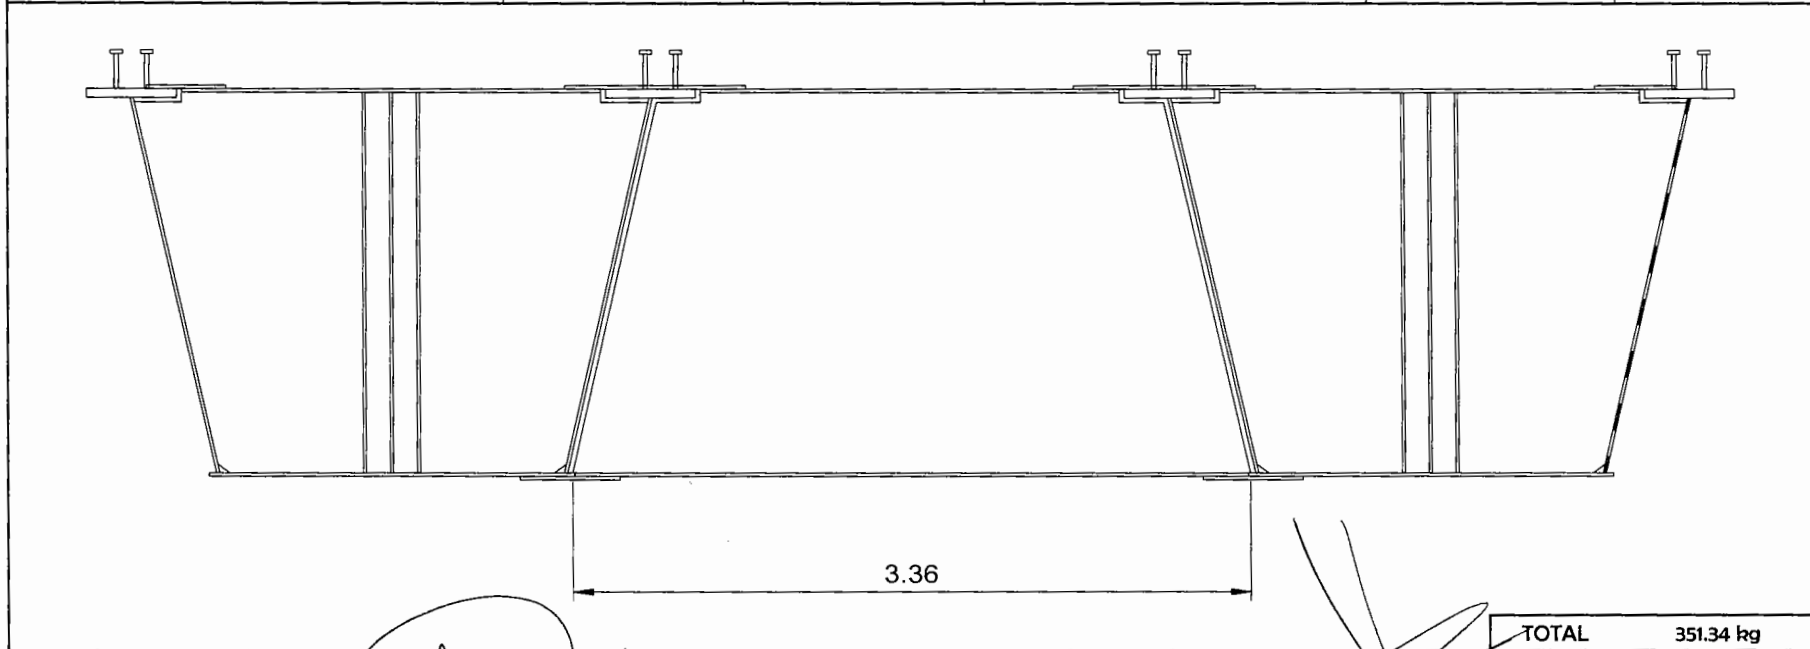


RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 4

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)		DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO EN SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO : 39					
Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1" atiezadores centro viga	199.18 /	2.09 /	0.17 /	24 /	1,698.45 kg /

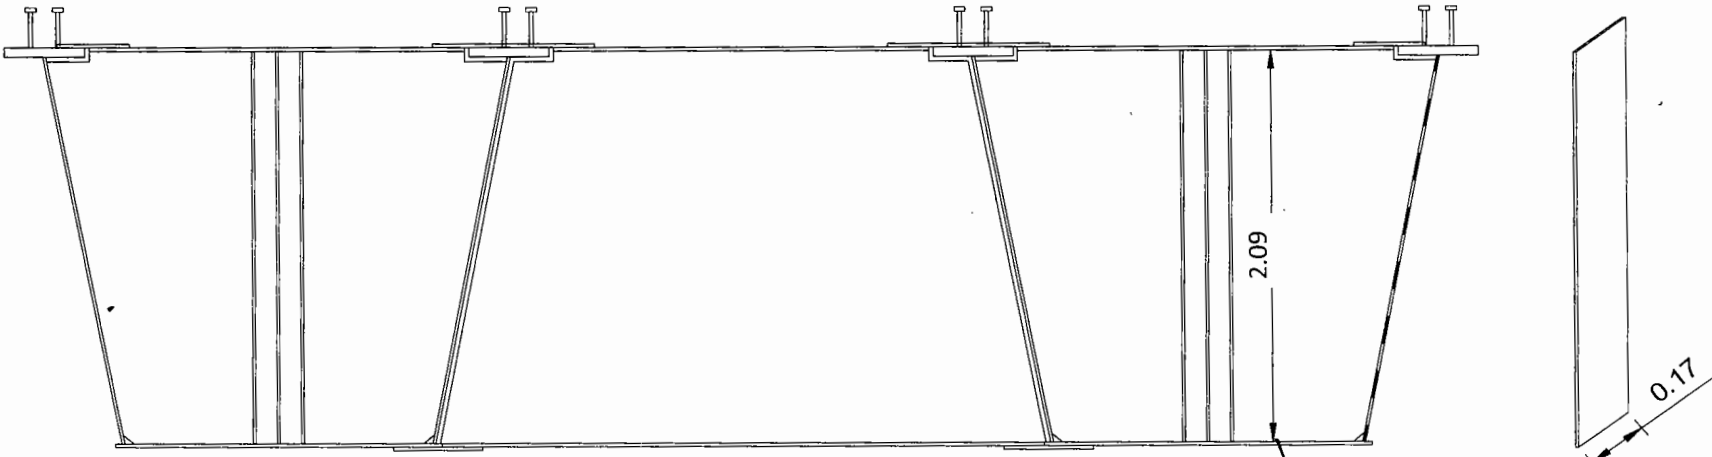

TOTAL	1,698.45 kg /
-------	---------------

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo Conexión 4 x 1/2"	19.05	2.05		4	156.21 kg

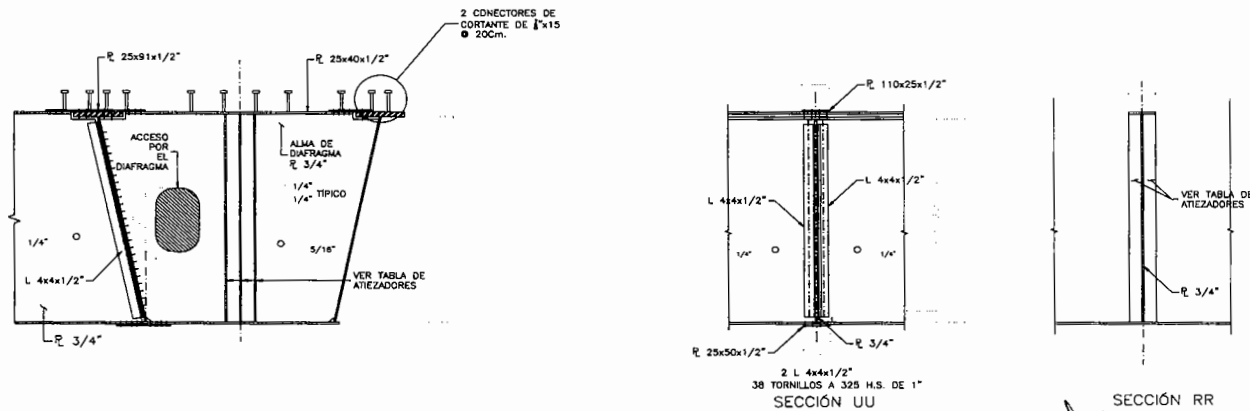

TOTAL 156.21 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera					
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.					
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)		DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017					
ACERO SUPERESTRUCTURA							
CONCEPTO : 39							
Alma Claro 2-3 Viga 1							
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO			PZA	RESULTADO
Alma placa 7/8"	174.38	54.01	2.13			2	40,121.80 kg

Alma Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION **PESO** **LONGITUD** **ANCHO** **PZA** **RESULTADO**

Alma placa 7/8" 174.38 54.01 2.13 2 40,121.80 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2


CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Patin Inferior Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín inferior sección 1 placa 3/4"	149.38	36.45	1.83	1	9,964.17 kg
Patín inferior sección 2 placa 1 3/4"	348.56	17.56	1.83	1	11,200.91 kg

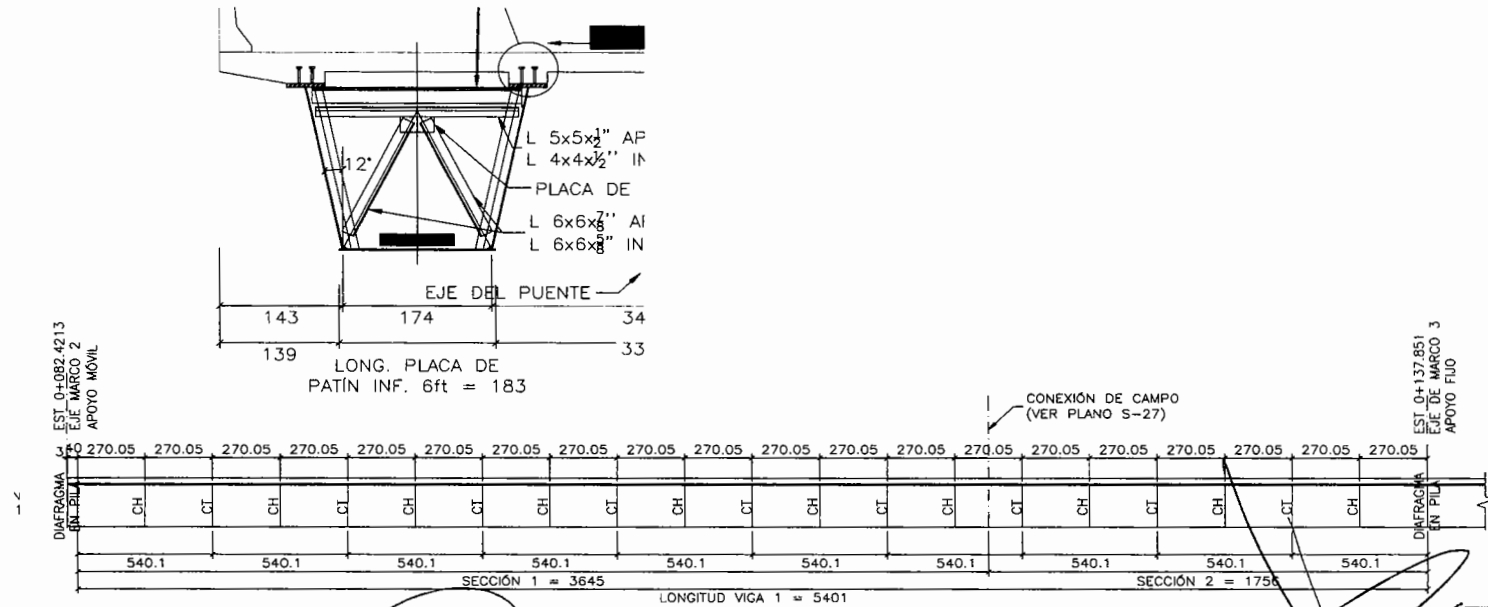

TOTAL 21,165.08 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO :	39				
Patin Superior Claro 2-3 Viga 1					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín superior sección 1 placa 1"	199.18	36.45	0.45	2	6,534.10 kg
Patín superior sección 2 placa 2"	398.36	17.56	0.61	2	8,534.15 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

TOTAL 15,068.25 kg

ANEXO 4

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)		DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO : 39					
Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 2-3 Viga 1					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59 ✓	0.170 ✓	0.10 ✓	38 ✓	64.34 kg ✓
Placa 1/2" conexión centro	99.59 ✓	0.45 ✓	0.39 ✓	19 ✓	332.08 kg ✓
Placa 7/8" costillas	174.38 ✓	2.13 ✓	0.15 ✓	38 ✓	2,117.15 kg ✓

TOTAL	2,513.57 kg
-------	-------------

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
ACERO SUPERESTRUCTURA			
CONCEPTO :	39		

Placa Conexión Hombro Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.42	0.10	38	158.95 kg

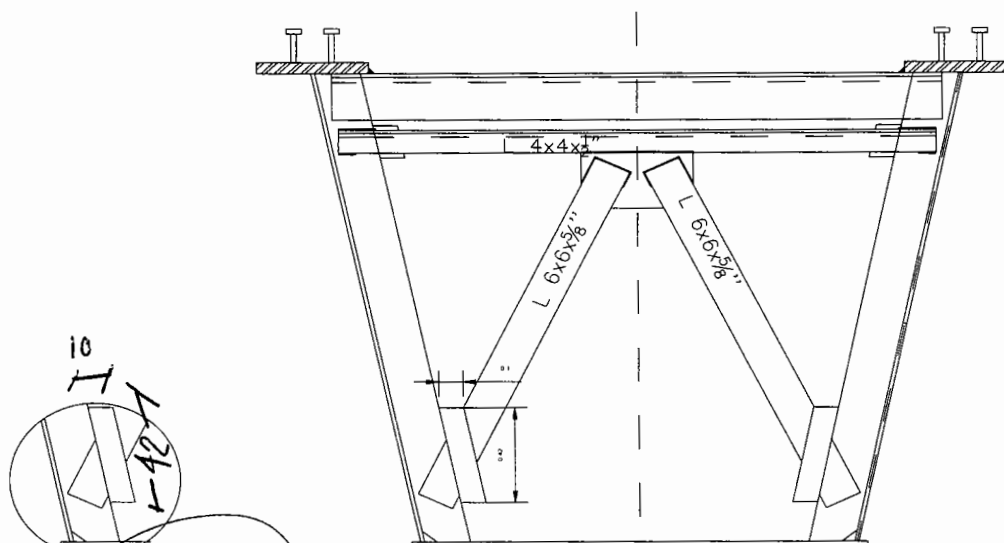

TOTAL	158.95 kg
-------	-----------

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 6

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
ACERO SUPERESTRUCTURA			
CONCEPTO :		39	

Cruceteo Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 5/8 Cruceteo	124.49	1.70	0.35	19	1,407.36 kg

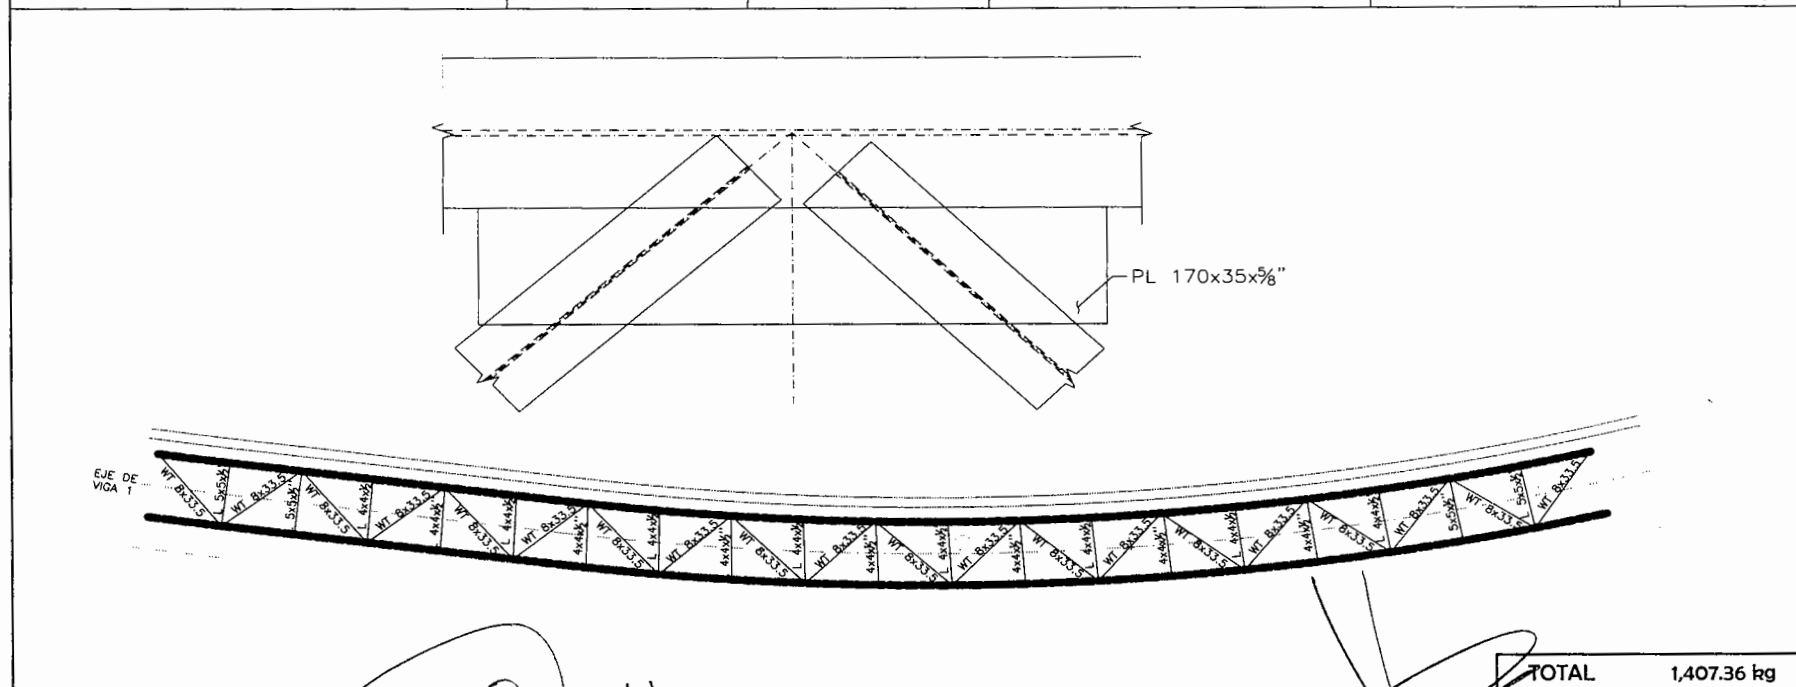

TOTAL 1,407.36 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 7

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

CT Extremos Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 5" x 1/2" extremos	24.11 /	2.40 /		4 /	231.46 kg /
Angulo para CT de 6" x 7/8" extremos	49.26	1.65		8 /	650.23 kg /

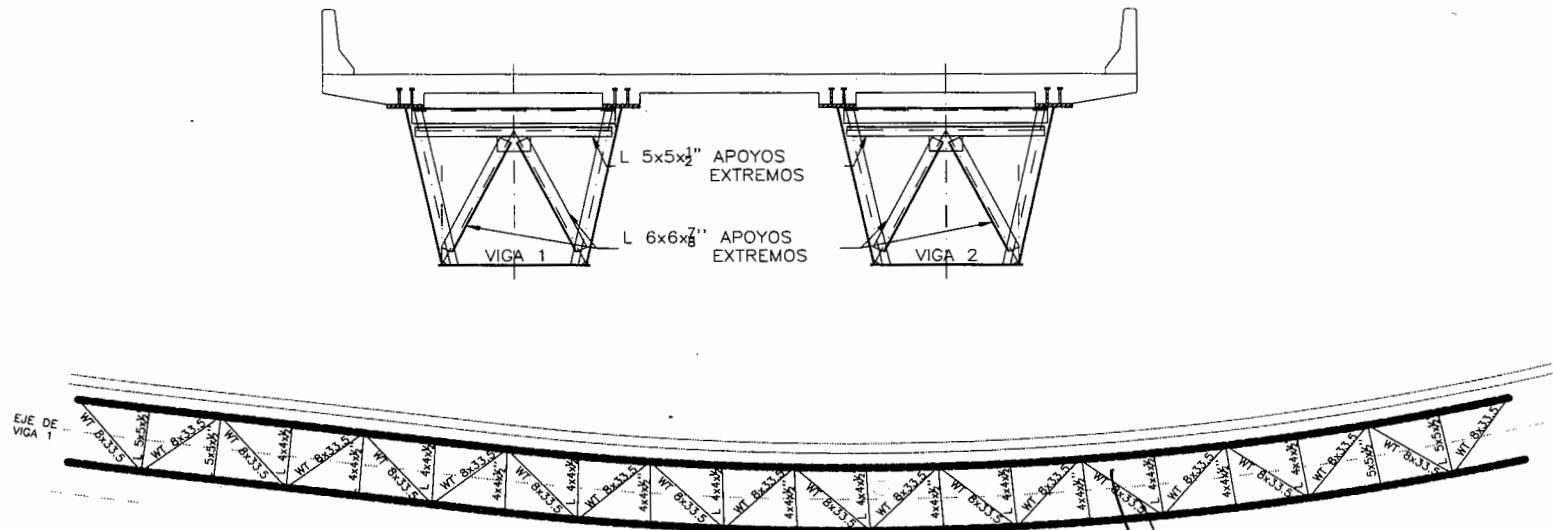

TOTAL 881.69 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 8

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

CT Intermedios Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 4" x 1/2"intermedios	19.05 /	2.40 /		15 /	685.80 kg /
Angulo para CT de 6" x 5/8"intermedios	36.01 /	1.65 /		30 /	1,782.50 kg /

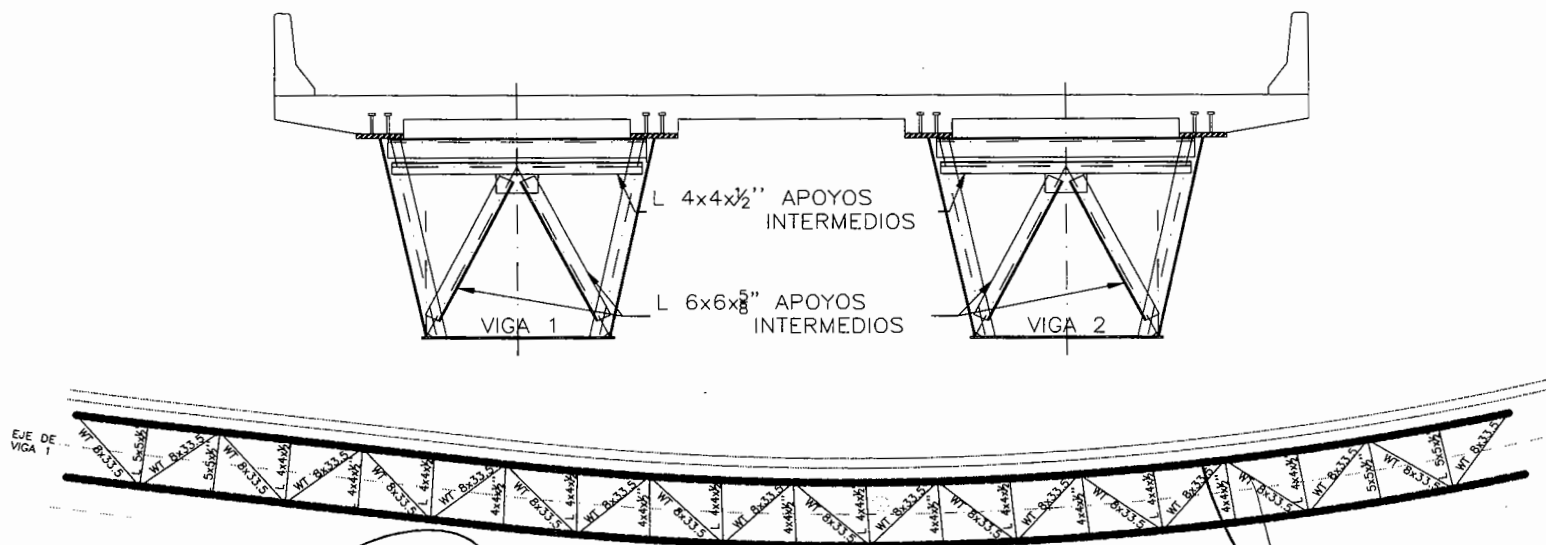

TOTAL 2,468.30 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 9

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

WT Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
WT 8x33.5	49.90	3.50		20	3,493.00 kg ✓

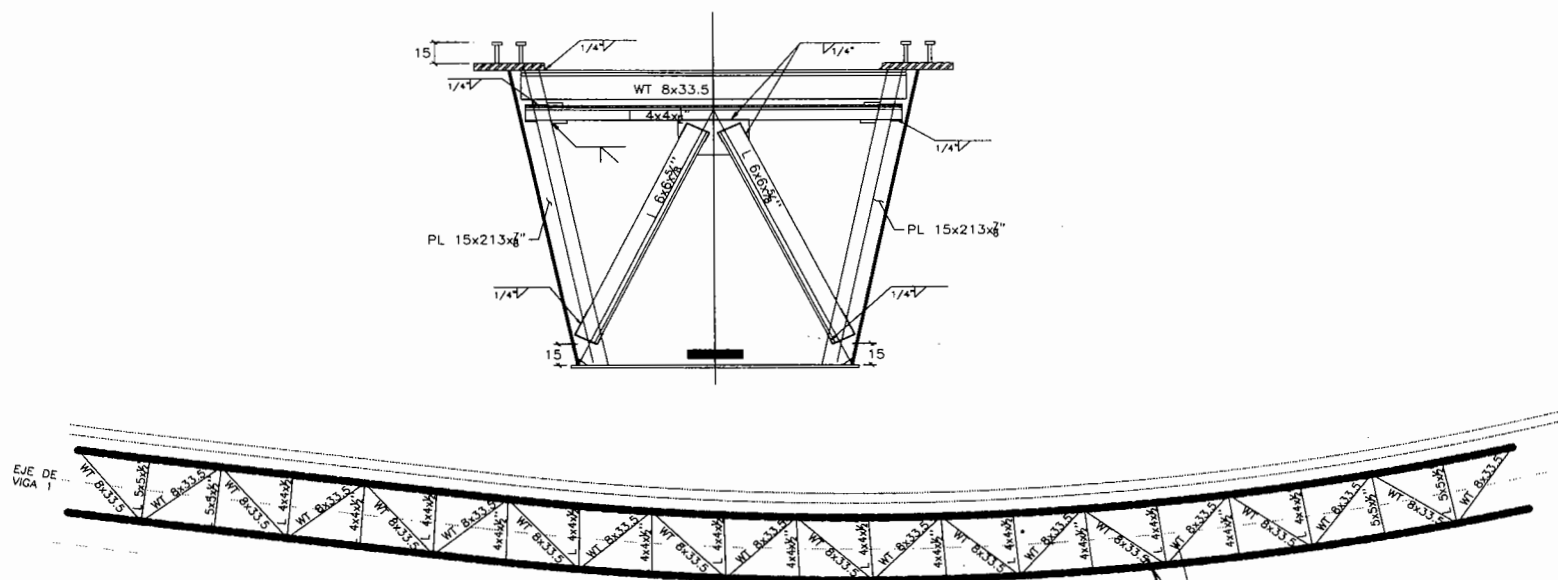

TOTAL 3,493.00 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017


OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

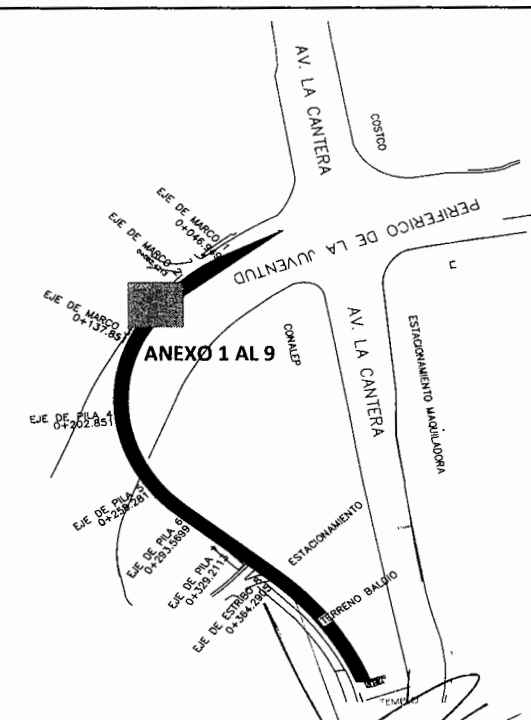CONCEPTO	39	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Fabricación de elementos estructurales , conforme a proyecto y medido en planos y pesos teoricos : Acero estructural A-709 GRADO 50: utilizado en vigas ,contraeventos , diafragmas, (de proyecto) y miscelaneos necesarios. Incluye la fabricacion completa ó en secciones(ademas de las conexiones entre partes de las vigas), los acarreo, desperdicios, maniobras, soldadura, placas de conexion,sandblasteo total, primario anticorrosivo y fletes(cargas, descargas,translados y permisos necesarios) para la puesta de los elementos en obra.		Alma Claro 2-3 Viga 2	ANEXO	945.70 kg
	Anexo 1	41,592.66 kg		
	Patin Inferior Claro 2-3 Viga 2			
	Anexo 2	21,935.97 kg		
	Patin Superior Claro 2-3 Viga 2			
	Anexo 3	15,616.43 kg		
	Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 2-3 Viga 2			
	Anexo 4	2,513.57 kg		
	Placa Conexión Hombro Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 5	158.95 kg		
	Cruceteo Claro 2-3 Viga 2			
	Anexo 6	1,407.36 kg		
	CT Extremos Claro 2-3 Viga 2			
	Anexo 7	881.69 kg		
	CT Intermedios Claro 2-3 Viga 2			
	Anexo 8	2,468.30 kg		
	WT Claro 2-3 Viga 2			
	Anexo 9	3,493.00 kg		
	Total	90,067.93 kg		
	Estimado anterior	89,122.23 kg		
	Para esta estimacion	945.70 kg	kg	

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	
ACERO SUPERESTRUCTURA			
CONCEPTO :	39		

Alma Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Alma placa 7/8"	174.38	55.99	2.13	2	41,592.66 kg

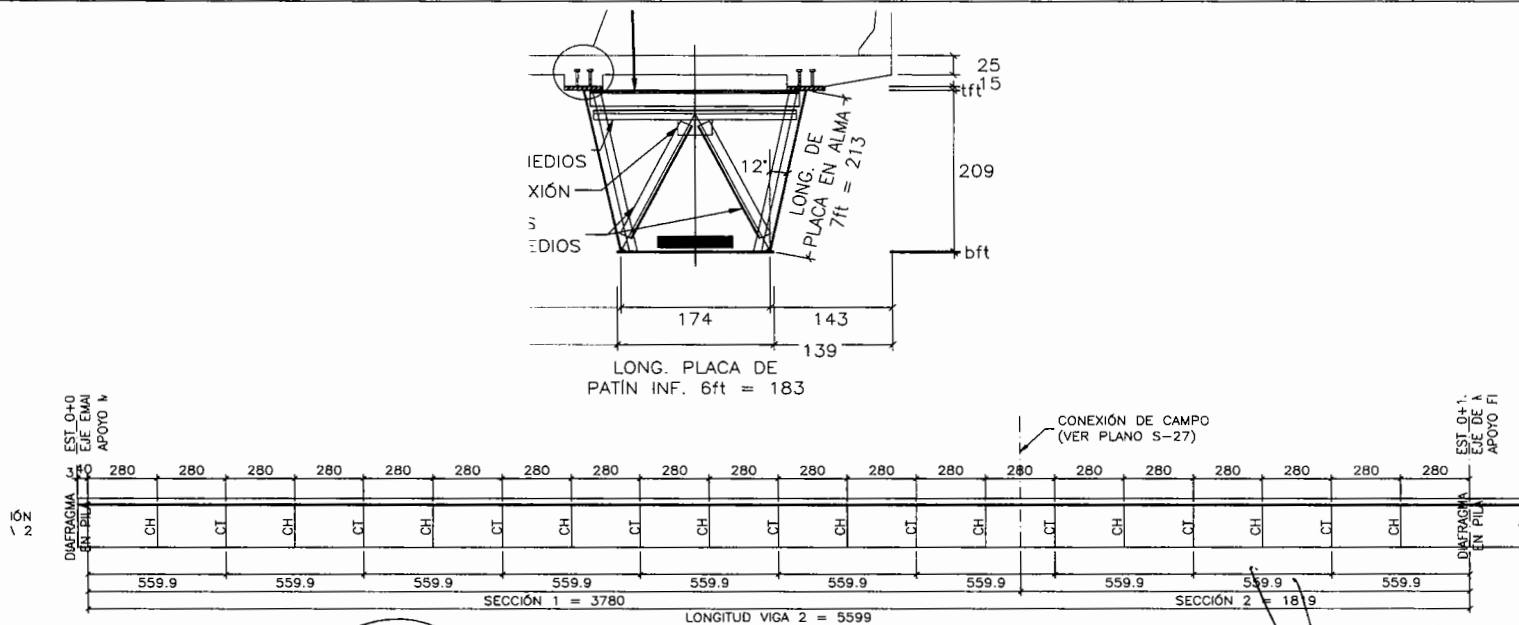

TOTAL 41,592.66 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO :	39				
Patin Superior Claro 2-3 Viga 2					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín superior sección 1 placa 1"	199.18	37.80	0.45	2	6,776.10 kg
Patín superior sección 2 placa 2"	398.36	18.19	0.61	2	8,840.33 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 4

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)




DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.17 /	0.10 /	38	64.34 kg ✓
Placa 1/2" conexión centro	99.59	0.45 /	0.39 /	19	332.08 kg ✓
Placa 7/8" costillas	174.38	2.13 /	0.15 /	38	2,117.15 kg ✓

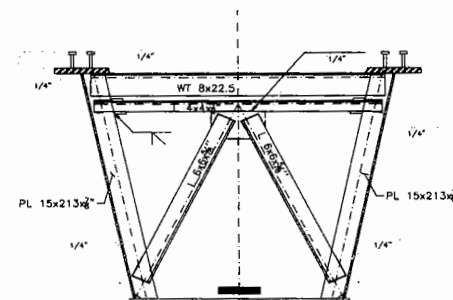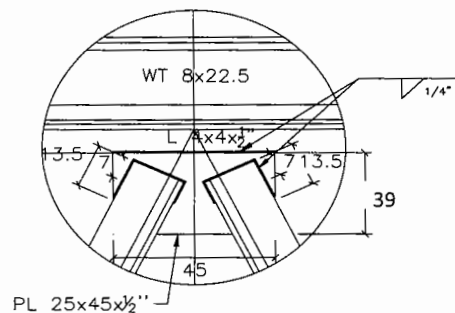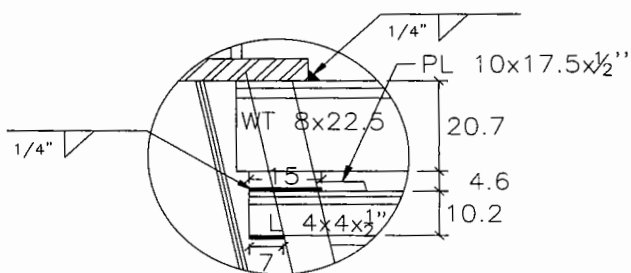

TOTAL 2,513.57 kg ✓

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5


CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Placa Conexión Hombro Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.42	0.10	38	158.95 kg

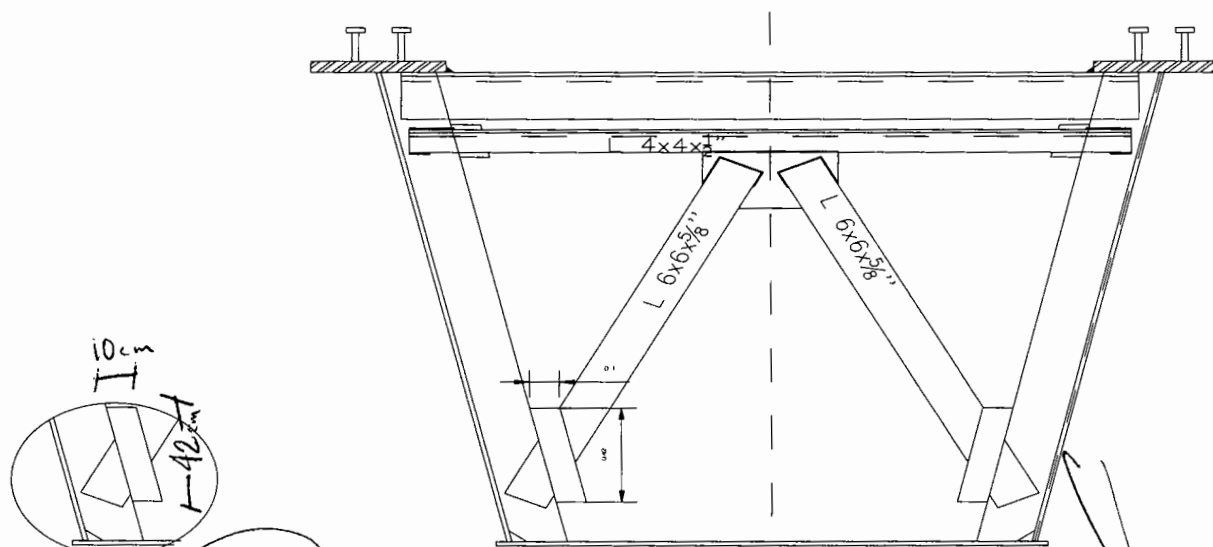

TOTAL 158.95 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 6

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO : 39					
Cruceo Claro 2-3 Viga 2					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 5/8 Cruceo	124.49	1.70	0.35	19	1,407.36 kg ✓

TOTAL 1,407.36 kg ✓

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 7

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO :	39				
CT Extremos Claro 2-3 Viga 2					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 5" x 1/2" extremos	24.11	2.40		4	231.46 kg
Angulo para CT de 6" x 7/8" extremos	49.26	1.65		8	650.23 kg


TOTAL 881.69 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 8

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO : 39					
CT Intermedios Claro 2-3 Viga 2					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 4" x 1/2"intermedios	19.05	2.40		15	685.80 kg
Angulo para CT de 6" x 5/8"intermedios	36.01	1.65		30	1,782.50 kg

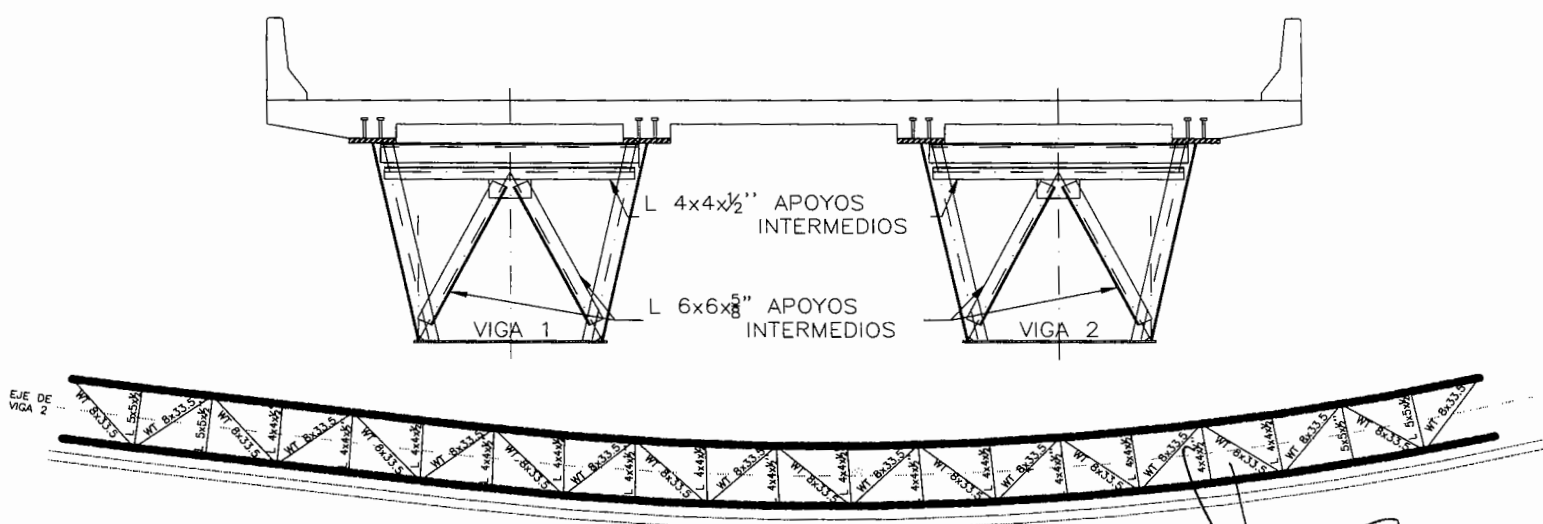

TOTAL 2,468.30 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 9

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

WT Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
WT 8X33.5	49.90	3.50		20	3,493.00 kg

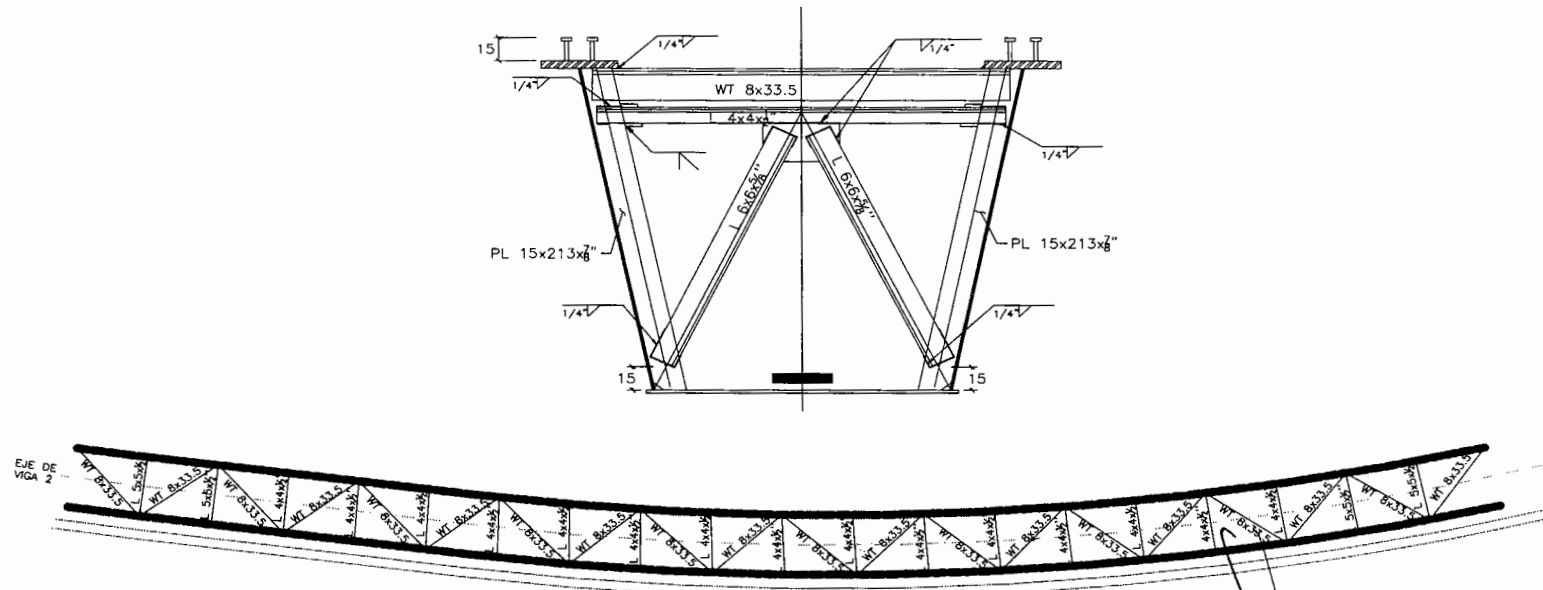

TOTAL 3,493.00 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Alma Claro 3-4 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO			PZA	RESULTADO
Alma placa 7/8"	174.38	66.54	2.13			2	49,429.82 kg

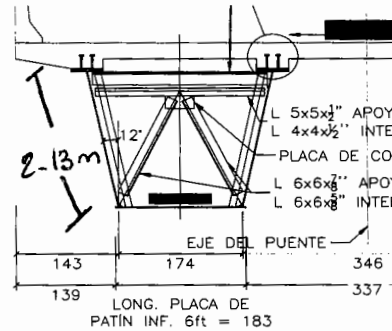

66.54

TOTAL 49,429.82 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO :	39				
Patín Superior Claro 3-4 Viga 2					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín superior sección 2 placa 2"	398.36	12.46 /	0.61 /	2	6,055.55 kg /
Patín superior sección 3 placa 1"	199.18	41.62 /	0.45 /	2	7,460.88 kg
Patín superior sección 4 placa 2"	398.36	12.46 /	0.61 /	2	6,055.55 kg

RESIDENTE
ING. ROBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO :	39				
Patin Inferior Claro 3-4 Viga 2					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín inferior sección 2 placa 1 3/4"	348.56	12.46	1.83	1	7,947.80 kg ✓
Patín inferior sección 3 placa 1"	199.18	41.62	1.83	1	15,170.47 kg ✓
Patín inferior sección 4 placa 1 3/4"	348.56	12.46	1.83	1	7,947.80 kg ✓


TOTAL	31,066.07 kg
--------------	---------------------

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO


CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 4


CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)		DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO : 39		Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 3-4 Viga 2			
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59 ✓	0.170 ✓	0.10 ✓	46	77.88 kg ✓
Placa 1/2" conexión centro	99.59 ✓	0.45 ✓	0.39 ✓	23	402.00 kg ✓
Placa 7/8" costillas	174.38	2.13	0.15	46	2,562.86 kg

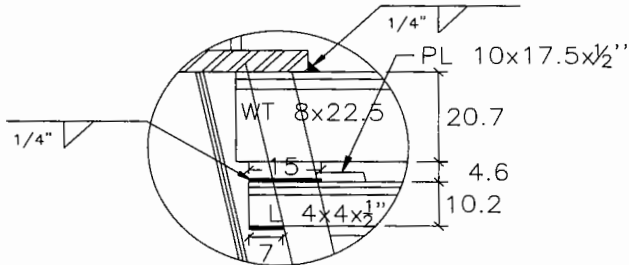

CONEXIÓN DE CAMPO
(VER PLANO S-27)

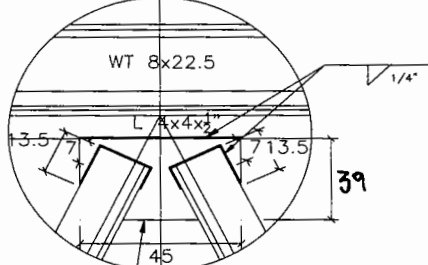

CONEXIÓN DE CAMPO
(VER PLANO S-27)

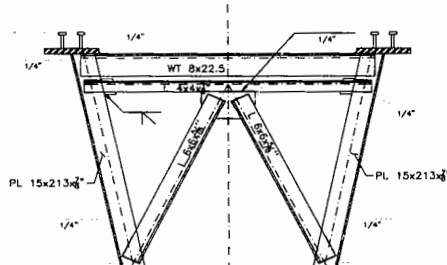

CONEXIÓN DE CAMPO
(VER PLANO S-27)



TOTAL 3,042.74 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Placa Conexión Hombro Claro 3-4 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.42	0.10	46	192.41 kg

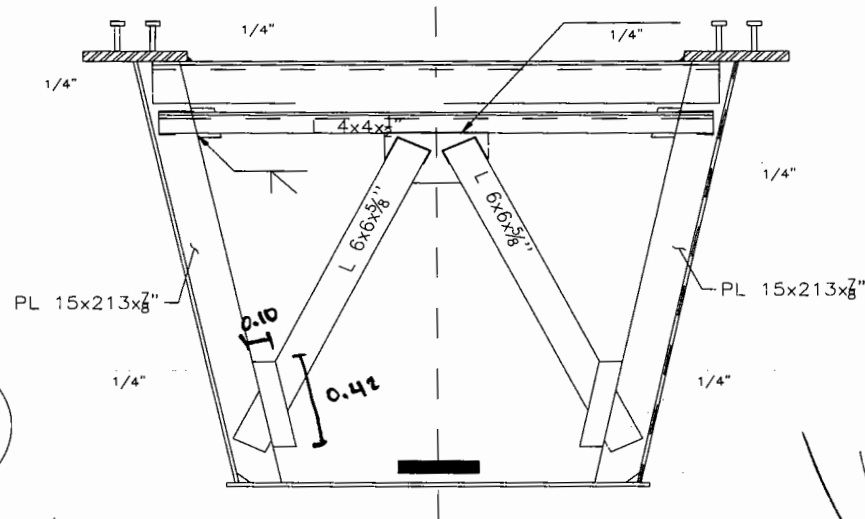

TOTAL 192.41 kg

RESIDENTE

ING. ROBOLOFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 6

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)



DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Cruceteo Claro 3-4 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 5/8 Cruceteo	124.49	1.70	0.35	23	1,703.65 kg

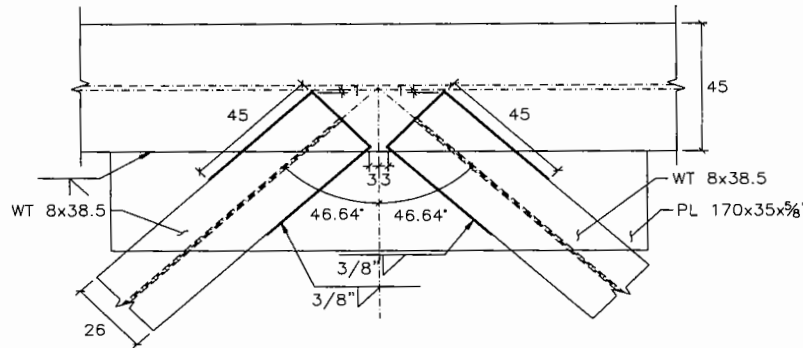

TOTAL 1,703.65 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 8

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

CT Intermedios Claro 3-4 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 4" x 1/2"intermedios	19.05 ✓	2.40 ✓	✓ 19	868.68 kg
Angulo para CT de 6" x 5/8"intermedios	36.01 ✓	1.65 ✓	✓ 38	2,257.83 kg

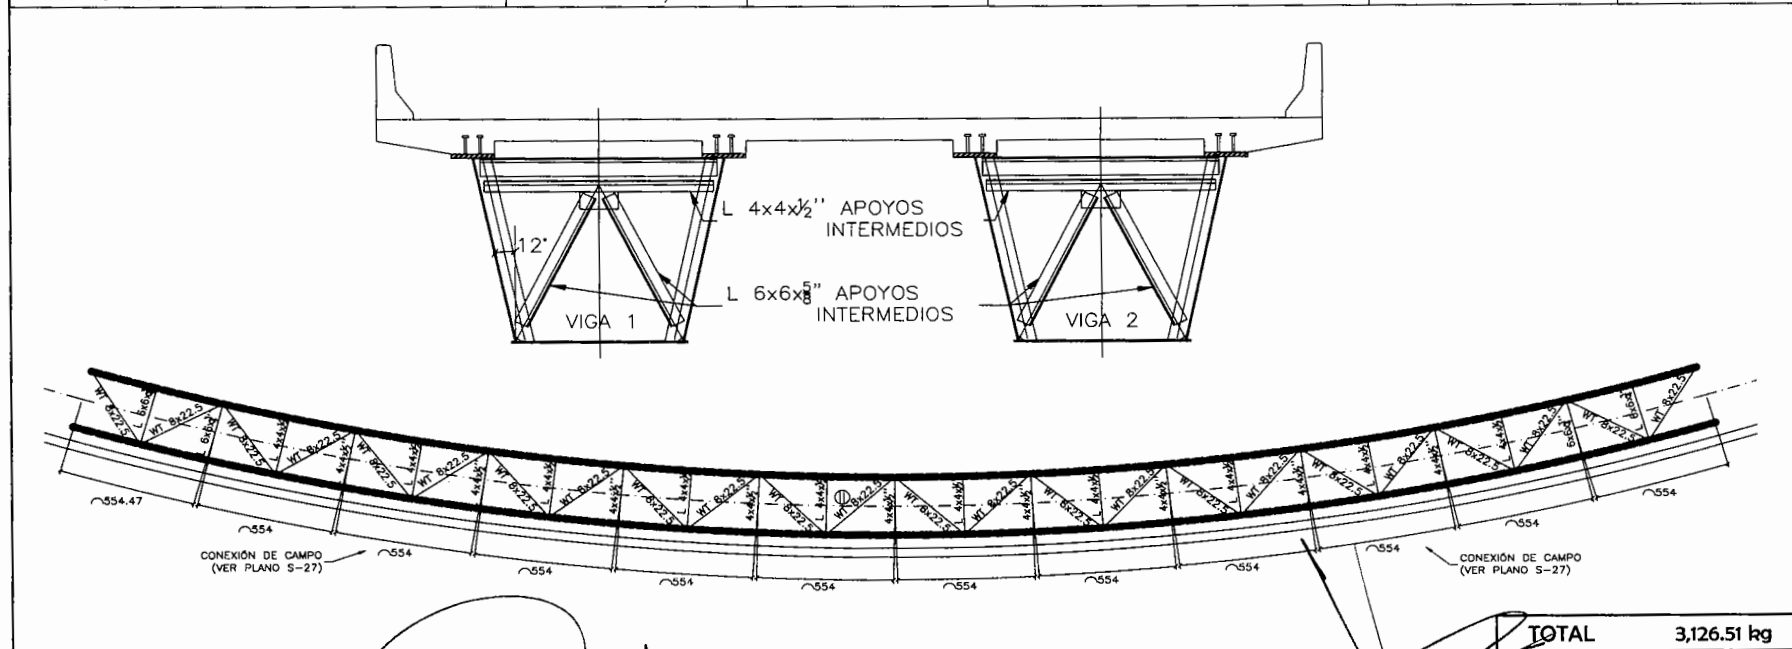

TOTAL 3,126.51 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 9

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

WT Claro 3-4 Viga 2

DESCRIPCION

PESO

LONGITUD

PZA

RESULTADO



WT 8X22.5

33.70

3.50

24

2,830.80 kg

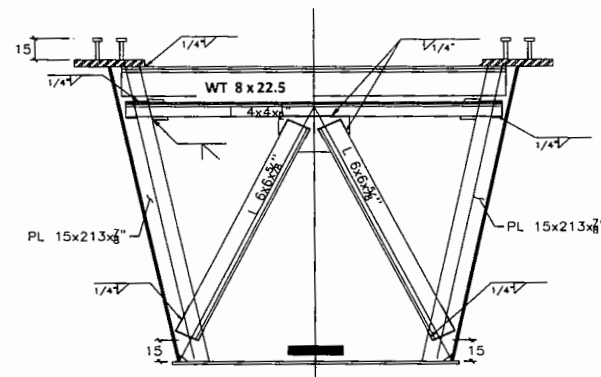

TOTAL 2,830.80 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA


CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

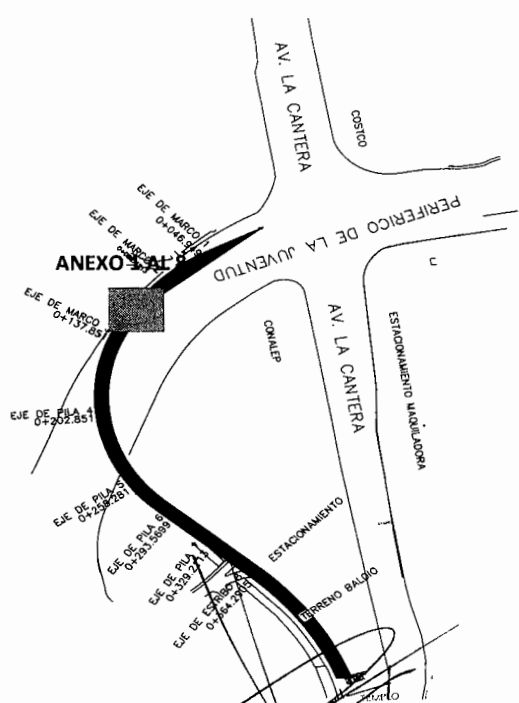CONCEPTO	39	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Fabricación de elementos estructurales , conforme a proyecto y medido en planos y pesos teoricos : Acero estructural A-709 GRADO 50: utilizado en vigas ,contraventeos , diafragmas, (de proyecto) y miscelaneos necesarios. Incluye la fabricacion completa ó en secciones(ademas de las conexiones entre partes de las vigas), los acarrees, desperdicios, maniobras, soldadura, placas de conexion,sandblasteo total, primario anticorrosivo y fletes(cargas, descargas,translados y permisos necesarios) para la puesta de los elementos en obra.		Alma Claro 3-4 Viga 1		107,388.51 kg
	Anexo 1	47,141.82 kg		
		Patin Inferior Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 2	29,626.29 kg		
		Patin Superior Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 3	18,664.04 kg		
		Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 4	3,042.74 kg		
		Placa Conexión Hombro Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 5	192.41 kg		
		Cruceteo Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 6	1,703.65 kg		
		CT Extremos Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 7	1,060.25 kg		
		CT Intermedios Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 8	3,126.51 kg		
		WT Claro 3-4 Viga 1		
	Anexo 9	2,830.80 kg		
		107,388.51 kg		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)



DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Alma Claro 3-4 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO			PZA	RESULTADO
Alma placa 7/8"	174.38	63.46	2.13			2	47,141.82 kg

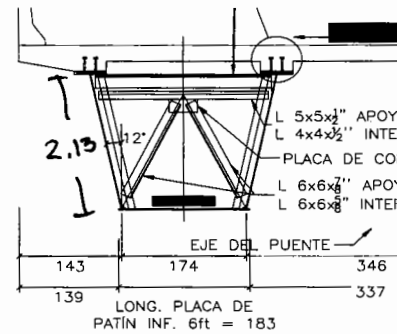

11.88

39.70
63.46

11.88

TOTAL 47,141.82 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2


CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Patín Inferior Claro 3-4 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín inferior sección 2 placa 1 3/4"	348.56	11.88	1.83	1	7,577.83 kg
Patín inferior sección 3 placa 1"	199.18	39.70	1.83	1	14,470.63 kg
Patín inferior sección 4 placa 1 3/4"	348.56	11.88	1.83	1	7,577.83 kg

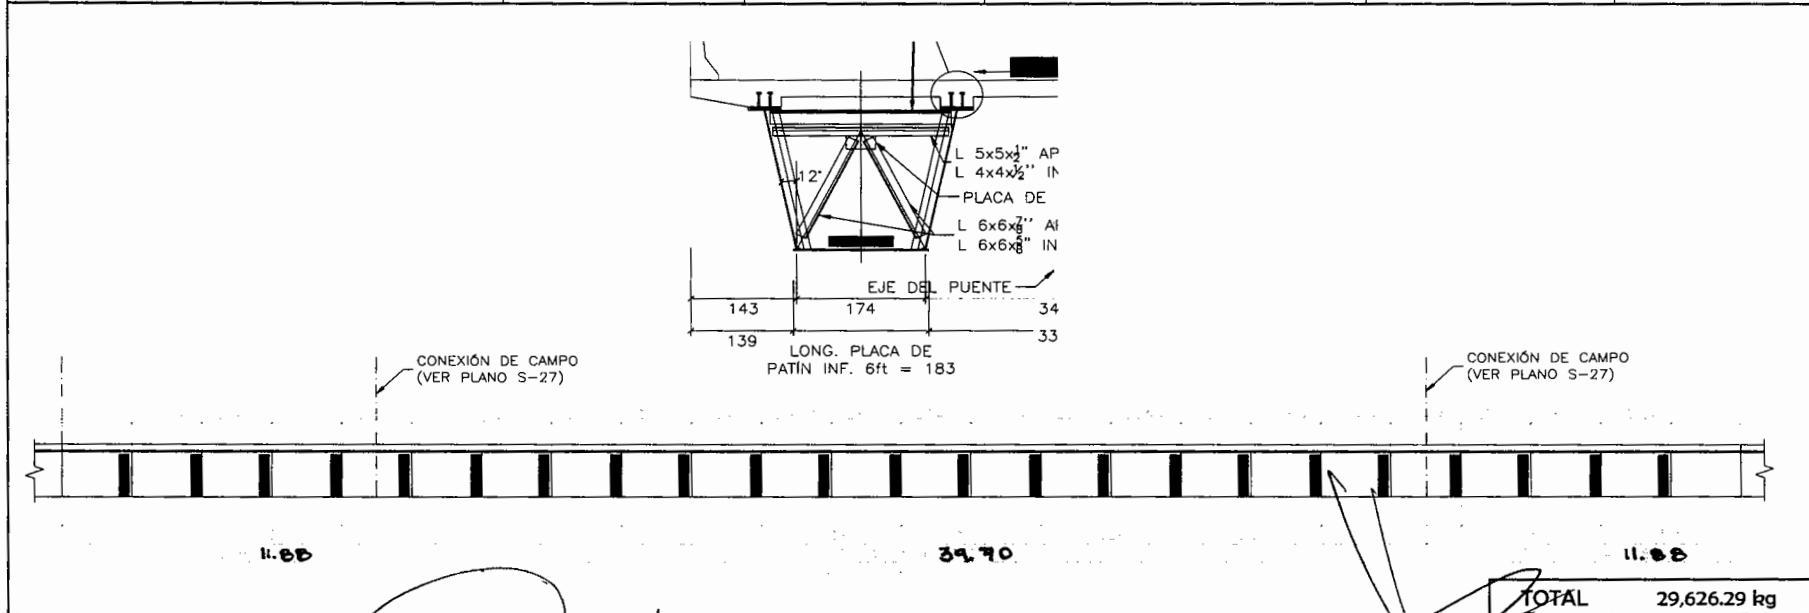

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017			
ACERO SUPERESTRUCTURA					
CONCEPTO :	39				
Patín Superior Claro 3-4 Viga 1					
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín superior sección 2 placa 2"	398.36	11.88	0.61	2	5,773.67 kg
Patín superior sección 3 placa 1"	199.18	39.70	0.45	2	7,116.70 kg
Patín superior sección 4 placa 2"	398.36	11.88	0.61	2	5,773.67 kg

11.88	39.70	11.88
		TOTAL 18,664.04 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 4




CONTRATO :	057/2017	Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA	CONTRATISTA:	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 3-4 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa ½" conexión hombro	99.59	0.170	0.10	46	77.88 kg
Placa ½" conexión centro	99.59	0.45	0.39	23	402.00 kg
Placa 7/8" costillas	174.38	2.13	0.15	46	2,562.86 kg

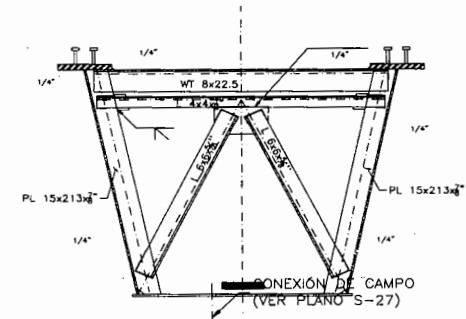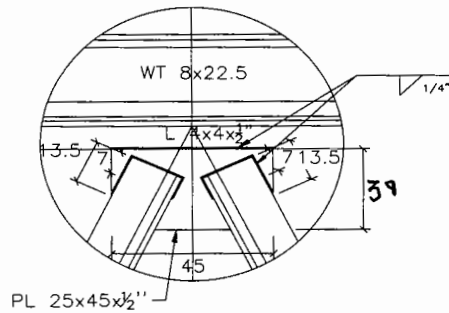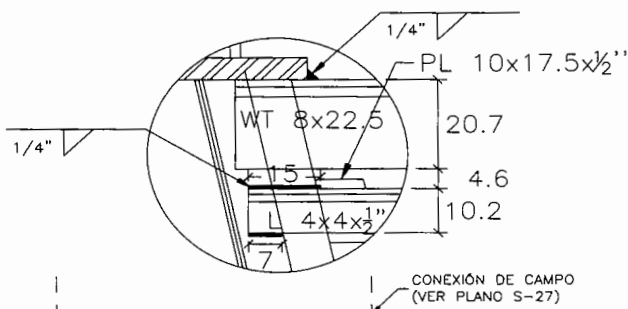

TOTAL 3,042.74 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5


CONTRATO :	057/2017	Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA	CONTRATISTA:	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

Placa Conexión Hombro Claro 3-4 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.42	0.10	46	192.41 kg

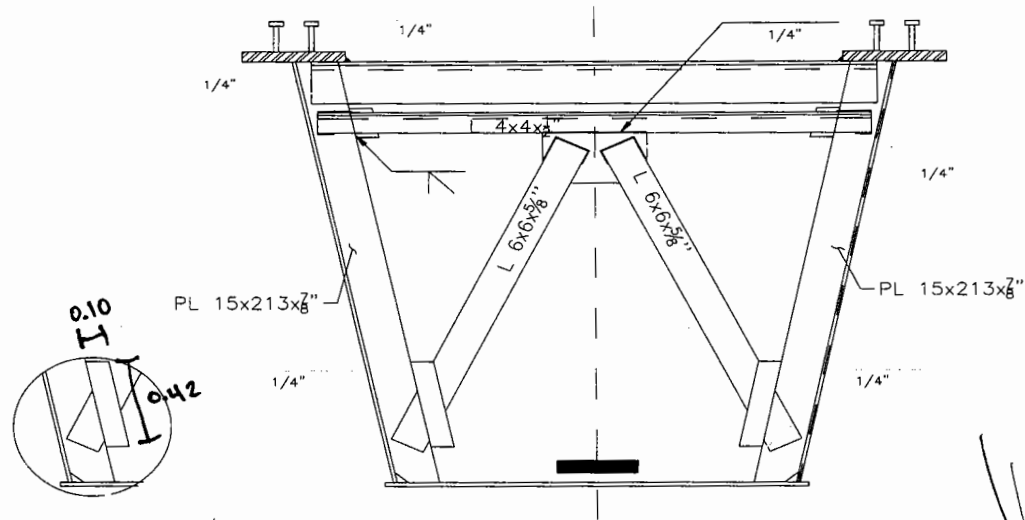

TOTAL 192.41 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 7

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

CT Extremos Claro 3-4 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 6" x 3/4"extremos	42.71	2.40		4	410.02 kg
Angulo para CT de 6" x 7/8"extremos	49.26	1.65		8	650.23 kg

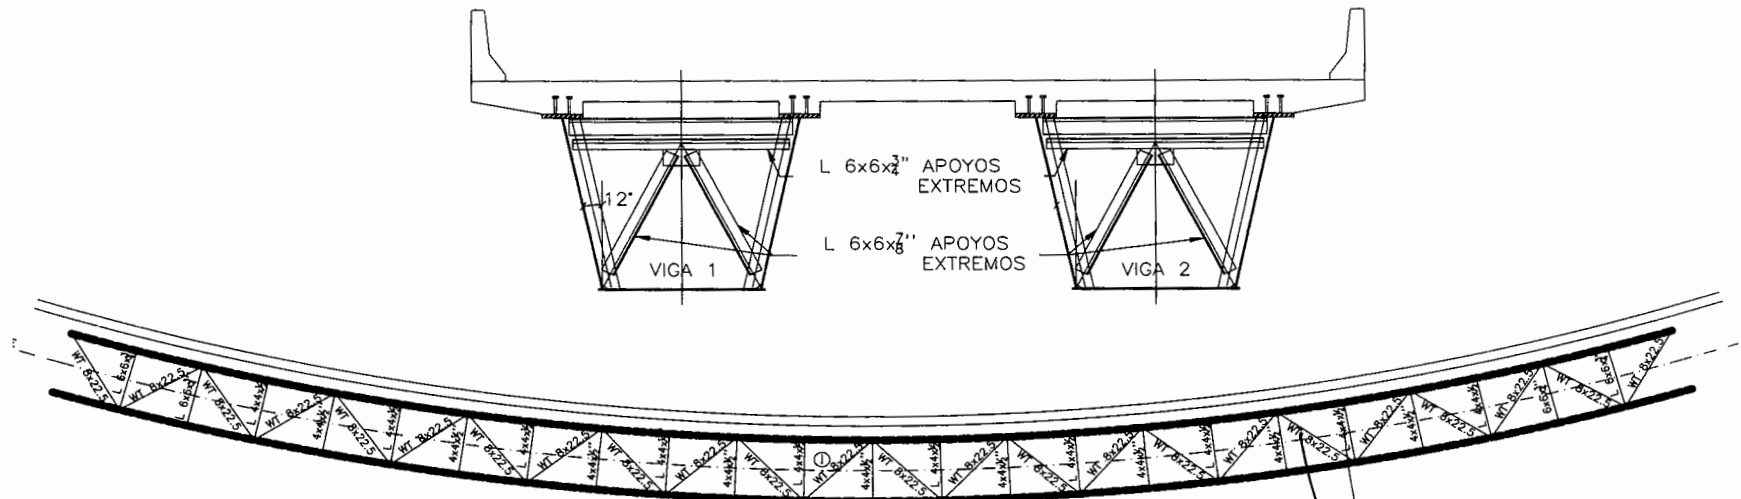

TOTAL 1,060.25 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 8


CONTRATO :	057/2017	Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA	CONTRATISTA:	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

CT Intermedios Claro 3-4 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 4" x 1/2"intermedios	19.05	2.40		19	868.68 kg
Angulo para CT de 6" x 5/8"intermedios	36.01	1.65		38	2,257.83 kg

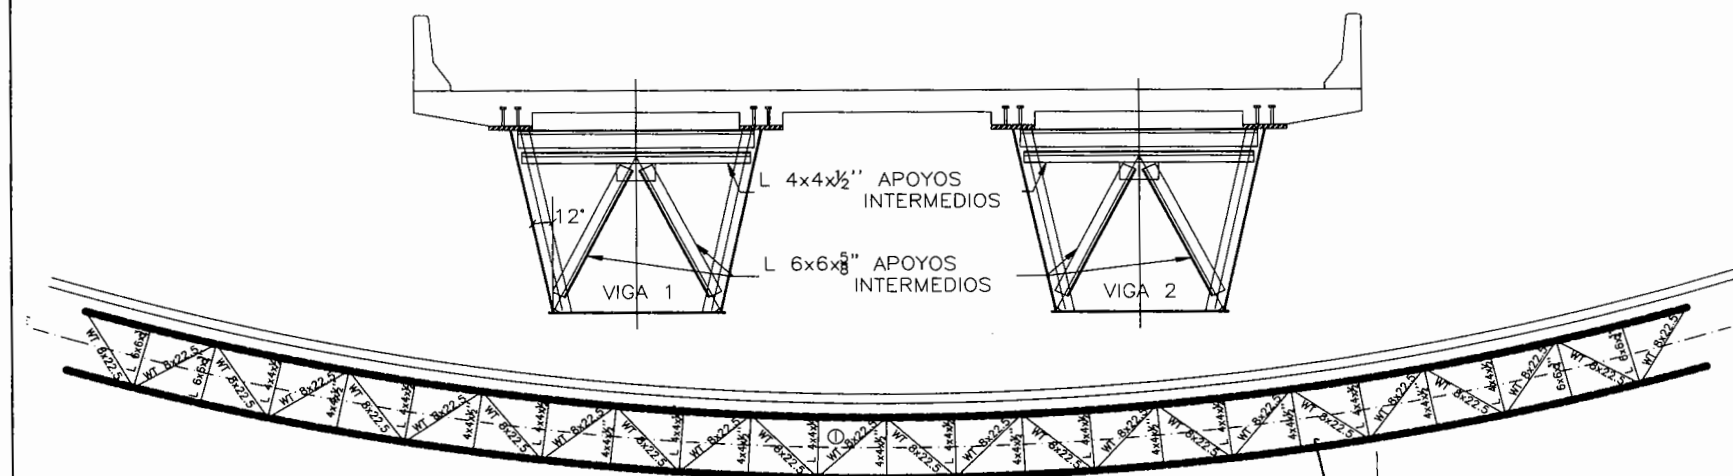

TOTAL 3,126.51 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 9

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)



DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 39

WT Claro 3-4 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
WT 8X22.5	33.70	3.50		24	2,830.80 kg

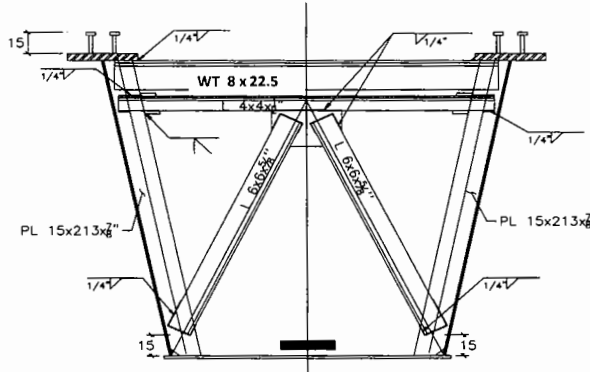

TOTAL 2,830.80 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO: 057/2017


OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

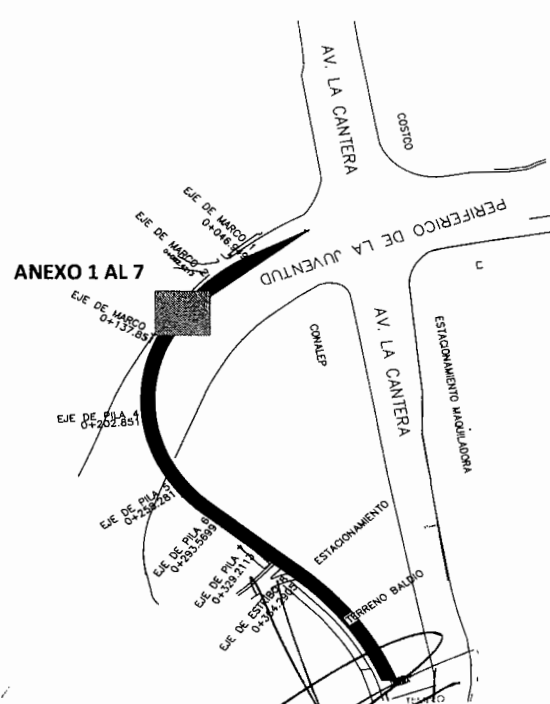CONCEPTO	40	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
		Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2		
Montaje de elementos estructurales metalicos : vigas cajon, contraventeos , diafragmas y miscelaneos necesarios. Incluye maniobras de gruas ,transporte , contravientos provisionales para el colado de la losa, andamios u estructuras de obra falsa requeridas para el montaje, fijacion y colocacion final y todo lo necesario para su correcta instalacion(A cualquier altura y terreno).	Alma Diafragma		ANEXO	6,993.79 kg
	Anexo 1	4,565.06 kg		
	Patin superior Placa 3/4"			
	Anexo 2	222.73 kg		
	Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2			
	Anexo 3	351.34 kg		
	Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2			
	Anexo 4	1,698.45 kg		
	Angulo Conexión 4 x 1/2"			
	Anexo 5	156.21 kg		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	BASE (B)	BASE (b)	ALTURA	AREA	PZA	RESULTADO
Alma de diafragma Placa de 3/4" Viga 1	149.38	2.60	1.72	2.09	4.51	2	1,347.41 kg
Alma de diafragma Placa de 3/4" Centro	149.38	3.39	2.60	2.09	6.26	2	1,870.24 kg
Alma de diafragma Placa de 3/4" Viga 2	149.38	2.60	1.72	2.09	4.51	2	1,347.41 kg

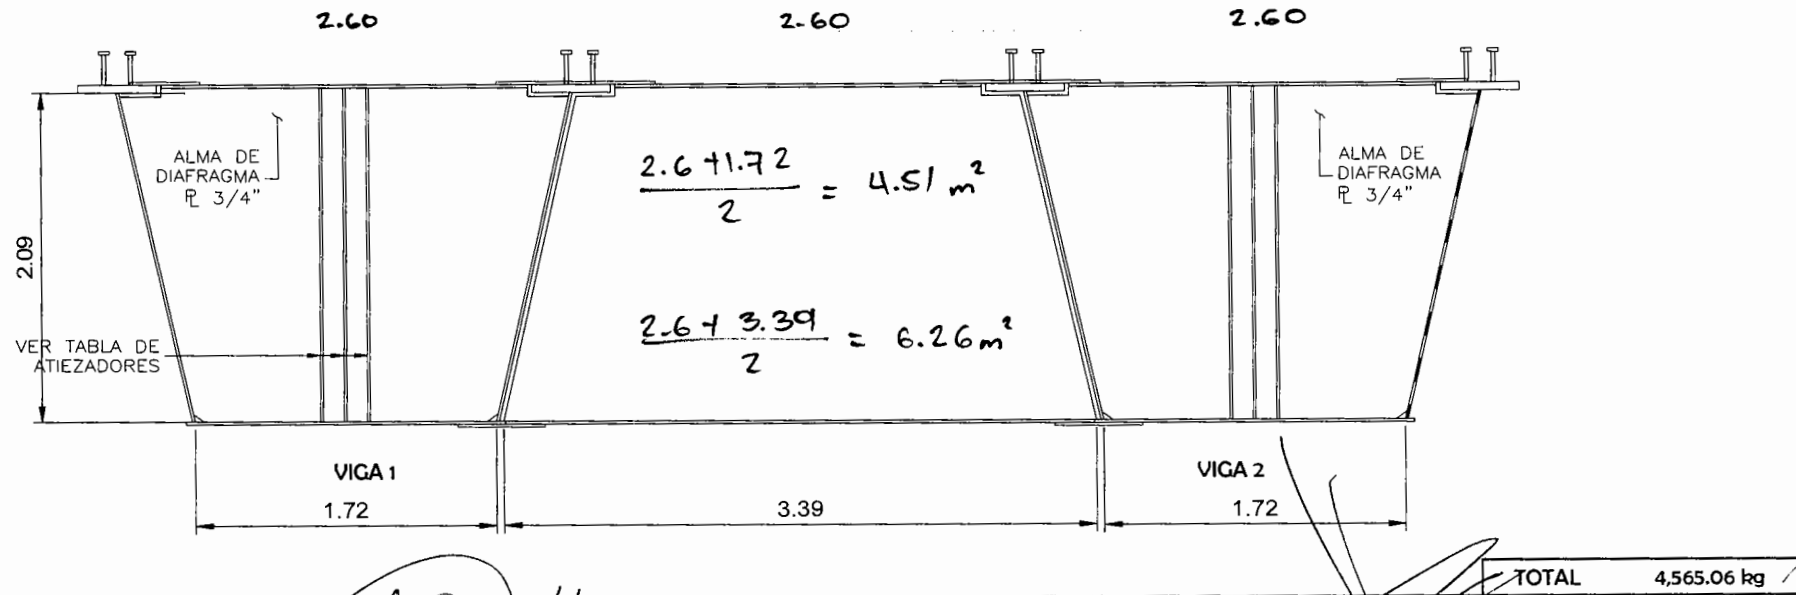

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PIEZAS	RESULTADO
Patin superior Placa 3/4"	149.38	2.13	0.35	2	222.73 kg ✓

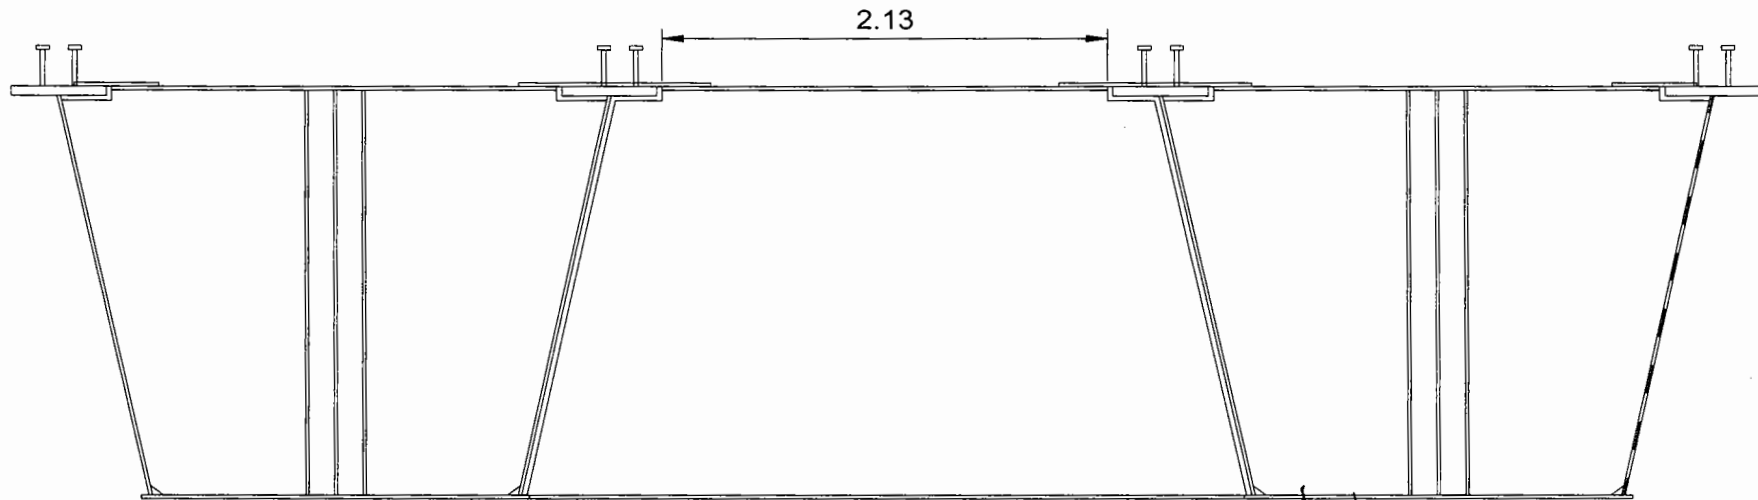

TOTAL 222.73 kg ✓

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patin inferior Placa 3/4"	149.38	3.36	0.35	2	351.34 kg

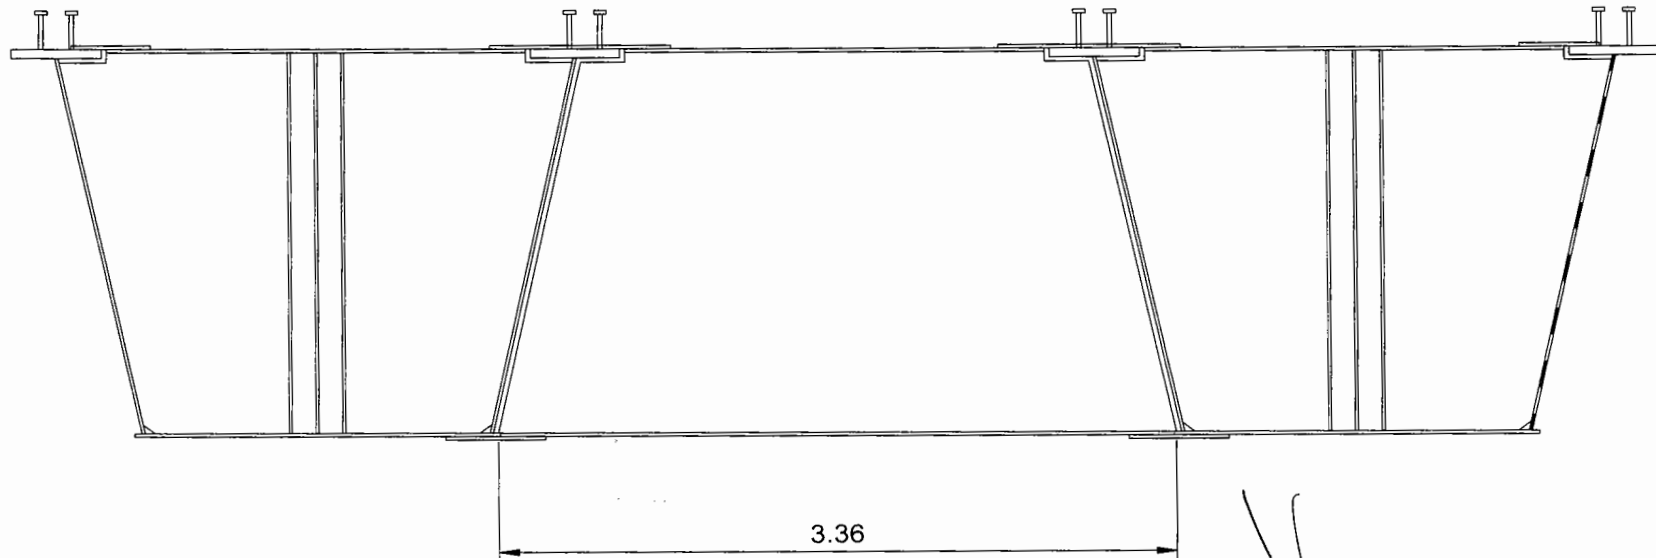

TOTAL 351.34 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 4

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1" atiezadores centro viga	199.18	2.09	0.17	24	1,698.45 kg

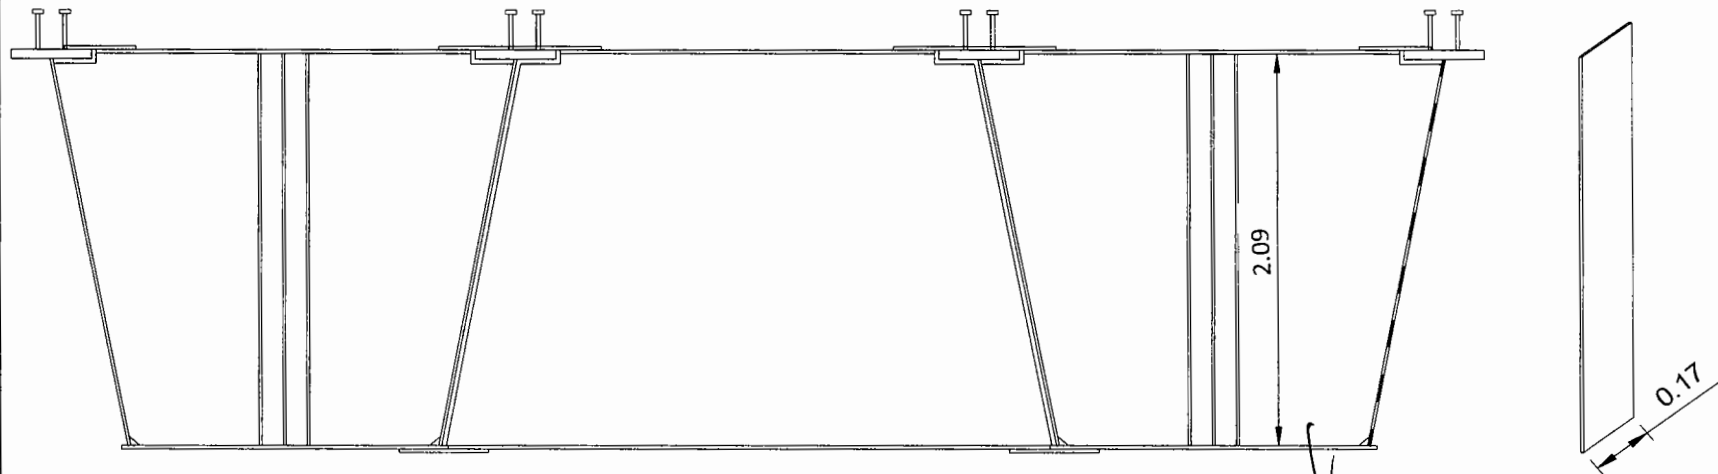

TOTAL

1,698.45 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO EN SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Diafragmas Claro 2-3 Viga 1 y 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo Conexión 4 x 1/2"	19.05	2.05		4	156.21 kg

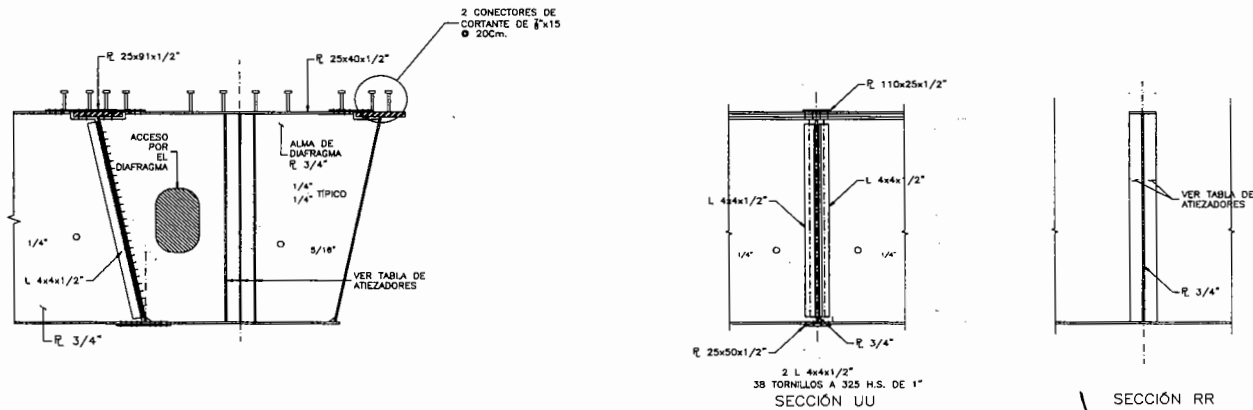

TOTAL 156.21 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.


No. DE ESTIMACION

8

(OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

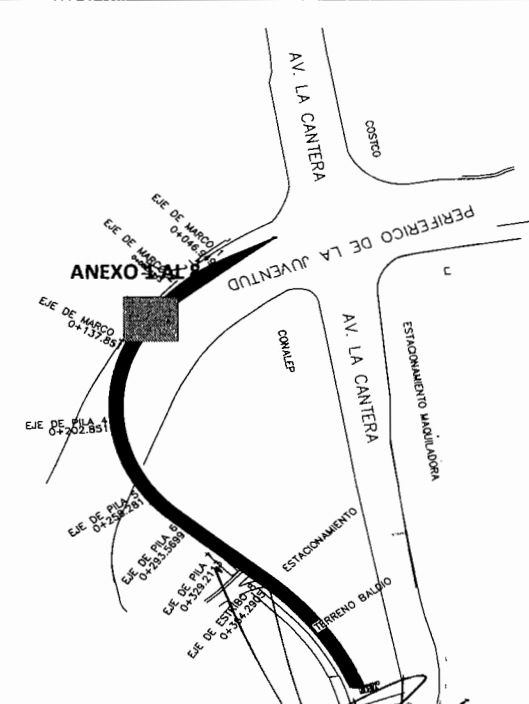CONCEPTO	40	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Montaje de elementos estructurales metalicos : vigas cajon, contraventeos , diafragmas y miscelaneos necesarios. Incluye maniobras de gruas ,transporte , contravientos provisionales para el colado de la losa,andamios u estructuras de obra falsa requeridas para el montaje, fijacion y colocacion final y todo lo necesario para su correcta instalacion(A cualquier altura y terreno).	Alma Claro 2-3 Viga 1			37.67 kg
	Anexo 1	40,121.80 kg		
	Patin Inferior Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 2	21,165.08 kg		
	Patin Superior Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 3	15,068.25 kg		
	Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 4	2,513.57 kg		
	Placa Conexión Hombro Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 5	158.95 kg		
	Cruceteo Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 6	1,407.36 kg		
	CT Extremos Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 7	881.69 kg		
	CT Intermedios Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 8	2,468.30 kg		
	WT Claro 2-3 Viga 1			
	Anexo 9	3,493.00 kg		
Total		87,278.00 kg		
Estimado anterior		87,240.33 kg		
Para esta estimacion		37.67 kg		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera					
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.					
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017					
ACERO SUPERESTRUCTURA							
CONCEPTO :	40						
Alma Claro 2-3 Viga 1							
DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO			PZA	RESULTADO
Alma placa 7/8"	174.38	54.01	2.13			2	40,121.80 kg

The drawing includes a cross-section of a truss bridge and a longitudinal view of the beam. The cross-section shows a truss with various members labeled: L 5x5x1/2" APOY, L 4x4x1/2" INTE, PLACA DE COI, L 6x6x7/8" APOY, and L 6x6x7/8" INTEF. Dimensions for the cross-section include 12", 143, 174, 346, 139, and 337. The longitudinal view shows a beam with a total length of 540.1, divided into two sections: SECCIÓN 1 = 3645 and SECCIÓN 2 = 1756. The beam is supported by two abutments, EST. 0+137.851 and EST. 0+137.851, with a central support labeled CONEXIÓN DE CAMPO (VER PLANO S-27). The beam is labeled ALMA PLACA 7/8" and the longitudinal view is labeled LONGITUD VIGA 1 = 540.1.

TOTAL	40,121.80 kg
--------------	---------------------

RESIDENTE
INC. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Patin Inferior Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín inferior sección 1 placa 3/4"	149.38	36.45	1.83	1	9,964.17 kg
Patín inferior sección 2 placa 1 3/4"	348.56	17.56	1.83	1	11,200.91 kg

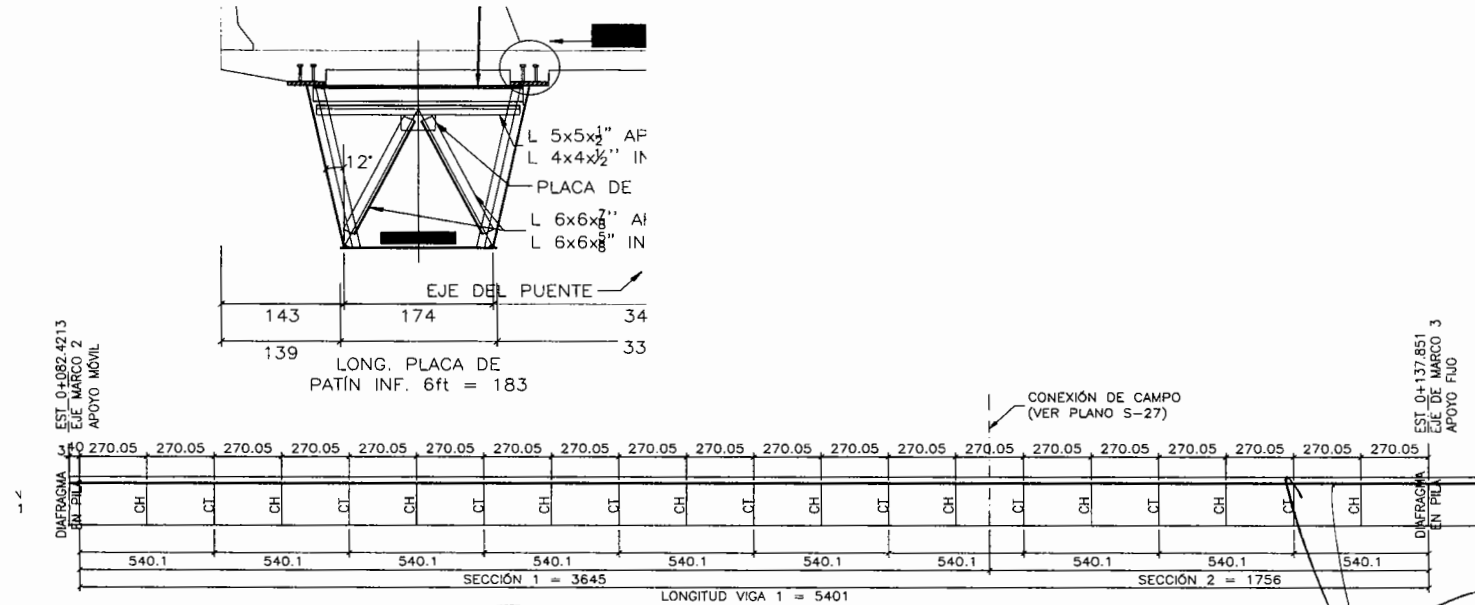

TOTAL 21,165.08 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Patin Superior Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín superior sección 1 placa 1"	199.18	36.45	0.45	2	6,534.10 kg
Patín superior sección 2 placa 2"	398.36	17.56	0.61	2	8,534.15 kg

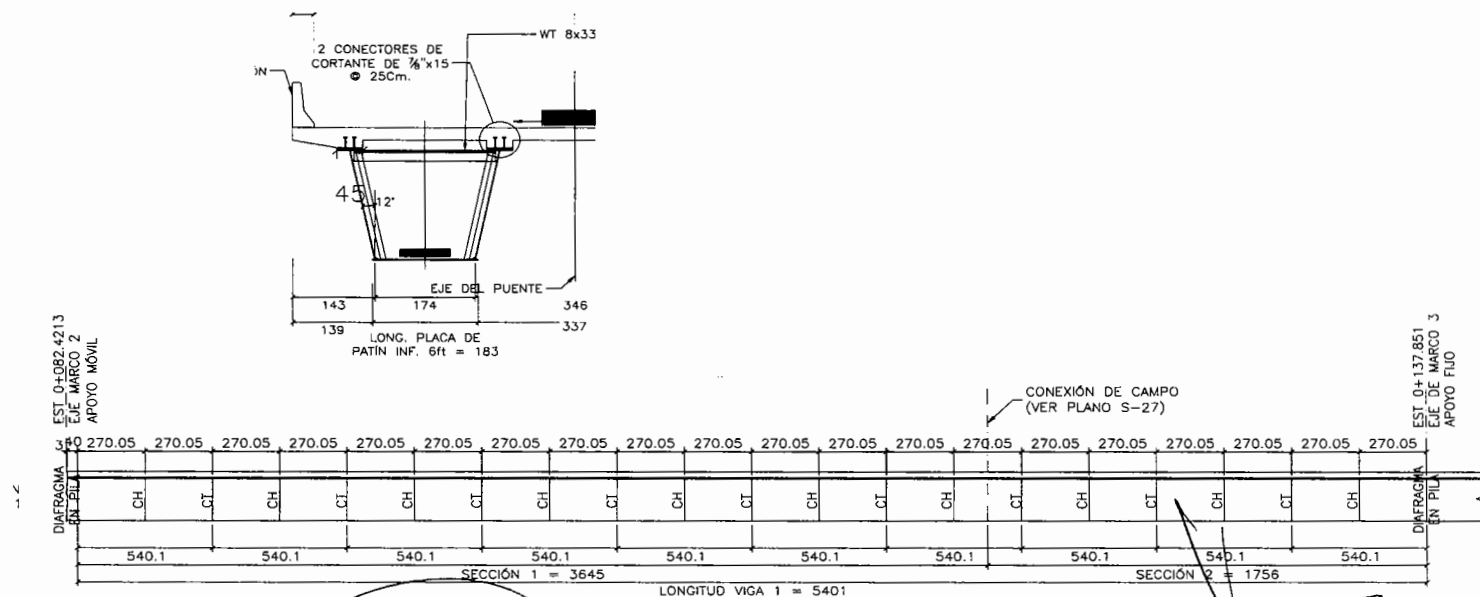

TOTAL 15,068.25 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 4

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)




DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.170	0.10	38	64.34 kg
Placa 1/2" conexión centro	99.59	0.45	0.39	19	332.08 kg
Placa 7/8" costillas	174.38	2.13	0.15	38	2,117.15 kg

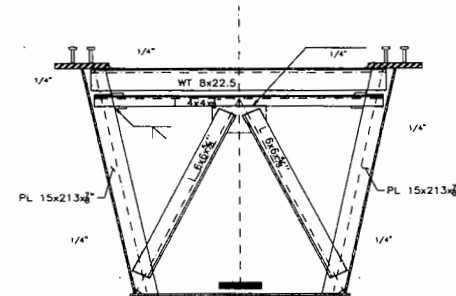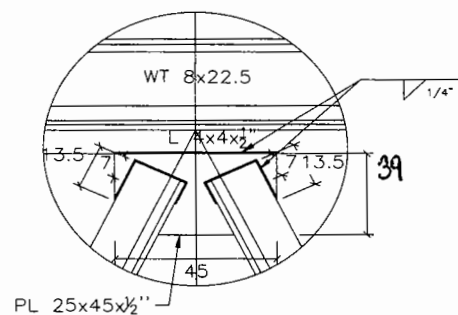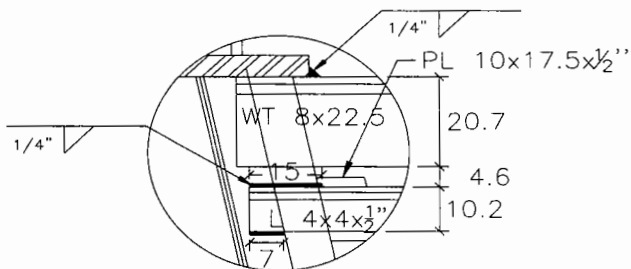

TOTAL 2,513.57 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)



DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Placa Conexión Hombro Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.42	0.10	38	158.95 kg

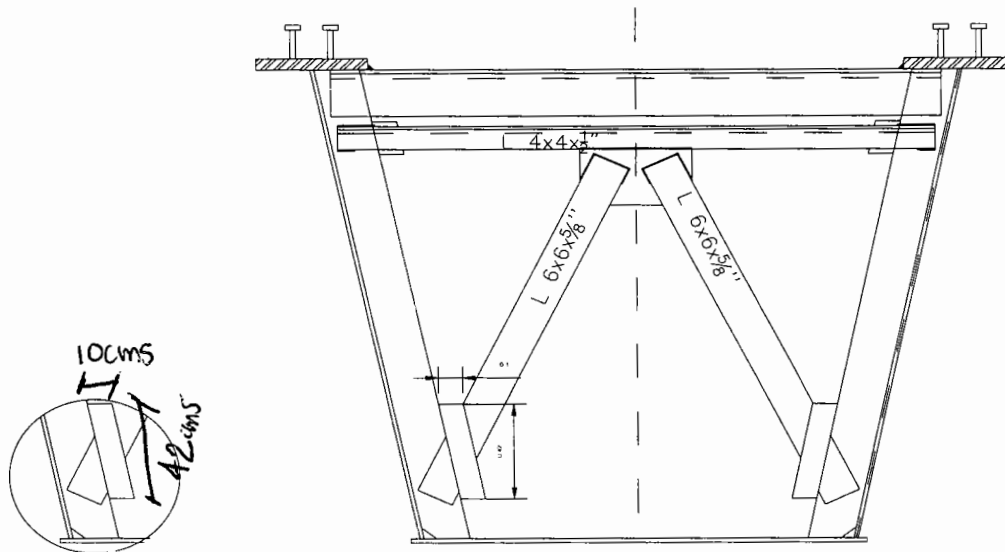

TOTAL 158.95 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 6

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Cruceteo Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 5/8 Cruceteo	124.49	1.70	0.35	19	1,407.36 kg

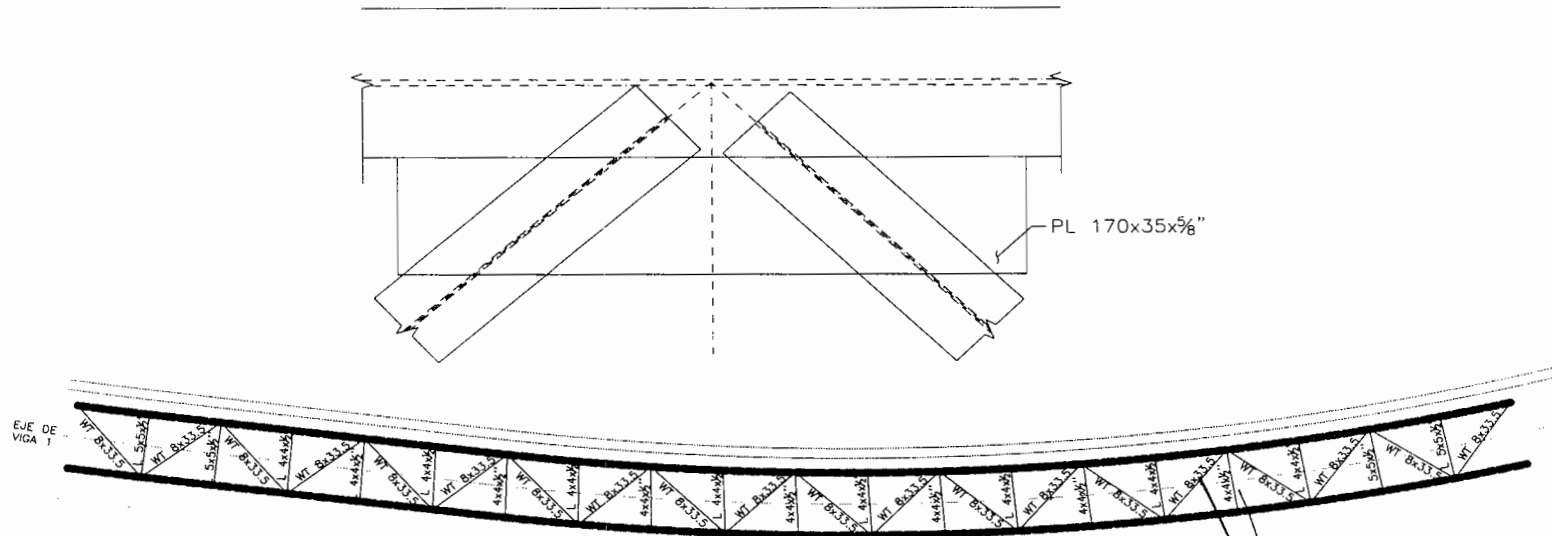

TOTAL 1,407.36 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 7


CONTRATO :	057/2017	Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA	CONTRATISTA:	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO :	40
------------	----

CT Extremos Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 5" x 1/2" extremos	24.11	2.40		4	231.46 kg
Angulo para CT de 6" x 7/8" extremos	49.26	1.65		8	650.23 kg

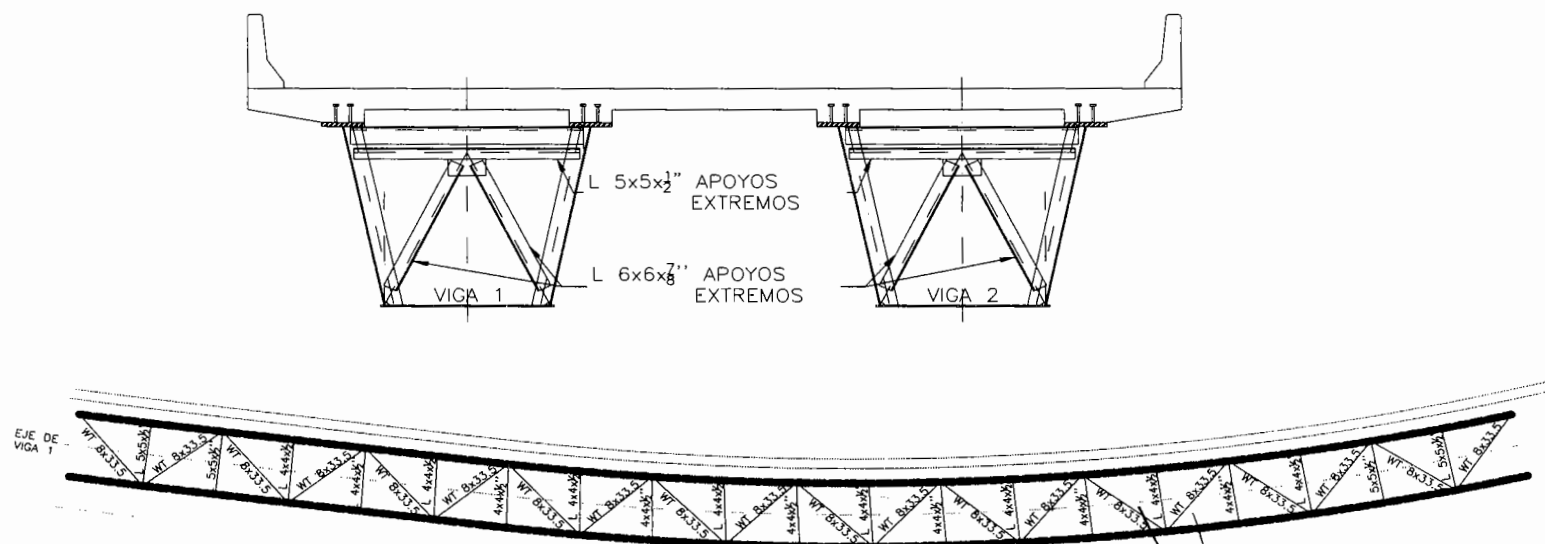

TOTAL 881.69 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 8

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

CT Intermedios Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 4" x 1/2"intermedios	19.05	2.40		15	685.80 kg
Angulo para CT de 6" x 5/8"intermedios	36.01	1.65		30	1,782.50 kg

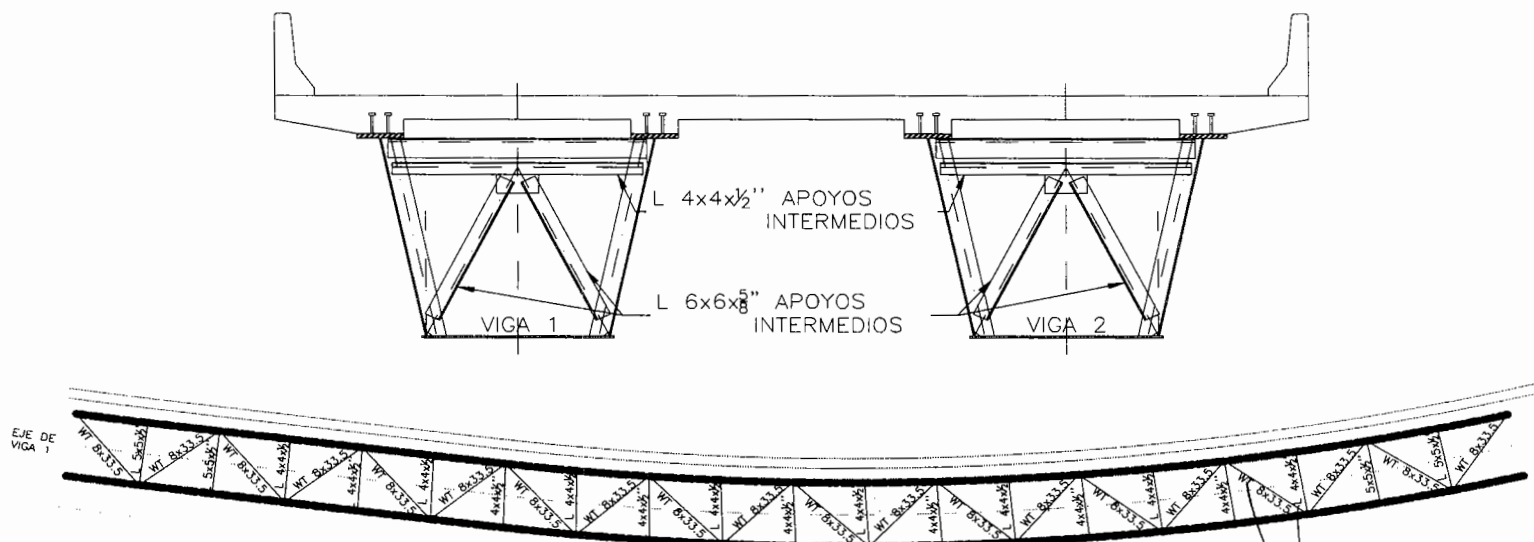

TOTAL 2,468.30 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 9

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

WT Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
WT 8X33.5	49.90	3.50		20	3,493.00 kg

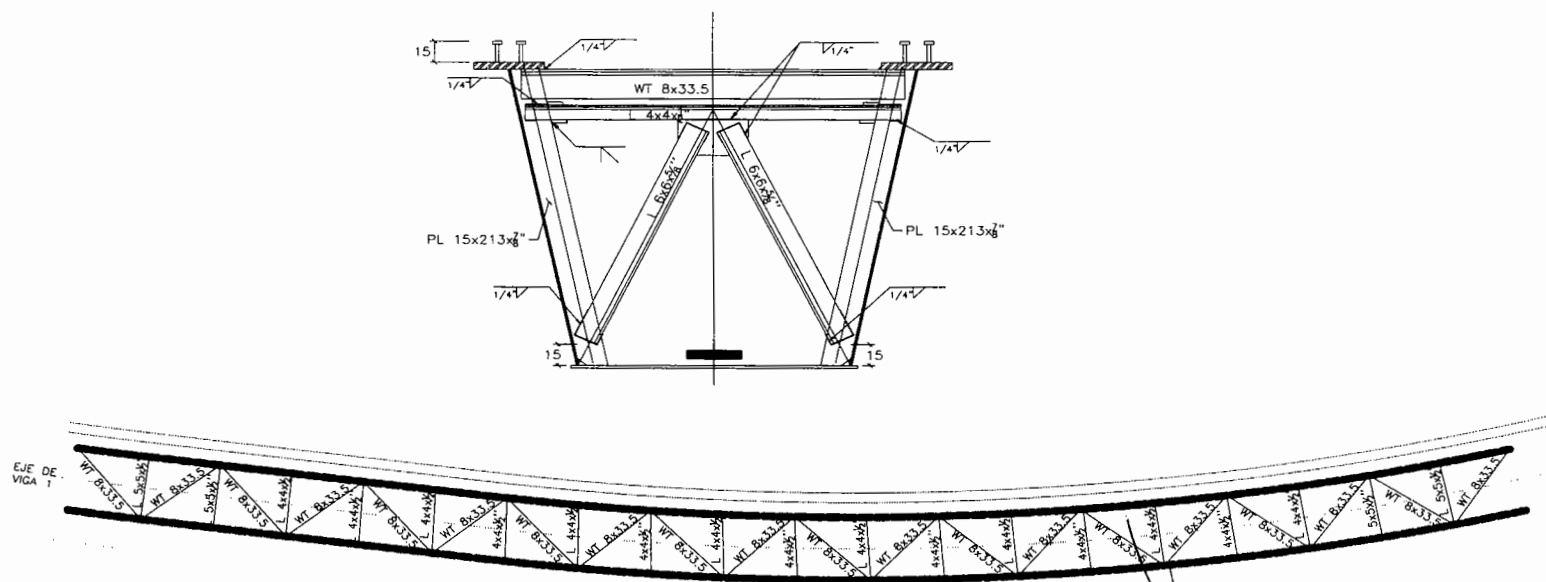

TOTAL 3,493.00 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA


CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

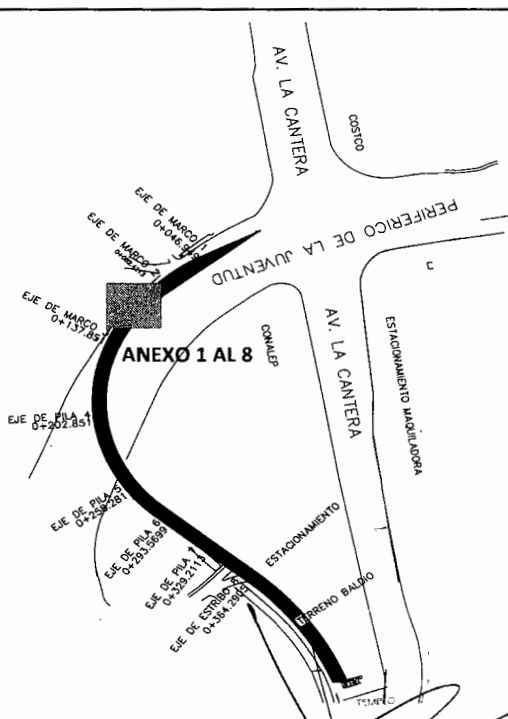CONCEPTO	40	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Montaje de elementos estructurales metalicos : vigas cajon, contraventeos , diafragmas y miscelaneos necesarios. Incluye maniobras de gruas ,transporte , contravientos provisionales para el colado de la losa, andamios u estructuras de obra falsa requeridas para el montaje, fijacion y colocacion final y todo lo necesario para su correcta instalacion(A cualquier altura y terreno).		Alma Claro 2-3 Viga 2		90,067.93 kg
	Anexo 1	41,592.66 kg		
		Patin Inferior Claro 2-3 Viga 2		
	Anexo 2	21,935.97 kg		
		Patin Superior Claro 2-3 Viga 2		
	Anexo 3	15,616.43 kg		
		Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 2-3 Viga 2		
	Anexo 4	2,513.57 kg		
		Placa Conexión Hombro Claro 2-3 Viga 1		
	Anexo 5	158.95 kg		
		Cruceteo Claro 2-3 Viga 2		
	Anexo 6	1,407.36 kg		
		CT Extremos Claro 2-3 Viga 2		
	Anexo 7	881.69 kg		
		CT Intermedios Claro 2-3 Viga 2		
	Anexo 8	2,468.30 kg		
		WT Claro 2-3 Viga 2		
	Anexo 9	3,493.00 kg		
		90,067.93 kg		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Alma Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Alma placa 7/8"	174.38	55.99	2.13	2	41,592.66 kg

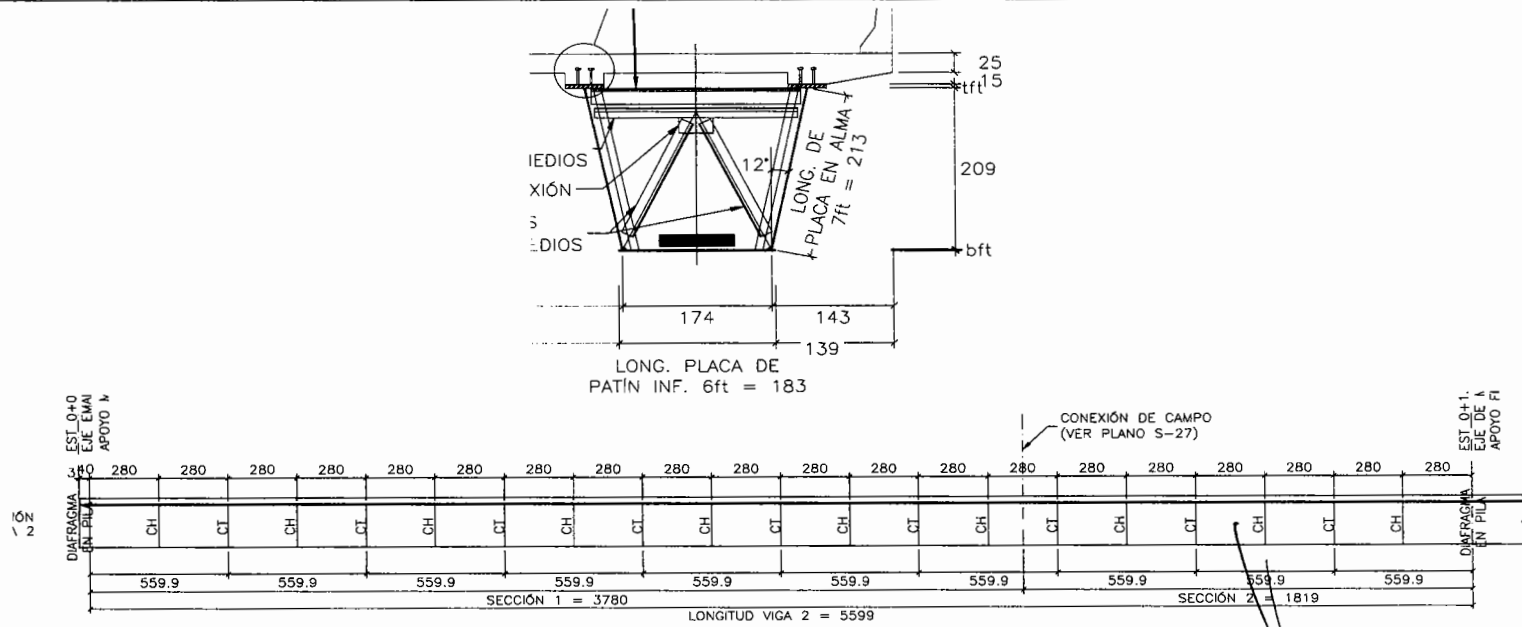

TOTAL 41,592.66 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)



DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Patin Inferior Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín inferior sección 1 placa 3/4"	149.38	37.80	1.83	1	10,333.21 kg
Patín inferior sección 2 placa 1 3/4"	348.56	18.19	1.83	1	11,602.76 kg

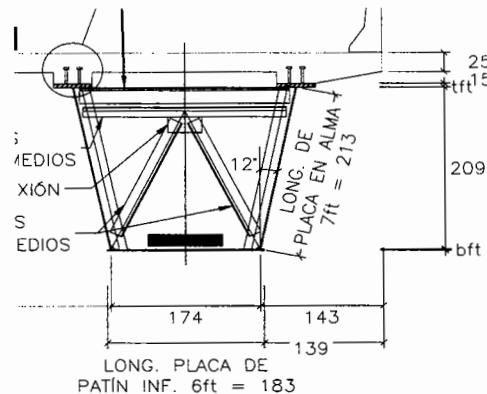

TOTAL 21,935.97 kg

RESIDENTE

ING. ROBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Patin Superior Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Patín superior sección 1 placa 1"	199.18	37.80	0.45	2	6,776.10 kg
Patín superior sección 2 placa 2"	398.36	18.19	0.61	2	8,840.33 kg

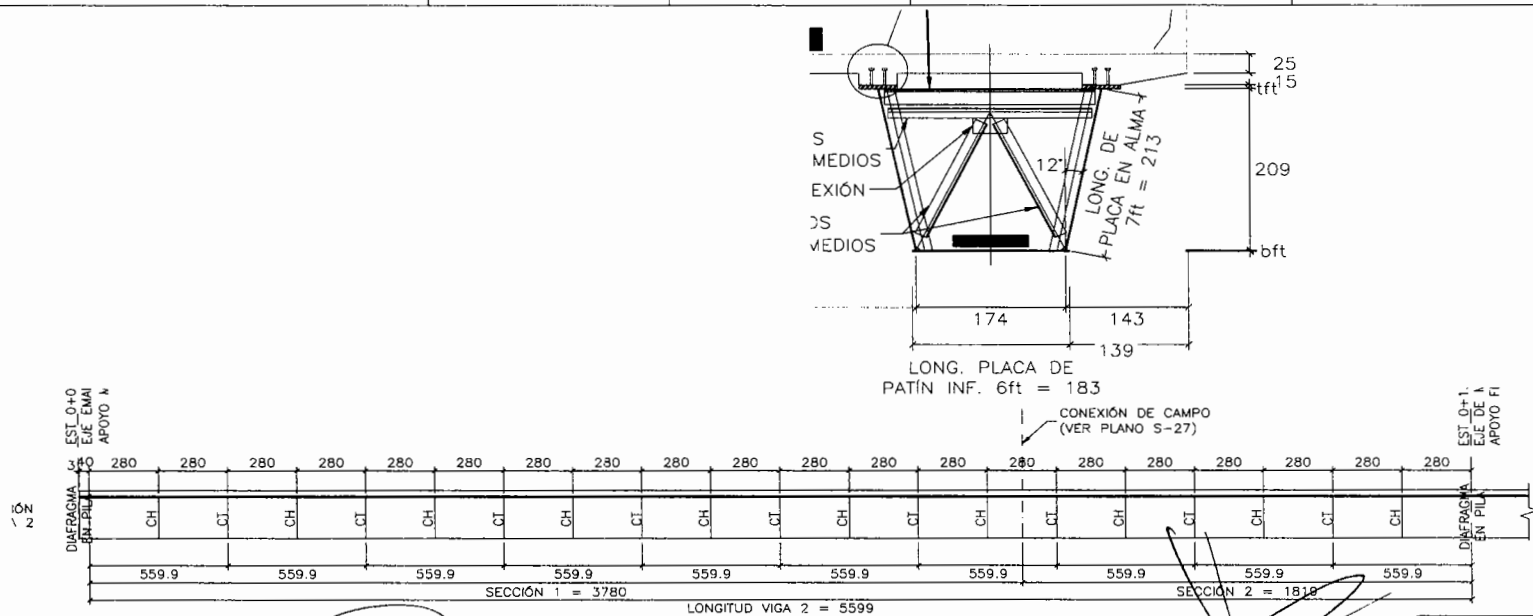

TOTAL 15,616.43 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 4




CONTRATO : 057/2017		Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera	
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA		CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	8 (OCHO)	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO :	40
------------	----

Placa Conexión Hombro, Centro y Costillas Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa ½" conexión hombro	99.59	0.17	0.10	38	64.34 kg
Placa ½" conexión centro	99.59	0.45	0.39	19	332.08 kg
Placa 7/8" costillas	174.38	2.13	0.15	38	2,117.15 kg

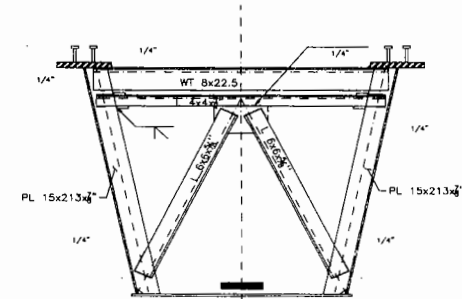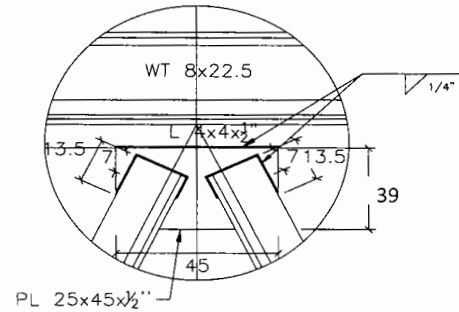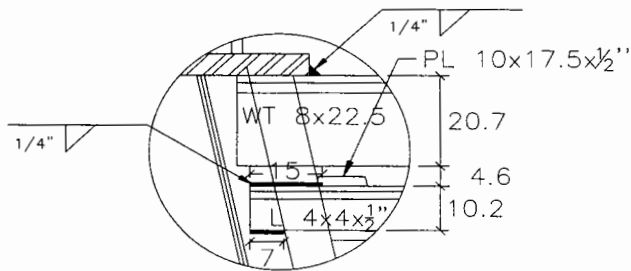

TOTAL 2,513.57 kg

RESIDENTE
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 5

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Placa Conexión Hombro Claro 2-3 Viga 1

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 1/2" conexión hombro	99.59	0.42	0.10	38	158.95 kg

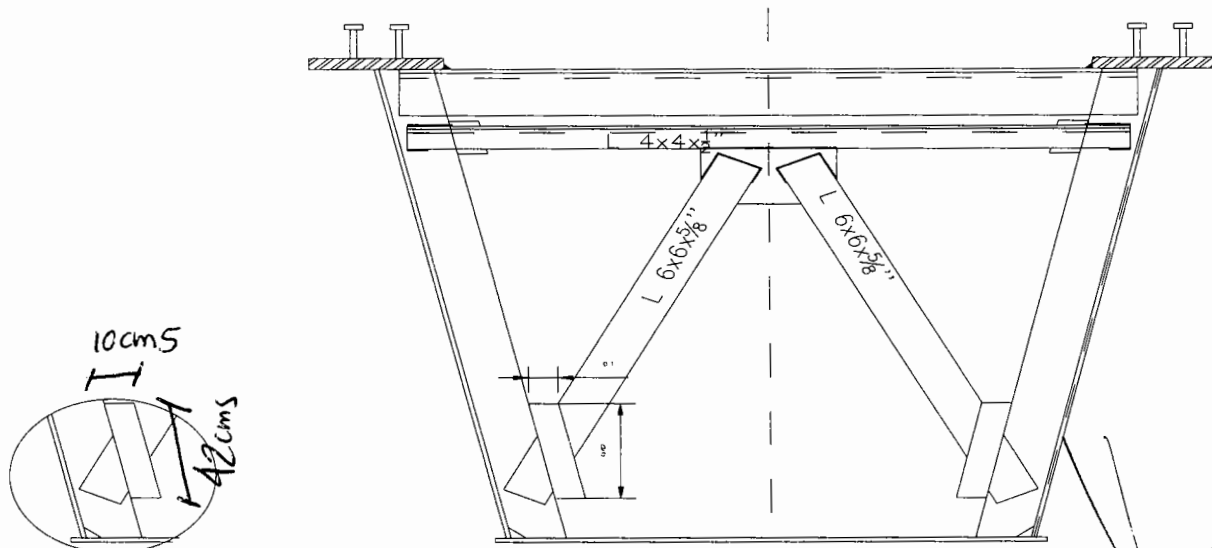

TOTAL 158.95 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 6

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

Cruceteo Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Placa 5/8 Cruceteo	124.49	1.70	0.35	19	1,407.36 kg

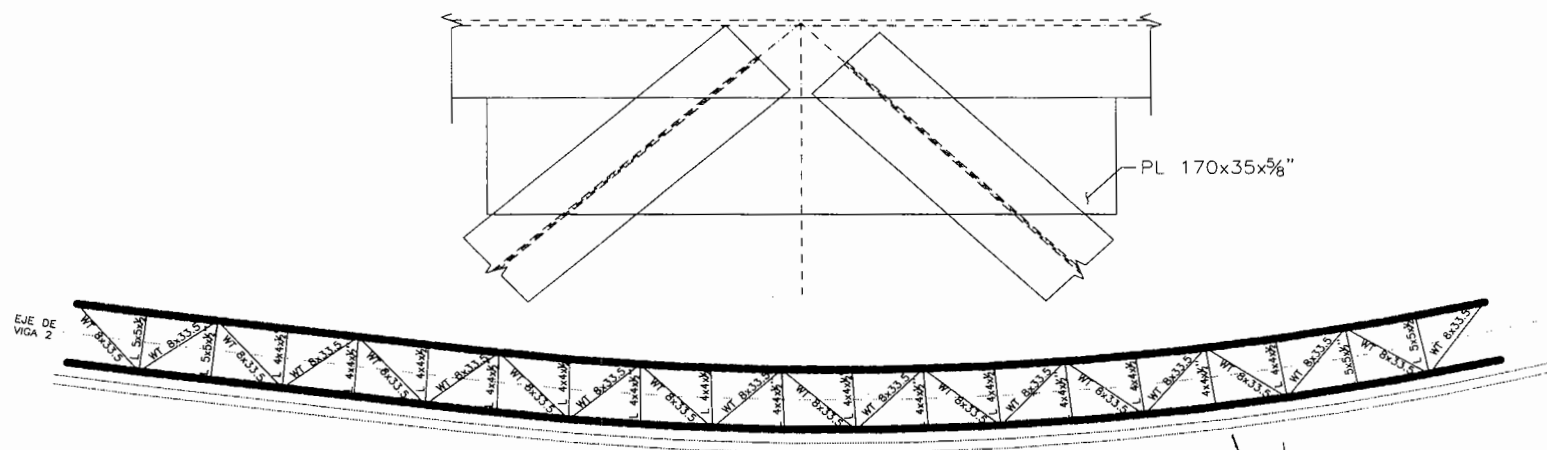

TOTAL 1,407.36 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 7

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

CT Extremos Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 5" x 1/2" extremos	24.11	2.40		4	231.46 kg
Angulo para CT de 6" x 7/8" extremos	49.26	1.65		8	650.23 kg

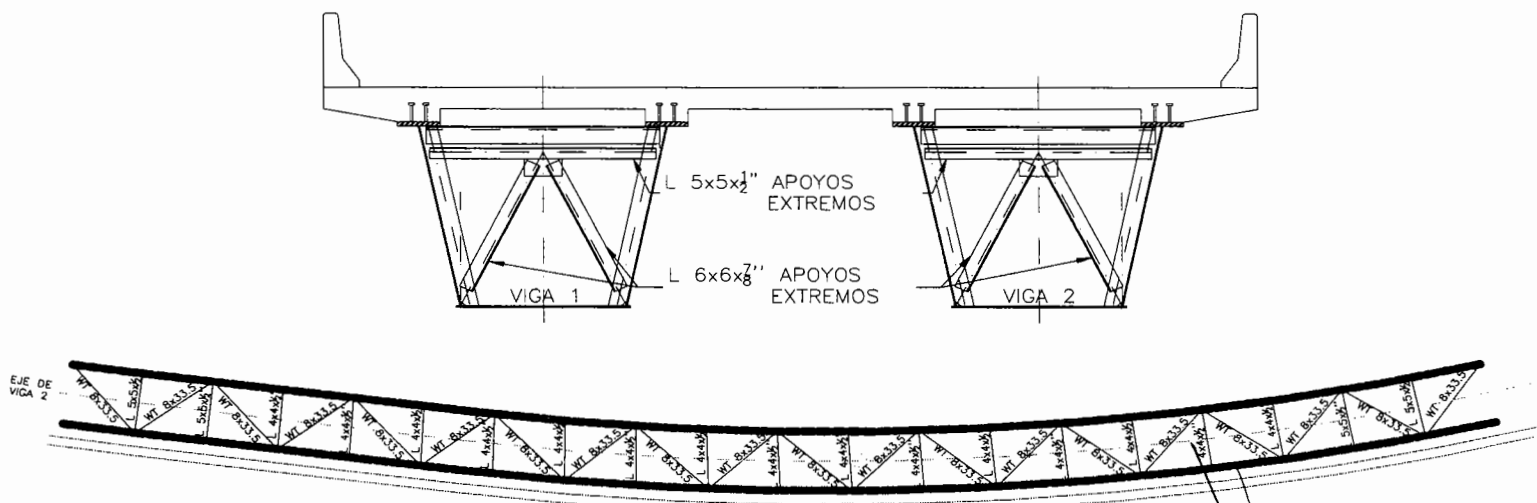

TOTAL 881.69 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 8

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)


DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

CT Intermedios Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
Angulo para CT de 4" x 1/2"intermedios	19.05	2.40		15	685.80 kg
Angulo para CT de 6" x 5/8"intermedios	36.01	1.65		30	1,782.50 kg

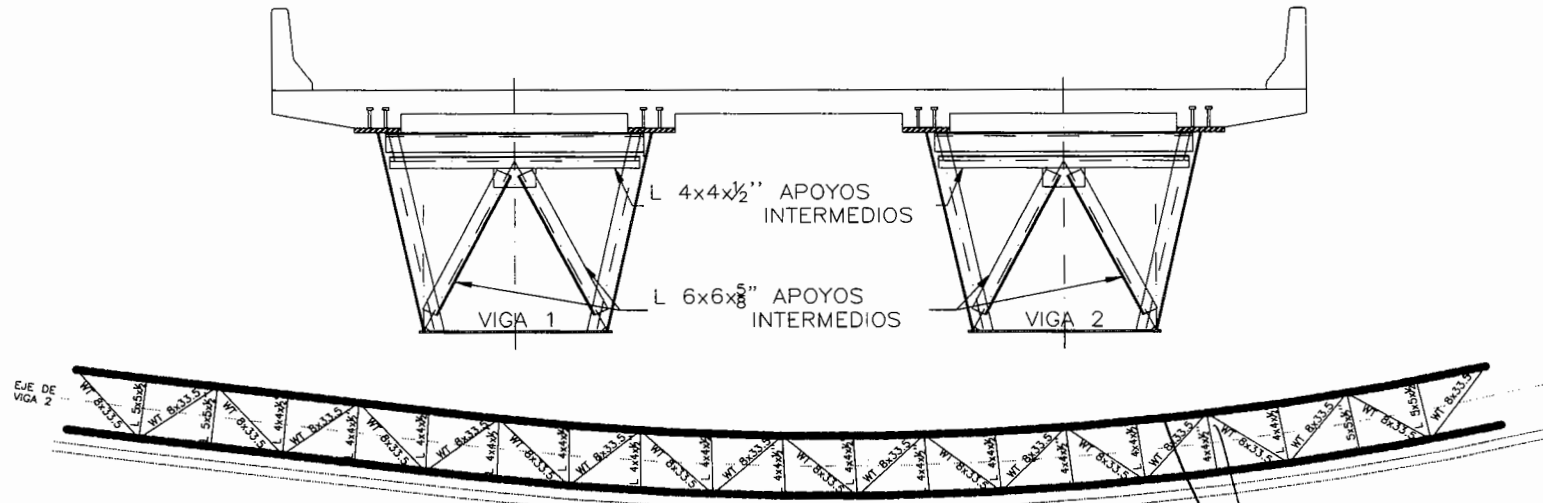

TOTAL 2,468.30 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 9

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)



DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 40

WT Claro 2-3 Viga 2

DESCRIPCION	PESO	LONGITUD	ANCHO	PZA	RESULTADO
WT 8X33.5	49.90	3.50		20	3,493.00 kg

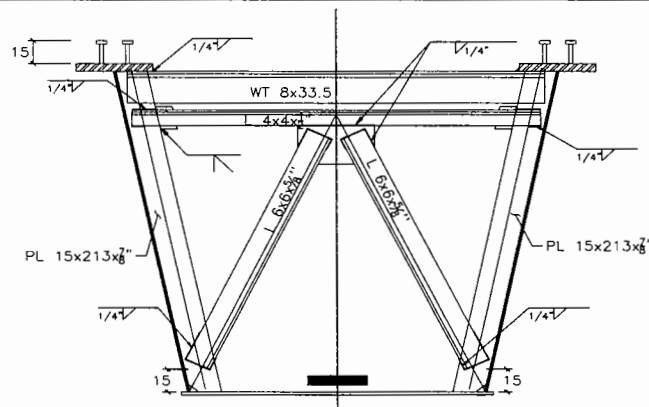

TOTAL 3,493.00 kg

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION

8

(OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO	41	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro ,instalacion y montaje conectores de cortante 7/8"x11.5cms	Conectores de cortante tramo 2-3 Viga 1		ANEXO 	1,988 pzs
	Anexo 1	976 pzs		
	Conectores de cortante tramo 2-3 Viga 2			
	Anexo 2	1,012 pzs		
		1,988 pzs pza		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017


ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 41

Conectores de cortante tramo 2-3 Viga 1


PIEZA	LONGITUD DE VIGA	(LONG. + 0.25)+1	(LONG. + 0.20)+1	PIEZAS	RESULTADO
Conector de 7/8" x 10" @ 20	54.04		271	2	542 pzs
Conector de 7/8" x 10" @ 25	54.04	217		2	434 pzs

2 CONECTORES DE
CORTANTE DE 7/8"x15
@ 25Cm.

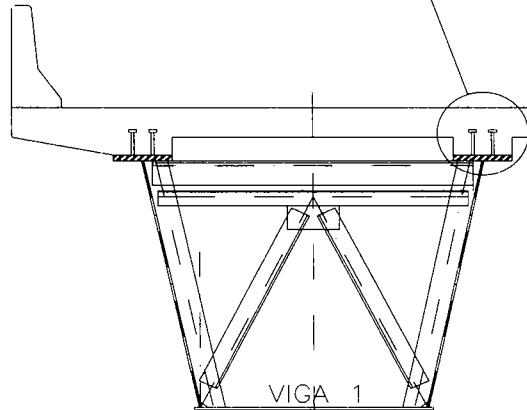

VIGA 1

2 CONECTORES DE
CORTANTE DE 7/8"x15
@ 20Cm.

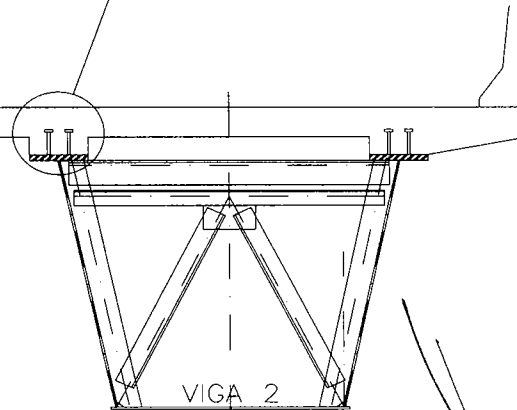

VIGA 2

TOTAL 976 pzs

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017


ACERO SUPERESTRUCTURA

CONCEPTO : 41


Conectores de cortante tramo 2-3 Viga 2

PIEZA	LONGITUD DE VIGA	(LONG. + 0.25)+1	(LONG. + 0.20)+1	PIEZAS	RESULTADO
Conector de 7/8" x 10" @ 20	55.99		281	2	562 pzs
Conector de 7/8" x 10" @ 25	55.99	225		2	450 pzs

2 CONECTORES DE
CORTANTE DE 7/8"x15
@ 25Cm.

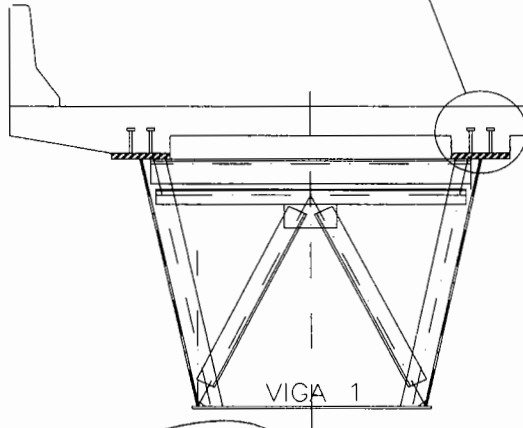

2 CONECTORES DE
CORTANTE DE 7/8"x15
@ 20Cm.

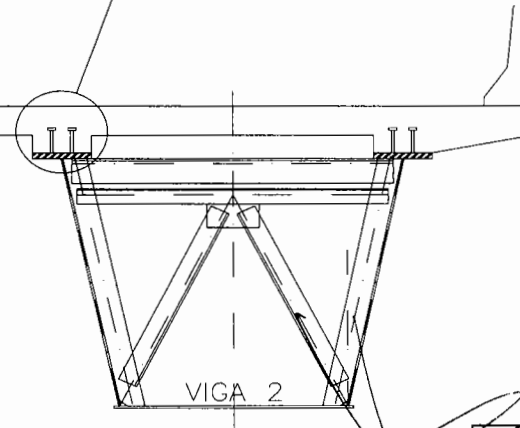

TOTAL 1,012 pzs

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 057/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION

8

(OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONCEPTO	55	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de concreto hidraulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de $f_c= 150 \text{ Kg/cm}^2$, utilizado en BANQUETAS de 8 cm de espesor según proyecto. Incluye: protección de paramentos, corte de módulos de 1.50 m con cortadora de disco, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Banqueta		ANEXO	123.89 m2
	Anexo 1	33.58 m2		
	Banqueta en Pila 4			
	Anexo 2	41.35 m2		
	Banqueta en Pila 4			
	Anexo 3	48.96 m2		
		123.89 m2 m2		

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRAS COMPLEMENTARIAS


CONCEPTO : 55

Banqueta

PIEZA	LONGITUD	ANCHO	RESULTADO
Banqueta sobre periférico	23.00	1.46	33.58 m2

Periférico
Sur-Norte

Unica Puente

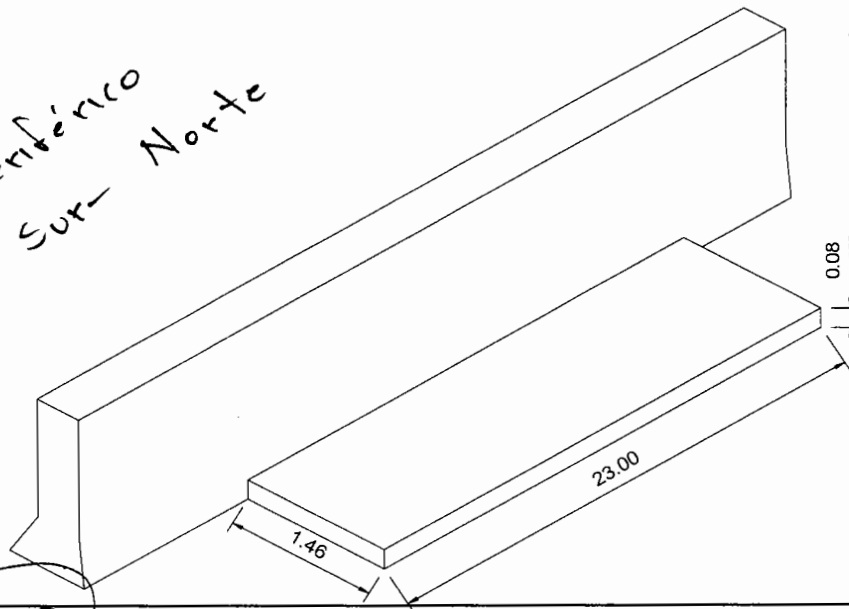

TOTAL 33.58 m2

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONCEPTO : 55

Banqueta en Pila 4

PIEZA	LONGITUD	ANCHO	RESULTADO
Banqueta sobre periférico	13.3	1.23	16.36 m2
Banqueta sobre periférico	12.95	1.93	24.99 m2

Periférico
Norte - Sur

Pila 4

Periférico
Sur - Norte

TOTAL 41.35 m2

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ANEXO 3

CONTRATO : 057/2017

Claro: Periférico de la Juventud y Av. La Cantera

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA

CONTRATISTA:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 8 (OCHO)

DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONCEPTO : 55

Banqueta en Pila 4

PIEZA	LONGITUD	ANCHO	RESULTADO
Banqueta sobre periférico	16.2	1.87	30.29 m2
Banqueta sobre periférico	14.7	1.27	18.67 m2

Periférico
Sur - Norte

Pila 4

Periférico
Norte - Sur


TOTAL 48.96 m2

RESIDENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

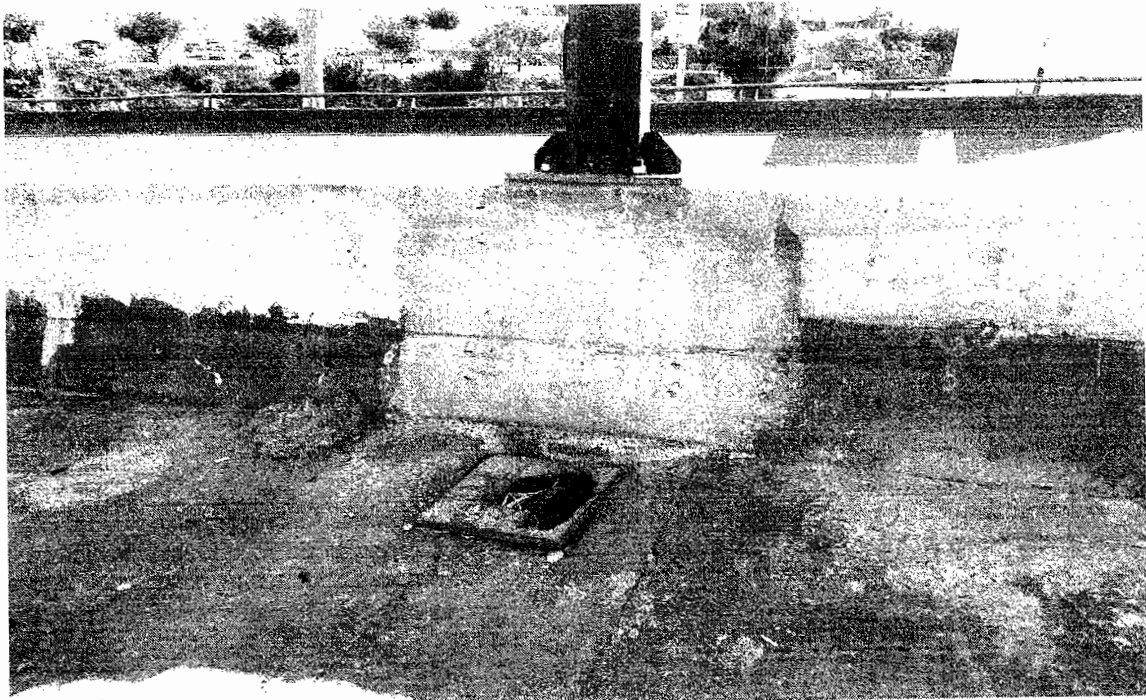


DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO



DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA


[Handwritten signature]

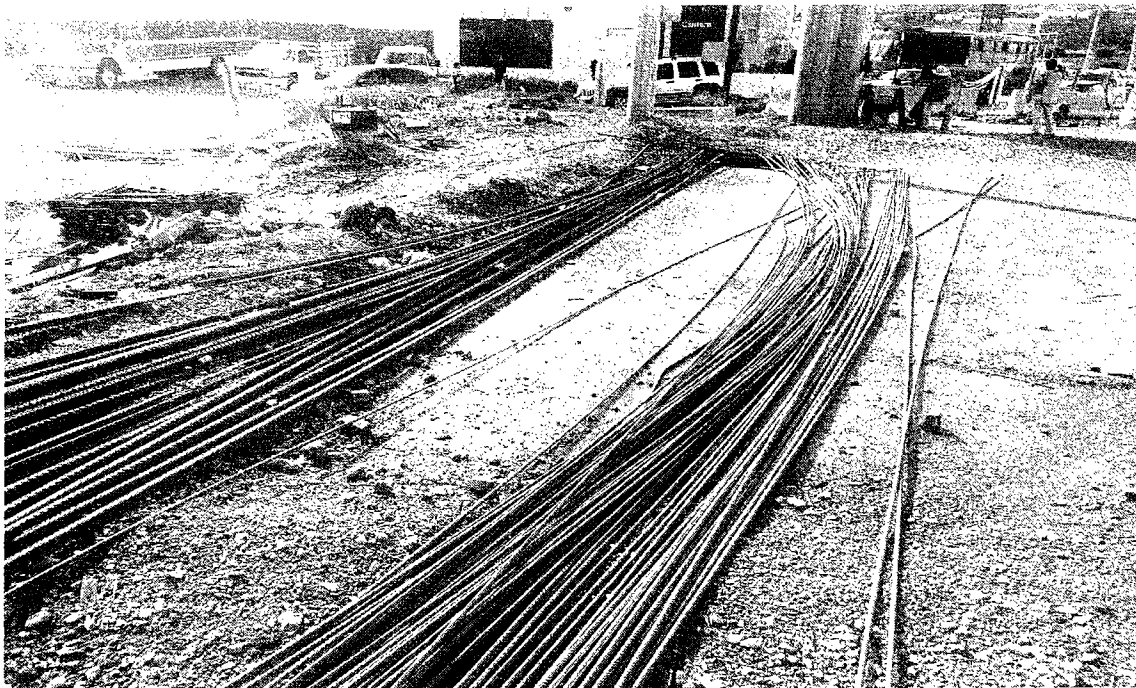

SUMINISTRO DE ACERO




HABILITADO DE ACERO

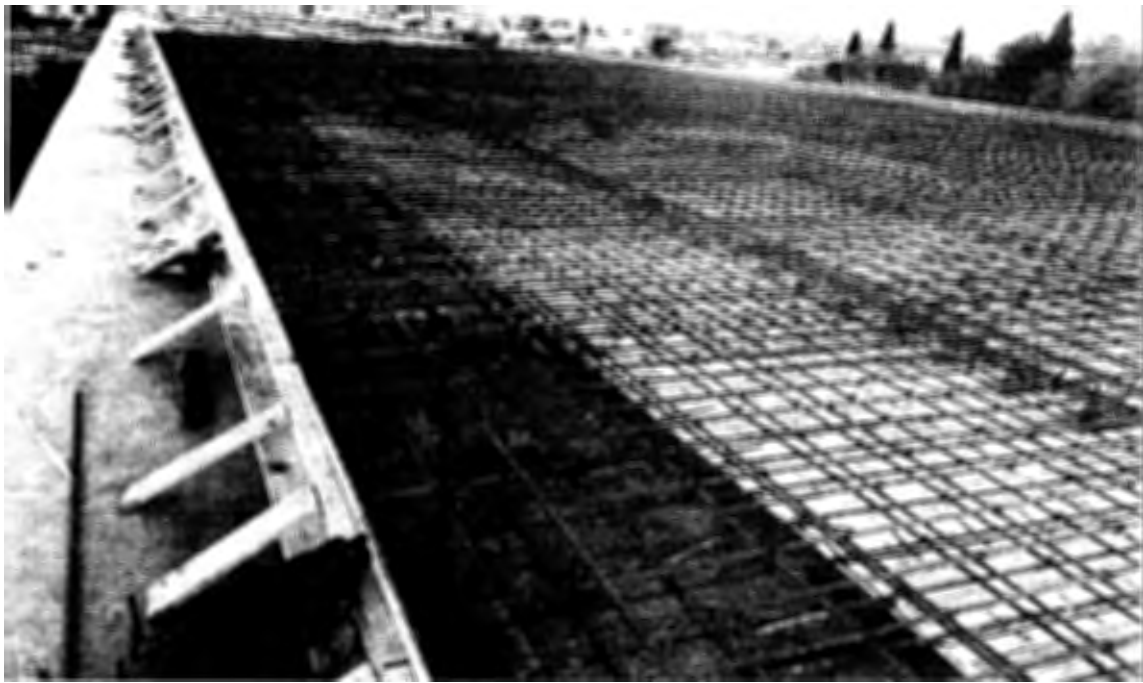

101

HABILITADO DE ACERO

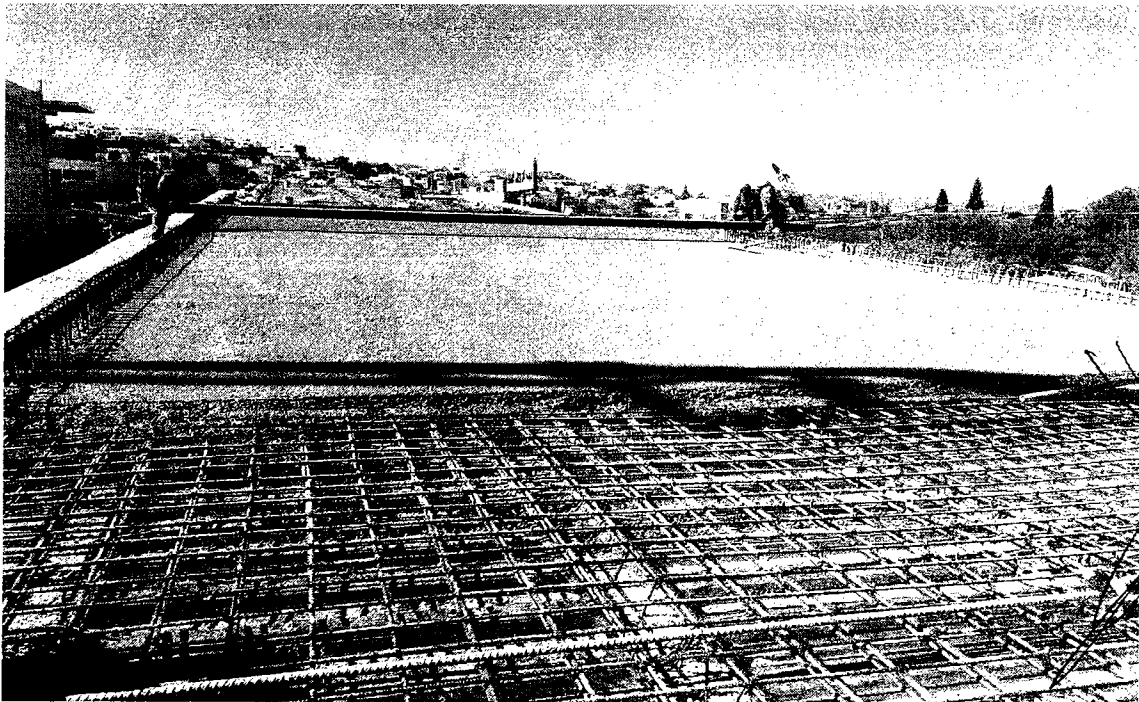


HABILITADO DE ACERO

[Handwritten signature]



102

MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS

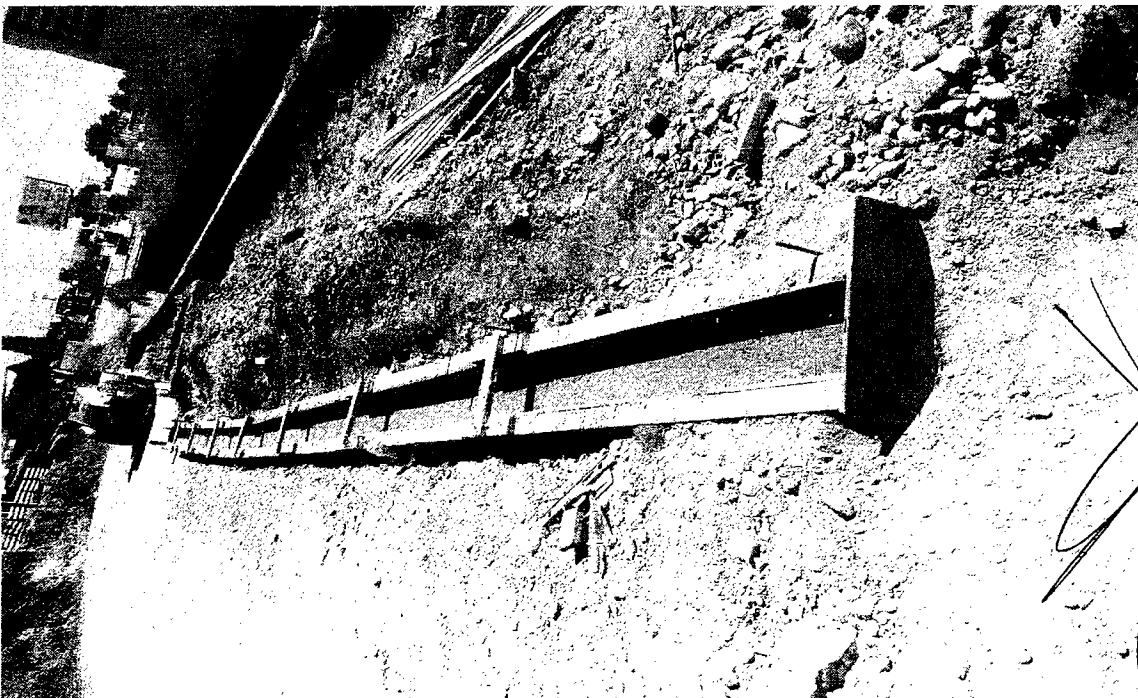


MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS

[Handwritten signature]




CONCRETO EN LOSA

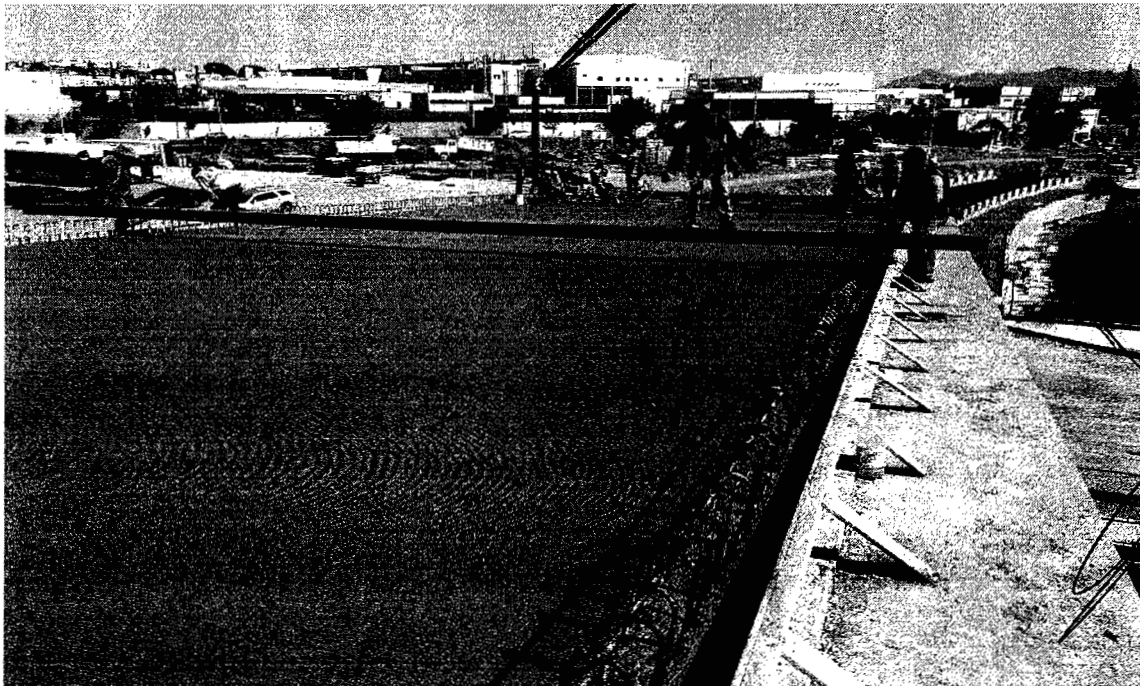


CONCRETO EN LOSA

[Handwritten signature]

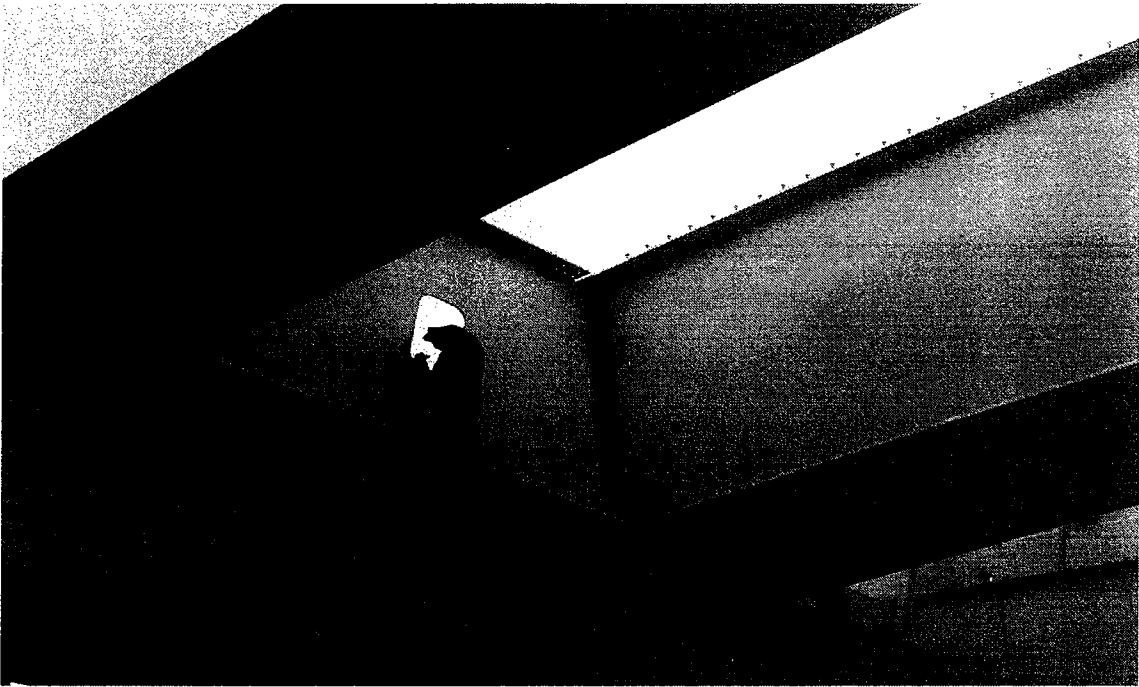


VIGAS METALICAS

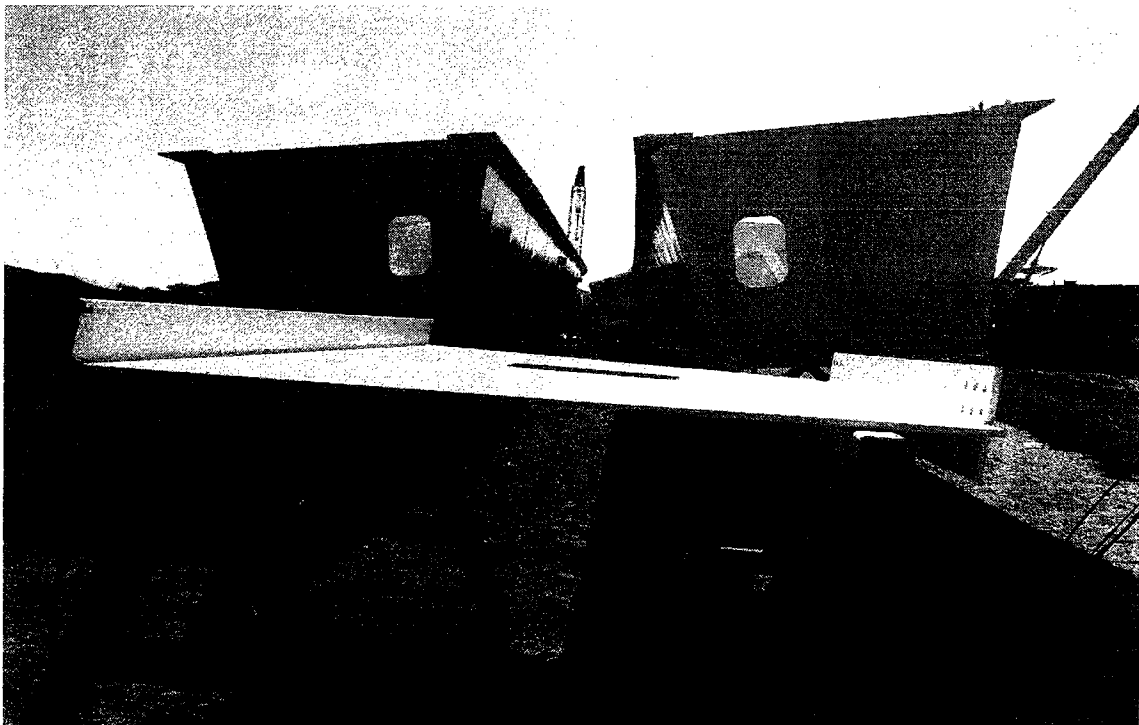

VIGAS METALICAS

[Handwritten signature]

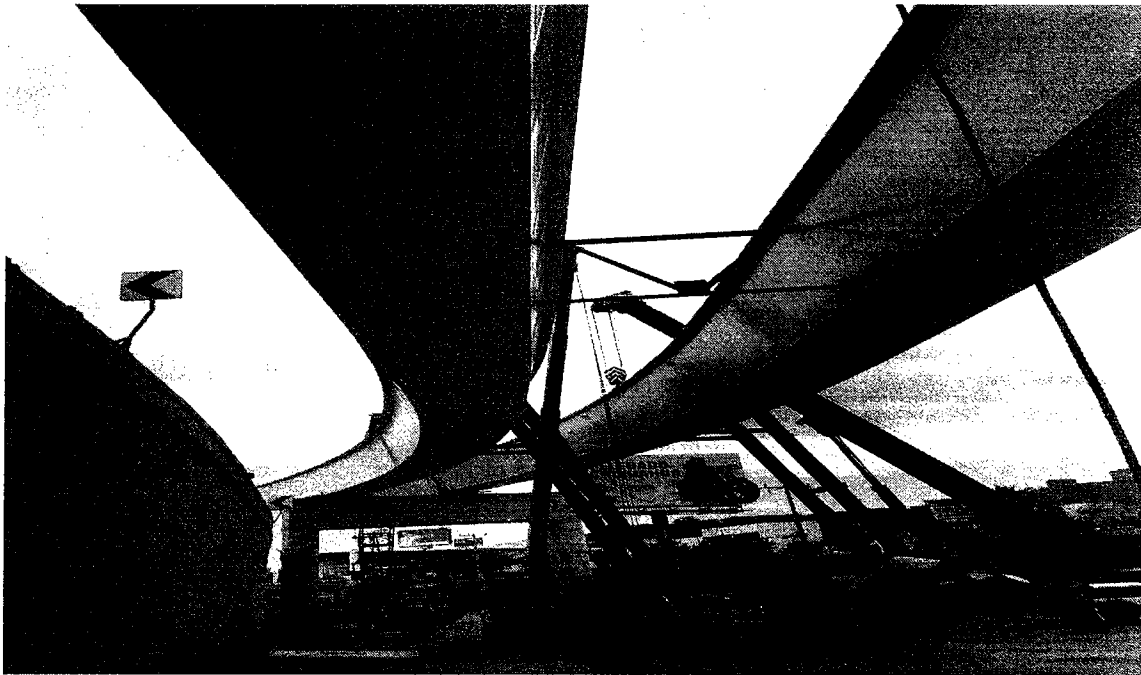

105

VIGAS METALICAS




VIGAS METALICAS

[Handwritten signature]



106

VIGAS METALICAS

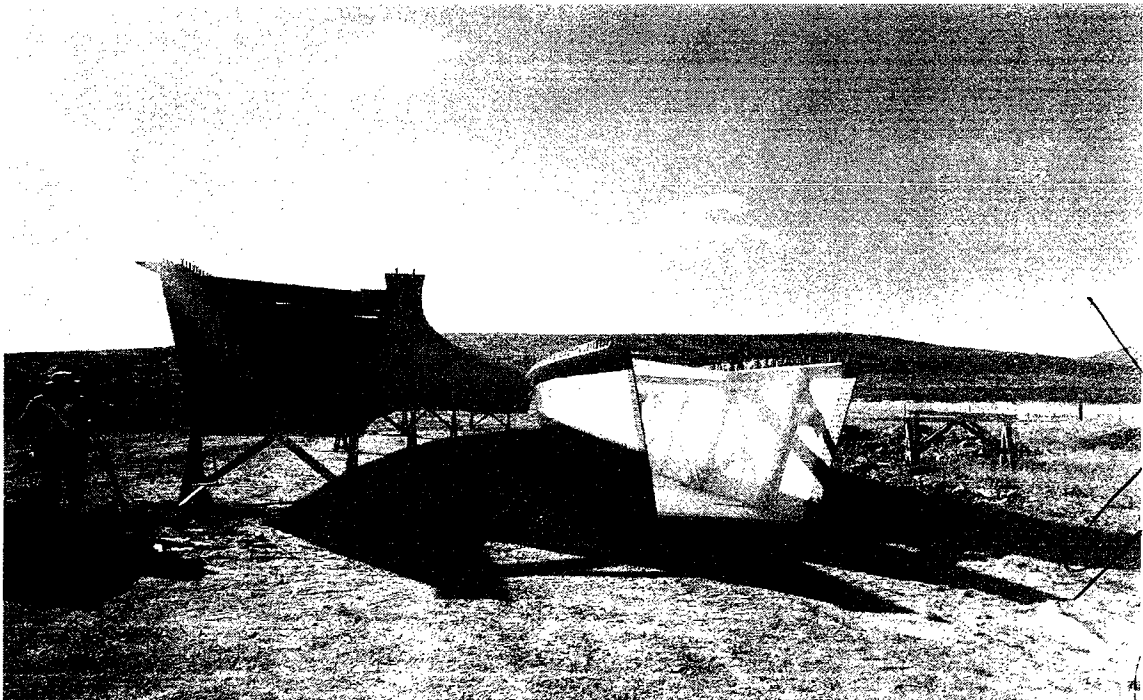

VIGAS METALICAS

[Handwritten signature]




107

VIGAS METALICAS




MONTAJE DE VIGAS METALICAS

[Handwritten signature]

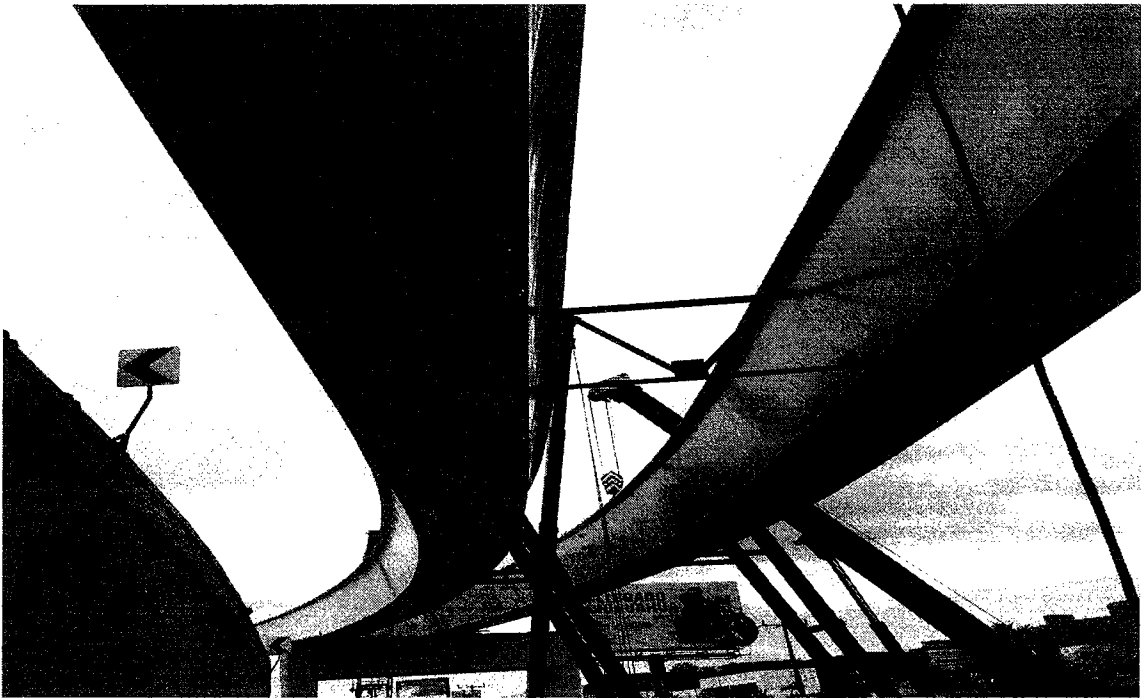


MONTAJE DE VIGAS METALICAS

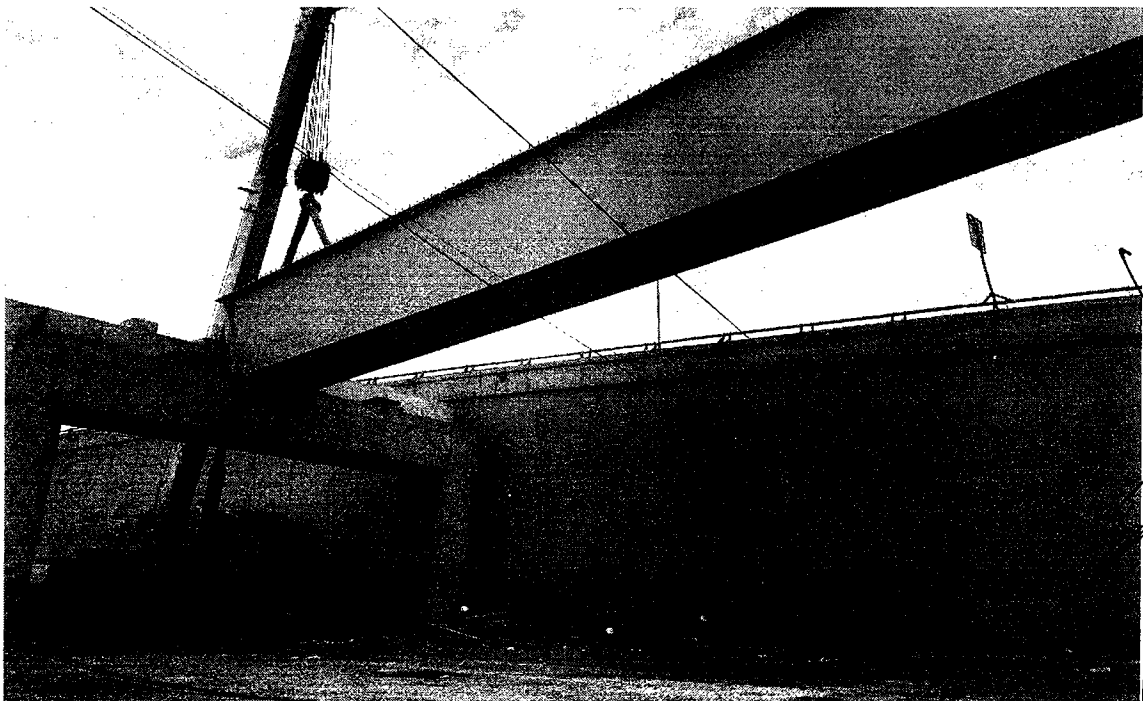

MONTAJE DE VIGAS METALICAS



PINTURA EN VIGAS METALICAS

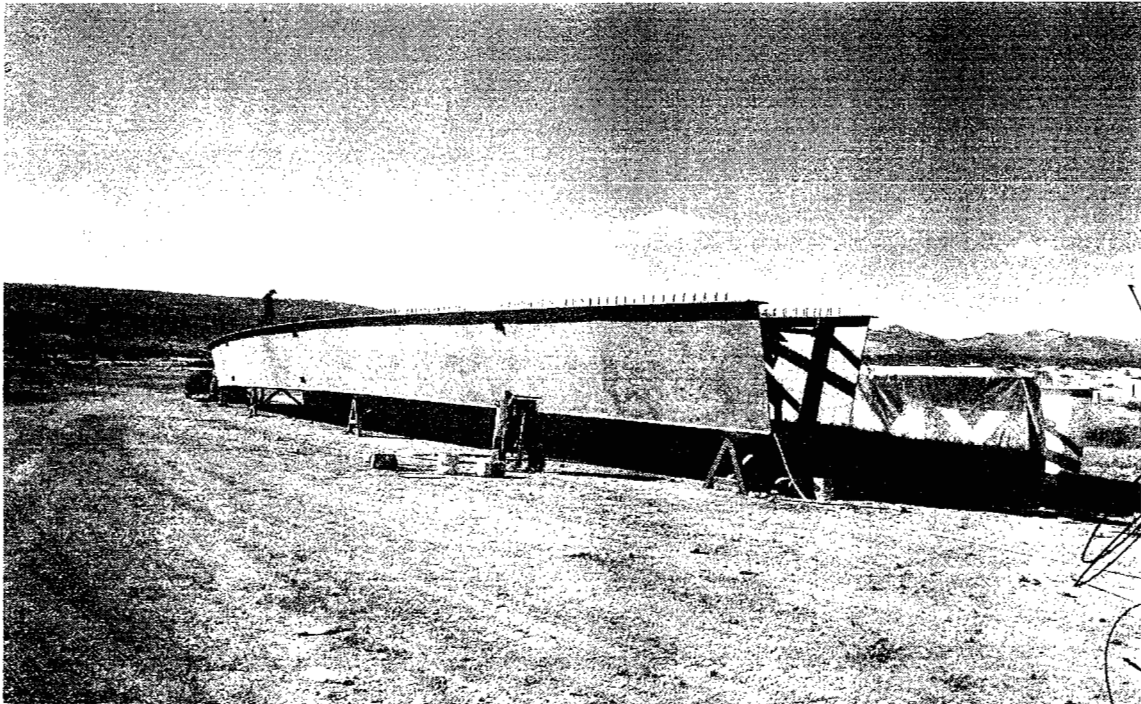

PINTURA EN VIGAS METALICAS



110

BANQUETAS



BANQUETAS



111

BANQUETAS



BANQUETAS

[Handwritten signature]



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	02-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	118		
TOMADA DE	ESCAMAS PARA TIERRA ARMADA		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	7351	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	118-B	118-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.1	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	179.1	
FECHA DE COLADO	05-sep-17	05-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	02-oct-17	02-sep-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	49830	51540	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	282.0	287.8	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	112.8	115.1	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO			
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	03-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	119		
TOMADA DE	ESCAMAS PARA TIERRA ARMADA		
DATOS DE PROYECTO			
f 'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	7403	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	119-B	119-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	06-sep-17	06-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	03-oct-17	03-oct-17	
EDAD (DÍAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	49780	48330	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	281.7	273.5	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	112.7	109.4	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ VIALDO No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:		03-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		120		
TOMADA DE		GUARNICION EN PERIFERICO EST. 143.8 AL 170		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm2)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	4717	REVENIMIENTO (cm)	13.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	120-B	120-C		
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0		
ALTURA (cm)	30.0	30.0		
ÁREA (cm2)	176.7	176.7		
FECHA DE COLADO	06-sep-17	06-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	03-oct-17	03-oct-17		
EDAD (DIAS)	28	28		
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	48690	47980		
RESISTENCIA MPa (kg/cm2)	275.6	271.5		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	110.2	108.6		
TIPO DE FALLA	1	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ				




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:		04-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		121		
TOMADA DE		ESCAMAS PARA TIERRA ARMADA		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	200	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	---	REVENIMIENTO (cm)	13.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	122-B	122-C		
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0		
ALTURA (cm)	30.0	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7		
FECHA DE COLADO	07-sep-17	07-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	04-oct-17	04-oct-17		
EDAD (DIAS)	28	28		
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	39690	38280		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	224.6	216.6		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	112.3	108.3		
TIPO DE FALLA	1	2		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
AUTORIZA  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ				




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	05-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	122		
TOMADA DE	ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE GUARNICION CENTRAL EST. 0+258.6 A 0+280.6		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	---	REVENIMIENTO (cm)	11.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	122-B	122-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.1	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	179.1	
FECHA DE COLADO	21-sep-17	21-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	05-oct-17	05-oct-17	
EDAD (DÍAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	48290	50870	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	273.3	284.0	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	109.3	113.6	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DÍAS DE EDAD, CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:		06-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		123		
TOMADA DE		ZAPATA CORRIDA PARA DESPLANTE DE MURO CENTRAL		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR SCANTERA	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	2990	REVENIMIENTO (cm)	12.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	123-B	123-C		
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0		
ALTURA (cm)	30.0	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7		
FECHA DE COLADO	21-sep-17	21-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	06-oct-17	06-oct-17		
EDAD (DÍAS)	28	28		
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	48730	50100		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	275.8	283.5		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	110.3	113.4		
TIPO DE FALLA	1	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DÍAS DE EDAD, CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
AUTORIZO ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ				




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	05-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	18-ED		
TOMADA DE	DIAGRAMA PILA No. 6		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	----		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	----		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8536	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	18-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	29-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	05-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	31670		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	179.2		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	71.7		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	05-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	17-ED		
TOMADA DE	PARAPETO ULTIMA SECCION		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	----		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	----		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8534	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	17-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	29-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	05-oct-17		
EDAD (DÍAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	30130		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	170.5		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	68.2		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DÍAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SÓLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	05-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	16-CE		
TOMADA DE	DIAFRAGMA 1 Y 2 TRAMO 7-8		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	30.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	31.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8409	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	16-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.1		
ÁREA (cm ²)	179.1		
FECHA DE COLADO	28-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	05-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	36110		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	201.6		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	80.6		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	05-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	15-CE		
TOMADA DE	GUARNICION Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD EST. 0+000A 0+139		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	31.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	32.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8404	REVENIMIENTO (cm)	11.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	15-A		
DIAMETRO (cm)	15.1		
ALTURA (cm)	30.1		
ÁREA (cm ²)	179.1		
FECHA DE COLADO	28-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	05-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	34750		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	194.0		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	77.6		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO			
ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ


INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	10-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	19-CA		
TOMADA DE	PARAPETO CHICO SOBRE PERIFERICO		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	34.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	32.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8665	REVENIMIENTO (cm)	12.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	19-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	03-oct-17		
FECHA DE RUPTURA	10-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	27320		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	154.6		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	61.8		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
SE REPORTA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD,			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO			
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ			

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	10-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	3-ED		
TOMADA DE	MURO DE PANTALLA PILA No. 5		
DATOS DE PROYECTO			
$f'c$ (kg/cm ²)	400	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	---		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	7716	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	3-B	3-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	12-sep-17	12-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	10-oct-14	10-oct-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	77890	75070	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	440.8	424.8	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	110.2	106.2	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ


INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	10-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	2-JO		
TOMADA DE	ZAPATA PARA DESPLANTE DE MURO CENTRAL FRENTE A TIENDA COSTCO		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	---		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	---	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	2-B	2-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	12-sep-17	12-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	10-oct-14	10-oct-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	46640	47610	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	264.0	269.4	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	105.6	107.8	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO			
ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	10-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	1-ED		
TOMADA DE	GUARNICION ESTACION 285 AL 311.5		
DATOS DE PROYECTO			
$f'c$ (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	---		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	4085	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	1-B	1-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	12-sep-17	12-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	10-oct-14	10-oct-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	44890	44270	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	254.0	250.5	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	101.6	100.2	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	11-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	5-CE		
TOMADA DE	GUARNICION PARAPETO Y ZAPATA CORRIDA PERIFERICO DE LA JUVENTUD		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	33.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	29.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	4124	REVENIMIENTO (cm)	11.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	5-B	5-C	
DIAMETRO (cm)	15.1	15.1	
ALTURA (cm)	30.1	30.0	
ÁREA (cm ²)	179.1	179.1	
FECHA DE COLADO	13-sep-17	13-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	11-oct-17	11-oct-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	46210	45140	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	258.0	252.0	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	103.2	100.8	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:		11-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		4-CE		
TOMADA DE		GUARNICION PARAPETO Y ZAPATA CORRIDA PERIFERICO DE LA JUVENTUD		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	33.0			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	29.0			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	4123	REVENIMIENTO (cm)	12.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	4-B	4-C		
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0		
ALTURA (cm)	30.0	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7		
FECHA DE COLADO	13-sep-17	13-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	11-oct-17	11-oct-17		
EDAD (DIAS)	28	28		
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	45060	44790		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	255.0	253.5		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	102.0	101.4		
TIPO DE FALLA	1	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.				
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ				



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	12-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	7CE		
TOMADA DE	GUARNICION PARAPETO Y ZAPATA CORRIDA PERIFERICO DE LA JUVENTUD		
DATOS DE PROYECTO			
f 'c (kg/cm2)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	31.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	29.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	---	REVENIMIENTO (cm)	12.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	7-B	7-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm2)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	14-sep-17	14-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	12-oct-17	12-oct-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	47340	46060	
RESISTENCIA MPa (kg/cm2)	267.9	260.7	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	107.2	104.3	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	12-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	6-CE		
TOMADA DE	GUARNICION PARAPETO Y ZAPATA CORRIDA PERIFERICO DE LA JUVENTUD		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	31.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	29.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	---	REVENIMIENTO (cm)	12.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	6-B	6-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	15-sep-17	15-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	13-oct-17	13-oct-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	47120	48370	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	266.7	273.7	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	106.7	109.5	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.			
AUTORIZO ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	13-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	8CE		
TOMADA DE	ZAPATA CORRIDA EN PARAPETO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD FRENTE A COSTCO		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	---		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR HOMERO	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	7897	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	8-B	8-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	15-sep-17	15-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	13-oct-17	13-oct-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	48970	50310	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	277.1	284.7	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	110.9	113.9	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	17-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	24-CA		
TOMADA DE	LOSA CLARO 7 - 8		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	26.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	29.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8967	REVENIMIENTO (cm)	11.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	24-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	10-oct-17		
FECHA DE RUPTURA	17-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	32030		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	181.3		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	72.5		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 DÍAS CUMPLIRÁ CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	17-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	23-CA		
TOMADA DE	LOSA CLARO 7 - 8		
DATOS DE PROYECTO			
f 'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	17.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	27.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR TOLEDANO	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8927	REVENIMIENTO (cm)	11.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	23-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	10-oct-17		
FECHA DE RUPTURA	17-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	32780		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	185.5		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	74.2		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	17-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	22-CA		
TOMADA DE	LOSA CLARO 7 - 8		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm2)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	17.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	27.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR TOLEDANO	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8532	REVENIMIENTO (cm)	12.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	22-A		
DIAMETRO (cm)	15.1		
ALTURA (cm)	30.1		
ÁREA (cm2)	179.1		
FECHA DE COLADO	10-oct-17		
FECHA DE RUPTURA	17-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	38510		
RESISTENCIA MPa (kg/cm2)	215.0		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	86.0		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ


INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	17-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	21-CA		
TOMADA DE	LOSA CLARO 7 - 8		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	17.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	26.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR TOLEDANO	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	8531	REVENIMIENTO (cm)	10.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	21-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	10-oct-17		
FECHA DE RUPTURA	17-oct-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	38740		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	219.2		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	87.7		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:		17-oct-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		20-CA		
TOMADA DE		LOSA CLARO 7 - 8		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	20.0			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	26.0			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	8947	REVENIMIENTO (cm)	11.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	20-A			
DIAMETRO (cm)	15.0			
ALTURA (cm)	30.0			
ÁREA (cm ²)	176.7			
FECHA DE COLADO	10-oct-17			
FECHA DE RUPTURA	17-oct-17			
EDAD (DIAS)	7			
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	39100			
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	221.3			
% RESISTENCIA DE PROYECTO	88.5			
TIPO DE FALLA	1			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ				

SCT

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Subdirección de Laboratorios
Departamento de Pruebas Estructurales

INFORME DE LABORATORIO

OBRA:	Construcción de Gaza	HOJA NÚMERO:	1 de 3
UBICACIÓN:	Periférico de La Juventud y Av. La Cantera Ciudad de Chihuahua, Chih.	REGISTRO PE:	314
		FECHA DE RECIBO:	9-ago-2017
		FECHA DE INFORME:	24-ago-2017
		NÚM. DE ENSAYE RM:	94781 al 95205
		NÚMERO DE APOYOS:	18029 al 18078

ENVIADO POR: MERP Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: Apoyos Integrales de Neopreno

25 de 400 x 400 x 127 mm


25 de 400 x 400 x 79 mm

TRABAJO EJECUTADOS:

Las muestras de neopreno fueron sometidas a las pruebas de compresibilidad, dureza Shore "A" y prueba de la flama, de acuerdo con lo establecido en la norma N-CMT-2-08/15 "Placas y Apoyos Integrales de Neopreno".

RESULTADOS:

	Mínimo	Máximo
Deformación, en %	1,57	2,34
Dureza Shore "A", en grados	62	63
Resultados de la prueba de la flama	Satisfactorio	



OBSERVACIONES:

Apoyo(s) seccionado(s) para verificación de su estructura: 18038 , 18068

Este reporte no constituye un certificado de calidad y esta Secretaría no lo autoriza para fines publicitarios. De la misma manera, tampoco se puede considerar como un dictamen para apoyar demandas o contrademandas judiciales.

El Jefe del Laboratorio de
Resistencia de Materiales

ING. JOSE ALFREDO PINTO BORRAS

El Jefe del Departamento de
Pruebas Estructurales

ING. JORGE LOPEZ VICENTE

SCT

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 Subdirección de Laboratorios
 Departamento de Pruebas Estructurales

REPORTE DE PLACAS Y APOYOS INTEGRALES DE NEOPRENO

OBRA:	Construcción de Gaza	HOJA NÚMERO:	2 de 3
UBICACIÓN:	Periférico de La Juventud y Av. La Cantera Ciudad de Chihuahua, Chih.	REGISTRO PE:	314
		FECHA DE RECIBO:	9-ago-2017
		FECHA DE INFORME:	24-ago-2017
		NÚM. DE ENSAYE RM:	94781 al 95205
		NÚMERO DE APOYOS:	18029 al 18078
ENVIADO POR:	MERP Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.		

MUESTRA					ESPECIFICACIONES			
Dimensiones en mm								
CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	PLACA ACERO				
25	400	400	127	8				
25	400	400	79	5				

PRESIÓN PRUEBA, kg/cm²
 DUREZA SHORE "A"

18029 al 18053	18054 al 18078		
100	100		
60	60		

TRABAJOS EJECUTADOS:

Las muestras de neopreno fueron sometidas a las pruebas de compresibilidad, dureza Shore "A" y prueba de la flama, de acuerdo con lo establecido en la norma N-CMT-2:08/15 "Placas y Apoyos Integrales de Neopreno".

RESULTADOS:


APOYOS NÚMERO	18029 al 18053			18054 al 18078								
	APOYO	ACERO	RECUBR	APOYO	ACERO	RECUBR	APOYO	ACERO	RECUBR	APOYO	ACERO	RECUBR
LARGO, EN mm	402	396,0		402	395,7							
ANCHO, EN mm	400	393,4		401	394,5							
ESPESOR, EN mm	126,5	3,1	8,9	78,1	3,1	9,6						

	DUREZA SHORE A	DEFORMACIÓN		DUREZA SHORE A	DEFORMACIÓN		DUREZA SHORE A	DEFORMACIÓN		DUREZA SHORE A	DEFORMACIÓN	
		mm	%		mm	%		mm	%		mm	%
Promedio	63	2,04	1,84	63	1,23	1,97						
Desv. Estandar	0	0,22	0,20	0	0,17	0,26						
Coef. Variación	0	0,11	0,11	0	0,14	0,13						
Valor mínimo	63	1,74	1,57	62	1,02	1,62						
Valor máximo	63	2,27	2,04	63	1,49	2,34						

OBSERVACIONES:

Verificación de estructura:	18038	18068
No satisfacen requisitos de dureza:	Ninguno	Ninguno
Con deformación superior al establecido:	Ninguno	Ninguno
Resultado de la prueba de la flama:	Satisfactorio	Satisfactorio

Este reporte no constituye un certificado de calidad y esta Secretaría no lo autoriza para fines publicitarios. De la misma manera, tampoco se puede considerar como un dictamen para apoyar demandas o contrademandas judiciales.



EL LABORATORISTA

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ACEROS

EL JEFE DEL LABORATORIO DE
RESISTENCIA DE MATERIALES

Juan Carlos Atilano C.
SR. JUAN CARLOS ATILANO CONSTANTINO

L.A.I. MARCO A. GONZÁLEZ TAVERA

ING. JOSÉ ALFREDO PINTO BORRÁS

REPORTE DE PLACAS Y APOYOS INTEGRALES DE NEOPRENO


OBRA: Construcción de Gaza
UBICACIÓN: Periférico de La Juventud y Av. La Cantera
Ciudad de Chihuahua, Chih.

HOJA NÚMERO: 3 de 3
REGISTRO PE: 314
FECHA DE RECIBO: 9-ago-2017
FECHA DE INFORME: 24-ago-2017
NÚM. DE ENSAYE RM: 94781 al 95205
NÚMERO DE APOYOS: 18029 al 18078

ENVIADO POR: MERP Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.



IDENTIFICACIÓN DEL APOYO 18038

GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN

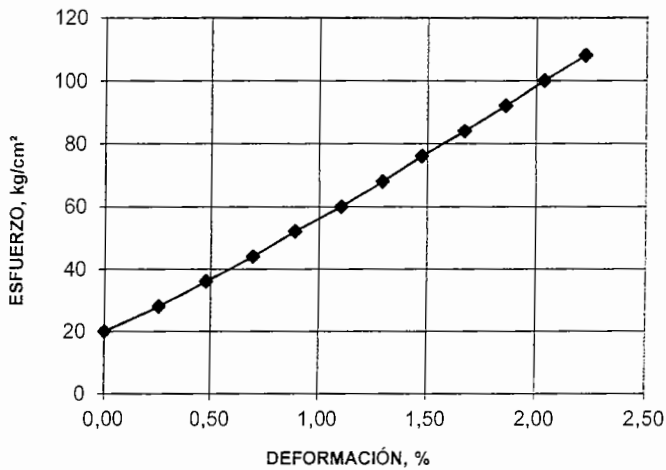

IDENTIFICACIÓN DEL APOYO 18068

GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN

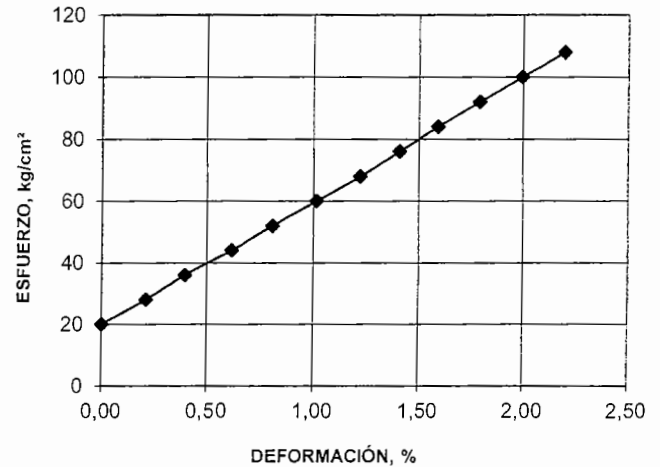

EL LABORATORISTA

Juan Carlos Atilano C.
SR. JUAN CARLOS ATILANO CONSTANTINO

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ACEROS

L.A.I. MARCO A. GONZÁLEZ TAVERA

EL JEFE DEL LABORATORIO DE
RESISTENCIA DE MATERIALES

ING. JOSÉ ALFREDO PINTO BORRÁS



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.02.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Ch	Ti	
370533	ASIM A572-50/A709-50	0.180	1.410	0.018	0.004	0.190	0.110	0.080	0.045	0.020	0.053	0.005	0.016	0.017	
370534	ASIM A572-50/A709-50	0.180	1.420	0.013	0.003	0.180	0.120	0.071	0.043	0.018	0.036	0.004	0.015	0.018	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.				
370533	7030	5422033001	1.7500		53.391 (KSI)		76.497 (KSI)		41 (%)		2				
370533	7060	5422035001	1.7500		53.333 (KSI)		76.664 (KSI)		39 (%)		2				
370534	7050	5424071001	1.2500		55.880 (KSI)		79.785 (KSI)		44 (%)		2				
370534	7070	5422040001	1.7500		55.081 (KSI)		78.870 (KSI)		53 (%)		2				
370534	7090	5422038001	1.7500		52.990 (KSI)		76.993 (KSI)		40 (%)		2				
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA		
370533	7030	5422033001	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
370533	7030	5422033002	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
370533	7030	5422033003	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
370533	7030	5422033004	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
370533	7060	5422035001	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
370533	7060	5422035003	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
370533	7060	5422035004	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
370534	7060	5422037003	1.7500		72.0000		240.0000		0000197243		000240		1002429241		
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE		NORMA										
370533	7030	5422033001	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
370533	7030	5422033002	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
370533	7030	5422033003	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
370533	7030	5422033004	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
370533	7060	5422035001	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
370533	7060	5422035003	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
370533	7060	5422035004	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
370534	7060	5422037003	2922		A-6 50% PLACA STECKEL										
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B017186B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.05.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	B	
1610366	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.320	0.028	0.005	0.120	0.019	0.027	0.019	0.006	0.037	0.003	0.009	0.002		
171907	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.160	0.860	0.018	0.005	0.190	0.039	0.025	0.019	0.005	0.040	0.004	0.001	0.003	0.0002	
271913	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.400	0.016	0.008	0.170	0.051	0.071	0.058	0.014	0.042	0.004	0.017	0.017		
271915	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.400	0.015	0.004	0.170	0.021	0.021	0.022	0.007	0.036	0.003	0.017	0.019		
272161	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.350	0.018	0.005	0.130	0.022	0.021	0.026	0.006	0.038	0.003	0.010	0.002		
272162	ASTM A572-50/A709-50	0.140	1.310	0.018	0.005	0.120	0.025	0.021	0.023	0.006	0.038	0.003	0.009	0.002		
470747	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.160	0.840	0.026	0.005	0.140	0.016	0.033	0.015	0.003	0.047	0.004	0.001	0.002	0.0002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELONG.	T. ELONG.
1610366	7010	5162036001	0.5000	54.269 (KSI)	78.403 (KSI)	46 (%)	2
1610366	7020	5162037007	0.5000	57.793 (KSI)	79.318 (KSI)	42 (%)	2
171907	7040	5706092001	1.0000	45.189 (KSI)	68.274 (KSI)	24 (%)	8
171907	7050	5706093001	1.0000	41.574 (KSI)	67.582 (KSI)	25 (%)	8
271913	5020	5650004001	0.7500	59.886 (KSI)	80.845 (KSI)	43 (%)	2
271913	6010	5650032001	1.0000	53.166 (KSI)	77.963 (KSI)	48 (%)	2
271913	6030	5650015001	0.7500	57.228 (KSI)	80.623 (KSI)	50 (%)	2
271915	5010	5650033001	1.0000	55.703 (KSI)	79.575 (KSI)	41 (%)	2
271915	5010	5650033007	1.0000	54.654 (KSI)	79.039 (KSI)	50 (%)	2
271915	5030	5650005001	0.7500	52.804 (KSI)	81.590 (KSI)	47 (%)	2
272161	5090	5688051001	0.3750	59.092 (KSI)	79.586 (KSI)	42 (%)	2
272161	6080	5688054003	0.3750	59.714 (KSI)	79.152 (KSI)	41 (%)	2
272162	5060	5688053003	0.3750	58.641 (KSI)	78.188 (KSI)	42 (%)	2
272162	5080	5688050003	0.3750	58.341 (KSI)	78.603 (KSI)	39 (%)	2
470747	7050	5634028001	0.6250	48.651 (KSI)	69.936 (KSI)	26 (%)	8
470747	7060	5634029001	0.6250	46.055 (KSI)	68.921 (KSI)	26 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA ENTREGA
1610366	7020	5162037005	0.5000	72.0000	240.0000	0000194809	000040 1002469436
171907	7030	5706091004	1.0000	96.0000	480.0000	0000198213	000040 1002469436
171907	7040	5706092004	1.0000	96.0000	480.0000	0000198213	000040 1002469436
271913	5020	5650004003	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170 1002469436
271913	5020	5650004004	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170 1002469436

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

OC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B017186B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.05.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA STECKEL					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

PRODUCTO EMBARCADA								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
271915	5030	5650005012	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002469436
272161	5050	5688052006	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
272161	5060	5688048001	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
272161	5060	5688048003	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
272161	5060	5688048004	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
272161	5090	5688051005	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
272161	5090	5688051006	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
272161	6060	5688046008	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
272162	6070	5688047008	0.3750	72.0000	240.0000	0000199219	000120	1002469436
470747	7040	5634030013	0.6250	72.0000	240.0000	0000199219	000030	1002469436

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
1610366	7020	5162037005	2842	A-6 50% PLACA STECKEL
171907	7030	5706091004	2963	A-6 50% PLACA STECKEL
171907	7040	5706092004	2963	A-6 50% PLACA STECKEL
271913	5020	5650004003	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
271913	5020	5650004004	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
271915	5030	5650005012	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272161	5050	5688052006	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272161	5060	5688048001	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272161	5060	5688048003	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272161	5060	5688048004	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272161	5090	5688051005	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272161	5090	5688051006	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272161	6060	5688046008	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
272162	6070	5688047008	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
470747	7040	5634030013	2985	A-6 50% PLACA STECKEL

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B999623B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					
ING. RAMIRO GONZALEZ MENCHACA						
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION						

		COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	B	
271913	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.400	0.016	0.008	0.170	0.051	0.071	0.058	0.014	0.042	0.004	0.017	0.017		
271963	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.860	0.012	0.006	0.200	0.029	0.024	0.025	0.007	0.037	0.003	0.002	0.003	0.0003	
272196	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.860	0.011	0.004	0.190	0.029	0.032	0.029	0.007	0.040	0.003	0.001	0.002	0.0001	
470747	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.160	0.840	0.026	0.005	0.140	0.016	0.033	0.015	0.003	0.047	0.004	0.001	0.002	0.0002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
271913	5020	5650004001	0.7500	59.886 (KSI)	80.845 (KSI)	43 (%)	2
271913	6010	5650032001	1.0000	53.166 (KSI)	77.963 (KSI)	48 (%)	2
271913	6030	5650015001	0.7500	57.228 (KSI)	80.623 (KSI)	50 (%)	2
271963	5010	5658074001	1.5000	42.138 (KSI)	68.421 (KSI)	29 (%)	8
271963	5020	5658047001	1.0000	45.375 (KSI)	70.422 (KSI)	27 (%)	8
271963	5080	5658048001	1.0000	44.397 (KSI)	69.077 (KSI)	26 (%)	8
272196	7040	5694077001	1.2500	42.872 (KSI)	68.143 (KSI)	30 (%)	8
272196	7050	5694079001	1.5000	42.668 (KSI)	66.710 (KSI)	28 (%)	8
272196	7090	5694076001	1.2500	41.334 (KSI)	67.421 (KSI)	31 (%)	8
470747	7050	5634028001	0.6250	48.651 (KSI)	69.936 (KSI)	26 (%)	8
470747	7060	5634029001	0.6250	46.055 (KSI)	68.921 (KSI)	26 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA
271913	5020	5650004001	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170 1002448035
271913	5020	5650004002	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170 1002448035
271913	6010	5650032009	1.0000	72.0000	240.0000	0000198213	000170 1002448035
271963	5050	5658046001	1.0000	72.0000	240.0000	0000199219	000070 1002448035
272196	7100	5694075001	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070 1002448035
272196	7100	5694075002	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070 1002448035
470747	7060	5634029013	0.6250	72.0000	240.0000	0000199219	000030 1002448035
470747	7060	5634029014	0.6250	72.0000	240.0000	0000199219	000030 1002448035
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA			
271913	5020	5650004001	2985	A-6 50% PLACA STECKEL			
271913	5020	5650004002	2985	A-6 50% PLACA STECKEL			
271913	6010	5650032009	2963	A-6 50% PLACA STECKEL			
271963	5050	5658046001	2985	A-6 50% PLACA STECKEL			

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL	EMITIO : S201740
--	------------------

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B999623B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.03.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARPT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	PRODUCTO EMBARCADO	
				NORMA	
272196	7100	5694075001	2963	A-6 50% PLACA STECKEL	
272196	7100	5694075002	2963	A-6 50% PLACA STECKEL	
470747	7060	5634029013	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
470747	7060	5634029014	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				FIN DE DATOS	

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



CUENTE	ACEROS TEPOTZOILAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUEREJARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
271913	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.400	0.016	0.008	0.170	0.051	0.071	0.058	0.014	0.042	0.004	0.017	0.017	
272165	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.410	0.022	0.006	0.170	0.021	0.024	0.023	0.006	0.036	0.003	0.014	0.016	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
271913	5020	5650004001	0.7500	59.886 (KSI)	80.845 (KSI)	43 (%)	2
271913	6010	5650032001	1.0000	53.166 (KSI)	77.963 (KSI)	48 (%)	2
271913	6030	5650015001	0.7500	57.228 (KSI)	80.623 (KSI)	50 (%)	2
272165	6160	5690052001	1.1250	50.556 (KSI)	77.496 (KSI)	51 (%)	2
272165	6180	5690055001	1.1250	50.770 (KSI)	77.889 (KSI)	50 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
271913	5020	5650004005	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	5020	5650004006	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	5020	5650004007	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	5020	5650004008	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	5020	5650004009	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	5020	5650004010	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	5020	5650004011	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	5020	5650004012	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	6020	5650003007	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	6020	5650003008	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	6020	5650003009	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
271913	6020	5650003010	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
272165	6120	5690076001	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
272165	6120	5690076002	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
272165	6120	5690076003	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095
272165	6120	5690076004	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002448095

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
271913	5020	5650004005	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
271913	5020	5650004006	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
271913	5020	5650004007	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
271913	5020	5650004008	2985	A-6 50% PLACA STECKEL

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.	EMITIO : S201740
--	------------------



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B999690B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.03.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMAILA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

				PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	PLANCHON	Nº. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA	
271913	5020	5650004009	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
271913	5020	5650004010	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
271913	5020	5650004011	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
271913	5020	5650004012	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
271913	6020	5650003007	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
271913	6020	5650003008	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
271913	6020	5650003009	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
271913	6020	5650003010	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
272165	6120	5690076001	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
272165	6120	5690076002	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
272165	6120	5690076003	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
272165	6120	5690076004	2985	A-6 50% PLACA STECKEL	
				FIN DE DATOS	

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



CUENTE ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		FECHA EMISION 27.02.2017	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA	
DIRECCION CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA		ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION			
PRODUCTO PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA

COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti
171485	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.410	0.023	0.003	0.190	0.019	0.021	0.016	0.004	0.033	0.005	0.016	0.016
271459	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.018	0.005	0.170	0.025	0.019	0.021	0.007	0.035	0.005	0.016	0.018

PRUEBAS AL PRODUCTO

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
171485	7010	5556012001	0.7500	55.899 (KSI)	77.784 (KSI)	35 (%)	2
171485	7020	5538063001	1.2500	57.176 (KSI)	78.451 (KSI)	52 (%)	2
171485	7060	5538056001	1.2500	55.185 (KSI)	79.545 (KSI)	41 (%)	2
271459	7030	5538085001	2.0000	50.638 (KSI)	76.270 (KSI)	33 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
171485	7070	5538070001	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439305
171485	7070	5538070002	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439305
171485	7070	5538070003	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439305
171485	7070	5538070004	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439305
271459	7030	5538085001	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439305
271459	7030	5538085002	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439305
271459	7030	5538085003	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439305
271459	7030	5538085004	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439305

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
171485	7070	5538070001	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
171485	7070	5538070002	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
171485	7070	5538070003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
171485	7070	5538070004	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
271459	7030	5538085001	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
271459	7030	5538085002	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
271459	7030	5538085003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
271459	7030	5538085004	2922	A-6 50% PLACA STECKEL

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B993430B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.02.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA STECKEL					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
271459	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.018	0.005	0.170	0.025	0.019	0.021	0.007	0.035	0.005	0.016	0.018	
271478	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.460	0.022	0.006	0.170	0.035	0.028	0.020	0.006	0.033	0.005	0.015	0.014	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
271459	7030	5538085001	2.0000	50.638 (KSI)	76.270 (KSI)	33 (%)	2
271459	7040	5540045001	2.0000	52.709 (KSI)	76.371 (KSI)	42 (%)	2
271478	7040	5538069001	1.5000	53.475 (KSI)	77.742 (KSI)	46 (%)	2

PRODUCTO EMPACADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
271459	7040	5540045001	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439480
271459	7040	5540045002	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439480
271459	7040	5540045003	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439480
271459	7040	5540045004	2.0000	72.0000	240.0000	0000197243	000280	1002439480
271478	7040	5538069001	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439480
271478	7040	5538069002	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439480
271478	7040	5538069003	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439480
271478	7040	5538069004	1.5000	96.0000	240.0000	0000197243	000220	1002439480
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
271459	7040	5540045001	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				
271459	7040	5540045002	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				
271459	7040	5540045003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				
271459	7040	5540045004	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				
271478	7040	5538069001	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				
271478	7040	5538069002	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				
271478	7040	5538069003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				
271478	7040	5538069004	2922	A-6 50% PLACA STECKEL				

FIN DE DATOS

COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B990752B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	21.02.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARPT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
370836	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.430	0.013	0.004	0.180	0.160	0.060	0.045	0.013	0.035	0.004	0.016	0.018	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.								
370836	7040	5498093002	1.0000	55.087 (KSI)	81.757 (KSI)	37 (%)	2								
370836	7050	5498092001	1.0000	62.940 (KSI)	82.728 (KSI)	50 (%)	2								
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA							
370836	7040	5498093001	1.0000	72.0000	480.0000	0000197243	000160	1002436252							
370836	7050	5498092002	1.0000	72.0000	480.0000	0000197243	000160	1002436252							
370836	7050	5498092003	1.0000	72.0000	480.0000	0000197243	000160	1002436252							
370836	7050	5498092005	1.0000	72.0000	480.0000	0000197243	000160	1002436252							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA											
370836	7040	5498093001	2922	A-6 50% PLACA STECKEL											
370836	7050	5498092002	2922	A-6 50% PLACA STECKEL											
370836	7050	5498092003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL											
370836	7050	5498092005	2922	A-6 50% PLACA STECKEL											
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B922481B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.09.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CISNEROS ATENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	
463747	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.015	0.002	0.180	0.018	0.020	0.018	0.006	0.032	0.005	0.014	0.016	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.			
463747	7110	4582024001		0.8750		52.471 (KSI)		78.862 (KSI)		42 (%)		2			
463747	7130	4582015001		0.8750		52.830 (KSI)		77.847 (KSI)		47 (%)		2			
PRODUCTO EMBALEADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA	
463747	7030	4582035001		0.8750		96.0000		480.0000		0000191598		000080		1002351386	
463747	7030	4582035002		0.8750		96.0000		480.0000		0000191598		000080		1002351386	
463747	7040	4582034001		0.8750		96.0000		480.0000		0000191598		000080		1002351386	
463747	7040	4582034002		0.8750		96.0000		480.0000		0000191598		000080		1002351386	
463747	7070	4582036001		0.8750		96.0000		480.0000		0000191598		000080		1002351386	
463747	7070	4582036002		0.8750		96.0000		480.0000		0000191598		000080		1002351386	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		PED. CLIENTE		NORMA									
463747	7030	4582035001		2787		A-6 50% PLACA STECKEL									
463747	7030	4582035002		2787		A-6 50% PLACA STECKEL									
463747	7040	4582034001		2787		A-6 50% PLACA STECKEL									
463747	7040	4582034002		2787		A-6 50% PLACA STECKEL									
463747	7070	4582036001		2787		A-6 50% PLACA STECKEL									
463747	7070	4582036002		2787		A-6 50% PLACA STECKEL									
FIN DE DATOS															

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CC-03-F-02-A



GENERAL QUÍMICA

SAHAGÚN
CALLE 2ª Carretera México-Cd. Sah.
Cd. Sahagún, Tlaxcala, HGO. 43960
México

ESTADO DE GUERRERO

AL SEÑOR
MIGUEL ANGELO GARCÍA
LIBRERÍA EDUCACIÓN MENSAJE
CALLE 1ª AV. 1234
MEXICO

TELÉFONO 4567890

FECHA DE VENTA
15/05/2007

CLIENTE: GARCÍA

PRODUCTO: HCHO

VALOR: 250.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2007

OTROS DATOS: N/A

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VALOR: 250.00

FECHA DE VENTA: 15/05/2007

CLIENTE: GARCÍA

PRODUCTO: HCHO

VALOR: 250.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2007

OTROS DATOS: N/A

FECHA DE VENTA: 15/05/2007

CLIENTE: GARCÍA

PRODUCTO: HCHO

VALOR: 250.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2007

OTROS DATOS: N/A

FECHA DE VENTA: 15/05/2007

CLIENTE: GARCÍA

PRODUCTO: HCHO

VALOR: 250.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2007

OTROS DATOS: N/A

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES

FORMA DE LA ...

CONDICIONES ...

FECHA DE ...

PROCESO ...

ANALISIS ...

SECCION ...

ANALISIS QUIMICO


GRUPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1002	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1003	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

ANALISIS FÍSICO

GRUPO	LIMITE ELASTICO	RESISTENCIA	ALARGAMIENTO	% NOTCH
1000	...	...	...	...
1001	...	...	...	...
1002	...	...	...	...
1003	...	...	...	...

ANALISIS DE LA MATERIA

GRUPO	...	...	...	...	...	...	...
1000	...	...	...	...	...	...	...
1001	...	...	...	...	...	...	...
1002	...	...	...	...	...	...	...
1003	...	...	...	...	...	...	...



CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA DE ELABORACION: 11/04/11 10:00:00

CLIENTE: ACEROS TEMPOZITLAN S.A. DE C.V.

PERIODO: 108049 CONTRA 0016 REMISION: 0114113-1

DETALLE: ALAMBRO 4X1,2" 101.8X12.7MM GRADO DE ACERO A572/A170M-16 G50

CANTIDAD EMBARCADA 39.71 TONS

ESPECIFICACION PRODUCTO: A6/A6M-11

EMBARQUE: JOSE A. PEREZ CABRERA

PESO TEORICO PRODUCTO: 14.146 KGS-MT LONGITUD (Mts) 12.26 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Ti	% Nb
305089	.0080	.0160	.0040	.2120	.2700	.0130	.160	.090	.070	.022	1.070	.002	.0010
305090	.0080	.0160	.0030	.2130	.2600	.0150	.270	.090	.100	.022	1.010	.002	.0010
305091	.0110	.0120	.0010	.1730	.2700	.0140	.210	.070	.070	.025	1.050	.002	.0010
305099	.0040	.0150	.0040	.2100	.2700	.0140	.180	.060	.110	.030	1.100	.002	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:


COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN ²)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN ²)	ALARGAMIENTO (%)	CHARPY V-NOTCH (J) PROMEDIO	CHARPY V-NOTCH (C) T1 T2 T3			CHARPY V-NOTCH TEMP C
305089	58,895	82,607	22					
305090	59,685	82,347	23					
305091	55,620	78,533	29					
305099	60,450	82,210	28					

	CHARPY V-NOTCH (LB/FT) PROMEDIO			CHARPY V-NOTCH (LB/FT) T1 T2 T3			CHARPY V-NOTCH TEMP F
305089							
305090							
305091							
305099							

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

305089 TRD01009 TRD01109 TRD01111 TRD01111 TRD01111 TRD01111



5502

[illegible]

1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304

[illegible]
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{q}^T \mathbf{F} \right) &= \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{q}}^T \dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{F} \\ &= \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \right) + \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{F} \\ &= \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}} \right) + \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{F} \\ &= \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}} \right) + \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{F} \end{aligned}$$
[illegible]

TEST	YIELD POINT (LB-INCH)	TENSILE STRENGTH (LB-INCH)	% ELONGATION (INCH)
000000	65,104	86,386	28

[illegible]

104 TLD0360 TLD0361 TLD0362 TLD0363 TLD0364 TLD0365 TLD0366 TLD0367





ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B985027B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.02.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRTL. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cl	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	
370533	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.410	0.018	0.004	0.190	0.110	0.080	0.045	0.020	0.053	0.005	0.016	0.017	
370534	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.420	0.013	0.003	0.190	0.120	0.071	0.043	0.018	0.036	0.004	0.015	0.018	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
370533	7030	5422033001	1.7500	53.391 (KSI)	76.497 (KSI)	41 (%)	2
370533	7060	5422035001	1.7500	53.333 (KSI)	76.664 (KSI)	39 (%)	2
370534	7050	5424071001	1.2500	55.880 (KSI)	79.785 (KSI)	44 (%)	2
370534	7070	5422040001	1.7500	55.081 (KSI)	78.870 (KSI)	53 (%)	2
370534	7090	5422038001	1.7500	52.990 (KSI)	76.993 (KSI)	40 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
370533	7030	5422033001	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241
370533	7030	5422033002	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241
370533	7030	5422033003	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241
370533	7030	5422033004	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241
370533	7060	5422035001	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241
370533	7060	5422035003	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241
370533	7060	5422035004	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241
370534	7060	5422037003	1.7500	72.0000	240.0000	0000197243	000240	1002429241

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
370533	7030	5422033001	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
370533	7030	5422033002	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
370533	7030	5422033003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
370533	7030	5422033004	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
370533	7060	5422035001	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
370533	7060	5422035003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
370533	7060	5422035004	2922	A-6 50% PLACA STECKEL
370534	7060	5422037003	2922	A-6 50% PLACA STECKEL

FIN DE DATOS

COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CG-03-F-02-A



ALTOS HORNO DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B922015B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	06.09.2016	PAGINA	1	PROSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARR. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alu	V	Co	Ti	
362392	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.420	0.014	0.005	0.180	0.095	0.040	0.033	0.011	0.037	0.003	0.015	0.018	
362394	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.410	0.017	0.004	0.180	0.140	0.051	0.040	0.011	0.038	0.003	0.015	0.016	
		PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELONG.		T. ELONG.			
362392	7010	4582020002		0.8750		54.581 (KSI)		79.324 (KSI)		49 (%)		2			
362392	7020	4582022001		0.8750		52.603 (KSI)		77.585 (KSI)		41 (%)		2			
362394	7050	4590083001		1.2500		57.179 (KSI)		78.274 (KSI)		45 (%)		2			
		PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA	
362392	7030	4582029002		0.8750		96.0000		480.0000		0000191598		000080		1002350716	
362394	7040	4590077001		1.2500		96.0000		480.0000		0000191555		000120		1002350716	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		PED. CLIENTE		NORMA									
362392	7030	4582029002		2787		A-6 50% PLACA STECKEL									
362394	7040	4590077001		2760		A-6 50% PLACA STECKEL									
		FIN DE DATOS													

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-R-02-A



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.09.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMAULA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cl	Ti	
463747	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.015	0.002	0.180	0.018	0.020	0.018	0.006	0.032	0.005	0.014	0.016	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELON.								
463747	7110	4582024001	0.8750	52.471 (KSI)	78.862 (KSI)	42 (%)	2								
463747	7130	4582015001	0.8750	52.830 (KSI)	77.847 (KSI)	47 (%)	2								
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA							
463747	7030	4582035001	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7030	4582035002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7040	4582034001	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7040	4582034002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7070	4582036001	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7070	4582036002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA											
463747	7030	4582035001	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7030	4582035002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7040	4582034001	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7040	4582034002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7070	4582036001	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7070	4582036002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740



ACERO TRANSPORTE SA DE CV

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE CARGA

GENERAL ANAYA NO. 5 COL. MARIANO ESCOBEDO CP. 54946

TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, ESTADO DE MEXICO

R.F.C ATR940908NS3

CARTA PORTE-TRASLADO

13706

FECHA/HORA DE EMISION

2017-06-23 18:44:21

Lugar y Fecha: Mexico D.F. a 23 de JUNIO de 2017		Referencia:			
Remitente: ACEROS TEPOTZOTLÁN SA DE CV MONC		Destinatario: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE CV			
RFC: ATE-851220-7C		RFC: MET-041118-5E			
Dirección: LIB. CARLOS SALINAS DE GORTARI KM.2		Dirección: ESTRADA BOCANEGRA NO.1702			
Colonia: CASTAÑOS		Colonia: SAN FELIPE			
Ciudad y Edo.: CASTAÑOS COAHUILA		Ciudad y Edo.: CHIHHUAHUA			
Tel.: C.P.25767		Tel.: C.P.:31203			
Recoger en: MONCLOVA		Entregar en: CHIHHUAHUA			
Valor Declarado: 0.00		Condiciones de pago: FLETE POR COBRAR/DESTINATARIO			
CANTIDAD	QUE EL REMITENTE DICE CONTIENEN	PESO TONS	PRECIO/TON	CONCEPTO	IMPORTE
1 LOTE	ACERO	26.020	637.00	FLETE	\$16 574.74
				SEGURO	\$0.00
				MANIOBRAS	\$0.00
				PEAJE	\$0.00
				REPARTO	\$0.00
				ESTADIAS	\$0.00
				OTROS	\$0.00
REMISION MC 24784				SUBTOTAL	\$16 574.74
ECONOMICO:AT130 PLACAS:91AD3K NUMERO DE VIAJE:4168-9				16% IVA	\$2 651.96
OPERADOR:GILBERTO ANGELES				SUBTOTAL C/IVA	\$19 226.70
(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.)				4% RETENCION	\$662.99
				TOTAL	\$18 563.71

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE AMPARA ESTA CARTA DE PORTE

PRIMERA.- Para los efectos del presente contrato de transporte se denomina "Porteador" al transportista y "Remitente" al usuario que contrata el servicio.

SEGUNDA.- El "Remitente" es responsable de que la información proporcionada al "Porteador" sea veraz y que la documentación que entregue para efectos del transporte sea la correcta.

TERCERA.- El "Remitente" debe declarar al "Porteador" el tipo de mercancía o efectos de que se trate, peso, medidas y/o número de la carga que entrega para su transporte y, en su caso, el valor de la misma. La carga que se entregue a granel será pesada por el "Porteador" en el primer punto donde haya báscula apropiada o, en su defecto, aforada en metros cúbicos con la conformidad del "Remitente".

CUARTA.- Para efectos del transporte, el "Remitente" deberá entregar al "Porteador" los documentos que las leyes y reglamentos exijan para llevar a cabo el servicio. En caso de no cumplirse con estos requisitos el "Porteador" está obligado a rehusar el transporte de las mercancías.

QUINTA.- Si por sospecha de falsedad en la declaración del contenido de un bulto el "Porteador" descare proceder a su reconocimiento, podrá hacerlo ante testigos y con asistencia del "Remitente" o del consignatario. Si este último no concurriere, se solicitará la presencia de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y se levantará el acta correspondiente. El "Porteador" tendrá en todo caso la obligación de dejar los bultos en el estado en que se encontraban antes del reconocimiento.

SEXTA.- El "Porteador" deberá recoger y entregar la carga precisamente en los domicilios que señale el "Remitente", ajustándose a los términos y condiciones convenidos. El "Porteador" solo está obligado a llevar la carga al domicilio del consignatario para su entrega una sola vez. Si esta no fuera recibida, se dejará aviso de que la mercancía queda a disposición del interesado en las bodegas que indique el "Porteador".

SEPTIMA.- Si la carga no fuere retirada dentro de los 30 días siguientes a aquel en que hubiere sido puesta a disposición del consignatario, el "Porteador" podrá solicitar la venta en pública subasta con arreglo a lo que dispone el Código de Comercio.

OCTAVA.- El "Porteador" y el "Remitente" negociarán libremente el precio del servicio, tomando en cuenta su tipo, característica de los embarques, volumen, regularidad, clase de carga y sistema de pago.

NOVENA.- Si el "Remitente" desea que el "Porteador" asuma la responsabilidad por el valor de las mercancías o efectos que el declare y que cubra toda clase de riesgos, inclusive los derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, las partes deberán convenir un cargo adicional, equivalente al valor de la prima del seguro que se contrate, el cual se deberá expresar en la **carta de porte**.

DECIMA.- Cuando el importe del flete no incluya el cargo adicional, la responsabilidad del "Porteador" queda expresamente limitada a la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por tonelada o cuando se trate de embarques cuyo peso sea mayor de 200kg. Pero menor de 1000kg; y a 4 días de salario mínimo por remesa cuando se trate de embarques con peso hasta de 200kg.

DECIMA PRIMERA.- El precio del transporte deberá pagarse en origen, salvo convenio entre las partes de pago en destino. Cuando el transporte se hubiere concertado "Flete por Cobrar", la entrega de las mercancías o efectos se hará contra el pago del flete y el "Porteador" tendrá derecho a retenerlos mientras no se le cubra el precio convenido.

DECIMA SEGUNDA.- Si al momento de la entrega resultare algún faltante o avería, el consignatario deberá hacerla constar en ese acto en la carta de porte y formular su reclamación por escrito al "Porteador", dentro de las 24 horas siguientes.

DECIMA TERCERA.- El "Porteador" queda eximido de la obligación de recibir mercancías o efectos para su transporte, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de carga que por su naturaleza, peso, volumen, embalaje, defectuoso o cualquier otra circunstancia no pueda transportarse sin destruirse o sin causar daño a los demás artículos o el material rodante. Salvo que la empresa de que se trate tenga el equipo adecuado.

b) Las mercancías cuyo transporte haya sido prohibido por disposiciones legales o reglamentarias. Cuando tales disposiciones no prohiban precisamente el transporte de determinadas mercancías, pero sí ordenen la presentación de ciertos documentos para que puedan ser transportadas, el "Remitente" estará obligado a entregar al "Porteador" los documentos correspondientes.

DECIMA CUARTA.- Los casos no previstos en las presentes condiciones y las quejas derivadas de su aplicación se someterán por la vía administrativa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DECIMA QUINTA.- Para el caso de que el "Remitente" contrate carro por entero, este aceptará la responsabilidad solidaria para con el "Porteador" mediante la figura de la corresponsabilidad QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, por lo que el "Remitente" queda obligado a verificar que la carga y el vehículo que la transporta, cumplan con el peso y dimensiones máximas establecidos en la Norma: NOM-012-SCT-2-2005.

Para el caso de incumplimiento e inobservancia a las disposiciones que regulan el peso y dimensiones, por parte del "Remitente", este será corresponsable de las infracciones y multas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DECIMA SEXTA.- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del "Remitente".

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) EN FORMA INCONDICIONAL A LA ORDEN DE ACERO TRANSPORTE SA DE CV EN ESTA CIUDAD O DONDE LLIJA EL TENERDOR DE ESTE DOCUMENTO EL IMPORTE QUE AMPARA EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. LA FALTA DEL PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL ___% MENSUAL

Nombre y Firma de quien Recibe

(EVITE CUOTA DE DEMORA, DESCARGUE ANTES DE 24 HORAS.)



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B922481B

CUENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION											
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		08.09.2016	1												
DIRECCION		CARRI. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA													
PRODUCTO		PLACA STECKEL													
COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
463747	ASIM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.015	0.002	0.180	0.018	0.020	0.018	0.006	0.032	0.005	0.014	0.016	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.								
463747	7110	4582024001	0.8750	52.471 (KSI)	78.862 (KSI)	42 (%)	2								
463747	7130	4582015001	0.8750	52.930 (KSI)	77.847 (KSI)	47 (%)	2								
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA							
463747	7030	4582035001	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7030	4582035002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7040	4582034001	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7040	4582034002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7070	4582036001	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
463747	7070	4582036002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080	1002351386							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA											
463747	7030	4582035001	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7030	4582035002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7040	4582034001	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7040	4582034002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7070	4582036001	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
463747	7070	4582036002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL											
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B939870B

CLIENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA											
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		21.10.2016	1												
DIRECCION		CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA		ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN											
PRODUCTO		PLACA STECKEL													
COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
267657	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.350	0.018	0.009	0.110	0.027	0.024	0.019	0.006	0.033	0.003	0.008	0.002	
363188	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.012	0.003	0.190	0.092	0.030	0.035	0.011	0.029	0.003	0.015	0.014	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.								
267657	7080	4832033001	0.3750	56.195 (KSI)	80.056 (KSI)	37 (%)	2								
267657	7090	4832034001	0.3750	56.463 (KSI)	80.737 (KSI)	40 (%)	2								
363188	7010	485007001	0.8750	56.378 (KSI)	80.959 (KSI)	48 (%)	2								
363188	7020	4850074001	0.8750	56.377 (KSI)	81.687 (KSI)	51 (%)	2								
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA							
267657	7070	4832038013	0.3750	72.0000	240.0000	0000192211	000170	1002373022							
267657	7070	4832038014	0.3750	72.0000	240.0000	0000192211	000170	1002373022							
363188	7020	4850074001	0.8750	96.0000	480.0000	0000192211	000240	1002373022							
363188	7020	4850074002	0.8750	96.0000	480.0000	0000192211	000240	1002373022							
363188	7030	4850075001	0.8750	96.0000	480.0000	0000192211	000240	1002373022							
363188	7030	4850075002	0.8750	96.0000	480.0000	0000192211	000240	1002373022							
363188	7070	4850073001	0.8750	96.0000	480.0000	0000192211	000240	1002373022							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA											
267657	7070	4832038013	2799	A-6 50%	PLACA STECKEL										
267657	7070	4832038014	2799	A-6 50%	PLACA STECKEL										
363188	7020	4850074001	2799	A-6 50%	PLACA STECKEL										
363188	7020	4850074002	2799	A-6 50%	PLACA STECKEL										
363188	7030	4850075001	2799	A-6 50%	PLACA STECKEL										
363188	7030	4850075002	2799	A-6 50%	PLACA STECKEL										
363188	7070	4850073001	2799	A-6 50%	PLACA STECKEL										
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118513

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B921766B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	06.09.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARTE. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alu	V	Co	Ti	
362390	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.410	0.017	0.004	0.170	0.130	0.046	0.041	0.012	0.041	0.003	0.015	0.018	
362395	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.400	0.012	0.002	0.160	0.110	0.057	0.038	0.014	0.029	0.003	0.014	0.015	
362400	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.410	0.013	0.002	0.170	0.110	0.039	0.039	0.012	0.034	0.003	0.015	0.015	
463747	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.015	0.002	0.180	0.018	0.020	0.018	0.006	0.032	0.005	0.014	0.016	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELONG.	T. ELONG.
362390	7050	4582021001	0.8750	53.814 (KSI)	78.880 (KSI)	47(%)	2
362390	7120	4582032002	0.8750	58.460 (KSI)	74.308 (KSI)	51(%)	2
362395	7050	4590078002	1.2500	57.216 (KSI)	75.503 (KSI)	49(%)	2
362400	7020	4590063001	1.0000	58.341 (KSI)	72.437 (KSI)	55(%)	2
463747	7110	4582024001	0.8750	52.471 (KSI)	78.862 (KSI)	42(%)	2
463747	7130	4582015001	0.8750	52.830 (KSI)	77.847 (KSI)	47(%)	2

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA ENTREGA
362390	7120	4582032002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080 1002350363
362395	7050	4590078002	1.2500	96.0000	480.0000	0000191555	000120 1002350363
362400	7020	4590063004	1.0000	96.0000	480.0000	0000191598	000110 1002350363
463747	7050	4582031002	0.8750	96.0000	480.0000	0000191598	000080 1002350363

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
362390	7120	4582032002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL
362395	7050	4590078002	2760	A-6 50% PLACA STECKEL
362400	7020	4590063004	2787	A-6 50% PLACA STECKEL
463747	7050	4582031002	2787	A-6 50% PLACA STECKEL

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A




ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B941002B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA	 ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION				
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Ca	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	
267664	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.440	0.017	0.004	0.170	0.026	0.028	0.023	0.007	0.038	0.003	0.014	0.016	
267666	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.420	0.017	0.005	0.170	0.024	0.028	0.020	0.006	0.040	0.003	0.016	0.014	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
267664	7050	4834060001	2.0000	51.863 (KSI)	74.232 (KSI)	45 (%)	2
267664	7070	4834048002	1.0000	56.334 (KSI)	76.691 (KSI)	49 (%)	2
267664	7080	4834047001	1.0000	53.609 (KSI)	77.287 (KSI)	42 (%)	2
267666	7020	4834055001	1.2500	54.381 (KSI)	78.086 (KSI)	44 (%)	2
267666	7030	4834046002	1.0000	55.339 (KSI)	77.474 (KSI)	47 (%)	2
267666	7040	4834054001	1.2500	54.612 (KSI)	78.207 (KSI)	45 (%)	2
267666	7070	4834026001	0.7500	56.614 (KSI)	79.523 (KSI)	46 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
267664	7070	4834048003	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260	1002374192
267666	7020	4834055002	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300	1002374192
267666	7020	4834055004	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300	1002374192
267666	7020	4834055006	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300	1002374192
267666	7030	4834046001	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260	1002374192
267666	7030	4834046003	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260	1002374192
267666	7040	4834054001	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300	1002374192
267666	7040	4834054002	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300	1002374192
267666	7040	4834054005	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300	1002374192

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
267664	7070	4834048003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7020	4834055002	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7020	4834055004	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7020	4834055006	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7030	4834046001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7030	4834046003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7040	4834054001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7040	4834054002	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7040	4834054005	2799	A-6 50% PLACA STECKEL

COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL	EMITIO : S201740
---	------------------

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B941002B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.10.2016	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

FIN DE DATOS

COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-01-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B934492B

CLIENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.										
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		07.10.2016	1											
DIRECCION		CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA												
PRODUCTO		PLACA STECKEL		ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA										
				PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION										
COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti
267307	ASIM A572-50/A709-50	0.170	1.410	0.015	0.004	0.160	0.021	0.024	0.018	0.006	0.040	0.004	0.014	0.017
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELONG.	T. ELONG.							
267307	7010	4764076001	2.0000	53.026 (KSI)	74.866 (KSI)	47 (%)	2							
267307	7020	4758033001	1.0000	53.131 (KSI)	79.233 (KSI)	42 (%)	2							
267307	7040	4764064001	1.0000	53.985 (KSI)	80.463 (KSI)	41 (%)	2							
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA						
267307	7030	4764066003	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260	1002366364						
267307	7030	4764066005	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260	1002366364						
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA										
267307	7030	4764066003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL										
267307	7030	4764066005	2799	A-6 50% PLACA STECKEL										
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



CUENTE	ACEROS TEPOTZOILAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.06.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

		COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Ch
171450	ASTM A572-50/A709-50	0.085	1.260	0.023	0.006	0.120	0.180	0.029	0.021	0.004	0.034	0.013	0.014
172768	ASTM A572-50/A709-50	0.079	1.240	0.016	0.004	0.120	0.180	0.024	0.023	0.005	0.036	0.013	0.015
173907	ASTM A572-50/A709-50	0.068	1.250	0.011	0.002	0.220	0.027	0.022	0.023	0.007	0.049	0.003	0.019
271635	ASTM A572-50/A709-50	0.089	1.270	0.014	0.007	0.120	0.180	0.017	0.019	0.006	0.048	0.013	0.014
272959	ASTM A572-50/A709-50	0.071	0.860	0.017	0.006	0.061	0.039	0.016	0.021	0.005	0.035	0.004	0.037
274805	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.100	0.013	0.005	0.110	0.020	0.020	0.021	0.006	0.041	0.002	0.009

COLADA	Ti
171450	0.002
172768	0.003
173907	0.009
271635	0.002
272959	0.003
274805	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
171450	7081	11283541	0.6250	53.176 (KSI)	68.920 (KSI)	50 (%)	2
172768	6011	11283561	0.6250	56.397 (KSI)	75.126 (KSI)	48 (%)	2
172768	6012	11283573	0.6250	61.113 (KSI)	75.635 (KSI)	47 (%)	2
173907	3031	11340601	0.6250	51.691 (KSI)	65.854 (KSI)	51 (%)	2
271635	6012	11283521	0.6250	55.302 (KSI)	68.048 (KSI)	49 (%)	2
271635	6013	11283511	0.6250	54.458 (KSI)	69.442 (KSI)	49 (%)	2
271635	6013	11283513	0.6250	54.458 (KSI)	69.442 (KSI)	49 (%)	2
272959	3013	11284811	0.6250	56.757 (KSI)	72.853 (KSI)	49 (%)	2
272959	4011	11284791	0.6250	51.554 (KSI)	67.768 (KSI)	48 (%)	2
274805	7020	11467611	0.6250	61.773 (KSI)	78.007 (KSI)	48 (%)	2
274805	7080	11467621	0.6250	55.324 (KSI)	74.887 (KSI)	37 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
171450	7081	11283543	0.6250	96.0000	240.0000	0000202611	000030	1002491607
172768	6013	11283553	0.6250	96.0000	240.0000	0000202611	000030	1002491607
173907	3031	11340601	0.6250	96.0000	480.0000	0000202611	000040	1002491607
271635	6012	11283523	0.6250	96.0000	240.0000	0000202611	000030	1002491607

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B036599B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.06.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRI. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
272959	4013	11284802	0.6250	96.0000	240.0000	0000202611	000030	1002491607
274805	7020	11467611	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
274805	7020	11467612	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
274805	7030	11467603	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
274805	7030	11467604	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
274805	7080	11467621	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
274805	7080	11467622	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
274805	7090	11467631	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
274805	7090	11467632	0.6250	72.0000	240.0000	0000202611	000010	1002491607
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
171450	7081	11283543	3057	A-6				
172768	6013	11283553	3057	A-6				
173907	3031	11340601	3057	A-6				
171635	6012	11283523	3057	A-6				
272959	4013	11284802	3057	A-6				
274805	7020	11467611	3057	A-6				
274805	7020	11467612	3057	A-6				
274805	7030	11467603	3057	A-6				
274805	7030	11467604	3057	A-6				
274805	7080	11467621	3057	A-6				
274805	7080	11467622	3057	A-6				
274805	7090	11467631	3057	A-6				
274805	7090	11467632	3057	A-6				
FIN DE DATOS								

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

EC-03-F-02-A



CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	11.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

+-----	
--	--

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
172599	7080	5854093001	1.1250	54.892 (KSI)	78.537 (KSI)	49 (%)	2
172599	7090	5854090001	1.1250	57.240 (KSI)	78.483 (KSI)	44 (%)	2
275421	7010	6216033007	0.3750	50.057 (KSI)	69.591 (KSI)	44 (%)	8
275421	7020	6216034007	0.3750	47.247 (KSI)	68.036 (KSI)	46 (%)	8
372107	7010	6134025001	2.0000	51.448 (KSI)	75.280 (KSI)	47 (%)	2
372107	7040	6178077001	0.7500	54.965 (KSI)	78.014 (KSI)	50 (%)	2
372107	7200	6132022001	0.7500	56.922 (KSI)	80.762 (KSI)	44 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
172599	7070	6192129001	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002497536
275421	7010	6216033001	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033002	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033003	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033004	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033011	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033012	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033013	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033014	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
275421	7010	6216033015	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000010	1002497536
372107	7050	6192127001	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002497536
372107	7050	6192127002	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002497536
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE		NORMA			
172599	7070	6192129001	3074		A-6 50% PLACA STECKEL			

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118511



CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	11.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

PRODUCTO EMBARCADO					
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA	
275421	7010	6216033001	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033002	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033003	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033004	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033011	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033012	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033013	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033014	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
275421	7010	6216033015	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
372107	7050	6192127001	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
372107	7050	6192127002	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL
FIN DE DATOS					



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B750440B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.06.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CERNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRI. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Al	V	Co	Ti
154122	ASTM A572-50/A709-50	0.068	1.409	0.014	0.003	0.172	0.026	0.024	0.022	0.038	0.042	0.039	0.001
154444	ASTM A572-50/A709-50	0.208	1.461	0.021	0.004	0.322	0.033	0.026	0.021	0.030	0.004	0.013	0.003
254161	ASTM A572-50/A709-50	0.121	1.315	0.014	0.006	0.159	0.018	0.028	0.015	0.037	0.004	0.040	0.002
254840	ASTM A572-50/A709-50	0.088	1.200	0.016	0.003	0.156	0.029	0.027	0.016	0.044	0.041	0.043	0.003
254841	ASTM A572-50/A709-50	0.216	1.385	0.022	0.005	0.321	0.019	0.031	0.014	0.030	0.030	0.014	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
154122	6031	91061891	1.5000	58.631 (KSI)	79.252 (KSI)	46 (%)	2
154122	6032	91061901	1.5000	58.303 (KSI)	78.715 (KSI)	49 (%)	2
154122	6033	91066091	1.7500	55.788 (KSI)	70.164 (KSI)	52 (%)	2
154444	3150	91066071	1.7500	56.183 (KSI)	83.686 (KSI)	65 (%)	2
154444	3160	91080901	2.0000	59.222 (KSI)	73.138 (KSI)	48 (%)	2
254161	5011	91061911	1.5000	57.293 (KSI)	77.774 (KSI)	48 (%)	2
254161	5013	91066121	1.7500	54.983 (KSI)	71.654 (KSI)	43 (%)	2
254161	5014	91066111	1.7500	55.380 (KSI)	71.823 (KSI)	60 (%)	2
254161	5021	91030351	1.5000	57.271 (KSI)	77.531 (KSI)	49 (%)	2
254840	7051	91066041	1.7500	54.335 (KSI)	70.505 (KSI)	60 (%)	2
254840	7052	91066031	1.7500	55.689 (KSI)	75.765 (KSI)	53 (%)	2
254840	7053	91080801	1.0000	59.754 (KSI)	66.608 (KSI)	55 (%)	2
254841	7011	91066051	1.7500	61.585 (KSI)	84.402 (KSI)	35 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA
154122	6033	91066091	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173
154122	6034	91066101	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173
154444	3150	91066071	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173
254161	5013	91066121	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173
254161	5014	91066111	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173
254840	7051	91066041	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173
254840	7052	91066031	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173
254841	7011	91066051	1.7500	72.0000	240.0000	0000173573	1002136173

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
154122	6033	91066091	2340	A-6

EMITIO : S115948

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CO-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B750440B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA	25.06.2015	2	
PRODUCTO	PLACA ANCHA			

-----+-----				PRODUCTO EMBARCADO	-----+-----
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA	
154122	6034	91066101	2340	A-6	
154444	3150	91066071	2340	A-6	
254161	5013	91066121	2340	A-6	
254161	5014	91066111	2340	A-6	
254840	7051	91066041	2340	A-6	
254840	7052	91066031	2340	A-6	
254841	7011	91066051	2340	A-6	
-----+-----				FIN DE DATOS	-----+-----

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S115948

QC-03-F-02-A

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 24/06/17 12:21:33

CLIENTE: ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.

PEDIDO: 025874

CONTRA 10781

REMISION: 0116945-1

PRODUCTO: ANGULO 5X1/2" 127X12.7MM GRADO DE ACERO A572/A572M-06 G50

ESPECIFICACION A5/A6M-10

EMBARQUE: ACERO TRANSPORTE

PESO TEORICO(KG/MT):24.106

LONGITUD(Mts) 12.20

TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
326542	.0140	.0160	.0240	.2100	.2600	.0140	.2200	.0900	.1300	.0320	1.0800	.0020

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN ²)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN ²)	ALARGAMIENTO 2"	V-NOTCH JOULES
326542	60,080	82,808	28	

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

326542 TRF02208 TRF02209 TRF02210 TRF02214 TRF02215 TRF02216

FUNDICIONES DE ACERO EST.
SIMEC
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

00004565

100

[illegible]

$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n^2}$	$\frac{1}{n^3}$	$\frac{1}{n^4}$	$\frac{1}{n^5}$	$\frac{1}{n^6}$	$\frac{1}{n^7}$	$\frac{1}{n^8}$	$\frac{1}{n^9}$	$\frac{1}{n^{10}}$
$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{512}$	$\frac{1}{1024}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{81}$	$\frac{1}{243}$	$\frac{1}{729}$	$\frac{1}{2187}$	$\frac{1}{6789}$	$\frac{1}{20539}$	$\frac{1}{61512}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{4096}$	$\frac{1}{16384}$	$\frac{1}{65536}$	$\frac{1}{262144}$	$\frac{1}{1048576}$
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{125}$	$\frac{1}{625}$	$\frac{1}{3125}$	$\frac{1}{15625}$	$\frac{1}{78125}$	$\frac{1}{390625}$	$\frac{1}{1953125}$	$\frac{1}{9765625}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{216}$	$\frac{1}{1296}$	$\frac{1}{7776}$	$\frac{1}{46656}$	$\frac{1}{279936}$	$\frac{1}{1679616}$	$\frac{1}{10077696}$	$\frac{1}{60466176}$
$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{49}$	$\frac{1}{343}$	$\frac{1}{2401}$	$\frac{1}{16807}$	$\frac{1}{117649}$	$\frac{1}{823543}$	$\frac{1}{5764801}$	$\frac{1}{40353607}$	$\frac{1}{282475249}$
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{512}$	$\frac{1}{4096}$	$\frac{1}{32768}$	$\frac{1}{262144}$	$\frac{1}{2097152}$	$\frac{1}{16777216}$	$\frac{1}{134217728}$	$\frac{1}{1073743872}$
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{81}$	$\frac{1}{729}$	$\frac{1}{6561}$	$\frac{1}{59049}$	$\frac{1}{531441}$	$\frac{1}{4782969}$	$\frac{1}{43046721}$	$\frac{1}{387420499}$	$\frac{1}{3486784401}$
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{100000}$	$\frac{1}{1000000}$	$\frac{1}{10000000}$	$\frac{1}{100000000}$	$\frac{1}{1000000000}$	$\frac{1}{10000000000}$

[illegible][illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

α	β	γ	δ	ϵ	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	$\omicron$	π	ρ	σ	τ	υ	ϕ	χ	ψ	ω	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

[illegible]

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

1000

ROBBER ESPECIAL
SAFE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 16/04/17 9:16:43

CLIENTE: ACEPIS TEPICOTULAN, S.A. DE C.V.

PEDIDO: 125049 CONTRA 1114 REMISION: 0114113-1

PRODUCTO: ANGULO 4X1/2" 131.6X12.7MM GRADO DE ACERO A572/A572M-66 650

CANTIDAD EMBARCADA 39.719 TONS

ESPECIFICACION PRODUCTO: A6/A6M-11 EMBARQUE: JOSE A. PEREZ CABRERA

PESO TEORICO PRODUCTO: 19.048 KGS/MT LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Ti	% Nb
325089	.0080	.0160	.0440	.2100	.1700	.0150	.260	.090	.070	.022	1.070	.002	.0010
325090	.0120	.0180	.0390	.2000	.1600	.0150	.270	.090	.100	.022	1.010	.002	.0020
325098	.0110	.0220	.0310	.1700	.2700	.0140	.210	.070	.070	.025	1.050	.002	.0010
325099	.0140	.0150	.0240	.2100	.2700	.0140	.180	.080	.110	.030	1.100	.002	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (%)	CHARPY V-NOTCH (J) PROMEDIO	CHARPY V-NOTCH (J) T1 T2 T3	CHARPY V-NOTCH TEMP C
325089	59,895	82,607	28			
325090	59,685	82,347	28			
325098	56,680	78,580	29			
325099	60,450	83,210	28			
				CHARPY V-NOTCH (LB/FT) PROMEDIO	CHARPY V-NOTCH (LB/FT) T1 T2 T3	CHARPY V-NOTCH TEMP F
325089						
325090						
325098						
325099						

ATADOS DE LA COLADA

COLADA						
325089	TRD01208	TRD01209	TRD01210	TRD01211	TRD01212	TRD01213



SOLD FORTACERO SA DE CV
TO: BLVD PRESIDENTE CARLOS SALINAS
 DE GORTARI KM 8 B
 A POSTAL 64 CP
 APODACA NL 66600

NUCOR
NUCOR CORPORATION
NUCOR STEEL UTAH

CERTIFIED MILL TEST REPORT

NUCOR - PLYMOUTH IS AN I.S.O. 9001 AND AN A.B.S. CERTIFIED MILL

Ship from:

Nucor Steel - Utah
 W Cemetery Road
 PLYMOUTH, UT 84330
 435-458-2300

Date: 28-Nov-2011

B.L. Number: 390863

Load Number: 707694

SHIP FORTACERO SA DE CV
TO: C/O INTERMODAL MEXICO
 BLVD CARLOS SALINAS DE GORTARI
 STATION MONTERREY
 APODACA NL 66600

Material Safety Data Sheets are available at www.nucorbar.com or by contacting your inside sales representative

ENWG-28 March 9, 2011

Material Safety Data Sheets are available at www.nucorbar.com or by contacting your inside sales representative.																		
HEAT NUM. *	DESCRIPTION	PHYSICAL TESTS						CHEMICAL TESTS										
		YIELD P.S.I.	TENSILE P.S.I.	ELONG % IN 8"	BEND	WT% DEF	C Ni	Mn Cr	P Mo	S V	Si Cu	Cu Sn	C.E.					
PO# => PL1120672101	4500082534 Nucor Steel - Utah 6x6x7/8" Angle 40" A572 Gr50 TY7 ASTM A572/A572M-07 GR 50 TY2, A7 09-08 GR 50	66,661 460MPa 66,790 461MPa	87,906 606MPa 88,813 612MPa	27.0% \n 28.0%			.20 .09 MN/C 04.50	.80 .09	.013 .016	.037 .039	.24 .005	.25						
CMTR COMPLIES WITH DIN EN 10204 - 3.1.B																		

ABEINSA	
Power Structures	
Fecha: 11-21-11	
No. 01/2	Va. Bo. Calidad
Responsible Dpto. Calidad	

00001300

QUALITY
ASSURANCE

Scott Laurenti

Scan [Signature]



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B000567B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	
171836	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.310	0.017	0.007	0.120	0.021	0.023	0.022	0.006	0.038	0.003	0.009	0.002	
271915	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.400	0.015	0.004	0.170	0.021	0.021	0.022	0.007	0.036	0.003	0.017	0.019	
272163	ASTM A572-50/A709-50	0.140	1.320	0.019	0.007	0.120	0.028	0.018	0.023	0.005	0.042	0.003	0.009	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELONG.	T. ELONG.
171836	6010	5698039001	0.5000	56.445 (KSI)	77.727 (KSI)	43 (%)	2
171836	6040	5698037002	0.5000	56.369 (KSI)	77.491 (KSI)	42 (%)	2
271915	5010	5650033001	1.0000	55.703 (KSI)	79.575 (KSI)	41 (%)	2
271915	5010	5650033007	1.0000	54.654 (KSI)	79.039 (KSI)	50 (%)	2
271915	5030	5650005001	0.7500	52.804 (KSI)	81.590 (KSI)	47 (%)	2
272163	6010	5690003001	0.6250	50.999 (KSI)	74.295 (KSI)	40 (%)	2
272163	6050	5694047001	0.6250	50.999 (KSI)	74.295 (KSI)	40 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
171836	6010	5698039009	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6010	5698039010	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6010	5698039011	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6010	5698039012	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6020	5698038016	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6020	5698038017	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6020	5698038018	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037003	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037004	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037005	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037006	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037007	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037010	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037011	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037012	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037017	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
171836	6040	5698037018	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
271915	5030	5650005001	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002449179

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-02 F-02-A




ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B000567B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.03.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
271915	5030	5650005002	0.7500	72.0000	240.0000	0000199219	000170	1002449179
272163	6080	5698040001	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
272163	6080	5698040003	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
272163	6080	5698040004	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
272163	6080	5698040005	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
272163	6080	5698040013	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
272163	6080	5698040015	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
272163	6080	5698040016	0.5000	72.0000	240.0000	0000199219	000140	1002449179
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
171836	6010	5698039009	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6010	5698039010	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6010	5698039011	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6010	5698039012	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6020	5698038016	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6020	5698038017	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6020	5698038018	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037003	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037004	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037005	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037006	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037007	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037010	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037011	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037012	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037017	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
171836	6040	5698037018	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
271915	5030	5650005001	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
271915	5030	5650005002	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
272163	6080	5698040001	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
272163	6080	5698040003	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
272163	6080	5698040004	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				
272163	6080	5698040005	2985	A-6 50% PLACA STECKEL				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-02-E-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO.

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B000567B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.03.2017	PAGINA	3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE
272163	6080	5698040013	2985
272163	6080	5698040015	2985
272163	6080	5698040016	2985
FIN DE DATOS			

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-P02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B996699B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	12.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	ROLLO STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti
371032	ASTM A572-50/A709-50 T	0.089	0.820	0.010	0.006	0.0870	0.150	0.051	0.048	0.013	0.002	0.037	0.002
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. ROLLO	PLANCHON	ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		% ELON.		T. ELONG.		
371032	S5638039	5010	0.7500		64.539 (KSI)		74.064 (KSI)		47 (%)		2		
371032	S5638041	6010	0.7500		64.844 (KSI)		74.516 (KSI)		52 (%)		2		
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. POLLO	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA		PED. CLIENTE		
371032	S5638039	0.7500	72.0000		0000198217		000210		1002443720		2962		
COLADA	NO. ROLLO	NORMA											
371032	S5638039	50%A6											
FIN DE DATOS													

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118510

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B941002B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL, CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	
267664	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.440	0.017	0.004	0.170	0.026	0.028	0.023	0.007	0.038	0.003	0.014	0.016	
267666	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.420	0.017	0.005	0.170	0.024	0.028	0.020	0.006	0.040	0.003	0.016	0.014	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELONG.	T. ELONG.
267664	7050	4834060001	2.0000	51.963 (KSI)	74.232 (KSI)	45 (%)	2
267664	7070	4834048002	1.0000	56.334 (KSI)	76.691 (KSI)	49 (%)	2
267664	7080	4834047001	1.0000	53.609 (KSI)	77.287 (KSI)	42 (%)	2
267666	7020	4834055001	1.2500	54.381 (KSI)	78.086 (KSI)	44 (%)	2
267666	7030	4834046002	1.0000	55.339 (KSI)	77.474 (KSI)	47 (%)	2
267666	7040	4834054001	1.2500	54.612 (KSI)	78.207 (KSI)	45 (%)	2
267666	7070	4834026001	0.7500	56.614 (KSI)	79.523 (KSI)	46 (%)	2

PRODUCTO EMEARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA
267664	7070	4834048003	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260 1002374192
267666	7020	4834055002	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300 1002374192
267666	7020	4834055004	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300 1002374192
267666	7020	4834055006	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300 1002374192
267666	7030	4834046001	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260 1002374192
267666	7030	4834046003	1.0000	72.0000	480.0000	0000192211	000260 1002374192
267666	7040	4834054001	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300 1002374192
267666	7040	4834054002	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300 1002374192
267666	7040	4834054005	1.2500	72.0000	240.0000	0000192211	000300 1002374192

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
267664	7070	4834048003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7020	4834055002	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7020	4834055004	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7020	4834055006	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7030	4834046001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7030	4834046003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7040	4834054001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7040	4834054002	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
267666	7040	4834054005	2799	A-6 50% PLACA STECKEL

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CC-03 R-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B941002B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.10.2016	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

OS-03-F-02-A



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISIÓN	27.10.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTÁN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	B	
249240	ASTM A572-50/A709-50	0.186	1.406	0.015	0.006	0.184	0.027	0.026	0.024		0.042	0.002	0.015	0.011		
249634	ASTM A572-50/A709-50	0.174	1.422	0.021	0.004	0.188	0.019	0.026	0.017		0.040	0.004	0.016	0.011		
445205	ASTM A36/ASME SA36 ED13	0.186	0.826	0.017	0.006	0.131	0.028	0.036	0.021	0.011	0.037	0.001	0.001	0.002	0.0002	
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.									
249240	7050	1170205001	1.7500	53.947 (KSI)	78.761 (KSI)	39 (%)	2									
249240	7130	1170204001	1.7500	54.900 (KSI)	77.412 (KSI)	45 (%)	2									
249634	7160	1270079001	1.7500	52.434 (KSI)	70.401 (KSI)	50 (%)	2									
445205	7060	1192099001	0.3750	43.389 (KSI)	71.000 (KSI)	28 (%)	8									
445205	7130	1192121001	0.5000	47.151 (KSI)	68.463 (KSI)	26 (%)	8									
445205	7150	1188002001	0.5000	47.229 (KSI)	68.588 (KSI)	25 (%)	8									
445205	7180	1188016001	0.7500	44.153 (KSI)	66.009 (KSI)	25 (%)	8									
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA		ENTREGA							
249240	7100	1270077001	1.7500	72.0000	480.0000	0000161481	000020		1002019957							
249634	7160	1270079001	1.7500	72.0000	480.0000	0000161481	000020		1002019957							
445205	7180	1188016001	0.7500	96.0000	240.0000	0000162086	000020		1002019957							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA												
249240	7100	1270077001	002190	A-6 PLACA STECKEL												
249634	7160	1270079001	002190	A-6 PLACA STECKEL												
445205	7180	1188016001	002192	A-6 PLACA STECKEL												
FIN DE DATOS																



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B998404B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
271906	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.021	0.004	0.160	0.020	0.026	0.022	0.006	0.042	0.005	0.016	0.018	
271908	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.021	0.005	0.160	0.028	0.046	0.028	0.009	0.039	0.006	0.016	0.019	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.								
271906	5080	5652097001	1.7500	54.133 (KSI)	77.118 (KSI)	41 (%)	2								
271906	5090	5650066001	2.0000	51.597 (KSI)	76.245 (KSI)	46 (%)	2								
271908	5010	5650065001	2.0000	52.272 (KSI)	76.816 (KSI)	45 (%)	2								
271908	5040	5650068001	2.0000	54.624 (KSI)	77.175 (KSI)	45 (%)	2								
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA							
271906	5090	5650066001	2.0000	72.0000	480.0000	0000198213	000280	1002446418							
271908	5010	5650065001	2.0000	72.0000	480.0000	0000198213	000280	1002446418							
271908	5010	5650065002	2.0000	72.0000	480.0000	0000198213	000280	1002446418							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA											
271906	5090	5650066001	2963	A-6 50% PLACA STECKEL											
271908	5010	5650065001	2963	A-6 50% PLACA STECKEL											
271908	5010	5650065002	2963	A-6 50% PLACA STECKEL											
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC03-F-02-A

SATAGÜEN
Km 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
Cd. Sahagún, Tlaxapulco, H. HGO 43060
México

CLIENTE: ACEROS DE COLOMBIA S.A.
ACEROS DE COLOMBIA S.A.
LIBRAMIENTO: CARLOS SALAS S.A. CARRERA 140, TORO, KM 3.5
C/ ASTANGOS COVA 28267
México

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE
FECHA: 06/06/2017

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE
FECHA: 25/03/2017

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE
FECHA: 25/03/2017

COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA	
C _g	Mn _g	S _g	P _g	Cr _g	Cu _g	Mb _g	Nb _g	Ni _g	Si _g
0.089	1.109	0.017	0.012	0.082	0.267	0.015	0.001	0.079	0.208
COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Si _g		Si _g		Si _g		Si _g		Si _g	
0.017		0.017		0.017		0.017		0.017	

COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA	
C _g	Mn _g	S _g	P _g	Cr _g	Cu _g	Mb _g	Nb _g	Ni _g	Si _g
0.089	1.109	0.017	0.012	0.082	0.267	0.015	0.001	0.079	0.208

COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA	
C _g	Mn _g	S _g	P _g	Cr _g	Cu _g	Mb _g	Nb _g	Ni _g	Si _g
0.089	1.109	0.017	0.012	0.082	0.267	0.015	0.001	0.079	0.208

COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA	
C _g	Mn _g	S _g	P _g	Cr _g	Cu _g	Mb _g	Nb _g	Ni _g	Si _g
0.089	1.109	0.017	0.012	0.082	0.267	0.015	0.001	0.079	0.208

ACEROS MESS VILLT

ACEROS MESS VILLT



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
AHMISA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B045116B

CUENTE	ACEROS TEPICIZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA EMPRESA. ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARR. MEX-QUEPILAR KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMPATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	AL	V	CB
174418	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.420	0.019	0.006	0.150	0.027	0.020	0.022	0.007	0.017	0.004	0.015
175310	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.440	0.016	0.004	0.150	0.022	0.016	0.019	0.006	0.013	0.005	0.015
175311	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.015	0.005	0.150	0.022	0.023	0.021	0.006	0.041	0.003	0.015
372525	ASTM A572-50/A709-50	0.150	1.420	0.015	0.003	0.170	0.120	0.054	0.052	0.014	0.035	0.003	0.014
372526	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.410	0.011	0.004	0.170	0.110	0.064	0.051	0.017	0.032	0.003	0.017
COLADA	TI												
174418	0.012												
175310	0.010												
175311	0.012												
372525	0.010												
372526	0.012												
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	3ELONG.	T. ELONG.						
174418	3010	11400361	1.7500	53.333 (KSI)	76.271 (KSI)	51 (%)	2						
174418	3020	11400271	1.7500	55.333 (KSI)	77.094 (KSI)	51 (%)	2						
174418	4040	11661791	1.2500	55.337 (KSI)	76.514 (KSI)	47 (%)	2						
174418	4050	11406611	0.8750	54.966 (KSI)	79.713 (KSI)	50 (%)	2						
174418	4100	11406161	1.0000	55.009 (KSI)	78.738 (KSI)	51 (%)	2						
174418	4180	11406031	2.0000	53.330 (KSI)	75.952 (KSI)	46 (%)	2						
175310	3120	11784391	0.7500	56.097 (KSI)	81.457 (KSI)	44 (%)	2						
175310	4080	11784281	0.7500	57.229 (KSI)	78.930 (KSI)	47 (%)	2						
175311	3070	11802991	2.0000	55.137 (KSI)	78.241 (KSI)	55 (%)	2						
175311	4110	11784491	0.7500	57.126 (KSI)	77.402 (KSI)	48 (%)	2						
175311	4120	11784521	0.7500	55.997 (KSI)	77.546 (KSI)	46 (%)	2						
372525	7010	11820701	0.7500	55.777 (KSI)	77.276 (KSI)	45 (%)	2						
372525	7200	11826001	1.7500	56.023 (KSI)	77.045 (KSI)	49 (%)	2						
372525	7210	11826061	1.7500	55.628 (KSI)	80.510 (KSI)	44 (%)	2						
372526	7010	11826011	1.7500	56.059 (KSI)	81.717 (KSI)	41 (%)	2						
372526	7160	11820571	0.8750	57.327 (KSI)	83.488 (KSI)	48 (%)	2						
372526	7240	11820641	0.8750	56.914 (KSI)	83.657 (KSI)	47 (%)	2						

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CS-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B045116B

CUENTE	ACEROS TEPICOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISIÓN	19-07-2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRE. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUMATULA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pulg.)	ANCHO (Pulg.)	LARGO (Pulg.)	PESO (Kg.)	TEMPERATURA	TEMPERATURA
174-18	4070	11784121	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-19	3040	11784181	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-10	3040	11784181	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-11	3020	11784221	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-11	3020	11784221	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
372-25	7010	11820701	0.7500	96.0000	480.0000	0000204121	000210	1002501371
372-26	7130	11820651	0.8750	96.0000	480.0000	0000204114	000010	1002501371
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pulg.)	ANCHO (Pulg.)	LARGO (Pulg.)	PESO (Kg.)	TEMPERATURA	TEMPERATURA
174-18	4070	11784121	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-19	3040	11784181	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-10	3040	11784181	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-11	3020	11784221	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
175-11	3020	11784221	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	1002501371
372-25	7010	11820701	0.7500	96.0000	480.0000	0000204121	000210	1002501371
372-26	7130	11820651	0.8750	96.0000	480.0000	0000204114	000010	1002501371

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO. Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIDO : S201740

FC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047499B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBEROS MICHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARPI. MEX.-QUEPETARO KM 27.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Co	Cr	Ni	Mo	Alu	V	Ch
175458	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.450	0.012	0.009	0.170	0.021	0.015	0.019	0.007	0.029	0.002	0.015
372577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.120	0.075	0.048	0.014	0.030	0.003	0.015
COLADA	Ti												
175458	0.011												
372577	0.011												
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	L. ELASTICO	P. TENSION	SECCION.	ELONG.						
175458	3020	11880681	1.0000	57.522 (KSI)	78.500 (KSI)	46 (%)	2						
175458	3050	11880622	1.0000	56.400 (KSI)	79.587 (KSI)	40 (%)	2						
175458	3100	11887211	0.8750	57.472 (KSI)	74.354 (KSI)	43 (%)	2						
372577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45 (%)	2						
372577	4020	11882191	2.0000	50.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50 (%)	2						
372577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39 (%)	2						
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50 (%)	2						
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA					
175458	3100	11887211	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
175458	3100	11887212	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	3090	11887411	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	3090	11887412	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	3100	11887381	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	3100	11887382	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	4050	11887321	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	4050	11887322	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	4060	11887361	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	4060	11887362	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	4120	11887441	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	4120	11887442	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
372577	4140	11887422	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192					
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA									
175458	3100	11887211	3074	A-6									
175458	3100	11887212	3074	A-6									

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047499B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CIBNEROS TENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRE. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAPAYULA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

				PRODUCTO ENTREGADO
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
372577	3090	11887411	3074	A-6
372577	3090	11887412	3074	A-6
372577	3100	11887381	3074	A-6
372577	3100	11887382	3074	A-6
372577	4050	11887321	3074	A-6
372577	4050	11887322	3074	A-6
372577	4060	11887361	3074	A-6
372577	4060	11887362	3074	A-6
372577	4120	11887441	3074	A-6
372577	4120	11887442	3074	A-6
372577	4140	11887422	3074	A-6

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B044412B

CLIENTE ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		FECHA EMISION 18.07.2017		PAGINA 1		NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTRIBUIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.																																														
DIRECCION CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA																																																				
PRODUCTO Vigas																																																				
COMPOSICION QUIMICA <table border="1"> <thead> <tr> <th>COLADA</th> <th>ESPECIFICACION</th> <th>C</th> <th>MN</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>SI</th> <th>CU</th> <th>CR</th> <th>NI</th> <th>MO</th> <th>ALT</th> <th>V</th> <th>NR/CE</th> <th>TT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175381</td> <td>ASTM A 572-50 A 292</td> <td>0.180</td> <td>0.800</td> <td>0.015</td> <td>0.008</td> <td>0.170</td> <td>0.032</td> <td>0.074</td> <td>0.019</td> <td>0.004</td> <td>0.010</td> <td>0.006</td> <td>0.008</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>175382</td> <td>ASTM A 572-50 A 292</td> <td>0.180</td> <td>0.850</td> <td>0.015</td> <td>0.008</td> <td>0.160</td> <td>0.024</td> <td>0.074</td> <td>0.019</td> <td>0.004</td> <td>0.010</td> <td>0.006</td> <td>0.007</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>								COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NR/CE	TT	175381	ASTM A 572-50 A 292	0.180	0.800	0.015	0.008	0.170	0.032	0.074	0.019	0.004	0.010	0.006	0.008	0.00	175382	ASTM A 572-50 A 292	0.180	0.850	0.015	0.008	0.160	0.024	0.074	0.019	0.004	0.010	0.006	0.007	0.00
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NR/CE	TT																																						
175381	ASTM A 572-50 A 292	0.180	0.800	0.015	0.008	0.170	0.032	0.074	0.019	0.004	0.010	0.006	0.008	0.00																																						
175382	ASTM A 572-50 A 292	0.180	0.850	0.015	0.008	0.160	0.024	0.074	0.019	0.004	0.010	0.006	0.007	0.00																																						
PRUEBAS AL PRODUCTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COLADA</th> <th>NO. PAQUETE</th> <th>E. ELASTICO</th> <th>E. TENSION</th> <th>SECCION</th> <th>T. ELONG.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175381</td> <td>261709734A</td> <td>61.152 (KSI)</td> <td>75.829 (KSI)</td> <td>24 (3)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709735A</td> <td>60.911 (KSI)</td> <td>75.976 (KSI)</td> <td>24 (3)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709736A</td> <td>60.993 (KSI)</td> <td>75.738 (KSI)</td> <td>24 (3)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709737A</td> <td>62.969 (KSI)</td> <td>77.152 (KSI)</td> <td>24 (3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>175382</td> <td>261709738A</td> <td>62.813 (KSI)</td> <td>77.974 (KSI)</td> <td>24 (3)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								COLADA	NO. PAQUETE	E. ELASTICO	E. TENSION	SECCION	T. ELONG.	175381	261709734A	61.152 (KSI)	75.829 (KSI)	24 (3)	8	175381	261709735A	60.911 (KSI)	75.976 (KSI)	24 (3)	8	175381	261709736A	60.993 (KSI)	75.738 (KSI)	24 (3)	8	175381	261709737A	62.969 (KSI)	77.152 (KSI)	24 (3)		175382	261709738A	62.813 (KSI)	77.974 (KSI)	24 (3)										
COLADA	NO. PAQUETE	E. ELASTICO	E. TENSION	SECCION	T. ELONG.																																															
175381	261709734A	61.152 (KSI)	75.829 (KSI)	24 (3)	8																																															
175381	261709735A	60.911 (KSI)	75.976 (KSI)	24 (3)	8																																															
175381	261709736A	60.993 (KSI)	75.738 (KSI)	24 (3)	8																																															
175381	261709737A	62.969 (KSI)	77.152 (KSI)	24 (3)																																																
175382	261709738A	62.813 (KSI)	77.974 (KSI)	24 (3)																																																
PRODUCTO ENBARCADO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COLADA</th> <th>NO. PAQUETE</th> <th>NO. PEAS.</th> <th>SEALTE (Pig.)</th> <th>PATIN (Pig.)</th> <th>LARGO (m)</th> <th>PESO (Kg/mt)</th> <th>PRELACIONTE</th> <th>PEDIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175381</td> <td>261709734A</td> <td>12</td> <td>16.0000</td> <td>7.0000</td> <td>12.2000</td> <td>66.960</td> <td>3121</td> <td>0000203904</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709735A</td> <td>12</td> <td>16.0000</td> <td>7.0000</td> <td>12.2000</td> <td>66.960</td> <td>3121</td> <td>0000203904</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709736A</td> <td>12</td> <td>16.0000</td> <td>7.0000</td> <td>12.2000</td> <td>66.960</td> <td>3121</td> <td>0000203904</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709737A</td> <td>12</td> <td>16.0000</td> <td>7.0000</td> <td>12.2000</td> <td>66.960</td> <td>3121</td> <td>0000203904</td> </tr> </tbody> </table>								COLADA	NO. PAQUETE	NO. PEAS.	SEALTE (Pig.)	PATIN (Pig.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PRELACIONTE	PEDIDO	175381	261709734A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904	175381	261709735A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904	175381	261709736A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904	175381	261709737A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PEAS.	SEALTE (Pig.)	PATIN (Pig.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PRELACIONTE	PEDIDO																																												
175381	261709734A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904																																												
175381	261709735A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904																																												
175381	261709736A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904																																												
175381	261709737A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121	0000203904																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COLADA</th> <th>NO. PAQUETE</th> <th>PARTIDA</th> <th>ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175381</td> <td>261709737A</td> <td>000110</td> <td>1002500255</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709738A</td> <td>000110</td> <td>1002500255</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709732A</td> <td>000110</td> <td>1002500255</td> </tr> <tr> <td>175381</td> <td>261709736A</td> <td>000110</td> <td>1002500255</td> </tr> </tbody> </table>								COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA	175381	261709737A	000110	1002500255	175381	261709738A	000110	1002500255	175381	261709732A	000110	1002500255	175381	261709736A	000110	1002500255																									
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA																																																	
175381	261709737A	000110	1002500255																																																	
175381	261709738A	000110	1002500255																																																	
175381	261709732A	000110	1002500255																																																	
175381	261709736A	000110	1002500255																																																	
FIN DE DATOS																																																				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S119333

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048088B

CUENTE	ACEROS TEROTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CERNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRE. MEX-QUERETARO KM 57.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

		COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Co	Cr	Ni	Mo	Alu	V	CP
175454	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.015	0.004	0.150	0.022	0.024	0.010	0.006	0.044	0.002	0.017
275549	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.460	0.017	0.004	0.160	0.021	0.020	0.021	0.006	0.025	0.002	0.016
275551	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.400	0.014	0.004	0.160	0.029	0.019	0.020	0.006	0.024	0.002	0.015
372577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.110	0.020	0.026	0.014	0.030	0.002	0.010
COLADA													
175454	0.012												
275549	0.011												
275551	0.009												
372577	0.011												

		PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELONG.	ELONG.
175454	4060	11840721	1.0000	50.424 (KSI)	77.290 (KSI)	52(%)	2
175454	4090	11840761	1.0000	56.503 (KSI)	79.993 (KSI)	48(%)	2
275549	3010	11802131	1.0000	56.398 (KSI)	78.571 (KSI)	52(%)	2
275549	3060	11803121	2.0000	55.772 (KSI)	78.290 (KSI)	52(%)	2
275549	4050	11803461	1.5000	54.522 (KSI)	77.923 (KSI)	45(%)	2
275549	4100	11809231	0.7500	57.128 (KSI)	81.774 (KSI)	49(%)	2
275549	4140	11803511	1.5000	54.011 (KSI)	78.423 (KSI)	52(%)	2
275551	3100	11829291	0.7500	58.252 (KSI)	79.799 (KSI)	45(%)	2
275551	4150	11803591	1.5000	55.639 (KSI)	75.525 (KSI)	48(%)	2
275551	4160	11803611	1.5000	55.122 (KSI)	76.719 (KSI)	52(%)	2
372577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45(%)	2
372577	4020	11882191	2.0000	52.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50(%)	2
372577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39(%)	2
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50(%)	2

		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTRETA
175454	4070	11840741	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002504989
175454	4070	11840742	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002504989
275549	3090	11829271	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504989
275549	3090	11829272	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504989
275549	3100	11829281	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504989

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048088B

CUENTE	ACEROS TEROTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CERREROS MENCHACA PRUEBAS METALURGICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	OFFIC. MEX-QUEBETIANO KM 37.5 CAR. PARQUE INDUSTRIAL COAHUILA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

DETALLE DE EMBAQUE								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pig.)	ANCHO (Pig.)	LARGO (Pig.)	PEDIDO	PARTIDA	NUMERO
275549	3100	11829280	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504980
275549	4110	11829251	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504980
275549	4110	11829250	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504980
275551	3100	11829291	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504980
275551	3100	11829292	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504980
275551	4100	11829321	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504980
275551	4100	11829322	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504980
372577	3050	11887371	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504980
372577	3050	11887372	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504980
372577	4130	11887431	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504980
372577	4130	11887432	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504980
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	BOMBA				
175454	4070	11840741	3103	A-6				
175454	4070	11840742	3103	A-6				
275549	3090	11829271	3103	A-6				
275549	3090	11829272	3103	A-6				
275549	3100	11829281	3103	A-6				
275549	3100	11829282	3103	A-6				
275549	4110	11829251	3103	A-6				
275549	4110	11829252	3103	A-6				
275551	3100	11829291	3103	A-6				
275551	3100	11829292	3103	A-6				
275551	4100	11829321	3103	A-6				
275551	4100	11829322	3103	A-6				
372577	3050	11887371	3074	A-6				
372577	3050	11887372	3074	A-6				
372577	4130	11887431	3074	A-6				
372577	4130	11887432	3074	A-6				

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047499B

CLIENTE	ACEROS TERTIZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARR. MEX-QUERETARO KM 47.1 CUL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	CU	Cr	NI	Mo	Alc	V	CL
175458	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.450	0.010	0.005	0.170	0.021	0.015	0.010	0.007	0.039	0.002	0.015
372577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.120	0.075	0.048	0.014	0.030	0.005	0.015
COLADA	Ti												
175458	0.011												
372577	0.011												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ELASTICIDAD	P. TENSION	SELYAL	T. EMP. C.
175458	3020	11840683	1.0000	57.522 (KSI)	78.500 (KSI)	46.7%	2
175458	3050	11840621	1.0000	56.400 (KSI)	79.587 (KSI)	49.7%	2
175458	3100	11887213	0.8750	57.672 (KSI)	84.354 (KSI)	43.0%	2
372577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45.4%	2
372577	4020	11882193	1.0000	53.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50.7%	2
372577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39.7%	2
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50.3%	2

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA
175458	3100	11887211	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
175458	3100	11887212	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	3090	11887411	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	3090	11887412	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	3100	11887381	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	3100	11887382	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	4050	11887323	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	4050	11887322	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	4060	11887361	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	4060	11887362	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	4120	11887441	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	4120	11887442	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192
372577	4140	11887422	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002504192

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
175458	3100	11887211	3074	A-6
175458	3100	11887212	3074	A-6

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047499B

CUENTE	ACEROS TETATEOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CERNEROS MENCHACA PRUEBAS METALURGICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARR. MEL-QUERETARO KM 37.5 CUL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMPACAD				
COMIDA	PLANIFIC	NO. PLACA	PRE. CLIENTE	REMA
372577	4090	11887411	3074	A-6
372577	3090	11887412	3074	A-6
372577	3100	11887381	3074	A-6
372577	3100	11887382	3074	A-6
372577	4050	11887321	3074	A-6
372577	4050	11887322	3074	A-6
372577	4060	11887361	3074	A-6
372577	4060	11887362	3074	A-6
372577	4120	11887441	3074	A-6
372577	4120	11887442	3074	A-6
372577	4140	11887422	3074	A-6
FIN DE DATOS				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITTO : S201740


OC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047922B

CUENTE	ACEPOS TEPICZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARTE. MEX-QUERETARO KM 37.5 CAR. PARQUE INDUSTRIAL, CUAMPALA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	AL	V	CP
173289	ASTM A36/A36M SAE E815	0.190	1.100	0.016	0.004	0.180	0.025	0.024	0.024	0.007	0.031	0.003	0.001
372524	ASTM A572-50/A703-50	0.190	1.130	0.011	0.002	0.180	0.130	0.047	0.050	0.015	0.031	0.003	0.018
372577	ASTM A572-50/A703-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.130	0.075	0.048	0.014	0.031	0.003	0.110
COLADA	Ti	S											
173289	0.017	0.0003											
372524	0.009												
372577	0.011												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	E. ELASTICO	E. TENSION	%ELONG.	E. ELONG.
173289	3120	11782863	1.0000	42.978 (KSI)	67.862 (KSI)	25.3%	3
173289	3070	11782981	1.0000	42.944 (KSI)	68.147 (KSI)	28.3%	3
173289	4070	11783321	0.8750	46.448 (KSI)	75.992 (KSI)	25.3%	3
372524	7170	11885691	1.7500	57.445 (KSI)	77.903 (KSI)	55.3%	3
372577	3010	11881651	1.0000	50.874 (KSI)	80.335 (KSI)	41.3%	3
372577	3010	11882191	1.0000	50.547 (KSI)	77.089 (KSI)	50.3%	3
372577	4040	11891641	1.0000	59.494 (KSI)	75.301 (KSI)	34.3%	3
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	72.385 (KSI)	50.3%	3

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA	EMBARCA
173289	4220	11828671	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000120	1001504661
372524	7130	11885691	1.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000250	1002504661
372577	3010	11887311	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1001504661
372577	3010	11887312	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504661
372577	3120	11887401	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504661
372577	2120	11887402	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504661
372577	4140	11887421	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504661
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
173289	4220	11828671	3103	A-6				
372524	7130	11885691	3103	A-6				
372577	3010	11887311	3074	A-6				
372577	3010	11887312	3074	A-6				
372577	3120	11887401	3074	A-6				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO. Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047922B

CUENTE	ACEPOS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARPT. NEX-QUEMETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

			PRODUCTO ENTREGADO	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PER. CLIENTE	NOTA
372577	3120	11887402	4074	A-6
372577	4140	11887422	2074	A-6

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

00-03-F-02-A



CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	17.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	Vigas					


COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	Ni	MO	ALU	V	NE/CB TJ
175283	ASTM A 572-50 / A 992	0.160	0.860	0.015	0.008	0.160	0.027	0.023	0.020	0.004	0.041	0.003	0.007

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	SELONG.	T. ELONG.
175283	261709700A	61.574 (KSI)	76.967 (KSI)	25 (%)	8
175283	261709701A	61.519 (KSI)	76.752 (KSI)	24 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PEAS.	PERALTA (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/m)	PED. CLASIFIC.
175283	261709700A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121
175283	261709701A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121
175283	261709706A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121
175283	261709707A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	3121
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA				
175283	261709700A	000110	1002500069				
175283	261709701A	000110	1002500069				
175283	261709706A	000110	1002500069				
175283	261709707A	000110	1002500069				

FIN DE DATOS



CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	23.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS BENCHACA  PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL GUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	CH	TI	
275594	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.120	0.020	0.005	0.120	0.024	0.020	0.017	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	
275724	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.120	0.014	0.005	0.120	0.027	0.024	0.018	0.005	0.003	0.002	0.005	0.004	
372604	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.120	0.010	0.005	0.120	0.130	0.024	0.052	0.010	0.003	0.003	0.005	0.004	
372604	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.120	0.012	0.005	0.120	0.130	0.024	0.055	0.014	0.003	0.002	0.005	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ELASTICO	R. TENSION	SELONG.	T. ELONG.
275594	7030	6260005001	0.5000	14.081 (KSI)	76.000 (PSI)	45 (%)	2
275594	7030	6260006001	0.5000	14.081 (KSI)	80.000 (PSI)	36 (%)	2
275724	7180	6288042001	0.3750	14.317 (KSI)	78.000 (PSI)	40 (%)	2
275724	7190	6288037007	0.3750	14.007 (KSI)	81.000 (PSI)	37 (%)	2
275724	7200	6288039007	0.3750	14.119 (KSI)	80.000 (PSI)	37 (%)	2
372604	7030	6288039001	0.5000	14.120 (KSI)	81.000 (PSI)	41 (%)	2
372604	7030	6288045006	0.3750	60.050 (KSI)	83.004 (KSI)	38 (%)	2
372604	7040	6288036001	0.3750	14.016 (KSI)	81.000 (PSI)	37 (%)	2
372606	7130	6280068001	0.5000	50.825 (KSI)	79.947 (PSI)	41 (%)	2
372606	7170	6280069001	0.5000	57.816 (KSI)	80.015 (KSI)	38 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
275594	7080	6260011005	0.5000	96.0000	240.0000	0000202639	000190	1002502986
275594	7080	6260011006	0.5000	96.0000	240.0000	0000202639	000190	1002502986
275724	7010	6288034001	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000160	1002502986
275724	7010	6288034002	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000160	1002502986
275724	7010	6288034003	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000160	1002502986
275724	7010	6288034004	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000160	1002502986
275724	7010	6288034006	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000160	1002502986
275724	7010	6288034007	0.3750	72.0000	240.0000	0000202639	000160	1002502986
275724	7180	6288042001	0.5000	72.0000	240.0000	0000202639	000180	1002502986
275724	7180	6288042002	0.5000	72.0000	240.0000	0000202639	000180	1002502986
275724	7180	6288042003	0.5000	72.0000	240.0000	0000202639	000180	1002502986
275724	7180	6288042004	0.5000	72.0000	240.0000	0000202639	000180	1002502986
275724	7180	6288042005	0.5000	72.0000	240.0000	0000202639	000180	1002502986
275724	7180	6288042006	0.5000	72.0000	240.0000	0000202639	000180	1002502986

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO. Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : 3116511

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	23.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 ZONA INDUSTRIAL CUANATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

PRODUCTO ENBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pig.)	ANCHO (Pig.)	LARG. (Pig.)	PEDIDO	PARTIDA	RESERVA
372604	7020	6288032001	0.1000	72.0000	240.0000	0000202633	000180	1002502986
372604	7020	6288032002	0.1000	72.0000	240.0000	0000202634	000180	1002502986
372604	7020	6288032003	0.1000	72.0000	240.0000	0000202635	000180	1002502986
372604	7020	6288032004	0.1000	72.0000	240.0000	0000202636	000180	1002502986
372604	7020	6288032005	0.1000	72.0000	240.0000	0000202637	000180	1002502986
372604	7020	6288032006	0.1000	72.0000	240.0000	0000202638	000180	1002502986
372604	7020	6288032007	0.1000	72.0000	240.0000	0000202639	000180	1002502986
372604	7020	6288032008	0.1000	72.0000	240.0000	0000202640	000180	1002502986
372604	7020	6288032009	0.1000	72.0000	240.0000	0000202641	000180	1002502986
372604	7020	6288032010	0.1000	72.0000	240.0000	0000202642	000180	1002502986
372604	7020	6288032011	0.1000	72.0000	240.0000	0000202643	000180	1002502986
372604	7020	6288032012	0.1000	72.0000	240.0000	0000202644	000180	1002502986
372604	7020	6288032013	0.1000	72.0000	240.0000	0000202645	000180	1002502986
372604	7020	6288032014	0.1000	72.0000	240.0000	0000202646	000180	1002502986
372604	7020	6288032015	0.1000	72.0000	240.0000	0000202647	000180	1002502986
372604	7020	6288032016	0.1000	72.0000	240.0000	0000202648	000180	1002502986
372604	7020	6288032017	0.1000	72.0000	240.0000	0000202649	000180	1002502986
372604	7020	6288032018	0.1000	72.0000	240.0000	0000202650	000180	1002502986
372604	7020	6288032019	0.1000	72.0000	240.0000	0000202651	000180	1002502986
372604	7020	6288032020	0.1000	72.0000	240.0000	0000202652	000180	1002502986
372604	7020	6288032021	0.1000	72.0000	240.0000	0000202653	000180	1002502986
372604	7020	6288032022	0.1000	72.0000	240.0000	0000202654	000180	1002502986
372604	7020	6288032023	0.1000	72.0000	240.0000	0000202655	000180	1002502986
372604	7020	6288032024	0.1000	72.0000	240.0000	0000202656	000180	1002502986
372604	7020	6288032025	0.1000	72.0000	240.0000	0000202657	000180	1002502986
372604	7020	6288032026	0.1000	72.0000	240.0000	0000202658	000180	1002502986
372604	7020	6288032027	0.1000	72.0000	240.0000	0000202659	000180	1002502986
372604	7020	6288032028	0.1000	72.0000	240.0000	0000202660	000180	1002502986
372604	7020	6288032029	0.1000	72.0000	240.0000	0000202661	000180	1002502986
372604	7020	6288032030	0.1000	72.0000	240.0000	0000202662	000180	1002502986
372604	7020	6288032031	0.1000	72.0000	240.0000	0000202663	000180	1002502986

EMITIO : S118511

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.



CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B046482B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	23.07.2017	PAGINA	3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 POL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STEEL					

CÓDIGO		DESCRIPCION	PRODUCTO	EMBARCADO	FECHA	ESTADO
000001	PLANTON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA		
000002	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000003	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000004	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000005	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000006	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000007	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000008	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000009	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000010	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000011	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000012	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000013	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000014	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000015	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000016	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000017	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000018	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000019	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	
000020	7000	6288030000	3074	A-6 50%	PLACA STECKEL	

FIN DE DATUM

EMITIO : S118511

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B995566B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUEPETAPO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	ROLLO STECKEL					

					COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Bi (ppm)	Pb	
171637	ASTM A472-50/A709-50 T	0.066	0.850	0.010	0.005	0.0000	0.022	0.028	0.010	0.007	0.000	0.000	0.000	
					PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO. ROLLO	PLANCHON	ESPESES (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		WELON.		T. ELONG.			
171637	S5580004	4010	0.7500		62.039 (KSI)		70.675 (KSI)		55 (%)		2			
171637	S5580003	4010	0.7500		59.720 (KSI)		69.622 (KSI)		55 (%)		1			
					PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. ROLLO	ESPESES (Plg.)		ANCHO (Plg.)	PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA		END. CLIENTE			
171637	S5580028	0.7500		30.0000	000019-418		000020		1002442142		100244			
COLADA	NO. ROLLO	NORMA												
171637	S5580038	10%A6												
					FIN DE DATOS									

EMITIO : S119411

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.



CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS ATENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARR. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co	Ti	
275728	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.330	0.015	0.006	0.110	0.025	0.033	0.017	0.004	0.039	0.002	0.009	0.002
275809	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.350	0.025	0.006	0.110	0.036	0.030	0.023	0.005	0.042	0.004	0.009	0.002
372463	ASTM A36/A572 SA36 ED15	0.180	0.870	0.009	0.007	0.400	0.100	0.045	0.041	0.011	0.039	0.002	0.000	
COLADA	P													
275728														
275809														
372463	0.0003													

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELONG.	T. ELONG.
275728	7110	6280088001	0.6250	54.288 (KSI)	76.837 (KSI)	43 (%)	2
275728	7110	6280091001	0.6250	53.091 (KSI)	75.095 (KSI)	42 (%)	2
275809	7100	6296002001	0.6250	55.296 (KSI)	79.757 (KSI)	40 (%)	2
275809	7140	6296007001	0.6250	55.689 (KSI)	76.611 (KSI)	49 (%)	2
275809	7150	6296041001	0.5000	55.416 (KSI)	77.215 (KSI)	44 (%)	2
372463	7050	6232078001	2.0000	44.889 (KSI)	69.447 (KSI)	25 (%)	8
372463	7060	6232077001	2.0000	45.245 (KSI)	69.550 (KSI)	25 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
275728	7110	6280088001	0.6250	72.0000	240.0000	0000202639	000200	1002504213
275728	7110	6280088001	0.6250	72.0000	240.0000	0000202639	000200	1002504213
275728	7170	6280007001	0.6250	72.0000	240.0000	0000202639	000200	1002504213
275728	7170	6280007001	0.6250	72.0000	240.0000	0000202639	000200	1002504213
275728	7170	6280007001	0.6250	72.0000	240.0000	0000202639	000200	1002504213
275728	7170	6280007001	0.6250	72.0000	240.0000	0000202639	000200	1002504213
275728	7170	6280007001	0.6250	72.0000	240.0000	0000202639	000200	1002504213
275809	7140	6296007001	0.6250	96.0000	240.0000	0000202639	000210	1002504213
275809	7140	6296007001	0.6250	96.0000	240.0000	0000202639	000210	1002504213
275809	7140	6296007001	0.6250	96.0000	240.0000	0000202639	000210	1002504213
372463	7010	6272094005	2.0000	72.0000	240.0000	0000202639	000140	1002504213
372463	7020	6272095003	2.0000	72.0000	240.0000	0000202639	000140	1002504213
372463	7020	6272095004	2.0000	72.0000	240.0000	0000202639	000140	1002504213
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
275728	7110	6280008001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047498B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTROLADOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

PRODUCTO EMPACADO			
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE
275728	7110	6280008000	3074
275728	7110	6280007000	3074
275728	7110	6280007000	3074
275728	7110	6280007000	3074
275728	7110	6280007000	3074
275809	7110	6296007000	3074
275809	7110	6296007000	3074
275809	7110	6296007000	3074
272463	7110	6272094000	3074
272463	7110	6272095000	3074
272463	7110	6272095000	3074

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	17.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CARREROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUEPETAPO KM 27.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMAILA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cr	Cr	Ni	Mo	Al	V	Co
172718	ASTM A36/ASME SA36 ED1	0.210	1.130	0.014	0.004	0.280	0.021	0.020	0.016	0.004	0.038	0.004	0.002
174506	ASTM A36/ASME SA36 ED1	0.220	1.130	0.014	0.005	0.290	0.021	0.020	0.019	0.006	0.031	0.002	0.001
175310	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.400	0.016	0.004	0.160	0.022	0.016	0.019	0.006	0.035	0.005	0.011
175313	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.400	0.016	0.005	0.170	0.022	0.022	0.021	0.006	0.039	0.004	0.017
175315	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.400	0.019	0.004	0.170	0.022	0.022	0.021	0.006	0.037	0.005	0.015

COLADA	Ti	B
172718	0.015	0.0003
174506	0.017	0.0003
175310	0.010	
175313	0.012	
175315	0.012	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
172718	7010	11801921	1.0000	43.055 (KSI)	67.834 (KSI)	39(%)	3
172718	7010	11801911	1.0000	54.066 (KSI)	76.561 (KSI)	26(%)	6
174506	4130	11801941	1.0000	42.018 (KSI)	68.303 (KSI)	39(%)	8
174506	4140	11801931	1.0000	42.499 (KSI)	67.867 (KSI)	28(%)	5
175310	3120	11784391	0.7500	58.097 (KSI)	81.457 (KSI)	44(%)	2
175310	4080	11784381	0.7500	57.329 (KSI)	78.930 (KSI)	47(%)	2
175313	3010	11784111	1.5000	58.441 (KSI)	72.739 (KSI)	46(%)	2
175313	3150	11802941	2.0000	54.247 (KSI)	78.190 (KSI)	41(%)	2
175313	4030	11782061	1.5000	56.342 (KSI)	77.922 (KSI)	46(%)	2
175313	4110	11784301	0.7500	56.568 (KSI)	79.195 (KSI)	47(%)	3
175315	3050	11784401	0.7500	57.780 (KSI)	80.753 (KSI)	43(%)	2
175315	3060	11784411	0.7500	57.886 (KSI)	81.661 (KSI)	42(%)	2
175315	3110	11802871	2.0000	58.733 (KSI)	80.260 (KSI)	35(%)	2

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA
172718	7010	11801921	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130 1002500442
172718	7010	11801922	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130 1002500442
174506	4140	11801931	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130 1002500442
174506	4140	11801932	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130 1002500442

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE	ACEROS TEPICOTILAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	17.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CORTES MENCHACA PRUEBAS METALURGICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHO					

PRODUCTO EMBARCADO								
CODIGO	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESES (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PESO	PARTIDA	ENTREGA
175319	4060	11784261	0.7500	96.0000	340.0000	0000104121	000200	1003500442
175319	4060	11784262	0.7500	96.0000	340.0000	0000104121	000200	1003500442
175319	3070	11784201	0.7500	96.0000	340.0000	0000104121	000200	1003500442
175319	3070	11784202	0.7500	96.0000	340.0000	0000104121	000200	1003500442
175319	4140	11784231	0.7500	96.0000	40.0000	0000104121	000200	1003500442
175319	4140	11784232	0.7500	96.0000	340.0000	0000104121	000200	1003500442
CODIGO	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESES (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PESO	PARTIDA	ENTREGA
175719	7010	11801921	3100	A-6				
175719	7010	11801922	3100	A-6				
175500	4140	11801931	3100	A-6				
175500	4140	11801932	3100	A-6				
175319	4060	11784261	3100	A-6				
175319	4060	11784262	3100	A-6				
175319	3070	11784201	3100	A-6				
175319	3070	11784202	3100	A-6				
175319	4140	11784231	3100	A-6				
175319	4140	11784232	3100	A-6				

FIN DE DATOS



CUENTE	ACEROS TEROTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUEPETARO KM 47.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Co	Cr	Ni	Mo	Al	V	(%)
174418	ASTM A772-50/A709-50	0.180	1.430	0.011	0.006	0.180	0.027	0.026	0.022	0.007	0.047	0.004	0.015
175310	ASTM A772-50/A709-50	0.100	1.410	0.011	0.004	0.160	0.022	0.024	0.019	0.006	0.024	0.005	0.015
175311	ASTM A772-50/A709-50	0.130	1.410	0.011	0.005	0.180	0.022	0.021	0.021	0.006	0.047	0.003	0.015
372525	ASTM A772-50/A709-50	0.100	1.430	0.011	0.003	0.170	0.120	0.054	0.052	0.014	0.045	0.002	0.014
372526	ASTM A772-50/A709-50	0.180	1.430	0.011	0.004	0.170	0.120	0.054	0.051	0.017	0.041	0.002	0.017

COLADA	Ti
174418	0.022
175310	0.020
175311	0.012
372525	0.010
372526	0.011

PRUEBAS AL PUNTO						
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESES (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	T. ELONG.
174418	3010	11400361	1.7500	52.323 (KSI)	76.971 (KSI)	51 (%)
174418	3020	11400370	1.7500	55.333 (KSI)	77.094 (KSI)	51 (%)
174418	4040	11661791	1.2500	55.337 (KSI)	76.514 (KSI)	47 (%)
174418	4050	11406611	0.8750	54.866 (KSI)	77.713 (KSI)	50 (%)
174418	4100	11406161	1.0000	55.009 (KSI)	78.738 (KSI)	51 (%)
174418	4180	11400031	2.0000	52.330 (KSI)	75.952 (KSI)	46 (%)
175310	3120	11784391	0.7500	58.097 (KSI)	81.457 (KSI)	44 (%)
175310	4090	11784281	0.7500	57.229 (KSI)	78.930 (KSI)	47 (%)
175311	3670	11802991	2.0000	55.137 (KSI)	78.341 (KSI)	55 (%)
175311	4110	11784491	0.7500	57.126 (KSI)	77.402 (KSI)	48 (%)
175311	4120	11784521	0.7500	55.997 (KSI)	77.346 (KSI)	46 (%)
372525	7010	11820701	0.7500	55.777 (KSI)	77.276 (KSI)	45 (%)
372525	7200	11826001	1.7500	56.022 (KSI)	77.045 (KSI)	49 (%)
372525	7210	11826061	1.7500	55.628 (KSI)	80.510 (KSI)	44 (%)
372526	7010	11826011	1.7500	56.059 (KSI)	81.717 (KSI)	41 (%)
372526	7160	11820571	0.8750	57.327 (KSI)	83.488 (KSI)	48 (%)
372526	7240	11820641	0.8750	56.914 (KSI)	83.657 (KSI)	47 (%)

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27-07-2017	PAGINA	2	ROSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y O FICINAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARR. MEX-QUEPETAPO IM 37.5 COL. PAPOE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PESADO	PARTIDA	ENTREGA
174418	4070	1174418	1.0000	60.0000	240.0000	0000202066	000010	100250177
175310	3040	1175310	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	100250177
175310	3040	1175310	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	100250177
175311	3020	1175311	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	100250177
175311	3020	1175311	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000200	100250177
372525	7010	11870701	0.7500	96.0000	480.0000	0000204121	000210	100250177
372526	7130	1187071	0.8750	96.0000	480.0000	0000204114	000010	100250177
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CILINDRO	TAMPO				
174418	4070	1174418	3074	A-6				
175310	3040	1175310	2102	A-6				
175310	3040	1175310	3103	A-6				
175311	3020	1175311	3102	A-6				
175311	3020	1175311	3103	A-6				
372525	7010	11870701	3102	A-6				
372526	7130	1187071	3074	A-6				
FIN DE DATOS								

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE

DECLARACION DE LA COMISION DE ENLACE



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048088B

CLIENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		26.07.2017	1	
DIRECCION				
CARRI. MEX-QUEREJARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA				ING. RAMIRO CORDERO ALLENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
PRODUCTO				
PLACA ANCHA				

ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Al	Cr	Ni	Mo	Alr	V	CL
175454	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.410	0.015	0.004	0.150	0.022	0.024	0.013	0.006	0.014	0.003	0.017
175549	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.460	0.013	0.004	0.160	0.021	0.020	0.021	0.006	0.025	0.003	0.016
175551	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.410	0.014	0.004	0.160	0.020	0.013	0.023	0.006	0.024	0.003	0.015
172577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.020	0.075	0.048	0.014	0.020	0.003	0.015
COLADA	TI												
175454	0.012												
175549	0.011												
175551	0.009												
172577	0.011												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	F. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
175454	4060	11840731	1.0000	56.424 (PSI)	77.290 (PSI)	52 (%)	2
175454	4090	11840761	1.0000	56.503 (PSI)	79.993 (KSI)	48 (%)	2
175549	3010	11802131	1.0000	56.398 (KSI)	78.571 (PSI)	53 (%)	2
175549	3060	11803121	2.0000	55.772 (KSI)	78.290 (PSI)	52 (%)	2
175549	4050	11803461	1.5000	54.522 (KSI)	77.983 (PSI)	45 (%)	2
175549	4100	11829231	0.7500	57.128 (KSI)	81.774 (PSI)	49 (%)	2
175549	4140	11803511	1.5000	54.011 (KSI)	78.483 (PSI)	52 (%)	2
175551	3100	11829291	0.7500	58.258 (KSI)	79.799 (KSI)	45 (%)	2
175551	4150	11803591	1.5000	55.639 (KSI)	79.585 (PSI)	48 (%)	2
175551	4160	11803611	1.5000	55.122 (KSI)	76.719 (KSI)	52 (%)	2
172577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45 (%)	2
172577	4020	11882191	2.0000	52.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50 (%)	2
172577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39 (%)	2
172577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175454	4070	11840741	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002504989
175454	4070	11840742	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002504989
175549	3090	11829271	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504989
175549	3090	11829272	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504989
175549	3100	11829281	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504989

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048088B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUEPETAPO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMAILA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pulg.)	ANCHO (Pulg.)	LARGO (Pulg.)	PROFUND.	PARTIDA	EMISORA
175548	3100	11829282	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504089
175549	4110	11829251	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504089
175549	4110	11829252	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504089
175551	3100	11829291	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504089
175551	3100	11829292	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504089
175551	4100	11829321	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504089
175551	4100	11829322	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002504089
372577	3050	11887371	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504089
372577	3050	11887372	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504089
372577	4130	11887431	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504089
372577	4130	11887432	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504089
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	RED. CLIENTE	NOMBR.				
175454	4070	11840741	3103	A-6				
175454	4070	11840742	3103	A-6				
175549	3090	11829271	3102	A-6				
175549	3090	11829272	3103	A-6				
175549	3100	11829281	3103	A-6				
175549	3100	11829282	3103	A-6				
175549	4110	11829251	3103	A-6				
175549	4110	11829252	3103	A-6				
175551	3100	11829291	3103	A-6				
175551	3100	11829292	3103	A-6				
175551	4100	11829321	3103	A-6				
175551	4100	11829322	3103	A-6				
372577	3050	11887371	3074	A-6				
372577	3050	11887372	3074	A-6				
372577	4130	11887431	3074	A-6				
372577	4130	11887432	3074	A-6				

FIN DE DATOS

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CO-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B998404B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.02.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					
ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA						
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION						

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alb	V	Nb	Ti	
271906	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.021	0.004	0.160	0.020	0.026	0.022	0.006	0.042	0.005	0.016	0.018	
271908	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.021	0.004	0.160	0.026	0.046	0.028	0.009	0.022	0.006	0.016	0.019	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pulg.)	L. ELASTICO	P. TRISION	%ELONG.	T. FLOW.
271906	5090	5650065001	1.7500	54.133 (KSI)	77.118 (PSI)	41(%)	1
271906	5090	5650066001	2.0000	51.507 (KSI)	76.245 (PSI)	46(%)	2
271908	5010	5650065001	2.0000	52.272 (KSI)	76.816 (PSI)	45(%)	2
271908	5040	5650069001	2.0000	54.624 (PSI)	77.175 (PSI)	45(%)	1

PRODUCTO ENBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pulg.)	ANCHO (Pulg.)	LARGO (Pulg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
271906	5090	5650065001	2.0000	72.0000	480.0000	0000198213	000280	1002446418
271908	5010	5650065001	2.0000	72.0000	480.0000	0000198213	000280	1002446418
271908	5010	5650065002	2.0000	72.0000	480.0000	0000198213	000280	1002446418
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NOMENCLATURA				
271906	5090	5650066001	2963	A-6 50% PLACA STECKEL				
271908	5010	5650065001	2963	A-6 50% PLACA STECKEL				
271908	5010	5650065002	2963	A-6 50% PLACA STECKEL				

FIN DE DATOS

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B936783B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	13.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CISTEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 27.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	CU	Cr	NI	Mo	Alc	N	Ca	TS	
168297	ASTM A72-50/A709-50	0.15	1.439	0.014	0.004	0.170	0.020	0.03	0.004	0.008	0.031	0.003	0.015	0.015	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Pulg.)		E. ELASTICO		E. TRAMPON		VELON.		T. ELONG.				
168297	7060	4770120001	1.7500		56.002 (PSI)		77.000 (PSI)		44 (%)		2				
168297	7080	4770120001	1.7500		56.001 (PSI)		75.000 (PSI)		46 (%)		2				
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESSOR (Pulg.)		ANGULO (Pulg.)		LARGO (Pulg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA		
168297	7050	4770120001	1.7500		72.0000		480.0000		0000190211		000030		1002360110		
168297	7100	4770126001	1.7500		72.0000		480.0000		0000190930		000010		1002360110		
168297	7130	4770123001	1.7500		72.0000		480.0000		0000190930		000010		1002360110		
168297	7150	4770124001	1.7500		72.0000		480.0000		0000190230		000010		1002360110		
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE				NOTA								
168297	7050	4770121001	2799				A-6 50% PLACA STECKEL								
168297	7100	4770126001	2768				A-6 50% PLACA STECKEL								
168297	7130	4770123001	2768				A-6 50% PLACA STECKEL								
168297	7150	4770124001	2768				A-6 50% PLACA STECKEL								
FIN DE DATOS															

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	% PULVERIFICACION	C	Mn	P	S	SI	CU	NI	BI	MO	AL	V	CR
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.0440	0.018	0.006	0.150	0.002	0.001	0.012	0.006	0.001	0.001	0.011
274286	ASTM A36/ASME SA36 E31F	0.220	1.160	0.017	0.004	0.250	0.002	0.001	0.020	0.006	0.000	0.002	0.002
275247	ASTM A36/ASME SA36 E31F	0.180	1.150	0.018	0.006	0.140	0.017	0.001	0.015	0.006	0.002	0.001	0.001
275529	ASTM A36/ASME SA36 E31F	0.200	1.140	0.020	0.004	0.180	0.017	0.002	0.022	0.005	0.001	0.001	0.002
COLADA	TI	B											
175459	0.011												
274286	0.018	0.0003											
275247	0.004	0.0002											
275529	0.012	0.0004											

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	VELON.	T. ELONG.
175459	3100	11861551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11862291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11867571	0.8750	55.452 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11861482	1.0000	58.081 (KSI)	77.622 (KSI)	41 (%)	2
274286	3220	11783431	0.8750	45.626 (KSI)	75.535 (KSI)	26 (%)	8
274286	4230	11783461	0.8750	46.493 (KSI)	72.031 (KSI)	28 (%)	8
274286	4250	11782891	1.0000	43.673 (KSI)	68.854 (KSI)	25 (%)	8
275247	4010	11828691	1.0000	44.020 (KSI)	72.010 (KSI)	26 (%)	8
275247	4030	11783251	0.8750	48.601 (KSI)	75.853 (KSI)	27 (%)	8
275529	3010	11861021	1.2500	45.092 (KSI)	69.505 (KSI)	27 (%)	8
275529	3020	11861011	1.2500	44.860 (KSI)	69.161 (KSI)	27 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA ENTREGA
175459	3010	11887551	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002505237
175459	3040	11887561	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002505237
175459	3040	11887562	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010 1002505237
274286	3210	11783451	0.8750	96.0000	240.0000	0000204121	000110 1002505237
275247	4010	11828691	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130 1002505237
275529	3010	11861021	1.2500	96.0000	240.0000	0000204121	000150 1002505237
275529	3020	11861011	1.2500	96.0000	240.0000	0000204121	000150 1002505237

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048323B

CLIENTE	ACEROS TEROTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CARREROS MENCHACA PRUEBAS METALURGICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUANATELA					
PRODUCTO	PLACA A572					

PRODUCTO EMBARCADO			
ORDEN	PLANCHAS	NO. PLACA	REDUCCION
175457	3010	11867551	2074
175458	3040	11867561	2074
175459	3040	11867562	2074
174286	3010	11783451	2103
275597	4010	11828691	2103
275598	3010	11861021	2103
275599	3020	11861011	2103
FIN DE DATOS			

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048039B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	1	NOTAMOS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CAPET. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMAILA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					
ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA						
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION						

ING. RAMIRO CARREROS MENCHACA
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cr	CL	NI	NO	Al	V	Co
175458	ASTM A 70-50/A700-50	0.170	1.450	0.011	0.000	0.170	0.021	0.031	0.011	0.007	0.035	0.003	0.010
172577	ASTM A 70-50/A700-50	0.170	1.420	0.008	0.007	0.170	0.120	0.024	0.018	0.014	0.030	0.003	0.017
COLADA	TE												
175458	0.011												
172577	0.011												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ELASTICO	P. TENSION	RELAC.	TRABAJA.
175458	3000	11840681	1.0000	77.501 (KSI)	78.500 (KSI)	45(%)	1
175458	3000	11840681	1.0000	77.400 (KSI)	79.587 (KSI)	47(%)	1
175458	3000	11887311	0.8750	77.673 (KSI)	84.384 (KSI)	43(%)	2
172577	3000	11881681	1.0000	77.874 (KSI)	80.332 (KSI)	45(%)	1
172577	3000	11882193	1.0000	77.847 (KSI)	77.069 (KSI)	50(%)	1
172577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	76.301 (KSI)	39(%)	2
172577	4100	11887441	0.8750	84.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50(%)	2

PRODUCTO EMBALADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA
175458	3110	11887201	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
175458	3110	11887202	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	3060	11887331	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	3060	11887332	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	3070	11887351	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	3070	11887352	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	3080	11887341	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	3130	11887531	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	3130	11887532	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	4100	11887531	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	4100	11887532	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	4110	11887451	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887
172577	4110	11887452	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	1002504887

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
175458	3110	11887201	3074	A-6
175458	3110	11887202	3074	A-6

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.




CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PROCESADO ENTREGADO				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NOTAS
372577	3060	11887331	3074	A-6
372577	3060	11887332	3074	A-6
372577	3070	11887351	3074	A-6
372577	3070	11887352	3074	A-6
372577	3090	11887341	3074	A-6
372577	3130	11887521	3074	A-6
372577	3130	11887522	3074	A-6
372577	4100	11887531	3074	A-6
372577	4100	11887532	3074	A-6
372577	4110	11887451	3074	A-6
372577	4110	11887452	3074	A-6

FIN DE LINEA



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	23.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA  ING. RAMIRO CORTES MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
ORDEN	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Ca	Co	Ni	Mo	Al	V	Cr	Ti	
275735	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.004	0.150	0.031	0.025	0.015	0.005	0.032	0.003	0.014	0.015	
275736	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.004	0.170	0.027	0.026	0.015	0.007	0.032	0.004	0.015	0.015	
372608	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.017	0.004	0.150	0.032	0.025	0.015	0.005	0.034	0.004	0.015	0.016	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
ORDEN	PLANTILLA	NO. PLACA	ESPESOR (Pulg.)	E. ELASTICO	E. TENSION	VELOC.	T. ELAST.
275735	7030	6280106004	1.0000	57.039 (KSI)	77.220 (KSI)	51 (%)	2
275735	7050	6280105003	1.0000	56.675 (KSI)	78.363 (KSI)	50 (%)	2
275736	7010	6280103001	1.0000	51.889 (KSI)	77.175 (KSI)	45 (%)	1
275736	7050	6280097007	1.0000	55.682 (KSI)	75.219 (KSI)	48 (%)	1
372608	7010	6280104001	1.0000	54.464 (KSI)	75.826 (KSI)	45 (%)	2
372608	7030	6280107001	1.0000	56.246 (KSI)	78.527 (KSI)	48 (%)	1
372608	7060	6280098001	1.0000	56.962 (KSI)	75.213 (KSI)	46 (%)	1

PRODUCTO EMBARCADO							
ORDEN	PLANTILLA	NO. PLACA	ESPESOR (Pulg.)	ANCHO (Pulg.)	LARGO (Pulg.)	PEDIDO	ENTREGA
275735	7030	6280106004	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000070 1002503087
275735	7050	6280105003	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000070 1002503087
275736	7060	6280108001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000070 1002503087
275736	7060	6280108001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000070 1002503087
372608	7030	6280107001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000070 1002503087
372608	7030	6280107001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000070 1002503087
372608	7060	6280098001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000070 1002503087

ORDEN	PLANTILLA	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
275735	7030	6280106004	3074	A-6 50% PLACA STECKEL
275735	7050	6280105003	3074	A-6 50% PLACA STECKEL
275736	7060	6280108001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL
275736	7060	6280108001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL
372608	7030	6280107001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL
372608	7030	6280107001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL
372608	7060	6280098001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO. Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



CLIENTE	ACEROS TEPICOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRI. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					
ING. RAMIRO CIBREROS MENCHACA						
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION						

COMPOSICION QUIMICA															
QUILATA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Co	Cr	Ni	Mo	Al	V	Cu	Ti	
267307	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.410	0.015	0.004	0.160	0.001	0.004	0.018	0.006	0.040	0.004	0.014	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
QUILATA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Pulg.)	L. ELASTICO	F. TENSION	RELOJ	T. ELONG.								
267307	7010	4764076001	1.0000	53.026 (PSI)	74.866 (PSI)	47%	1								
267307	7020	4764063001	1.0000	53.131 (PSI)	75.122 (PSI)	43%	2								
267307	7040	4764064001	1.0000	53.885 (KSI)	80.463 (PSI)	41%	2								
PRODUCTO EMBAUCADO															
QUILATA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Pulg.)	ANCHO (Pulg.)	ALARGO (Pulg.)	PESO (Kg.)	PARTIDA	MATERIA							
267307	7030	4764066002	1.0000	72.0000	480.0000	0000190211	000260	1002366224							
267307	7030	4764066004	1.0000	72.0000	480.0000	0000190211	000260	1002366224							
267307	7040	4764064001	1.0000	72.0000	480.0000	0000190211	000260	1002366224							
267307	7040	4764064002	1.0000	72.0000	480.0000	0000190211	000260	1002366224							
267307	7040	4764064004	1.0000	72.0000	480.0000	0000190211	000260	1002366224							
267307	7040	4764064005	1.0000	72.0000	480.0000	0000190211	000260	1002366224							
QUILATA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CALIENTE	NOTAS											
267307	7030	4764066002	2799	A-6 50% PLACA STECKEL											
267307	7030	4764066004	2799	A-6 50% PLACA STECKEL											
267307	7040	4764064001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL											
267307	7040	4764064003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL											
267307	7040	4764064004	2799	A-6 50% PLACA STECKEL											
267307	7040	4764064005	2799	A-6 50% PLACA STECKEL											
FIN DE DATOS															

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B046666B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	23.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.
DIRECCION	CARRETERA MEX-CUERETARO KM 42.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUERETARO					
PRODUCTO	PLACA SUE-TEL					
ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA						
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION						

ING. RAMIRO CORDERO BENCHACA
PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	AL	TI	
275715	ASTM A 572-100	0.180	0.430	0.018	0.005	0.010	0.021	0.010	0.018	0.005	0.033	0.004	0.015
275716	ASTM A 572-100	0.180	0.430	0.018	0.005	0.010	0.021	0.010	0.018	0.005	0.033	0.004	0.015
275718	ASTM A 572-100	0.180	0.430	0.017	0.005	0.010	0.021	0.010	0.018	0.005	0.033	0.004	0.015

PRUEBAS AL RESCOTADO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pig.)	ELASTICIDAD	P. TENSION	SELOM.							
275715	7050	6280106004	1.0000	57.932 (KSI)	77.220 (KSI)	51 (%)							
275716	7050	6280103001	1.0000	58.075 (KSI)	75.363 (KSI)	50 (%)							
275718	7010	6280104002	1.0000	58.580 (KSI)	75.175 (KSI)	49 (%)							
275720	7050	6280097002	1.0000	58.563 (KSI)	75.114 (KSI)	49 (%)							
275718	7010	6280104002	1.0000	58.564 (KSI)	75.100 (KSI)	49 (%)							
275718	7060	6280107001	1.0000	58.564 (KSI)	75.100 (KSI)	49 (%)							
275718	7060	6280098001	1.0000	58.564 (KSI)	75.100 (KSI)	49 (%)							

PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Pig.)	ANCHO (Pig.)	LARGO (Pig.)	PEDIDO	PARTE	SERIE					
275715	7010	6280102005	1.0000	42.0000	480.0000	000026239	000270	1002503088					
275716	7010	6280103001	1.0000	42.0000	480.0000	000026239	000270	1002503088					
275718	7050	6280097002	1.0000	42.0000	480.0000	000026239	000270	1002503088					
275720	7010	6280104002	1.0000	42.0000	480.0000	000026239	000270	1002503088					
275718	7060	6280098001	1.0000	42.0000	480.0000	000026239	000270	1002503088					
275718	7060	6280098001	1.0000	42.0000	480.0000	000026239	000270	1002503088					

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	RED. CLIENTE	NORMA									
275715	7010	6280102005	3074	A-6 50% PLACA STECKEL									
275716	7010	6280103001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL									
275720	7050	6280097002	3074	A-6 50% PLACA STECKEL									
275718	7010	6280104002	3074	A-6 50% PLACA STECKEL									
275718	7060	6280098001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL									
275718	7060	6280098001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL									

FIN DE DATOS

EMITIO : SC01740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA NIPRA: 15/04/17 01:00:40

CLIENTE: ACEROS TUPACERIAN, S.A. DE C.V.

ORDEN: 000140 CUENTA: 1016 REMISION: 0104110-1

PRODUCTO: ANSUL 40012 101.0X10.70X 35AR0 DE ACERO A570, A570K-06 350

CANTIDAD EMBARCADA: 39.729 TONS

ESPECIFICACION PRODUCTO: SA 400-1. ENBAQUE: JOSE A. PEREZ CABRERA

PESO TEORICO PRODUCTO: 19.048 PGS/MT LONGITUD (mts): 12.01 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS

COLADA	% C	% Si	% Mn	% P	% S	% Cu	% Ni	% Cr	% V	% Nb	% Ti	% Nb
105001	.0180	.0140	.0440	.0100	.0010	.0010	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
105002	.0180	.0130	.0390	.0100	.0010	.0010	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
105003	.0180	.0090	.0310	.0100	.0000	.0010	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
105004	.0180	.0130	.0340	.0100	.0010	.0010	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000


ANALISIS MECANICO Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN ²)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN ²)	ALARGAMIENTO (%)	CHARPY V-NOTCH (J)		CHARPY V-NOTCH (J)			CHARPY V-NOTCH	
				PROMEDIO		T1	T2	T3	TEMP C	
105001	59,000	11,800	23							
105002	55,000	10,900	23							
105003	56,000	11,500	23							
105004	60,000	12,000	23							
				CHARPY V-NOTCH (LB/FT)		CHARPY V-NOTCH (LB/FT)			CHARPY V-NOTCH	
				PROMEDIO		T1	T2	T3	TEMP F	
105001										
105002										
105003										
105004										

AYUDAS DE LA COLADA

COLADA

105001 105002 105003 105004 105005 105006 105007





ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B051885B

CUENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		03.08.2017	1	
DIRECCION				
CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA				ING. RAMIRO CIBEROS MENCHACA
PRODUCTO				
PLACA ANCHA				PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	
175458	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.450	0.012	0.009	0.170	0.021	0.015	0.019	0.007	0.039	0.003	0.015	
275549	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.460	0.013	0.004	0.160	0.031	0.020	0.021	0.006	0.035	0.003	0.016	
372577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.120	0.075	0.048	0.014	0.030	0.003	0.015	
372695	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.170	0.890	0.012	0.005	0.200	0.130	0.059	0.051	0.013	0.033	0.002	0.001	
COLADA	Ti	B												
175458	0.011													
275549	0.011													
372577	0.011													
372695	0.003	0.0004												
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.							
175458	3020	11840681	1.0000	57.522 (KSI)	78.500 (KSI)	46 (%)	2							
175458	3050	11840621	1.0000	56.400 (KSI)	79.587 (KSI)	49 (%)	2							
175458	3100	11887211	0.8750	57.672 (KSI)	84.354 (KSI)	43 (%)	2							
175458	4110	11980711	2.0000	55.959 (KSI)	78.887 (KSI)	48 (%)	2							
275549	3010	11802131	1.0000	56.398 (KSI)	78.571 (KSI)	53 (%)	2							
275549	3060	11803121	2.0000	55.772 (KSI)	78.290 (KSI)	52 (%)	2							
275549	4050	11803461	1.5000	54.522 (KSI)	77.983 (KSI)	45 (%)	2							
275549	4100	11829231	0.7500	57.128 (KSI)	81.774 (KSI)	49 (%)	2							
275549	4140	11803511	1.5000	54.011 (KSI)	78.483 (KSI)	52 (%)	2							
372577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45 (%)	2							
372577	4020	11882191	2.0000	52.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50 (%)	2							
372577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39 (%)	2							
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50 (%)	2							
372695	3080	11981281	1.5000	46.275 (KSI)	67.870 (KSI)	26 (%)	8							
372695	3100	11982611	1.5000	46.576 (KSI)	69.820 (KSI)	24 (%)	8							
372695	4180	11982711	0.7500	46.592 (KSI)	68.681 (KSI)	26 (%)	8							
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA						
175458	3070	11887191	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509312						
175458	3070	11887192	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509312						
5549	4120	11829261	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002509312						

ROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITTO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B051885B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.08.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
275549	4120	11829262	0.7500	72.0000	240.0000	0000204121	000190	1002509312
372577	3030	11887291	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509312
372577	3030	11887292	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509312
372577	4010	11887301	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509312
372577	4010	11887302	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509312
372695	3160	11982871	0.7500	72.0000	480.0000	0000204121	000070	1002509312
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
175458	3070	11887191	3074	A-6				
175458	3070	11887192	3074	A-6				
275549	4120	11829261	3103	A-6				
275549	4120	11829262	3103	A-6				
372577	3030	11887291	3074	A-6				
372577	3030	11887292	3074	A-6				
372577	4010	11887301	3074	A-6				
372577	4010	11887302	3074	A-6				
372695	3160	11982871	3103	A-6				
FIN DE DATOS								

EL CERTIFICADO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B052671B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	06.08.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	
175118	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.430	0.014	0.006	0.160	0.018	0.019	0.019	0.005	0.033	0.003	0.015	
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015	
372586	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.920	0.010	0.008	0.200	0.120	0.062	0.050	0.014	0.035	0.002	0.001	

COLADA	Ti	B
175118	0.010	
175459	0.011	
372586	0.002	0.0003

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
175118	3120	11980431	0.8750	55.187 (KSI)	77.651 (KSI)	51 (%)	2
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2
372586	7030	11860951	1.0000	48.557 (KSI)	72.388 (KSI)	25 (%)	8
372586	7060	11860471	1.0000	44.360 (KSI)	69.033 (KSI)	27 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175118	3120	11980431	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002510308
175118	3120	11980432	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002510308
175459	4030	11887572	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002510308
372586	7090	11860431	1.0000	96.0000	480.0000	0000204121	000140	1002510308
372586	7130	11860421	1.0000	96.0000	480.0000	0000204121	000140	1002510308

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
175118	3120	11980431	3074	A-6
175118	3120	11980432	3074	A-6
175459	4030	11887572	3074	A-6
372586	7090	11860431	3103	A-6
372586	7130	11860421	3103	A-6

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-009-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B053904B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	09.08.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co
175147	ASTM A572-50/A709-50	0.068	1.270	0.014	0.004	0.210	0.021	0.027	0.019	0.025	0.035	0.003	0.017
175458	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.450	0.012	0.009	0.170	0.021	0.015	0.019	0.007	0.039	0.003	0.015
175919	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.850	0.018	0.005	0.130	0.022	0.027	0.025	0.005	0.040	0.002	0.001
471336	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.170	0.880	0.019	0.003	0.130	0.019	0.028	0.019	0.004	0.033	0.003	0.001
COLADA	Ti	B											
175147	0.010												
175458	0.011												
175919	0.002	0.0002											
471336	0.002	0.0002											

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
175147	6041	12101421	0.6250	64.585 (KSI)	86.182 (KSI)	50 (%)	2
175147	6042	12101411	0.6250	53.037 (KSI)	71.361 (KSI)	49 (%)	2
175458	3020	11840681	1.0000	57.522 (KSI)	78.500 (KSI)	46 (%)	2
175458	3050	11840621	1.0000	56.400 (KSI)	79.587 (KSI)	49 (%)	2
175458	3100	11887211	0.8750	57.672 (KSI)	84.354 (KSI)	43 (%)	2
175458	4110	11980711	2.0000	55.959 (KSI)	78.887 (KSI)	48 (%)	2
175919	7131	12101251	0.6250	49.452 (KSI)	69.591 (KSI)	28 (%)	8
175919	7141	12101291	0.6250	44.192 (KSI)	70.520 (KSI)	26 (%)	8
471336	7021	12101301	0.6250	43.428 (KSI)	69.755 (KSI)	27 (%)	8
471336	7031	11900791	0.3750	58.989 (KSI)	76.553 (KSI)	23 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175147	6042	12101411	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000150	1002511718
175147	6042	12101412	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000150	1002511718
175147	6043	12101402	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000150	1002511718
175147	6043	12101403	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000150	1002511718
175458	4120	12101581	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002511718
175458	4120	12101582	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002511718
175919	7131	12101251	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
175919	7131	12101252	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
175919	7131	12101253	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B053904B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	09.08.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175919	7141	12101291	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
175919	7141	12101292	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
175919	7151	12101282	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
175919	7151	12101283	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
471336	7021	12101301	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
471336	7021	12101302	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
471336	7021	12101303	0.6250	72.0000	240.0000	0000204785	000010	1002511718
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
175147	6042	12101411	3165	A-6				
175147	6042	12101412	3165	A-6				
175147	6043	12101402	3165	A-6				
175147	6043	12101403	3165	A-6				
175458	4120	12101581	3074	A-6				
175458	4120	12101582	3074	A-6				
175919	7131	12101251	3165	A-6				
175919	7131	12101252	3165	A-6				
175919	7131	12101253	3165	A-6				
175919	7141	12101291	3165	A-6				
175919	7141	12101292	3165	A-6				
175919	7151	12101282	3165	A-6				
175919	7151	12101283	3165	A-6				
471336	7021	12101301	3165	A-6				
471336	7021	12101302	3165	A-6				
471336	7021	12101303	3165	A-6				

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B050737B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	01.08.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRT. MEX.-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb
172726	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.170	1.100	0.015	0.004	0.130	0.020	0.025	0.016	0.004	0.032	0.003	0.001
175316	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.005	0.150	0.023	0.024	0.020	0.005	0.038	0.003	0.015
175458	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.450	0.012	0.009	0.170	0.021	0.015	0.019	0.007	0.039	0.003	0.015
273914	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.220	1.150	0.017	0.004	0.290	0.018	0.023	0.025	0.005	0.038	0.003	0.001
COLADA	Ti	B											
172726	0.002	0.0002											
175316	0.013												
175458	0.011												
273914	0.019	0.0004											
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.						
172726	7020	11800951	1.2500	47.902 (KSI)	73.696 (KSI)	25 (%)	8						
172726	7030	11800961	1.2500	48.775 (KSI)	74.473 (KSI)	24 (%)	8						
175316	3020	11790141	1.2500	59.960 (KSI)	81.203 (KSI)	53 (%)	2						
175316	3110	11802061	1.0000	55.355 (KSI)	78.522 (KSI)	52 (%)	2						
175316	4060	11802041	1.0000	55.869 (KSI)	79.287 (KSI)	48 (%)	2						
175316	4150	11882441	1.5000	59.810 (KSI)	79.893 (KSI)	46 (%)	2						
175458	3020	11840681	1.0000	57.522 (KSI)	78.500 (KSI)	46 (%)	2						
175458	3050	11840621	1.0000	56.400 (KSI)	79.587 (KSI)	49 (%)	2						
175458	3100	11887211	0.8750	57.672 (KSI)	84.354 (KSI)	43 (%)	2						
175458	4110	11980711	2.0000	55.959 (KSI)	78.887 (KSI)	48 (%)	2						
273914	3010	11790271	1.2500	48.037 (KSI)	67.720 (KSI)	28 (%)	8						
273914	3020	11790261	1.2500	47.927 (KSI)	67.684 (KSI)	28 (%)	8						
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA					
172726	7030	11800961	1.2500	96.0000	240.0000	0000204121	000150	1002507014					
175316	4110	11882421	1.5000	72.0000	240.0000	0000204121	000240	1002507014					
175316	4140	11882431	1.5000	72.0000	240.0000	0000204121	000240	1002507014					
175458	4060	11980401	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002507014					
175458	4060	11980402	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002507014					
273914	4010	11800941	1.2500	96.0000	240.0000	0000204121	000150	1002507014					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-02-A



CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

RO
B050737B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA	01.08.2017	2	
PRODUCTO	PLACA ANCHA			

				PRODUCTO EMBARCADO
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
172726	7030	11800961	3103	A-6
175316	4110	11882421	3103	A-6
175316	4140	11882431	3103	A-6
175458	4060	11980401	3074	A-6
175458	4060	11980402	3074	A-6
273914	4010	11800941	3103	A-6
				FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03\F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B049168B

CLIENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA										
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		28.07.2017	1											
DIRECCION														
CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA				ING. RAMIRO CISNEROS AYENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION										
PRODUCTO														
PLACA ANCHA														
COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	
175316	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.005	0.150	0.023	0.024	0.020	0.005	0.038	0.003	0.015	
175455	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.470	0.020	0.004	0.170	0.029	0.031	0.021	0.007	0.036	0.003	0.016	
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015	
275551	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.420	0.014	0.004	0.160	0.029	0.019	0.022	0.006	0.024	0.003	0.015	
275803	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.170	0.900	0.012	0.006	0.190	0.031	0.019	0.021	0.005	0.033	0.002	0.001	
COLADA	Ti	B												
175316	0.013													
175455	0.010													
175459	0.011													
275551	0.009													
275803	0.003	0.0002												
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.							
175316	3020	11790141	1.2500	59.960 (KSI)	81.203 (KSI)	53 (%)	2							
175316	3110	11802061	1.0000	55.355 (KSI)	78.522 (KSI)	52 (%)	2							
175316	4060	11802041	1.0000	55.869 (KSI)	79.287 (KSI)	48 (%)	2							
175316	4150	11882441	1.5000	59.810 (KSI)	79.893 (KSI)	46 (%)	2							
175455	4030	11886831	1.0000	55.683 (KSI)	75.812 (KSI)	46 (%)	2							
175455	4040	11886821	1.0000	58.878 (KSI)	82.062 (KSI)	48 (%)	2							
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2							
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2							
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2							
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2							
275551	3100	11829291	0.7500	58.258 (KSI)	79.799 (KSI)	45 (%)	2							
275551	4150	11803591	1.5000	55.639 (KSI)	79.585 (KSI)	48 (%)	2							
275551	4160	11803611	1.5000	55.122 (KSI)	76.719 (KSI)	52 (%)	2							
275803	3080	11903771	1.0000	44.223 (KSI)	69.911 (KSI)	26 (%)	8							
275803	3140	11903801	1.0000	43.827 (KSI)	70.448 (KSI)	27 (%)	8							
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA						
175316	4150	11882441	1.5000	72.0000	240.0000	0000204121	000240	1002506091						
175455	4030	11886831	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091						
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL							EMITIO : S201740							



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B049168B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO GIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175455	4030	11886832	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091
175455	4040	11886821	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091
175455	4040	11886822	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091
175459	4060	11887601	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002506091
175459	4060	11887602	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002506091
275551	4120	11826591	1.5000	72.0000	240.0000	0000204121	000240	1002506091
275803	3130	11903761	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
275803	3130	11903762	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
275803	3140	11903801	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
275803	3140	11903802	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
175316	4150	11882441	3103	A-6				
175455	4030	11886831	3103	A-6				
175455	4030	11886832	3103	A-6				
175455	4040	11886821	3103	A-6				
175455	4040	11886822	3103	A-6				
175459	4060	11887601	3074	A-6				
175459	4060	11887602	3074	A-6				
275551	4120	11826591	3103	A-6				
275803	3130	11903761	3103	A-6				
275803	3130	11903762	3103	A-6				
275803	3140	11903801	3103	A-6				
275803	3140	11903802	3103	A-6				
FIN DE DATOS								

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03-F-01-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B052094B

CLIENTE ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		FECHA EMISION 04.08.2017		PAGINA 1		NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA	
DIRECCION CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA						ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA	
PRODUCTO PLACA ANCHA						PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION	

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Ch
173289	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.190	1.100	0.016	0.004	0.280	0.023	0.024	0.024	0.007	0.031	0.003	0.001
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015
372580	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.160	0.820	0.016	0.006	0.110	0.140	0.092	0.066	0.015	0.036	0.002	0.001
372695	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.170	0.890	0.012	0.005	0.200	0.130	0.059	0.051	0.013	0.033	0.002	0.001
COLADA	Ti B												
173289	0.017 0.0003												
175459	0.011												
372580	0.002 0.0003												
372695	0.003 0.0004												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
173289	3190	11782861	1.0000	42.978 (KSI)	67.863 (KSI)	29 (%)	8
173289	3200	11782881	1.0000	42.944 (KSI)	68.147 (KSI)	28 (%)	8
173289	4230	11783311	0.8750	46.448 (KSI)	75.992 (KSI)	25 (%)	8
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2
372580	7070	11844161	0.7500	45.241 (KSI)	69.099 (KSI)	27 (%)	8
372580	7090	11844141	0.7500	44.995 (KSI)	70.419 (KSI)	29 (%)	8
372695	3080	11981281	1.5000	46.275 (KSI)	67.870 (KSI)	26 (%)	8
372695	3100	11982611	1.5000	46.576 (KSI)	69.820 (KSI)	24 (%)	8
372695	4180	11982711	0.7500	46.592 (KSI)	68.681 (KSI)	26 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
173289	4240	11783301	0.8750	96.0000	240.0000	0000204121	000110	1002509620
175459	3030	11887542	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509620
175459	4040	11887592	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509620
372580	7010	11844091	0.7500	96.0000	480.0000	0000204121	000090	1002509620
372695	3170	11982861	0.7500	72.0000	480.0000	0000204121	000070	1002509620
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
173289	4240	11783301	3103	A-6				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B052094B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.08.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	PRODUCTO EMBARCADO	
175459	3030	11887542	3074	NORMA	
175459	4040	11887592	3074	A-6	
372580	7010	11844091	3103	A-6	
372695	3170	11982861	3103	A-6	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
				FIN DE DATOS	
				+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

ACERO TRANSPORTE SA DE CV

ACERO
TRANSPORTE S.A. DE C.V.RFC: ATR940908NS3
[COORDINADOS]GENERAL ANAYA 5
MARIANO ESCOBEDO
TULTITLÁN, ESTADO DE MEXICO MÉXICO
C.P. 54946

843

14-AGO.-2017 09:36:09
TULTITLÁN, ESTADO DE MEXICO

No. Viaje Cliente:

Lugar de Expedición: GENERAL ANAYA 5 MARIANO ESCOBEDO, TULTITLÁN, ESTADO DE MEXICO, MÉXICO C.P.54946

Ruta: MONCLOVA-CHIHUAHUA

Remitente / Origen

ATE851220708 ACEROS TEPOTZOTLAN MONCLOVA
LIB. CARLOS SALINAS DE GORTARI KM.2
CASTAÑOS, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA C.P. 25767

Recoger En: MONCLOVA

Destinatario / Destino

MET0411185E7 MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V
ESTRADA BOCA NEGRA 1702
SAN FELIPÉ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31203

Entregar En: CHIHUAHUA

Detalle de la Carga

Bultos El Remitente Dice Contener
1 1 LOTE ACEROPeso
35.000
Tn.

Detalle de Facturación

Cantidad	U. M.	Concepto	I. unitario	Importe
1	NO APLICA	FLETE	637	22,295.00

Operador: ALFONSO HERRERA GARCIA

Unidad: AT096 Placas: 356ET5

Remolque: AT0116 Placas: 417UJ9

Observacion:

Subtotal: 22,295.00

IVA 16% 3,567.20

RET. 4% 891.80

Total: 24,970.40

Importe con letra: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.

CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE QUE AMPARA ESTA CARTA DE PORTE

PRIMERA.- Para los efectos del presente contrato de transporte se denomina "Transportista" al que realiza el servicio de transportación y "Remitente" o "Expedidor" al usuario que contrata el servicio o remite la mercancía.

SEGUNDA.- El "Remitente" o "Expedidor" es responsable de que la información proporcionada al "Transportista" sea veraz y que la documentación que entregue para efectos del transporte sea la correcta.

TERCERA.- El "Remitente" o "Expedidor" debe declarar al "Transportista" el tipo de mercancía o efectos de que se trate, peso, medidas y/o número de la carga que entrega para su transporte y, en su caso, el valor de la misma. La carga que se entregue a granel será pesada por el "Transportista" en el primer punto donde haya alguna apropiada o, en su defecto, alforada en metros cúbicos con la conformidad del "Remitente" o "Expedidor".

CUARTA.- Para efectos del transporte, el "Remitente" o "Expedidor" deberá entregar al "Transportista" los documentos que las leyes y reglamentos exijan para llevar a cabo el servicio, en caso de no cumplirse con estos requisitos el "Transportista" está obligado a rehusar el transporte de las mercancías.

QUINTA.- Si por sospecha de falsedad en la declaración del contenido de un bulto el "Transportista" deseara proceder a su reconocimiento, podrá hacerlo ante testigos y con asistencia del "Remitente" o "Expedidor" o del consignatario. Si este último no comparece se solicitará la presencia de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se levantará el acta correspondiente. El "Transportista" tendrá en todo caso, la obligación de dejar los bultos en el estado en que se encontraban antes del reconocimiento.

SESTA.- El "Transportista" deberá recoger y entregar la carga precisamente en los domicilios que señale el "Remitente" o "Expedidor", ajustándose a los términos y condiciones convenidos. El "Transportista" solo está obligado a llevar la carga al domicilio del consignatario para su entrega una sola vez. Si ésta no fuera recibida, se registra aviso de que la mercancía quedó a disposición del interesado en las bodega que indique el "Transportista".

SEPTIMA.- Si la carga no fuere recogida dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que hubiere sido puesta a disposición del consignatario, el "Transportista" podrá solicitar la venta en subasta pública con arreglo a lo que dispone el Código de Comercio.

OCTAVA.- El "Transportista" y el "Remitente" o "Expedidor" negociarán libremente el precio del servicio, tomando en cuenta su tipo, características de los embarques, volumen, regularidad, date de carga y sistema de pago.

NOVENA.- Si el "Remitente" o "Expedidor" desea que el "Transportista" asuma la responsabilidad por el valor de las mercancías o efectos que él declare y que cubra todo clase de riesgos, inclusive los derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, las partes deberán convenir un cargo adicional, equivalente al valor de la prima del seguro que se contrata, el cual se deberá expresar en la Carta de Porte.

DECIMA.- Cuando el importe del flete no incluya el cargo adicional, la responsabilidad del "Transportista" queda expresamente limitada a la cantidad equivalente a 15 días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal por tonelada o cuando se trate de embarques cuyo peso sea mayor de 265 kg., pero menor de 1000 kg., a 4 días de salario mínimo por remesa cuando se trate de embarques con peso hasta de 300 kg.

DECIMA PRIMERA.- El precio del transporte deberá pagarse en origen, salvo convenio entre las partes de pago en destino. Cuando el transporte se hubiere contratado "Flete por Contar", la entrega de las mercancías o efectos se hará contra el pago del Flete y el "Transportista" tendrá derecho a retenerlos mientras no se le hubiere el precio convenido.

DECIMA SEGUNDA.- Si al momento de la entrega resultare algún faltante o avería, el consignatario deberá hacerla constar en ese acto en la Carta de Porte y formular su reclamación por escrito al "Transportista", dentro de las 24 horas siguientes.

DECIMA TERCERA.- El "Transportista" queda exento de la obligación de recibir mercancías o efectos para su transporte, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de carga que por su naturaleza, peso, volumen, embalaje defectuoso o cualquier otra circunstancia no pueda transportarse sin destruirse o sin causar daño a los demás artículos o al material restante, salvo que la empresa de que se trate tenga el equipo adecuado.

b) Si las mercancías cuyo transporte haya sido probado por disposiciones legales o reglamentarias.

Cuando tales disposiciones no prohiban precisamente el transporte de determinadas mercancías, pero ordenen la presentación de ciertos documentos para que puedan ser transportadas, el "Remitente" o "Expedidor" estará obligado a entregar al "Transportista" los documentos correspondientes.

DECIMA CUARTA.- Los casos no previstos en las presentes condiciones y las quejas derivadas de su aplicación se someterán por la vía administrativa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DECIMA QUINTA.- Para el caso de que el "Remitente" o "Expedidor" contrate corre por entero, éste asumirá la responsabilidad solidaria para con el "Transportista" respecto la figura de la corresponsabilidad que contempla el artículo 10 del Reglamento Sobre el Flete. Cuando en virtud de la cantidad de los vehículos de Autotransporte que participan en los Camiones y Puentes de Jurisdicción Federal, por lo que el "Remitente" o "Expedidor" queda obligado a verificar que la carga y el vehículo que la transporta, cumplan con el peso y dimensiones máximas establecidas en la NOM-012-STC-2014.

Para el caso de cumplimiento e incumplimiento a las disposiciones que regulan el peso y dimensiones, por parte del "Remitente" o "Expedidor", éste será corresponsable de las infracciones y multas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal impongan al "Transportista", por cargar las unidades con exceso de peso.

DEBEMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL A LA ORDEN DE ACERO TRANSPORTE SA DE CV EN ESTA CIUDAD O DONDE ELIJA EL TENEDOR DE ESTE DOCUMENTO EL IMPORTE QUE AMPARA EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. LA FALTA DEL PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERES MORATORIO DEL ____% MENSUAL

Nombre y Firma de quien Recibe

(EVITE CUOTAS DE DEMORA, DESCARGUE ANTES DE 24 HORAS)




ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B941666B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA  ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
267663	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.410	0.014	0.003	0.160	0.018	0.027	0.018	0.006	0.035	0.003	0.017	0.015	
267664	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.440	0.017	0.004	0.170	0.026	0.028	0.023	0.007	0.038	0.003	0.014	0.016	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.			
267663	7010	4834057001		2.0000		55.824 (KSI)		76.541 (KSI)		52 (%)		2			
267663	7060	4834059001		2.0000		54.124 (KSI)		76.826 (KSI)		45 (%)		2			
267664	7050	4834060001		2.0000		51.863 (KSI)		74.232 (KSI)		45 (%)		2			
267664	7070	4834048002		1.0000		56.334 (KSI)		76.691 (KSI)		49 (%)		2			
267664	7080	4834047001		1.0000		53.609 (KSI)		77.287 (KSI)		42 (%)		2			
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA	
267663	7010	4834057001		2.0000		72.0000		480.0000		0000192211		000360		1002375185	
267663	7010	4834057002		2.0000		72.0000		480.0000		0000192211		000360		1002375185	
267663	7050	4834058001		2.0000		72.0000		480.0000		0000192211		000360		1002375185	
267664	7010	4834056001		2.0000		72.0000		480.0000		0000192211		000360		1002375185	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		PED. CLIENTE		NORMA									
267663	7010	4834057001		2799		A-6 50% PLACA STECKEL									
267663	7010	4834057002		2799		A-6 50% PLACA STECKEL									
267663	7050	4834058001		2799		A-6 50% PLACA STECKEL									
267664	7010	4834056001		2799		A-6 50% PLACA STECKEL									
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
271909	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.015	0.005	0.170	0.035	0.029	0.031	0.010	0.036	0.004	0.017	0.018	
271910	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.430	0.017	0.004	0.170	0.032	0.024	0.025	0.009	0.038	0.004	0.016	0.018	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.			
271909	5030	5650075001		2.0000		55.703 (KSI)		75.096 (KSI)		44 (%)		2			
271910	6020	5650053002		1.5000		52.880 (KSI)		78.407 (KSI)		45 (%)		2			
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA	
271909	5030	5650075001		2.0000		72.0000		480.0000		0000193433		000130		1002446127	
271910	6020	5650053001		1.5000		72.0000		480.0000		0000198213		000250		1002446127	
271910	6020	5650053002		1.5000		72.0000		480.0000		0000198213		000250		1002446127	
271910	6020	5650053003		1.5000		72.0000		480.0000		0000198213		000250		1002446127	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		PED. CLIENTE		NORMA									
271909	5030	5650075001		2827		A-6 50% PLACA STECKEL									
271910	6020	5650053001		2963		A-6 50% PLACA STECKEL									
271910	6020	5650053002		2963		A-6 50% PLACA STECKEL									
271910	6020	5650053003		2963		A-6 50% PLACA STECKEL									
FIN DE DATOS															



CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA STECKEL					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	B
271909	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.015	0.005	0.170	0.035	0.029	0.031	0.010	0.036	0.004	0.017	0.018	
271915	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.400	0.015	0.004	0.170	0.021	0.021	0.022	0.007	0.036	0.003	0.017	0.019	
271960	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.870	0.016	0.004	0.200	0.039	0.031	0.025	0.006	0.038	0.003	0.002	0.003	0.0003
271977	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.170	0.890	0.015	0.005	0.190	0.021	0.026	0.022	0.005	0.036	0.002	0.001	0.002	0.0003

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
271909	5030	5650075001	2.0000	55.703 (KSI)	75.096 (KSI)	44 (%)	2
271915	5010	5650033001	1.0000	55.703 (KSI)	79.575 (KSI)	41 (%)	2
271960	5020	5662037001	0.8750	42.929 (KSI)	68.993 (KSI)	25 (%)	8
271960	6010	5658057001	1.5000	44.581 (KSI)	69.049 (KSI)	27 (%)	8
271960	6090	5662032001	0.8750	46.525 (KSI)	69.560 (KSI)	24 (%)	8
271977	5030	5656027007	1.2500	46.991 (KSI)	69.428 (KSI)	26 (%)	8
271977	5040	5654049001	1.2500	44.216 (KSI)	67.146 (KSI)	26 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
271909	5030	5650075002	2.0000	72.0000	480.0000	0000193433	000130	1002446485
271915	5010	5650033006	1.0000	72.0000	240.0000	0000199219	000190	1002446485
271960	6010	5658057001	1.5000	72.0000	240.0000	0000198213	000110	1002446485
271960	6010	5658057002	1.5000	72.0000	240.0000	0000198213	000110	1002446485
271977	5030	5656027001	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070	1002446485
271977	5030	5656027002	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070	1002446485
271977	5030	5656027003	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070	1002446485
271977	5030	5656027004	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070	1002446485
271977	5030	5656027005	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070	1002446485
271977	5030	5656027006	1.2500	72.0000	240.0000	0000198213	000070	1002446485

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
271909	5030	5650075002	2827	A-6 50% PLACA STECKEL
271915	5010	5650033006	2985	A-6 50% PLACA STECKEL
271960	6010	5658057001	2963	A-6 50% PLACA STECKEL
271960	6010	5658057002	2963	A-6 50% PLACA STECKEL
271977	5030	5656027001	2963	A-6 50% PLACA STECKEL
271977	5030	5656027002	2963	A-6 50% PLACA STECKEL



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B998465B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.03.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						PRODUCTO EMBARCADO		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE			NORMA			
271977	5030	5656027003	2963			A-6 50% PLACA STECKEL			
271977	5030	5656027004	2963			A-6 50% PLACA STECKEL			
271977	5030	5656027005	2963			A-6 50% PLACA STECKEL			
271977	5030	5656027006	2963			A-6 50% PLACA STECKEL			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						FIN DE DATOS			

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03-R02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B935621B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	10.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
168296	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.430	0.014	0.004	0.170	0.020	0.037	0.019	0.006	0.034	0.003	0.017	0.017	
168390	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.420	0.018	0.003	0.170	0.020	0.024	0.016	0.006	0.035	0.003	0.014	0.017	
362935	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.420	0.013	0.004	0.170	0.098	0.035	0.035	0.010	0.042	0.002	0.015	0.018	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
168296	7040	4770122001	1.7500	54.927 (KSI)	75.650 (KSI)	45 (%)	2
168390	7010	4780125001	1.0000	54.697 (KSI)	76.801 (KSI)	45 (%)	2
168390	7020	4780137001	2.0000	50.925 (KSI)	69.510 (KSI)	50 (%)	2
168390	7040	4780138001	2.0000	51.206 (KSI)	66.535 (KSI)	51 (%)	2
362935	7060	4770061001	0.7500	57.602 (KSI)	81.780 (KSI)	40 (%)	2
362935	7120	4770088001	1.0000	52.498 (KSI)	79.339 (KSI)	41 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	ENTREGA
168296	7040	4770122001	1.7500	72.0000	480.0000	0000191537	1002367687
168390	7050	4780139001	2.0000	96.0000	480.0000	0000190672	1002367687
168390	7050	4780139002	2.0000	96.0000	480.0000	0000190672	1002367687
362935	7070	4770095003	1.0000	72.0000	240.0000	0000192211	1002367687
362935	7180	4770094003	1.0000	72.0000	240.0000	0000192211	1002367687

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
168296	7040	4770122001	2787	A-6 50% PLACA STECKEL
168390	7050	4780139001	2760	A-6 50% PLACA STECKEL
168390	7050	4780139002	2760	A-6 50% PLACA STECKEL
362935	7070	4770095003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL
362935	7180	4770094003	2799	A-6 50% PLACA STECKEL

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B038024B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	29.06.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA  PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

		COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti
174725	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.420	0.015	0.004	0.170	0.019	0.024	0.015	0.004	0.036	0.003	0.016	0.019
274833	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.340	0.013	0.002	0.130	0.022	0.016	0.016	0.004	0.035	0.002	0.009	0.002
372028	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.310	0.012	0.008	0.130	0.150	0.051	0.054	0.013	0.038	0.002	0.008	0.002
372107	ASTM A572-50/A709-50	0.160	1.410	0.012	0.005	0.170	0.110	0.046	0.044	0.012	0.042	0.003	0.015	0.017

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
174725	7020	6164062001	0.7500	53.865 (KSI)	78.848 (KSI)	45 (%)	2
174725	7070	6164061001	0.7500	52.273 (KSI)	78.675 (KSI)	50 (%)	2
174725	7080	6164083001	1.5000	56.641 (KSI)	79.860 (KSI)	46 (%)	2
274833	7070	6124001002	0.5000	59.443 (KSI)	80.870 (KSI)	40 (%)	2
274833	7150	6124002001	0.5000	59.906 (KSI)	81.281 (KSI)	42 (%)	2
372028	7090	6110006001	0.5000	60.078 (KSI)	79.313 (KSI)	40 (%)	2
372028	7110	6110003001	0.5000	57.123 (KSI)	77.455 (KSI)	46 (%)	2
372107	7010	6134025001	2.0000	51.448 (KSI)	75.280 (KSI)	47 (%)	2
372107	7040	6178077001	0.7500	54.965 (KSI)	78.014 (KSI)	50 (%)	2
372107	7200	6132022001	0.7500	56.922 (KSI)	80.762 (KSI)	44 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
174725	7050	6178082001	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002493389
174725	7050	6178082002	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002493389
274833	7130	6174032001	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
274833	7130	6174032002	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
274833	7130	6174032003	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
274833	7130	6174032004	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
274833	7130	6174032005	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
372028	7040	6174033006	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
372028	7050	6174036001	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
372028	7050	6174036002	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
372028	7050	6174036003	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
372028	7050	6174036004	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
372028	7050	6174036005	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389
372028	7050	6174036006	0.3750	96.0000	240.0000	0000202639	000170	1002493389

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S115948

CC-03-F-024



CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	29.06.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA STECKEL					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
372107	7040	6178077001	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002493389
372107	7040	6178077002	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002493389
372107	7060	6178078001	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002493389
372107	7060	6178078002	0.7500	72.0000	480.0000	0000202639	000220	1002493389
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
174725	7050	6178082001	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
174725	7050	6178082002	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
274833	7130	6174032001	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
274833	7130	6174032002	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
274833	7130	6174032003	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
274833	7130	6174032004	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
274833	7130	6174032005	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372028	7040	6174033006	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372028	7050	6174036001	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372028	7050	6174036002	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372028	7050	6174036003	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372028	7050	6174036004	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372028	7050	6174036005	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372028	7050	6174036006	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372107	7040	6178077001	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372107	7040	6178077002	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372107	7060	6178078001	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
372107	7060	6178078002	3074	A-6 50%	PLACA	STECKEL		
FIN DE DATOS								



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B050741B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	01.08.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA STECKEL					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
275735	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.004	0.180	0.031	0.025	0.018	0.005	0.033	0.003	0.014	0.015	
275736	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.003	0.170	0.027	0.026	0.018	0.007	0.039	0.004	0.015	0.015	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
275735	7030	6280106004	1.0000	57.039 (KSI)	77.220 (KSI)	51 (%)	2
275735	7050	6280105001	1.0000	56.675 (KSI)	78.363 (KSI)	50 (%)	2
275736	7010	6280103001	1.0000	53.880 (KSI)	77.175 (KSI)	45 (%)	2
275736	7050	6280097005	1.0000	55.683 (KSI)	75.219 (KSI)	48 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
275735	7020	6280101002	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002506941
275735	7020	6280101004	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002506941
275735	7030	6280106001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002506941
275735	7030	6280106002	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002506941
275735	7030	6280106003	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002506941
275736	7030	6280100002	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002506941
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
275735	7020	6280101002	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275735	7020	6280101004	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275735	7030	6280106001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275735	7030	6280106002	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275735	7030	6280106003	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275736	7030	6280100002	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITTO : S201740

CC-03-F02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B934727B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	B
362758	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.022	0.009	0.190	0.110	0.026	0.040	0.014	0.042	0.003	0.017	0.018	
464058	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.870	0.018	0.006	0.290	0.024	0.028	0.020	0.005	0.037	0.002	0.001		0.0003

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELONG.	T. ELONG.
362758	7100	4690081001	1.7500	60.549 (KSI)	76.106 (KSI)	36 (%)	2
362758	7140	4690084001	1.7500	62.361 (KSI)	77.632 (KSI)	38 (%)	2
464058	7010	4672039001	1.7500	45.308 (KSI)	68.914 (KSI)	26 (%)	8
464058	7050	4672040001	1.7500	44.322 (KSI)	70.033 (KSI)	27 (%)	8

				PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
362758	7020	4770117001	1.7500	72.0000	480.0000	0000192211	000330	1002366653
362758	7110	4770120001	1.7500	72.0000	480.0000	0000192211	000330	1002366653
464058	7110	4770144001	1.7500	72.0000	240.0000	0000192211	000140	1002366653
464058	7130	4770146001	1.7500	72.0000	240.0000	0000192211	000140	1002366653
464058	7150	4770147001	1.7500	72.0000	240.0000	0000192211	000140	1002366653
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE		NORMA			
362758	7020	4770117001	2799		A-6 50%	PLACA STECKEL		
362758	7110	4770120001	2799		A-6 50%	PLACA STECKEL		
464058	7110	4770144001	2799		A-6 50%	PLACA STECKEL		
464058	7130	4770146001	2799		A-6 50%	PLACA STECKEL		
464058	7150	4770147001	2799		A-6 50%	PLACA STECKEL		
				FIN DE DATOS				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B051521B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	02.08.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRI. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	
175311	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.018	0.005	0.180	0.022	0.023	0.021	0.006	0.043	0.003	0.015	
175458	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.450	0.012	0.009	0.170	0.021	0.015	0.019	0.007	0.039	0.003	0.015	
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015	
471337	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.100	0.950	0.020	0.004	0.130	0.020	0.025	0.016	0.004	0.040	0.004	0.002	
COLADA	Ti	B												
175311	0.012													
175458	0.011													
175459	0.011													
471337	0.015	0.0002												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
175311	3060	11828811	1.0000	54.821 (KSI)	79.793 (KSI)	51 (%)	2
175311	3070	11802991	2.0000	55.137 (KSI)	78.241 (KSI)	55 (%)	2
175311	4110	11784491	0.7500	57.126 (KSI)	77.402 (KSI)	48 (%)	2
175311	4120	11784521	0.7500	55.997 (KSI)	77.346 (KSI)	46 (%)	2
175458	3020	11840681	1.0000	57.522 (KSI)	78.500 (KSI)	46 (%)	2
175458	3050	11840621	1.0000	56.400 (KSI)	79.587 (KSI)	49 (%)	2
175458	3100	11887211	0.8750	57.672 (KSI)	84.354 (KSI)	43 (%)	2
175458	4110	11980711	2.0000	55.959 (KSI)	78.887 (KSI)	48 (%)	2
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2
471337	7011	11828591	1.0000	40.996 (KSI)	61.365 (KSI)	27 (%)	8
471337	7021	11828601	1.0000	39.921 (KSI)	59.947 (KSI)	25 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175311	4020	11784571	0.7500	96.0000	480.0000	0000204121	000210	1002508876
175458	3020	11840681	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002508876
175459	3030	11887541	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002508876
175459	4030	11887571	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002508876
471337	7021	11828601	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002508876

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B051521B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	02.08.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

				PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
471337	7021	11828602	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002508876
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE		NORMA			
175311	4020	11784571	3103		A-6			
175458	3020	11840681	3103		A-6			
175459	3030	11887541	3074		A-6			
175459	4030	11887571	3074		A-6			
471337	7021	11828601	3103		A-6			
471337	7021	11828602	3103		A-6			
				FIN DE DATOS				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-01-A




ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047499B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	
175458	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.450	0.012	0.009	0.170	0.021	0.015	0.019	0.007	0.039	0.003	0.015	
372577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.120	0.075	0.048	0.014	0.030	0.003	0.015	
COLADA	Ti													
175458	0.011													
372577	0.011													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.							
175458	3020	11840681	1.0000	57.522 (KSI)	78.500 (KSI)	46 (%)	2							
175458	3050	11840621	1.0000	56.400 (KSI)	79.587 (KSI)	49 (%)	2							
175458	3100	11887211	0.8750	57.672 (KSI)	84.354 (KSI)	43 (%)	2							
372577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45 (%)	2							
372577	4020	11882191	2.0000	52.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50 (%)	2							
372577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39 (%)	2							
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50 (%)	2							
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA						
175458	3100	11887211	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
175458	3100	11887212	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	3090	11887411	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	3090	11887412	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	3100	11887381	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	3100	11887382	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	4050	11887321	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	4050	11887322	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	4060	11887361	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	4060	11887362	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	4120	11887441	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	4120	11887442	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
372577	4140	11887422	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002504192						
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA										
175458	3100	11887211	3074	A-6										
175458	3100	11887212	3074	A-6										

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047499B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						PRODUCTO EMBARCADO		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE			NORMA			
372577	3090	11887411	3074			A-6			
372577	3090	11887412	3074			A-6			
372577	3100	11887381	3074			A-6			
372577	3100	11887382	3074			A-6			
372577	4050	11887321	3074			A-6			
372577	4050	11887322	3074			A-6			
372577	4060	11887361	3074			A-6			
372577	4060	11887362	3074			A-6			
372577	4120	11887441	3074			A-6			
372577	4120	11887442	3074			A-6			
372577	4140	11887422	3074			A-6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						FIN DE DATOS			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048520B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	
175465	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.840	0.019	0.006	0.120	0.032	0.031	0.022	0.005	0.036	0.002	0.001	
372577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.120	0.075	0.048	0.014	0.030	0.003	0.015	
372580	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.160	0.820	0.016	0.006	0.110	0.140	0.092	0.066	0.015	0.036	0.002	0.001	
COLADA	Ti	B												
175465	0.002	0.0003												
372577	0.011													
372580	0.002	0.0003												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
175465	7230	11844131	0.7500	45.262 (KSI)	70.349 (KSI)	25 (%)	8
175465	7240	11844121	0.7500	45.510 (KSI)	68.915 (KSI)	28 (%)	8
372577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45 (%)	2
372577	4020	11882191	2.0000	52.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50 (%)	2
372577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39 (%)	2
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50 (%)	2
372580	7070	11844161	0.7500	45.241 (KSI)	69.099 (KSI)	27 (%)	8
372580	7090	11844141	0.7500	44.995 (KSI)	70.419 (KSI)	29 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175465	7160	11860101	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000080	1002505131
175465	7190	11860121	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000080	1002505131
372577	3140	11887501	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505131
372577	3140	11887502	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505131
372577	4070	11887471	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505131
372577	4070	11887472	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505131
372577	4090	11887461	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505131
372577	4090	11887462	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505131
372580	7040	11860151	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000080	1002505131
372580	7040	11860152	0.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000080	1002505131
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
175465	7160	11860101	3103	A-6				
175465	7190	11860121	3103	A-6				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03-P02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048520B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

+-----+-----+-----+-----+				PRODUCTO EMBARCADO	-----+
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA	
372577	3140	11887501	3074	A-6	
372577	3140	11887502	3074	A-6	
372577	4070	11887471	3074	A-6	
372577	4070	11887472	3074	A-6	
372577	4090	11887461	3074	A-6	
372577	4090	11887462	3074	A-6	
372580	7040	11860151	3103	A-6	
372580	7040	11860152	3103	A-6	
+-----+-----+-----+-----+				FIN DE DATOS	-----+

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03-F-02A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048747B

CUENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		27.07.2017	1	
DIRECCION		CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA		
PRODUCTO		PLACA ANCHA		

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015
372577	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.007	0.170	0.120	0.075	0.048	0.014	0.030	0.003	0.015

COLADA	Ti
175459	0.011
372577	0.011

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2
372577	3020	11881651	1.0000	60.874 (KSI)	80.339 (KSI)	45 (%)	2
372577	4020	11882191	2.0000	52.547 (KSI)	77.069 (KSI)	50 (%)	2
372577	4040	11881641	1.0000	59.494 (KSI)	78.301 (KSI)	39 (%)	2
372577	4120	11887441	0.8750	54.244 (KSI)	78.385 (KSI)	50 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175459	3010	11887552	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687
175459	3020	11887511	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687
175459	3020	11887512	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687
175459	4050	11887581	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687
175459	4050	11887582	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687
372577	3080	11887342	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687
372577	4080	11887611	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687
372577	4080	11887612	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002505687

COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA
175459	3010	11887552	3074	A-6
175459	3020	11887511	3074	A-6
175459	3020	11887512	3074	A-6
175459	4050	11887581	3074	A-6
175459	4050	11887582	3074	A-6
372577	3080	11887342	3074	A-6

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048747B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						-----+			
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	PRODUCTO EMBARCADO					
				NORMA					
372577	4080	11887611	3074	A-6					
372577	4080	11887612	3074	A-6					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				FIN DE DATOS		-----+			

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-R02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B049168B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA ING. RAMIRO CIBERNOS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	
175316	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.420	0.020	0.005	0.150	0.023	0.024	0.020	0.005	0.038	0.003	0.015	
175455	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.470	0.020	0.004	0.170	0.029	0.031	0.021	0.007	0.036	0.003	0.016	
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015	
275551	ASTM A572-50/A709-50	0.190	1.420	0.014	0.004	0.160	0.029	0.019	0.022	0.006	0.024	0.003	0.015	
275803	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.170	0.900	0.012	0.006	0.190	0.031	0.019	0.021	0.005	0.033	0.002	0.001	

COLADA	Ti	B
175316	0.013	
175455	0.010	
175459	0.011	
275551	0.009	
275803	0.003	0.0002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
175316	3020	11790141	1.2500	59.960 (KSI)	81.203 (KSI)	53 (%)	2
175316	3110	11802061	1.0000	55.355 (KSI)	78.522 (KSI)	52 (%)	2
175316	4060	11802041	1.0000	55.869 (KSI)	79.287 (KSI)	48 (%)	2
175316	4150	11882441	1.5000	59.810 (KSI)	79.893 (KSI)	46 (%)	2
175455	4030	11886831	1.0000	55.683 (KSI)	75.812 (KSI)	46 (%)	2
175455	4040	11886821	1.0000	58.878 (KSI)	82.062 (KSI)	48 (%)	2
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2
275551	3100	11829291	0.7500	58.258 (KSI)	79.799 (KSI)	45 (%)	2
275551	4150	11803591	1.5000	55.639 (KSI)	79.585 (KSI)	48 (%)	2
275551	4160	11803611	1.5000	55.122 (KSI)	76.719 (KSI)	52 (%)	2
275803	3080	11903771	1.0000	44.223 (KSI)	69.911 (KSI)	26 (%)	8
275803	3140	11903801	1.0000	43.827 (KSI)	70.448 (KSI)	27 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175316	4150	11882441	1.5000	72.0000	240.0000	0000204121	000240	1002506091
175455	4030	11886831	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-01-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
 PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B049168B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.07.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175455	4030	11886832	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091
175455	4040	11886821	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091
175455	4040	11886822	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002506091
175459	4060	11887601	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002506091
175459	4060	11887602	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002506091
275551	4120	11826591	1.5000	72.0000	240.0000	0000204121	000240	1002506091
275803	3130	11903761	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
275803	3130	11903762	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
275803	3140	11903801	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
275803	3140	11903802	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002506091
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
175316	4150	11882441	3103	A-6				
175455	4030	11886831	3103	A-6				
175455	4030	11886832	3103	A-6				
175455	4040	11886821	3103	A-6				
175455	4040	11886822	3103	A-6				
175459	4060	11887601	3074	A-6				
175459	4060	11887602	3074	A-6				
275551	4120	11826591	3103	A-6				
275803	3130	11903761	3103	A-6				
275803	3130	11903762	3103	A-6				
275803	3140	11903801	3103	A-6				
275803	3140	11903802	3103	A-6				
				FIN DE DATOS				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B051363B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	02.08.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CERNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co
175455	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.470	0.020	0.004	0.170	0.029	0.031	0.021	0.007	0.036	0.003	0.016
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015
275802	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.160	0.910	0.015	0.005	0.200	0.030	0.023	0.022	0.005	0.041	0.002	0.001
471337	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.100	0.950	0.020	0.004	0.130	0.020	0.025	0.016	0.004	0.040	0.004	0.002
COLADA	Ti B												
175455	0.010												
175459	0.011												
275802	0.003 0.0003												
471337	0.015 0.0002												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
175455	4030	11886831	1.0000	55.683 (KSI)	75.812 (KSI)	46 (%)	2
175455	4040	11886821	1.0000	58.878 (KSI)	82.062 (KSI)	48 (%)	2
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2
275802	3050	11903581	1.2500	42.834 (KSI)	68.312 (KSI)	26 (%)	8
275802	3060	11903661	1.2500	46.785 (KSI)	66.349 (KSI)	28 (%)	8
275802	3090	11903821	1.0000	50.742 (KSI)	71.670 (KSI)	28 (%)	8
471337	7011	11828591	1.0000	40.996 (KSI)	61.365 (KSI)	27 (%)	8
471337	7021	11828601	1.0000	39.921 (KSI)	59.947 (KSI)	25 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
175455	4050	11886841	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002508720
175455	4050	11886842	1.0000	96.0000	240.0000	0000204121	000220	1002508720
175459	4040	11887591	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002508720
275802	4110	11903751	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002508720
471337	7011	11828591	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002508720
471337	7011	11828592	1.0000	72.0000	240.0000	0000204121	000130	1002508720
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
175455	4050	11886841	3103	A-6				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-P02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B051363B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	02.09.2017	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO GONZALEZ TENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

+-----+-----+-----+-----+-----+					PRODUCTO EMBARCADO	-----+
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE		NORMA	
175455	4050	11886842	3103		A-6	
175459	4040	11887591	3074		A-6	
275802	4110	11903751	3103		A-6	
471337	7011	11828591	3103		A-6	
471337	7011	11828592	3103		A-6	
+-----+-----+-----+-----+-----+					FIN DE DATOS	-----+

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-01A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B051649B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.08.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS TENCHACA
PRODUCTO	PLACA ANCHA					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb
174602	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.210	1.110	0.020	0.005	0.280	0.023	0.021	0.019	0.006	0.034	0.003	0.001
175115	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.450	0.017	0.003	0.170	0.020	0.020	0.019	0.005	0.031	0.004	0.015
175459	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.016	0.006	0.180	0.020	0.020	0.019	0.006	0.032	0.003	0.015
COLADA	Ti	B											
174602	0.017	0.0003											
175115	0.009												
175459	0.011												

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
174602	3150	11782841	1.2500	43.835 (KSI)	68.099 (KSI)	29 (%)	8
174602	3180	11782851	1.2500	42.899 (KSI)	77.960 (KSI)	26 (%)	8
174602	4250	11783271	0.8750	45.318 (KSI)	75.430 (KSI)	24 (%)	8
175115	4070	11965171	1.7500	54.983 (KSI)	76.180 (KSI)	47 (%)	2
175459	3100	11881551	1.0000	58.976 (KSI)	79.247 (KSI)	41 (%)	2
175459	3120	11882291	2.0000	54.061 (KSI)	76.640 (KSI)	44 (%)	2
175459	4030	11887571	0.8750	55.453 (KSI)	77.332 (KSI)	50 (%)	2
175459	4110	11881481	1.0000	58.081 (KSI)	77.693 (KSI)	41 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
174602	4240	11783321	0.8750	96.0000	240.0000	0000204121	000110	1002509049
175115	4070	11965171	1.7500	96.0000	240.0000	0000204121	000250	1002509049
175459	3050	11980391	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509049
175459	3050	11980392	0.8750	84.0000	240.0000	0000204036	000010	1002509049
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
174602	4240	11783321	3103	A-6				
175115	4070	11965171	3103	A-6				
175459	3050	11980391	3074	A-6				
175459	3050	11980392	3074	A-6				

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048324B

CUENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CARREROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
275732	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.014	0.006	0.180	0.026	0.024	0.017	0.004	0.038	0.003	0.018	0.019	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.				
275732	7030	6284059001	1.7500		56.195 (KSI)		76.577 (KSI)		50 (%)		2				
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA		
275732	7030	6284059001	1.7500		72.0000		240.0000		0000202639		000350		1002505238		
275732	7030	6284059002	1.7500		72.0000		240.0000		0000202639		000350		1002505238		
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE				NORMA								
275732	7030	6284059001	3074				A-6 50% PLACA STECKEL								
275732	7030	6284059002	3074				A-6 50% PLACA STECKEL								
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-R



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B048746B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
275732	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.014	0.006	0.180	0.026	0.024	0.017	0.004	0.038	0.003	0.018	0.019	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.				
275732	7030	6284059001	1.7500		56.195 (KSI)		76.577 (KSI)		50 (%)		2				
275732	7060	6284060001	1.7500		54.884 (KSI)		75.522 (KSI)		52 (%)		2				
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA		
275732	7060	6284060002	1.7500		72.0000		240.0000		0000202639		000350		1002505689		
275732	7080	6284058001	1.7500		72.0000		240.0000		0000202639		000350		1002505689		
275732	7080	6284058002	1.7500		72.0000		240.0000		0000202639		000350		1002505689		
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE		NORMA										
275732	7060	6284060002	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
275732	7080	6284058001	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
275732	7080	6284058002	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-P02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770
B934727B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.10.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CORDERO MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	PLACA STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	B	
362758	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.022	0.009	0.190	0.110	0.026	0.040	0.014	0.042	0.003	0.017	0.018		
464058	ASTM A36/ASME SA36 ED15	0.180	0.870	0.018	0.006	0.290	0.024	0.028	0.020	0.005	0.037	0.002	0.001	0.0003		
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.									
362758	7100	4690081001	1.7500	60.549 (KSI)	76.106 (KSI)	36 (%)	2									
362758	7140	4690084001	1.7500	62.361 (KSI)	77.632 (KSI)	38 (%)	2									
464058	7010	4672039001	1.7500	45.308 (KSI)	68.914 (KSI)	26 (%)	8									
464058	7050	4672040001	1.7500	44.322 (KSI)	70.033 (KSI)	27 (%)	8									
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA								
362758	7020	4770117001	1.7500	72.0000	480.0000	0000192211	000330	1002366653								
362758	7110	4770120001	1.7500	72.0000	480.0000	0000192211	000330	1002366653								
464058	7110	4770144001	1.7500	72.0000	240.0000	0000192211	000140	1002366653								
464058	7130	4770146001	1.7500	72.0000	240.0000	0000192211	000140	1002366653								
464058	7150	4770147001	1.7500	72.0000	240.0000	0000192211	000140	1002366653								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA												
362758	7020	4770117001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL												
362758	7110	4770120001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL												
464058	7110	4770144001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL												
464058	7130	4770146001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL												
464058	7150	4770147001	2799	A-6 50% PLACA STECKEL												
FIN DE DATOS																

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B929668B


CLIENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		27.09.2016	1	
DIRECCION		CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA		
PRODUCTO		PLACA STECKEL		

+-----+-----+		COMPOSICION QUIMICA														-----	
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti			
362758	ASTM A572-50/A709-50	0.170	1.440	0.022	0.009	0.190	0.110	0.026	0.040	0.014	0.042	0.003	0.017	0.018			
+-----+-----+		PRUEBAS AL PRODUCTO														-----	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.					
362758	7100	4690081001		1.7500		60.549 (KSI)		76.106 (KSI)		36 (%)		2					
362758	7140	4690084001		1.7500		62.361 (KSI)		77.632 (KSI)		38 (%)		2					
+-----+-----+		PRODUCTO EMBARCADO														-----	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA			
362758	7100	4690081001		1.7500		72.0000		480.0000		0000191537		000010		1002360629			
362758	7140	4690084001		1.7500		72.0000		480.0000		0000190930		000010		1002360629			
362758	7160	4690082001		1.7500		72.0000		480.0000		0000191537		000010		1002360629			
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA		PED. CLIENTE		NORMA											
362758	7100	4690081001		2787		A-6 50% PLACA STECKEL											
362758	7140	4690084001		2768		A-6 50% PLACA STECKEL											
362758	7160	4690082001		2787		A-6 50% PLACA STECKEL											
+-----+-----+		FIN DE DATOS														-----	

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



DE LA CALIDAD

ASEGUARAMIENTO

ELI5

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE
SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE	SE	DE	LA	DE

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES



SOLD FORTACERO SA DE CV
BLVD. PRESIDENTE CARLOS SALINAS
TO: DE GORTARI KM 8.8
A POSTAL 64 CP
APODACANL 66600

NUCOR
NUCOR CORPORATION
NUCOR STEEL UTAH

CERTIFIED MILL TEST REPORT

NUCOR - PLYMOUTH IS AN I.S.O. 9001 AND AN A.B.S. CERTIFIED MILL

Ship from:

Nucor Steel - Utah
W Cemetery Road
PLYMOUTH, UT 84330
435-458-2300

Page: 1

43539

SHIP FORTACERO SA DE CV
C/O INTERMODAL MEXICO
TO: BLVD CARLOS SALINAS DE GORTARI
STATION MONTERREY
APODACANL 66600

Date: 28-Nov-2011
B.L. Number: 390863
Load Number: 207694

Material Safety Data Sheets are available at www.nucorban.com or by contacting your inside sales representative.

NIMC-03 March 5, 2011

HEAT NUM. *	DESCRIPTION	PHYSICAL TESTS					CHEMICAL TESTS									
		YIELD P.S.I.	TENSILE P.S.I.	ELONG % IN 8"	BEND	WT% DEF	C	Mn	P	S	Si	Cu	Sn	C.E.		
PO# => PL1120672101	4500082534 Nucor Steel - Utah 6x6x7/8" Angle 40' A572-Gr50 TY2 ASTM A572/A572M-07 GR 50 TY2, A7 09-08 GR 50	66,661	87,906	27.0%			.20	.90	.013	.037	.24	.25				
		460MPa	606MPa	1			.09	.09	.016	.039	.005					
		86,790	88,813	28.0%			MN/C									
		461MPa	612MPa				04.50									
CMTR COMPLIES WITH DIN EN 10204 - 3.1.B																

ABEINSA	
Fecha: 16-01-12	
No. 10/12	Vo. Bo. Calidad
Responsable Dpto. Calidad	

00001361

QUALITY
ASSURANCE

Scott Laurent

Scott Laurent



Acera Ramos Arizpe
CARRETERA MONCLOVA KM 4 NUMERO 2125
TRAMO SANTA CRUZ CUA CALIENTE
C.P. 26380 RAMOS ARIZPE COAHUILA
Teléfono: +52 56 818 345 1111
Mail: info@ramosarizpe.com.mx

CERTIFICADO DE CALIDAD /

No. Certificado: 00035-2190/2014
Fecha: Date: 16/04/2014

Elaborado en México / Made in Mexico

DATOS DEL CLIENTE - SOLD TO

Cliente / Customer: ACEROS TEPICZOTLAN SA DE CV
Dirección / Address: CARR MEXICO GUERETERO KM 2.5 EN PARQUE INDUSTRIAL
QUANUILA
Ciudad / City: TUAUTIMAN ARIZOALLI Estado / State: EDO. DE MEXICO
Teléfono / Phone: 06727692 País / Country: MEXICO C.P./ZIP: 47500
Correo Electrónico / eMail: miniamfrez@deacero.com

CLIENTE CONSIGNADO - SHIP TO

Cliente / Customer: COAHUILA
Dirección / Address: LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE MORTARIL KM 2.5
Ciudad / City: CASTANOS Estado / State: COAHUILA

DATOS DEL EMBARQUE / SHIPPING INFORMATION

Num. Vago / Trave No: 00205
Num. Fáb. / Invoice No: 0060463
Pedido / Customer Order No: 20902234
Num. Plan. Shipping Plan: 80433
Fecha Embarque / Date: 07/04/2014

COMPOSICION QUIMICA / CHEMICAL COMPOSITION (% PESO / WEIGHT)

Código / Item	Resistencia / Resistance	Código / Code	Producto / Description of Goods	% C	% Mn	% S	% P	% Si	% Cu	% Cr	% Ni	% Mo	% Nb	% V	PPM Nb
00077	08028	10102	ANGULO L 8" x 6" x 5/8" A572 (p. 17.14=4.61 IN.O.M.)	AVG 0.21	AVG 0.92	AVG 0.30	AVG 0.003	AVG 0.505	AVG 0.25	AVG 0.08	AVG 0.05	AVG 0.019	AVG 0.010	AVG 0.015	AVG 150

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL PROPERTIES

Código / Item	Resistencia / Resistance	Código / Code	Producto / Description of Goods	Carbón / Carbon	Carbón / Sulphur	RT / Yield	TS / Tensile	% Elong / Elong	UF / Yield	YS / Yield	P. Ductil / Ductility
00077	08028	10102	ANGULO L 8" x 6" x 5/8" A572 (p. 17.14=4.61 IN.O.M.)	0.21	0.003	35.5	5673.7	33.8	38.5	5673.7	Compe / Satisfactory

Certificamos que este material ha sido producido inspeccionado y probado de acuerdo a las normas de fabricación del acero aplicables a la ASTM A36-2006 (re aprobada en 2009), A572-2012 y A572-2011 y a las normas dimensionales NMX B252, ASTM A6/A6M-2012 y/o con el que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a las normas de fabricación del acero aplicables a la ASTM A36-2006, A572-2006 (re aprobada en 2009), A572-2012 y A572-2011, las normas dimensionales NMX B252, ASTM A6/A6M-2012



FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

[Handwritten signature]



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047755B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA STECKEL					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
275735	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.004	0.180	0.031	0.025	0.018	0.005	0.033	0.003	0.014	0.015	
275736	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.003	0.170	0.027	0.026	0.018	0.007	0.039	0.004	0.015	0.015	
372608	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.017	0.005	0.180	0.032	0.025	0.019	0.005	0.034	0.004	0.015	0.016	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
275735	7030	6280106004	1.0000	57.039 (KSI)	77.220 (KSI)	51 (%)	2
275735	7050	6280105001	1.0000	56.675 (KSI)	78.363 (KSI)	50 (%)	2
275736	7010	6280103001	1.0000	53.880 (KSI)	77.175 (KSI)	45 (%)	2
275736	7050	6280097005	1.0000	55.683 (KSI)	75.219 (KSI)	48 (%)	2
372608	7010	6280104001	1.0000	54.464 (KSI)	75.826 (KSI)	45 (%)	2
372608	7030	6280107001	1.0000	56.246 (KSI)	78.527 (KSI)	48 (%)	2
372608	7060	6280098001	1.0000	55.961 (KSI)	75.213 (KSI)	46 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
275735	7010	6280102004	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002504562
275735	7050	6280105005	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002504562
275736	7050	6280097001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002504562
275736	7050	6280097002	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002504562
275736	7050	6280097003	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002504562
372608	7010	6280104003	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270	1002504562
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE	NORMA				
275735	7010	6280102004	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275735	7050	6280105005	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275736	7050	6280097001	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275736	7050	6280097002	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
275736	7050	6280097003	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				
372608	7010	6280104003	3074	A-6 50% PLACA STECKEL				

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A




ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B047932B

CLIENTE		FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.		26.07.2017	1	
DIRECCION		CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA		
PRODUCTO		PLACA STECKEL		

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti
275736	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.003	0.170	0.027	0.026	0.018	0.007	0.039	0.004	0.015	0.015
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.			
275736	7010	6280103001	1.0000		53.880 (KSI)		77.175 (KSI)		45 (%)		2			
275736	7050	6280097005	1.0000		55.683 (KSI)		75.219 (KSI)		48 (%)		2			
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)		ANCHO (Plg.)		LARGO (Plg.)		PEDIDO		PARTIDA		ENTREGA	
275736	7050	6280097005	1.0000		72.0000		480.0000		0000202639		000270		1002504656	
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE				NORMA							
275736	7050	6280097005	3074				A-6 50% PLACA STECKEL							
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B049059B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.07.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					ING. RAMIRO CIBNEROS MENCHACA
PRODUCTO	PLACA STECKEL					PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Co	Ti	
275736	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.430	0.016	0.003	0.170	0.027	0.026	0.018	0.007	0.039	0.004	0.015	0.015	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.								
275736	7010	6280103001	1.0000	53.880 (KSI)	77.175 (KSI)	45 (%)	2								
275736	7050	6280097005	1.0000	55.683 (KSI)	75.219 (KSI)	48 (%)	2								
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA		ENTREGA						
275736	7030	6280100001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270		1002506033						
275736	7040	6280099001	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270		1002506033						
275736	7040	6280099002	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270		1002506033						
275736	7040	6280099003	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270		1002506033						
275736	7040	6280099004	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270		1002506033						
275736	7040	6280099005	1.0000	72.0000	480.0000	0000202639	000270		1002506033						
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	PED. CLIENTE		NORMA										
275736	7030	6280100001	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
275736	7040	6280099001	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
275736	7040	6280099002	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
275736	7040	6280099003	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
275736	7040	6280099004	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
275736	7040	6280099005	3074		A-6 50% PLACA STECKEL										
FIN DE DATOS															

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740

CC-03-F-02-A



ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA: CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B001351B

CLIENTE	ACEROS TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	29.03.2017	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACIÓN
DIRECCION	CARRT. MEX-QUERETARO KM 37.5 COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA					
PRODUCTO	ROLLO STECKEL					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti
272342	ASTM A572-50/A709-50 T	0.061	0.840	0.016	0.005	0.0660	0.019	0.020	0.020	0.005	0.003	0.040	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO. ROLLO	PLANCHON	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
272342	S5728011	5030	0.3750	63.591 (KSI)	71.385 (KSI)	39 (%)	2
272342	S5728007	6010	0.5000	64.701 (KSI)	72.352 (KSI)	46 (%)	2
272342	S5728012	6030	0.3750	62.752 (KSI)	70.508 (KSI)	40 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
272342	S5728007	0.5000	72.0000	0000199970	000110	1002450053	3002
COLADA	NO. ROLLO	NORMA					
272342	S5728007	50%A6					

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118542

CC-03-F-02-A



INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:		02-sep-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		14-ED		
TOMADA DE		ZAPATA CORRIDA PARA ESCAMA ETRIBO 8		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	250	MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	8264	REVENIMIENTO (cm)	13.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	14-A			
DIAMETRO (cm)	15.1			
ALTURA (cm)	30.1			
ÁREA (cm ²)	179.1			
FECHA DE COLADO	25-sep-17			
FECHA DE RUPTURA	02-sep-17			
EDAD (DIAS)	7			
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	37840			
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	211.3			
% RESISTENCIA DE PROYECTO	84.5			
TIPO DE FALLA	1			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ				

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: GAZA PERIFERICO DE LA JUVENTUD

FECHA 21-sep-17

LOCALIZACION: PEFIFERICO DE JUVENTUD Y AV. CANTERA, CHIHUAHUA, CHIH.

COMPACTACION DE PROYECTO

95%

ESPESOR DE PROYECTO

20 CMS.

REPORTE DE COMPACTACION DE:

CAPA TIERRA ARMADA

GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD

MERP EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
			1a. CAPA TIERRA ARMADA TRAMO 0+080 A 0+100						
		DER	20	1920	1972	1829	12.0	7.8	95
		CEN	20	1920	1969	1821	12.0	8.1	95
		IZQ	20	1920	1990	1826	12.0	9.0	95
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR									

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

21-sep-17

TECNICO : HUGO SERGIO CONTRERAS

~~AUTORIZO~~

C. FAUSTO CHAVEZ BASCOM
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410.60.22 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: GAZA		FECHA DE INFORME:	27-sep-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
FOLIO DE INFORME			
MUESTRA No.	10-CA		
TOMADA DE	GUARNICION 0+417.9		
DATOS DE PROYECTO			
f 'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	37.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	34.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR G.C.C. (CANTERA)	CEMENTO	HOLCIM
REMISIÓN	3693	REVENIMIENTO (cm)	11.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	10-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	20-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	27-sep-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	34080		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	192.9		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	77.1		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.			
AUTORIZO 2 ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**


OBRA: GAZA		FECHA DE INFORME:	27-sep-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
FOLIO DE INFORME			
MUESTRA No.	115		
TOMADA DE	MARCO CABEZA No. 3		
DATOS DE PROYECTO			
f 'c (kg/cm ²)	250	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	28.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	31.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR G.C.C. (CANTERA)	CEMENTO	HOLCIM
REMISIÓN	7034	REVENIMIENTO (cm)	12.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	115-B	115-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.1	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	30-ago-17	30-ago-17	
FECHA DE RUPTURA	27-sep-17	27-sep-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	50940	51910	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	288.3	293.8	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	115.3	117.5	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO			
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ			


INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	28-sep-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.3	11-CED		
TOMADA DE	2 TRABES ASSHTO 5 LONGITUD 19.94		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	450	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR SUPERIOR	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	418	REVENIMIENTO (cm)	18.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	11-A		
DIAMETRO (cm)	15.1		
ALTURA (cm)	30.1		
ÁREA (cm ²)	179.1		
FECHA DE COLADO	21-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	28-sep-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	64160		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	358.2		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	79.6		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			





INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:		30-sep-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		12-CA		
TOMADA DE		CABEZAL DE MARCO No. 1		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	400	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECOS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12±2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	24612	REVENIMIENTO (cm)	10.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	12-A			
DIAMETRO (cm)	15.0			
ALTURA (cm)	30.0			
ÁREA (cm ²)	176.7			
FECHA DE COLADO	23-sep-17			
FECHA DE RUPTURA	30-sep-17			
EDAD (DIAS)	7			
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	57500			
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	325.4			
% RESISTENCIA DE PROYECTO	81.4			
TIPO DE FALLA	1			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.				
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ				



INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	30-sep-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	13-CA		
TOMADA DE	CABEZAL DE MARCO No. 1		
DATOS DE PROYECTO			
f 'c (kg/cm ²)	400	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	--		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR CANTERA	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	24612	REVENIMIENTO (cm)	10.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	13-A		
DIAMETRO (cm)	15.0		
ALTURA (cm)	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7		
FECHA DE COLADO	23-sep-17		
FECHA DE RUPTURA	30-sep-17		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	54710		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	309.6		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	77.4		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			

**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZA		FECHA DE INFORME:	30-sep-17
LOCALIZACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y CANTERA CHIHUAHUA, CHIH.			
CLIENTE Y DIRECCIÓN: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.			
CHIHUAHUA, CHIH.			
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.	117		
TOMADA DE	CABEZAL PILA No. 7		
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kg/cm ²)	400	MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMC-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO	
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	27.0		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	32.0		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	NO		
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR HOMERO	CEMENTO	CPC 30-R
REMISIÓN	7605	REVENIMIENTO (cm)	13.0
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒ VIBRADO ☐		
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACIÓN	117-B	117-C	
DIAMETRO (cm)	15.0	15.0	
ALTURA (cm)	30.0	30.0	
ÁREA (cm ²)	176.7	176.7	
FECHA DE COLADO	02-sep-17	02-sep-17	
FECHA DE RUPTURA	30-sep-17	30-sep-17	
EDAD (DIAS)	28	28	
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	78340	81060	
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	443.4	458.7	
% RESISTENCIA DE PROYECTO	110.8	114.7	
TIPO DE FALLA	1	1	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CON LA DE PROYECTO.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO			
AUTORIZO ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ			
