

Control



GRUPO CADUMA CONSULTORES

GCC120109DZ8
GARCIA SALINAS 4311 Las Granjas
Chihuahua Chihuahua Chihuahua
México C.P. 31100
contacto@caduma.com.mx

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 51DA9417-E5B4-4F3C-A22C-22C3E186BFFB

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000516083379

Fecha y hora de emisión: 08/12/2025 09:06:36 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 08/12/2025 09:06:38 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 3918

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /
RFC: MCI651010V22 /
VICTORIA 14 5o piso Zona Centro Chihuahua Chihuahua México C.P.
31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO 81101500 - Ingeniería civil 02 - Sí objeto de impuesto. CONTRATO NO. 029/2025 / ESTIMACION NO. 6 (SEIS) / CONSISTENTE EN: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II / ALCANCE DE LA ESTIMACION: \$147,981.00 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$0.00 SUBTOTAL: \$147,981.00 / I.V.A.: \$23,676.96 / TOTAL: \$171,657.96 /	IVA Traslado 16.00% \$23,676.96 RETENCION C.M.I.C. Retenido 0.20% (\$295.96) RETENCION D.I.F. Retenido 0.20% (\$295.96)	\$147,981.00	\$147,981.00
Subtotal					\$147,981.00
IVA Traslado 16.00%					\$23,676.96
RETENCION C.M.I.C. Retención 0.20%					(\$295.96)
RETENCION D.I.F. Retención 0.20%					(\$295.96)
Total					\$171,066.04

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 04/100 MXN

Sello digital Emisor

JEV/IElBpuD4yFD7MKDLM80LYzVmQ0/UsmLh7Vv9QtZnzi9KrGxqG48Vbgx2uH2qGx+YQ1Su4A8jPbjO2ZvAeMx32u9C
+7ZqA.JvjbuCDozwdxlhJLVZ/6krnPEXjgmCQI5eDwbTTGhKxUfVdxcIQioUfVChyZ8wTzdlfK
+XhquxCWUcnyZGCFIFVfjqEMv5+viBku555hlQmdl21.Jl4rbcw2VSeb
+nvaklU4lx6uW3ht6ldL7hsdXKKMWQ1nVcFtjAwH2k6ai4wNmRxe3RrY7Nk90ULHw4ktgW0SjvmPDIMw2dq5gNfuJ3jhDbBXg4CA
vSmmYOf8GBvNAUpcGFwRw==

Sello digital del SAT

TfAuQk+L99C4Scclbpg2ZVBcdNldkhPqCUY6GL0FGFPpITB2JdA50nrEq7m68YIKC8Uu4/IKMDA12nW1UUKHALwh
+jB35XgsQbmF9BJCoxemU/MxJBcntjAEGjYJly0MuHyX3fnnMiNsNcWnedxj70yrdMmqVPB7dkjbR3UqKINoZjZtscfaPdR4IMEAc
+FRknDu6A0SuzE1BejoSe4AvPlq7VbdWcVxbFqNgaX6PmxwRNyN90ZXYQ/CBDGveB5/
Mn8NaMzNaoeb0wWh4jN7RK1EJeZeQHxzAWdNfrAh4G+K5PGnAYoAaheXudK6lVrgtcnEJDTY2qY0GZoe59I7A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|51DA9417-E5B4-4F3C-A22C-22C3E186BFFB|2025-12-08T09:06:38|DND070112H92|JEV/IElBpuD4yFD7MKDLM80LYzVmQ0/
UsmLh7Vv9QtZnzi9KrGxqG48Vbgx2uH2qGx+YQ1Su4A8jPbjO2ZvAeMx32u9C
+7ZqA.JvjbuCDozwdxlhJLVZ/6krnPEXjgmCQI5eDwbTTGhKxUfVdxcIQioUfVChyZ8wTzdlfK
+XhquxCWUcnyZGCFIFVfjqEMv5+viBku555hlQmdl21.Jl4rbcw2VSeb
+nvaklU4lx6uW3ht6ldL7hsdXKKMWQ1nVcFtjAwH2k6ai4wNmRxe3RrY7Nk90ULHw4ktgW0SjvmPDIMw2dq5gNfuJ3jhDbBXg4CAv
SmmYOf8GBvNAUpcGFwRw==|00001000000713690397|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 08/12/2025 09:06:38
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCC120109DZ8	GRUPO CADUMA CONSULTORES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
51DA9417-E5B4-4F3C-A22C-22C3E186BFFB	2025-12-08T09:06:36	2025-12-08T09:06:38	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171,066.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FAFM	CONTRATO: 029/2025
OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	ESTIMACIÓN: 6 (SEIS)
	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
	ESTADO FINANCIERO CON IVA
REFERENCIA: 28° 36' 9.97" N 106° 6' 13.12" O	IMPORTE CONTRATADO: 590,138.40 ✓
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: 375,124.28 ✓
	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: 171,657.96 ✓
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	IMPORTE ACUMULADO: 546,782.24 ✓
	IMPORTE POR ESTIMAR: 43,356.16 ✓
RFC: GCC-120109-DZ8	

TIPO DE CONCEPTOS	IMPORTES SIN IVA
CONCEPTOS NORMALES:	147,981.00 ✓
CONCEPTOS EXCEDENTES:	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	
REINTEGRO DE LA RETENCIÓN ANTERIOR:	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN:	147,981.00 ✓

OBSERVACIONES:

DESCUENTOS	
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):	-
C.M.I.C. (0.2%):	295.96 ✓
D.I.F. (0.2%):	295.96 ✓
S.I.V.C. (0.5%):	-
SUMA DE LOS DESCUENTOS:	591.92 ✓
RESUMEN	
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN:	147,981.00 ✓
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	
SUBTOTAL:	147,981.00 ✓
I.V.A.:	23,676.96 ✓
SUMA:	171,657.96 ✓
DESCUENTOS:	591.92 ✓
SALDO NETO PARA PAGO:	171,066.04 ✓
TOTAL CON LETRA:	
CIENTO SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. ✓	

ELABORÓ

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISÓ

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Vo Bo

LICENCIADO JAVIER EMILIO CRUZ VALENZUELA

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN URBANA

ARQUITECTA ADRIANA DÍAZ NEGRETE

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

AUTORIZÓ

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

X

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$171,066.04 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.), COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 (SEIS), DEL CONTRATO 029/2025, POR EL TRABAJO DENOMINADO: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II.

1 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN (IMPORTES SIN IVA)

SUMA DE LOS TRABAJOS:	147,981.00 /
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	-
REINTEGRO:	-
ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:	147,981.00 /
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	-
SUBTOTAL:	147,981.00 /
IVA (16%):	23,676.96 /
SUMA:	171,657.96 /
DESCUENTOS:	591.92 /
SALDO NETO PARA PAGO	171,066.04 /

2 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO (LOS IMPORTES NO LLEVAN IVA)

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):	-
C.M.I.C. (0.2%):	295.96 /
D.I.F. (0.2%):	295.96 /
S.I.V.C. (0.5%):	-
SUMA DE DESCUENTOS:	591.92 /

3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO:	590,138.40 /
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:	-
ACUMULADO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN:	375,124.28 /
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN:	171,657.96 /
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	546,782.24 /
IMPORTE POR ESTIMAR:	43,356.16 /

4 RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO (SEGÚN FACTURA):	-
ACUMULADO AMORTIZADO ANTERIOR:	-
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	-
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	-
IMPORTE POR AMORTIZAR:	-

5 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO

	C.M.I.C. (0.2%):	D.I.F. (0.2%):	S.I.V.C. (0.5%):
ACUMULADO ANTERIOR:	646.77 /	646.77 /	-
ESTA ESTIMACIÓN:	295.96 /	295.96 /	-
ACUMULADO ACTUAL:	942.73 /	942.73 /	-

RECIBIMOS

INGENIERO LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
GCC-120109-DZ8

HOJA DE PARTIDAS

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
PARTIDAS		IMPORTE	
NORMALES		147,981.00	
1	CONTROL DE CALIDAD	147,981.00	
		SUBTOTAL: 147,981.00	
		IVA: 23,676.96	
		TOTAL: 171,657.96	


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

HOJA DE CONCEPTOS

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II						
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)								
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025								
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTIMADO	P. U.	IMPORTE

NORMAL								
VOLUMENES								
1	CONTROL DE CALIDAD							
1.1	CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE TERRACERÍAS Y SUB-RASANTE	ENSAYE	50.000000	50.000000	50.000000	-	1,169.00	-
1.2	CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA	ENSAYE	50.000000	50.000000	20.000000	30.000000	1,275.00	38,250.00
1.3	CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA	ENSAYE	28.000000	28.000000	8.000000	20.000000	1,260.00	25,200.00
1.4	DISEÑO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLA	ENSAYE	33.000000	33.000000	15.000000	18.000000	2,691.00	48,438.00
1.5	PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)	ENSAYE	40.000000	40.000000	28.000000	12.000000	2,600.00	31,200.00
1.6	DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN	ENSAYE	401.000000	401.000000	380.000000	21.000000	233.00	4,893.00
1.7	VERIFICACIÓN DE ESPESORES Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS	ENSAYE	127.000000	54.000000	54.000000	-	512.00	-

SUBTOTAL:	147,981.00
IVA:	23,676.96
TOTAL:	171,657.96


INGENIERA SILVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
1. CONTROL DE CALIDAD			
1.2			
CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA			
		FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ENCINO VIRGINIA NORTE, ENSAYE 21	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ENCINO VIRGINIA ESTE, ENSAYE 22	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ENCINO MONTERREY, ENSAYE 23	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ENCINO ARIZONA, ENSAYE 24	
		FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO PASO ROBLES NORTE, ENSAYE 25	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE PUNTA DANA, ENSAYE 26	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO PASO ROBLES OESTE, ENSAYE 27	
		FRACCIONAMIENTO ZERANA	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ZERANA ESTE, ENSAYE 28	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ZERANA NORTE, ENSAYE 29	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ZERANA OESTE, ENSAYE 30	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ZERANA SUR, ENSAYE 31	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLA ZARAUZ, ENSAYE 32	
		FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO GAIA, ENSAYE 33	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE BRONTES, ENSAYE 34	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA AV. FRANCISCO VILLA, ENSAYE 35	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO NEREO, ENSAYE 36	
		MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ORION, ENSAYE 37	
		SUMA DE VOLUMETRÍA: 17.000000	
		COBRADO EN LA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 30.000000	
		TOTAL: 30.000000	
		SUMA DEL VOLUMEN: 30.000000	
		ENSAYE	

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 2 2	
1.2	CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA	SUMA HOJA ANTERIOR	17.000000
FRACCIONAMIENTO PARVATI			
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO PARVATI, ENSAYE 38		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA PASEO DE ANANDA, ENSAYE 39		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE GANESH, ENSAYE 40		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO INDRA, ENSAYE 41		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE VERUNA, ENSAYE 42		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE BHAGA, ENSAYE 43		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE ASURA, ENSAYE 44		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE MENAKA, ENSAYE 45		1.0000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO CERRADA QUINTA CAROLINA			
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CERRADA QUINTA CAROLINA, ENSAYE 46		1.0000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO CERRADA GRUTAS RESIDENCIAL			
MATERIAL BASE HIDRÁULICA SIERRA CALIFORNIANA, ENSAYE 47		1.0000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO CITTANOVA			
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO CITTANOVA SUR, ENSAYE 48		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CIRCUITO CITTANOVA ESTE, ENSAYE 49		1.0000000	ENSAYE
MATERIAL BASE HIDRÁULICA CALLE MARANELLO, ENSAYE 50		1.0000000	ENSAYE
RESUMEN DE VOLUMEN		SUMA DE VOLUMETRÍA:	30.000000
PROYECTO:			50.000000
ACUMULADO ANTERIOR:			20.000000
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:			30.000000
POR EJERCER:			-
EXCEDENTE:			-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:			30.000000


INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

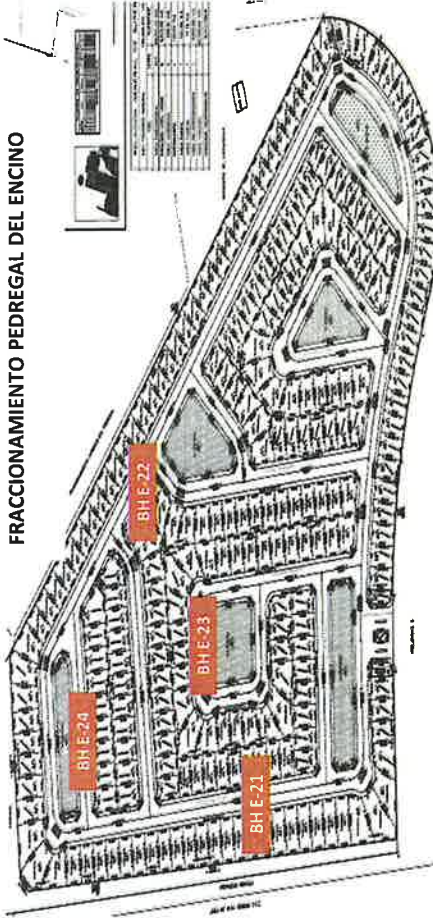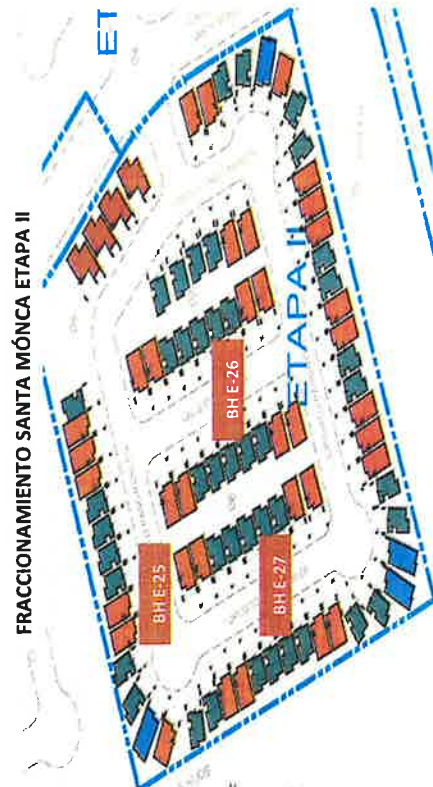CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II UBICACIÓN: CHIHUAHUA	HOJA 1 4
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.			
1. CONTROL DE CALIDAD		CROQUIS / PLANOS	
1.2 CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA	 		
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	50.000000		
ACUMULADO ANTERIOR:	20.000000		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000		



INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025	OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)		
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	UBICACIÓN: CHIHUAHUA	

HOJA 2 | 4

CROQUIS / PLANOS

CONCEPTO


1. CONTROL DE CALIDAD

1.2
CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA

FRACCIONAMIENTO ZERANA



FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION

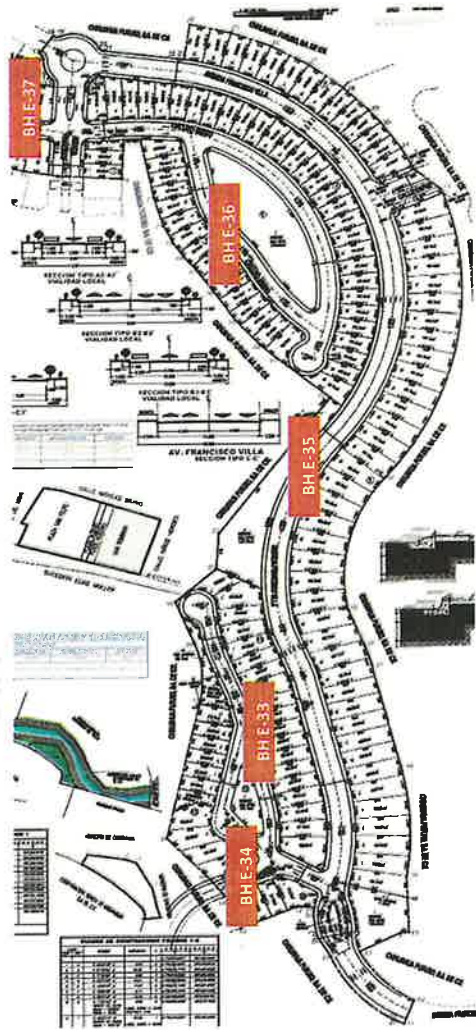

RESUMEN DE VOLUMEN

PROYECTO:	50.000000
ACUMULADO ANTERIOR:	20.000000
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000

INGENIERO JORGE ZEUS-ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025	OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)		
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	UBICACIÓN: CHIHUAHUA	

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS	HOJA 3 4
----------	------------------	------------

1. CONTROL DE CALIDAD		
-----------------------	--	--


1.2	CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA	
-----	--	---

RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	50.000000
ACUMULADO ANTERIOR:	20.000000
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

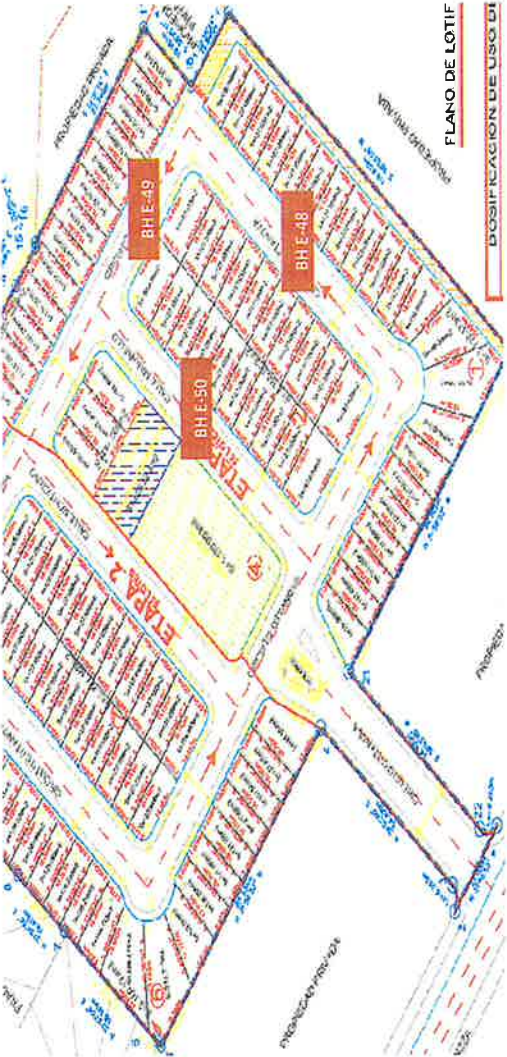CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II													
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)															
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025															
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA													
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS													
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 4 4													
1.2 CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA		FRACCIONAMIENTO CITTANOVA  RESUMEN DE VOLUMEN <table><tr><td>PROYECTO:</td><td>50.000000</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>20.000000</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>30.000000</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>30.000000</td></tr></table>		PROYECTO:	50.000000	ACUMULADO ANTERIOR:	20.000000	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000
PROYECTO:	50.000000														
ACUMULADO ANTERIOR:	20.000000														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000														


INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025	OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)		
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	UBICACIÓN: CHIHUAHUA	

CONCEPTO	HOJA 1 2
----------	------------

1. CONTROL DE CALIDAD

1.2	CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA
-----	--



FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO

MUESTREO DE BASE HIDRÁULICA



FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA

MUESTREO DE BASE HIDRÁULICA



FRACCIONAMIENTO ZERANA

MUESTREO DE BASE HIDRÁULICA



FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION

MUESTREO DE BASE HIDRÁULICA

RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	50.000000
ACUMULADO ANTERIOR:	20.000000
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000


INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 2 2	
1.2 CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA		FRACCIONAMIENTO PARVATI  MUESTREO DE BASE HIDRÁULICA FRACCIONAMIENTO CERRADA QUINTA CAROLINA  MUESTREO DE BASE HIDRÁULICA	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	50.000000		
ACUMULADO ANTERIOR:	20.000000		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	30.000000		



INGENIERO JORGE ZEÚS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 1 2	
1.3	CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA		
		TOTAL	UNIDAD
FRACCIONAMIENTO LAOS			
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. LAOS, ENSAYE 9		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. LAOS, ENSAYE 10		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. NALE, ENSAYE 11		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. NALE, ENSAYE 12		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. TAKAN, ENSAYE 13		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. TAKAN, ENSAYE 14		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO CITTANOVA			
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. CITTANOVA NORTE, ENSAYE 15		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. CITTANOVA NORE, ENSAYE 16		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. MARANELO, ENSAYE 17		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. MARANELO, ENSAYE 18		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO PARVATI			
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA CIRCUITO PARVATI, ENSAYE 19		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA CIRCUITO PARVATI, ENSAYE 20		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. PASEO DE ANANDA, ENSAYE 21		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. PASEO DE ANANDA, ENSAYE 22		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA CIRCUITO INDRA, ENSAYE 23		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA CIRCUITO INDRA, ENSAYE 24		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. BHAGA, ENSAYE 25		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. BHAGA, ENSAYE 26		1.000000	ENSAYE
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		18.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		20.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:			
POR EJERCER:			
EXCEDENTE:			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		20.000000	ENSAYE

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADOR DE ESTIMACIÓN


CONTRATO No. 029/2025					
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)					
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025					
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.					
UBICACIÓN: CHIHUAHUA					
OBRAS: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II					
HOJA 2 2					
OPERACIONES ARITMÉTICAS					
1. CONTROL DE CALIDAD					
CONCEPTO					
FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL					
SUMA HOJA ANTERIOR					
18.000000					
CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA					
MUESTRA DE GRAVA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. SIERRA CALIFORNIANA, ENSAYE 27					
1.000000					
ENSAYE					
MUESTRA DE ARENA PARA MEZCLA ASFÁLTICA C. SIERRA CALIFORNIANA, ENSAYE 28					
1.000000					
ENSAYE					
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:					
28.000000					
ACUMULADO ANTERIOR:					
8.000000					
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:					
20.000000					
POR EJERCER:					
-					
EXCEDENTE:					
-					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:					
20.000000					
SUMA DE VOLUMETRÍA:					
20.000000					

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

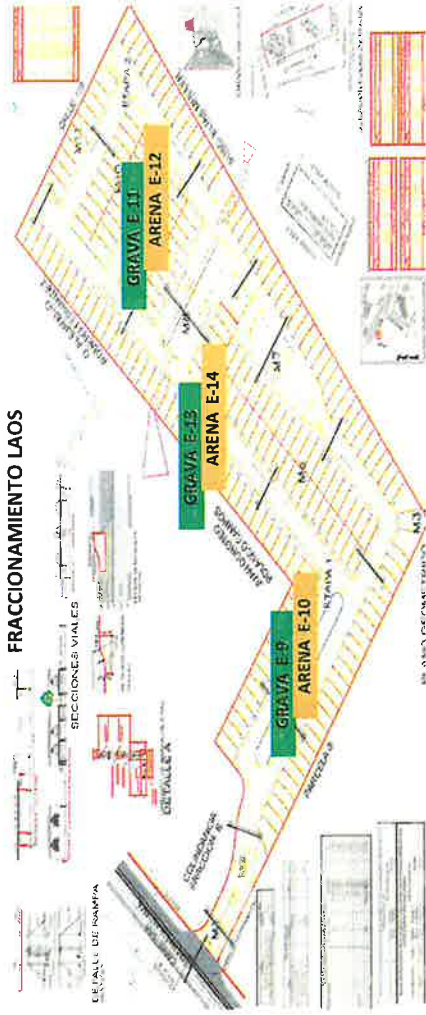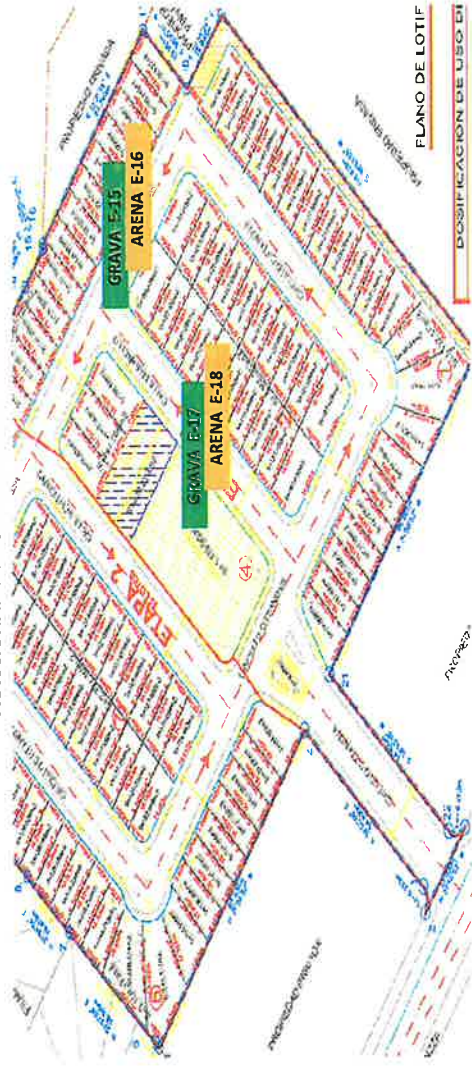CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II													
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)															
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025															
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA													
		HOJA 1 2													
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS													
1. CONTROL DE CALIDAD															
1.3	CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA	FRACCIONAMIENTO LAOS  FRACCIONAMIENTO CITTANOVA  FLANO DE LOTIF DISTRIBUCIÓN DE USOS DE TIERRA													
		RESUMEN DE VOLUMEN <table><tr><td>PROYECTO:</td><td>28.000000</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>8.000000</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>20.000000</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>20.000000</td></tr></table>		PROYECTO:	28.000000	ACUMULADO ANTERIOR:	8.000000	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000
PROYECTO:	28.000000														
ACUMULADO ANTERIOR:	8.000000														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000														





INGENIERO JORGE ZEUS-ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

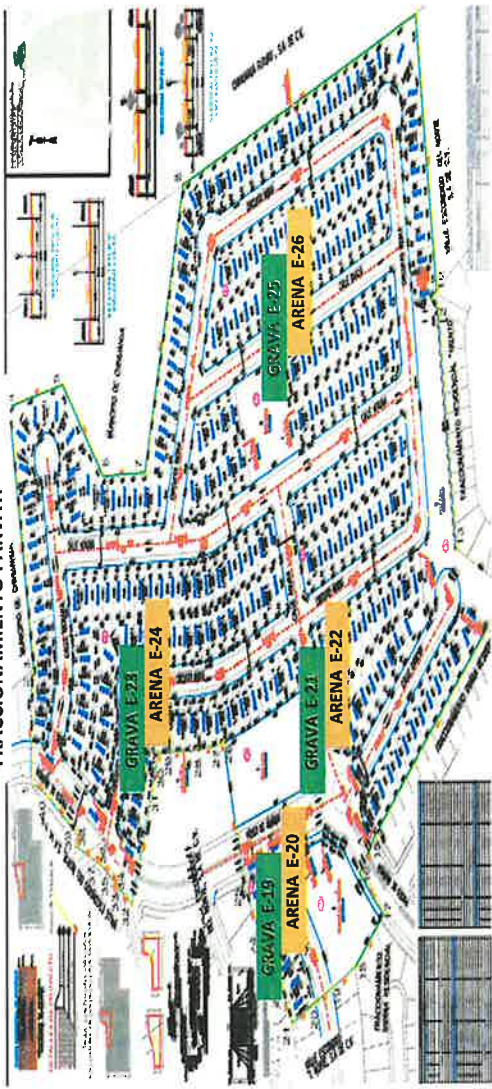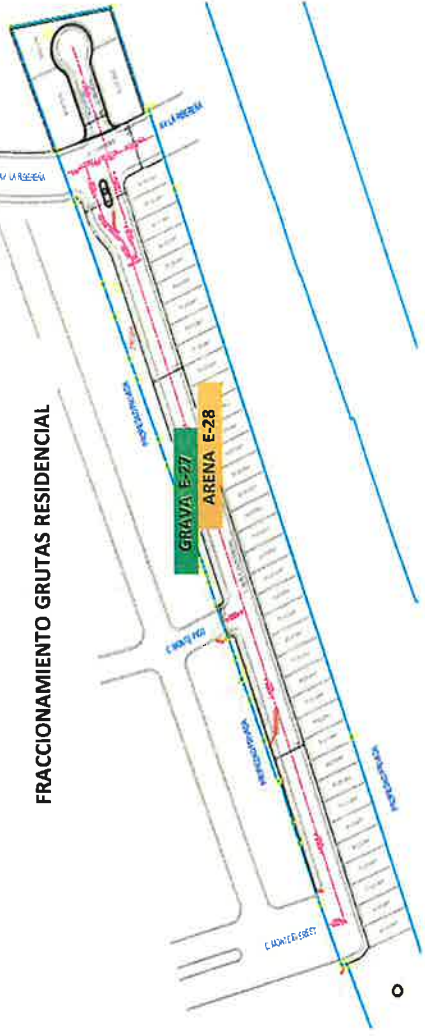CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 2 2	
1.3	CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA	FRACCIONAMIENTO PARVATI  FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL 	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		28.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		8.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		20.000000	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		20.000000	



INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN


CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 1 2	
1.3 CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA		FRACCIONAMIENTO LAOS  MUESTREO DE AGREGADOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA FRACCIONAMIENTO CITTANOVA  MUESTREO DE AGREGADOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	28.000000		
ACUMULADO ANTERIOR:	8.000000		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000		


INGENIERO JORGE ZEUS-ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN


CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II															
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)																	
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025																	
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA															
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA															
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 2 2															
1.3 CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA		FRACCIONAMIENTO PARVATI  MUESTREO DE AGREGADOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL  MUESTREO DE AGREGADOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA															
<table><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>28.000000</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>8.000000</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>20.000000</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>20.000000</td></tr></table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	28.000000	ACUMULADO ANTERIOR:	8.000000	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000		
RESUMEN DE VOLUMEN																	
PROYECTO:	28.000000																
ACUMULADO ANTERIOR:	8.000000																
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000																
POR EJERCER:	-																
EXCEDENTE:	-																
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.000000																


INGENIERO JORGE ZEÚS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
1. CONTROL DE CALIDAD			
CONCEPTO			
1.4	DISEÑO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLA	TOTAL	UNIDAD
FRACCIONAMIENTO LAOS			
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. LAOS, ENSAYE 16		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. BOKEO, ENSAYE 17		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. NALE, ENSAYE 18		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. BALEC, ENSAYE 19		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. TAKAN, ENSAYE 20		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO CITTANOVA			
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. CITTANOVA SUR, ENSAYE 21		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. CITTANOVA ESTE, ENSAYE 22		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. CITTANOVA NORTE, ENSAYE 23		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. MARANELLO, ENSAYE 19		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO PARVATI			
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA CIRCUITO PARVATI, ENSAYE 25		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. PASEO DE ANANDA, ENSAYE 26		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. GANESH, ENSAYE 27		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA CIRCUITO INDRA, ENSAYE 28		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. VERUNA, ENSAYE 29		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. BHAGA, ENSAYE 30		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. ASURA, ENSAYE 31		1.000000	ENSAYE
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. MENAKA, ENSAYE 32		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL			
MUESTRA DE MEZCLA ASFÁLTICA C. SIERRA CALIFORNIANA, ENSAYE 33		1.000000	ENSAYE
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	33.000000	SUMA DE VOLUMETRÍA:	
ACUMULADO ANTERIOR:	15.000000	COBRADO EN LA ESTIMACIÓN ANTERIOR:	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000	TOTAL:	18.000000
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000	SUMA DEL VOLUMEN:	18.000000
			ENSAYE




INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

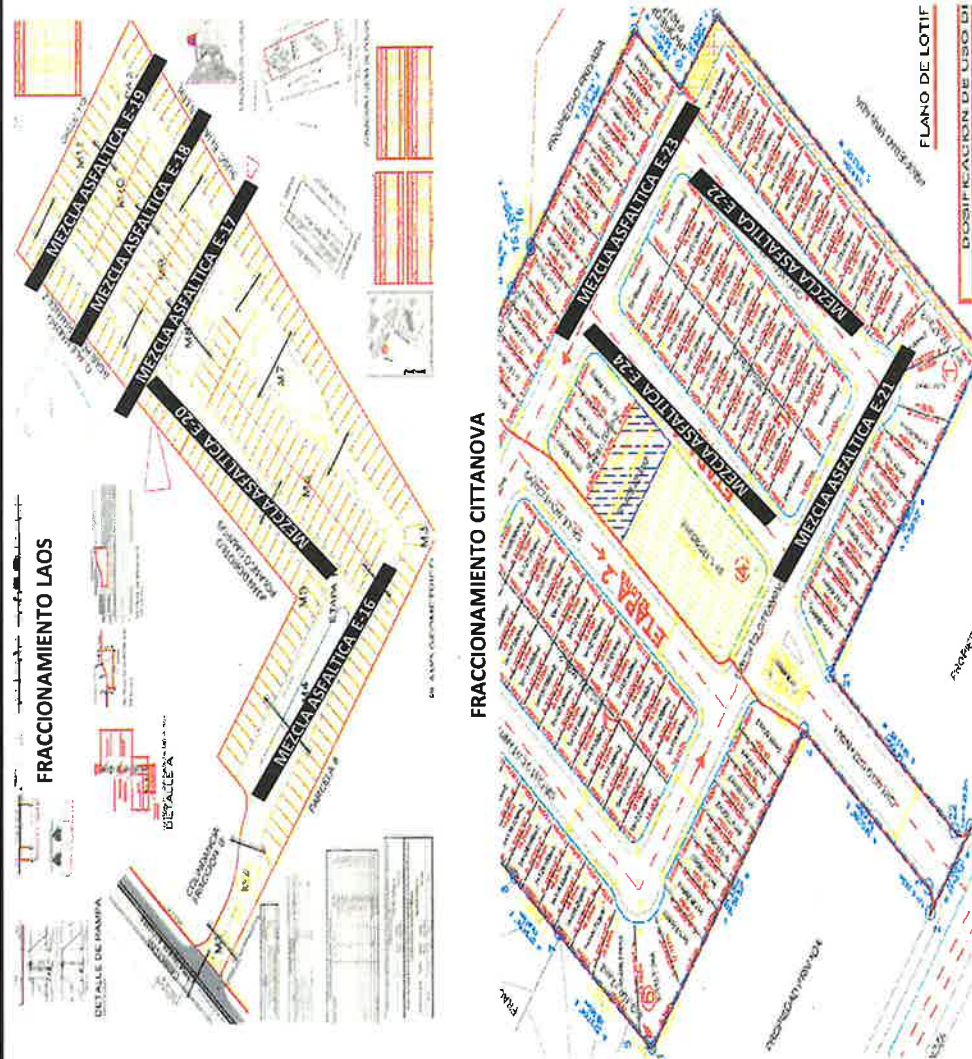CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II															
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)																	
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025																	
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA															
		CROQUIS / PLANOS															
		HOJA 1 2															
1. CONTROL DE CALIDAD		CONCEPTO															
1.4		DISEÑO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLA															
																	
		<table><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>33.000000</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>15.000000</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>18.000000</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>18.000000</td></tr></table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	33.000000	ACUMULADO ANTERIOR:	15.000000	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000
RESUMEN DE VOLUMEN																	
PROYECTO:	33.000000																
ACUMULADO ANTERIOR:	15.000000																
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000																
POR EJERCER:	-																
EXCEDENTE:	-																
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000																

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025	OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)		
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	UBICACIÓN: CHIHUAHUA	

CONCEPTO	GROQUIS / PLANOS	HOJA 2 2
----------	------------------	------------

1. CONTROL DE CALIDAD		
-----------------------	--	--

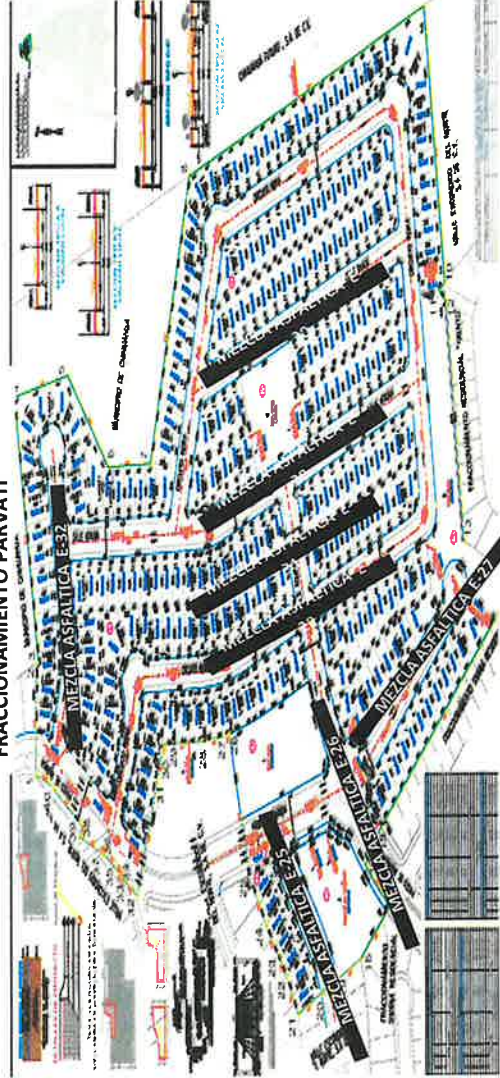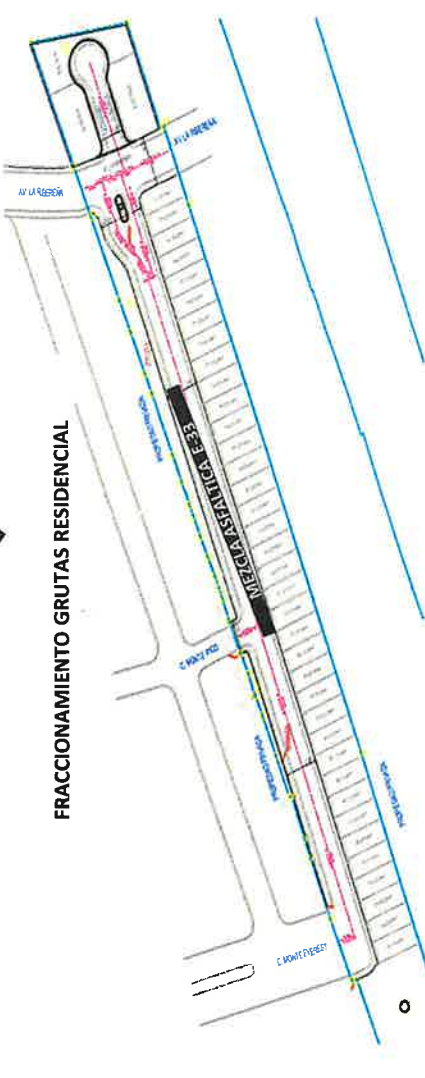1.4	DISEÑO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLA	FRACCIONAMIENTO PARVATI  FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL 
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:	33.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:	15.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000	
POR EJERCER:	-	
EXCEDENTE:	-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.000000	

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA-QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
1. CONTROL DE CALIDAD			
1.4 DISEÑO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLA			
		FRACCIONAMIENTO CITTANOVA	
		MUESTRA DE CARPETA ASFÁLTICA	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		33.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		15.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.000000	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.000000	

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
1. CONTROL DE CALIDAD			
1.4	DISEÑO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLA	FRACCIONAMIENTO PARVATI PRUEBAS DE LABORATORIO EN MEZCLA ASFÁLTICA	FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL MUESTREO DE CARPETA ASFÁLTICA
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:		33.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		15.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.000000	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.000000	

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 1 2	
1.5	PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES	TOTAL	UNIDAD
FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO			
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO ENCINO MONTERREY ALREDEDOR DE MANZANA 5, ENSAYE 29		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA			
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO PASO ROBLES OESTE, ENSAYE 30		1.000000	ENSAYE
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO PASO ROBLES ESTE, ENSAYE 31		1.000000	ENSAYE
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CALLE PUNTA DANA, ENSAYE 32		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO ZERANA			
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO ZERANA ESTE, ENSAYE 33		1.000000	ENSAYE
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO ZERANA NTE, ENSAYE 34		1.000000	ENSAYE
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO ZERANA ESTE, ENSAYE 35		1.000000	ENSAYE
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO ZERANA ESTE, ENSAYE 36		1.000000	ENSAYE
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CALLE ZARAUZ, ENSAYE 37		1.000000	ENSAYE
FRACCIONAMIENTO PARVATI			
MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CIRCUITO PARVATI, ENSAYE 38		1.000000	ENSAYE
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		40.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		28.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		12.000000	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		12.000000	
SUMA DE VOLUMETRÍA:		10.000000	
COBRADO EN LA ESTIMACIÓN ANTERIOR:		12.000000	
TOTAL:		12.000000	
SUMA DEL VOLUMEN:		12.000000	ENSAYE

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
1. CONTROL DE CALIDAD			
1.5	PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)	SUMA HOJA ANTERIOR	10.000000
		<u>FRACCIONAMIENTO CERRADA QUINTA CAROLINA</u>	
		MUESTRA EMULSIÓN PARA IMPREGNACION CERRADA QUINTA CAROLINA, ENSAYE 39	1.000000
		ENSAYE	
		<u>FRACCIONAMIENTO ZERANA</u>	
		MUESTRA EMULSIÓN PARA LIGA C. SIERRA CALIFORNIANA, ENSAYE 40	1.000000
		ENSAYE	
		SUMA DE VOLUMETRÍA:	12.000000
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	40.000000		
ACUMULADO ANTERIOR:	28.000000		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000		

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTIZ



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025	OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)		
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	UBICACIÓN: CHIHUAHUA	

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS	HOJA 1 3
----------	------------------	------------


1. CONTROL DE CALIDAD		
-----------------------	--	--

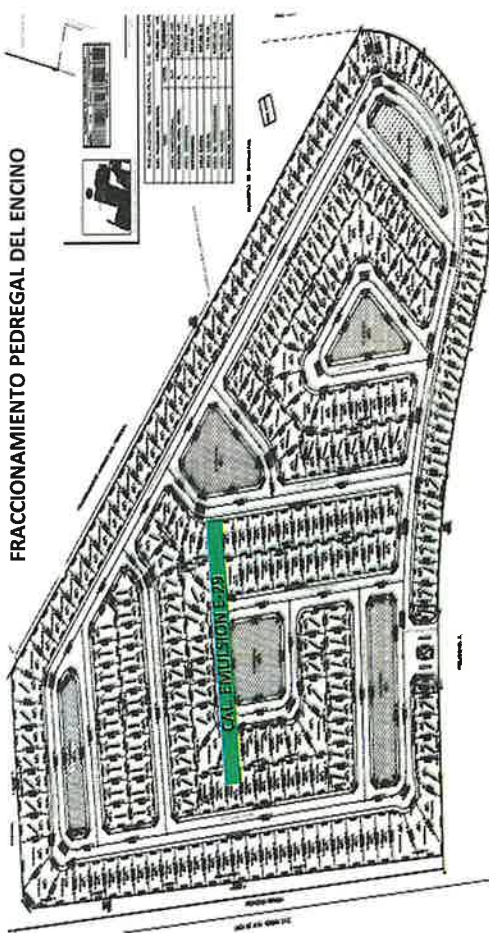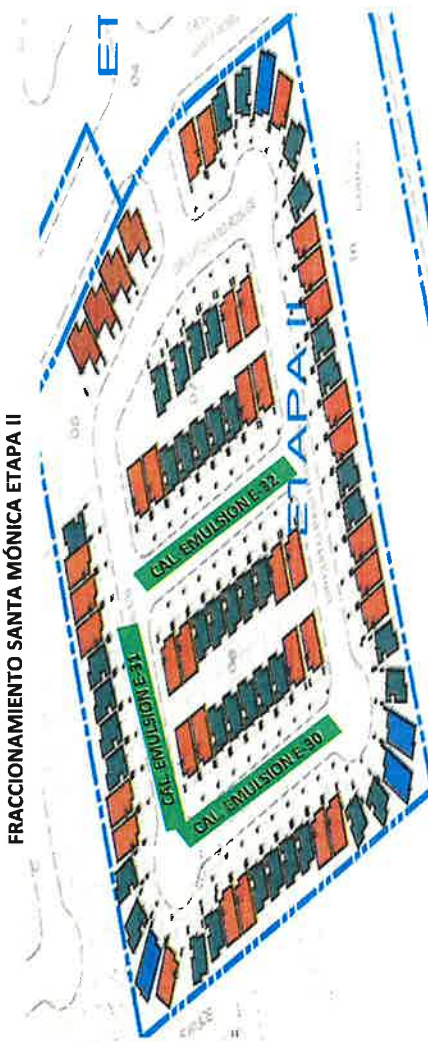1.5	PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)	FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO  FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA ETAPA II 														
		<table><thead><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROYECTO:</td><td>40.000000</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>28.000000</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>12.000000</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>12.000000</td></tr></tbody></table>	RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	40.000000	ACUMULADO ANTERIOR:	28.000000	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000
RESUMEN DE VOLUMEN																
PROYECTO:	40.000000															
ACUMULADO ANTERIOR:	28.000000															
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000															
POR EJERCER:	-															
EXCEDENTE:	-															
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000															

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

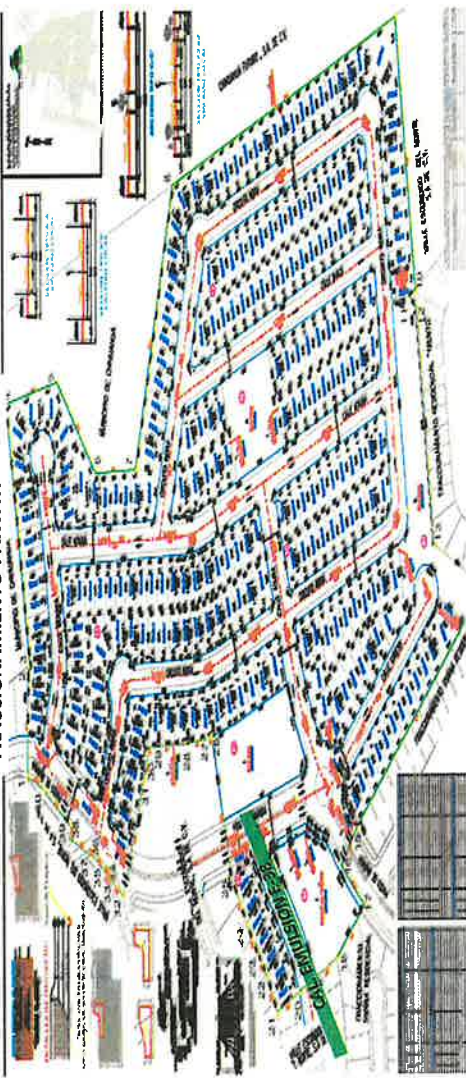CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 2 3	
1.5	PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)	FRACCIONAMIENTO ZERANA  FRACCIONAMIENTO PARVATI 	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		40.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		28.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		12.000000	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		12.000000	



INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE




INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025	OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)		
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	UBICACIÓN: CHIHUAHUA	

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS	HOJA 3 3
----------	------------------	------------

1. CONTROL DE CALIDAD		
-----------------------	--	--

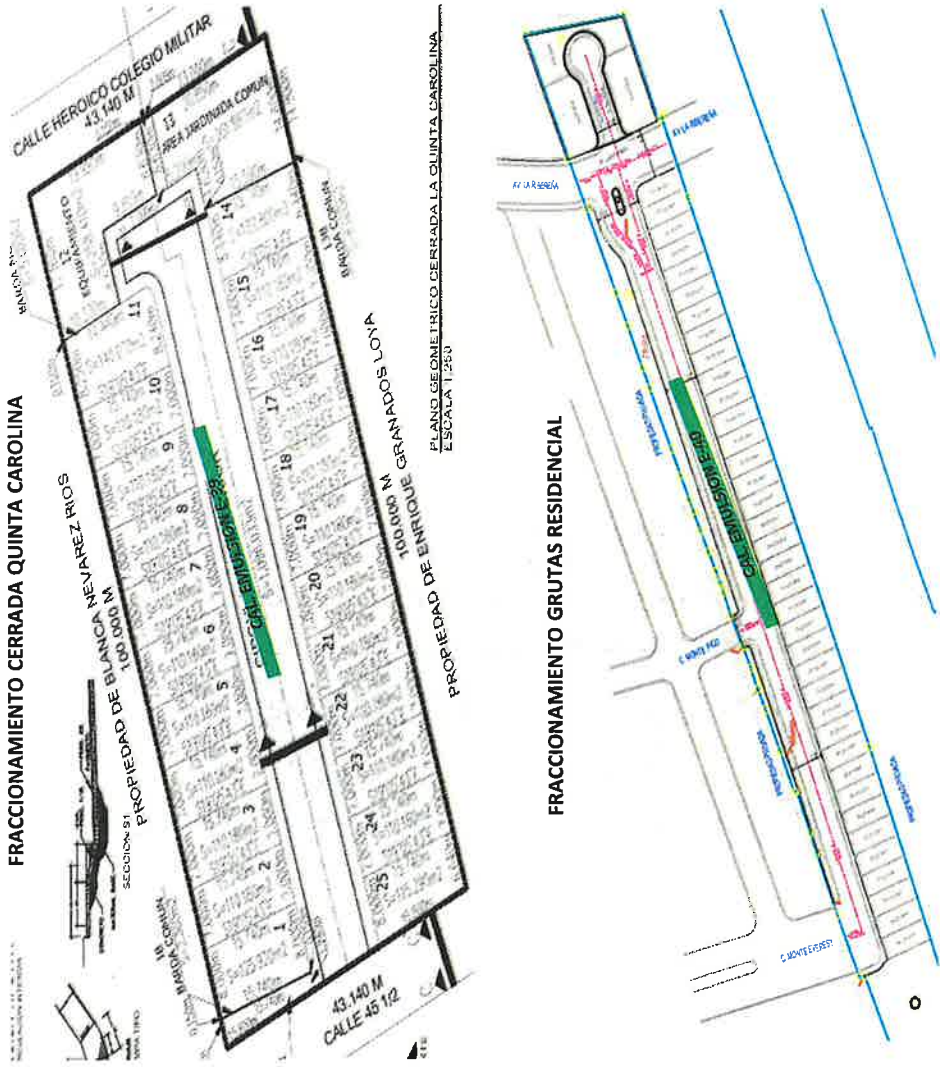1.5	PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)	
-----	--	---

RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	40.000000
ACUMULADO ANTERIOR:	28.000000
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000


INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 1 3	
1.5 PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)		FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO  MUESTRA EMULSION ASFÁLTICA FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA  MUESTRA EMULSION ASFÁLTICA	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	40.000000		
ACUMULADO ANTERIOR:	28.000000		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000		




INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II													
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)															
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025															
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA													
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA													
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 2 3													
1.5 PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)		FRACCIONAMIENTO ZERANA  MUESTRA EMULSION ASFÁLTICA FRACCIONAMIENTO PARVATI  MUESTRA EMULSION ASFÁLTICA													
RESUMEN DE VOLUMEN <table><tr><td>PROYECTO:</td><td>40.000000</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>28.000000</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>12.000000</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>12.000000</td></tr></table>		PROYECTO:	40.000000	ACUMULADO ANTERIOR:	28.000000	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000		
PROYECTO:	40.000000														
ACUMULADO ANTERIOR:	28.000000														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.000000														


INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 3 3	
1.5			
PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)		FRACCIONAMIENTO CERRADA QUINTA CAROLINA	
			
		MUESTRA EMULSION ASFÁLTICA	
		FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL	
			
		PRUEBAS DE LABORATORIO A LA EMULSION ASFÁLTICA	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		40.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		28.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		12.000000	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		12.000000	


INGENIERO JORGE ZEÚS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II													
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)															
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025															
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA													
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS													
1. CONTROL DE CALIDAD															
1.6	DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN	FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ENCINO VIRGINIA FRENTE A MANZANA 1 (LOTES 1 AL 32), ENSAYE 381 A 385 COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ENCINO VIRGINIA FRENTE A MANZANA 1 (LOTES 40 AL 75), ENSAYE 386 A 390 COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CIRCUITO ENCINO MONTERREY (ALREDEDOR DE MANZANA 5), ENSAYE 391 A 394 FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CIRCUITO PASO ROBLES (0+040 AL 0+150), ENSAYE 395 A 397 FRACCIONAMIENTO ZERANA COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL 0+000 AL 0+227, ENSAYES 398 AL 401	<table><thead><tr><th>TOTAL</th><th>UNIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>ENSAYE</td></tr><tr><td>5</td><td>ENSAYE</td></tr><tr><td>4</td><td>ENSAYE</td></tr><tr><td>3</td><td>ENSAYE</td></tr><tr><td>4</td><td>ENSAYE</td></tr></tbody></table>	TOTAL	UNIDAD	5	ENSAYE	5	ENSAYE	4	ENSAYE	3	ENSAYE	4	ENSAYE
TOTAL	UNIDAD														
5	ENSAYE														
5	ENSAYE														
4	ENSAYE														
3	ENSAYE														
4	ENSAYE														
RESUMEN DE VOLUMEN		SUMA DE VOLUMETRÍA: 21.000000													
PROYECTO:	401.000000	COBRADO EN LA ESTIMACIÓN ANTERIOR:													
ACUMULADO ANTERIOR:	380.000000	TOTAL: 21.000000													
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000	SUMA DEL VOLUMEN: 21.000000													
		ENSAYE													

INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025	OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)	
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	

UBICACIÓN: CHIHUAHUA

HOJA 1 | 2


CROQUIS / PLANOS

CONCEPTO


1. CONTROL DE CALIDAD

1.6

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN

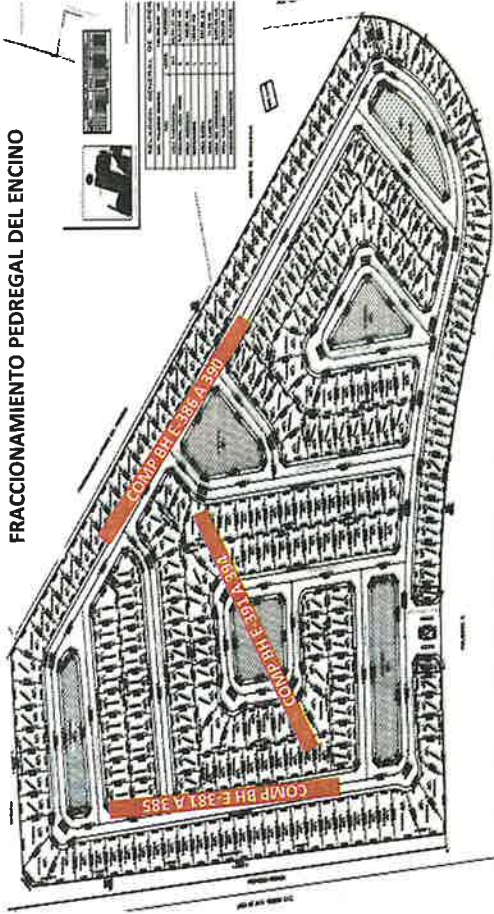

FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA ETAPA II

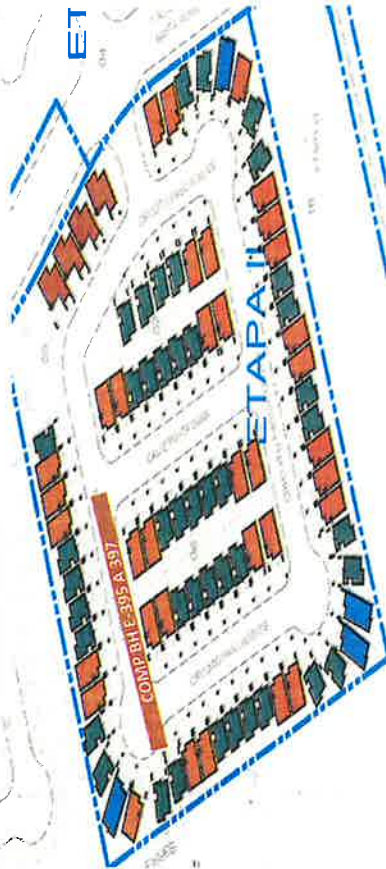

RESUMEN DE VOLUMEN

PROYECTO:	401.000000
ACUMULADO ANTERIOR:	380.000000
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000

INGENIERO JORGE ZEÚS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	HOJA 2 2
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.			
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
1. CONTROL DE CALIDAD			
1.6	DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN	FRACCIONAMIENTO ZERANA 	
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:		401.000000	
ACUMULADO ANTERIOR:		380.000000	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		21.000000	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		21.000000	




INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUIÑONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN


CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)			
PERÍODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 1 2	
1.6 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN		FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO	
			
		DETERMINACIÓN DEL % DE COMPACTACIÓN	
		FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA	
			
		DETERMINACIÓN DEL % DE COMPACTACIÓN	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	401.000000		
ACUMULADO ANTERIOR:	380.000000		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000		


INGENIERO JORGE ZEUS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE



INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 029/2025		OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II													
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)															
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025															
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.		UBICACIÓN: CHIHUAHUA													
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA													
1. CONTROL DE CALIDAD		HOJA 2 2													
1.6 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN		FRACCIONAMIENTO ZERANA DETERMINACIÓN DEL % DE COMPACTACIÓN 													
RESUMEN DE VOLUMEN <table><tr><td>PROYECTO:</td><td>401.000000</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>380.000000</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>21.000000</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>21.000000</td></tr></table>				PROYECTO:	401.000000	ACUMULADO ANTERIOR:	380.000000	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000
PROYECTO:	401.000000														
ACUMULADO ANTERIOR:	380.000000														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.000000														


INGENIERO JORGE ZEÚS ORTEGA Y ORTEGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERA SYLVIA GABRIELA QUINONES ZAPATA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

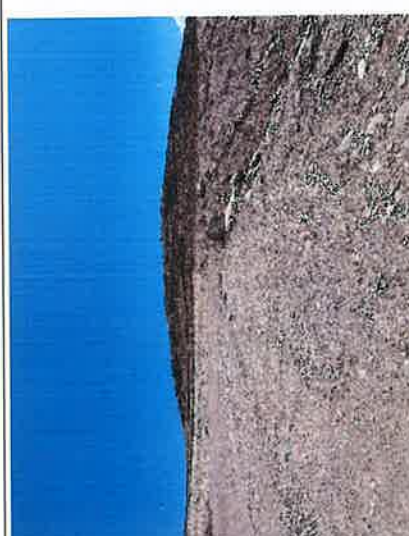

1.2- INFORMES DE CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO

ENSAYE No. 21

CONTRATISTA : GRUPO VALLES

CIUDAD : CHIHUAHUA
ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-23
FECHA DE INFORME : 2025-oct-26

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA


MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CIRCUITO ENCINO VIRGINIA (FRENTE MZA 1, LOTE 17)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : GCC MATERIALES NOMBRE DE DIOS

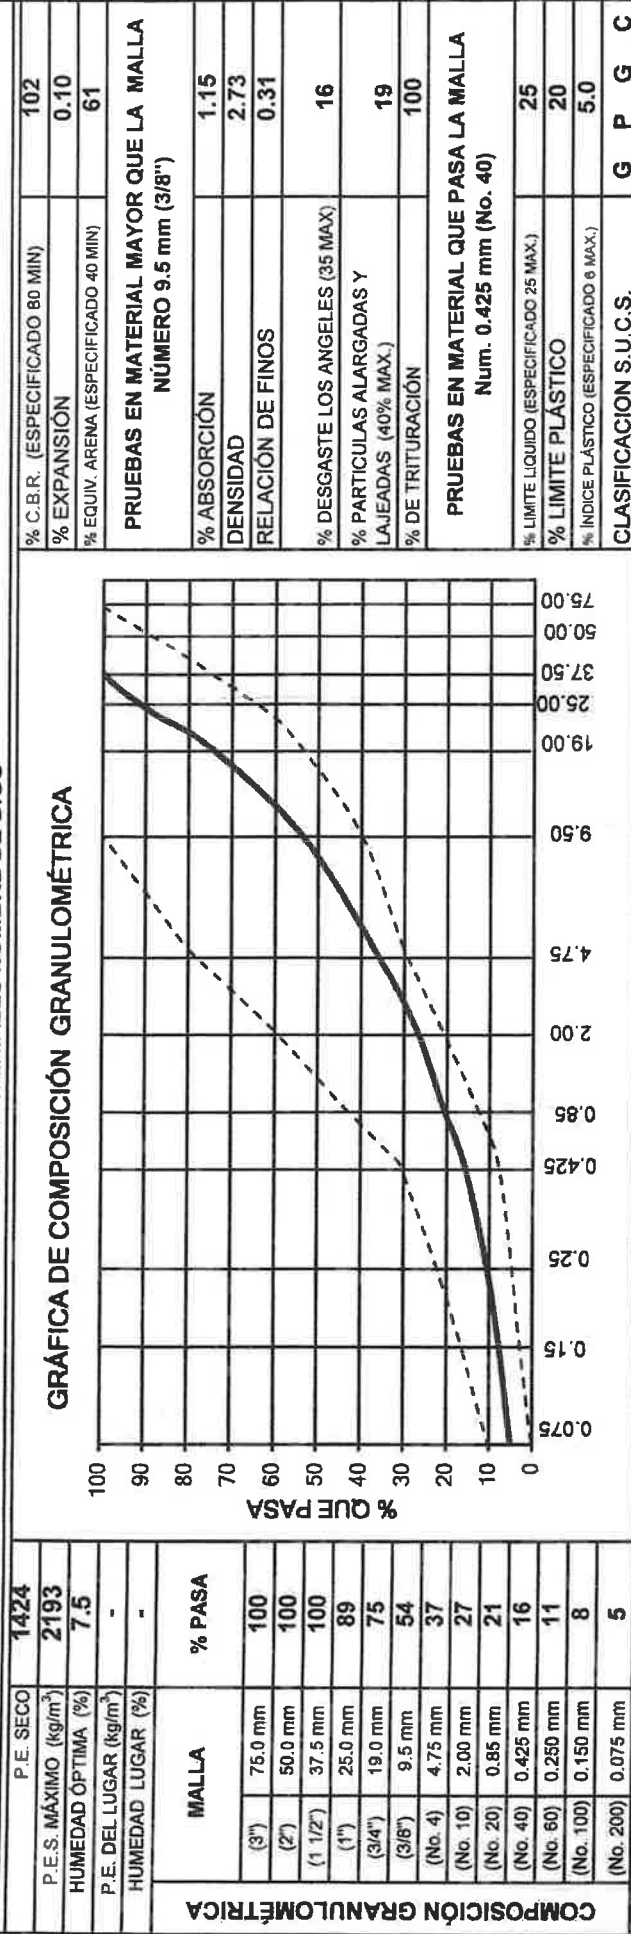

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CBH-09

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO

ENSAYE No. 22

CONTRATISTA : GRUPO VALLES

CIUDAD : CHIHUAHUA
ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-23
FECHA DE INFORME : 2025-oct-26

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CIRCUITO ENCINO VIRGINIA (FRENTE MZA 1, LOTE 57)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : GCC MATERIALES NOMBRE DE DIOS

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO	1398
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		2168	
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		7.8	
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		-	
HUMEDAD LUGAR (%)		-	
MALLA		% PASA	
(3")	75.0 mm	100	
(2")	50.0 mm	100	
(1 1/2")	37.5 mm	100	
(1")	25.0 mm	93	
(3/4")	19.0 mm	71	
(3/8")	9.5 mm	50	
(No. 4)	4.75 mm	34	
(No. 10)	2.00 mm	25	
(No. 20)	0.85 mm	17	
(No. 40)	0.425 mm	13	
(No. 60)	0.250 mm	9	
(No. 100)	0.150 mm	6	
(No. 200)	0.075 mm	3	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

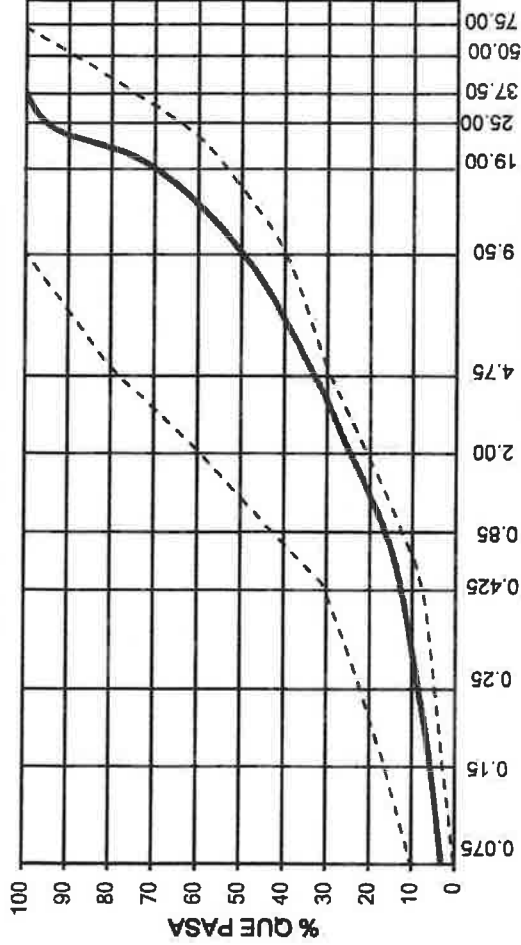

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	103
% EXPANSIÓN	0.10
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	63

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	1.21
DENSIDAD	2.75
RELACIÓN DE FINOS	0.23
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	17
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	19
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO

ENSAYE No. 23

CONTRATISTA : GRUPO VALLES

CIUDAD : CHIHUAHUA
ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-23
FECHA DE INFORME : 2025-oct-26

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA


MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CIRCUITO ENCINO MONTERREY (FRENTE A MANZANA 4, LOTE 51)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : GCC MATERIALES NOMBRE DE DIOS

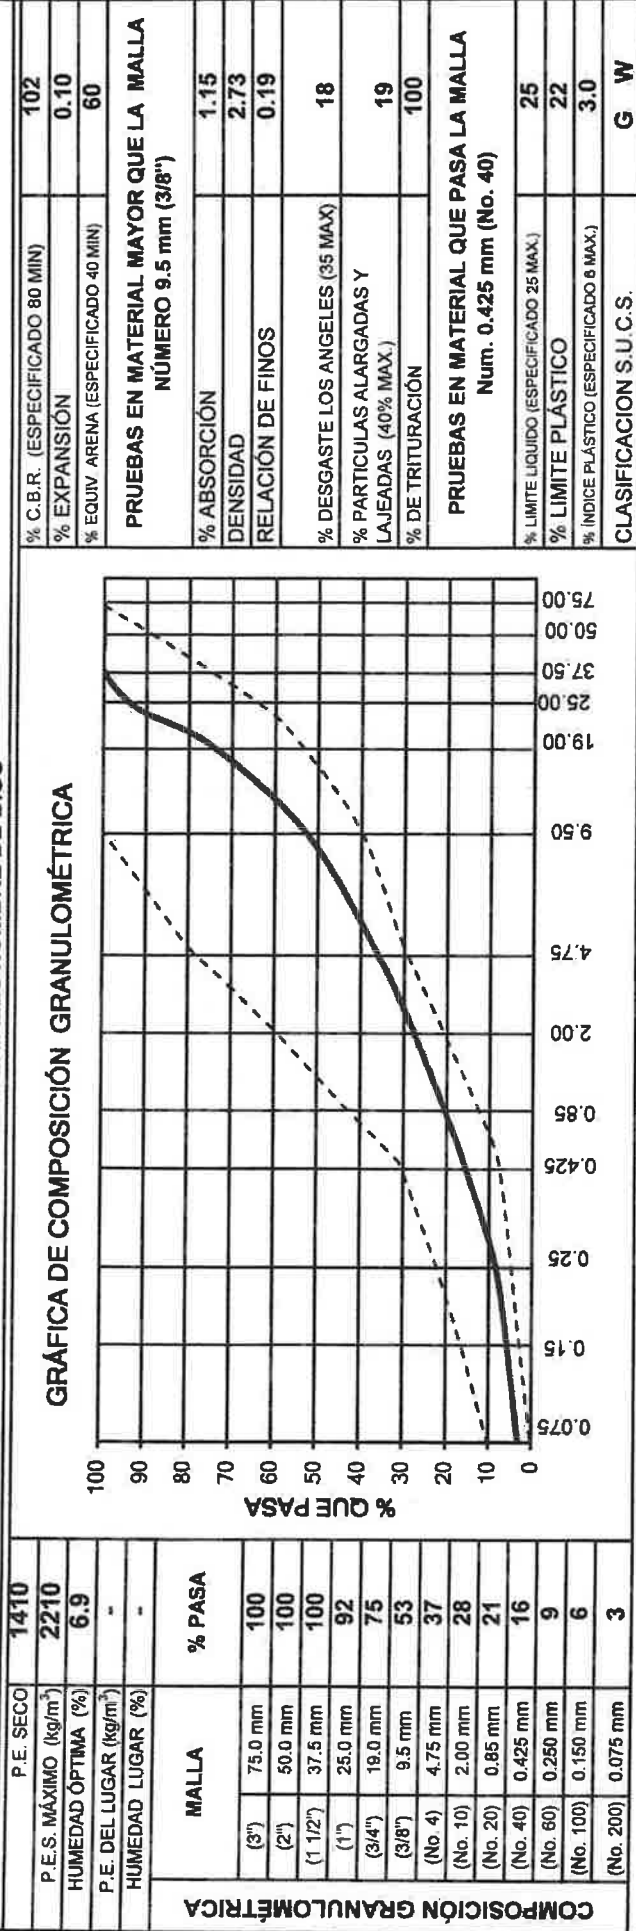

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO

ENSAYE No. 24

CONTRATISTA : GRUPO VALLES

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-23

FECHA DE INFORME : 2025-oct-26

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CIRCUITO ENCINO ARIZONA (FRENTE MZA 3, LOTE 5)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : GCC MATERIALES NOMBRE DE DIOS

P.E. SECO 1422

P.E. MÁXIMO (kg/m³) 2190

HUMEDAD ÓPTIMA (%) 7.2


P.E. DEL LUGAR (kg/m³) -

HUMEDAD LUGAR (%) -

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

MALLA	% PASA
(3") 75.0 mm	100
(2") 50.0 mm	100
(1 1/2") 37.5 mm	100
(1") 25.0 mm	88
(3/4") 19.0 mm	74
(3/8") 9.5 mm	57
(No. 4) 4.75 mm	38
(No. 10) 2.00 mm	29
(No. 20) 0.85 mm	21
(No. 40) 0.425 mm	16
(No. 60) 0.250 mm	9
(No. 100) 0.150 mm	6
(No. 200) 0.075 mm	3

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

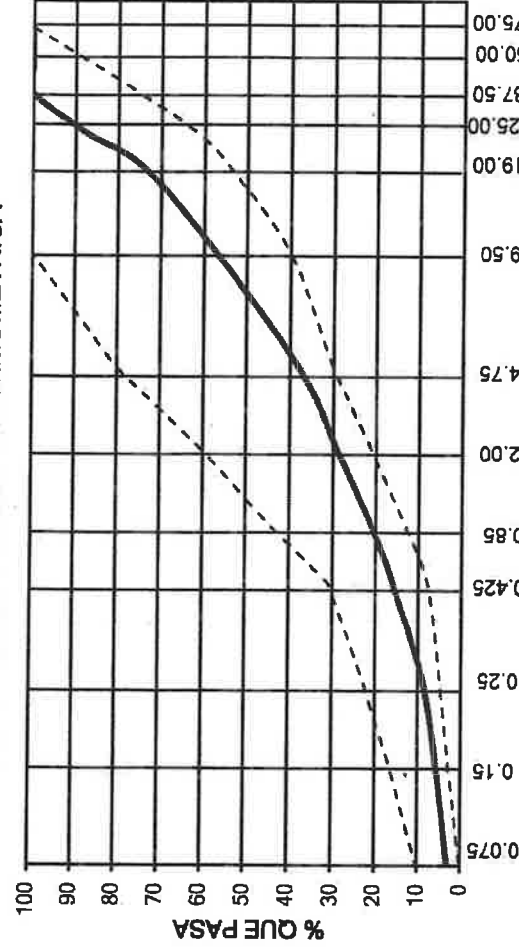

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.10
% EQUIV ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	57

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	1.24
DENSIDAD	2.71
RELACIÓN DE FINOS	0.19
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	18
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX)	20
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJAS O SUGERENCIAS ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA

ENSAYE No. 25

CONTRATISTA : DESARROLLOS COBOSA

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-23

ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-oct-26

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA


MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y RIOLITA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO PASO ROBLES NORTE km 0+075

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

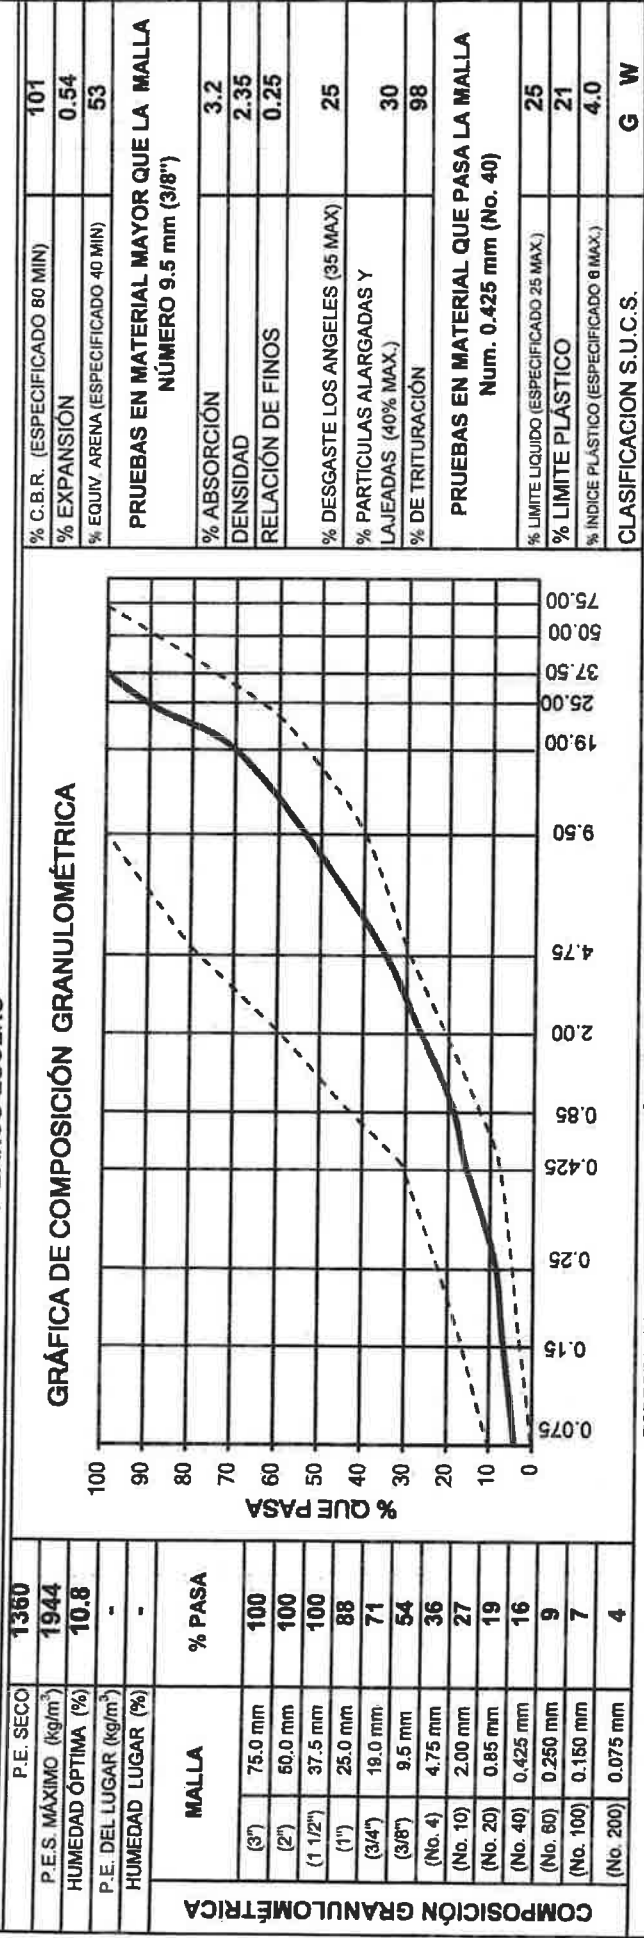

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARBIEROS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA

CONTRATISTA : DESARROLLOS COBOSA

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

ENSAYE No. 26

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-23

FECHA DE INFORME : 2025-oct-26

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y RÍOLITA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE PUNTA DANA km 0+020

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E. MÁXIMO (kg/m ³)		1358
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1930
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		11.3
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA		% PASA
(3")	75.0 mm	100
(2")	50.0 mm	100
(1 1/2")	37.5 mm	100
(1")	25.0 mm	90
(3/4")	19.0 mm	77
(3/8")	9.5 mm	53
(No. 4)	4.75 mm	36
(No. 10)	2.00 mm	25
(No. 20)	0.85 mm	18
(No. 40)	0.425 mm	14
(No. 60)	0.250 mm	9
(No. 100)	0.150 mm	6
(No. 200)	0.075 mm	4

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

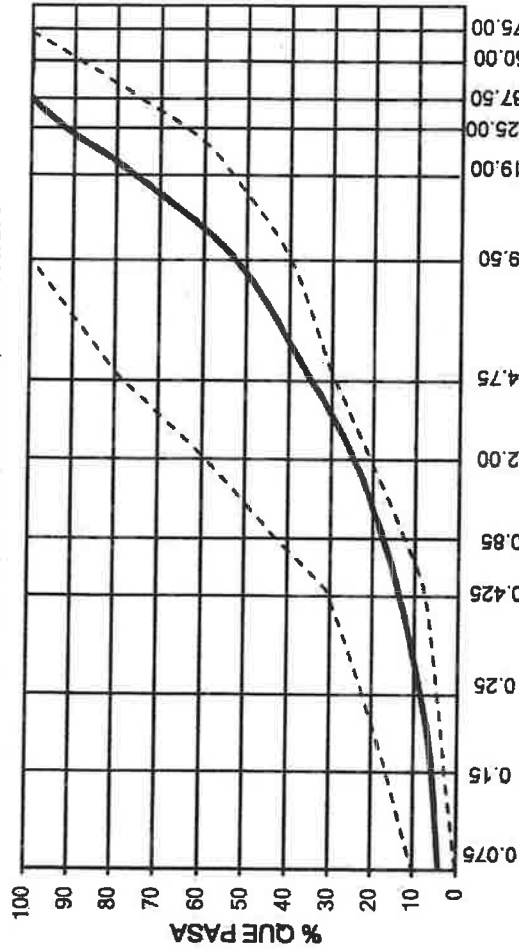

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.54
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	55

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	3.6
DENSIDAD	2.34
RELACIÓN DE FINOS	0.29
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	28
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX)	30
% DE TRITURACIÓN	98

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% ÍNDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S.	G P
------------------------	-----

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA

ENSAYE No. 27

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-23

FECHA DE INFORME : 2025-oct-26

CONTRATISTA : DESARROLLOS COBOSA

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y RIOLITA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO PASO ROBLES OESTE km 0+010

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1366
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1953
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		10.5
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA	% PASA	
(3") 75.0 mm	100	
(2") 50.0 mm	100	
(1 1/2") 37.5 mm	100	
(1") 25.0 mm	90	
(3/4") 19.0 mm	73	
(3/8") 9.5 mm	55	
(No. 4) 4.75 mm	35	
(No. 10) 2.00 mm	26	
(No. 20) 0.85 mm	20	
(No. 40) 0.425 mm	15	
(No. 80) 0.250 mm	10	
(No. 100) 0.150 mm	6	
(No. 200) 0.075 mm	4	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

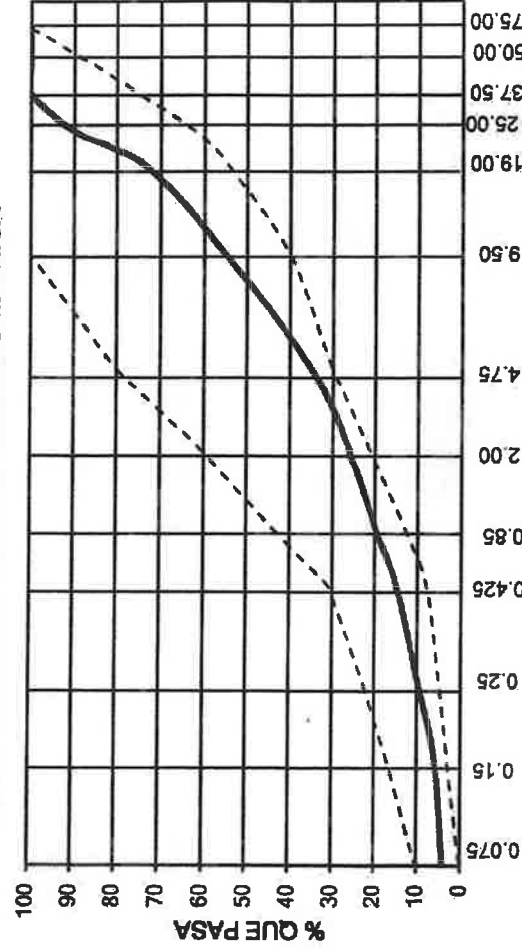

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	100
% EXPANSIÓN	0.54
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	51
PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA NÚMERO 9.5 mm (3/8")	
% ABSORCIÓN	3.3
DENSIDAD	2.37
RELACIÓN DE FINOS	0.27
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	28
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	30
% DE TRITURACIÓN	98
PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA Num. 0.425 mm (No. 40)	
% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	5.0
CLASIFICACION S.U.C.S.	G P

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO ZERANA

ENSAYE No. 28

CONTRATISTA : MUTO REALITAS

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-27

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-oct-30

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO ZERANA ESTE (FRENTE A MANZANA 1, LOTE 22)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO ORTEGA

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E. MÁXIMO (kg/m ³)		1381
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1840
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		9.3
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA	% PASA	
(3") 75.0 mm	100	
(2") 50.0 mm	100	
(1 1/2") 37.5 mm	100	
(1") 25.0 mm	86	
(3/4") 19.0 mm	73	
(3/8") 9.5 mm	52	
(No. 4) 4.75 mm	39	
(No. 10) 2.00 mm	28	
(No. 20) 0.85 mm	22	
(No. 40) 0.425 mm	16	
(No. 60) 0.250 mm	10	
(No. 100) 0.150 mm	7	
(No. 200) 0.075 mm	5	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

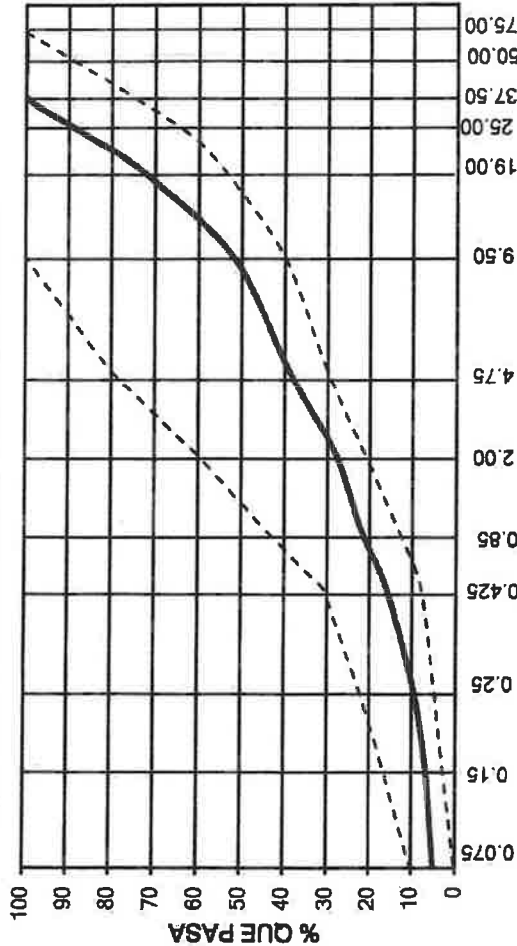

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	103
% EXPANSIÓN	0.54
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	56

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	4.4
DENSIDAD	2.10
RELACIÓN DE FINOS	0.31
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	18
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	22
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% ÍNDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO ZERANA

ENSAYE No. 29

CONTRATISTA : MUTO REALITAS

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-27

CIUDAD : CHIHUAHUA
ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-oct-30

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO ZERANA NORTE (FRENTE A MANZANA 4, LOTE 7)


TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO ORTEGA

DATOS DEL MUESTREO

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E.S. MÁXIMO (kg/m³)		1377
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1853
P.E. DEL LUGAR (kg/m³)		9.8
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA		% PASA
(3")	75.0 mm	100
(2")	50.0 mm	100
(1 1/2")	37.5 mm	100
(1")	25.0 mm	88
(3/4")	19.0 mm	75
(3/8")	9.5 mm	55
(No. 4)	4.75 mm	40
(No. 10)	2.00 mm	28
(No. 20)	0.85 mm	20
(No. 40)	0.425 mm	16
(No. 60)	0.250 mm	10
(No. 100)	0.150 mm	7
(No. 200)	0.075 mm	5

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

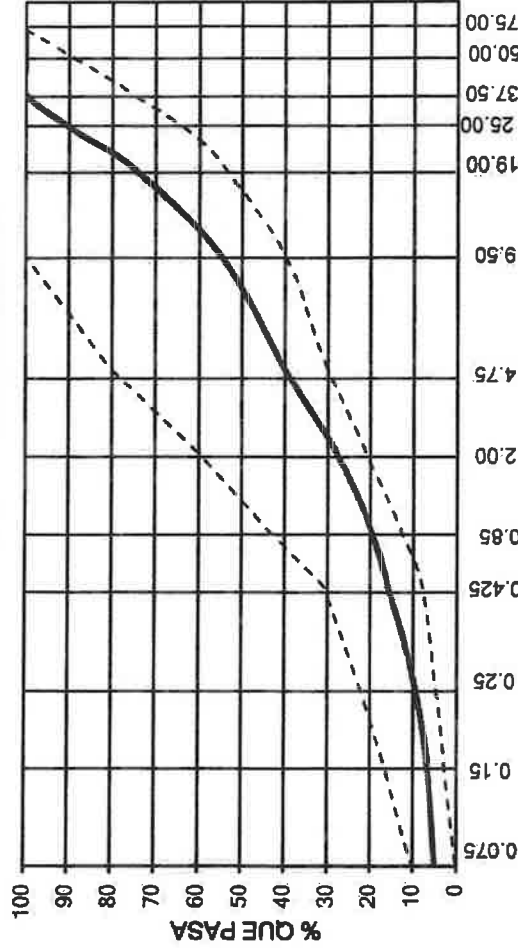

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	103
% EXPANSIÓN	0.54
% EQUIV ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	71

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	3.7
DENSIDAD	2.16
RELACIÓN DE FINOS	0.31
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	19
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	21
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX)	25
% LIMITE PLÁSTICO	19
% ÍNDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	6.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

Mario Alberto Rodríguez Fierro

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJAS O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO ZERANA

ENSAYE No. 30

CONTRATISTA : MUTO REALITAS

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-27

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-oct-30

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA

DATOS DEL MUESTREO


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO ZERANA ESTE(FRENTE A MANZANA 1, LOTE 72)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO ORTEGA

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E. MÁXIMO (kg/m ³)		1390
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1891
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		9.1
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA	% PASA	
(3")	75.0 mm	100
(2")	50.0 mm	100
(1 1/2")	37.5 mm	100
(1")	25.0 mm	73
(3/4")	19.0 mm	62
(3/8")	9.5 mm	46
(No. 4)	4.75 mm	34
(No. 10)	2.00 mm	26
(No. 20)	0.85 mm	20
(No. 40)	0.425 mm	16
(No. 60)	0.250 mm	10
(No. 100)	0.150 mm	7
(No. 200)	0.075 mm	5

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

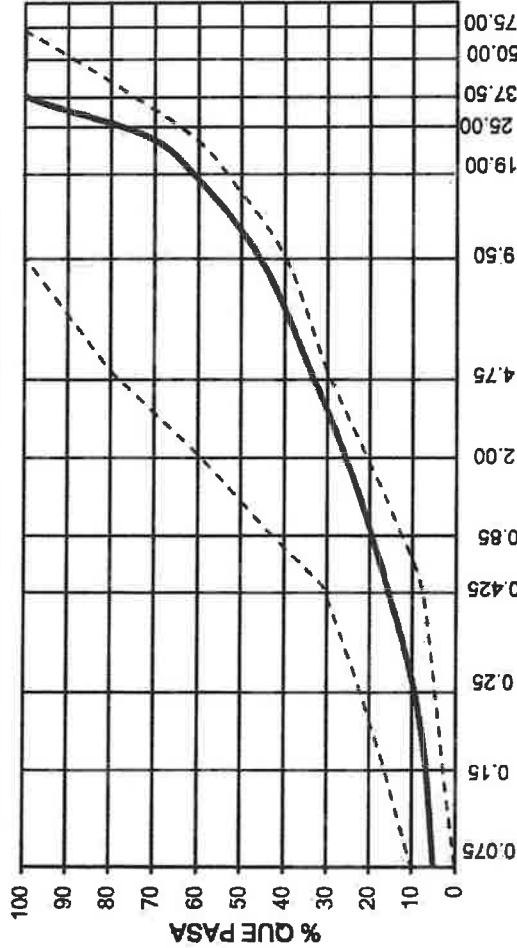

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	100
% EXPANSIÓN	0.54
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	65

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	3.68
DENSIDAD	2.13
RELACIÓN DE FINOS	0.31
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	20
% PARTÍCULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	24
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LÍMITE LÍQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LÍMITE PLÁSTICO	20
% ÍNDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	5.0

CLASIFICACIÓN S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

Mario Alberto Rodríguez Fierro

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO ZERANA

ENSAYE No. 31

CONTRATISTA : MUTO REALITAS

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-27

FECHA DE INFORME : 2025-oct-30

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO ZERANA SUR (FRENTE A MANZANA 1, LOTE 8)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO ORTEGA

P.E. SECO 1363

P.E.S. MÁXIMO (kg/m³) 1824

HUMEDAD ÓPTIMA (%) 9.5


P.E. DEL LUGAR (kg/m³) -

HUMEDAD LUGAR (%) -

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

MALLA	% PASA
(3") 75.0 mm	100
(2") 50.0 mm	100
(1 1/2") 37.5 mm	100
(1") 25.0 mm	80
(3/4") 19.0 mm	66
(3/8") 9.5 mm	52
(No. 4) 4.75 mm	36
(No. 10) 2.00 mm	26
(No. 20) 0.85 mm	20
(No. 40) 0.425 mm	15
(No. 60) 0.250 mm	10
(No. 100) 0.150 mm	6
(No. 200) 0.075 mm	5

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

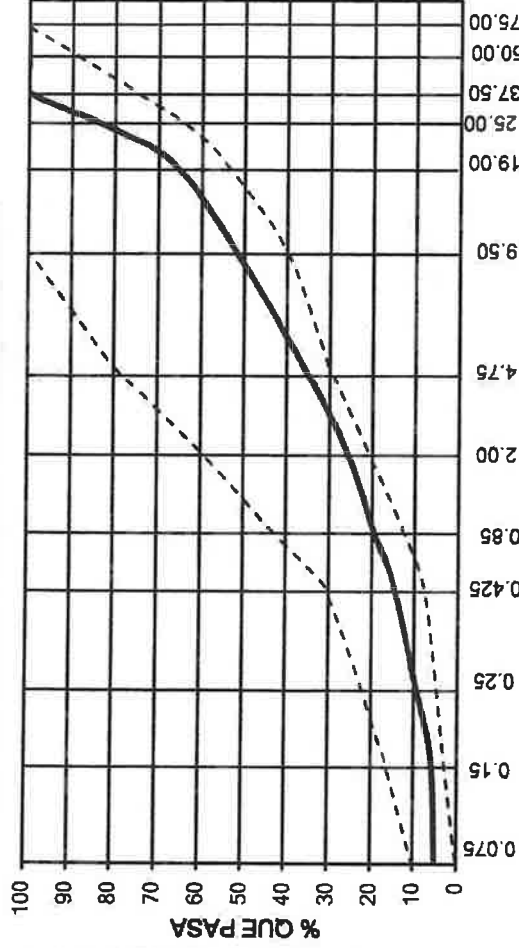

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN) 102

% EXPANSIÓN 0.54

% EQUIV ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN) 63

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NUMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN 3.57

DENSIDAD 2.16

RELACIÓN DE FINOS 0.33

% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX) 19

% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX) 22

% DE TRITURACIÓN 100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.) 25

% LIMITE PLÁSTICO 19

% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.) 6.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.J. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJAS O SUGERENCIAS ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO ZERANA

CONTRATISTA : MUTO REALITAS

ENSAYE No. 32

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-27

FECHA DE INFORME : 2025-oct-30

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE ZARAUZ (FRENTE A MANZANA 3, LOTE 7)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO ORTEGA

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1368
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1826
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		9.1
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA		% PASA
(3")	75.0 mm	100
(2")	60.0 mm	100
(1 1/2")	37.5 mm	100
(1")	25.0 mm	88
(3/4")	19.0 mm	74
(3/8")	9.5 mm	52
(No. 4)	4.75 mm	36
(No. 10)	2.00 mm	25
(No. 20)	0.85 mm	19
(No. 40)	0.425 mm	15
(No. 60)	0.250 mm	11
(No. 100)	0.150 mm	7
(No. 200)	0.075 mm	5

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

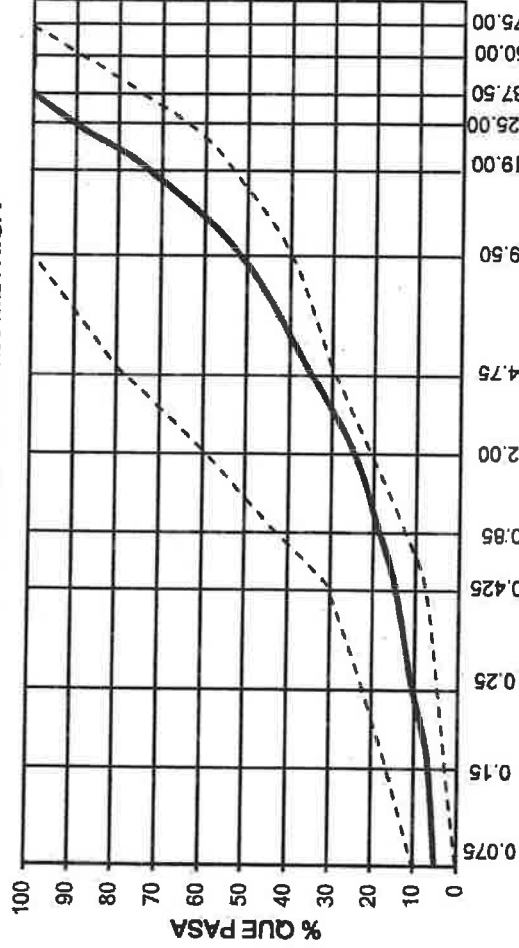

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	102
% EXPANSIÓN	0.48
% EQUIV ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	69

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NUMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	3.48
DENSIDAD	2.10
RELACIÓN DE FINOS	0.33
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	20
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX)	20
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLASTICO	19
% INDICE PLASTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	6.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

Mario Alberto Rodríguez Fierro

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TÉCNICO

M.I. Leonel Barrientos Juárez

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : **FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION** ENSAYE No. **33**
CONTRATISTA : **CORPORACION TECNICA DE URBANISMO** CIUDAD : **CHIHUAHUA** FECHA DE RECIBO : **2025-oct-27**
ESTADO : **CHIHUAHUA** FECHA DE INFORME : **2025-oct-30**

MATERIAL PARA CAPA DE : **BASE HIDRAULICA** MUESTRA No. **1**
DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL : **ROCA CALIZA TRITURADA**
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : **CALLE CIRCUITO GAIA (FRENTE A MANZANA 11, LOTE 17)**
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : **TRITURADO EN PLANTA**
UBICACIÓN DEL BANCO : **BANCO GCC MATERIALES**

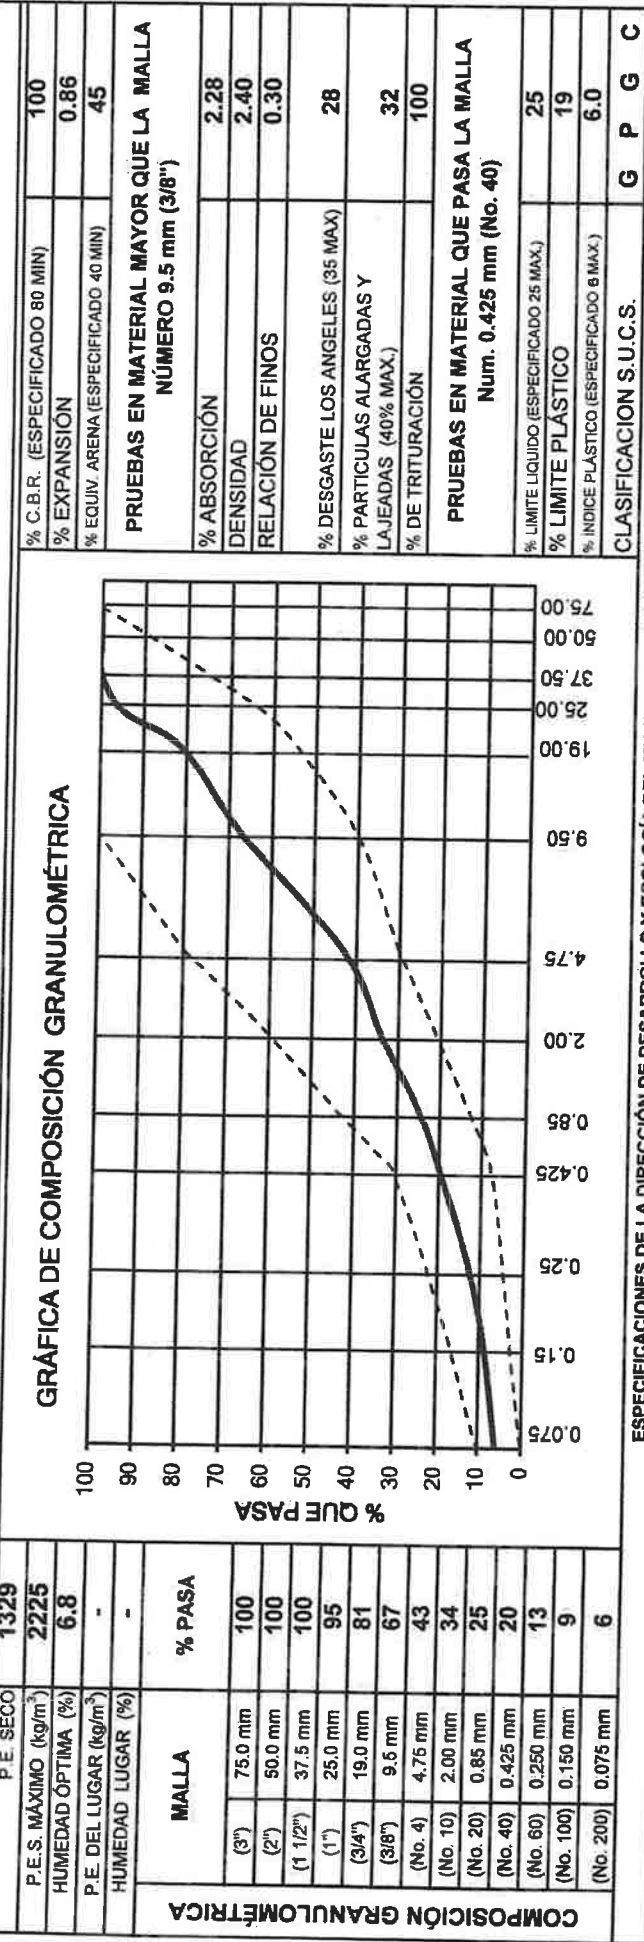

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO TÉCNICO
M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09


CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.



CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : **FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION** ENSAYE No. **34**
CONTRATISTA : **CORPORACION TECNICA DE URBANISMO** CIUDAD : **CHIHUAHUA** FECHA DE RECIBO : **2025-oct-27**
ESTADO : **CHIHUAHUA** FECHA DE INFORME : **2025-oct-30**

MATERIAL PARA CAPA DE : **BASE HIDRAULICA** MUESTRA No. **1**
DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL : **ROCA CALIZA TRITURADA**
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : **CALLE BRONTES (FRENTE A MANZANA 10, LOTE 2)**
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : **TRITURADO EN PLANTA**
UBICACIÓN DEL BANCO : **BANCO GCC MATERIALES**

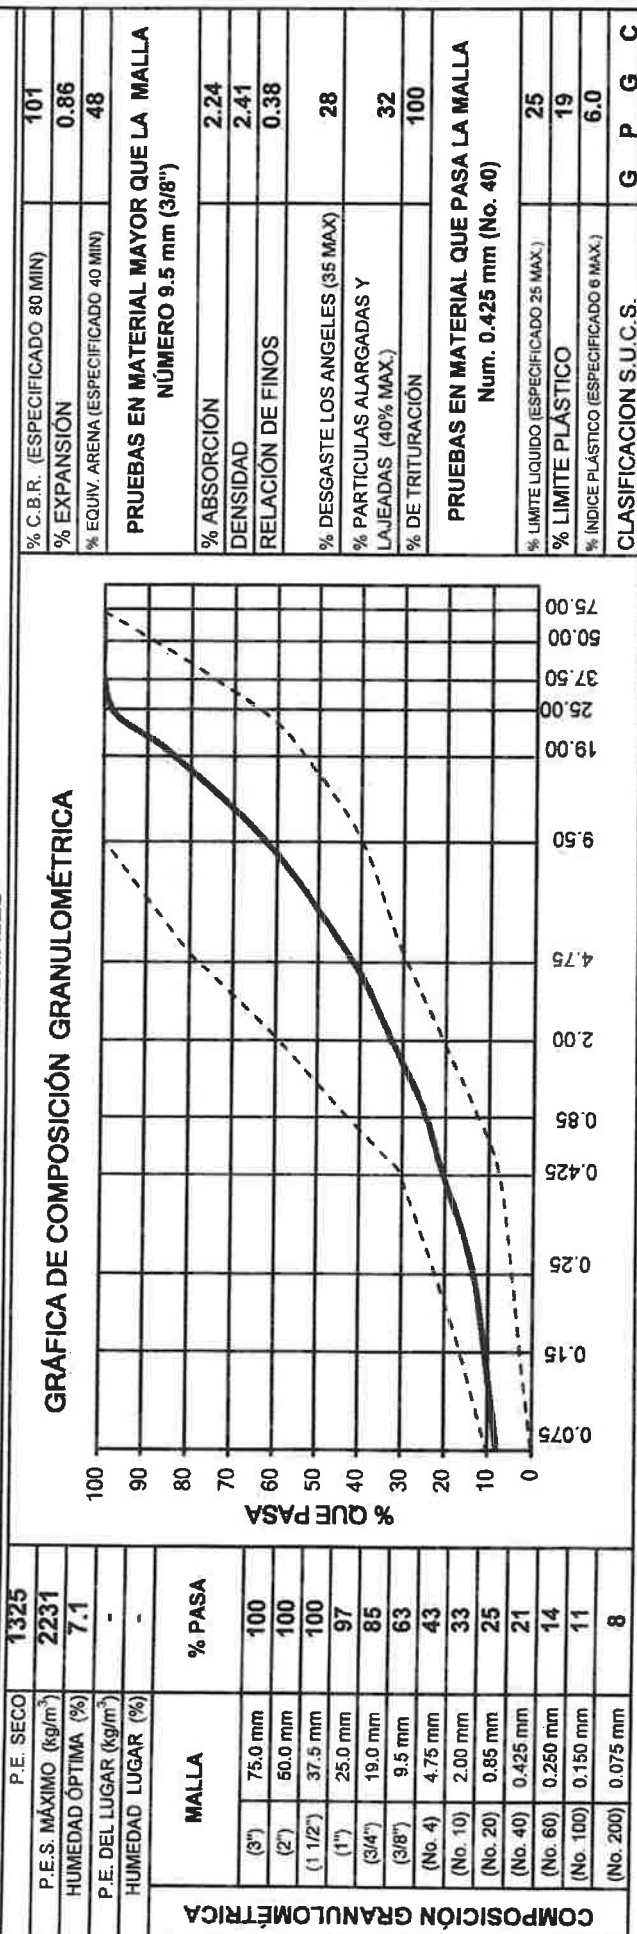

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : **FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION** ENSAYE No. **35**
CONTRATISTA : **CORPORACION TECNICA DE URBANISMO** FECHA DE RECIBO : **2025-oct-27**
CIUDAD : **CHIHUAHUA** FECHA DE INFORME : **2025-oct-30**
ESTADO : **CHIHUAHUA**

MATERIAL PARA CAPA DE : **BASE HIDRÁULICA** MUESTRA No. **1**
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : **ROCA CALIZA TRITURADA**
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : **AV. FRANCISCO VILLA (FRENTE A MANZANA 8, LOTE 22)**
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : **TRITURADO EN PLANTA**
UBICACIÓN DEL BANCO : **BANCO GCC MATERIALES**

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA				GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA										PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA NÚMERO 9.5 mm (3/8")			
P.E. SECO		1350		MALLA		% PASA				% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)		100					
P.E.S. MÁXIMO (kg/m³)		2235		(3")		75.0 mm		100		% EXPANSIÓN		0.74					
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		7.4		(2")		50.0 mm		100		% EQUIV ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)		43					
P.E. DEL LUGAR (kg/m³)		-		(1 1/2")		37.5 mm		100		PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA Num. 0.425 mm (No. 40)							
HUMEDAD LUGAR (%)		-		(1")		25.0 mm		83									
				(3/4")		19.0 mm		75									
				(3/8")		9.5 mm		60									
				(No. 4)		4.75 mm		45									
				(No. 10)		2.00 mm		30		% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)		27					
				(No. 20)		0.85 mm		25		% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)		30					
				(No. 40)		0.425 mm		20		% DE TRITURACIÓN		100					
				(No. 80)		0.250 mm		12		PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA Num. 0.425 mm (No. 40)							
				(No. 100)		0.150 mm		9									
				(No. 200)		0.075 mm		6									
										% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)		25					
										% LIMITE PLÁSTICO		19					
										% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)		6.0					
										CLASIFICACION S.U.C.S.		G P G C					

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION

ENSAYE No. 36

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-27

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-oct-30

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO NEREO (FRENTE A MANZANA 5, LOTE 9)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO GCC MATERIALES

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E. MÁXIMO (kg/m ³)		1344
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		2195
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		7.8
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA		% PASA
(3")	75.0 mm	100
(2")	50.0 mm	100
(1 1/2")	37.5 mm	100
(1")	25.0 mm	85
(3/4")	19.0 mm	77
(3/8")	9.5 mm	63
(No. 4)	4.75 mm	45
(No. 10)	2.00 mm	30
(No. 20)	0.85 mm	27
(No. 40)	0.425 mm	19
(No. 60)	0.250 mm	13
(No. 100)	0.150 mm	10
(No. 200)	0.075 mm	7

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

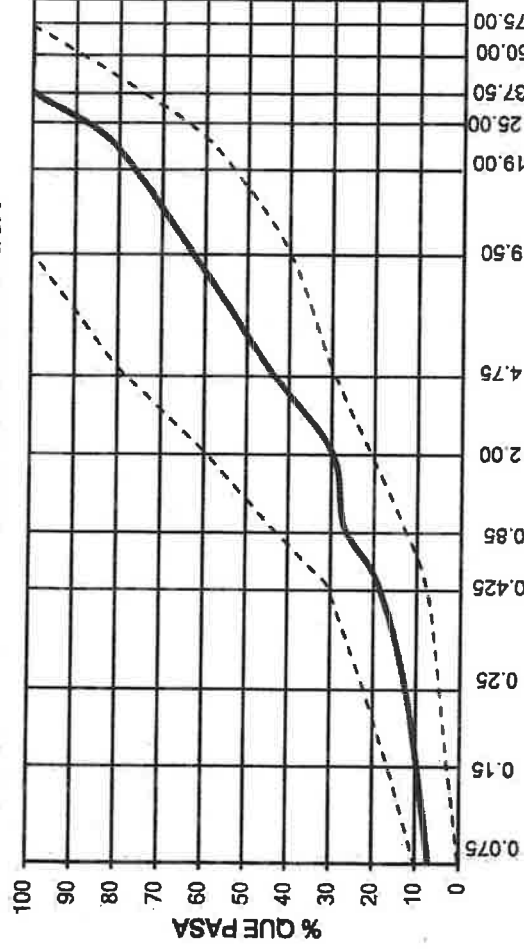

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.66
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	41

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NUMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.24
DENSIDAD	2.40
RELACIÓN DE FINOS	0.37
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	28
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	31
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO GAIA DOMINION

ENSAYE No. 37

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-27

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-oct-30

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE ORION (FRENTE A MANZANA 3, LOTE 14)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO GCC MATERIALES

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO	1350
P.E.S. MÁXIMO (kg/m³)		2197	
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		7.2	
P.E. DEL LUGAR (kg/m³)		-	
HUMEDAD LUGAR (%)		-	
MALLA		% PASA	
(3")	75.0 mm	100	
(2")	50.0 mm	100	
(1 1/2")	37.5 mm	100	
(1")	25.0 mm	90	
(3/4")	19.0 mm	70	
(3/8")	9.5 mm	53	
(No. 4)	4.75 mm	39	
(No. 10)	2.00 mm	27	
(No. 20)	0.85 mm	20	
(No. 40)	0.425 mm	17	
(No. 60)	0.250 mm	13	
(No. 100)	0.150 mm	10	
(No. 200)	0.075 mm	7	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

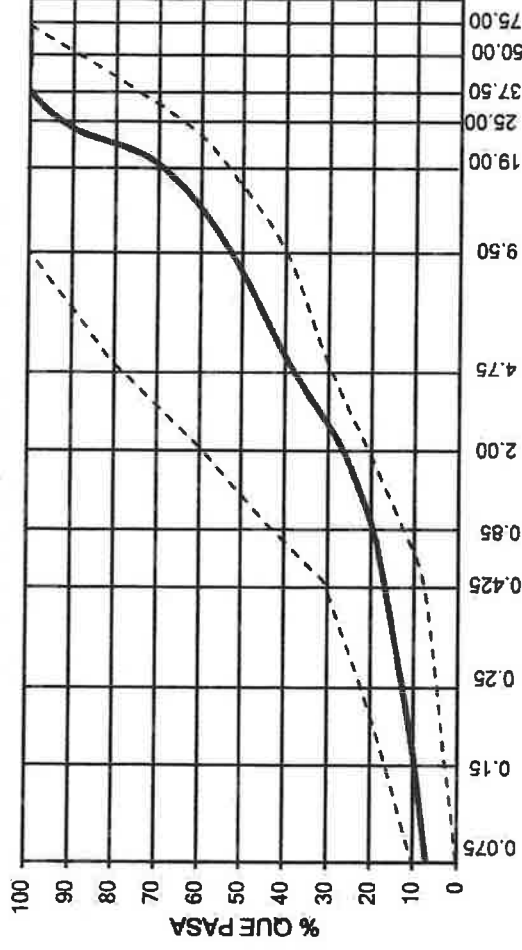

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	100
% EXPANSIÓN	0.71
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	42

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NUMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.22
DENSIDAD	2.43
RELACIÓN DE FINOS	0.41
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	26
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	29
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.J. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJAS O SUGERENCIAS ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

ENSAYE No. 38

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-31

ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-03

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1


DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE CIRCUITO PARVATI (FRENTE A MANZANA 2, LOTE 6)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO DISTRITO 1

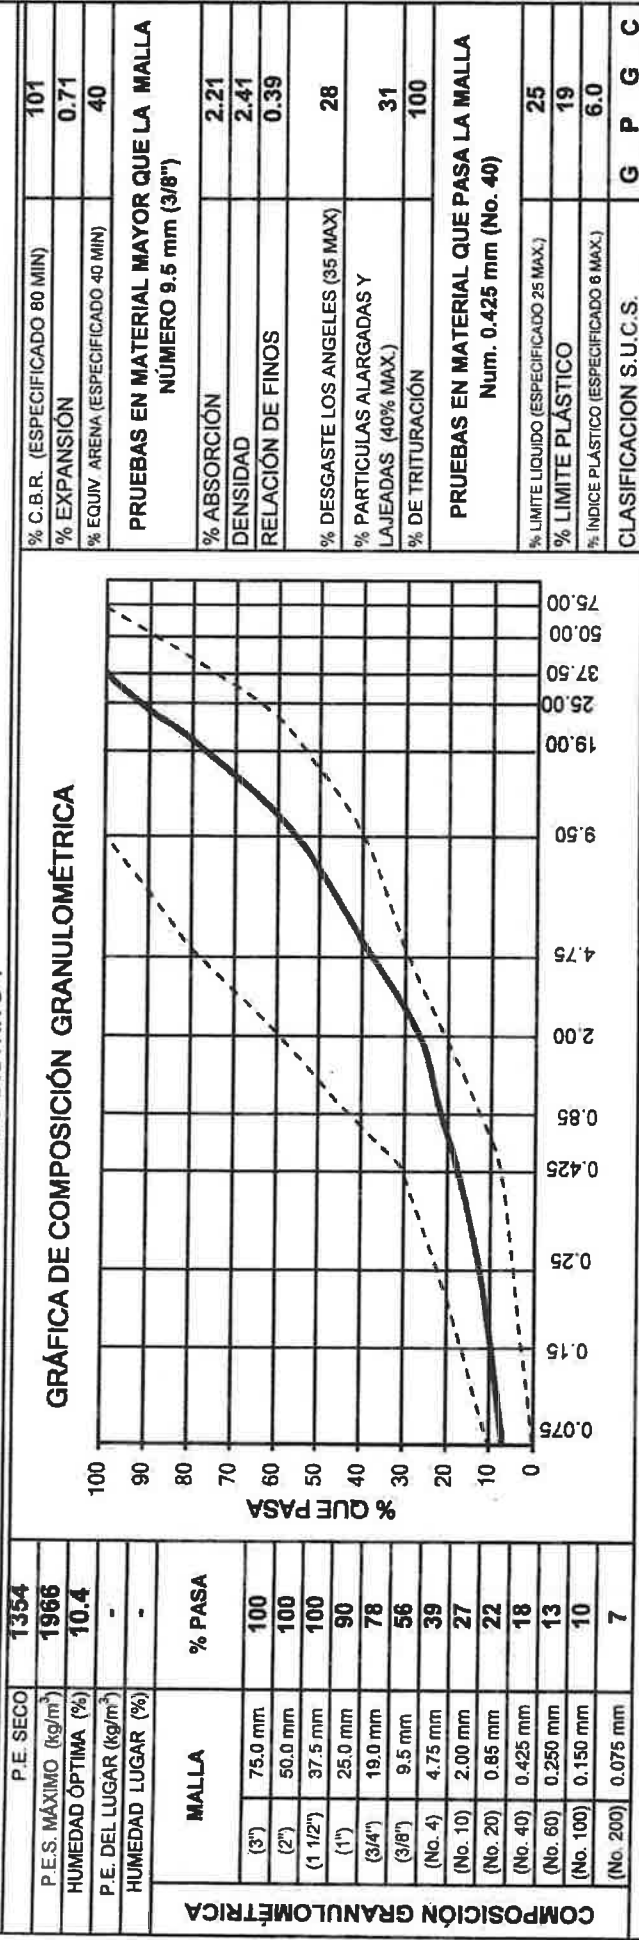

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

Mario Alberto Rodríguez Fierro

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

ENSAYE No. 39

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-31

ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-03

DATOS DEL MUESTREO

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA


MUESTRA No. 1

DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE PASEO DE ANANDA (A UN COSTADO DE MANZANA 3, LOTE 1)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACION DEL BANCO : BANCO DISTRITO 1

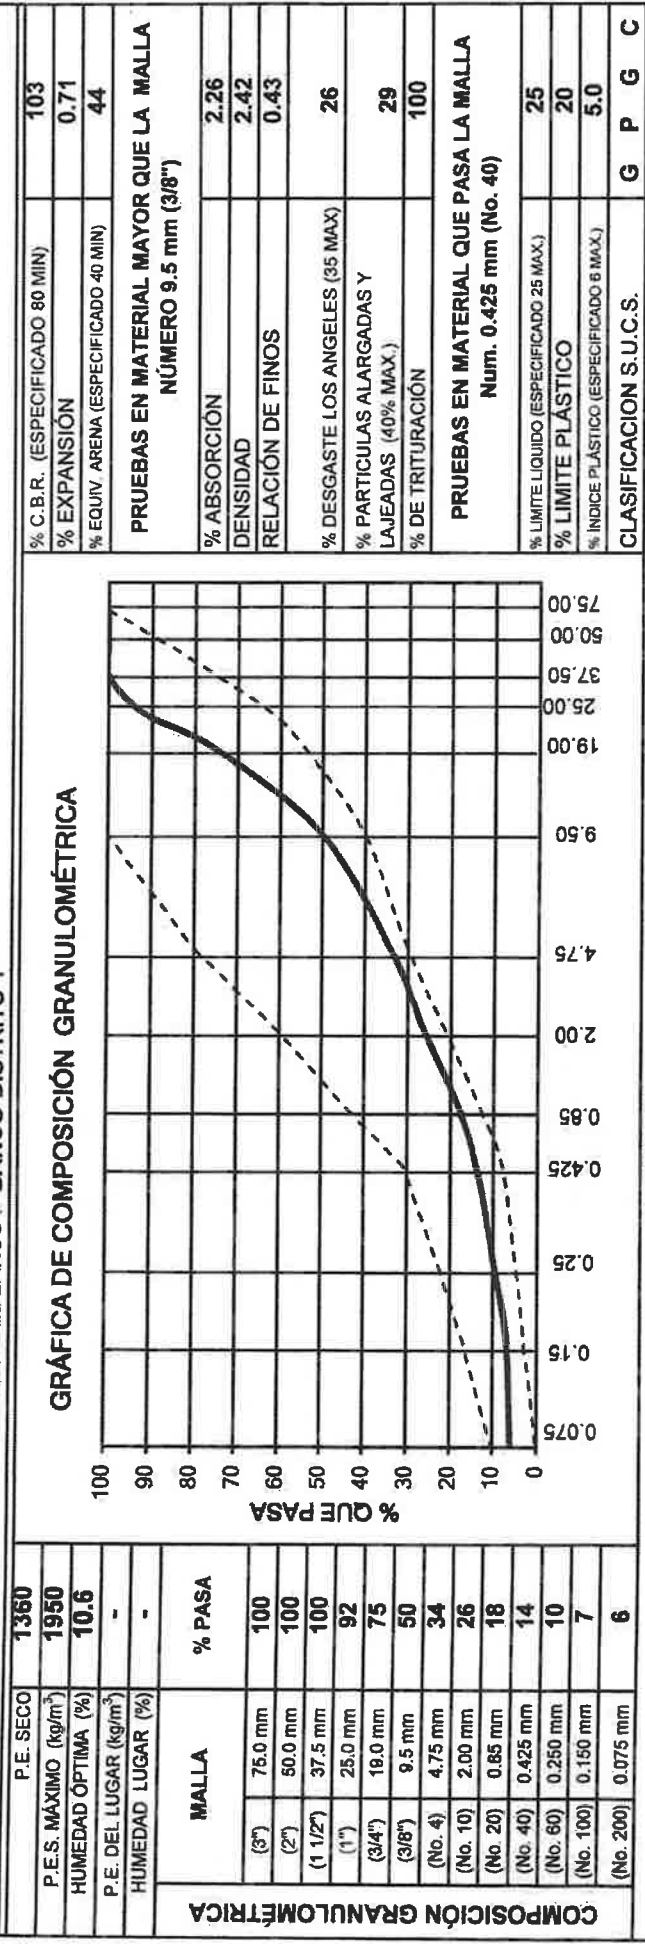

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

ENSAYE No. 40

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-31

ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-03


MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE GANESH (FRENTE A MANZANA 3, LOTE 13)
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA
UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO DISTRITO 1

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA			% PASA
MALLA			
P.E. SECO	P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)	P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)	
1371	1964	-	
	10.7	-	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

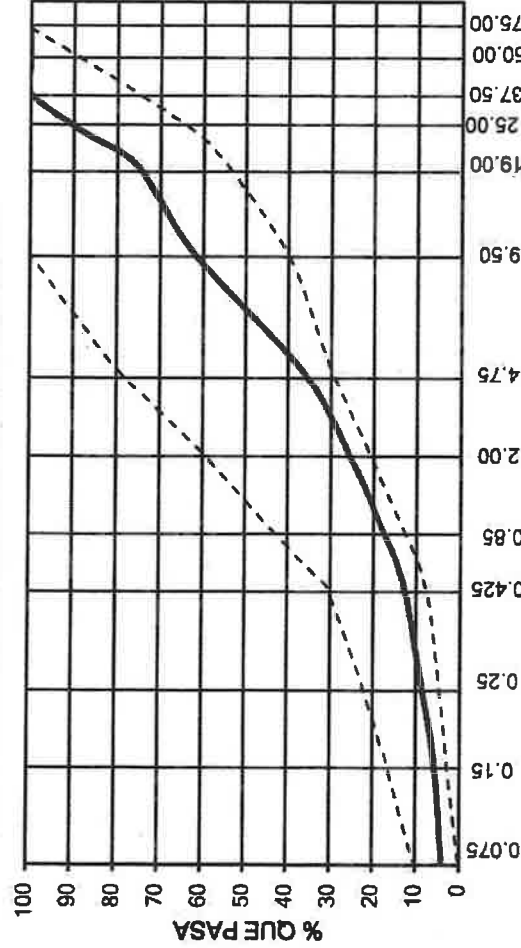

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	102
% EXPANSIÓN	0.66
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	42
PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA NÚMERO 9.5 mm (3/8")	
% ABSORCIÓN	2.21
DENSIDAD	2.41
RELACIÓN DE FINOS	0.31
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	27
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	28
% DE TRITURACIÓN	100
PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA Num. 0.425 mm (No. 40)	
% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 26 MAX.)	25
% LIMITE PLASTICO	19
% INDICE PLASTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	6.0
CLASIFICACION S.U.C.S.	G P

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.



CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA: FRACCIONAMIENTO PARVATI

CONTRATISTA: CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

ENSAYE No. 41

FECHA DE RECIBO: 2025-oct-31

FECHA DE INFORME: 2025-nov-03

MATERIAL PARA CAPA DE: BASE HIDRAULICA

DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL: CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO: CALLE CIRCUITO INDRA (FRENTE A MANZANA 4, LOTE 8)


TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO: BANCO DISTRITO 1

MUESTRA No. 1

P.E. SECO	1372
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)	1950
HUMEDAD ÓPTIMA (%)	10.4
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)	-
HUMEDAD LUGAR (%)	-
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	
MALLA	
(3")	100
(2")	100
(1 1/2")	100
(1")	88
(3/4")	75
(3/8")	53
(No. 4)	38
(No. 10)	28
(No. 20)	20
(No. 40)	15
(No. 60)	9
(No. 100)	6
(No. 200)	4

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

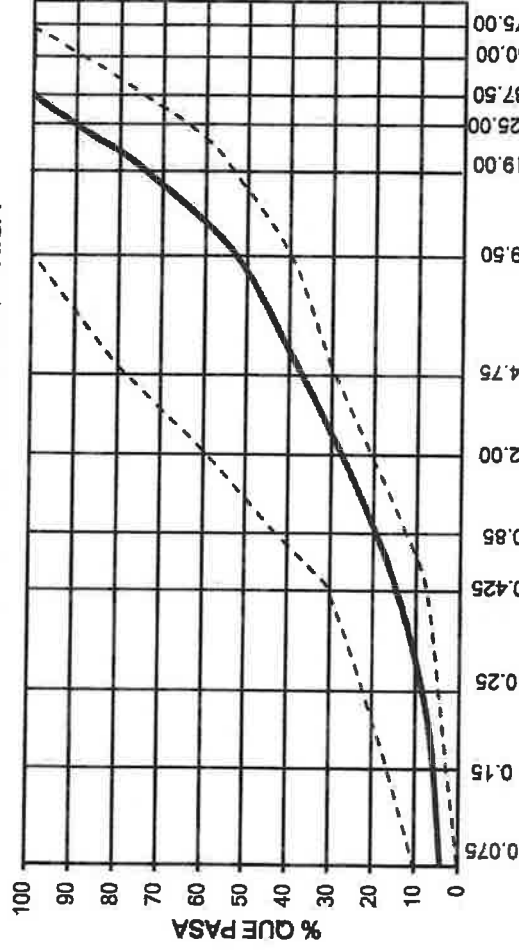

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.48
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	43
PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA NUMERO 9.5 mm (3/8")	
% ABSORCIÓN	2.22
DENSIDAD	2.43
RELACIÓN DE FINOS	0.27
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	28
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX)	31
% DE TRITURACIÓN	96
PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA Num. 0.425 mm (No. 40)	
% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	19
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	6.0
CLASIFICACION S.U.C.S.	G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA.

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

ENSAYE No. 42

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-31

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-03

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE VERUNA (FRENTE A MANZANA 5, LOTE 8)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO DISTRITO 1

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO		1381
		P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1966
		HUMEDAD ÓPTIMA (%)		10.6
		P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		-
		HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA		% PASA		
	(3")	75.0 mm	100	
	(2")	50.0 mm	100	
	(1 1/2")	37.5 mm	100	
	(1")	25.0 mm	90	
	(3/4")	19.0 mm	77	
	(3/8")	9.5 mm	60	
	(No. 4)	4.75 mm	41	
	(No. 10)	2.00 mm	30	
	(No. 20)	0.85 mm	20	
	(No. 40)	0.425 mm	16	
	(No. 60)	0.250 mm	10	
	(No. 100)	0.150 mm	6	
	(No. 200)	0.075 mm	4	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

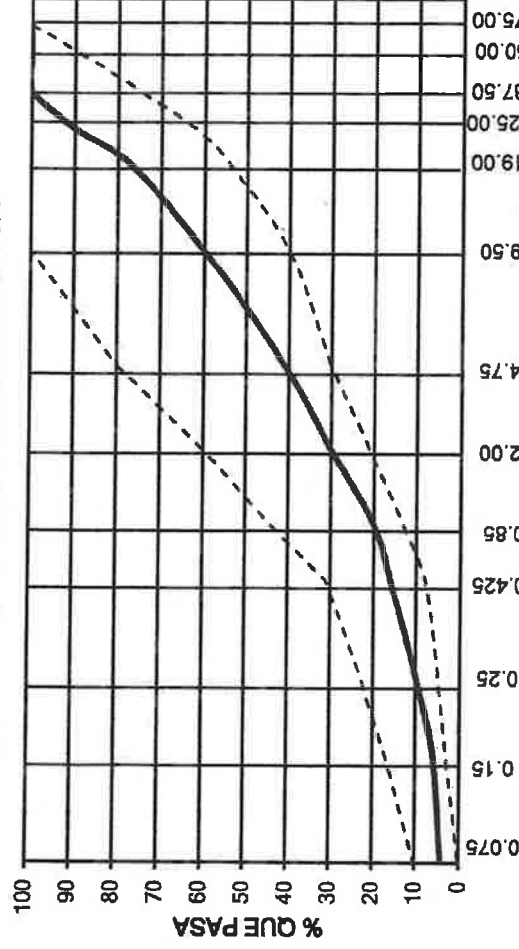

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	100
% EXPANSIÓN	0.87
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	40

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.24
DENSIDAD	2.40
RELACIÓN DE FINOS	0.25
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	32
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	35
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	19
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	6.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJAS O SUGERENCIAS ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

ENSAYE No. 43

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-31

ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-03

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE BHAGA (FRENTE A MANZANA 8, LOTE 27)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO DISTRITO 1

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E. MÁXIMO (kg/m³)		1359
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1948
P.E. DEL LUGAR (kg/m³)		11.0
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA	% PASA	
(3")	75.0 mm	100
(2")	50.0 mm	100
(1 1/2")	37.5 mm	100
(1")	25.0 mm	92
(3/4")	19.0 mm	78
(3/8")	9.5 mm	63
(No. 4)	4.75 mm	45
(No. 10)	2.00 mm	37
(No. 20)	0.85 mm	24
(No. 40)	0.425 mm	17
(No. 60)	0.250 mm	10
(No. 100)	0.150 mm	6
(No. 200)	0.075 mm	4

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

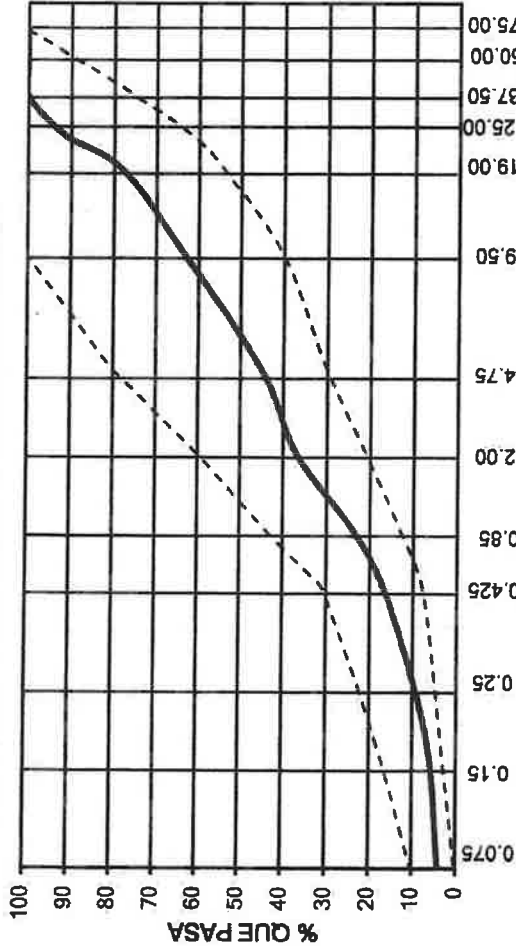

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	102
% EXPANSIÓN	0.63
% EQUIV ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	42

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.2
DENSIDAD	2.41
RELACIÓN DE FINOS	0.24
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	30
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	28
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	19
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	6.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJAS O SUGERENCIAS ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.



CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

ENSAYE No. 44
FECHA DE RECIBO : 2025-oct-31
FECHA DE INFORME : 2025-nov-03

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE ASURA (A UN COSTADO DE MANZANA 5, LOTE 21)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO DISTRITO 1

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO	1336
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1963	
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		10.2	
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		-	
HUMEDAD LUGAR (%)		-	
MALLA		% PASA	
(3")	75.0 mm	100	
(2")	50.0 mm	100	
(1 1/2")	37.5 mm	100	
(1")	25.0 mm	87	
(3/4")	19.0 mm	75	
(3/8")	9.5 mm	53	
(No. 4)	4.75 mm	37	
(No. 10)	2.00 mm	30	
(No. 20)	0.85 mm	21	
(No. 40)	0.425 mm	17	
(No. 60)	0.250 mm	10	
(No. 100)	0.150 mm	6	
(No. 200)	0.075 mm	4	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

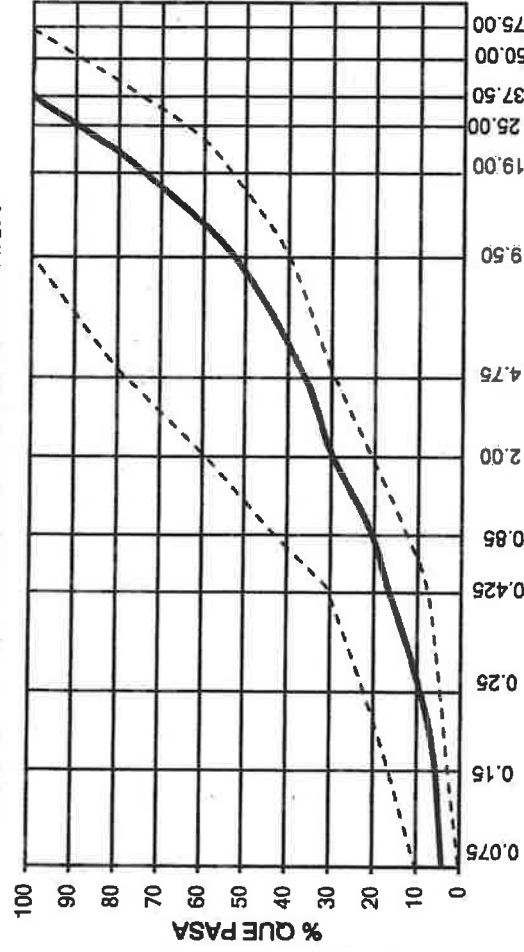

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)

% EXPANSIÓN

% EQUIV ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)

% ABSORCIÓN

DENSIDAD

RELACIÓN DE FINOS

% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)

% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)

% DE TRITURACIÓN

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)

% LIMITE PLÁSTICO

% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)

CLASIFICACION S.U.C.S.

G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.J. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.



CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

ENSAYE No. 45

CONTRATISTA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

FECHA DE RECIBO : 2025-oct-31

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-03

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE MENAKA (FRENTE A MANZANA 3, LOTE 98)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO DISTRITO 1

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO	1321
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1956	
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		11.2	
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		-	
HUMEDAD LUGAR (%)		-	
MALLA	% PASA		
(3")	75.0 mm	100	
(2")	50.0 mm	100	
(1 1/2")	37.5 mm	100	
(1")	25.0 mm	88	
(3/4")	19.0 mm	73	
(3/8")	9.5 mm	50	
(No. 4)	4.75 mm	39	
(No. 10)	2.00 mm	34	
(No. 20)	0.85 mm	23	
(No. 40)	0.425 mm	17	
(No. 60)	0.250 mm	10	
(No. 100)	0.150 mm	8	
(No. 200)	0.075 mm	5	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

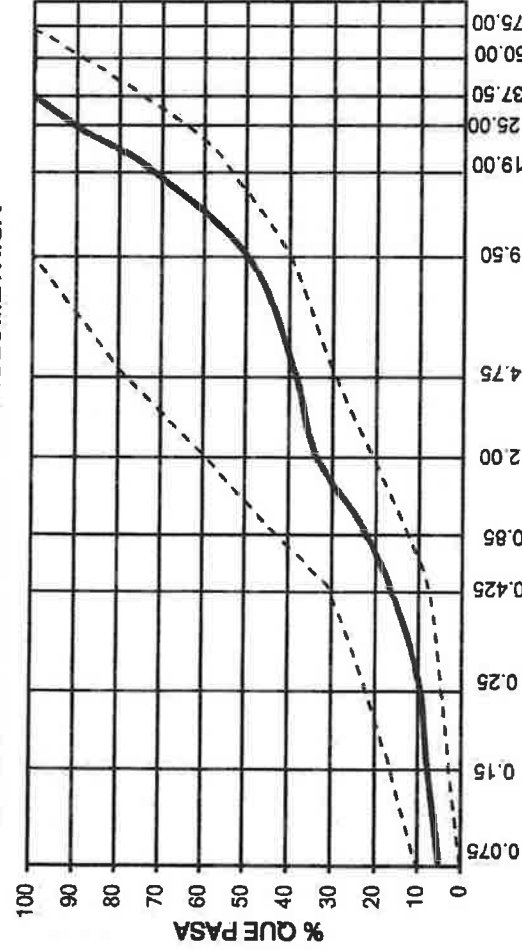

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.63
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	42

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.25
DENSIDAD	2.40
RELACIÓN DE FINOS	0.29
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	29
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	30
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	19
% ÍNDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	6.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G P G C

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.



CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO CERRADA QUI NTA CAROLINA

CONTRATISTA : GRUPO TRINNAL

ENSAYE No. 46
FECHA DE RECIBO : 2025-nov-04
FECHA DE INFORME : 2025-nov-07

CIUDAD : CHIHUAHUA
ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CERRADA QUINTA CAROLINA


TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

MUESTRA No. 1

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA			MALLA	% PASA	
	P.E. SECO	1321			
	P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)	1956	(3")	75.0 mm	100
	HUMEDAD ÓPTIMA (%)	11.2	(2")	50.0 mm	100
	P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)	-	(1 1/2")	37.5 mm	100
	HUMEDAD LUGAR (%)	-	(1")	25.0 mm	88
			(3/4")	19.0 mm	73
			(3/8")	9.5 mm	50
			(No. 4)	4.75 mm	39
			(No. 10)	2.00 mm	30
			(No. 20)	0.85 mm	23
			(No. 40)	0.425 mm	17
			(No. 60)	0.250 mm	9
			(No. 100)	0.150 mm	6
			(No. 200)	0.075 mm	4

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

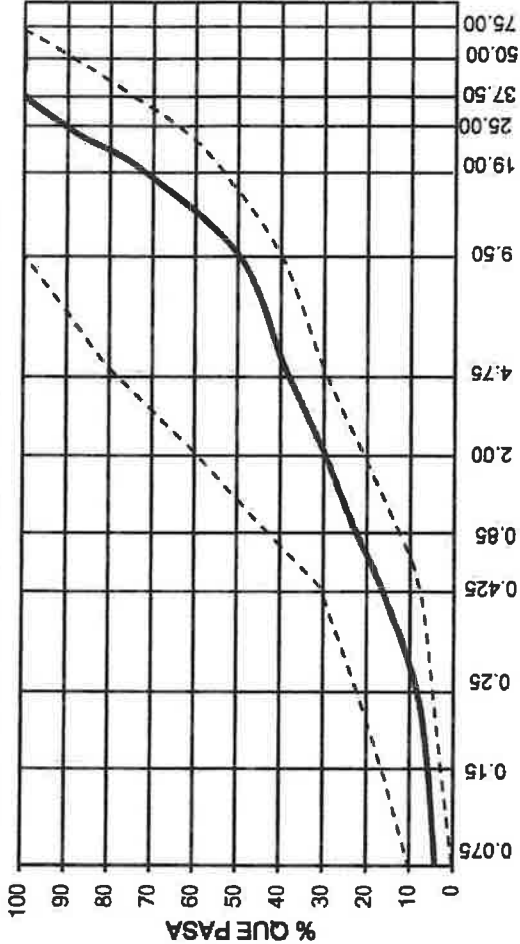

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	102
% EXPANSIÓN	0.71
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	48
PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA NÚMERO 9.5 mm (3/8")	
% ABSORCIÓN	2.27
DENSIDAD	2.43
RELACIÓN DE FINOS	0.24
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	27
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	25
% DE TRITURACIÓN	100
PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA Num. 0.425 mm (No. 40)	
% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	19
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	6.0
CLASIFICACION S.U.C.S.	G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL

ENSAYE No. 47

CONTRATISTA : ROAC GRUPO INMOBILIARIO

FECHA DE RECIBO : 2025-nov-04

CIUDAD : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-07

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRAULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : C. SIERRA CALIFORNIANA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO	1342
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1931	
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		12.4	
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		-	
HUMEDAD LUGAR (%)		-	
MALLA		% PASA	
(3")	75.0 mm	100	
(2")	50.0 mm	100	
(1 1/2")	37.5 mm	100	
(1")	25.0 mm	90	
(3/4")	18.0 mm	76	
(3/8")	9.5 mm	57	
(No. 4)	4.75 mm	42	
(No. 10)	2.00 mm	29	
(No. 20)	0.85 mm	21	
(No. 40)	0.425 mm	19	
(No. 60)	0.250 mm	12	
(No. 100)	0.150 mm	8	
(No. 200)	0.075 mm	4	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

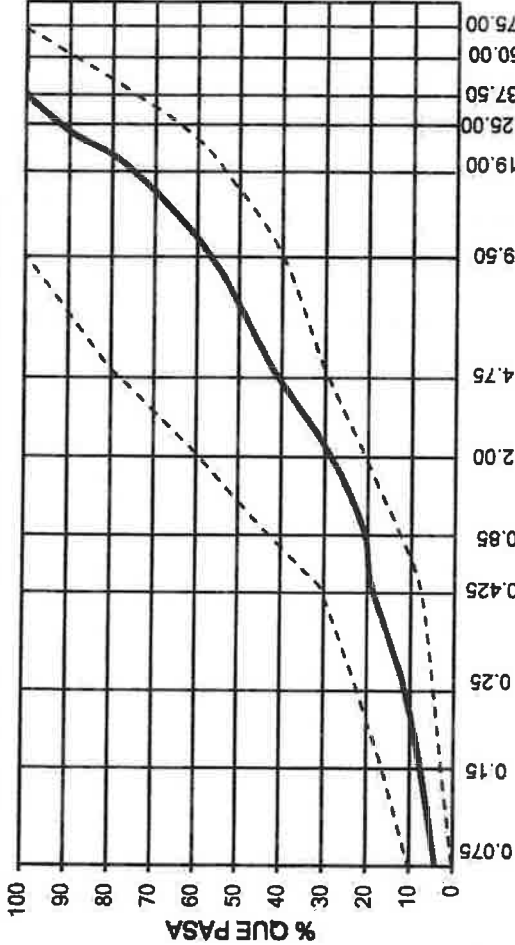

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.53
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	44

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.28
DENSIDAD	2.45
RELACIÓN DE FINOS	0.21
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	28
% PARTÍCULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	30
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LÍMITE LÍQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LÍMITE PLÁSTICO	20
% ÍNDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 6 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

Mario Alberto Rodríguez Fierro

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

IR-CBH-09

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO CITTANOVA

CONTRATISTA : YVASA

ENSAYE No. 48

FECHA DE RECIBO : 2025-nov-04

FECHA DE INFORME : 2025-nov-07

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CIRCUITO CITTANOVA SUR (KM 0+030)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1350
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		19.48
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		13.1
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA	% PASA	
(3")	75.0 mm	100
(2")	50.0 mm	100
(1 1/2")	37.5 mm	100
(1")	25.0 mm	92
(3/4")	19.0 mm	78
(3/8")	9.5 mm	62
(No. 4)	4.75 mm	44
(No. 10)	2.00 mm	31
(No. 20)	0.85 mm	21
(No. 40)	0.425 mm	17
(No. 60)	0.250 mm	12
(No. 100)	0.150 mm	8
(No. 200)	0.075 mm	4

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

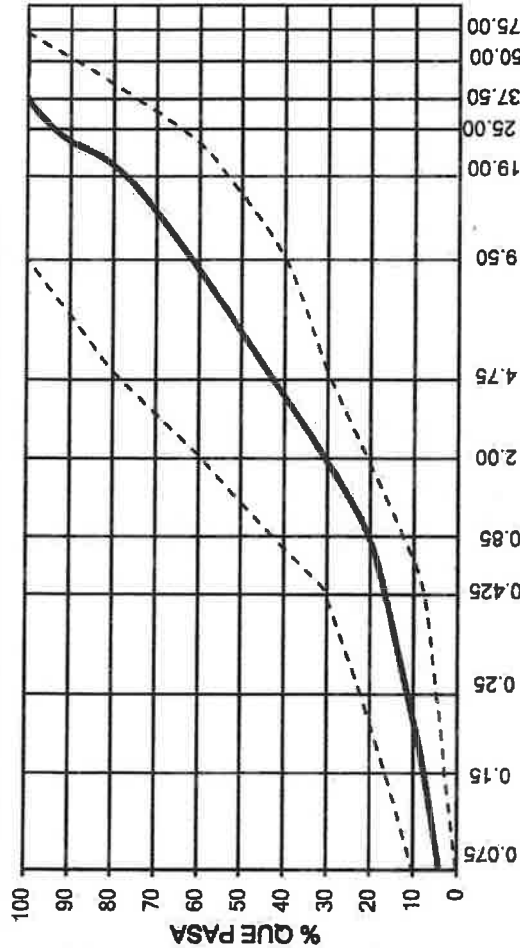

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.81
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	42

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.31
DENSIDAD	2.40
RELACIÓN DE FINOS	0.24
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	28
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX)	31
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARBIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO CITTANOVA

CONTRATISTA : YVASA

ENSAYE No. 49

FECHA DE RECIBO : 2025-nov-04

FECHA DE INFORME : 2025-nov-07

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CIRCUITO CITTANOVA ESTE (KM 0+020)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

P.E. SECO	1337
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)	1940
HUMEDAD ÓPTIMA (%)	12.4
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)	-
HUMEDAD LUGAR (%)	-
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	
MALLA	% PASA
(3") 75.0 mm	100
(2") 50.0 mm	100
(1 1/2") 37.5 mm	100
(1") 25.0 mm	90
(3/4") 18.0 mm	75
(3/8") 9.5 mm	53
(No. 4) 4.75 mm	38
(No. 10) 2.00 mm	31
(No. 20) 0.85 mm	21
(No. 40) 0.425 mm	18
(No. 60) 0.250 mm	13
(No. 100) 0.150 mm	8
(No. 200) 0.075 mm	4

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

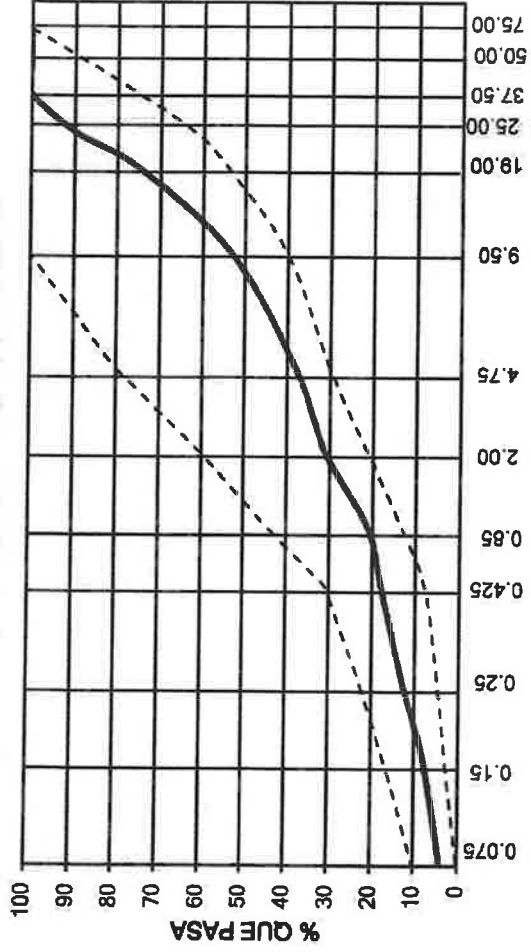

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	100
% EXPANSIÓN	0.63
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	40
PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA NÚMERO 9.5 mm (3/8")	
% ABSORCIÓN	2.27
DENSIDAD	2.41
RELACIÓN DE FINOS	0.22
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	29
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	30
% DE TRITURACIÓN	100
PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA Num. 0.425 mm (No. 40)	
% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	19
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	6.0
CLASIFICACION S.U.C.S.	G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJAS O SUGERENCIAS ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA

OBRA : FRACCIONAMIENTO CITTANOVA

ENSAYE No. 50

CONTRATISTA : YVASA

FECHA DE RECIBO : 2025-nov-04

CIUDAD : CHIHUAHUA
ESTADO : CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME : 2025-nov-07

MATERIAL PARA CAPA DE : BASE HIDRÁULICA

MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : CONGLOMERADO Y ROCA CALIZA TRITURADA


CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : CALLE MARENELLO (KM 0+015)

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURADO EN PLANTA

UBICACIÓN DEL BANCO : BANCO LUCERO

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO
P.E.S. MÁXIMO (kg/m ³)		1322
HUMEDAD ÓPTIMA (%)		1949
P.E. DEL LUGAR (kg/m ³)		12.1
HUMEDAD LUGAR (%)		-
MALLA	% PASA	
(3") 76.0 mm	100	
(2") 50.0 mm	100	
(1 1/2") 37.5 mm	100	
(1") 25.0 mm	92	
(3/4") 19.0 mm	76	
(3/8") 9.5 mm	51	
(No. 4) 4.75 mm	39	
(No. 10) 2.00 mm	30	
(No. 20) 0.85 mm	20	
(No. 40) 0.425 mm	17	
(No. 60) 0.250 mm	12	
(No. 100) 0.150 mm	8	
(No. 200) 0.075 mm	4	

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

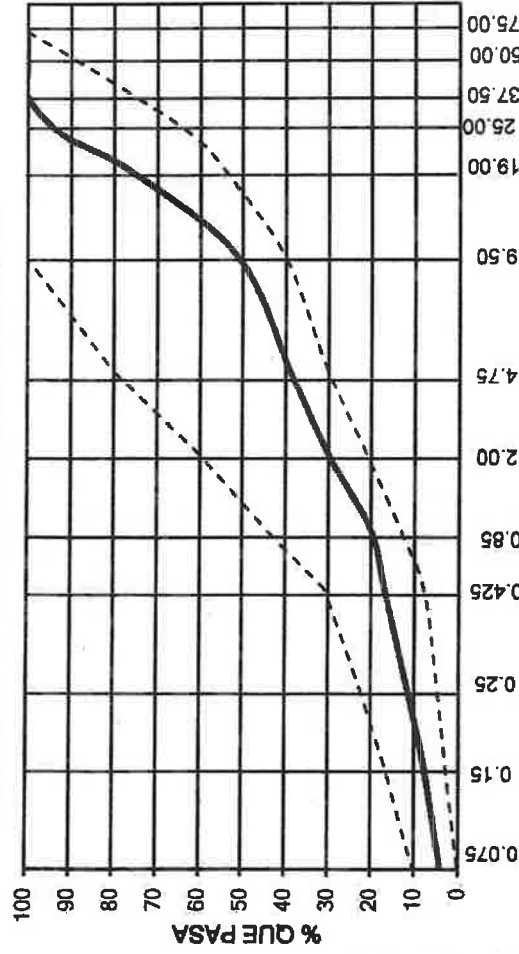

% C.B.R. (ESPECIFICADO 80 MIN)	101
% EXPANSIÓN	0.83
% EQUIV. ARENA (ESPECIFICADO 40 MIN)	42

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA
NÚMERO 9.5 mm (3/8")

% ABSORCIÓN	2.29
DENSIDAD	2.40
RELACIÓN DE FINOS	0.24
% DESGASTE LOS ANGELES (35 MAX)	30
% PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (40% MAX.)	28
% DE TRITURACIÓN	100

PRUEBAS EN MATERIAL QUE PASA LA MALLA
Num. 0.425 mm (No. 40)

% LIMITE LIQUIDO (ESPECIFICADO 25 MAX.)	25
% LIMITE PLÁSTICO	20
% INDICE PLÁSTICO (ESPECIFICADO 8 MAX.)	5.0

CLASIFICACION S.U.C.S. G W

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE BASE HIDRÁULICA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TECNICO

M.I. LEONEL BARBIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

IR-CBH-09

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

1.3- INFORMES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.


CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :
FRACCIONAMIENTO LAOS
CALLE LAOS
CONSTRUCTORA : CIVITAS DESARROLLOS

ENSAYE No. : 9
FECHA RECIBO : 2025-nov-07
FECHA INFORME : 2025-nov-09
TÉCNICO : M.A.R.F.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL GRAVA PARA CARPETA ASFÁLTICA
CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

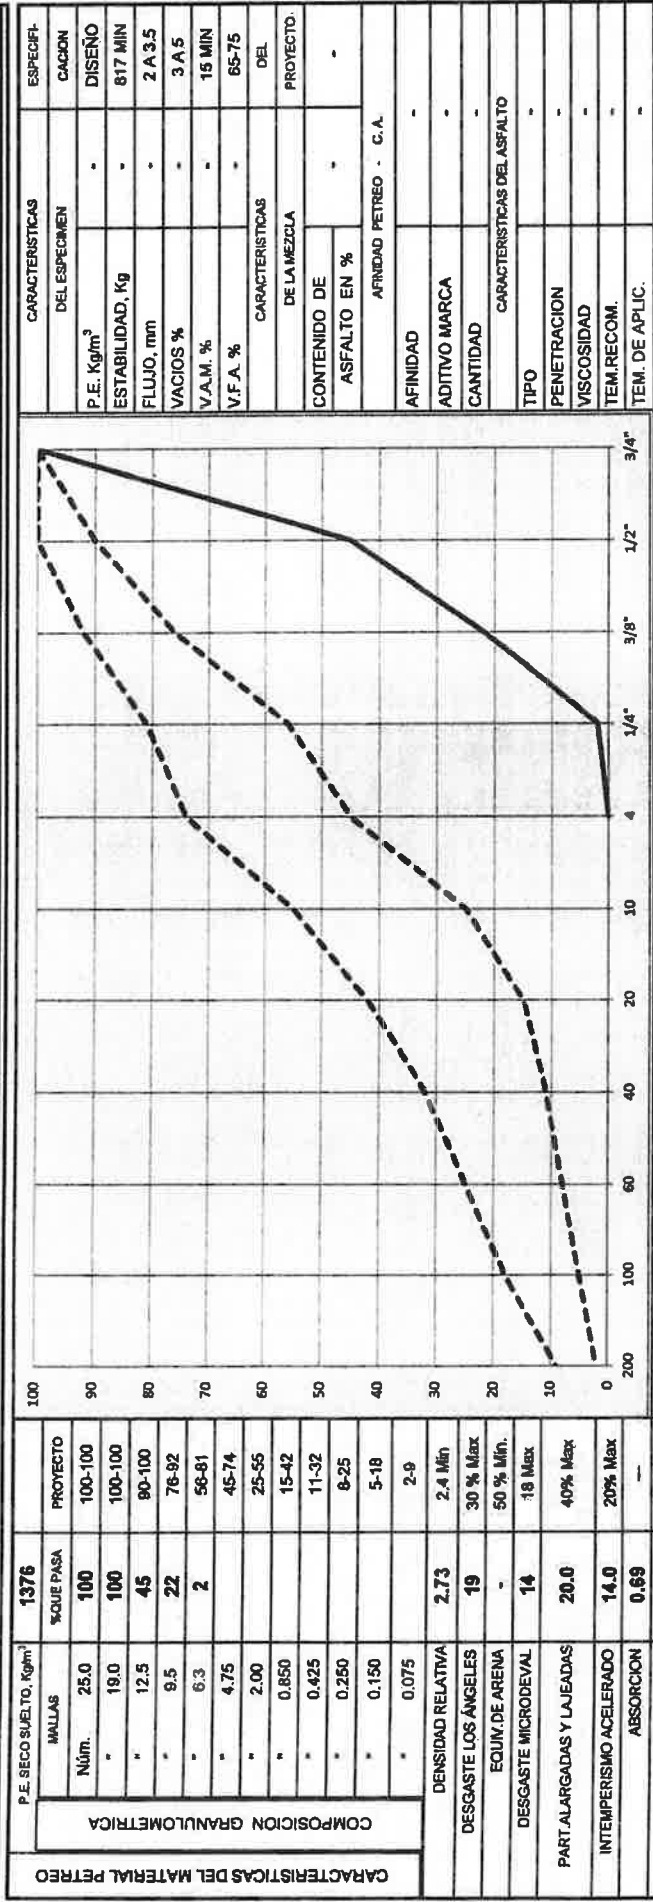

NORMATIVA SCT N-CMT-04-04/17 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO LAOS

CONSTRUCTORA : CIVITAS DESARROLLOS

ENSAYE No. : 10

FECHA RECIBO : 2025-nov-07

FECHA INFORME : 2025-nov-09

TÉCNICO : M.A.R.F.

ESTADO CHIHUAHUA


DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ARENA CARPETA ASFÁLTICA ASFÁLTICA

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

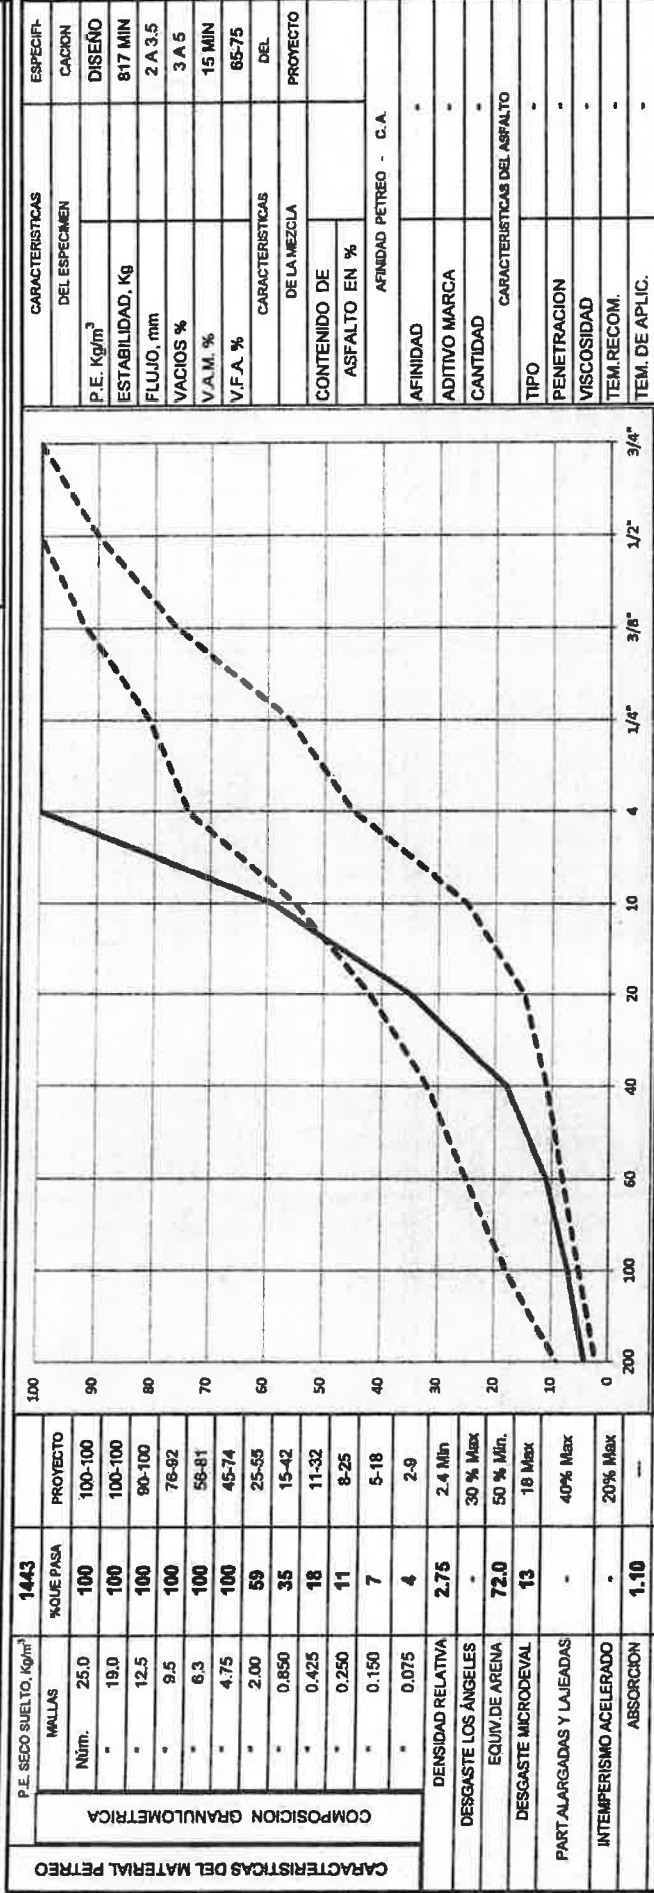

NORMATIVA SCT N-CIT-04-04/17 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

M.L.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ DIRECTOR TÉCNICO


EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA. PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITAMOS, OJEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO contacto@caduma.com.mx. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :	FRACCIONAMIENTO LAOS	ENSAYE No. :	11
		FECHA RECIBO :	2025-nov-14
	CALLE NALE	FECHA INFORME :	2025-nov-16
CONSTRUCTORA : CIVITAS DESARROLLOS		TÉCNICO :	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	GRAVA PARA CARPETA ASFALTICA
CLASIFICACION PETROGRAFICA	DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL	PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

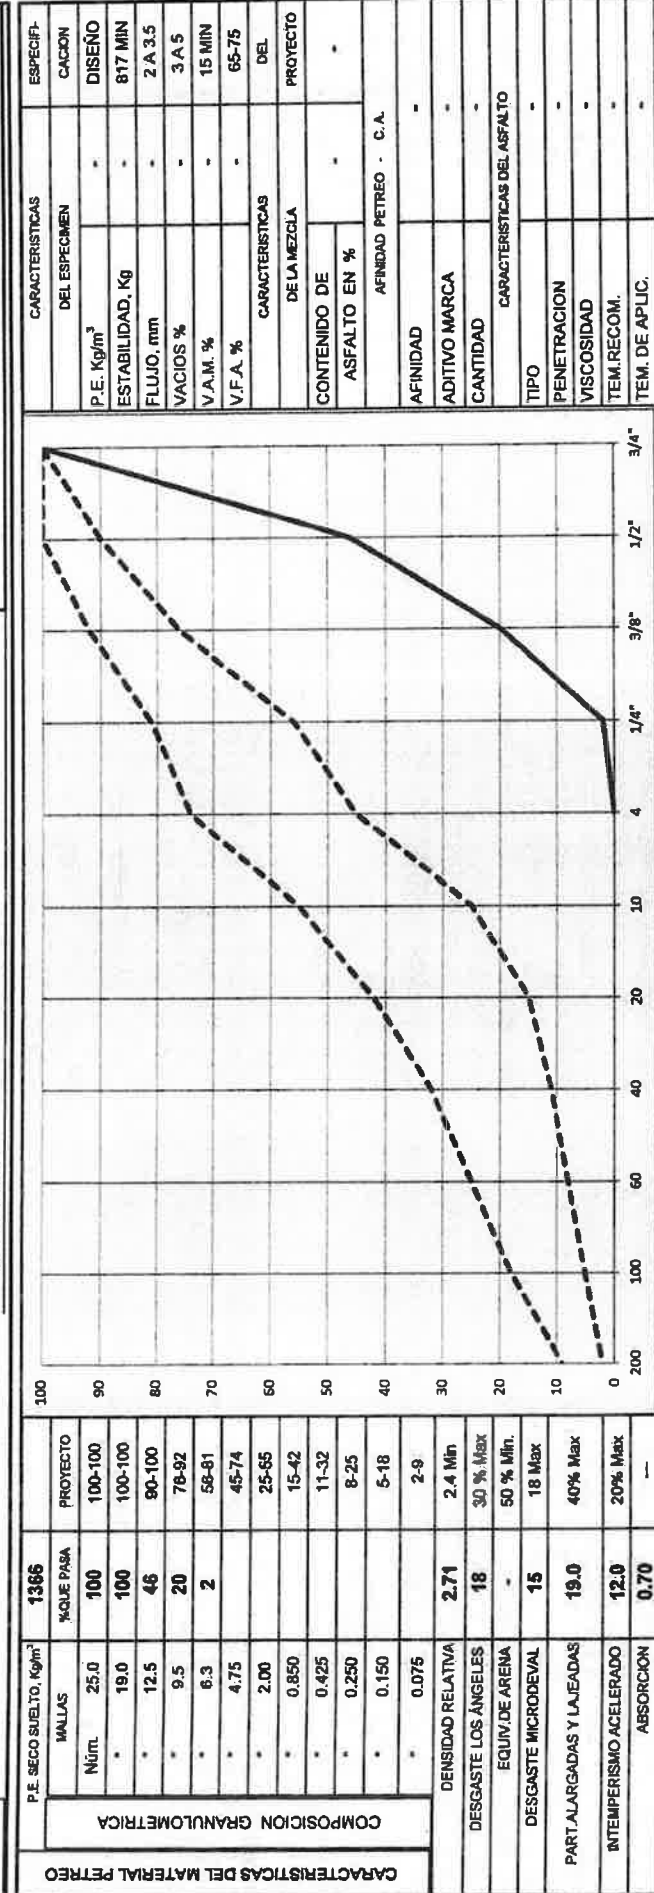

NORMA TIVA SCT N-CNT-04-04H7 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

100	85 Min
-----	--------



MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
 TÉCNICO




M.J.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
 DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

R-CMC-14

OBRA :	FRACCIONAMIENTO LAOS	ENSAYE No. :	12
		FECHA RECIBO :	2025-nov-14
	CALLE NALE	FECHA INFORME :	2025-nov-16
CONSTRUCTORA :	CIVITAS DESARROLLOS	TÉCNICO :	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ARENA CARPETA ASFALTICA ASFALTICA
CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO	GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

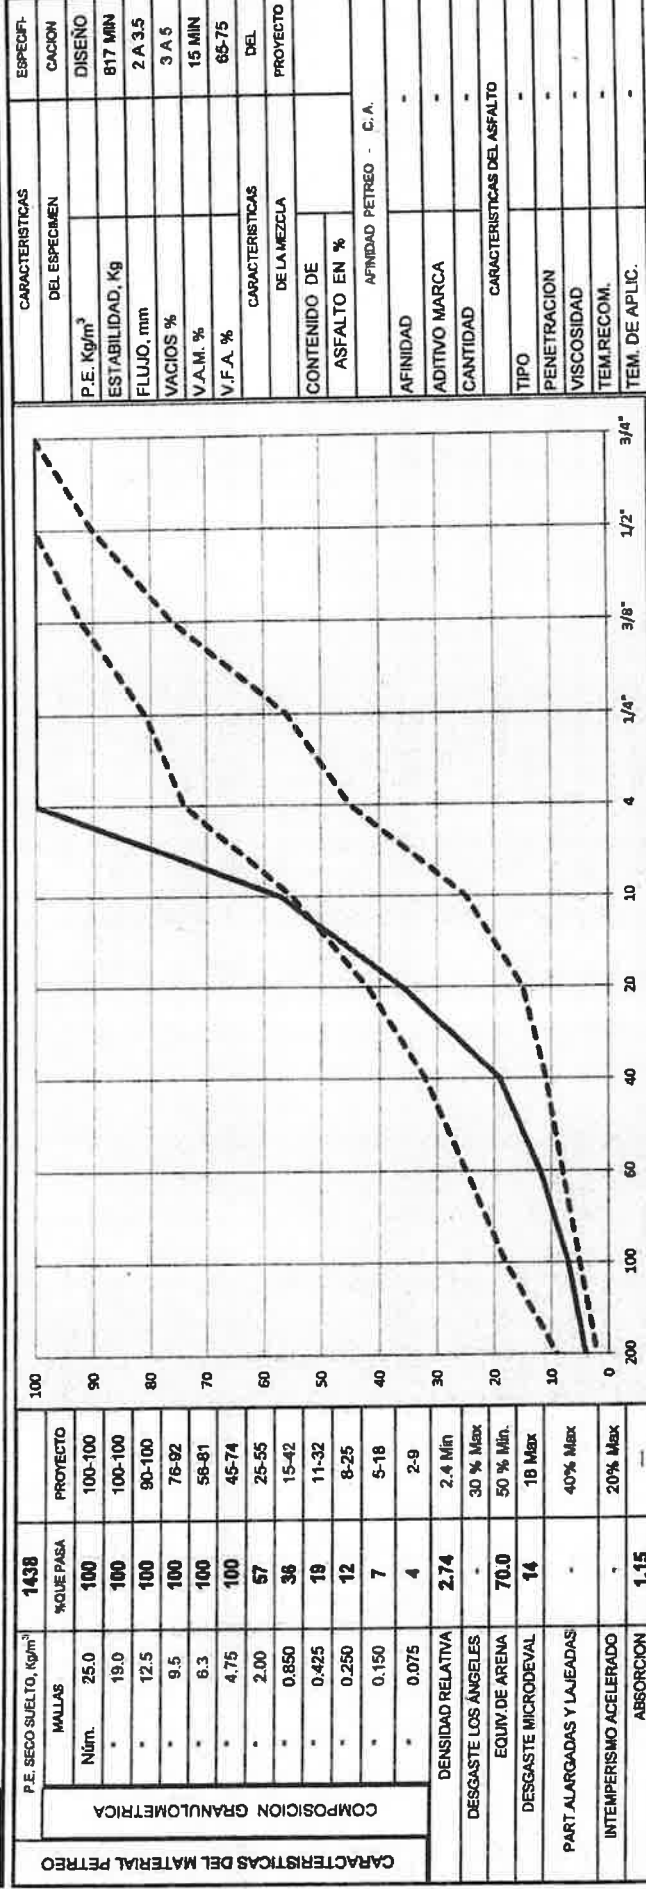

MODIFICATIVA SCT N-CONT-04-04/17 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA APROBACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TÉCNICO

M., I. LEÓNEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :	FRACCIONAMIENTO LAOS	ENSAYE No. :	13
CONSTRUCTORA :	CALLE TAKAN	FECHA RECIBO :	2025-nov-14
	CIVITAS DESARROLLOS	FECHA INFORME :	2025-nov-16
		TÉCNICO :	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	GRAVA PARA CARPETA ASFÁLTICA	
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA	
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL	
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT	
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL		PETREO	GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

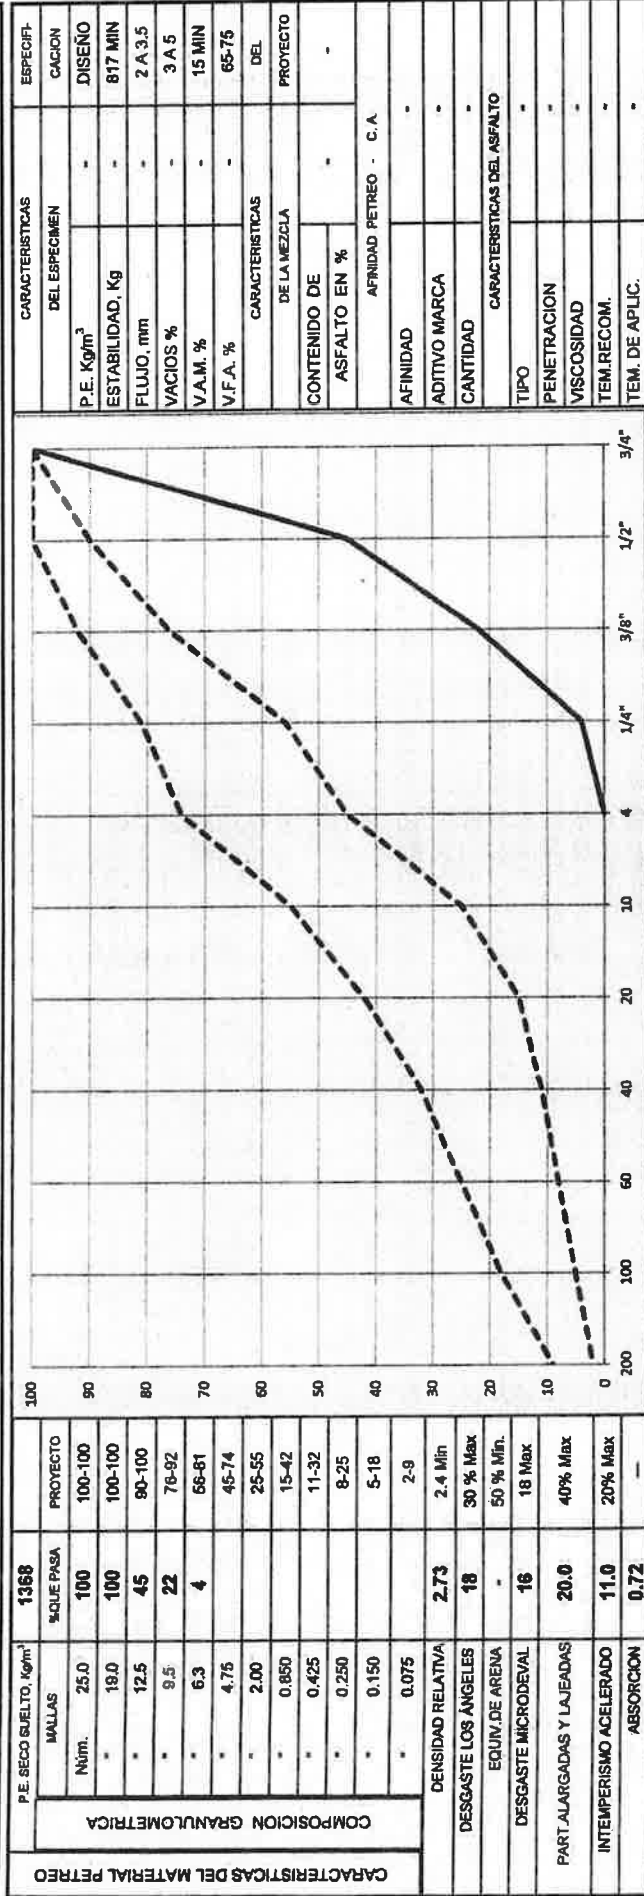

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	
EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.	

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.A. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	

OBRA :
CONSTRUCTORA :
CALLE TAKAN
CIVITAS DESARROLLOS

FRACCIONAMIENTO LAOS
ESTADO CHIHUAHUA
M.A.R.F.

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

ENSAYE No. : 14
FECHA RECIBO : 2025-nov-14
FECHA INFORME : 2025-nov-16
TÉCNICO : M.A.R.F.

DESCRIPCION DEL MATERIAL ARENA CARPETA ASFÁLTICA ASFÁLTICA

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

COMPOSICION GRANULOMETRICA

P.E. SECO SUELTO, kg/m³	1441
MALLAS	
Núm.	25.0
PROYECTO	100-100
100-100	100
100-100	100
90-100	100
75-92	100
50-61	100
45-74	100
25-55	56
15-42	37
11-32	20
8-25	11
5-18	8
2-8	4

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECÍMEN		ESPECÍMEN
P.E. Kg/m³	DEL ESPECÍMEN	CACION
ESTABILIDAD, Kg		DISEÑO
FLUJO, mm		817 MIN
VACIOS %		2 A 3.5
V.A.M. %		3 A 5
V.F.A. %		15 MIN
		65-75
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		PROYECTO
CONTENIDO DE ASFALTO EN %		
AFINIDAD PETREO - C A		
AFINIDAD		-
ADITIVO MARCA		-
CANTIDAD		-
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		
TIPO		-
PENETRACION		-
VISCOSIDAD		-
TEM.RECOM.		-
TEM. DE APLIC.		-

GRÁFICO DE GRANULOMETRÍA

NORMATIVA SCT N-CMT-04-04/17 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA
PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE ENTREGAMOS, GUÍA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :
CONSTRUCTORA : YVASA

FRACCIONAMIENTO CITTANOVA
CIRCUITO CITTANOVA NORTE

ENSAYE No. : 15
FECHA RECIBO : 2025-nov-18
FECHA INFORME : 2025-nov-20
TÉCNICO : M.A.R.F.

ESTADO CHIHUAHUA


DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL GRAVA PARA CARPETA ASFÁLTICA

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

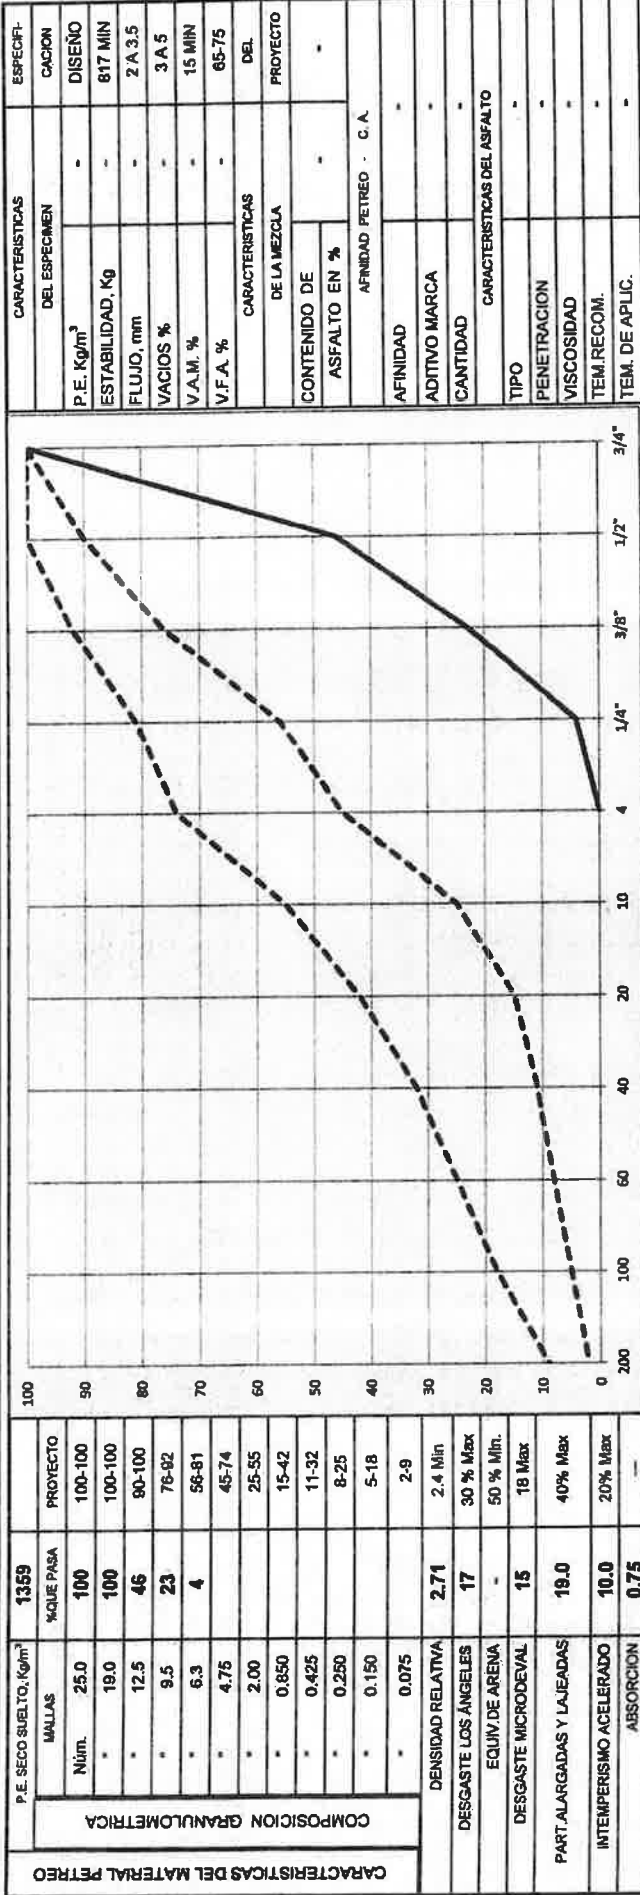

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA:	FRACCIONAMIENTO LAOS	ENSAYE No.:	16
CONSTRUCTORA:	YVASA	FECHA RECIBO:	2025-nov-18
		FECHA INFORME:	2025-nov-20
		TÉCNICO:	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	ARENA CARPETA ASFÁLTICA ASFÁLTICA
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA		

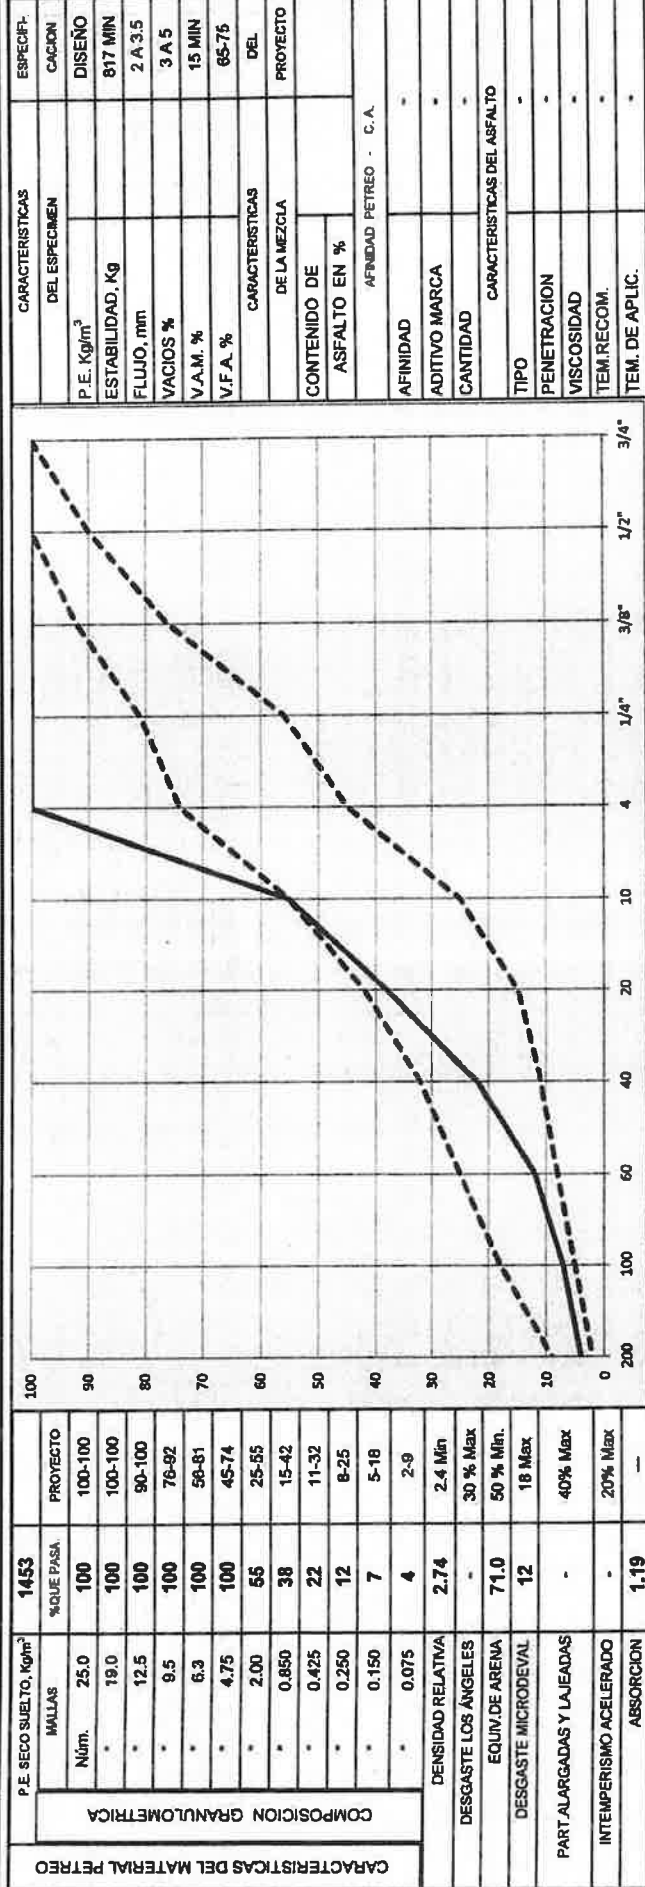

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.
ANGULARIDAD	48
AZUL DE METILENO	11
DESPEÑAMIENTO POR FRICCIÓN	-
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Cara)	-
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Cara)	-

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.L. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :	FRACCIONAMIENTO CITTANOVA	ENSAYE No. :	17
CONSTRUCTORA :	CALLE MARANELLO	FECHA RECIBO :	2025-nov-18
	YVASA	FECHA INFORME :	2025-nov-20
		TÉCNICO :	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL GRAVA PARA CARPETA ASFÁLTICA
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DKOS CHIHUAHUA

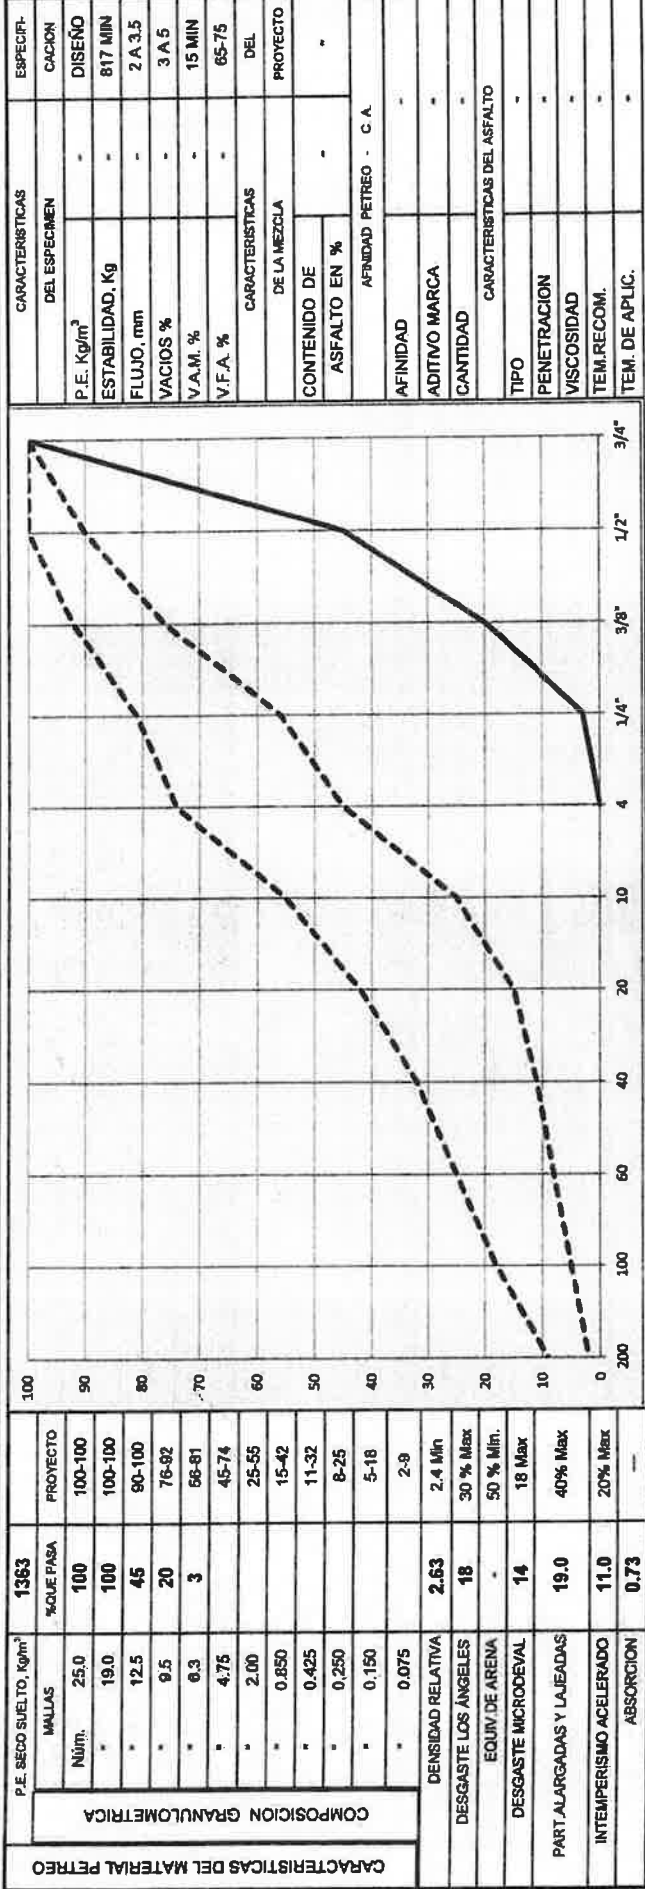

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.
----------------------------------	---


MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.A. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	
IR-CMC-14	

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1 1/2")

OBRA :	FRACCIONAMIENTO LAOS	ENSAYE No. :	18
		FECHA RECIBO :	2025-nov-18
	CALLE MARANELLO	FECHA INFORME :	2025-nov-20
CONSTRUCTORA : YVASA		TÉCNICO :	M.A.R.F.

DESCRIPCION DEL MATERIAL	
CLASIFICACION PETROGRAFICA	ARENA CARPETA ASFALTICA ASFALTICA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	ROCA CALIZA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	TRITURACION TOTAL
UBICACION DEL BANCO DE MATERIAL PETREO	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA	

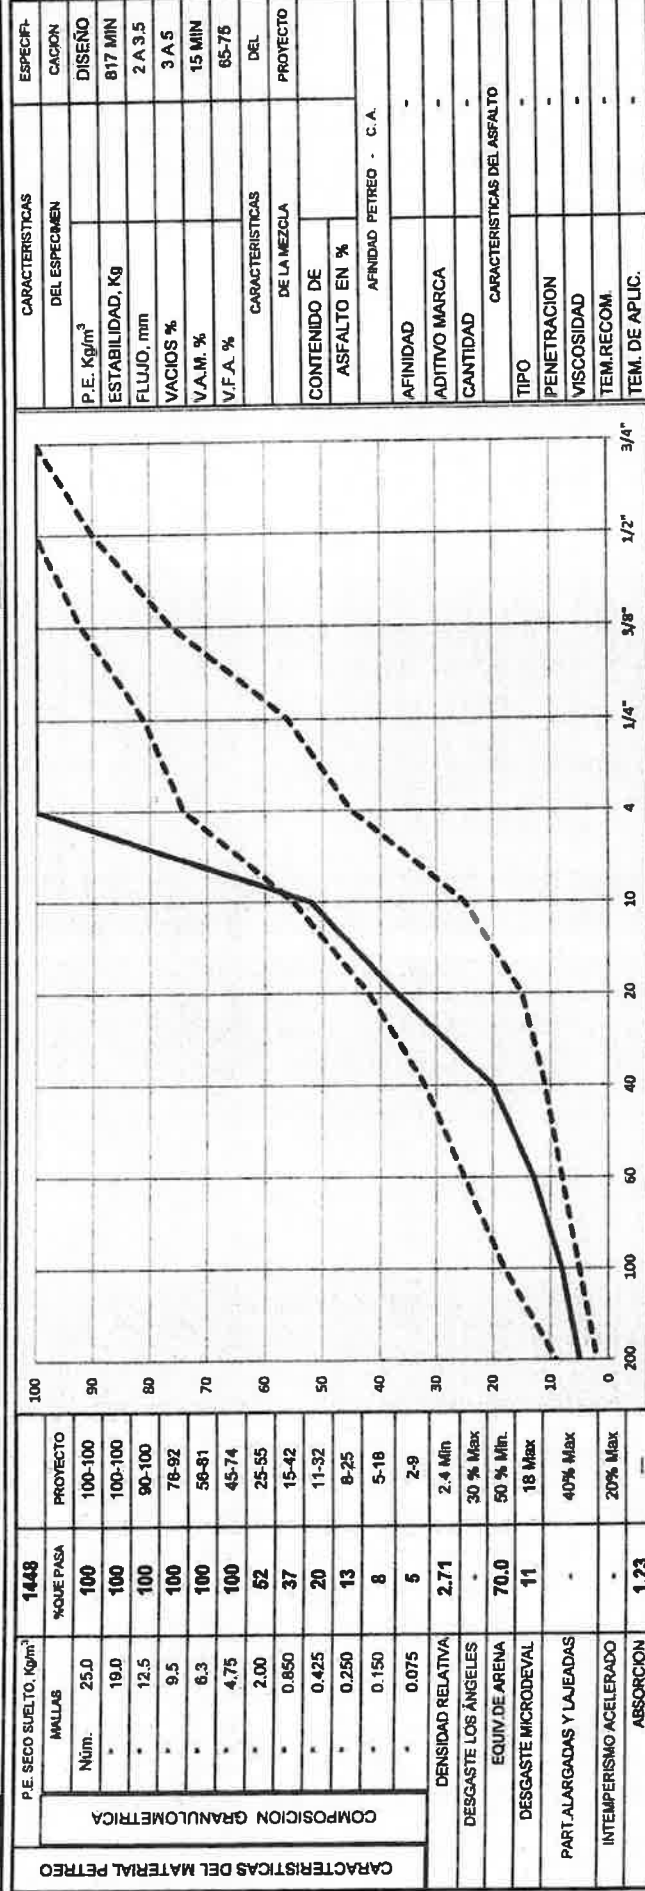

NORMATIVA SCT N-CNT-04-04/17 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

PARTICULAS TRITURADAS (2 Cara)		85 Min
MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO		
TECNICO		
M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ		
DIRECTOR TÉCNICO		
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE		

RC-CMC-14

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA: FRACCIONAMIENTO PARVATI

CIRCUITO PARVATI

CONSTRUCTORA: CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

ENSAYE No.: 19

FECHA RECIBO: 2025-nov-19

FECHA INFORME: 2025-nov-21

TÉCNICO: M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCION DEL MATERIAL GRAVA PARA CARPETA ASFALTICA

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO

P.E. SECO SUELTO, Kg/m³

1359

PROYECTO

100-100

100-100

90-100

76-92

58-81

45-74

25-55

15-42

11-32

8-25

5-18

2-9

2.71

19

13

19.0

12.0

0.68

45% Mín

15mg/g Max

20% Max

100

100

95 Mín

85 Mín

100

100

95 Mín

85 Mín

100

100

95 Mín

85 Mín

100

100

95 Mín

85 Mín

100

100

95 Mín

85 Mín

100


100

95 Mín

85 Mín

100

100

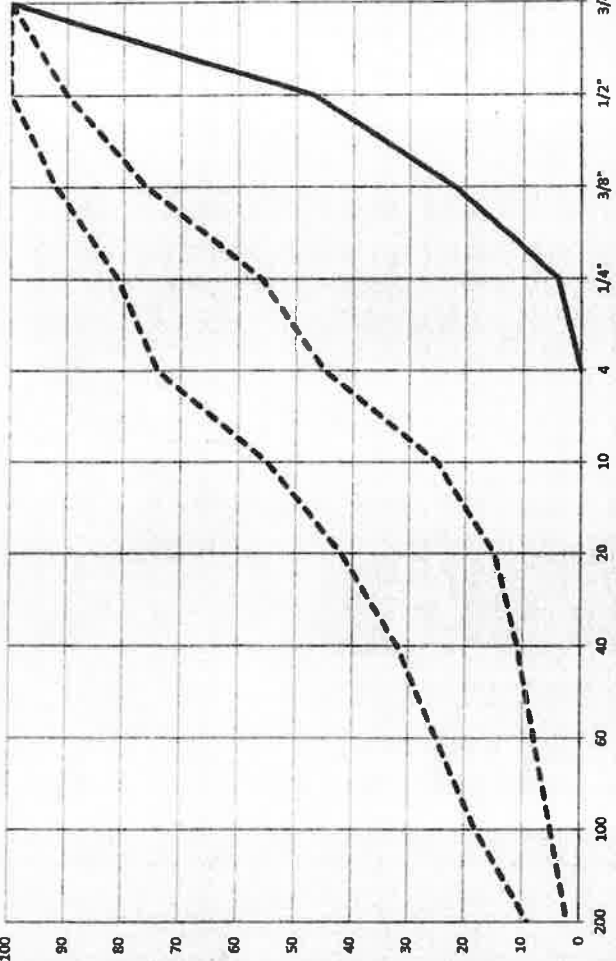

NORMATIVA SCT N-CMT-04-04/17 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TÉCNICO

M.I. LEONE/ BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA
PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O INEFICIENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :	FRACCIONAMIENTO PARVATI	ENSAYE No. :	20
CONSTRUCTORA :	CIRCUITO PARVATI	FECHA RECIBO :	2025-nov-19
	CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA INFORME :	2025-nov-21
		TÉCNICO :	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	ARENA CARPETA ASFÁLTICA
	CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO	GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

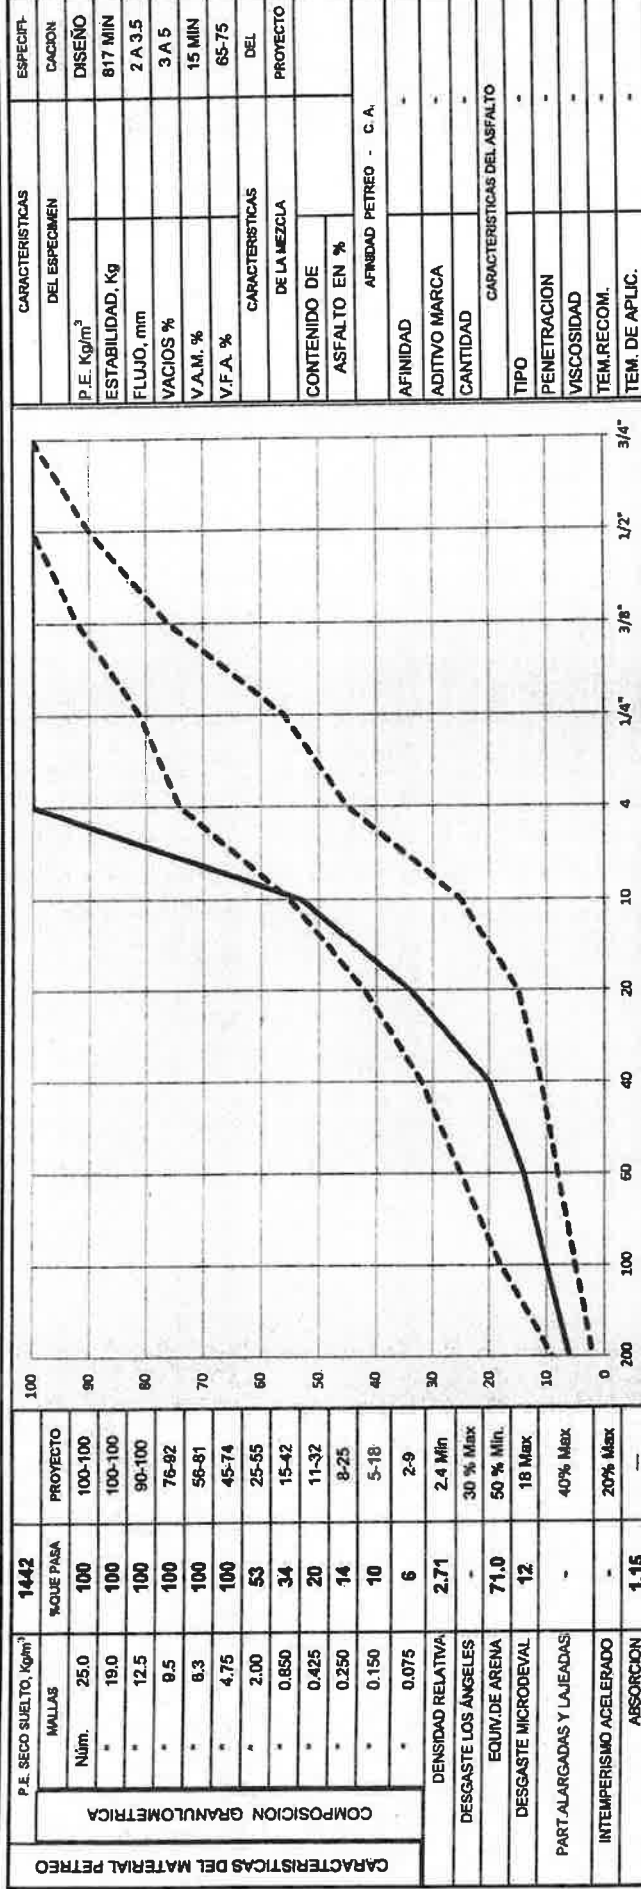

NORMATIVA SCT N-CMT-04-04-07 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.A. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	
IR-CMC-14	

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA: FRACCIONAMIENTO PARVATI

PASEO DE ANANDA

CONSTRUCTORA: CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

ENSAYE No.: 21
FECHA RECIBO: 2025-nov-19
FECHA INFORME: 2025-nov-21
TÉCNICO: M.A.R.F.

ESTADO CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO


DESCRIPCION DEL MATERIAL GRAVA PARA CARPETA ASFALTICA

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

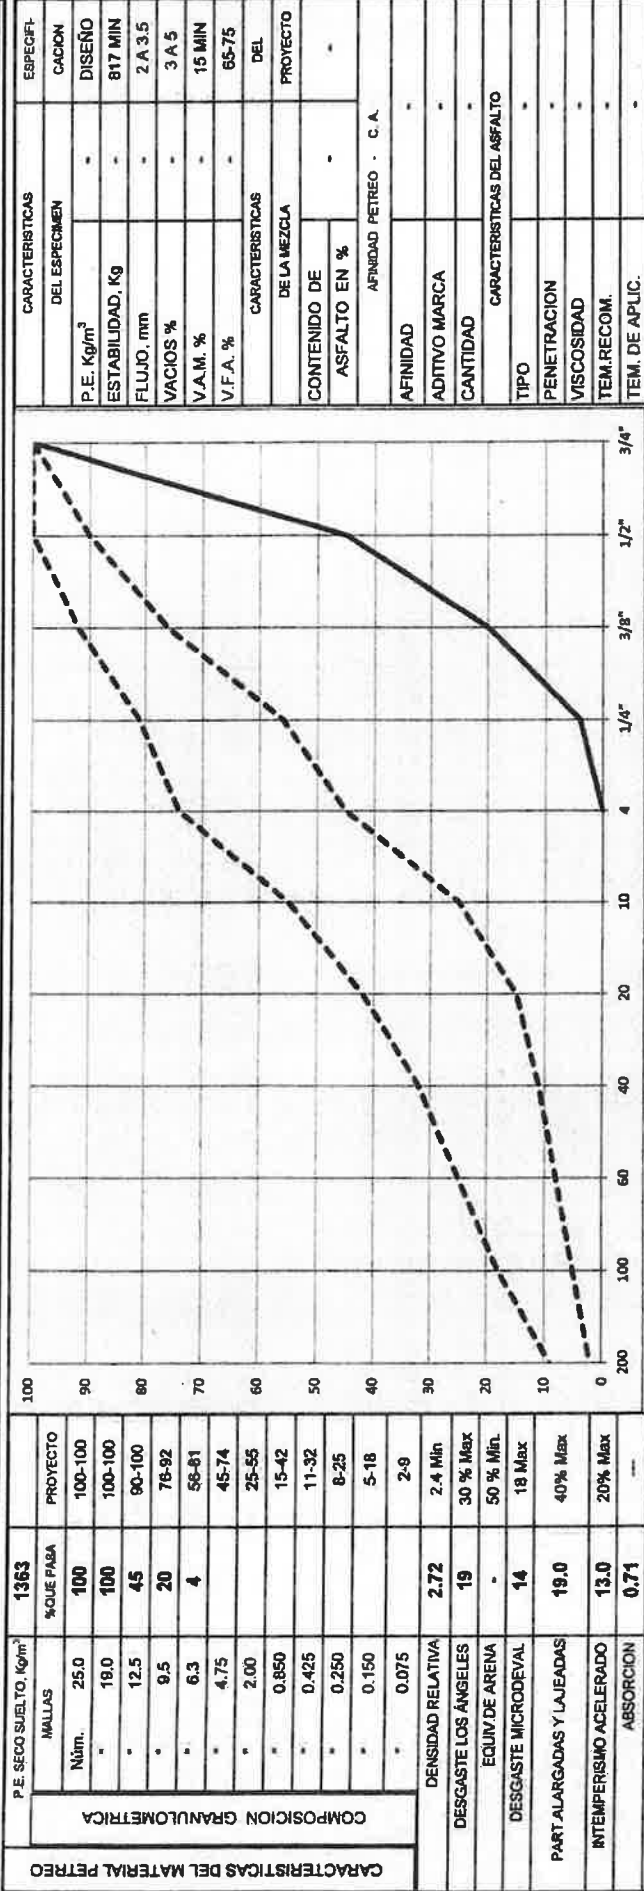

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TÉCNICO

M.J. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

CADUMA

FRACCIONAMIENTO PARVATI

22
ENSAYE No. :

FECHA RECIBO: 2025-nov-19


PASEOS DE ANANDA

FECHA INFORME: 2025-nov-21

CONSTRUCTORA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

TÉCNICO: M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	ARENA CARPETA ASFALTICA ASFALTICA
	CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL
	ROCA CALIZA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO
	TRITURACION TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO
	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETRO
	GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

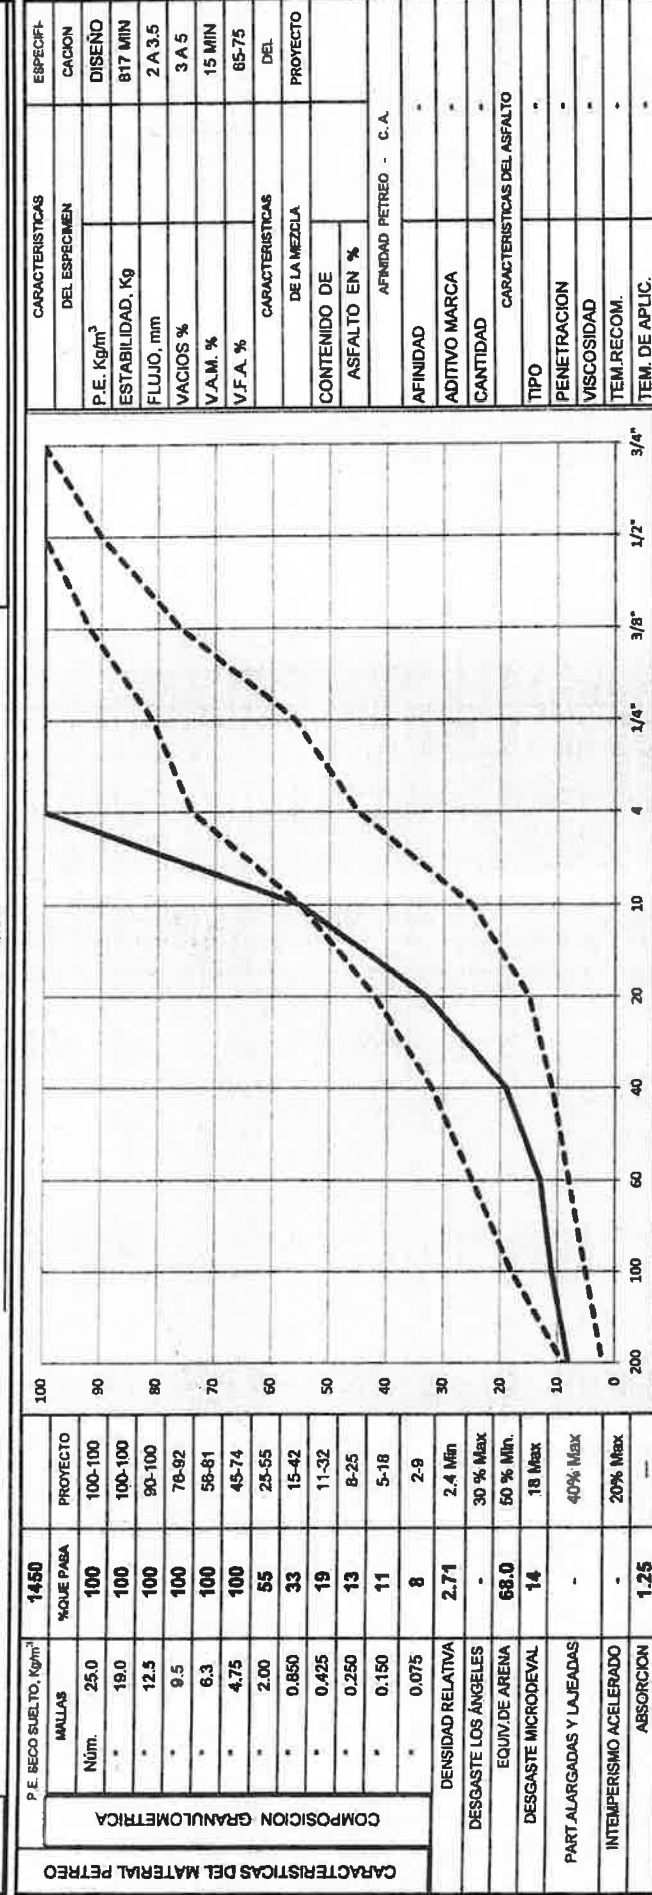

NORMATIVA SCT N-CNT-04-0417 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN	-	20% Max
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Cara)	-	95 Min
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Cara)	-	95 Min

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TÉCNICO

M. I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-10

EL RESULTADO SÓLO ES VÁLIDO PARA LA INDUSTRIA ANALIZADA

PARA CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS DE LOS RESULTADOS QUE LOS RESULTADOS ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: [CONTACTO@SELSTINA.COM](mailto:contacto@selstina.com)

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR CADUNA DE LAS CONSULTAS. 8. DE R.L. DE C.V.


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA:	FRACCIONAMIENTO PARVATI	ENSAYE No.:	23
CONSTRUCTORA:	CIRCUITO INDRA	FECHA RECIBO:	2025-nov-20
	CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA INFORME:	2025-nov-22
		TÉCNICO:	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	GRAVA PARA CARPETA ASFALTICA
	CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO	GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

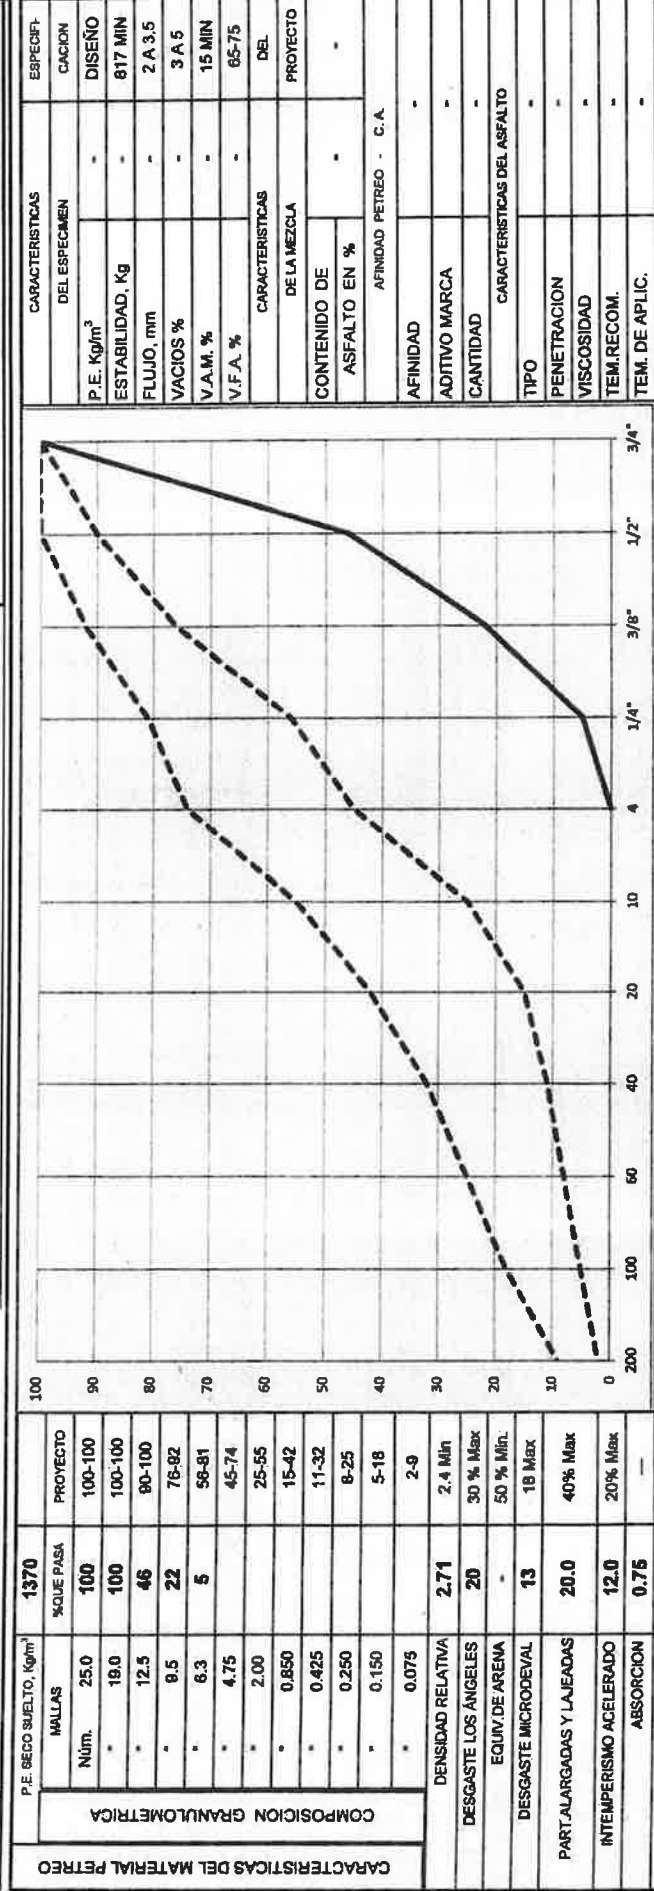

NORMATIVA SCT N-CMT-04-0017 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.A. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	
IR-CMC-14	

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :
CONSTRUCTORA :
CIRCUITO INDRA
CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

FRACCIONAMIENTO PARVATI
ESTADO CHIHUAHUA
M.A.R.F.

ENSAYE No. :
FECHA RECIBO :
FECHA INFORME :
TÉCNICO :

24
2025-nov-20
2025-nov-22
M.A.R.F.

DESCRIPCION DEL MATERIAL ARENA CARPETA ASFALTICA ASFALTICA

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO			P.E. SECO SUELTO, Kg/m³		1448	%QUE PASA	PROYECTO
COMPOSICION GRANULOMETRICA			MALLAS				
			Núm.	25.0	100	100-100	100-100
			*	19.0	100	100-100	100-100
			*	12.5	100	90-100	90-100
			*	9.5	100	76-92	76-92
			*	6.3	100	56-81	56-81
			*	4.75	100	45-74	45-74
			*	2.00	51	25-55	25-55
			*	0.850	32	15-42	15-42
			*	0.425	18	11-32	11-32
			*	0.250	12	8-25	8-25
			*	0.150	8	5-18	5-18
			*	0.075	4	2-9	2-9
DENSIDAD RELATIVA			2.75				
DESGASTE LOS ÁNGELES			-				
EQUIV.DE ARENA			73.0				
DESGASTE MICRODEVAL			14				
PART.ALARGADAS Y LAJEADAS			-				
INTEMPERISMO ACELERADO			-				
ABSORCION			1.15				

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACION
P.E. Kg/m³		DISEÑO
ESTABILIDAD, Kg		817 MIN
FLUJO, mm		2 A 3.5
VACIOS %		3 A 5
V.A.M. %		15 MIN
V.F.A. %		65-75
CARACTERÍSTICAS		DEL
DE LA MEZCLA		PROYECTO
CONTENIDO DE		
ASFALTO EN %		
AFINIDAD PETREO - C.A.		
AFINIDAD		-
ADITIVO MARCA		-
CANTIDAD		-
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		
TIPO		-
PENETRACION		-
VISCOSIDAD		-
TEM.RECOM.		-
TEM. DE APLIC.		3/4"

EL RESULTADO SOLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, CHEQUEA O SUGIERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TÉCNICO

M. J. LEONEL BARBIEROS JUÁREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA:	FRACCIONAMIENTO PARVATI	ENSAYE No.:	25
CONSTRUCTORA:	CALLE BHAGA	FECHA RECIBO:	2025-nov-21
		FECHA INFORME:	2025-nov-23
		TÉCNICO:	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL GRAVA PARA CARPETA ASFÁLTICA
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACÉN EN PLANTA PERMONT
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA	

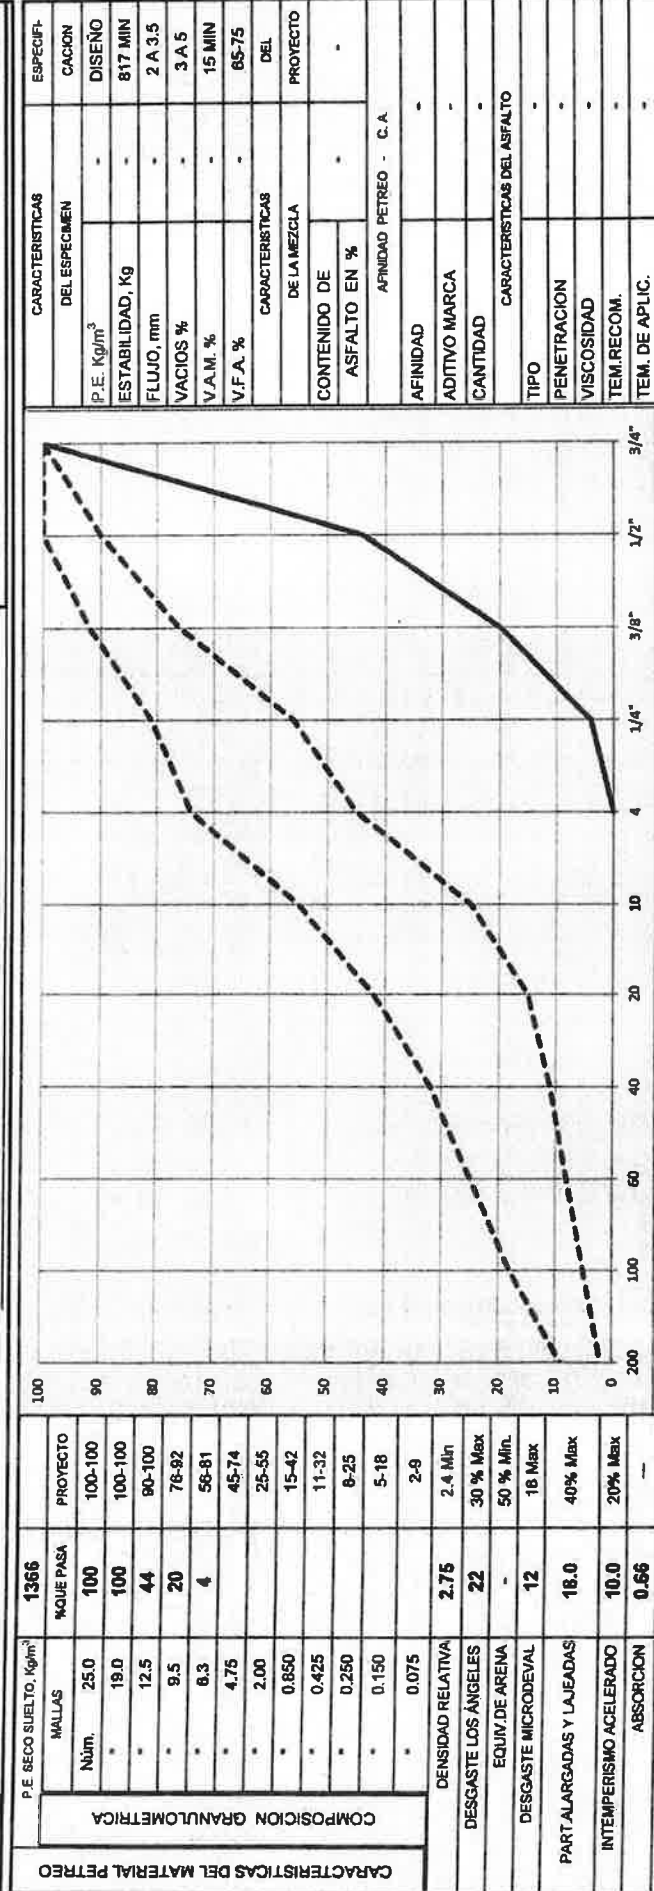

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.A. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	
IR-CMC-14	

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

OBRA: **FRACCIONAMIENTO PARVATI**

CONSTRUCTORA: **CORPORACION TECNICA DE URBANISMO**

ESTADO CHIHUAHUA

ENSAYE No.: **26**

FECHA RECIBO: **2025-nov-21**

FECHA INFORME: **2025-nov-23**

TÉCNICO: **M.A.R.F.**

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ARENA CARPETA ASFÁLTICA ASFÁLTICA

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL **ROCA CALIZA**

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO **TRITURACIÓN TOTAL**

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO **ALMACÉN EN PLANTA PERMONT**

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO **GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA**

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO		COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA		P.E. SECO SUELTO, Kg/m ³		1451		PROYECTO	
		MALLAS		%		QUE PASA			
		Núm.							
			25.0		100		100-100		100-100
			19.0		100		100-100		100-100
			12.5		100		90-100		90-100
			9.5		100		78-92		78-92
			6.3		100		56-81		56-81
			4.75		100		45-74		45-74
			2.00		49		25-55		25-55
			0.850		30		15-42		15-42
			0.425		17		11-32		11-32
			0.250		11		8-25		8-25
			0.150		7		5-18		5-18
			0.075		4		2-9		2-9
DENSIDAD RELATIVA		2.75		2.4 Min		30 % Max		30 % Max	
DESGASTE LOS ÁNGELES		-		-		50 % Min.		50 % Min.	
EQUIV. DE ARENA		73.0		14		18 Max		18 Max	
DESGASTE MICRODEVAL		-		-		40% Max		40% Max	
PART ALARGADAS Y LAJEADAS		-		-		20% Max		20% Max	
INTEMPERISMO ACELERADO		1.18		-		45% Min		45% Min	
ANGULARIDAD		45		10		15mg/g Max		15mg/g Max	
AZUL DE METILENO		-		-		20% Max		20% Max	
DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN		-		-		95 Min		95 Min	
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Carr)		-		-		85 Min		85 Min	
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Carr)		-		-					

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

200

100

60

40

20

10

4

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

200

100

60

40

20

10

4

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

CARACTERÍSTICAS

DEL ESPECIMEN

P.E. Kg/m³

ESTABILIDAD, Kg

FLUJO, mm

VACIOS %

V.A.M. %

V.F.A. %

CARACTERÍSTICAS

DE LA MEZCLA

CONTENIDO DE

ASFALTO EN %

AFINIDAD PETREO - C.A.

AFINIDAD

ADITIVO MARCA

CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO

TIPO

PENETRACIÓN

VISCOSIDAD

TEM.RECOM.

TEM. DE APLIC.

ESPECIF.

CACIÓN

DISEÑO

817 MIN

2 A 3.5

3 A 5

15 MIN

65-75

DEL

PROYECTO

NORMATIVA SCT N-CMT-04-04-017 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO

TÉCNICO

M.A.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA :	FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL	ENSAYE No. :	27
CONSTRUCTORA :	CALLE SIERRA CALIFORNIANA	FECHA RECIBO :	2025-nov-21
	ROAC GRUPO INMOBILIARIO	FECHA INFORME :	2025-nov-23
		TÉCNICO :	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL GRAVA PARA CARPETA ASFÁLTICA
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL Roca Caliza
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO Trituración Total
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO Almacén en Planta Nirvana
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

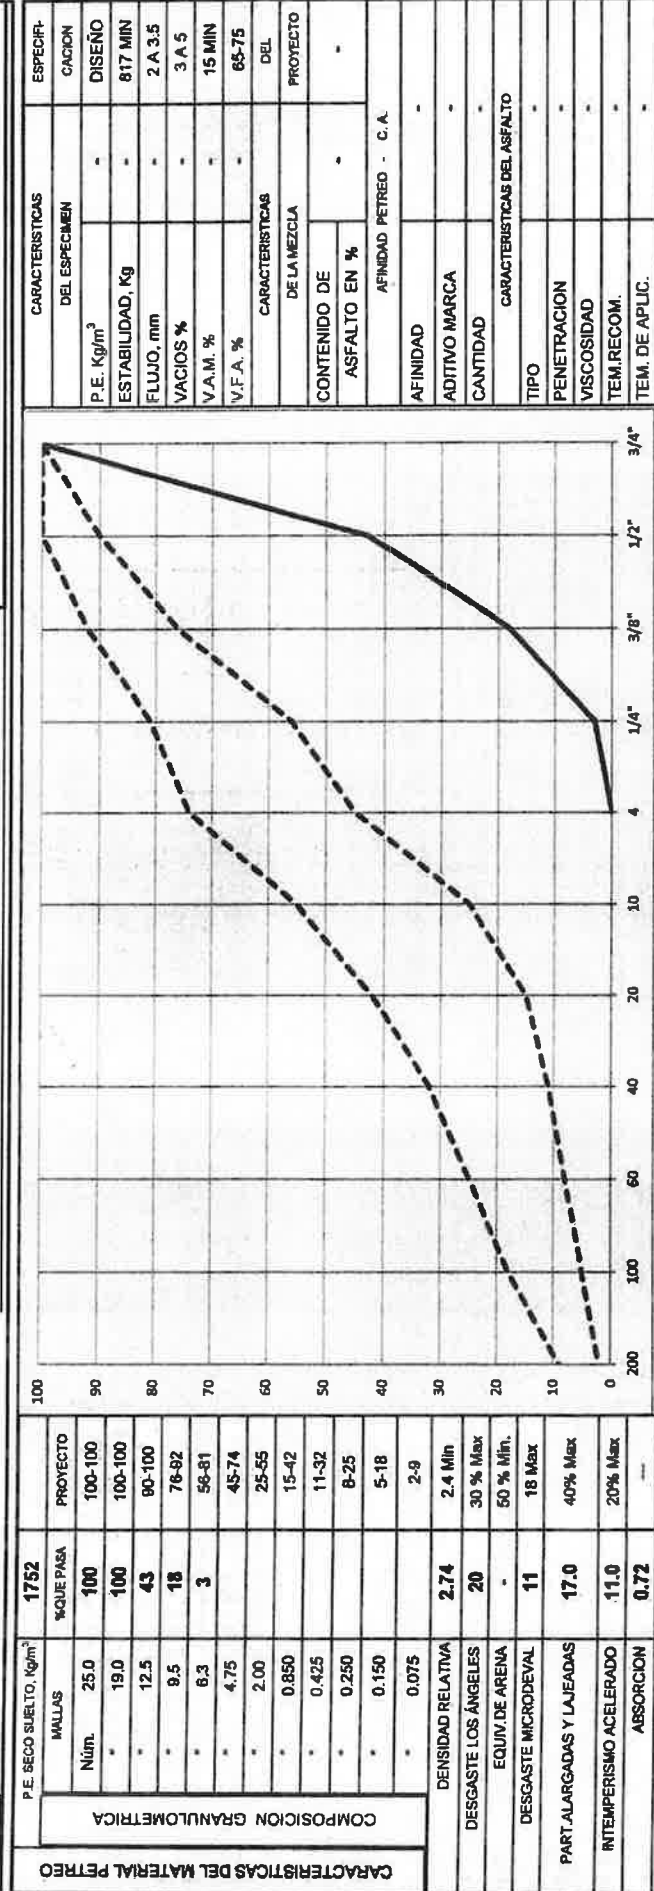

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	
NORMATIVA SCT N-CMT-04-0417 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS	
EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.	

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.J.J. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	
IR-CMC-14	

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA:	FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL	ENSAYE No.:	28
CONSTRUCTORA:	CALLE SIERRA CALIFORNIANA	FECHA RECIBO:	2025-nov-21
	ROAC GRUPO INMOBILIARIO	FECHA INFORME:	2025-nov-23
		TÉCNICO:	M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	ARENA CARPETA ASFÁLTICA ASFÁLTICA
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACÉN EN PLANTA NIRVANA
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO		GCC MATERIALES, NOMBRE DE DIOS CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO			P.E. SECO SUELTO, Kg/m ³		PROYECTO		CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACION	
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA			MALLAS	% QUE PASA	100-100	100-100	P.E. Kg/m ³	ESTABILIDAD, Kg	DISEÑO	CACION
			Núm.		100	100-100			817 MIN	
					100	90-100			2 A 3.5	
					100	76-92			3 A 5	
					100	56-81			15 MIN	
					100	45-74			65-75	
					50	25-55			DEL	
					33	15-42			PROYECTO	
					19	11-32				
					12	8-25				
					8	5-18				
					5	2-9				
DENSIDAD RELATIVA					2.71	2.4 Min				
DESGASTE LOS ÁNGELES					-	30 % Max				
EQUIV. DE ARENA					72.0	50 % Min.				
DESGASTE MICRODEVAL					11	18 Max				
PART. ALARGADAS Y LAJEADAS					-	40% Max				
INTEMPERISMO ACELERADO					-	20% Max				
ABSORCIÓN					1.27	-				
ANGULARIDAD					45	45% Min				
AZUL DE METILENO					11	15mg/g Max				
DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN					-	20% Max				
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Cara)					-	95 Min				
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Caras)					-	85 Min				

NORMATIVA SCT N-CMT-04-04-17 MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA EMPLEARSE EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDAMENTE DOSIFICADO.

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO	M.A.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	

1.4- INFORMES DE DISEÑO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO LAOS	
LOCALIZACIÓN : C. LAOS	ENSAJE No. : 16
CONSTRUCTORA : CIVITAS DESARROLLOS	FECHA RECIBO : 2025-nov-07
	FECHA INFORME : 2025-nov-10
	TÉCNICO : M.A.R.F.
	CIUDAD : CHIHUAHUA
	ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL	PETREO PLANTA PERMONT

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO			CARACTERÍSTICAS DEL ESPECÍMEN		ESPECIFICACION
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA			P.E. Kg/m ³		DISEÑO
P.E. SECO SUELTO, Kg/m ³			PROYECTO		817 MIN
MALLAS			% QUE PASA		2 A 3.5
Núm.					3 A 5
25.0			100		14 MIN
19.0			100		65-75
12.5			93		
9.5			83		
6.3			64		
4.75			50		
2.00			35		
0.850			23		
0.425			16		
0.250			12		
0.150			8		
0.075			3		
DENSIDAD RELATIVA			-		
DESGASTE LOS ÁNGELES			-		
EQUIV. DE ARENA			-		
DESGASTE MICRODEVAL			-		
PART. ALARGADAS Y LAJEADAS			-		
INTERPERISMO ACCELERADO			-		
ABSORCIÓN			-		
ANGULARIDAD			-		
AZUL DE METILENO			-		
DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN			-		
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Cara)			-		
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Caras)			-		

Tamaño de Malla (inches)	Proyecto (%)	Diseño (%)
3/4"	100	100
1/2"	100	100
1/4"	100	100
3/8"	100	100
1/2"	100	100
1/4"	100	100
3/8"	100	100
1/2"	100	100
3/4"	100	100

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	
NORMATIVA SCT N-CMT-4-06-00316 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS	
LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA	

M.J. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ DIRECTOR TÉCNICO	
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	
IR-CMC-14	


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO LAOS	ENSAYE No. : 17
LOCALIZACIÓN : C. BOKEO	FECHA RECIBO : 2025-nov-07
CONSTRUCTORA : CIVITAS DESARROLLOS	FECHA INFORME : 2025-nov-10
	TÉCNICO : M.A.R.F.
	CIUDAD : CHIHUAHUA
	ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO	PLANTA PERMONT

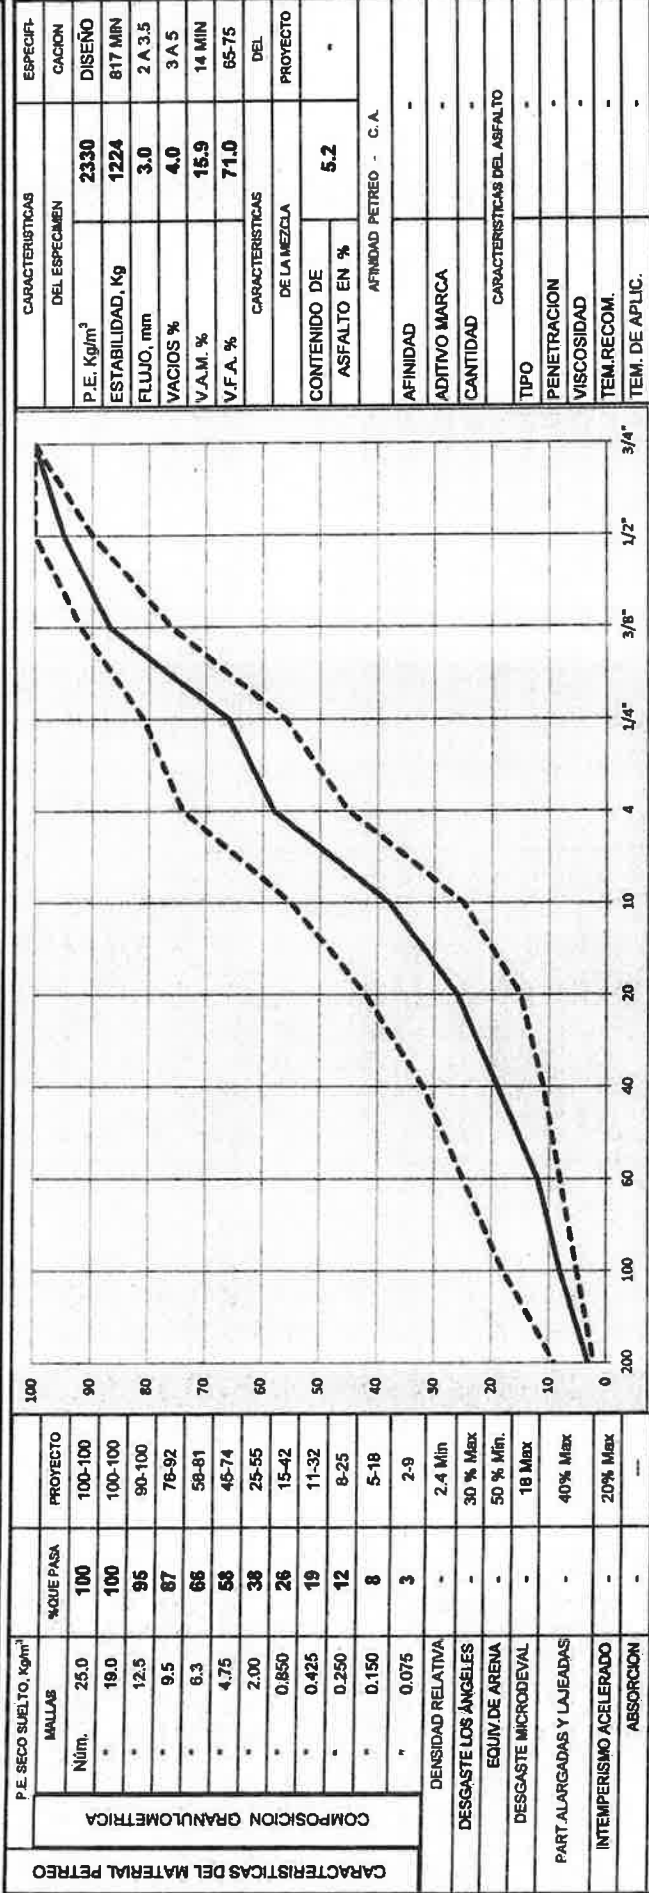

NORMATIVA SCT N-CMT-4-05-003/16 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

MJ LEONEL BARRIENTOS JUAREZ	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

OBRA : FRACCIONAMIENTO LAOS

LOCALIZACIÓN : C. NALE

CONSTRUCTORA : CIVITAS DESARROLLOS

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

ENSAYE No. : 18

FECHA RECIBO : 2025-nov-14

FECHA INFORME : 2025-nov-17

TÉCNICO : M.A.R.F.

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL

ROCA CALIZA TRITURADA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO

TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO

EXTENDEDORA

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL

PETREO PLANTA PERMONT

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

MALLAS	%QUE PASA	PROYECTO
Núm. 25.0	100	100-100
" 19.0	100	100-100
" 12.5	93	90-100
" 9.5	81	76-92
" 6.3	63	56-81
" 4.75	50	45-74
" 2.00	35	25-55
" 0.850	21	15-42
" 0.425	16	11-32
" 0.250	12	8-25
" 0.150	8	5-18
" 0.075	3	2-9

DENSIDAD RELATIVA

2.4 Min

30 % Max

EQUIV.DE ARENA

50 % Min.

18 Max

PART ALARGADAS Y LAJEADAS

40% Max

INTEMPISMO ACELERADO

20% Max

ABSORCIÓN

45% Min

15mg/g Max

20% Max

PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Canal)

95 Min

PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Canal)

95 Min

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACIÓN
P.E. Kg/m ³	2317	DISEÑO
ESTABILIDAD, Kg	1248	817 MIN
FLUJO, mm	2.4	2 A 3.5
VACIOS %	4.5	3 A 5
V.A.M. %	16.1	14 MIN
V.F.A. %	68.0	65-75
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		DEL PROYECTO
CONTENIDO DE ASFALTO EN %	5.1	
AFINIDAD PETREO - C.A.		
AFINIDAD		-
ADITIVO MARCA		-
CANTIDAD		-
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		
TIPO		-
PENETRACION		-
VISCOSIDAD		-
TEM.RECOM.		-
TEM. DE APLIC.		-

GRÁFICO DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

200

100

60

40

20

10

4

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

13

MJ LEONEL BARBIENTOS JUAREZ

DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO LAOS	ENSAYE No. : 19
LOCALIZACIÓN : C. BALEC	FECHA RECIBO : 2025-nov-14
CONSTRUCTORA : CIVITAS DESARROLLOS	FECHA INFORME : 2025-nov-17
	TÉCNICO : M.A.R.F.
	CIUDAD : CHIHUAHUA
	ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL	PETREO PLANTA PERMONT

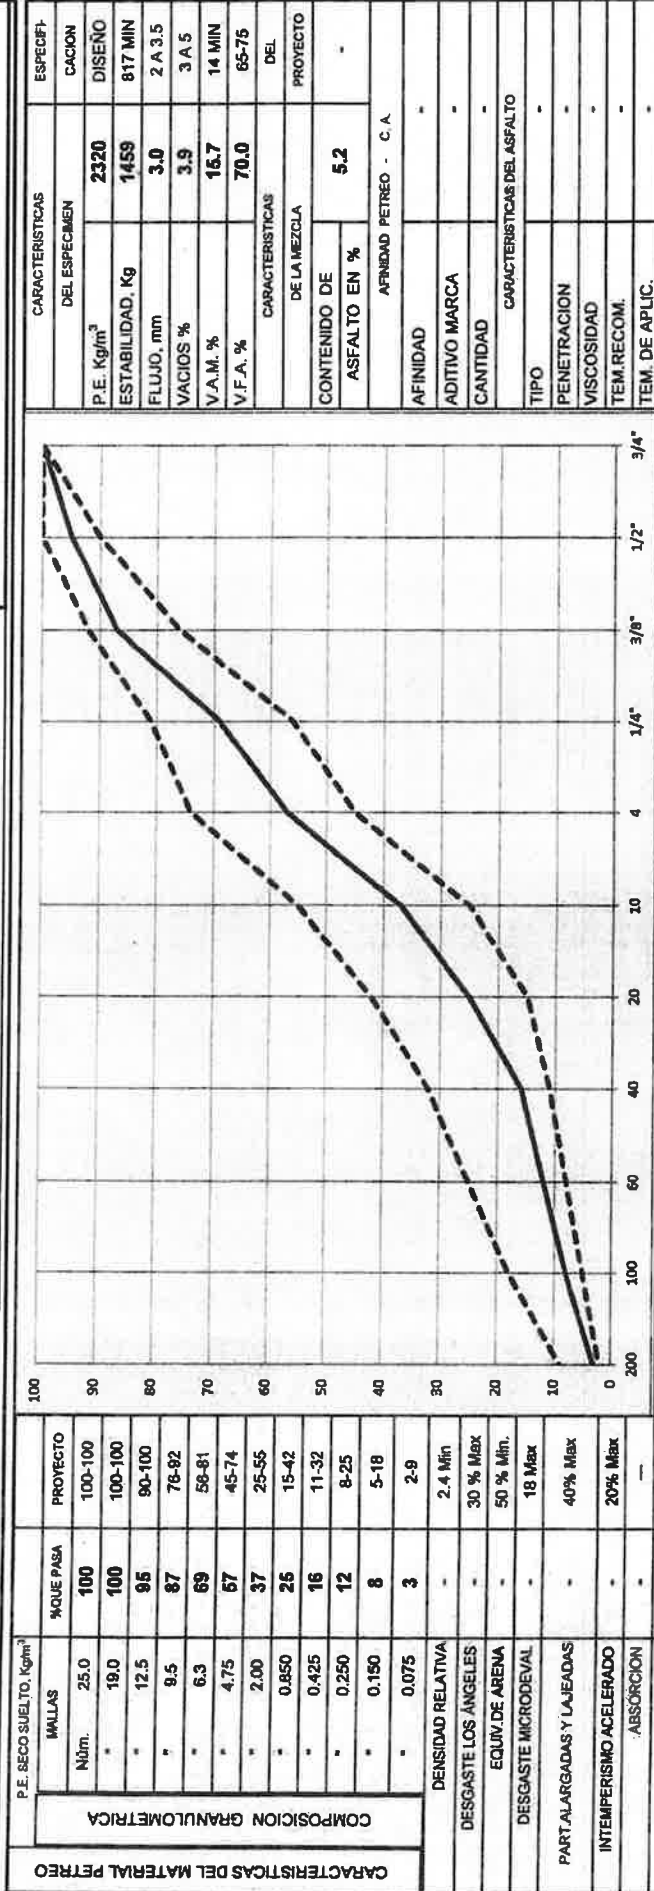

NORMATIVA SCT N-CMT-4-05-003716 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA: FRACCIONAMIENTO LAOS

LOCALIZACIÓN: C. TAKAN

CONSTRUCTORA: CIVITAS DESARROLLOS

ENSAYE No.: 20

FECHA RECIBO: 2025-nov-14

FECHA INFORME: 2025-nov-17

TÉCNICO: M.A.R.F.

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL: ROCA CALIZA TRITURADA


TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO: EXTENDEDORA

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL: PETREO PLANTA PERMONT

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO

P.E. SECO SUELO, Kg/m ³	MALLAS	% QUE PASA	PROYECTO
Núm.	25.0	100	100-100
"	19.0	100	100-100
"	12.5	96	90-100
"	9.5	88	75-92
"	6.3	71	50-81
"	4.75	62	45-74
"	2.00	38	25-55
"	0.850	26	15-42
"	0.425	18	11-32
"	0.250	12	8-25
"	0.150	8	5-18
"	0.075	3	2-9

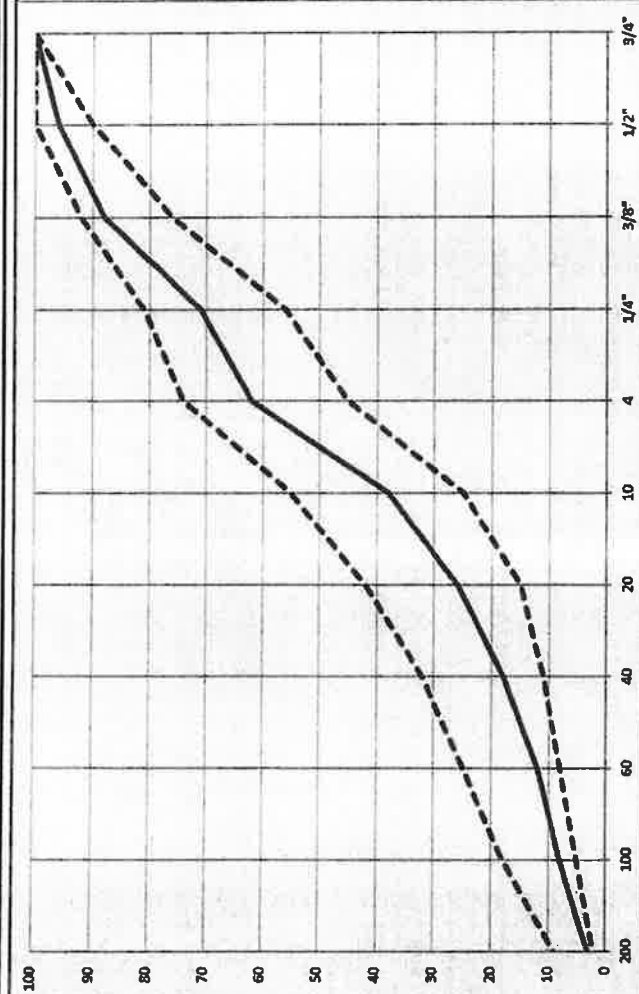

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACIÓN
P.E. Kg/m ³	2329	DISEÑO
ESTABILIDAD, Kg	1453	817 MIN
FLUJO, mm	3.1	2 A 3.5
VACÍOS %	3.8	3 A 5
V.A.M. %	16.0	14 MIN
V.F.A. %	71.0	65-75
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		DEL PROYECTO
CONTENIDO DE ASFALTO EN %	5.2	-
AFINIDAD PETREO - C. A.		-
AFINIDAD	-	-
ADITIVO MARCA	-	-
CANTIDAD	-	-
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		-
TIPO	-	-
PENETRACIÓN	-	-
VISCOSIDAD	-	-
TEM. RECOM.	-	-
TEM. DE APLIC.	-	-

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

DENSIDAD RELATIVA	2.4 Min
DESGASTE LOS ÁNGELES	30 % Max
EQUIV. DE ARENA	50 % Min.
DESGASTE MICRODEVAL	18 Max
PART. AJARGADAS Y LAJEADAS	40% Max
INTEMPERISMO ACELERADO	20% Max
ABSORCIÓN	---
ANGULARIDAD	45% Min
AZUL DE METILENO	15mg/100 Max
DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN	20% Max
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Cara)	95 Min
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Cara)	85 Min

NORMATIVA SCT N-CMT-4-05-00316 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO CITTANOVA		ENSAYE No. : 21
LOCALIZACIÓN : CIRCUITO CITTANOVA SUR	CIUDAD : CHIHUAHUA	FECHA RECIBO : 2025-nov-14
CONSTRUCTORA : YVASA	ESTADO : CHIHUAHUA	FECHA INFORME : 2025-nov-17
		TÉCNICO : M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL	PETREO PLANTA PERMONT

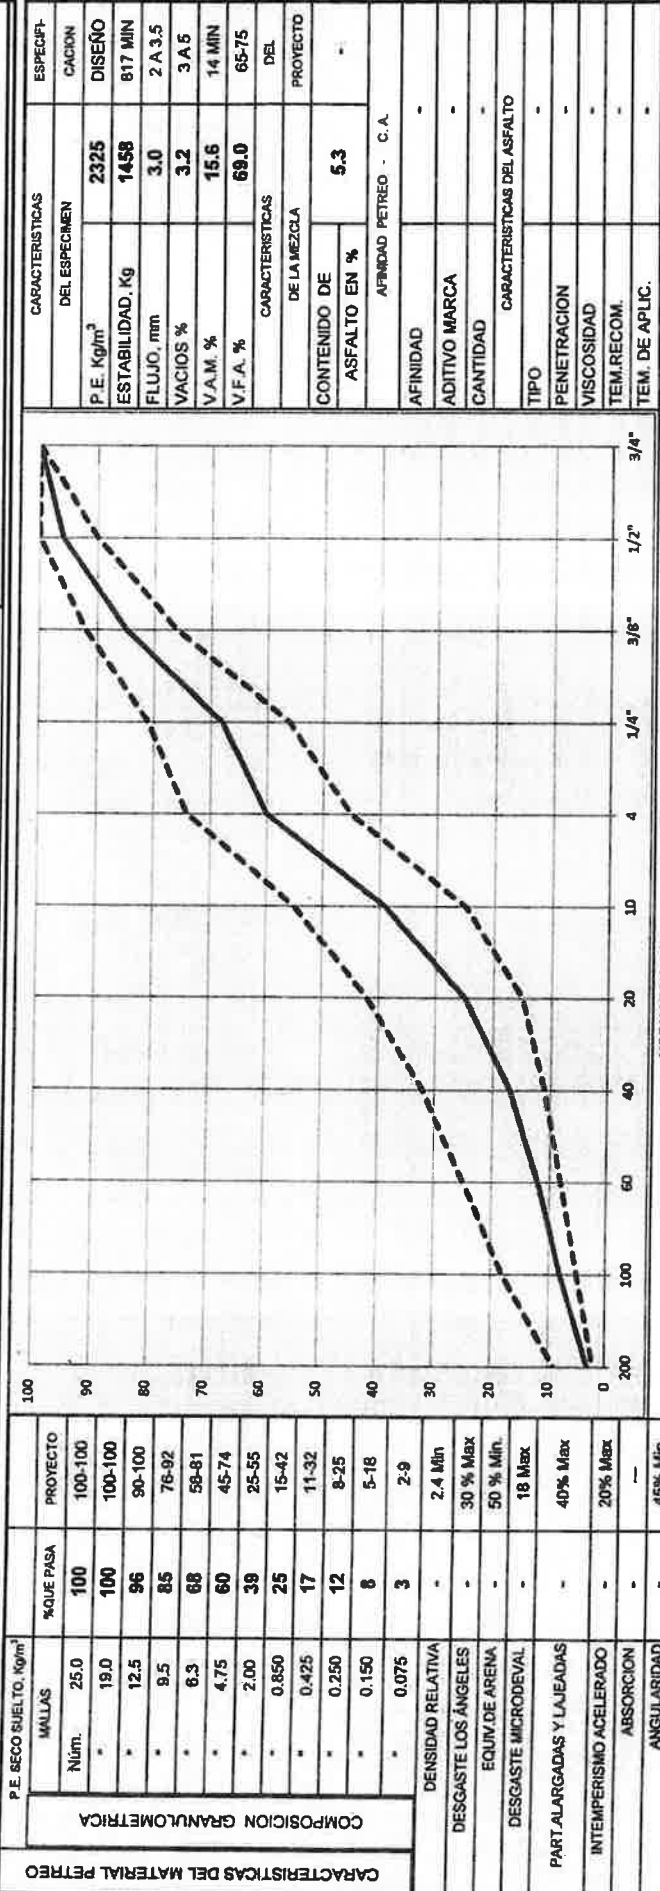

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

MLI LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

OBRA : FRACCIONAMIENTO CITTANOVA		CALIDAD DE CARPETA ASFALTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")	
LOCALIZACIÓN : CIRCUITO CITTANOVA ESTE		ENSAYE No. : 22	
CONSTRUCTORA : YVASA		FECHA RECIBO : 2025-nov-18	
		FECHA INFORME : 2025-nov-21	
		TÉCNICO : M.A.R.F.	
CIUDAD : CHIHUAHUA			
ESTADO : CHIHUAHUA			
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"			
CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA TRITURADA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EXTENDEIDORA			
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO PLANTA PERMONT			
DATOS DEL MUESTREO			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO			
P.E. SECO SUELTO, Kg/m ³			
MALLAS			
Num.			
25.0			
100			
100-100			
100			
98			
90-100			
85			
76-82			
69			
58-81			
45-74			
25-55			
15-42			
11-32			
8-25			
5-18			
2-9			
2.4 Min			
30 % Max			
50 % Min.			
18 Max			
40% Max			
20% Max			
45% Min			
15mp/g Max			
20% Max			
95 Min			
85 Min			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
NORMATIVA SCT N-CMT-4-05-00316 CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA CARRETERAS			
LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA			
M.J. LEÓN BARRIENTOS JUAREZ DIRECTOR TÉCNICO			
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE			
IR-CMC-14			

OBRA : FRACCIONAMIENTO CITTANOVA		CALIDAD DE CARPETA ASFALTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")	
LOCALIZACIÓN : CIRCUITO CITTANOVA NORTE	CIUDAD : CHIHUAHUA	ENSAJE No. : 23	
CONSTRUCTORA : YVASA	ESTADO : CHIHUAHUA	FECHA RECIBO : 2025-nov-18	
		FECHA INFORME : 2025-nov-21	
		TÉCNICO : M.A.R.F.	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"			
CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA TRITURADA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EXTENDEDORA			
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO PLANTA PERMONT			
DATOS DEL MUESTREO			
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO			
P.E. SECO SUELTO, Kg/m³		PROYECTO	
Mallas		100-100	
Núm.		100	
25.0		100-100	
19.0		90-100	
12.5		70-82	
9.5		50-81	
6.3		45-74	
4.75		25-55	
2.00		15-42	
0.850		11-32	
0.425		8-25	
0.250		5-18	
0.150		2-9	
0.075		2.4 Min	
DENSIDAD RELATIVA		30 % Max	
DESGASTE LOS ÁNGELES		50 % Min.	
EQUIV. DE ARENA		18 Max	
DESGASTE MICRODEVAL		40% Max	
PART ALARGADAS Y LAJEADAS		20% Max	
INTemperismo ACELERADO		45% Min	
ABSORCION		15mg/g Max	
ANGULARIDAD		20% Max	
AZUL DE METILENO		95 Min	
DESprendimiento POR Fricción		85 Min	
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Cara)			
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Cara)			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
NORMATIVA SCT N-CMT-4-95-00018 CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA CARRETERAS			
LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA			
M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ DIRECTOR TÉCNICO			
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE			
IR-CMC-14			

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

OBRA: FRACCIONAMIENTO CITTANOVA

LOCALIZACIÓN: CALLE MARANELLO

CONSTRUCTORA: YVASA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

ENSAYE No.: 24

FECHA RECIBO: 2025-nov-18

FECHA INFORME: 2025-nov-21

TÉCNICO: M.A.R.F.

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA


DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA TRITURADA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EXTENDEDEDORA

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO PLANTA PERMONT

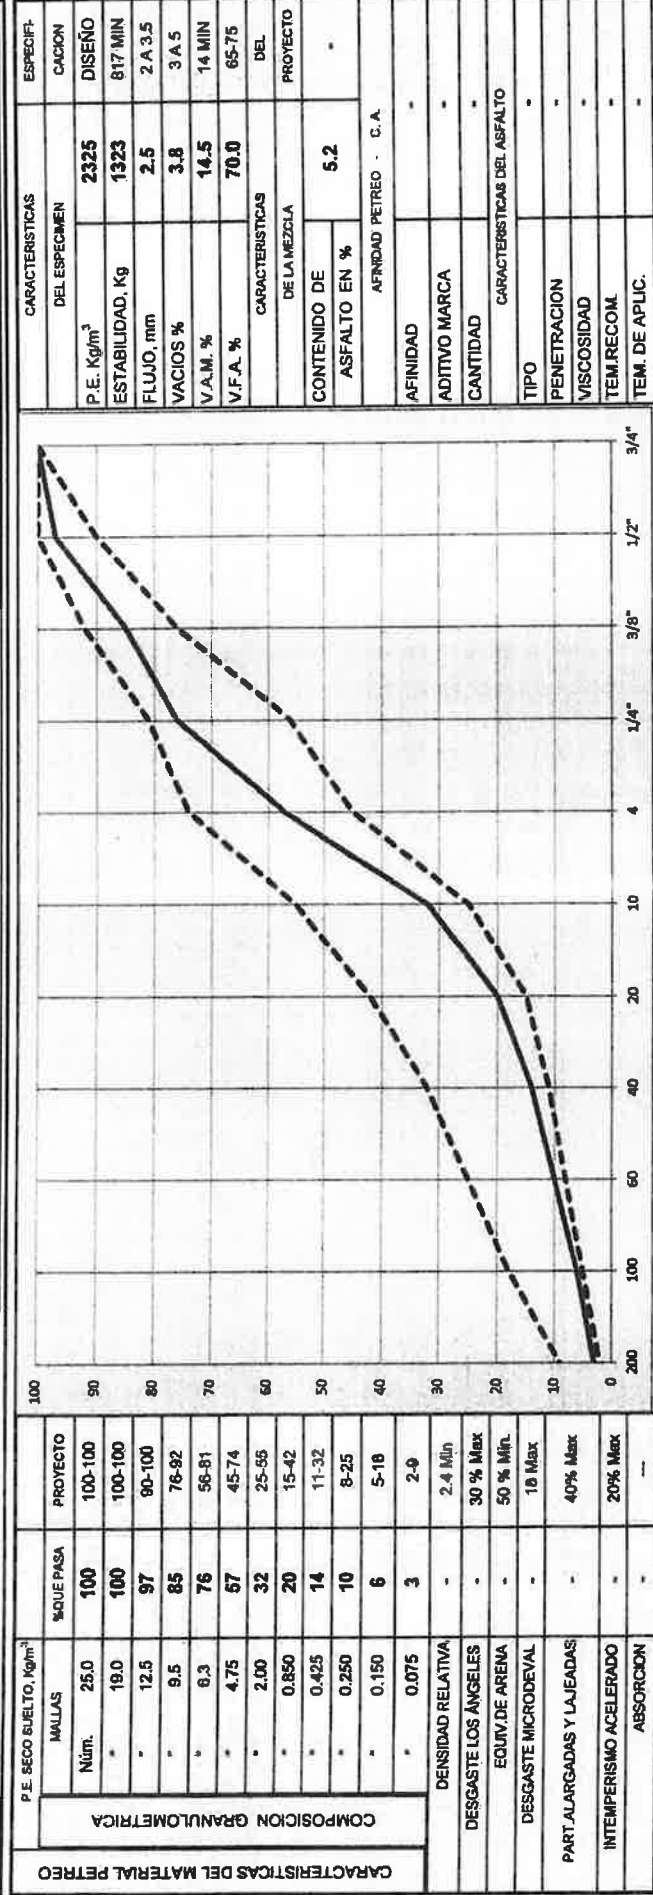

NORMATIVA SCT N-CMT-4-05-003Y16 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

M.J. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ

DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI

LOCALIZACIÓN : CIRCUITO PARVATI

CONSTRUCTORA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

CALIDAD DE CARPETA ASFALTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

ENSAYE No. : 25

FECHA RECIBO : 2025-nov-19

FECHA INFORME : 2025-nov-21

TÉCNICO : M.A.R.F.

CIUDAD : CHIHUAHUA

ESTADO : CHIHUAHUA

MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA TRITURADA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EXTENDEDORA

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO PLANTA PERMONT

MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA TRITURADA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EXTENDEDORA

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO PLANTA PERMONT

COMPOSICION GRANULOMETRICA

P.E. SECO SUELTO, Kg/m³	MALLAS	% QUE PASA	PROYECTO
Núm.	25.0	100	100-100
"	19.0	100	100-100
"	12.5	96	90-100
"	9.5	84	75-92
"	6.3	72	56-81
"	4.75	55	45-74
"	2.00	33	25-55
"	0.850	22	15-42
"	0.425	16	11-32
"	0.250	12	8-25
"	0.150	8	5-18
"	0.075	5	2-9

DESGASTE RELATIVA

DESGASTE LOS ÁNGELES	-	2.4 Min
EQUIV. DE ARENA	-	30 % Max
DESGASTE MICRODEVAL	-	50 % Min.
PART. AJAGADAS Y LAJEADAS	-	18 Max
INTEMPERISMO ACELERADO	-	40% Max
INTemperismo Acelerado	-	20% Max
ABSORCION	-	-
ANGULARIDAD	-	45% Min
AZUL DE METILENO	-	15mg/g Max
DESPRENDIMIENTO POR FRICCION	-	20% Max
PARTICULAS TRITURADAS (1 Cara)	-	95 Min
PARTICULAS TRITURADAS (2 Cara)	-	85 Min

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO

CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACION
P.E. Kg/m³	2317	DISEÑO
ESTABILIDAD, Kg	1342	817 MIN
FLUJO, mm	2.7	2 A 3.5
VACIOS %	3.8	3 A 5
V.A.M. %	15.1	14 MIN
V.F.A. %	71.0	85-75
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		DEL PROYECTO
CONTENIDO DE ASFALTO EN %	5.2	-
AFINIDAD PETREO - C.A.		-
AFINIDAD	-	-
ADITIVO MARCA	-	-
CANTIDAD	-	-
CARACTERISTICAS DEL ASFALTO		-
TIPO	-	-
PENETRACION	-	-
VISCOSIDAD	-	-
TEM. RECOM.	-	-
TEM. DE APLIC.	-	-

GRANULOMETRIA

SIEVE SIZE	PROJECT (%)	SAMPLE (%)
25.0	100	100
19.0	100	100
12.5	96	96
9.5	84	84
6.3	72	72
4.75	55	55
2.00	33	33
0.850	22	22
0.425	16	16
0.250	12	12
0.150	8	8
0.075	5	5

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NORMATIVA SCT N-CMT-4-05-00316 CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA CARRETERAS

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

MJ LEONEL BARRIENTOS JUAREZ DIRECTOR TECNICO

IR-CMC-14

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE ENTIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTADOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO: contacto@caduma.com.mx
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA: FRACCIONAMIENTO PARVATI

LOCALIZACIÓN: PASEOS DE ANANDA

CONSTRUCTORA: CORPORACION TECNICA DE URBANISMO

ENSAYE No.: 26

FECHA RECIBO: 2025-nov-19

FECHA INFORME: 2025-nov-21

TÉCNICO: M.A.R.F.

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA


DESCRIPCION DEL MATERIAL: MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL: ROCA CALIZA TRITURADA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO: EXTENDEDORA

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO: PLANTA PERMONT

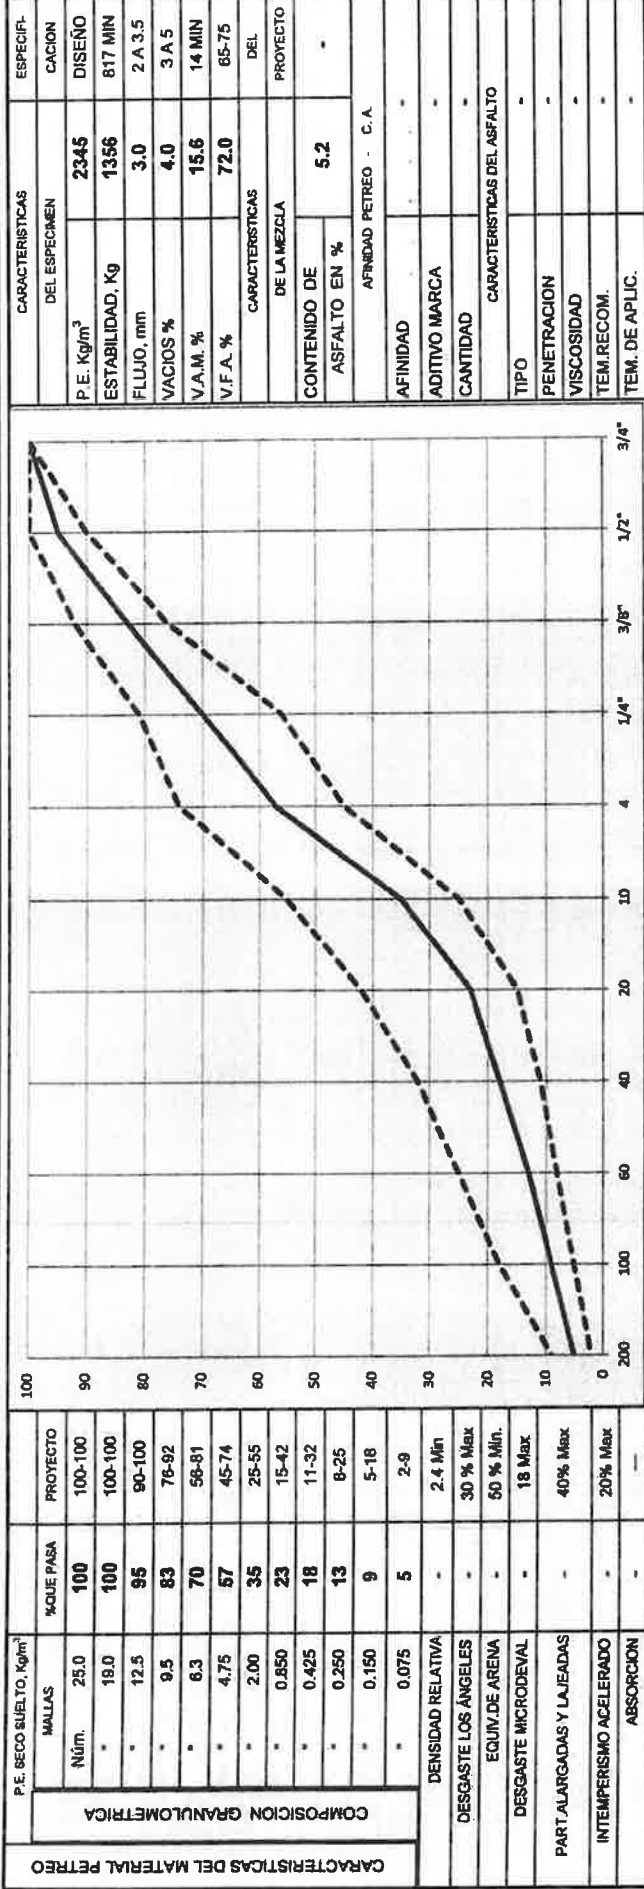

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI	ENSAYE No. : 27
LOCALIZACIÓN : CALLE GANESH	FECHA RECIBO : 2025-nov-19
CONSTRUCTORA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA INFORME : 2025-nov-21
	TÉCNICO : M.A.R.F.
	CIUDAD : CHIHUAHUA
	ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCION DEL MATERIAL : MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL : ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO : EXTENDEDORA
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO : PLANTA PERMONT	

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO	P.E. SECO SUELTO, Kg/m³		MALLAS		% QUE PASA		PROYECTO		CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACION	
	Num.	25.0	100	100-100	100	100-100	100-100	100-100	P.E. Kg/m³	2350	DISEÑO	CACION
COMPOSICION GRANULOMETRICA		19.0	100	100-100	95	90-100	76-92	56-81	ESTABILIDAD, Kg	1348	817 MIN	
		12.5	95	90-100	85	76-92	56-81	45-74	FLUJO, mm	3.2	2 A 3.5	
		9.5	85	76-92	75	56-81	45-74	25-55	VACIOS %	4.1	3 A 5	
		8.3	75	56-81	56	45-74	25-55	15-42	V.A.M. %	15.7	14 MIN	
		4.75	56	45-74	35	25-55	15-42	8-25	V.F.A. %	73.0	65-75	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO		2.00	35	25-55	26	15-42	11-32	5-18	CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		DEL	PROYECTO
		0.850	26	15-42	16	11-32	8-25	2-9	CONTENIDO DE ASFALTO EN %		5.3	
		0.425	16	11-32	12	8-25	5-18	2-9	AFINIDAD PETREO		C.A.	
		0.250	12	8-25	8	5-18	2-9	2-9	AFINIDAD		-	
		0.150	8	5-18	5	2-9	2-9	2-9	ADITIVO MARCA		-	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO		0.075	5	2-9	-	2.4 Min	30 % Max	50 % Min.	CANTIDAD		-	
		-	-	-	-	30 % Max	50 % Min.	18 Max	CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		-	
		-	-	-	-	40% Max	20% Max	40% Max	TIPO		-	
		-	-	-	-	20% Max	40% Max	20% Max	PENETRACION		-	
		-	-	-	-	45% Min	15mg/g Max	20% Max	VISCOSIDAD		-	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO		-	-	-	-	15mg/g Max	20% Max	40% Max	TEM.RECOM.		-	
		-	-	-	-	20% Max	40% Max	20% Max	TEM. DE APLIC.		-	
		-	-	-	-	40% Max	20% Max	40% Max	AFINIDAD		-	
		-	-	-	-	20% Max	40% Max	20% Max	ADITIVO MARCA		-	
		-	-	-	-	45% Min	15mg/g Max	20% Max	CANTIDAD		-	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO		-	-	-	-	15mg/g Max	20% Max	40% Max	CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		-	
		-	-	-	-	20% Max	40% Max	20% Max	TIPO		-	
		-	-	-	-	40% Max	20% Max	40% Max	PENETRACION		-	
		-	-	-	-	20% Max	40% Max	20% Max	VISCOSIDAD		-	
		-	-	-	-	45% Min	15mg/g Max	20% Max	TEM.RECOM.		-	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO		-	-	-	-	15mg/g Max	20% Max	40% Max	TEM. DE APLIC.		-	
		-	-	-	-	20% Max	40% Max	20% Max	AFINIDAD		-	
		-	-	-	-	40% Max	20% Max	40% Max	ADITIVO MARCA		-	
		-	-	-	-	20% Max	40% Max	20% Max	CANTIDAD		-	
		-	-	-	-	45% Min	15mg/g Max	20% Max	CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		-	

NORMATIVA SCT N-CMT-4-06-00318 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

M.J. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ DIRECTOR TÉCNICO	CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE
IR-CMC-14	

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.


CADUMA

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI		CALIDAD DE CARPETA ASFALTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")	
LOCALIZACIÓN : CIRCUITO INDRA	ENSAYE No : 28		
CONSTRUCTORA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA RECIBO : 2025-nov-20		
	FECHA INFORME : 2025-nov-21		
	CIUDAD : CHIHUAHUA		
	ESTADO : CHIHUAHUA		
	TÉCNICO : M.A.R.F.		
DESCRIPCION DEL MATERIAL MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"			
CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL ROCA CALIZA TRITURADA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EXTENDEDORA			
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO PLANTA PERMONT			
MUESTREO			
DATOS DEL			
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO			
P.E. SECO SUELO Kg/m ³		PROYECTO	
Mallas		100-100	
Núm.		25.0	
%		100	
Núm.		19.0	
%		100	
Núm.		12.5	
%		96	
Núm.		9.5	
%		83	
Núm.		6.3	
%		64	
Núm.		4.75	
%		62	
Núm.		2.00	
%		32	
Núm.		0.850	
%		21	
Núm.		0.425	
%		16	
Núm.		0.250	
%		12	
Núm.		0.150	
%		8	
Núm.		0.075	
%		5	
DENSIDAD RELATIVA		2.4 Min	
DESGASTE LOS ÁNGELES		20 % Max	
EQUIN/DE ARENA		50 % Min.	
DESGASTE MICRODEVAL		18 Max	
PART ALARGADAS Y LAJEADAS		40% Max	
INTemperismo ACelerado		20% Max	
ABSORCION		-	
ANGULARIDAD		45% Min	
AZUL DE METILENO		15mg/g Max	
DESprendimiento POR FRICCIÓN		20% Max	
PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Cara)		95 Min	
PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Cara)		85 Min	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
NORMATIVA SCT N-CRT-405-00316 CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA CARRETERAS			
LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA			
MJ LEONEL BARRIENTOS JUAREZ DIRECTOR TECNICO			
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE			
IR-CMC-14			

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA: FRACCIONAMIENTO PARVATI		ENSAYE No.: 29
LOCALIZACIÓN: CALLE VERUNA		FECHA RECIBO: 2025-nov-21
CONSTRUCTORA: CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA INFORME: 2025-nov-21
	ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO: M.A.R.F.

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO	PLANTA PERMONT

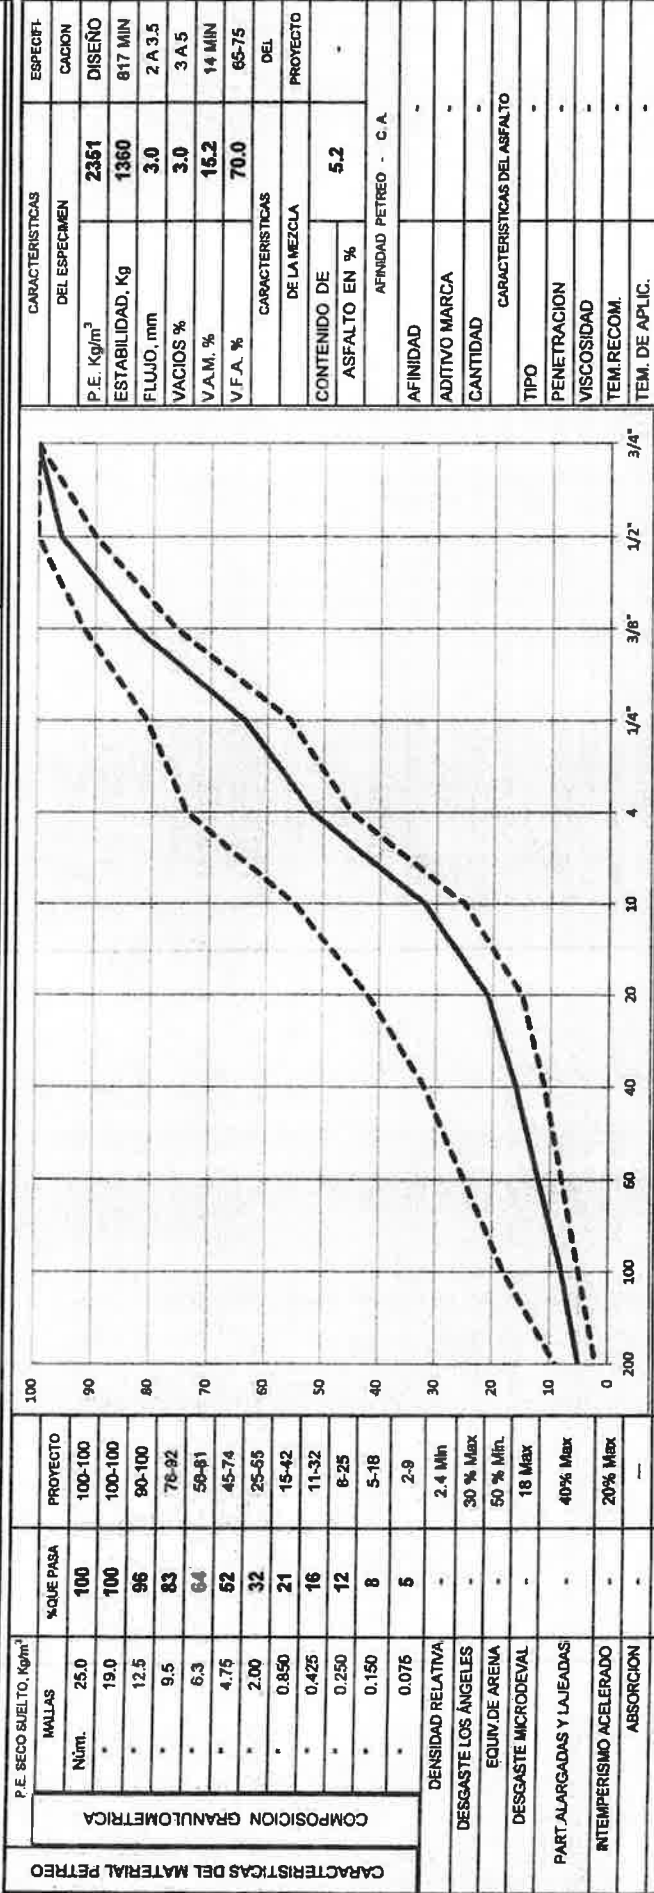

NORMATIVA SCT N-CMT-4-05-003H6 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ	DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI	ENSAYE No. : 30
LOCALIZACIÓN : CALLE BHAGA	FECHA RECIBO : 2025-nov-21
CONSTRUCTORA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA INFORME : 2025-nov-21
	TÉCNICO : M.A.R.F.
	CIUDAD : CHIHUAHUA
	ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL	PETREO PLANTA PERMONT

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO	CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACIÓN
	P.E. Kg/m³	2346	DISEÑO
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	ESTABILIDAD, Kg	1342	817 MIN
	FLUJO, mm	2.9	2 A 3.5
	VACÍOS %	3.1	3 A 5
	V.A.M. %	16.6	14 MIN
	V.F.A. %	71.0	65-75
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO			
CONTENIDO DE LA MEZCLA			
CONTENIDO DE ASFALTO EN %		5.2	-
AFINIDAD PETREO - C.A.			
AFINIDAD		-	-
ADITIVO MARCA		-	-
CANTIDAD		-	-
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO			
TIPO		-	-
PENETRACIÓN		-	-
VISCOSIDAD		-	-
TEM.RECOM.		-	-
TEM. DE APLIC.		-	-

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

200 100 60 40 20 10 4 2 1 1/4 3/8 1/2 3/4

P.E. SECO BUELT, Kg/m³	PROYECTO
Mallas	100-100
Núm.	100
25.0	100-100
19.0	90-100
12.5	76-82
9.5	56-81
6.3	45-74
4.75	25-55
2.00	15-42
0.850	11-32
0.425	8-25
0.250	5-18
0.150	2-8
0.075	2.4 Min

DESGASTE RELATIVA

DESGASTE LOS ÁNGELES

EQUIV. DE ARENA

DESGASTE MICRODEVAL

PART. ALARGADAS Y LAJEADAS

INTemperismo ACELERADO

ABSORCIÓN

ANGULARIDAD

AZUL DE METILENO

DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN

PARTÍCULAS TRITURADAS (1 Carr)

PARTÍCULAS TRITURADAS (2 Carr)

NORMATIVA SCT N-CMT-408-08316 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

MI LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE
IR-CMC-14

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE ENTREGAMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO contacto@caduma.com.mx

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.


CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI	ENSAYE No. : 31
LOCALIZACIÓN : CALLE ASURA	FECHA RECIBO : 2025-nov-21
CONSTRUCTORA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA INFORME : 2025-nov-21
	TÉCNICO : M.A.R.F.
	CIUDAD : CHIHUAHUA
	ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL	PETREO PLANTA PERMONT

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO			CARACTERÍSTICAS DEL ESPECÍMEN		ESPECIFICACIÓN
P.E. SECO SUELTO, Kg/m³			P.E. Kg/m³		
MALLAS					
Núm.	25.0	PROYECTO		2349	DISEÑO
	19.0	100-100		1367	817 MIN
	12.5	98		2.9	2 A 3.5
	9.5	84		2.8	3 A 5
	6.3	66		15.5	14 MIN
	4.75	56		71.0	65-75
	2.00	36			DEL
	0.850	22			PROYECTO
	0.425	15			
	0.250	10			
	0.150	7			
	0.075	4			
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA			CONTENIDO DE ASFALTO EN %		
DENSIDAD RELATIVA			AFINIDAD PETREO - C.A.		
DESGASTE LOS ÁNGELES			AFINIDAD		
EQUIV DE ARENA			ADITIVO MARCA		
DESGASTE MICRODEVAL			CANTIDAD		
PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS			CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO		
INTEMPERISMO ACELERADO			TIPO		
ABSORCIÓN			PENETRACIÓN		
ANGULARIDAD			VISCOSIDAD		
AZUL DE METILENO			TEM.RECOM.		
DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN			TEM. DE APLIC.		
PARTICULAS TRITURADAS (1 Cara)					
PARTICULAS TRITURADAS (2 Cara)					

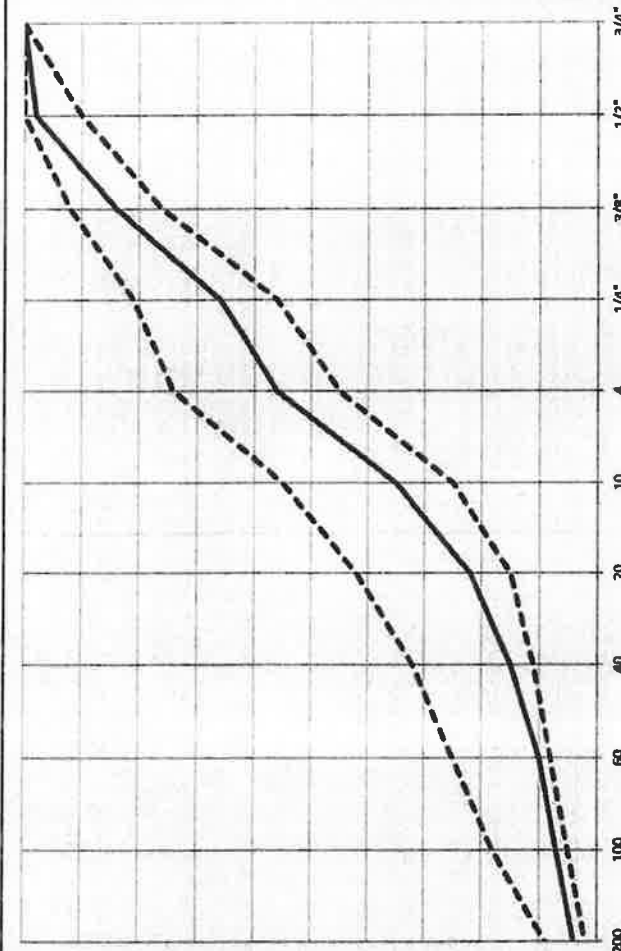

NORMATIVA SCT N-CMT-4-06-003/16 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

MJ LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

IR-CMC-14


GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA : FRACCIONAMIENTO PARVATI	ENSAYE No. : 32
LOCALIZACIÓN : CALLE MENAKA	FECHA RECIBO : 2025-nov-21
CONSTRUCTORA : CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA INFORME : 2025-nov-21
	TECNICO : M.A.R.F.
	CIUDAD : CHIHUAHUA
	ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MEZCLA ASFALTICA T.M 3/4"
	CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA CALIZA TRITURADA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EXTENDEDORA
	UBICACION DEL BANCO DE MATERIAL	PETREO PLANTA PERMONT

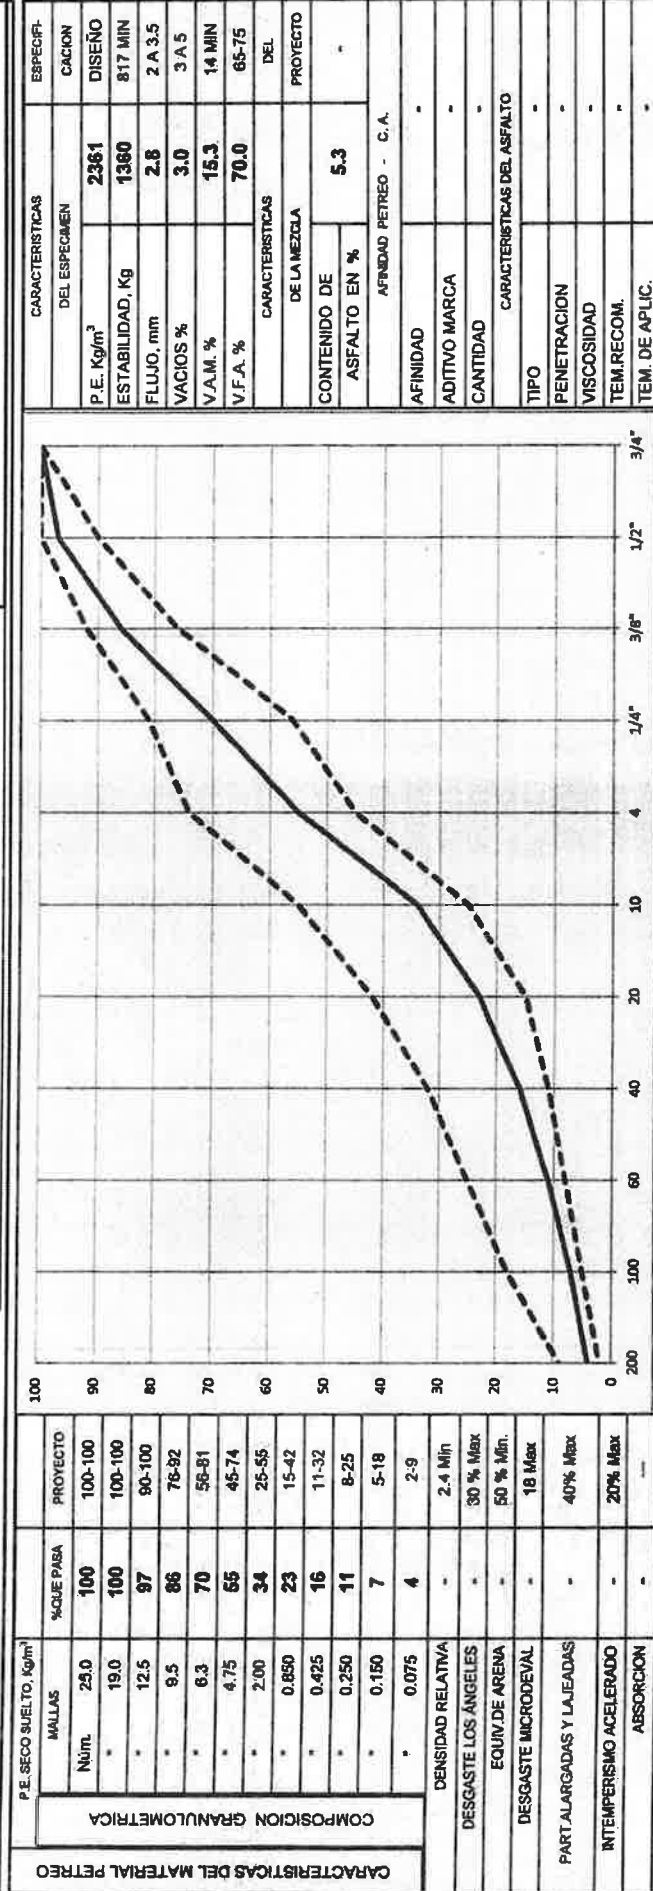

NORMATIVA SCT N-CMT-4-06-003H6 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEZCLA ANALIZADA, CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ	DIRECTOR TECNICO
CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE	

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

CADUMA

CALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA TAMAÑO MÁXIMO 3/4" (NOMINAL 1/2")

OBRA: FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL

LOCALIZACIÓN: CALLE SIERRA CALIFORNIANA

CONSTRUCTORA: ROAC GRUPO INMOBILIARIO

ENSAJE No.: 33
FECHA RECIBO: 2025-nov-21
FECHA INFORME: 2025-nov-21
TÉCNICO: M.A.R.F.

CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: MEZCLA ASFÁLTICA T.M 3/4"


CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL: ROCA CALIZA TRITURADA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: TRITURACIÓN TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO: EXTENDEDORA

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO: PLANTA NIUVANA

DATOS DEL MUESTREO

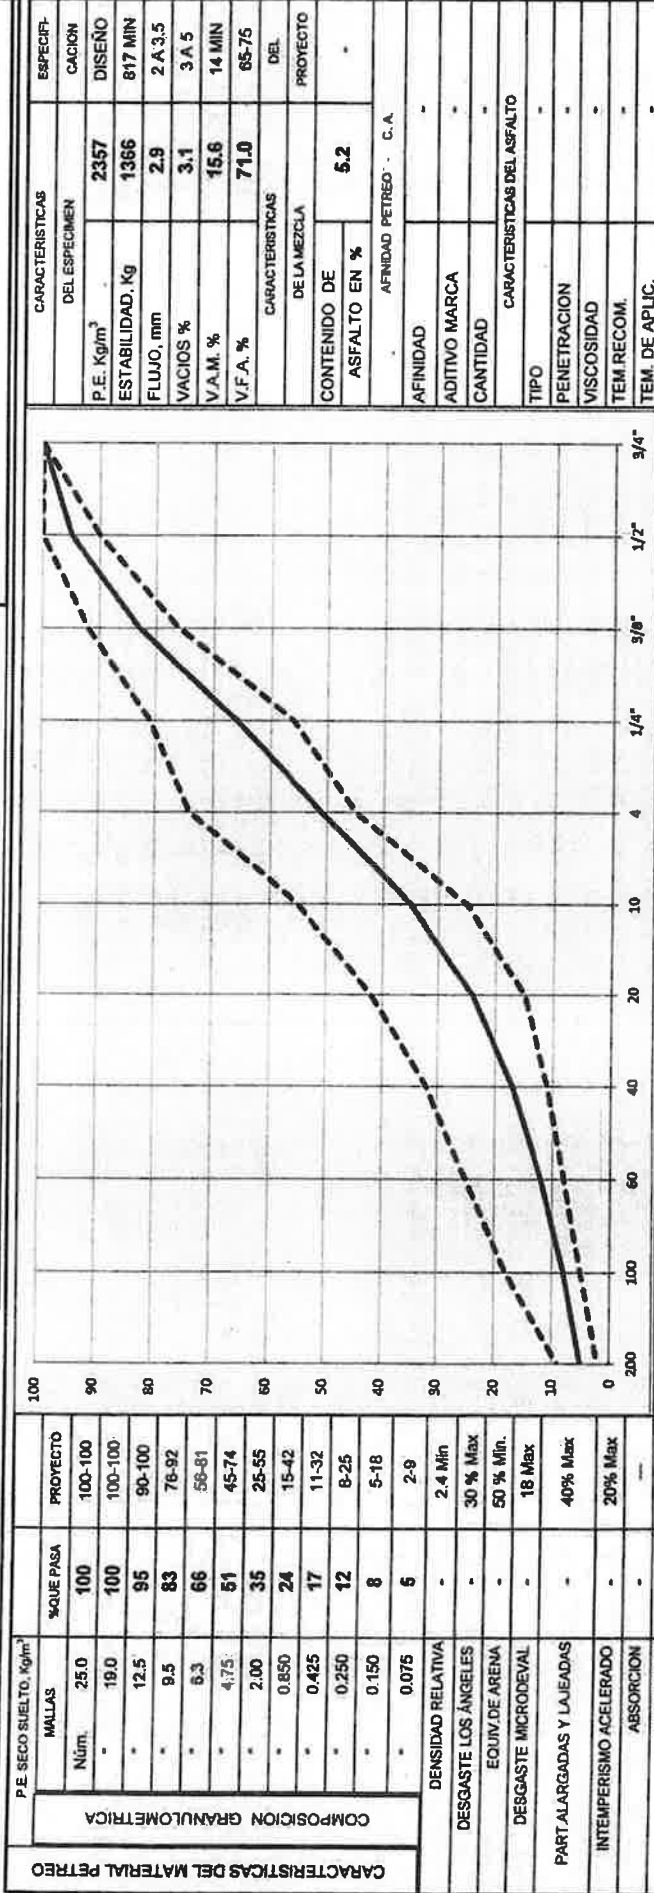

1.5- INFORMES DE PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS (EXCEPTO ASFALTOS GRADO PG)

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL ENCINO	ENSAYE NÚMERO:	29
CONSTRUCTORA:	GRUPO VALLES	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-27
LOCALIZACIÓN:	CIRCUITO ENCINO MONTERREY	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 2025-oct-31
		ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO: **PETROLIZADORA**
 TIPO DE EMULSIÓN: **ECI-60**
 PARA UTILIZARLO EN: **RIEGO DE IMPREGNACIÓN**

PROVEEDOR: **FASE**

ENSAYE:	29	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECI-60	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-80	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	61	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.7	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO.	5.30	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	11	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	-	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	52 (520)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	160	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	98	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	45	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
 TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
 DIRECTOR TÉCNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA	ENSAYE NÚMERO:	30
CONSTRUCTORA:	DESARROLOS COBOSA	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-27
LOCALIZACION:	CIRCUITO PASO ROBLES OESTE	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 2025-oct-31
		ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO: PETROLIZADORA
 TIPO DE EMULSIÓN: ECI-60
 PARA UTILIZARLO EN: RIEGO DE IMPREGNACIÓN

PROVEEDOR: GREMCA

ENSAYE:	30	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECI-60	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO	63	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.5	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO	4.80	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	12	-----	3	3	5	-----	5	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	-	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa·s (POISES), MÁXIMO	54 (540)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	171	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	99	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	47	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
 TÉCNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
 DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA	ENSAYE NÚMERO:	31
CONSTRUCTORA:	DESARROLOS COBOSA	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-27
LOCALIZACION:	CIRCUITO PASO ROBLES NORTE	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 2025-oct-31
		ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO: PETROLIZADORA

TIPO DE EMULSIÓN: ECI-60

PROVEEDOR: GREMCA

PARA UTILIZARLO EN: RIEGO DE IMPREGNACIÓN

ENSAYE:	31	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECI-60	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60


DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO	62	60	65	68	65	65	80	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.4	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO	4.10	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	13	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	-	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa·s (POISES), MÁXIMO	53 (530)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	169	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	98	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	45	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN


 MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
 TÉCNICO


 M. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
 DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA	ENSAYE NÚMERO:	32
CONSTRUCTORA:	DESARROLOS COBOSA	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-27
LOCALIZACIÓN:	CALLE PUNTA DANA	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 2025-oct-31
		ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO: PETROLIZADORA
 TIPO DE EMULSIÓN: ECI-60
 PARA UTILIZARLO EN: RIEGO DE IMPREGNACIÓN

PROVEEDOR: GREMCA

ENSAYE:	32	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECI-60	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO	61	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.5	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO	4.80	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	12	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	-	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	54 (540)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	170	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	99	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	48	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
 TÉCNICO

M.I LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
 DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO ZERANA	ENSAYE NÚMERO:	33
CONSTRUCTORA:	MUTO REALITAS	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-31
LOCALIZACION:	CIRCUITO ZERANA ESTE	CIUDAD:	CHIHUAHUA
		ESTADO:	CHIHUAHUA
		FECHA DE INFORME:	2025-nov-04
		TÉCNICO DE CAMPO:	M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO : PETROLIZADORA

TIPO DE EMULSIÓN : ECL-65

PROVEEDOR: AESA

PARA UTILIZARLO EN : RIEGO DE IMPREGNACIÓN

ENSAYE :	33	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO :	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN :	ECL-65	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	66	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.4	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO.	4.30	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.18	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	91	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	-	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	115	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	53 (530)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	193	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	45	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN



MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO



M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO



GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE CV.

CADUMA

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO ZERANA	ENSAYE NÚMERO:	34
CONSTRUCTORA:	MUTO REALITAS	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-31
LOCALIZACION:	CIRCUITO ZERANA NORTE	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 2025-nov-04
		ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO:	PETROLIZADORA	PROVEEDOR:	AESA
TIPO DE EMULSIÓN:	ECL-65		
PARA UTILIZARLO EN:	RIEGO DE IMPREGNACIÓN		

ENSAYE:	34	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECL-65	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	67	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.3	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO.	4.00	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	93	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	-	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	110	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	55 (550)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	181	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	98	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	47	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TECNICO

CARRETERAS + DESARROLLO URBANO + MEDIO AMBIENTE

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIONICAS

OBRA: FRACCIONAMIENTO ZERANA	ENSAYE NÚMERO: 35
CONSTRUCTORA: MUTO REALITAS	FECHA DE RECIBO: 2025-oct-31
LOCALIZACION: CIRCUITO ZERANA OESTE	CIUDAD: CHIHUAHUA
	ESTADO: CHIHUAHUA
	FECHA DE INFORME: 2025-nov-04
	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.
DEPÓSITO MUESTREADO: PETROLIZADORA	
TIPO DE EMULSIÓN: ECL-65	
PARA UTILIZARLO EN: RIEGO DE IMPREGNACIÓN	
PROVEEDOR: AESA	

ENSAYE:	35	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECL-65	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60


DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	66	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.1	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO.	4.30	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	92	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	-	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	113	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120


NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	52 (520)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	177	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	43	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN


 MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
 TECNICO


 M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
 DIRECTOR TECNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO ZERANA	ENSAYE NÚMERO:	36
CONSTRUCTORA:	MUTO REALITAS	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-31
LOCALIZACIÓN:	CIRCUITO ZERANA SUR	CIUDAD:	CHIHUAHUA
		ESTADO:	CHIHUAHUA
		FECHA DE INFORME:	2025-nov-04
		TÉCNICO DE CAMPO:	M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO: PETROLIZADORA
 TIPO DE EMULSIÓN: ECL-65
 PARA UTILIZARLO EN: RIEGO DE IMPREGNACIÓN

PROVEEDOR: AESA

ENSAYE:	36	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECL-65	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	65	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.2	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO.	4.70	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	91	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	-	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	110	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa·s (POISES), MÁXIMO	52 (520)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	171	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	45	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO ZERANA	ENSAYE NÚMERO:	37
CONSTRUCTORA:	MUTO REALITAS	FECHA DE RECIBO:	2025-oct-31
LOCALIZACION:	CALLE ZARAUZ	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 2025-nov-04
		ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO : PETROLIZADORA
 TIPO DE EMULSIÓN : ECL-65
 PARA UTILIZARLO EN : RIEGO DE IMPREGNACIÓN

PROVEEDOR: AESA

ENSAYE :	37	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO :	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN :	ECL-65	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO	66	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.3	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO	4.60	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	90	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	-	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	112	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa·s (POISES), MÁXIMO	53 (530)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	166	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	98	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	47	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA: FRACCIONAMIENTO PARAVATI	ENSAYE NÚMERO: 38
CONSTRUCTORA: CORPORACION TECNICA DE URBANISMO	FECHA DE RECIBO: 2025-oct-31
LOCALIZACION: CIRCUITO PARAVATI	CIUDAD: CHIHUAHUA
	ESTADO: CHIHUAHUA
	FECHA DE INFORME: 2025-nov-04
	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.
DEPÓSITO MUESTREADO: PETROLIZADORA	
TIPO DE EMULSIÓN: ECI-60	
PARA UTILIZARLO EN: RIEGO DE IMPREGNACIÓN	
PROVEEDOR: FASE	

ENSAYE:	38	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECI-60	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60


DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	63	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	5.2	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO.	4.30	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %, MÁXIMO	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	11	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	-	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	56 (560)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	162	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	98	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	45	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN


MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
 TÉCNICO


M.I. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
 DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO CERRADA QUINTA CAROLINA	ENSAYE NÚMERO:	39
CONSTRUCTORA:	GRUPO TRINNAL	FECHA DE RECIBO:	2025-nov-04
LOCALIZACION:	CERRADA QUINTA CAROLINA	CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 2025-nov-08
		ESTADO: CHIHUAHUA	TÉCNICO DE CAMPO: M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO: PETROLIZADORA

TIPO DE EMULSIÓN: ECI-60

PROVEEDOR: GREMCA

PARA UTILIZARLO EN: RIEGO DE IMPREGNACIÓN

ENSAYE:	39	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECI-60	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	63	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	6.1	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	-	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %; MÁXIMO.	3.80	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	11	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	-	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	56 (560)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	171	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	98	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	47	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE ENSAYE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIONICAS

OBRA:	FRACCIONAMIENTO GRUTAS RESIDENCIAL	ENSAYE NÚMERO:	40
CONSTRUCTORA:	ROAC GRUPO INMOBILIARIO	FECHA DE RECIBO:	2025-nov-04
LOCALIZACION:	C. SIERRA CALIFORNIANA	CIUDAD:	CHIHUAHUA
		FECHA DE INFORME:	2025-nov-09
		ESTADO:	CHIHUAHUA
		TÉCNICO DE CAMPO:	M.A.R.F.

DEPÓSITO MUESTREADO:	PETROLIZADORA	PROVEEDOR:	FASE
TIPO DE EMULSIÓN:	ECR-60		
PARA UTILIZARLO EN:	RIEGO DE LIGA		

ENSAYE:	40	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
MUESTRA NÚMERO:	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIÓN:	ECR-60	ECR-60	ECR-65	ECR-70	ECM-65	ECL-65	ECI-60	ECS-60

DEL CEMENTO ORIGINAL	DATOS	NORMAS						
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; %, MÍNIMO.	63	60	65	68	65	65	60	60
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 25° C; s, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	-----	25	5	25
VISCOSIDAD SAYBOLT - FUROL A 50° C; s, MÍNIMO	5.7	5	40	50	25	-----	-----	-----
ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS; DIFERENCIA EN %, MÁXIMO.	2.90	5	5	5	5	5	10	5
RETENIDO EN MALLA N° 20 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.22	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PASA MALLA N° 20 Y SE RETIENE EN MALLA N° 60 EN LA PRUEBA DEL TAMÍZ; %, MÁXIMO	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO SECO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	90	90	-----	90
CUBRIMIENTO DEL AGREGADO HUMEDO; %, MÍNIMO	-	-----	-----	-----	75	75	-----	75
CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCULAS	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MÁXIMO	-	-----	3	3	5	-----	15	-----
ÍNDICE DE RUPTURA; %	71	<100	<100	<100	80-140	>120	-----	>120

NORMATIVA DE LA SCT N-CTM-4-05-001/06

DEL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN	DATOS	NORMA						
VISCOSIDAD DINÁMICA A 60° C; Pa's (POISES), MÁXIMO	55 (550)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)	50 ± 10 (500 ± 100)
PENETRACIÓN A 25° C, EN 100 Gr Y 5 s; 10 ¹ mm	161	110 - 250	110 - 250	110 - 250	100 - 250	100 - 250	100 - 400	100 - 250
SOLUBILIDAD; %, MÍNIMO	98	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	-----
DUCTILIDAD A 25° C, Cm, MÍNIMO	47	40	40	40	40	40	40	-----

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRODUCTO ASFÁLTICO ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES, PARA SER EMPLEADO EN EL RIEGO DE LIGA

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ FIERRO
TECNICO

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
DIRECTOR TECNICO

1.6- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN

Calle García Salinas No 4311 Colonia Granjas Cd. Chihuahua, Chih.

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACION (GC-DC-00)

NMX-C-467-ONNCE-2019 "Industria de la construcción-Geotecnia-Materiales para terracerías-Métodos de muestreo", NMX-C-468-ONNCE-2018 "Industria de la construcción-Geotecnia-Materiales Terrosos-Método de preparación de muestras", NMX-C-475-ONNCE-2013 "Industria de la construcción-Geotecnia-Materiales Terrosos-Determinación del contenido de agua mediante Horno-Método de ensayo", NMX-C-478-ONNCE-2019 "Industria de la construcción-Geotecnia-Materiales Terrosos-Compactación Dinámica Estandar y Modificada-Método de ensayo", NMX-C-507-ONNCE-2019 "Industria de la construcción-Geotecnia-Determinación de la Masa Volumétrica Seca del lugar y grado de compactación de materiales terrosos - método de ensayo de Trompa y Arena".

LOS RESULTADOS DESCRITOS EN ESTE INFORME SOLO SON VALIDOS PARA LAS PRUEBAS REALIZADAS.

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN LOS TELÉFONOS (014)426-20-86, Y EN EL CORREO ELECTRÓNICO: grupocaduma@gmail.com

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS, CUMPLEN CON EL PORCENTAJE MINIMO ESPECIFICADO.

ELABORO:

MARIO ALBERTO RODRIGUEZ FIERRO

Nombre y firma

AUTORIZO

M.I LEONEL BARRIENTOS JUAREZ

Nombre y firma

CADUMA

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACION (GC-DC-00)

Nombre y firma

CADUMA

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACION (GC-DC-00)

AUTORIZO:

M.I. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ
 Nombre y firma

