


CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONST.	CYP CRUZ SAENZ	FECHA RECIBO	02/07/2025
MUESTRA:	PETREO CLASIFICADO DE MALLA No. 4 A FINOS (POLVILLO)	FECHA INFORME	09/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	100	60-82
	1/4"	100	44-71
	Núm. 4	100	37-64
	Num. 10	64	20-46
	Núm. 20	39	12-35
	Núm. 40	23	8-27
	Núm. 60	19	6-21
	Núm. 100	15	4-16
	Núm. 200	12	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD		2.66	(2.4 MIN)
DESGASTE %			(35 MAX)
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			(40MAX)
EQUIV. ARENA %			(50 MIN)
CONTRACCIÓN LINEAL %			

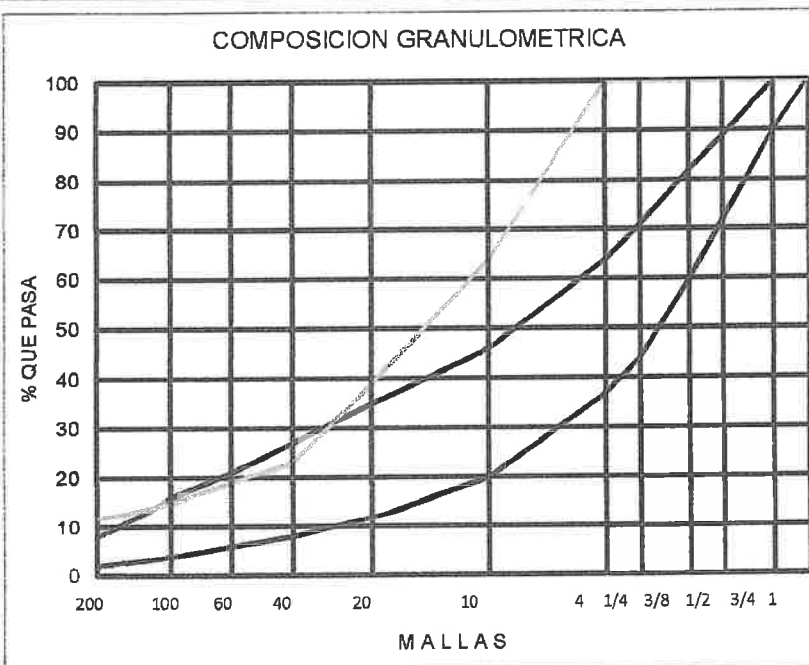

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:
 REPORTAMOS LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA No. 4 A FINOS.

EL JEFE DEL LABORATORIO ING. FAUSTO J. CHÁVEZ MARTÍNEZ


CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONST.	CYP CRUZ SAENZ	FECHA RECIBO	02/07/2025
MUESTREO:	PETREO CLASIFICADO DE MALLA 1/2" A MALLA No. 10 (SELLO).	FECHA INFORME	09/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	76	60-82
	1/4"	35	44-71
	Núm. 4	15	37-64
	Num. 10	1	20-46
	Núm. 20	0	12-35
	Núm. 40	0	8-27
	Núm. 60	0	6-21
	Núm. 100	0	4-16
	Núm. 200	0	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %		0.72	
DENSIDAD		2.65	(2.4 MIN)
DESGASTE %		26.3	(35 MAX)
PART. ALARGADAS %		8.5	
PART. LAJEADAS %		11.1	(35MAX)
EQUIV. ARENA %			(50 MIN)
CONTRACCIÓN LINEAL %			

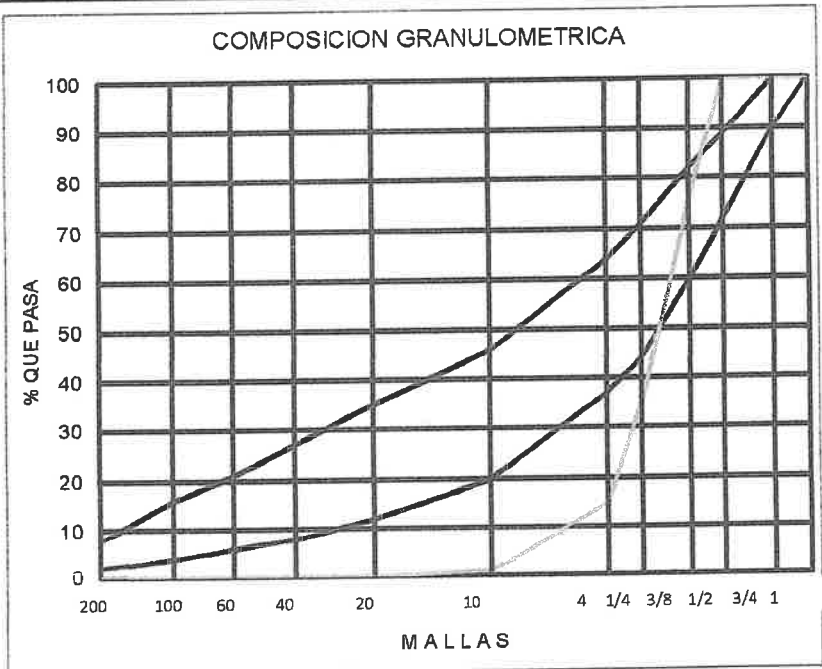

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg.		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:	
REPORTAMOS LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA 3/8" A No. 10.	
EL JEFE DEL LABORATORIO ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTÍNEZ	


CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA : CYP CRUZ
MEZCLA 70% MAT. CLASIFICADO DE 3/8" A FINOS (ARENA), 20% MAT. CLASIF. DE 3/4" A 3/8" (GRAVA) Y 10% MATERIAL 3/8" A No. 10 (SELLO).		FECHA RECIBO 02/07/2025
MUESTRA: PETREO CLASIFICADO DE 3/4" A FINOS.		FECHA INFORME 09/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA	
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL	
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN OBRA	
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA	

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	99	90-100
	1/2"	87	72-89
	3/8"	78	60-82
	1/4"	65	44-71
	Núm. 4	55	37-64
	Num. 10	38	20-46
	Núm. 20	26	12-35
	Núm. 40	20	8-27
	Núm. 60	16	6-21
	Núm. 100	12	4-16
	Núm. 200	6	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION % 2			
DENSIDAD 2.53 (2.4 MIN)			
DESGASTE % 30.1 (35 MAX)			
PART. ALARGADAS % 14.8 (40MAX)			
PART. LAJEADAS % 10.0			
EQUIV. ARENA % 67.10 (50 MIN)			
CONTRACCIÓN LINEAL % 1.6 (2.0 MAX)			

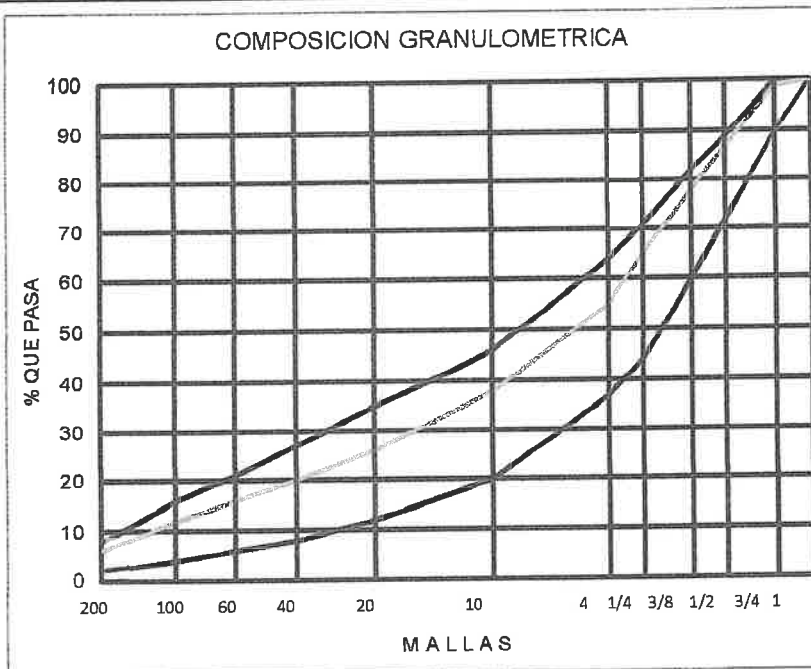

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3		
ESTABILIDAD, kg.		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA DE MATERIALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE UNA MEZCLA ASF. DE TAM. MAX 3/4".

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTÍNEZ

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

BLVD. DIAZ ORDAZ No 1811, COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH.

TELS.
(614) 4 10 60 32 , (614) 3 46 94 04

PRUEBA MARSHALL

OBRA PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.






BANCO ALMACEN EN LA PLANTA

FECHA 09-jul-25

CARPETA TAMAÑO 3/4"

tipo de asfalto: PG 76-22

densidad del asfalto: .998 T/M3

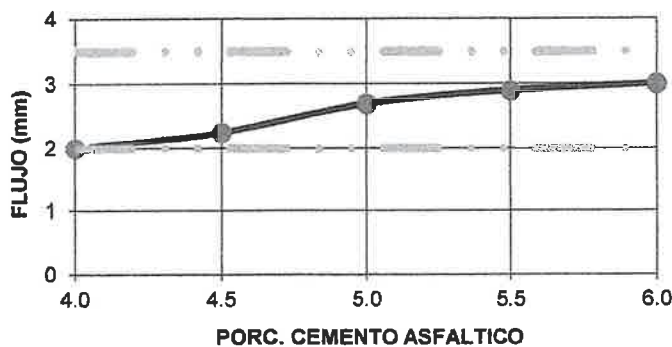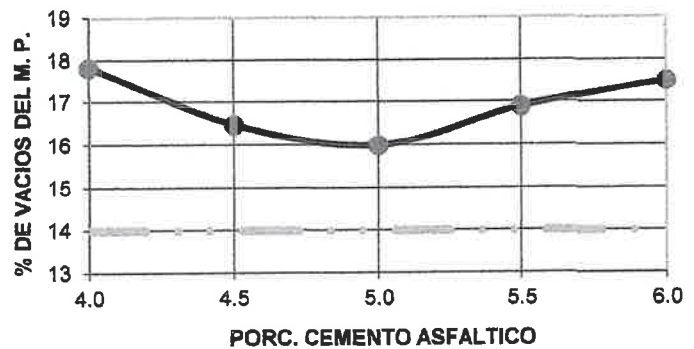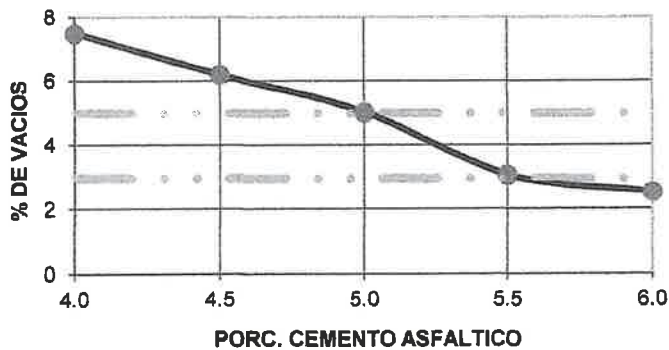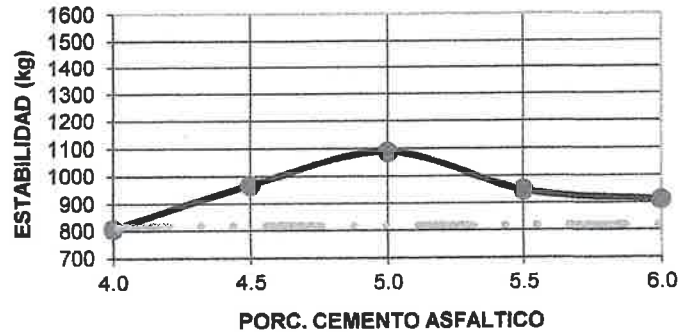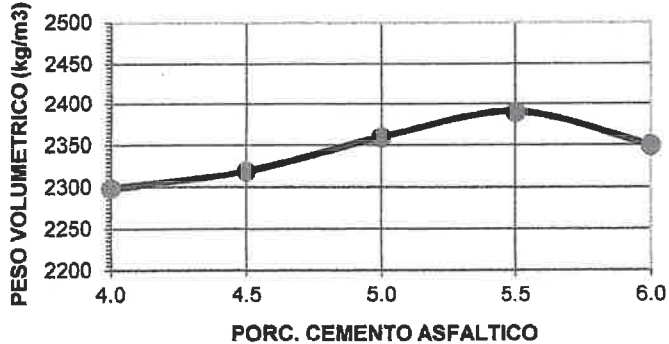

TEMPERATURA DE ELABORACION

150° -165°

TEMPERATURA DE TENDIDO

160°

CARACTERISTICAS	DATOS OBTENIDOS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO OPTIMO DE C.A. (%)	5.00	
ESTABILIDAD (kg):	1248	817
VACIOS (%):	3.50	DE 3 A 5
PESO VOLUMETRICO (kg/m³):	2384	
FLUJO (mm):	2.70	DE 2 A 4
VACIOS DEL M. P. (%):	15.40	13 MIN

EL LABORATORISTA

EL JEFE DE LABORATORIO


NOTA IMPORTANTE

HACEMOS NOTAR QUE EN LA PLANTA SE DEBERA EFECTUAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA OBTENER ESTOS RESULTADOS

ING.FAUSTO CHAVEZ M.



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

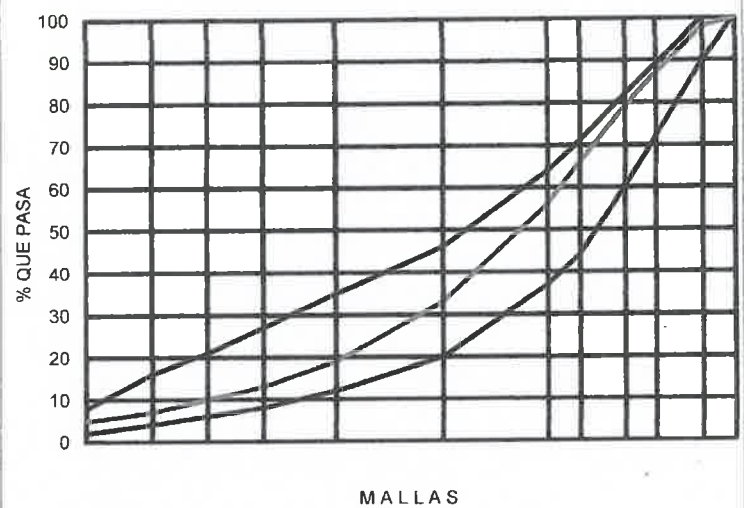OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA PLANTA		CYP CRUZ SAENZ	
EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA		FECHA RECIBO 29/06/2026	
(KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM 0+349.60).		FECHA INFORME 30/06/2026	
MUESTRA		MEZCLA ASFALTICA 3/4"	
DESCRIPCION DEL MATERIAL		ROCA CALIZA	
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO		TRITURACION TOTAL	
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO		AL TENDER	
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO		MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA	
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	98	90-100
	1/2"	87	72-89
	3/8"	79	60-82
	1/4"	66	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Núm. 10	33	20-46
	Núm. 20	19	12-35
	Núm. 40	13	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C 180		170 - 180	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm³ 2348			
ESTABILIDAD, kg. 1216		817.5	
FLUJO, mm 3.0		2 - 3.5	
VACIOS, % 3.9		DE 3 A 5	
VAM, % 15.8		14 MIN	
CONT. CEM ASF/PETREO, % 5.2		5.3	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFALTICA.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60).	ENSAYES No.	635
	FECHA DE RECIBO	29-jun.-26
	FECHA DE INFORME	29-jun.-26

CAPA CARPETA ASFALTICA 3/4	ESPESOR DE PROYECTO DE LA CAPA	3.5
PLANTA EN Km.	ESPESOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR	4.1
	CYP CRUZ SAENZ	

[illegible]

LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y AL COMPACTAR SON SATISFACTORIOS

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE RIEGOS DE LIGA	X	IMPREGNACION	
---------------------------	---	--------------	--

1503

OBRA :	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60)	ENSAYES No.	634
		FECHA DE RECIBO	29-jun-26
		FECHA DE INFORME	30-jun-26

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION	07:50	HORA DE DETERMINACION	08:00
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA,	61 L/m ²	TEMPERATURA DE APLICACION	160°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 L/m ²	CANTIDAD EMPLEADA	1246.53
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RÁPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA		TEMPERATURA AMBIENTE	25°C		
	SOLEADO				

[illegible]

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ






CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA PLANTA		CYP CRUZ SAENZ	
EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA		FECHA RECIBO 01/07/2026	
(KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM 0+349.60).		FECHA INFORME 02/07/2026	
MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"			
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER			
UBICACIÓN DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA			
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	98	90-100
	1/2"	88	72-89
	3/8"	80	60-82
	1/4"	67	44-71
	Núm. 4	57	37-64
	Núm. 10	34	20-46
	Núm. 20	20	12-35
	Núm. 40	15	8-27
	Núm. 60	11	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO PG 76 - 22			
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFALTICA.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			

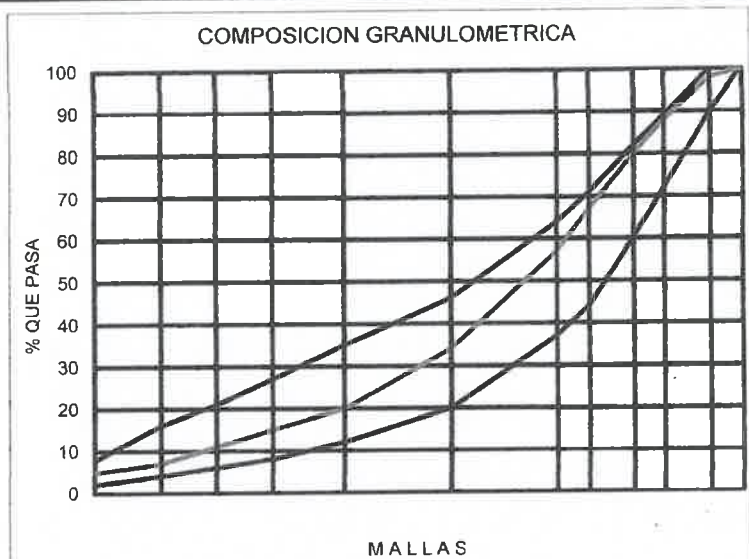

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	180	170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2319	
ESTABILIDAD, kg.	1248	817.5
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	3.6	DE 3 A 5
VAM, %	15.5	14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %	5.2	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

IMPREGNACION

OBRA :	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60)	ENSAYES No.	640
		FECHA DE RECIBO	01-jul-26
		FECHA DE INFORME	02-jul-26

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION		08:00	HORA DE DETERMINACION	8:10AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	61 L/m2	TEMPERATURA DE APLICACION		150°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 L/m2	CANTIDAD EMPLEADA		1001.27
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO		RAPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA		SOLEADO		TEMPERATURA AMBIENTE		25°C



ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60).	ENSAYES No.	638
	FECHA DE RECIBO	1-Jul.-26
	FECHA DE INFORME	1-Jul.-26

CAPA CARPETA ASFALTICA 3/4	ESPALESADELA CARPETA 3/4	3.5
PLANTA EN Km.	CYP CRUZ SAENZ	4.1
	ESPALESADELA CARPETA 3/4	4.1

VIJES		MUESTRA		HORAS		TEMPERATURAS DE MEZCLA					TENDIDO			ESPESOR		
CAMION	VOL		No.	SALIDA	DESCARGA	AL SALIR	AL TENDER	AL COM-	DE Km.	A Km.	LADO o	CALZADA	ANCHO	DE CAPA		
No.	m3			EN PLANTA	EN TRAMO	DE PLANTA	EN TRAMO	PACTAR			FRANJA			TENDIDA		
TRAMO 2 ESTACION DEL 0+510 AL 0+638.84																
ROJ	28		1.0	08:00	08:20	179.0	175.0	170.0	0+510	0+617	DER		6.37		3.5	
BLA	5.7		2.0	08:20	08:40	180.0	176.0	171.0	0+617	0+638.84	DER		6.37		3.5	
BLA	22.3		2.0	08:20	09:00	180.0	172.0	168.0	0+510	0+595.2	IZQ		6.37		3.5	
AZU	11.4		3.0	08:10	08:40	180.0	172.0	168.0	0+595.2	0+638.84	IZQ		6.37		3.5	

[illegible]

LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y AL COMPACTAR SON SATISFACTORIOS

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ

Hoja N° 001 Folio 1 201

25 Junio 2026.

Con esta fecha se oportuna este documento correspondiente al Contrato 057/2026 de Obra Pública.

Por haberse iniciado a base de pasado y subrecompa esta obra en (Calle Calles) entre (Calle Brindley y A. Deodora) (Km 0+638.85) entre los Puntos 1'301,825.87 incluyendo

el importe del Contrato es de Bs 1'301,825.87 incluyendo el impuesto al Valor Agregado.

No se entrega participaciones para el inicio de los trabajos.

El modo de Ejecución de los trabajos es el del 25 de

Junio del 2026.

La ejecución ejecutará de los trabajos así

(Construcción y Mantenimiento) S.A. de C.V.

Las personas que intervienen que trabajan ahora

a este momento son las que al día

de hoy son: Puntos y Puntos Puntos y

Puntos y Puntos y Puntos y Puntos y

Puntos y Puntos y Puntos y Puntos y

Puntos y Puntos y Puntos y Puntos y

Puntos y Puntos y Puntos y Puntos y

Puntos y Puntos y Puntos y Puntos y

Puntos y Puntos y Puntos y Puntos y

Puntos y Puntos y Puntos y Puntos y

Nota nº 001


Folio 002.

25 junio 2026.

Registro de personas asignadas a este Documento.

Arq. Karla Anahi Conzalez Urdaneta,
Jefe del Depto. de Construcción
de Infraestructura.

A. Victor R. Jimenez Quintero
Representante Legal.

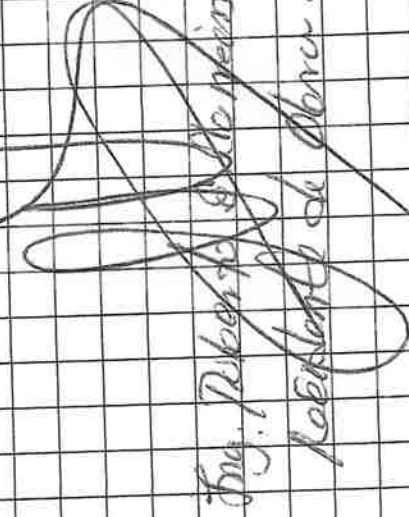

Ing. Roberto S. Hernandez

Representante de Honor.



Arq. Felipe N. Espinoza Chavez

Super Intendente de
obra.

Nota N° 002

Folio 03.

25 Jun 2026.

Se establece que las notas de bitácora serán firmadas en
un plazo menor a (5) cinco días hábiles por Consignante
los que no sean firmados y se considerará como requisito todas
los documentos de autenticación serán a un mayor a un mes
el Contrataste. Deben presentar la Estimación
dentro de los cinco días hábiles. Siguen las a la
fecha de la para la realización del. Trámite
de pago a los documentos de gastos.

Los Registros de obra. por parte de obras de Ma
nual. Contrataste en un plazo no mayor a cinco
días hábiles. Siguen las a la presentación por su
revisión y autorización de la Estimación.



25 Junip 2020. Nota no 003.

Folio 01

Se hace entrega a la Contratación. Instalaciones y
Muros. S.A. de C.V. los Oficios Correspondientes. a la
Obra. Solicitado del Superintendente, nombre del
Laboratorio de Control de Calidad, Dirección de Obras
y Fines y Finanzas, Inicio de las Actividades, en
el mismo entrega a la Zona de las Mañanitas. el Personal
Marshall. de la Unidad Asistida, Unidad del castillo
para la Mañana y Emulaciones castañitas.
La Empresa al inicio de los trabajos de los Centros
con el Personal. Solicitados en las Especificaciones.
Particulares para el legado de la Zona de Trabajo
y la Unidad del Equipo y Transporte.



Nota n° 004

Folio 05

25 Junio 2026

El día de hoy se realizó reunión de trabajo
se hizo levantamiento del terreno dispuesto
para poder hacer el punto de terminación de
obra del área señalada el peritaje en la zona.

26 Junio 2026 Nota n° 005

Hoy se realizó el estudio que deberá iniciar.
con el trabajo de la zona del punto de
obra como. Se realiza un punto de protección de
obra.

Folio 86

Nota n° 006

29 Junio 2026.
Se reanuda el trabajo
de esta fecha se da inicio con los trabajos
de fresado de pavimento. Termina la
avanzada del 606 en este concepto.

~~Nota n° 007~~

Nota n° 007

30 Junio 2026.

Hoy se reinicia y se termina el concepto de
fresado de pavimento en calle de la
entre. Se da inicio y entran a fuerza.
Quedan

~~Nota n° 008~~

02 Julio 2016.

Nota 10008

Folio 07

Con esta fecha se da inicio al desarrollo de
Candido de la parte afectada con un espesor de
2.5 cm de espesor. Sobre la superficie presentada
semanas de avance del 63% de este concepto.





03 Julio 2016

Nota 10009

Con esta fecha se continúan con el trabajo de
desarrollo de la parte afectada en la parte
terminando al 100%. Los trabajos programados
seguirán por el mismo orden en todos los
trabajos (Candido) a lo largo del tiempo
y tarde.



03 Julio 2020

Nota N° 010

Fólio 08

Abn esta fecha los supuestos presentados
numeros generadores e Extraordinarios
para su revisión, autorización y
firmas correspondientes.



F A S E EMULSIONES Y ASFALTOS

CALLE 63 No. 6313 COL. CONCORDIA CP. 31375 CHIHUAHUA, CHIH.

INFORME DE PRUEBAS LABORATORIO

PRODUCTO: EMULSION CATIONICA ECR-65

EXPEDIDO A: CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION: CHIHUAHUA

FECHA ELABORACION: 02/07/2026

ENSAYE No. 15

FECHA DE INFORME: 02/07/2026

ESTADO: CHIHUAHUA

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO TAD-CADEREYTA NL.

EMULSION CATIONICA ECR-65	ENSAYES		METODO
PRUEBAS	No	No	
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO EN MASA ;%,MINIMO	65.1		65
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 25 °C ,S. MINIMO	N/A		N/A
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 50 °C ,S. MINIMO	41		40
ASENTAMIENTO EN 5 DIAS; DIFERENCIA EN %. MAXIMO	0.005		5
RETENCION EN LA MALLA No20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ%. MAX	0.1		0.1
PASA MALLA No 20 Y SE RETIENE EN MALLA No 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %.MAXIMO	0.23		0.25
CARGA ELECTRICA DE LA PARTICULA	+		(+)
RESIDUO DE LA DESTILACION. % EN VOLUMEN (SOLVENTE)	N/A		
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MAXIMO	3		3
EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION			
VISCOSIDAD DINAMICA A 60° C;PAS(P(1)),MAXIMO	N/A		50 +- 10
PENETRACION A 25 °C; 100 g, 5 SEGG;GRADOS.	148		110-250
SOLUBILIDAD; %, MINIMO	N/A		
DUCTIBILIDAD. % 25°C, CM, MINIMO	N/A		

OBSERVACIONES:

LA EMULSION CUMPLE LOS REQUISITOS PARA UNA EMULSION ECR-65

LABORATORIO

GERENCIA

ING. CESAR OMAR AGUILERA OLIVAS

ING. MANUEL SANCHEZ MEDRANO



CERTIFICADO DE CALIDAD

PROYECTOS Y LABORATORIO

INFORME DE PRUEBAS DE GRADO DE DESEMPEÑO

ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO (BETÚN DE PETRÓLEO)

OBRA: CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.	REMISIÓN: 33027
LOCALIZACIÓN: CHIMUAHUA	FECHA DE INFORME: 10 DE JUNIO DEL 2026

REFINERÍA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO	ASFALTOS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
TIPO DE PRODUCTO INDICADO EN LA REMISIÓN	ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO
DEPÓSITO MUESTREADO	TANQUE CLIENTE

PRUEBAS	NORMATIVA	RESULTADOS AFSA LABORATORIO	ESPECIFICACIÓN SCT
DEL CEMENTO ASFALTICO ORIGINAL			
PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND °C MÍNIMO	ASTM 8254-19	288	230
VISCOSIDAD ROTACIONAL 135 °C Pa-s, MÁXIMO	ASTM D4402/15	1.28	3
MÓDULO REOLÓGICO CORTE DINÁMICO (G*/senδ) kPa, MÍNIMO	ASTM D7175/15	1.49	1
TEMPERATURA DE ENSAYO @ 10 rad/s, °C	ASTM D7175/15	76	76
RECUPERACIÓN ELASTICA POR TOSIÓN, 25 °C, %, MÍNIMO	M-MMP-4-05-024/21	45	40
RESIDUO DEL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA			
PERDIDA POR CALENTAMIENTO, % MÁXIMO	ASTM D2872/19	-0.124	1
MÓDULO REOLÓGICO CORTE DINÁMICO (G*/senδ) kPa MÍNIMO	ASTM D7175/15	2.83	2.2
TEMPERATURA DE ENSAYO @ 10 rad/s, °C	ASTM D7175/15	76	76
RESIDUO DE LA VASIJA DE ENVEJECIMIENTO (PAV)			
MÓDULO REOLÓGICO CORTE DINÁMICO (G*/senδ) kPa, MÁXIMO	ASTM D7175/15	3,127	5,000
TEMPERATURA DE ENSAYO @ 10 rad/s, °C	ASTM D7175/15	31	31
TEMPERATURA DE ENVEJECIMIENTO, °C	ASTM D6521/19	100	100
ÍNDICE DE ENDURECIMIENTO FÍSICO, MÁXIMO	ASTM D6648/08	187 (0.301)	-
RIGIDEZ DE FLEXIÓN S(I), Mpa, MÁXIMO (m=0.3 min.)	ASTM D6648/08	186 (0.302)	300
TEMPERATURA DE PRUEBA @ 60s, °C	ASTM D6648/08	-12	-12

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE ESPECIFICACIONES PARA UN PG 76-22 MODIFICADO



INGENIERO DE PRUEBA

L.Q. NORMA E. ROMÁN D.
