



LESA
Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO ASFÁLTICO


OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	No. DE ENSAYE:	1
LOCALIZACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE RECIBO:	05/06/2026
		FECHA DE INFORME:	06/06/2026

DATOS DEL MUESTREO:	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	CARPETA ASFÁLTICA, TAMAÑO NOMINAL TMA ½"	% DE ARENA
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL:	CAIIZA	% DE GRAVA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO:	TRITURADO	% DE SELLO
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO:	PLANTA	% DE ARENA 2
	BANCO PROCEDENCIA DEL MATERIAL PÉIREO:	GCC, NOMBRE DE DIOS	

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PÉTREO	COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	MASA ESPECÍFICA SECA SUELTA (kg/m³)			
		MALLAS		% QUE PASA	% PROYECTO
		DESIGNACIÓN	mm		
		1"	25.00	100	100
		3/4"	19.00	100	100
		1/2"	12.50	100	100
		3/8"	9.50	96	90-100
		1/4"	6.30	78	70-89
		No. 4	4.75	63	56-82
		No. 10	2.00	38	28-64
		No. 20	0.850	24	18-49
		No. 40	0.425	15	13-37
No. 60	0.250	11	10-29		
No. 100	0.150	9	6-21		
No. 200	0.075	6	2-10		
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA				%PROYECTO	
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO(%)				5.38	5.4
ADITIVO USADO	MARCA				
	TIPO				
	CANTIDAD				
AFINIDAD					
CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN				ESPECIFICACIÓN	
MASA ESPECIFICA (Kg/m³)				2400	2415
ESTABILIDAD (Kg)				987	817 MÍN
FLUJO (mm)				2.8	2 - 3.5
VACIOS (%)				3.8	3 - 5
V.A.M. (%)				15.8	12 MÍN
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO					
TIPO DE ASFALTO					
PENETRACIÓN					
VISCOSIDAD					
TEMPERATURA RECOMENDADA					
TEMPERATURA DE APLICACIÓN					

TRÁNSITO ESPERADO $1 \times 10^4 \leq Z_L \leq 30 \times 10^4$

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

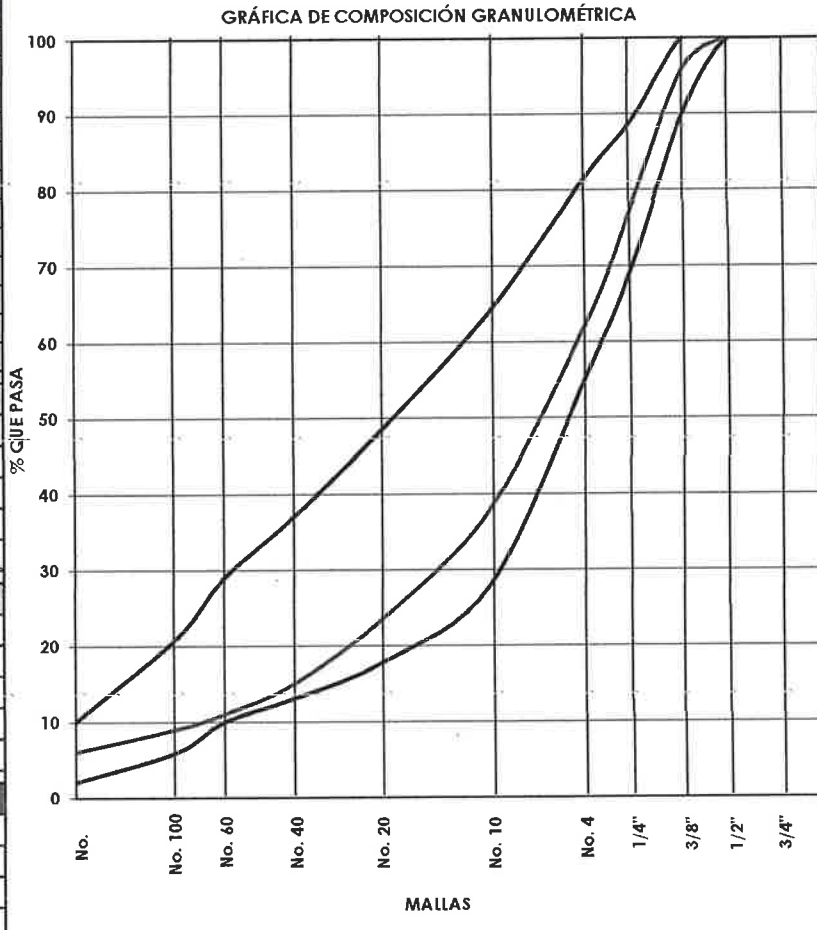

MALLAS	% QUE PASA (Muestra)	% QUE PASA (Proyecto)
No. 100	9	6
No. 60	11	10
No. 40	15	13
No. 20	24	18
No. 10	38	28
No. 4	63	56
1/4"	78	70
3/8"	96	90
1/2"	100	100
3/4"	100	100
1"	100	100

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

LA MUESTRA ANALISADA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE

NORMAS DE REFERENCIA: N-CMY-4-04/17 Y N-CMY-4-05-003/16

SUPERINTENDENTE

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

TÉCNICO LABORATORISTA

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO

ERICK CARAVEO CRUZ



LESA
Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO ASFÁLTICO

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	No. DE ENSAYE:	2
LOCALIZACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE RECIBO:	06/06/2026
		FECHA DE INFORME:	07/06/2026

DATOS DEL MUESTREO:	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	CARPETA ASFÁLTICA, TAMAÑO NOMINAL TMA ½"	% DE ARENA	
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL:	CALIZA	% DE GRAVA	
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO:	TRITURADO	% DE SELLO	
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO:	PLANTA	% DE ARENA 2	
	BANCO PROCEDENCIA DEL MATERIAL PÉTREO:	GCC, NOMBRE DE DIOS		

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PÉTREO	MASA ESPECÍFICA SECA SUELT (kg/m³)			
	MALLAS		% QUE PASA	% PROYECTO
	DESIGNACIÓN	mm		
	1"	25.00	100	100
	¾"	19.00	100	100
	½"	12.50	100	100
	3/8"	9.50	94	90-100
	¼"	6.30	81	70-89
	No. 4	4.75	63	56-82
	No. 10	2.00	36	28-64
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	No. 20	0.850	22	18-49
	No. 40	0.425	15	13-37
	No. 60	0.250	11	10-29
	No. 100	0.150	9	6-21
	No. 200	0.075	6	2-10


CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		% PROYECTO
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO (%)	5.39	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD	
AFINIDAD		

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACIÓN
MASA ESPECÍFICA (Kg/m³)	2388	2415
ESTABILIDAD (Kg)	994	817 MÍN
FLUJO (mm)	2.6	2 - 3.5
VACIOS (%)	3.5	3 - 5
V.A.M. (%)	15.4	12 MÍN

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO	
TIPO DE ASFALTO	
PENETRACIÓN	
VISCOSIDAD	
TEMPERATURA RECOMENDADA	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	

TRÁNSITO ESPERADO $1 \times 10^4 \leq ZI \leq 30 \times 10^4$

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

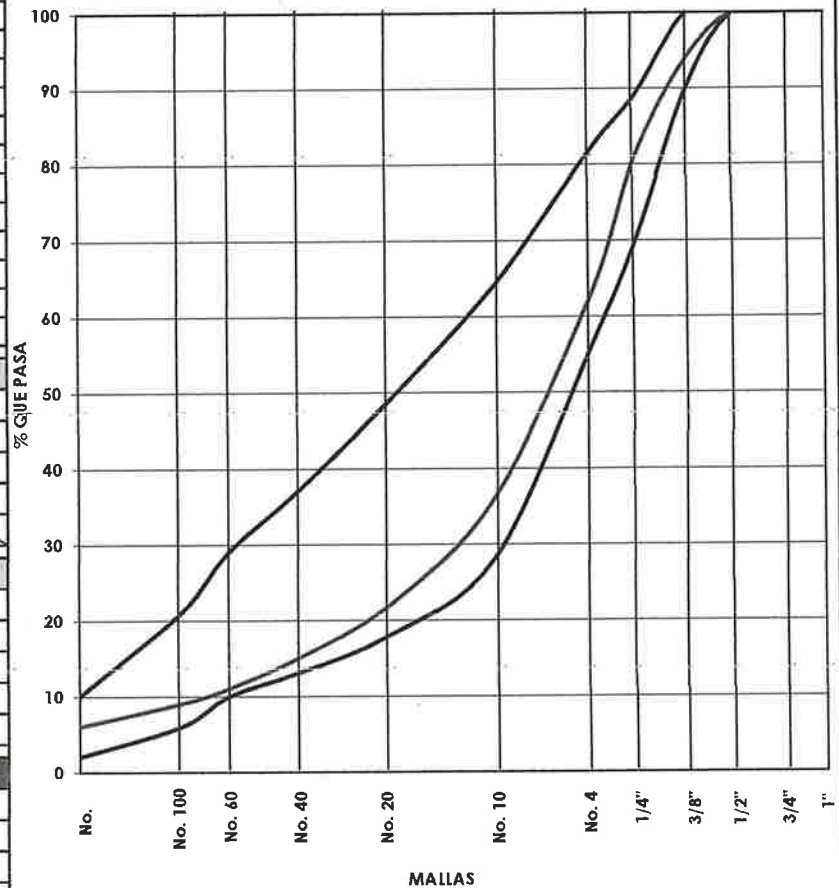

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

LA MUESTRA ANALISADA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE

NORMAS DE REFERENCIA: N-CMT-4-04/17 Y N-CMT-4-05-GOS/16

SUPERINTENDENTE

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

TÉCNICO LABORATORISTA

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO

ERICK CARAVEO CRUZ



LESA®

Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO ASFÁLTICO

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	No. DE ENSAYE:	3
LOCALIZACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE RECIBO:	08/06/2026
		FECHA DE INFORME:	09/06/2026

DATOS DEL MUESTREO:	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	CARPETA ASFÁLTICA, TAMAÑO NOMINAL TMA ½"	% DE ARENA
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL:	CALIZA	% DE GRAVA
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO:	TRITURADO	% DE SELLO
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO:	PLANTA	% DE ARENA 2
	BANCO PROCEDENCIA DEL MATERIAL PÉIREO:	GCC, NOMBRE DE DIOS	

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO	MASA ESPECÍFICA SECA-SUELTA (kg/m³)			
	MALLAS		% QUE PASA	% PROYECTO
	DESIGNACIÓN	mm		
	1"	25.00	100	100
	3/4"	19.00	100	100
	1/2"	12.50	100	100
	3/8"	9.50	96	90-100
	1/4"	6.30	75	70-89
	No. 4	4.75	61	56-82
	No. 10	2.00	35	28-64
	No. 20	0.850	22	18-49
	No. 40	0.425	16	13-37
	No. 60	0.250	11	10-29
	No. 100	0.150	8	6-21
	No. 200	0.075	5	2-10


CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA			% PROYECTO
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO(%)			5.46
ADIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD		
ARNIDAD			

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACIÓN
MASA ESPECIFICA (Kg/m³)	2410	2415
ESTABILIDAD (Kg)	988	817 MÍN
FLUJO (mm)	2.6	2 - 3.5
VACIOS (%)	3.5	3 - 5
V.A.M. (%)	15.8	12 MÍN

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO	
TIPO DE ASFALTO	
PENETRACIÓN	
VISCOSIDAD	
TEMPERATURA RECOMENDADA	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	

TRÁNSITO ESPERADO $1 \times 10^4 \leq ZI \leq 30 \times 10^4$

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

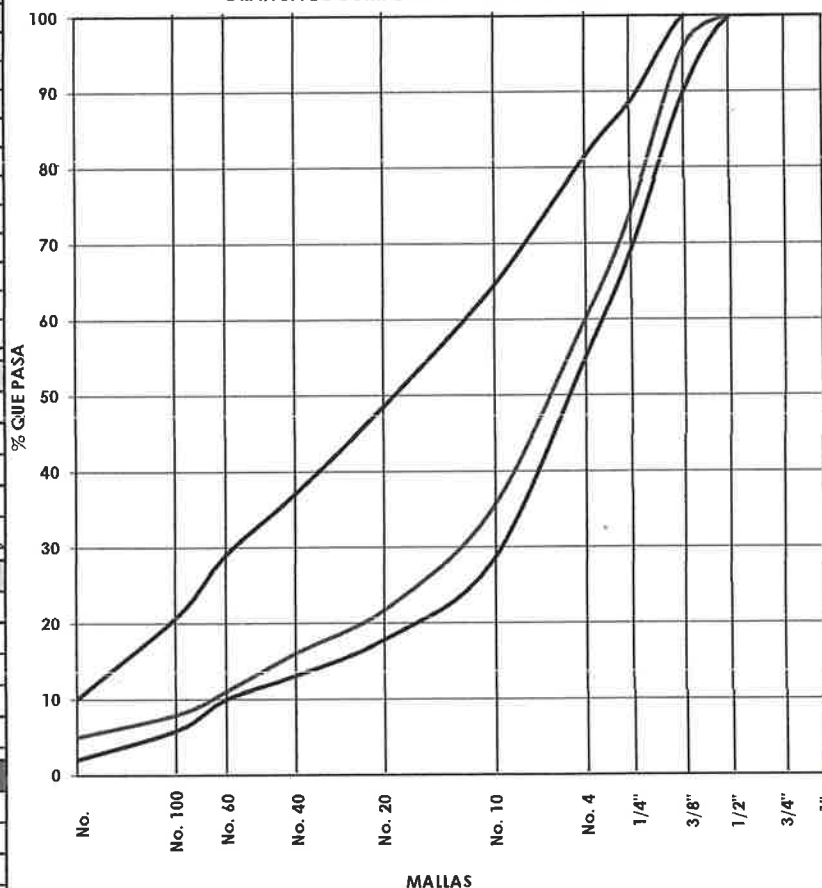

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

LA MUESTRA ANALISADA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE

NORMAS DE REFERENCIA: N-CMT-4-04/17 Y N-CMT-4-05-003/16

SUPERINTENDENTE

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

TÉCNICO LABORATORISTA

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO

ERICK CARAVEO CRUZ



LESA®

Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO ASFÁLTICO

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	No. DE ENSAYE:	4
LOCALIZACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE RECIBO:	09/06/2026
		FECHA DE INFORME:	10/06/2026

DATOS DEL MUESTREO:	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	CARPETA ASFÁLTICA, TAMAÑO NOMINAL TMA ½"	% DE ARENA	
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL:	CAUIZA	% DE GRAVA	
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO:	TRITURADO	% DE SELLO	
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO:	PLANTA	% DE ARENA 2	
	BANCO PROCEDENCIA DEL MATERIAL PÉTREO:	GCC, NOMBRE DE DIOS		

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PÉTREO	MASA ESPECÍFICA SECA SUELTA (kg/m³)				TRÁNSITO ESPERADO $1 \times 10^4 \leq \Sigma \leq 30 \times 10^4$				
	COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	MALLAS		% QUE PASA	% PROYECTO	GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA			
		DESIGNACIÓN	mm						
		1"	25.00	100	100				
		3/4"	19.00	100	100				
		1/2"	12.50	100	100				
		3/8"	9.50	96	90-100				
		1/4"	6.30	77	70-89				
		No. 4	4.75	64	56-82				
		No. 10	2.00	37	28-64				
		No. 20	0.850	22	18-49				
		No. 40	0.425	15	13-37				
		No. 60	0.250	12	10-29				
		No. 100	0.150	9	6-21				
		No. 200	0.075	6	2-10				
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA				%PROYECTO					
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO(%)				5.36	5.4				
ADITIVO USADO	MARCA								
	TIPO								
	CANTIDAD								
ARNIDAD									
CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN				ESPECIFICACIÓN					
MASA ESPECIFICA (Kg/m³)				2495	2415				
ESTABILIDAD (Kg)				974	817 MÍN				
FLUJO (mm)				2.5	2 - 3.5				
VACIOS (%)				3.2	3 - 5				
V.A.M. (%)				15.4	12 MÍN				
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO									
TIPO DE ASFALTO									
PENETRACIÓN									
VISCOSIDAD									
TEMPERATURA RECOMENDADA									
TEMPERATURA DE APLICACIÓN									

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

LA MUESTRA ANALISADA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE

NORMAS DE REFERENCIA: N-CMT-4-04/17 Y N-CMY-4-05-003/16

SUPERINTENDENTE

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

TÉCNICO LABORATORISTA

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO

ERICK CARAVEO CRUZ



LESA®

Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO ASFÁLTICO

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	No. DE ENSAYE:	5
LOCALIZACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE RECIBO:	11/06/2026
		FECHA DE INFORME:	12/06/2026

DATOS DEL MUESTREO:	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	CARPETA ASFÁLTICA, TAMAÑO NOMINAL TMA ½"	% DE ARENA	
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL:	CALIZA	% DE GRAVA	
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO:	TRITURADO	% DE SELLO	
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO:	PLANTA	% DE ARENA 2	
	BANCO PROCEDENCIA DEL MATERIAL PÉTREO:	GCC, NOMBRE DE DIOS		

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PÉTREO	MASA ESPECÍFICA SECA SUELTA (kg/m³)			
	COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	MALLAS		% QUE PASA
		DESIGNACIÓN	mm	
		1"	25.00	100
		3/4"	19.00	100
		1/2"	12.50	100
		3/8"	9.50	94
		1/4"	6.30	77
		No. 4	4.75	65
		No. 10	2.00	36
		No. 20	0.850	23
		No. 40	0.425	16
		No. 60	0.250	12
		No. 100	0.150	9
		No. 200	0.075	6


CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA			% PROYECTO
CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO (%)			5.50
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD		
AFINIDAD			

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECIMEN		ESPECIFICACIÓN
MASA ESPECÍFICA (kg/m³)	2385	2415
ESTABILIDAD (kg)	991	817 MÍN
FLUJO (mm)	2.8	2 - 3.5
VACIOS (%)	3.8	3 - 5
V.A.M. (%)	15.7	12 MÍN

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO	
TIPO DE ASFALTO	
PENETRACIÓN	
VISCOSIDAD	
TEMPERATURA RECOMENDADA	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	

TRÁNSITO ESPERADO $1 \times 10^6 \leq ZI \leq 30 \times 10^6$

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

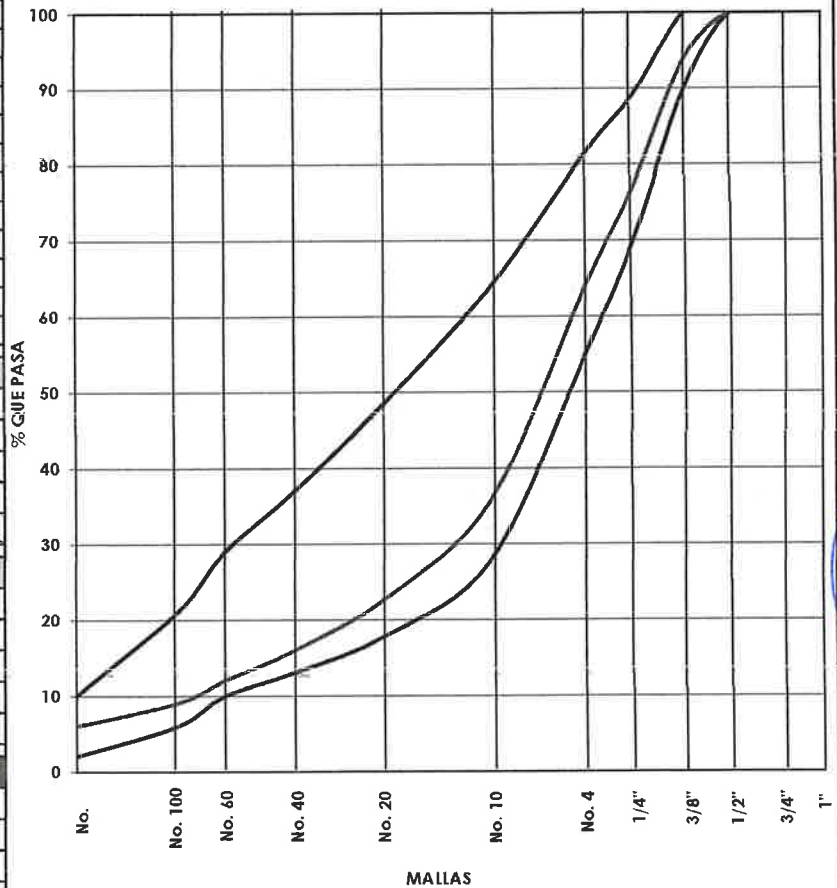

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

LA MUESTRA ANALISADA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE

NORMAS DE REFERENCIA: N-CMT-4-04/17 Y N-CMT-4-05-003/16

SUPERINTENDENTE

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

TÉCNICO LABORATORISTA

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO

ERICK CARAVEO CRUZ



LESA®

Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE RIEGOS :

LIGA

X

OBRA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL
TRAMO: CALLE DE ARUCO
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

ENSAYES No. 1

FECHA DE RECIBO 05-jun-26

FECHA DE INFORME 06-jun-26

REPORTE DE CAMPO No. 1
PRODUCTO ASF. EMPLEADO ECR - 60
ADITIVO EMPLEADO NINGUNO
EQUIPO DE BARRIDO MECANICO

HORA DE INICIACION 9:50

HORA DE TERMINACION 11:05

CANTIDAD RECOMENDADA 61°C

CANTIDAD RECOMENDADA 0.5 L/m²

CANTIDAD EMPLEADA 0.50


PROFUNDIDAD MEDIA DE MATERIAL SECO

CONDICIONES DEL CLIMA BUENAS TEMPERATURA AMBIENTE 23 °C

DE KM A KM	FRANJA	CUERPO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA (m ²)	PRODUCTO ASFALTICO		TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA ANTES DE SU IMPREGNACION	
						REGADO			
						LITROS	L/m ²		
0+000	0+138	DER	UNICO	138	3.40	469	235	0.50	ACEPTABLE
0+138	0+000	IZQ	UNICO	138	3.40	469	235	0.50	ACEPTABLE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUPERINTENDENTE
ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO
LABORATORISTA
TEC. ERICK CARAVEO



Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE RIEGOS : IMPREGNACION

LIGA X

OBRA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL		
TRAMO:	CALLE CISNE 1	ENSAYES No.	2
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE RECIBO	06-jun-26
		FECHA DE INFORME	07-jun-26

REPORTE DE CAMPO No.	2	HORA DE INICIACION	8:30	HORA DE TERMINACION	9:50
PRODUCTO ASF. EMPLEADO	ECR - 60	CANTIDAD RECOMENDADA		TEMP. DE APLICACION	60°C
ADITIVO EMPLEADO	NINGUNO	CANTIDAD RECOMENDADA	0.5 L/m²	CANTIDAD EMPLEADA	0.50
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO	PROFUNDIDAD MEDIA DE MATERIAL SECO			
CONDICIONES DEL CL MA	BUENAS	TEMPERATURA AMBIENTE	23	°C	

DE KM A KM	FRANJA	CUERPO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA (m ²)	PRODUCTO ASFALTICO		TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA ANTES DE SU IMPREGNACION	
						LITROS	REGADO L/m ²		
0+000	0+130	DER	UNICO	129	3.40	439	220	0.50	ACEPTABLE
0+130	0+000	IZQ	UNICO	129	3.40	439	220	0.50	ACEPTABLE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUPERINTENDENTE	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	LABORATORISTA
NOMBRE Y FIRMA	ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO	TEC. ERICK CARAVEO



LESA®

Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE RIEGOS : IMPREGNACION

LIGA **X**

OBRA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL ENSAYES No. **3**

TRAMO: CALLE CISNE 2 FECHA DE RECIBO **06-jun-26**

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA DE INFORME **07-jun-26**

REPORTE DE CAMPO No. **3** HORA DE INICIACION **9:05** HORA DE TERMINACION **11:00**

PRODUCTO ASF. EMPLEADO **ECR - 60** CANTIDAD RECOMENDADA TEMP. DE APLICACION **60°C**

ADITIVO EMPLEADO **NINGUNO** CANTIDAD RECOMENDADA **0.5 L/m²** CANTIDAD EMPLEADA **0.51**

EQUIPO DE BARRIDO **MECANICO** PROFUNDIDAD MEDIA DE MATERIAL SECO

CONDICIONES DEL CLIMA **BUENAS** TEMPERATURA AMBIENTE **24 °C**

DE KM A KM	FRANJA	CUERPO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	PRODUCTO ASFALTICO		TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA ANTES DE SU IMPREGNACION
						LITROS	REGADO	
0+000	0+116	DER	116	3.40	394	200	0.51	ACEPTABLE
0+116	0+000	IZQ	116	3.40	394	200	0.51	ACEPTABLE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUPERINTENDENTE

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

LABORATORISTA

ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO

TEC. ERICK CARAVEO



INFORME DE RIEGOS : IMPREGNACION

LIGA X

X

OBRA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	ENSAYES No.	4
TRAMO:	CALLE FAISAN	FECHA DE RECIBO	06-jun-26
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE INFORME	07-jun-26

REPORTE DE CAMPO No.	4	HORA DE INICIACION	9:05	HORA DE TERMINACION	11:00
PRODUCTO ASF. EMPLEADO	ECR - 60	CANTIDAD RECOMENDADA		TEMP. DE APLICACION	60°C
ADITIVO EMPLEADO	NINGUNO	CANTIDAD RECOMENDADA	0.5 L/m²	CANTIDAD EMPLEADA	0.50
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO	PROFUNDIDAD MEDIA DE MATERIAL SECO			
CONDICIONES DEL CLIMA	BUENAS	TEMPERATURA AMBIENTE	24	°C	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUPERINTENDENTE	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	LABORATORISTA
		
NOMBRE Y FIRMA	ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO	TEC. ERICK CARAVEO



LESA®
Laboratorio y estudios de suelos y asfaltos

INFORME DE RIEGOS : **IMPREGNACION**

LIGA **X**

OBRA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y ENSAYES No. 5
CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL
TRAMO: CALLE FAISAN 11-jun-26
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. 12-jun-26

REPORTE DE CAMPO No. 5 HORA DE INICIACION 8:50 HORA DE TERMINACION 10:30
PRODUCTO ASF. EMPLEADO ECR - 60 CANTIDAD RECOMENDADA TEMP. DE APLICACION 60°C
ADITIVO EMPLEADO NINGUNO CANTIDAD RECOMENDADA 0.5 L/m² CANTIDAD EMPLEADA 0.50
EQUIPO DE BARRIDO MECANICO PROFUNDIDAD MEDIA DE MATERIAL SECO

CONDICIONES DEL CL MA				BUENAS			TEMPERATURA AMBIENTE		24	°C	TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA ANTES DE SU IMPREGNACION
DE KM A KM	FRANJA	CUERPO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA (m ²)	PRODUCTO ASFALTICO		LITROS	REGADO	U/m ²	
0+148	0+370	DER	222	4.50	999	500	0.50				ACEPTABLE
0+370	0+000	IZQ	370	4.50	1665	830	0.50				ACEPTABLE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUPERINTENDENTE
ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO
LABORATORISTA
TEC. ERICK CARAVEO



TEC. ERICK CARAVEDO CRUZ

OBRA	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL
------	---

FECHA DE RECIBO	13/06/2026
FECHA DE INFORME	14/06/2026

LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.

ESPESOR DE PROYECTO	GRADO DE COMPACTACION DE PROYECTO
10	95
15	95
20	95
25	95
30	95
35	95
40	95
45	95
50	95
55	95
60	95
65	95
70	95
75	95
80	95
85	95
90	95
95	95
100	95
105	95
110	95
115	95
120	95
125	95
130	95
135	95
140	95
145	95
150	95
155	95
160	95
165	95
170	95
175	95
180	95
185	95
190	95
195	95
200	95
205	95
210	95
215	95
220	95
225	95
230	95
235	95
240	95
245	95
250	95
255	95
260	95
265	95
270	95
275	95
280	95
285	95
290	95
295	95
300	95
305	95
310	95
315	95
320	95
325	95
330	95
335	95
340	95
345	95
350	95
355	95
360	95
365	95
370	95
375	95
380	95
385	95
390	95
395	95
400	95
405	95
410	95
415	95
420	95
425	95
430	95
435	95
440	95
445	95
450	95
455	95
460	95
465	95
470	95
475	95
480	95
485	95
490	95
495	95
500	95
505	95
510	95
515	95
520	95
525	95
530	95
535	95
540	95
545	95
550	95
555	95
560	95
565	95
570	95
575	95
580	95
585	95
590	95
595	95
600	95
605	95
610	95
615	95
620	95
625	95
630	95
635	95
640	95
645	95
650	95
655	95
660	95
665	95
670	95
675	95
680	95
685	95
690	95
695	95
700	95
705	95
710	95
715	95
720	95
725	95
730	95
735	95
740	95
745	95
750	95
755	95
760	95
765	95
770	95
775	95
780	95
785	95
790	95
795	95
800	95
805	95
810	95
815	95
820	95
825	95
830	95
835	95
840	95
845	95
850	95
8	

ENSAYE No.	ESTACION km.	FRANJA Lado	ESPESOR CAPA cm.	PESOS			PESOS ESPECIFICOS				GRADO COMPACTACION %		
				AIRE A	CUBIERTO B	AGUA C	DIF D= A-B	AGUA E= B-C	VOL ESTEA F= D/DEN EST	DIF G= E-F		ESPECIMEN kg./m ³	PROYECTO kg./m ³
CALLE FAISAN													
9	0+010	DER	2.01	380.8	391.6	216.4	10.8	175.2	12.9	162.3	2346	2415	97
10	0+055	CEN	2.00	386.4	397.1	216.8	10.7	180.3	12.7	167.6	2306	2415	95
11	0+100	IZQ	2.05	376.4	385.8	210.1	9.4	175.7	11.2	164.5	2288	2415	95
12	0+150	DER	2.10	382.2	392.1	215.8	9.9	176.3	11.8	164.5	2323	2415	96
13	0+205	CEN	2.06	381.9	392.7	216.8	10.8	175.9	12.9	163.0	2342	2415	97
14	0+253	IZQ	2.02	388.9	399.1	220.0	10.2	179.1	12.1	167.0	2329	2415	96
15	0+308	DER	2.03	375.2	387.0	208.6	11.8	178.4	14.0	164.4	2283	2415	95
16	0+365	CEN	2.00	384.7	396.4	214.8	11.7	181.6	13.9	167.7	2294	2415	95

P.V.M. = PESO VOLUMETRICO DE LA MEZCLA EN EL TRAMO
C.A. = CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO. (PORCIENTO)

SUPERINTENDENTE

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

LABORATORISTA

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO

TEC. ERICK CARAVEO CRUZ



INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	REPORTE DE CAMPO No.	1
		FECHA DE RECIBO:	05/06/2026
UBICACIÓN:	CALLE DE ARUCO	FECHA DE INFORME:	06/06/2026

CAPA:	CARPEA ASFALTICA T.M.A. 3/8	ESPEOR DE PROYECTO DE LA CAPA:	2.0
UBICACIÓN PLANTA:	PLANTA GLSA CHIHUAHUA	ESPEOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR:	2.5

[illegible]**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:**

SUPERINTENDENTE _____ NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD _____ ING. JOSE LUIS CARRILLO MORENO	LABORATORISTA _____ TEC. ERICK CARAVEO
---	--	---



INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCCO COL. COLINAS DEL SOL	REPORTE DE CAMPO No.	2
		FECHA DE RECIBO:	06/06/2026
UBICACIÓN:	CALLE CISNE 1	FECHA DE INFORME:	07/06/2026

CAPA:	CARPETA ASFALTICA T.M.A. 3/8	ESPESOR DE PROYECTO DE LA CAPA:	2.0
UBICACIÓN PLANTA:	PLANTA GLSA CHIHUAHUA	ESPESOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR:	2.5

[illegible]**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:**

SUPERINTENDENTE	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	LABORATORISTA
		
NOMBRE Y FIRMA	ING JOSE LUIS CARRILLO MORENO	TEC. ERICK CARAVEO



Labor and Management Studies, 40, 401-414.

INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	REPORTE DE CAMPO No.	3
		FECHA DE RECIBO:	08/06/2026
UBICACIÓN:	CALLE CISNE 2	FECHA DE INFORME:	09/06/2026

CAPA:	CARPEA ASFALTICA T.M.A. 3/8	ESPEJOR DE PROYECTO DE LA CAPA:	2.0
UBICACIÓN PLANTA:	PLANTA GLSA CHIHUAHUA	ESPEJOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR:	2.5

[illegible]**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:**

SUPERINTENDENTE  NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD  ING JOSE LUIS CARRILLO MORENO	LABORATORISTA  TEC. ERICK CARAVEO
---	--	---



INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA:	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE CISNE ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ARUCO COL. COLINAS DEL SOL	REPORTE DE CAMPO No. 4
		FECHA DE RECIBO: 09/06/2026
UBICACIÓN:	CALLE FAISAN	FECHA DE INFORME: 10/06/2026

CAPA:	CARPEA ASFALTICA T.M.A. 3/8	ESPESOR DE PROYECTO DE LA CAPA:	2.0
UBICACIÓN PLANTA:	PLANTA GISA CHIHUAHUA	ESPESOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR:	2.5

[illegible]

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

SUPERINTENDENTE 	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 	LABORATORISTA 
NOMBRE Y FIRMA	ING JOSE LUIS CARRILLO MORENO	TEC. ERICK CARAVEO



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA		BACHEO CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		PLANTA	CYP CRUZ SAENZ	
LOCALIZACIÓN :		DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		FECHA RECIBO	25/05/2026	
				FECHA INFORME	25/05/2026	
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE PLANTA CYP CRUZ SAENZ 25-MAYO-2026						
MUESTRA		MEZCLA ASFALTICA 3/4"				
DESCRIPCION DEL MATERIAL		ROCA CALIZA				
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO		TRITURACIÓN TOTAL				
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO		EN LA PLANTA DE ASFALTOS				
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO		MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA				
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA			COMPOSICION GRANULOMETRICA % QUE PASA MALLAS		
	CARPETA ASFALTICA					
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA			PROYECTO
		1"	100			
		3/4"	100			100
		1/2"	100			90-100
		3/8"	89			76-92
		1/4"	77			56-81
		Núm. 4	68			45-74
		Num. 10	37			25-55
		Núm. 20	23			15-42
		Núm. 40	13			11-32
		Núm. 60	11			8-25
		Núm. 100	8			5-18
		Núm. 200	6			2-9
	RET. MALLA		%			
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³					
	ABSORCION %					
	DENSIDAD					
	DESGASTE %					
	PART. ALARGADAS %					
	PART. LAJEADAS %					
	EQUIV. ARENA %					
	CONTRACCIÓN LINEAL %					
	CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO					
TIPO		AC - 30				
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.						
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg						
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES				
TEMP. DE ELABORACION, °C		170				
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2367				
ESTABILIDAD, kg.		1223 817.5				
FLUJO, mm		2.9 2 - 3.5				
VACIOS, %		4.0 DE 3 A 5				
VAM, %		15.6 14 MIN				
CONT. CEM ASF/PETREO, %		5.2 5.3				
ADITIVO USADO	MARCA					
	TIPO					
	CANTIDAD/ C.A.					
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO					
OBSERVACIONES:						
ESPECIFICACIONES						
REPORTAMOS LA COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA Y EL CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO ANALIZADO.						
		GERENTE GENERAL				
		ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.				



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA BACHEO CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		PLANTA CYP CRUZ SAENZ	
LOCALIZACIÓN : DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		FECHA RECIBO 27/05/2026	
		FECHA INFORME 27/05/2026	
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE PLANTA CYP CRUZ SAENZ 27-MAYO-2026			
MUESTRA		MEZCLA ASFALTICA 3/4"	
DESCRIPCION DEL MATERIAL		ROCA CALIZA	
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO		TRITURACION TOTAL	
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO		EN LA PLANTA DE ASFALTOS	
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO		MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA	
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA
		1"	100
		3/4"	100
		1/2"	92
		3/8"	87
		1/4"	75
		Núm. 4	67
		Núm. 10	36
		Núm. 20	23
		Núm. 40	15
		Núm. 60	12
		Núm. 100	9
	Núm. 200	7	
	RET. MALLA	%	
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
	ABSORCION %		
	DENSIDAD		
	DESGASTE %		
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO AC - 30			
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ASFÁLTICA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES			
GERENTE GENERAL			
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.			

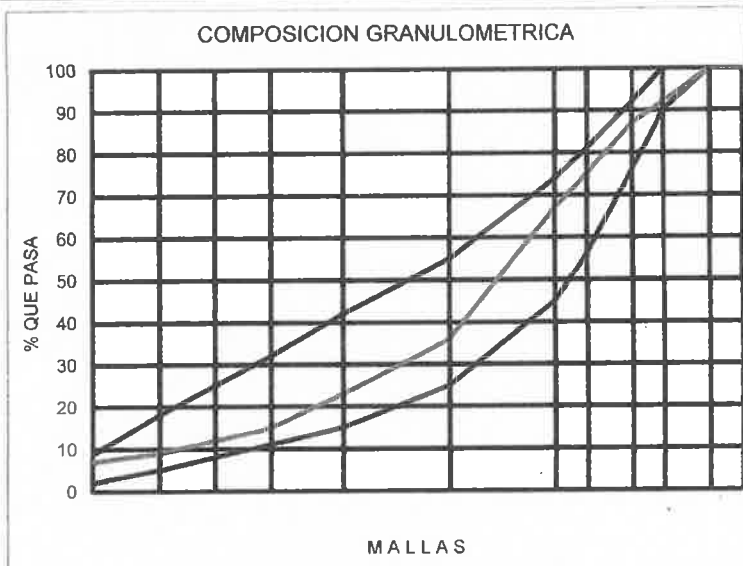

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3		2341
ESTABILIDAD, kg.	1243	817.5
FLUJO, mm	2.7	2 - 3.5
VACIOS, %	4.1	DE 3 A 5
VAM, %	15.5	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA		BACHEO CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		PLANTA	CYP CRUZ SAENZ		
LOCALIZACIÓN :				DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		FECHA RECIBO	29/05/2026
						FECHA INFORME	29/05/2026
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE PLANTA CYP CRUZ SAENZ 29-MAYO-2026							
MUESTRA		MEZCLA ASFALTICA 3/4"					
DESCRIPCION DEL MATERIAL		ROCA CALIZA					
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO		TRITURACION TOTAL					
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO		EN LA PLANTA DE ASFALTOS					
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO		MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA					
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA						
	CARPETA ASFALTICA						
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO			
		1"	100				
		3/4"	100	100			
		1/2"	93	90-100			
		3/8"	88	76-92			
		1/4"	74	56-81			
		Núm. 4	66	45-74			
		Num. 10	37	25-55			
		Núm. 20	22	15-42			
		Núm. 40	15	11-32			
		Núm. 60	12	8-25			
		Núm. 100	9	5-18			
	Núm. 200	6	2-9				
	RET. MALLA		%				
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³						
	ABSORCION %						
	DENSIDAD						
	DESGASTE %						
PART. ALARGADAS %							
PART. LAJEADAS %							
EQUIV. ARENA %							
CONTRACCIÓN LINEAL %							
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO							
TIPO		AC - 30					
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.							
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg							
COMPOSICION GRANULOMETRICA							
MALLAS							
N-CMT.04-04/17							
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA				ESPECIFICACIONES			
TEMP. DE ELABORACION, °C				160			
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³				2268			
ESTABILIDAD, kg.				1247		817.5	
FLUJO, mm				2.8		2 - 3.5	
VACIOS, %				4.3		DE 3 A 5	
VAM. %				15.4		14 MIN	
CONT. CEM.ASF/PETREO, %				5.4		5.3	
ADITIVO USADO	MARCA						
	TIPO						
	CANTIDAD/ C.A.						
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO					
OBSERVACIONES:							
LA MEZCLA ASFÁLTICA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES							
GERENTE GENERAL							
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.							



CERTIFICADO DE CALIDAD

PROYECTOS Y LABORATORIO **INFORME DE PRUEBAS DE CEMENTOS ASFALTICOS**
ASFALTO AC-30 (BETÚN DE PETROLEO)

OBRA: **CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.** REMISIÓN: **34480**
LOCALIZACIÓN: **CHIHUAHUA, CHIH.** FECHA DE INFORME: **20 DE MAYO DEL 2026**

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO **ASFALTOS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**
TIPO DE PRODUCTO INDICADO EN LA REMISIÓN **AC-30**
DEPOSITO MUESTREADO **TANQUE CLIENTE**

PRUEBAS	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS LABORATORIO AFSA	ESPECIFICACIÓN
			N-CMT-4-05-001
DEL CEMENTO ASFALTICO ORIGINAL			
PENETRACIÓN A 25°C, 100 GRAMOS, 5 SEG (EN 0.1 MM), MÍNIMO	M-MMP-4-05-006/00	53	50
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL A 135 °C, SEG, MÍNIMO	M-MMP-4-05-004/00	277	150
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C, Pa-s	M-MMP-4-05-002/02	3,161	2,400-3,600
VISCOSIDAD CINEMATICA A 135°C (CENTISTOKES), MÍNIMO	M-MMP-4-05-003/02	427	350
PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND (°C),MÍNIMO	M-MMP-4-05-007/00	305	232
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO (°C)	M-MMP-4-05-009/00	50.6	50-58
SOLUBILIDAD EN (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-008/00	99.6%	99%
DEL RESIDUO DE LA PRUEBA DE LA PELÍCULA DELGADA			
PERDIDA POR CALENTAMIENTO (%), MÁXIMO	M-MMP-4-05-010/02	-0.072	0.5
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C Pa-s, MÁXIMO	M-MMP-4-05-002/02	9,244	12,000
PENETRACIÓN RETENIDA 25 °C (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-010/02	46	40
DUCTILIDAD A 25 °C, 5 CM/MIN, CM, MÍNIMO	M-MMP-4-05-011/07	68	58

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES COMO UN AC-30



INGENIERO DE PRUEBA

L.Q. NORMA ROMÁN
L.Q. NORMA ROMÁN



FASE EMULSIONES

CALLE 63 No. 6313 COL. CONCORDIA. CHIHUAHUA.CHIH.

INFORME DE PRUEBAS DE LABORATORIO

PRODUCTO: EMULSION CATIONICA ECR-65

EMPRESA: CYP

LOCALIZACION: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ENSAYE No. 20

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2026

ESTADO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME: 15/05/2026

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO

TAD-CADEREYTA NL.

TIPO DE CEMENTO ASFALTICO UTILIZADO

AC-20 EKBE 64-22

EMULSION CATIONICA ECR-65	ENSAYES		ESPECIFICACION
PRUEBAS	No	No	SCT
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO EN MASA :%,MINIMO	65.4		65
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 25 °C .S, MINIMO	N/A		N/A
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 50 °C .S, MINIMO	46		40
ASENTAMIENTO EN 5 DIAS: DIFERENCIA EN %. MAXIMO	0.005		5
RETENCION EN LA MALLA No20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ%.MAX	0.1		0.1
PASA MALLA No 20 Y SE RETIENE EN MALLA No 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ: %. MAXIMO	0.15		0.25
CARGA ELECTRICA DE LA PARTICULA	+		(+)
RESIDUO DE LA DESTILACION, % EN VOLUMEN (SOLVENTE)	N/A		
DISOLVENTE EN VOLUMEN: %, MAXIMO	3		3
EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION			
VISCOSIDAD DINAMICA A 60° C;PAS(P(1)),MAXIMO	N/A		50 +- 10
PENETRACION A 25 °C; 100 g, 5 SEGG;GRADOS.	119		110-250
SOLUBILIDAD: %, MINIMO	N/A		
DUCTIBILIDAD, % 25°C, CM, MINIMO	N/A		

OBSERVACIONES:

LA EMULSION CUMPLE LOS REQUISITOS PARA UNA EMULSION ECR-65

LABORATORIO

ING. OMAR AGUILERA OLIVAS

GERENTE

ING. MANUEL SANCHEZ MEDRANO




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
LOCALIZACION	MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CYP CRUZ	FECHA RECIBO	05/07/2025
		FECHA INFORME	13/07/2025
MUESTRA	PETREO CLASIFICADO DE MALLA No. 4 A FINOS (POLVILLO)		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	100	60-82
	1/4"	100	44-71
	Núm. 4	100	37-64
	Num. 10	64	20-46
	Núm. 20	39	12-35
	Núm. 40	23	8-27
	Núm. 60	19	6-21
	Núm. 100	15	4-16
	Núm. 200	12	2-8
RET. MALLA			
			%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		1620	
ABSORCION %			
DENSIDAD		2.71	(2.4 MIN)
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %		65	(50 MIN)
CONTRACCION LINEAL %		1.2	

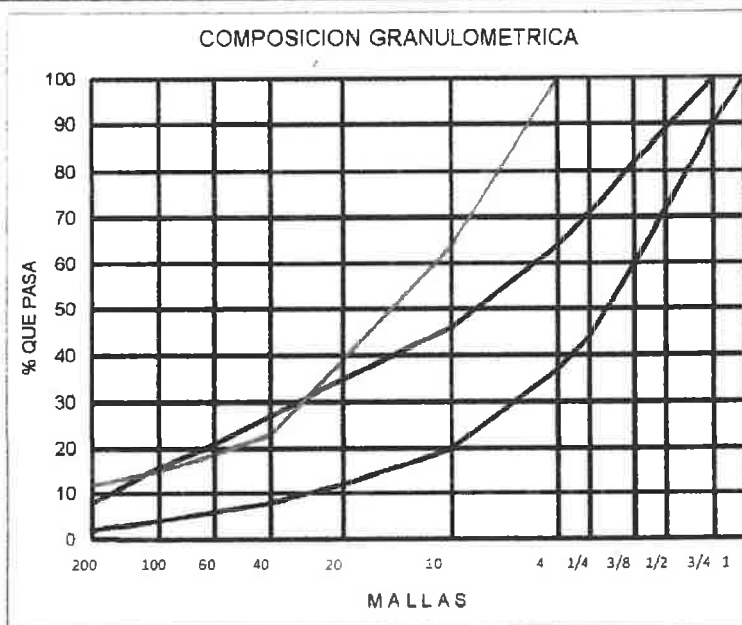

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:
REPORTAMOS LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA No. 4 Y FINOS.

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONSTRUCTORA CYP CRUZ		FECHA RECIBO	05/07/2025
PETREO DE 3/8" A No. 10 (SELLO)		FECHA INFORME	13/07/2025

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA
		PROYECTO	
		1"	100
		3/4"	100
		1/2"	100
		3/8"	78
		1/4"	43
		Núm. 4	21
		Núm. 10	2
		Núm. 20	0
		Núm. 40	0
		Núm. 60	0
		Núm. 100	0
		Núm. 200	0
		RET. MALLA	%
	P V SECO SUELTO Kg/m ³		
	1460		
	ABSORCION %		
	0.72		
	DENSIDAD		
	2.68 (2.4 MIN)		
	DESGASTE %		
	26.3 (35 MAX)		
	PART. ALARGADAS %		
	9.0		
	PART. LAJEADAS %		
	11.9		
	EQUIV. ARENA %		
	CONTRACCION LINEAL %		

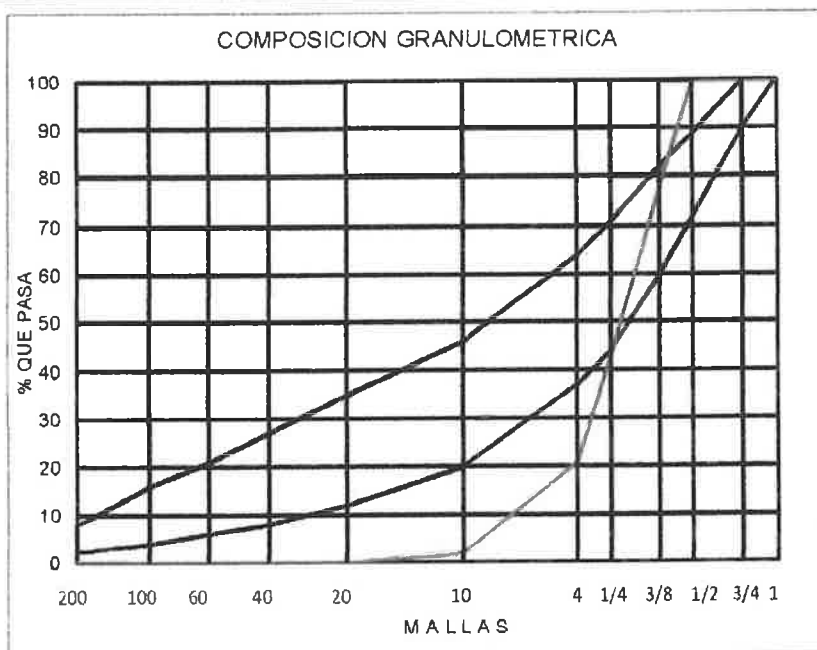

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM. ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C A	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

OBSERVACIONES:
REPORTAMOS LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA 3/8" A No. 10.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
LOCALIZACION	MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CYP CRUZ	FECHA RECIBO	05/07/2025
		FECHA INFORME	13/07/2025
MUESTRA	PETREO CLASIFICADO DE 3/4" A MALLA No. 4 (GRAVA)		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	GCC EN COLONIA NOMBRE DE DIOS		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	99	90-100
	1/2"	81	72-89
	3/8"	52	60-82
	1/4"	12	44-71
	Núm. 4	3	37-64
	Núm. 10	1	20-46
	Núm. 20	0	12-35
	Núm. 40	0	8-27
	Núm. 60	0	6-21
	Núm. 100	0	4-16
	Núm. 200	0	2-8
RET. MALLA			%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		1539	
ABSORCION %	0.85		
DENSIDAD	2.68	(2.4 MIN)	
DESGASTE %	26	(35 MAX)	
PART. ALARGADAS %	10.1	} (35MAX)	
PART. LAJEADAS %	9.8		
EQUIV. ARENA %		(50 MIN)	
CONTRACCION LINEAL %			

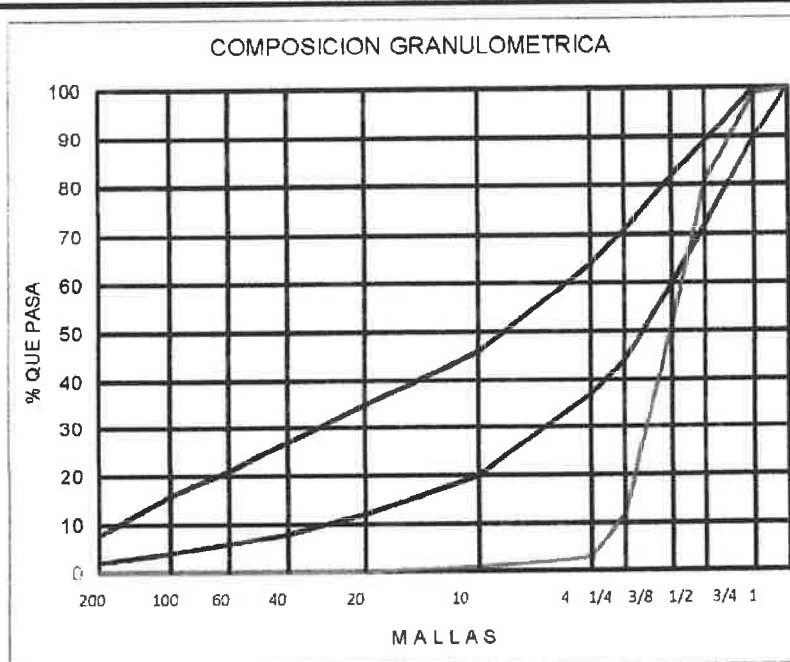

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD kg		817.5
FLUJO mm		2 - 3.5
VACIOS %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM. ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:
EL MATERIAL ENSAYADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ELABORACION DE MEZCLA ASF.

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	05/07/2025
20% MATERIAL CLASIFICADO DE MALLA 3/4 A No. 4 (GRAVA), 20% DE MATERIAL ENTRE MALLA 3/8" Y No. 4, 60% MATERIAL DE MALLA No. 4 A FINOS.		FECHA INFORME	13/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	100-100
	3/4"	100	88 - 100
	1/2"	90	74 - 100
	3/8"	84	65 - 85
	1/4"	70	54 - 72
	Núm. 4	64	47 - 65
	Num 10	32	32 - 48
	Núm 20	20	21 - 34
	Núm 40	13	14 - 24
	Núm 60	11	10 - 18
	Núm 100	9	7 - 13
	Núm 200	7	4 - 9
RET. MALLA			%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		1672	
ABSORCION %		2.1	
DENSIDAD		2.69	(2.4 MIN)
DESGASTE %		26.7	(35 MAX)
PART. ALARGADAS %		10.4	} (40MAX)
PART. LAJEADAS %		9.9	
EQUIV. ARENA %		71	(50 MIN)
CONTRACCION LINEAL %		1	

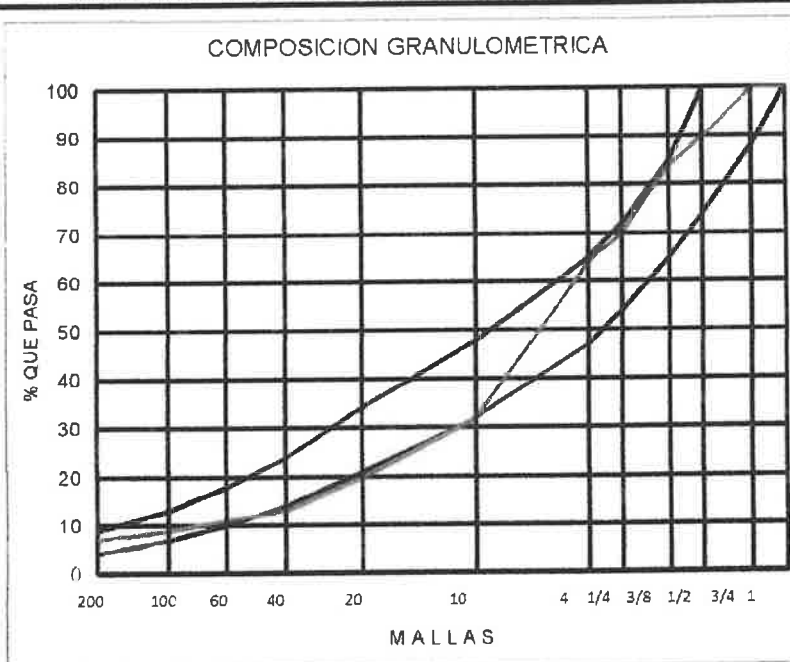

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD kg		817.5
FLUJO, mm		DE 2 A 4
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C A	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA DE MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE UNA MEZCLA ASFALTICA DE TAM. MAX DE 3/4".

EL JEFE DEL LABORATORIO ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ	
---	--



LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

BLVD. DIAZ ORDAZ No 1811, COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH.

TELS.

(614) 4 10 60 32, (614) 3 46 94 04

PRUEBA MARSHALL

OBRA PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.

MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN CYP CRUZ SAENZ






BANCO ALMACEN EN LA PLANTA

FECHA 13-jul-25

CARPETA TAMAÑO 3/4"

Tipo de asfalto: AC-30

Densidad del asfalto: .985 T/M3

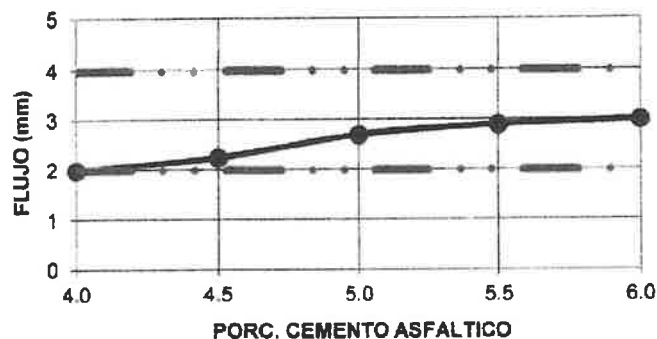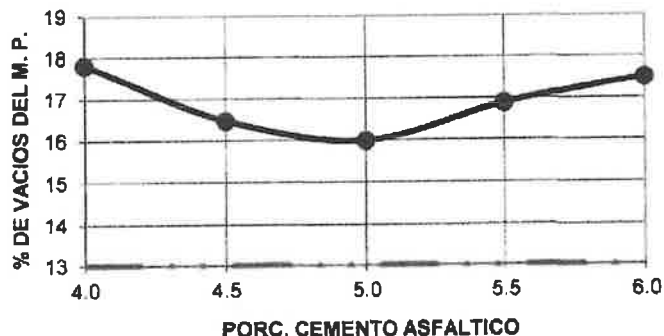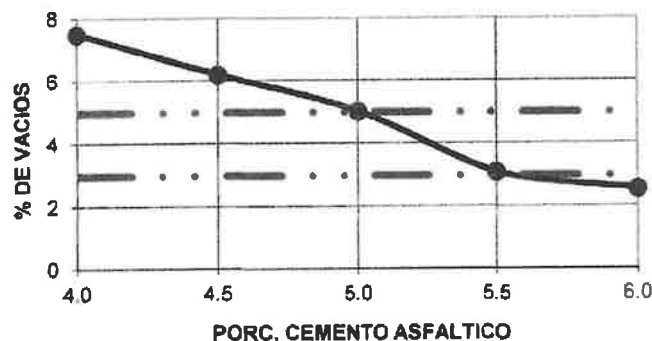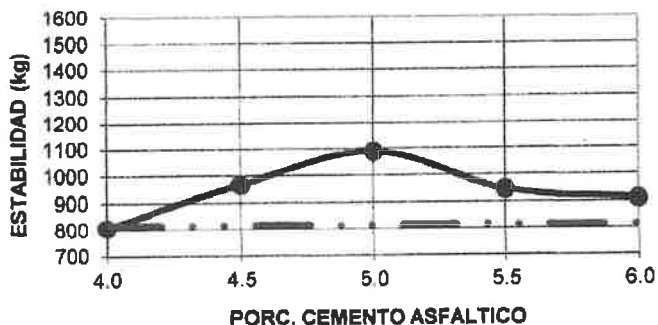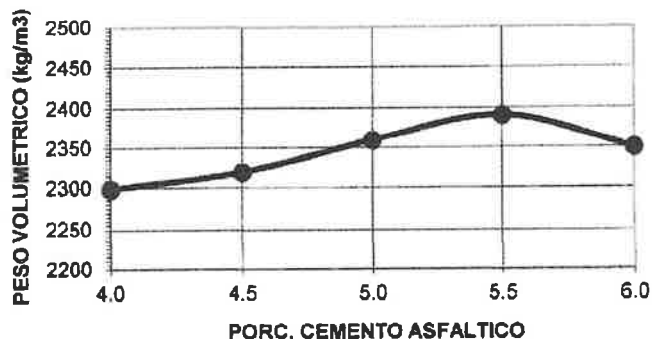

TEMPERATURA DE ELABORACION

170° -180°

TEMPERATURA DE TENDIDO

166°

CARACTERISTICAS	DATOS OBTENIDOS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO OPTIMO DE C.A. (%):	5.00	
ESTABILIDAD (kg):	1248	817
VACIOS (%):	3.50	DE 3 A 5
PESO VOLUMETRICO (kg/m3):	2384	
FLUJO (mm):	2.70	DE 2 A 4
VACIOS DEL M. P. (%):	15.40	13 MIN

EL LABORATORISTA

EL JEFE DE LABORATORIO

NOTA IMPORTANTE

HACEMOS NOTAR QUE EN LA PLANTA
SE DEBERA EFECTUAR LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA OBTENER ESTOS
RESULTADOS

ING.FAUSTO CHAVEZ M.

CERTIFICADO DE CALIDAD

PROYECTOS Y LABORATORIO **INFORME DE PRUEBAS DE CEMENTOS ASFALTICOS**
ASFALTO AC-30 (BETÚN DE PETROLEO)

OBRA: **CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.**

REMISIÓN: **34480**

LOCALIZACIÓN: **CHIHUAHUA, CHIH.**

FECHA DE INFORME : **20 DE MAYO DEL 2026**

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO
 TIPO DE PRODUCTO INDICADO EN LA REMISIÓN
 DEPOSITO MUESTREADO

ASFALTOS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
AC- 30
TANQUE CLIENTE

PRUEBAS	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS LABORATORIO AFSA	ESPECIFICACIÓN
			N-CMT-4-05-001
DEL CEMENTO ASFALTICO ORIGINAL			
PENETRACIÓN A 25°C, 100 GRAMOS, 5 SEG (EN 0.1 MM), MÍNIMO	M-MMP-4-05-006/00	53	50
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL A 135 °C, SEG, MÍNIMO	M-MMP-4-05-004/00	277	150
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C, Pa-s	M-MMP-4-05-002/02	3,161	2,400-3,600
VISCOSIDAD CINEMATICA A 135°C (CENTISTOKES), MÍNIMO	M-MMP-4-05-003/02	427	350
PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND (°C),MÍNIMO	M-MMP-4-05-007/00	305	232
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO (°C)	M-MMP-4-05-009/00	50.6	50-58
SOLUBILIDAD EN (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-008/00	99.6%	99%
DEL RESIDUO DE LA PRUEBA DE LA PELICULA DELGADA			
PERDIDA POR CALENTAMIENTO (%), MÁXIMO	M-MMP-4-05-010/02	-0.072	0.5
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C Pa-s, MÁXIMO	M-MMP-4-05-002/02	9,244	12,000
PENETRACIÓN RETENIDA 25 °C (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-010/02	46	40
DUCTILIDAD A 25 °C, 5 CM/MIN, CM, MÍNIMO	M-MMP-4-05-011/07	68	58

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES COMO UN AC-30



INGENIERO DE PRUEBA

L.Q. NORMA ROMÁN



FASE EMULSIONES

CALLE 63 No. 6313 COL. CONCORDIA. CHIHUAHUA.CHIH.

INFORME DE PRUEBAS DE LABORATORIO

PRODUCTO: EMULSION CATIONICA ECR-65

EMPRESA: CYP

LOCALIZACION: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ENSAYE No. 20

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2026

ESTADO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FECHA DE INFORME: 15/05/2026

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO

TAD-CADEREYTA NL.

TIPO DE CEMENTO ASFALTICO UTILIZADO

AC-20 EKBE 64-22

EMULSION CATIONICA ECR-65	ENSAYES		ESPECIFICACION
	No	No	
PRUEBAS			SCT
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO EN MASA :%,MINIMO	65.4		65
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 25 °C .S, MINIMO	N/A		N/A
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 50 °C .S, MINIMO	46		40
ASENTAMIENTO EN 5 DIAS; DIFERENCIA EN %, MAXIMO	0.005		5
RETENCION EN LA MALLA No20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ%.MAX	0.1		0.1
PASA MALLA No 20 Y SE RETIENE EN MALLA No 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; % MAXIMO	0.15		0.25
CARGA ELECTRICA DE LA PARTICULA	+		(+)
RESIDUO DE LA DESTILACION, % EN VOLUMEN (SOLVENTE)	N/A		
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MAXIMO	3		3
EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION			
VISCOSIDAD DINAMICA A 60° C;PAS(P(1)),MAXIMO	N/A		50 +- 10
PENETRACION A 25 °C; 100 g. 5 SEGG;GRADOS.	119		110-250
SOLUBILIDAD, %, MINIMO	N/A		
DUCTIBILIDAD, % 25°C. CM. MINIMO	N/A		

OBSERVACIONES:

LA EMULSION CUMPLE LOS REQUISITOS PARA UNA EMULSION ECR-65

LABORATORIO

ING. OMAR AGUILERA OLIVAS

GERENTE

ING. MANUEL SANCHEZ MEDRANO



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACIÓN :	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	FECHA RECIBO	01/06/2026
		FECHA INFORME	03/06/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO


CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	100
	1/2"	100	90-100
	3/8"	92	76-92
	1/4"	81	56-81
	Núm. 4	66	45-74
	Num. 10	38	25-55
	Núm. 20	27	15-42
	Núm. 40	15	11-32
	Núm. 60	11	8-25
	Núm. 100	9	5-18
	Núm. 200	5	2-9
RET. MALLA			%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO		
TIPO	AC - 30	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.		
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg		

COMPOSICION GRANULOMETRICA

Mallas	% Que Pasa
200	100
100	100
60	100
40	100
20	100
10	100
4	100
1/4	100
3/8	100
1/2	100
3/4	100
1	100

N-CMT.04-04/17		
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		158
150 - 160		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3		2365
ESTABILIDAD, kg.		1096
817.5		
FLUJO, mm		2.87
2 - 3.5		
VACIOS, %		4.06
DE 3 A 5		
VAM, %		14.71
14 MIN		
CONT. CEM ASF/PETREO,		5.4
5.3		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

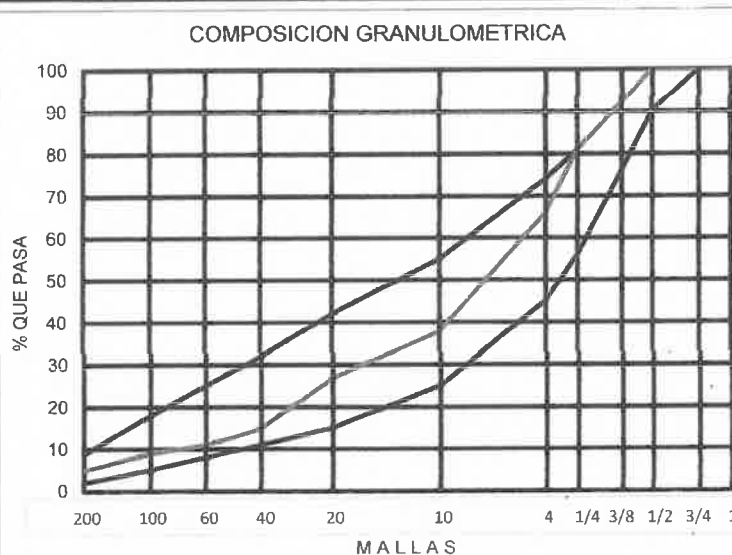

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	158	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2365	
ESTABILIDAD, kg.	1096	817.5
FLUJO, mm	2.87	2 - 3.5
VACIOS, %	4.06	DE 3 A 5
VAM, %	14.71	14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO,	5.4	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	


OBSERVACIONES:		
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFALTICA.		
GERENTE GENERAL		
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.		



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

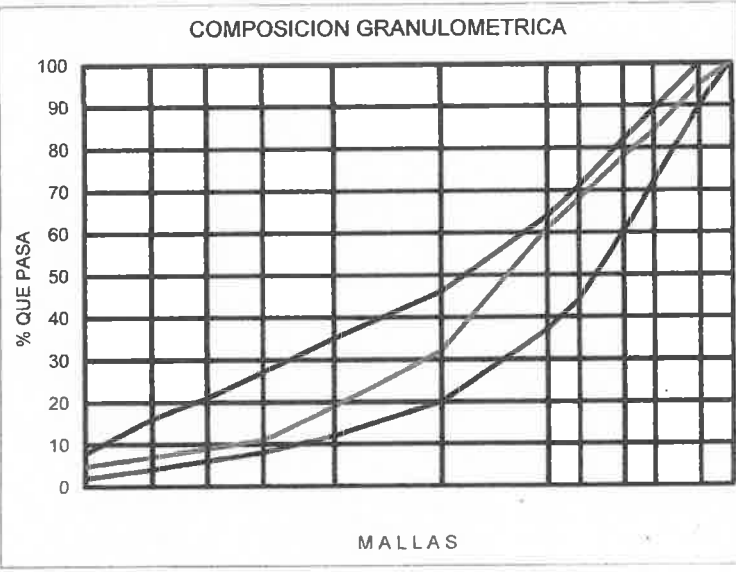
OBRA PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		PLANTA CYP CRUZ SAENZ	
LOCALIZACION EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.		FECHA RECIBO 03/06/2026	
		FECHA INFORME 05/06/2026	
MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"			
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCAS CALIZA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER			
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA			
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	95	90-100
	1/2"	84	72-89
	3/8"	78	60-82
	1/4"	68	44-71
	Núm. 4	61	37-64
	Num. 10	32	20-46
	Núm. 20	19	12-35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	9	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO AC - 30			
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C 153		150 - 160	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm³ 2114			
ESTABILIDAD, kg 1174		817.5	
FLUJO, mm 2.9		2 - 3.5	
VACIOS, % 4.1		DE 3 A 5	
VAM, % 16.2		14 MIN	
CONT. CEM.ASF/PETREO, % 5.3		5.3	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

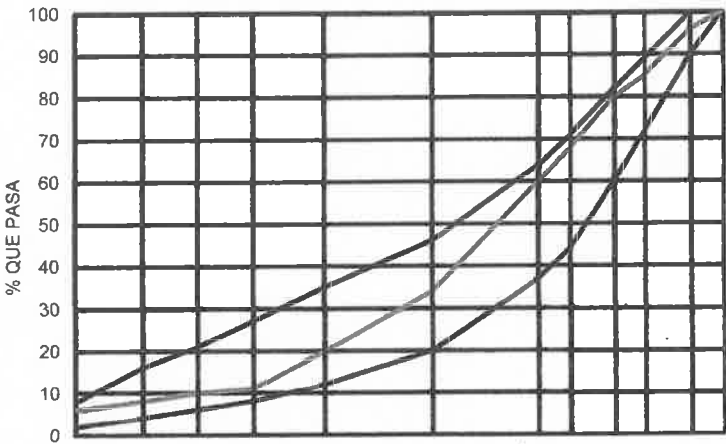OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	FECHA RECIBO	05/06/2026
		FECHA INFORME	07/06/2026
MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	96	90-100
	1/2"	85	72-89
	3/8"	80	60-82
	1/4"	68	44-71
	Núm. 4	60	37-64
	Núm. 10	34	20-46
	Núm. 20	20	12-35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	8	4-16
	Núm. 200	6	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	AC - 30		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
			
MALLAS			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C	156	150 - 160	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	1997		
ESTABILIDAD, kg.	1204	817.5	
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5	
VACIOS, %	3.9	DE 3 A 5	
VAM, %	15.8	14 MIN	
CONT. CEMAS/PETREO, %	5.3	5.3	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	FECHA RECIBO	08/06/2026
		FECHA INFORME	10/06/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	96	90-100
	1/2"	80	72-89
	3/8"	74	60-82
	1/4"	63	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Num. 10	30	20-46
	Núm. 20	16	12-35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	9	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	6	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	AC - 30		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C	161	150 - 163	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2085		
ESTABILIDAD, kg.	1195	817.5	
FLUJO, mm	3.0	2 - 3.5	
VACIOS, %	3.7	DE 3 A 5	
VAM, %	15.6	14 MIN	
CONT. CEMASF/PETREO, %	5.2	5.3	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.			
EL JEFE DEL LABORATORIO C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 814-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	FECHA RECIBO	10/06/2026
		FECHA INFORME	12/06/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	94	90-100
	1/2"	81	72-89
	3/8"	75	60-82
	1/4"	66	44-71
	Núm. 4	58	37-64
	Num. 10	32	20-46
	Núm. 20	15	12--35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	9	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8

RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
ABSORCION %		
DENSIDAD		
DESGASTE %		
PART. ALARGADAS %		
PART. LAJEADAS %		
EQUIV. ARENA %		
CONTRACCIÓN LINEAL %		

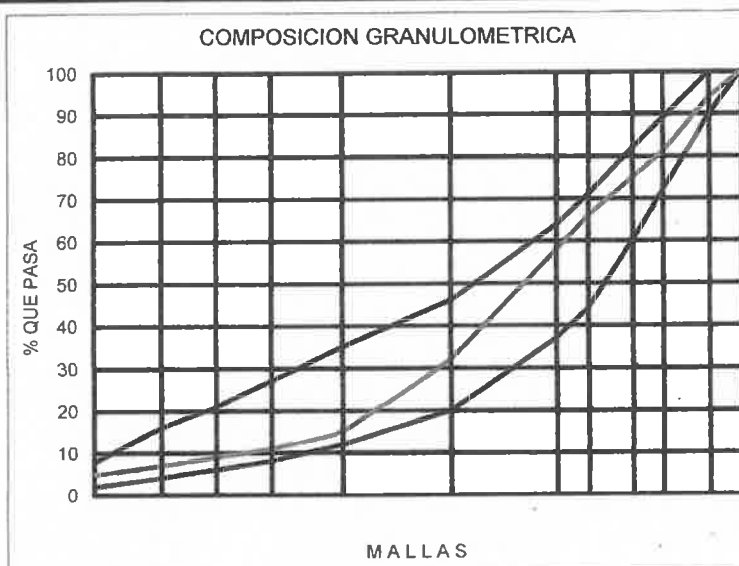

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	160	150 - 163
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	1997	
ESTABILIDAD, kg.	1204	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	3.9	DE 3 A 5
VAM, %	15.8	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:	LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.	
	EL JEFE DEL LABORATORIO C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CALLES PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACIÓN:	DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO 12/06/2026
		FECHA INFORME 14/06/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCAS CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

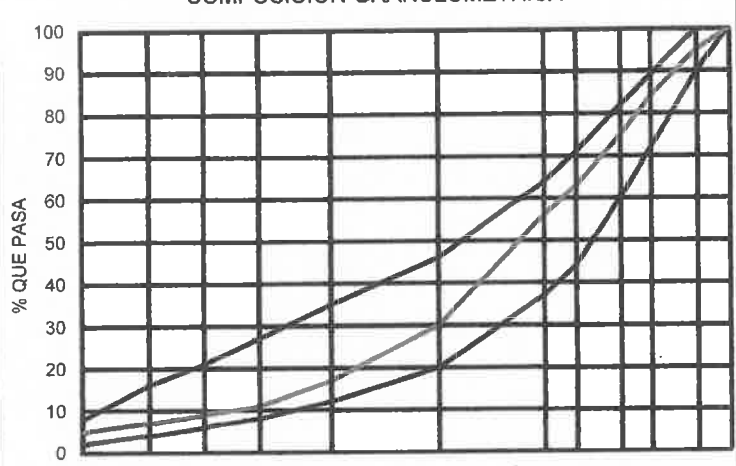CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	95	90-100
	1/2"	84	72-89
	3/8"	75	60-82
	1/4"	63	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Núm. 10	30	20-46
	Núm. 20	17	12--35
	Núm. 40	11	8--27
	Núm. 60	9	6--21
	Núm. 100	7	4--16
	Núm. 200	5	2--8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	AC - 30		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
			
MALLAS			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C	158	150 - 160	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³			
ESTABILIDAD, kg.	1201	817.5	
FLUJO, mm	2.8	2 - 3.5	
VACIOS, %	4.5	DE 3 A 5	
VAM, %	15.0	14 MIN	
CONT. CEMASF/PETREO, %	5.3	5.3	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CALLES PLANTA		CYP CRUZ SAENZ	
LOCALIZACIÓN: DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		FECHA RECIBO	15/06/2026
		FECHA INFORME	17/06/2026
MUESTRA		MEZCLA ASFALTICA 3/4"	
DESCRIPCION DEL MATERIAL		ROCAS CALIZA	
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO		TRITURACION TOTAL	
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO		AL TENDER	
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO		MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA	
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	96	90-100
	1/2"	83	72-89
	3/8"	73	60-82
	1/4"	60	44-71
	Núm. 4	54	37-64
	Num. 10	29	20-46
	Núm. 20	18	12-35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	9	6-21
	Núm. 100	8	4-16
	Núm. 200	6	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO AC - 30			
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			

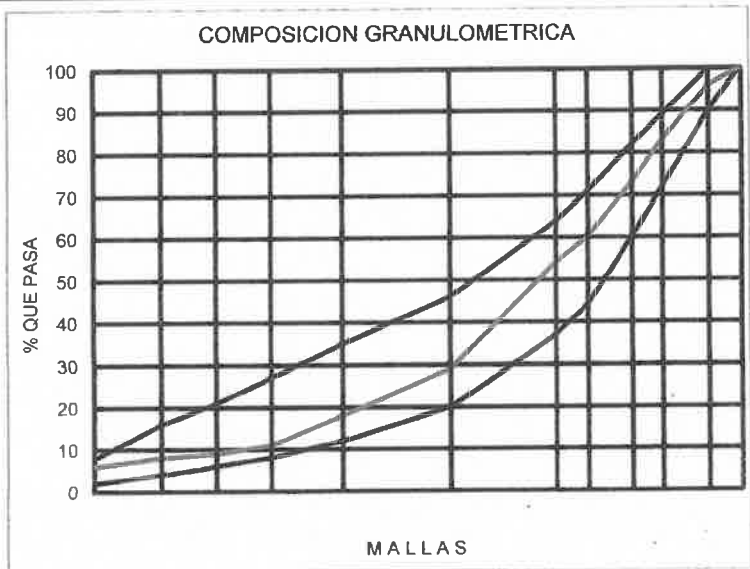

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	159	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3		
ESTABILIDAD, kg.	1211	817.5
FLUJO, mm	3.0	2 - 3.5
VACIOS, %	4.2	DE 3 A 5
VAM, %	15.1	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO PLANTA CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACIÓN: EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
FECHA RECIBO 19/06/2026
FECHA INFORME 21/06/2026

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREO EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO

COMPOSICION GRANULOMETRICA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
MALLAS	% PASA	PROYECTO	
1"	100		
3/4"	100	100	
1/2"	99	90-100	
3/8"	82	76-92	
1/4"	69	56-81	
Núm. 4	59	45-74	
Num. 10	35	25-55	
Núm. 20	23	15-42	
Núm. 40	13	11-32	
Núm. 60	11	8-25	
Núm. 100	8	5-18	
Núm. 200	6	2-9	
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

COMPOSICION GRANULOMETRICA

Malla	Curva Superior (%)	Curva Intermedia (%)	Curva Inferior (%)
1"	100	100	100
3/4"	100	100	100
1/2"	100	100	100
3/8"	100	100	100
1/4"	100	100	100
Núm. 4	100	100	100
Num. 10	100	100	100
Núm. 20	100	100	100
Núm. 40	100	100	100
Núm. 60	100	100	100
Núm. 100	100	100	100
Núm. 200	0	0	0

N-CMT.04-04/17		
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		168
150 - 160		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3		2330
ESTABILIDAD, kg.		1093
817.5		
FLUJO, mm		2.6
2 - 3.5		
VACIOS, %		3.8
DE 3 A 5		
VAM, %		15.4
14 MIN		
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		5.3
5.3		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES: ESPECIFICACIONES
LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE LOS REQUISITOS PARA BACHEO.
GERENTE GENERAL
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO PLANTA CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. FECHA RECIBO 22/06/2026
FECHA INFORME 24/06/2026

MUESTRA MEZCLA ASFÁLTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO			
CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
MALLAS	% PASA	PROYECTO	
1"	100		
3/4"	100	90-100	
1/2"	99	72-89	
3/8"	81	60-82	
1/4"	71	44-71	
Núm. 4	63	37-64	
Núm. 10	36	20-46	
Núm. 20	23	12-35	
Núm. 40	12	8-27	
Núm. 60	10	6-21	
Núm. 100	7	4-16	
Núm. 200	5	2-8	
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO AC - 30			
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ENSAYADA PRESENTA CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASF.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			

COMPOSICION GRANULOMETRICA

N-CMT.04-04/17

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		169
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2360
ESTABILIDAD, kg.	1093	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	3.8	DE 3 A 5
VAM, %	14.6	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.4	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO PLANTA CYP CRUZ SAENZ
EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. FECHA RECIBO 24/06/2026
FECHA INFORME 26/06/2026

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO			
CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	82	72-89
	3/8"	72	60-82
	1/4"	64	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Num. 10	31	20-46
	Núm. 20	18	12-35
	Núm. 40	12	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	7	4-16
Núm. 200	6	2-8	
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO AC - 30			
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C		156	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2293	
ESTABILIDAD, kg.		1103	
FLUJO, mm		2.7	
VACIOS, %		4.3	
VAM, %		15.6	
CONT. CEM ASF/PETREO, %		5.2	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ACEPTABLE PARA SU EMPLEO EN CONCRETO ASFÁLTICO.

GERENTE GENERAL
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	FECHA RECIBO	26/06/2024
		FECHA INFORME	28/06/2024

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

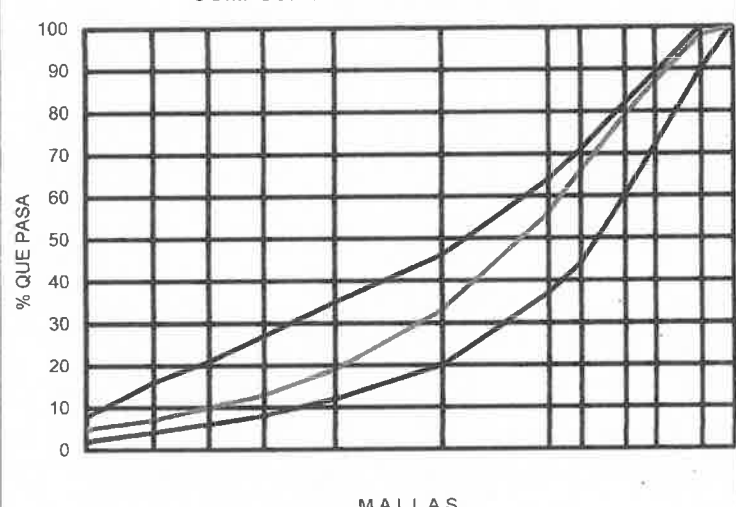CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	98	90-100
	1/2"	87	72-89
	3/8"	79	60-82
	1/4"	66	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Num. 10	33	20-46
COMPOSICION GRANULOMETRICA	Núm. 20	19	12-35
	Núm. 40	13	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8
	RET. MALLA		%
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
	ABSORCION %		
	DENSIDAD		
	DESGASTE %		
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	PART. ALARGADAS %		
	PART. LAJEADAS %		
	EQUIV. ARENA %		
	CONTRACCION LINEAL %		
	TIPO	AC - 30	
	PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.		
	VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg		
	ADITIVO USADO	MARCA	
		TIPO	
		CANTIDAD/ C.A.	
COMPOSICION GRANULOMETRICA	COMPOSICION GRANULOMETRICA		
			
	MALLAS		
	N-CMT.04-04/17		
	CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		
	ESPECIFICACIONES		
	TEMP. DE ELABORACION, °C	155	150 - 160
	PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2348	
	ESTABILIDAD, kg.	1216	817.5
	FLUJO, mm	3.0	2 - 3.5
ADITIVO USADO	VACIOS, %	3.9	DE 3 A 5
	VAM, %	15.8	14 MIN
	CONT. CEM ASF/PETREO, %	5.2	5.0
	AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFALTICA.


EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

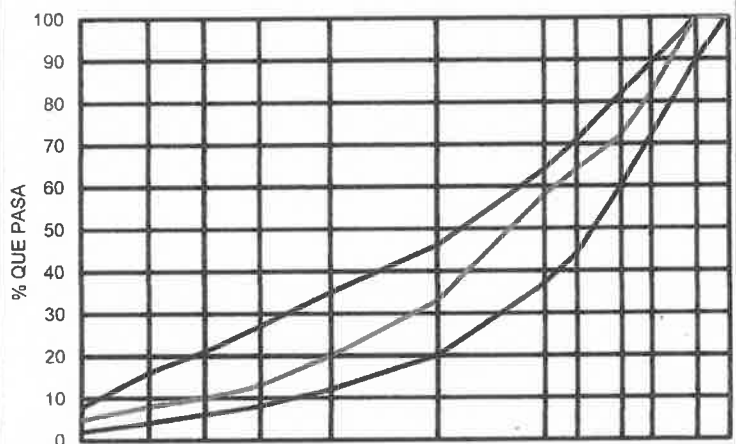OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	FECHA RECIBO	29/06/2026
		FECHA INFORME	01/07/2026
MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	82	72-89
	3/8"	72	60-82
	1/4"	64	44-71
	Núm. 4	58	37-64
	Núm. 10	33	20-46
	Núm. 20	20	12-35
	Núm. 40	13	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	8	4-16
	Núm. 200	5	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	AC - 30		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
			
MALLAS			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C	157	150 - 160	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2387		
ESTABILIDAD, kg.	1214	817.5	
FLUJO, mm	2.7	2 - 3.5	
VACIOS, %	4.3	DE 3 A 5	
VAM, %	15.6	14 MIN	
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.3	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ACEPTABLE PARA SU EMPLEO EN CONCRETO ASFALTICO.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			



CERTIFICADO DE CALIDAD

PROYECTOS Y LABORATORIO INFORME DE PRUEBAS DE CEMENTOS ASFÁLTICOS

ASFALTO AC-30 (BETÚN DE PETROLEO)

OBRA: CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.	REMISIÓN: 35366
LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME : 26 DE JUNIO DEL 2026

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO	ASFALTOS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
TIPO DE PRODUCTO INDICADO EN LA REMISIÓN	AC- 30
DEPOSITO MUESTREADO	TANQUE CLIENTE

PRUEBAS	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS LABORATORIO AFSA	ESPECIFICACIÓN
			N-CMT-4-05-001
DEL CEMENTO ASFALTICO ORIGINAL			
PENETRACIÓN A 25°C, 100 GRAMOS, 5 SEG (EN 0.1 MM), MÍNIMO	M-MMP-4-05-006/00	51	50
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL A 135 °C, SEG, MÍNIMO	M-MMP-4-05-004/00	272	150
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C, Pa-s	M-MMP-4-05-002/02	3,016	2,400-3,600
VISCOSIDAD CINEMATICA A 135°C (CENTISTOKES), MÍNIMO	M-MMP-4-05-003/02	416	350
PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND (°C),MÍNIMO	M-MMP-4-05-007/00	306	232
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO (°C)	M-MMP-4-05-009/00	50.6	50-58
SOLUBILIDAD EN (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-008/00	99.6%	99%
DEL RESIDUO DE LA PRUEBA DE LA PELICULA DELGADA			
PERDIDA POR CALENTAMIENTO (%), MÁXIMO	M-MMP-4-05-010/02	-0.105	0.5
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C Pa-s, MÁXIMO	M-MMP-4-05-002/02	9,264	12,000
PENETRACIÓN RETENIDA 25 °C (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-010/02	46	40
DUCTILIDAD A 25 °C, 5 CM/MIN, CM, MÍNIMO	M-MMP-4-05-011/07	64	58

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES COMO UN AC-30



INGENIERO DE PRUEBA

Norma

L.Q. NORMA ROMÁN



F A S E EMULSIONES Y ASFALTOS

CALLE 63 No. 6313 COL. CONCORDIA CP. 31375 CHIHUAHUA, CHIH.

INFORME DE PRUEBAS LABORATORIO

PRODUCTO: EMULSION CATIONICA ECR-65

EXPEDIDO A: CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION: CHIHUAHUA

FECHA ELABORACION: 02/07/2026

ENSAYE No. 15

FECHA DE INFORME: 02/07/2026

ESTADO: CHIHUAHUA

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO TAD-CADEREYTA NL.

EMULSION CATIONICA ECR-65	ENSAYES		METODO
PRUEBAS	No	No	
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO EN MASA ;%,MINIMO	65.1		65
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 25 °C ,S, MINIMO	N/A		N/A
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 50 °C ,S, MINIMO	41		40
ASENTAMIENTO EN 5 DIAS; DIFERENCIA EN %. MAXIMO	0.005		5
RETENCION EN LA MALLA No20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ%.MAX	0.1		0.1
PASA MALLA No 20 Y SE RETIENE EN MALLA No 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %.MAXIMO	0.23		0.25
CARGA ELECTRICA DE LA PARTICULA	+		(+)
RESIDUO DE LA DESTILACION, % EN VOLUMEN (SOLVENTE)	N/A		
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MAXIMO	3		3
EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION			
VISCOSIDAD DINAMICA A 60° C;PAS(P(1)),MAXIMO	N/A		50 +- 10
PENETRACION A 25 °C; 100 g, 5 SEGG;GRADOS.	148		110-250
SOLUBILIDAD; %, MINIMO	N/A		
DUCTIBILIDAD, % 25°C, CM, MINIMO	N/A		

OBSERVACIONES:

LA EMULSION CUMPLE LOS REQUISITOS PARA UNA EMULSION ECR-65

LABORATORIO

ING. CESAR OMAR AGUILERA OLIVAS

GERENCIA

ING. MANUEL SANCHEZ MEDRANO



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. PLANTA CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONSTRUCTORA CYP CRUZ FECHA RECIBO 05/07/2025
PETREO DE 3/8" A No. 10 (SELLO) FECHA INFORME 13/07/2025

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	78	60-82
	1/4"	43	44-71
	Núm. 4	21	37-64
	Num 10	2	20-46
	Núm 20	0	12-35
	Núm 40	0	8-27
	Núm 60	0	6-21
	Núm. 100	0	4-16
	Núm. 200	0	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		1460	
ABSORCION %		0.72	
DENSIDAD		2.68 (2.4 MIN)	
DESGASTE %		26.3 (35 MAX)	
PART. ALARGADAS %		9.0	
PART. LAJEADAS %		11.9	
EQUIV ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

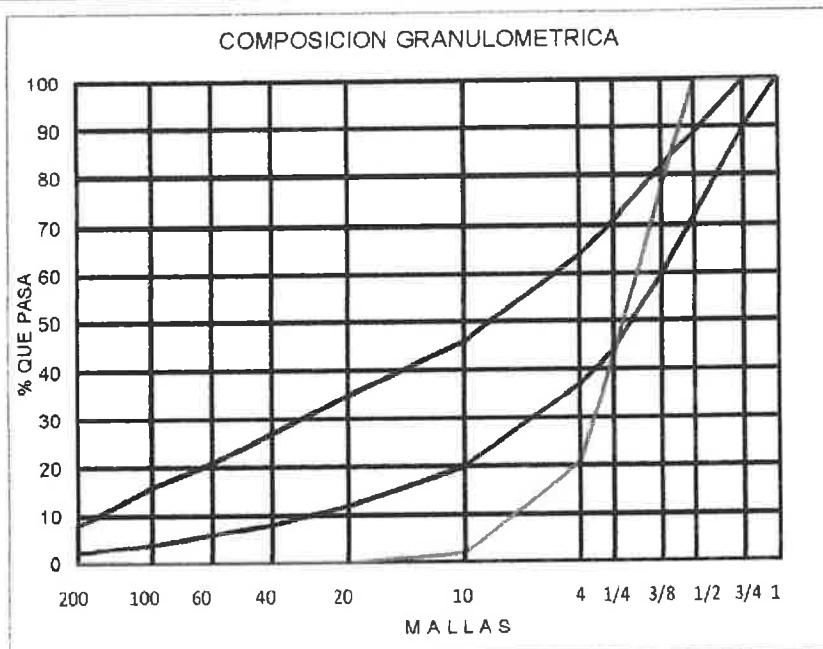

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION. °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. GEM. ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C A	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

OBSERVACIONES:

REPORTAMOS LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA 3/8" A No. 10.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
LOCALIZACION	MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CYP CRUZ	FECHA RECIBO	05/07/2025
		FECHA INFORME	13/07/2025
MUESTRA	PETREO CLASIFICADO DE 3/4" A MALLA No. 4 (GRAVA)		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	GCC EN COLONIA NOMBRE DE DIOS		

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	99	90-100
	1/2"	81	72-89
	3/8"	52	60-82
	1/4"	12	44-71
	Núm 4	3	37-64
	Num 10	1	20-46
	Núm 20	0	12-35
	Núm 40	0	8-27
	Núm 60	0	6-21
	Núm 100	0	4-16
	Núm. 200	0	2-8
	RET MALLA		%
	P.V. SÉCO SUELTO Kg/m ³	1539	
	ABSORCION %	0.85	
	DENSIDAD	2.68	(2.4 MIN)
	DESGASTE %	26	(35 MAX)
	PART ALARGADAS %	10.1	} (35MAX)
	PART LAJEADAS %	9.8	
	EQUIV. ARENA %		(50 MIN)
	CONTRACCIÓN LINEAL %		

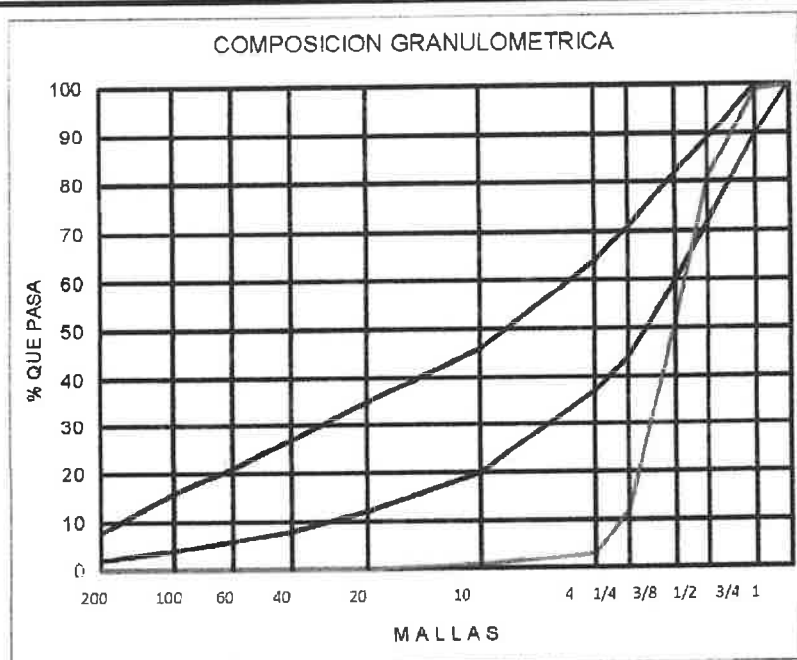

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD kg		817.5
FLUJO mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT CEM ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ENSAYADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASF.

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTÍNEZ




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	05/07/2025
20% MATERIAL CLASIFICADO DE MALLA 3/4 A No. 4 (GRAVA), 20% DE MATERIAL ENTRE MALLA 3/8" Y No. 4, 60% MATERIAL DE MALLA No. 4 A FINOS.		FECHA INFORME	13/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL			
ROCA CALIZA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO			
TRITURACION TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO			
ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS			
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO			
MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA			

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
	CARPETA ASFALTICA		
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	100-100
	3/4"	100	88 - 100
	1/2"	90	74 - 100
	3/8"	84	65 - 85
	1/4"	70	54 - 72
	Núm. 4	64	47 - 65
	Núm. 10	32	32 - 48
	Núm. 20	20	21 - 34
	Núm. 40	13	14 - 24
	Núm. 60	11	10 - 18
	Núm. 100	9	7 - 13
	Núm. 200	7	4 - 9
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			1672
ABSORCION %		2.1	
DENSIDAD		2.69	(2.4 MIN)
DESGASTE %		26.7	(35 MAX)
PART. ALARGADAS % 10.4			} (40MAX)
PART. LAJEADAS % 9.9			
EQUIV. ARENA % 71			(50 MIN)
CONTRACCIÓN LINEAL % 1			

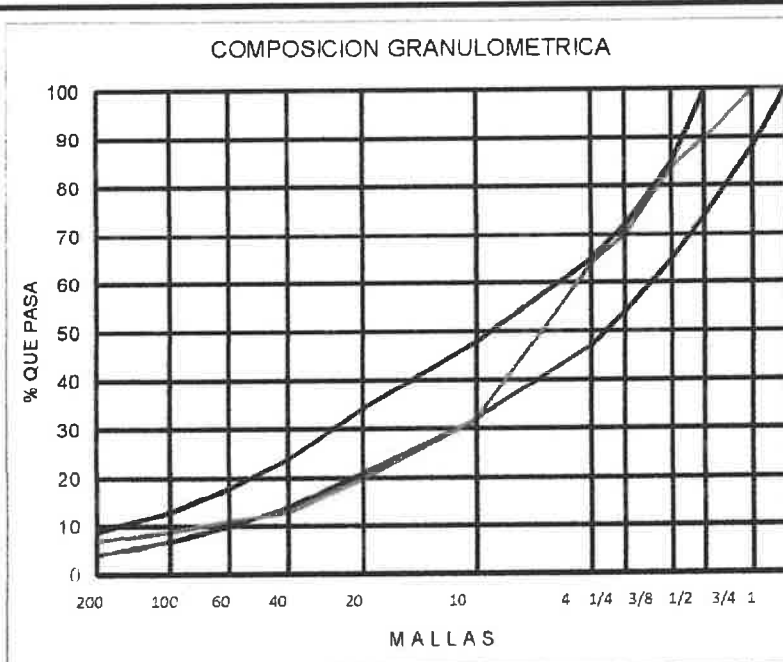

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD kg		817.5
FLUJO, mm		DE 2 A 4
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA DE MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE UNA MEZCLA ASFALTICA DE TAM. MAX DE 3/4".

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ



LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

BLVD. DIAZ ORDAZ No 1611, COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH.

TELS.

(614) 4 10 60 32 . (614) 3 46 94 04

PRUEBA MARSHALL

OBRA PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.

MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN CYP CRUZ SAENZ






BANCO ALMACEN EN LA PLANTA

FECHA 13-jul-25

CARPETA TAMAÑO 3/4"

Tipo de asfalto: AC-30

Densidad del asfalto: .985 T/M3

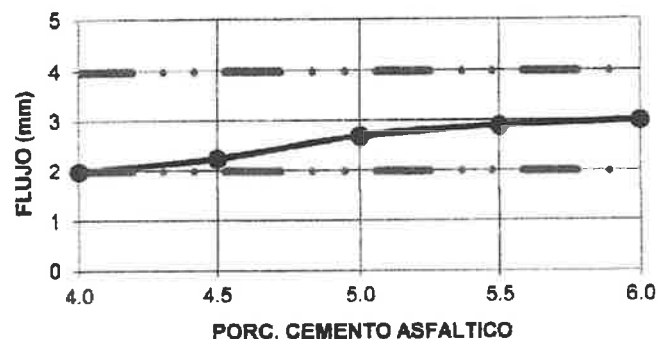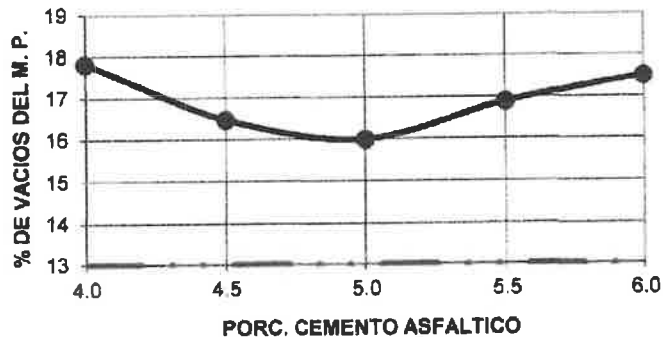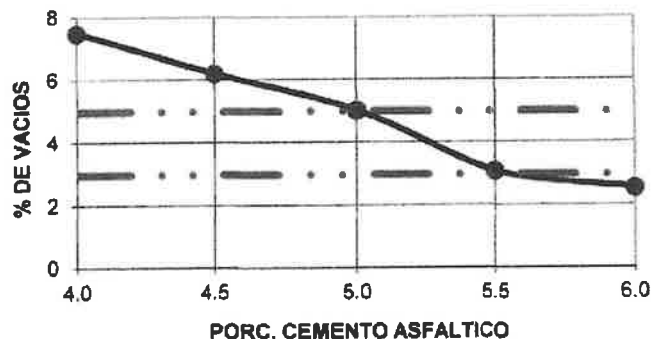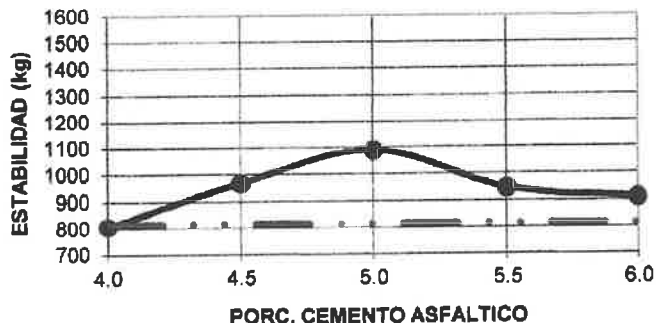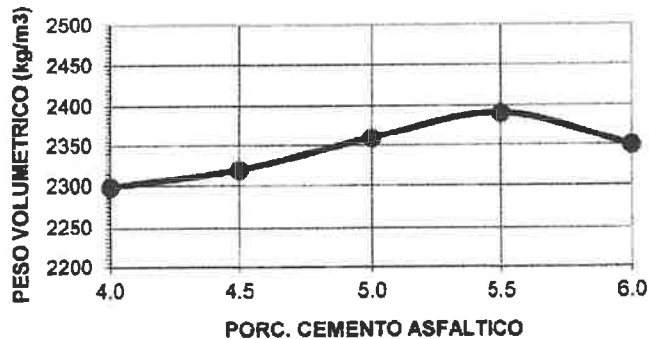

TEMPERATURA DE ELABORACION

170° -180°

TEMPERATURA DE TENDIDO

166°

CARACTERISTICAS	DATOS OBTENIDOS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO OPTIMO DE C.A. (%):	5.00	
ESTABILIDAD (kg):	1248	817
VACIOS (%):	3.50	DE 3 A 5
PESO VOLUMETRICO (kg/m³):	2384	
FLUJO (mm):	2.70	DE 2 A 4
VACIOS DEL M. P. (%):	15.40	13 MIN

EL LABORATORISTA

EL JEFE DE LABORATORIO

NOTA IMPORTANTE

HACEMOS NOTAR QUE EN LA PLANTA
SE DEBERA EFECTUAR LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA OBTENER ESTOS
RESULTADOS

ING.FAUSTO CHAVEZ M.




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA PARA BACHEO EN CALLES DE LA PLANTA CYP CRUZ SAENZ
CIUDAD DE CHIHUAHUA. FECHA RECIBO 31/07/2026
FECHA INFORME 01/08/2026

MUESTRA MEZCLA ASFÁLTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	95	90-100
	1/2"	84	72-89
	3/8"	75	60-82
	1/4"	63	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Num. 10	30	20-46
	Núm. 20	17	12--35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	9	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

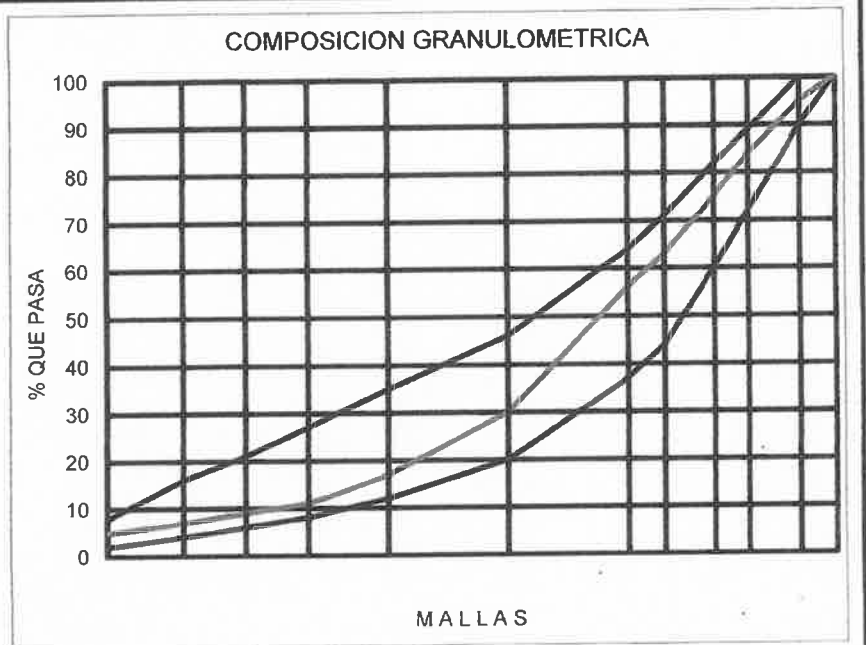

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		150
150		150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg.	1568	817.5
FLUJO, mm	2.8	2 - 3.5
VACIOS, %	4.5	DE 3 A 5
VAM, %	15.0	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.5	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ASFALTICA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA PARA BACHEO EN CALLES DE LA PLANTA CYP CRUZ S.
CIUDAD DE CHIHUAHUA. FECHA RECIBO 03/08/2026
FECHA INFORME 04/08/2026

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA DE ORIGEN CALIZO
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACEN EN PLANTA DE MEZCLADO
UBICACIÓN DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	100
	1/2"	94	100
	3/8"	86	90-100
	1/4"	78	70-89
	Núm. 4	69	56-82
	Núm. 10	36	28-64
	Núm. 20	23	18-49
	Núm. 40	14	13-37
	Núm. 60	12	10-29
	Núm. 100	10	6-21
	Núm. 200	7	2-10

COMPOSICION GRANULOMETRICA	P. V. S. SUELTO KG/M3		
	ABSORCION %		(2.4 MIN)
	DENSIDAD		(30 MAX)
	DESGASTE %		(35 MAX)
	PART. ALARGADAS %		(35 MAX)
	PART. LAJEADAS %		(50 MIN)
	EQUIV. ARENA %		69.8
	CONTRACCIÓN LINEAL %		

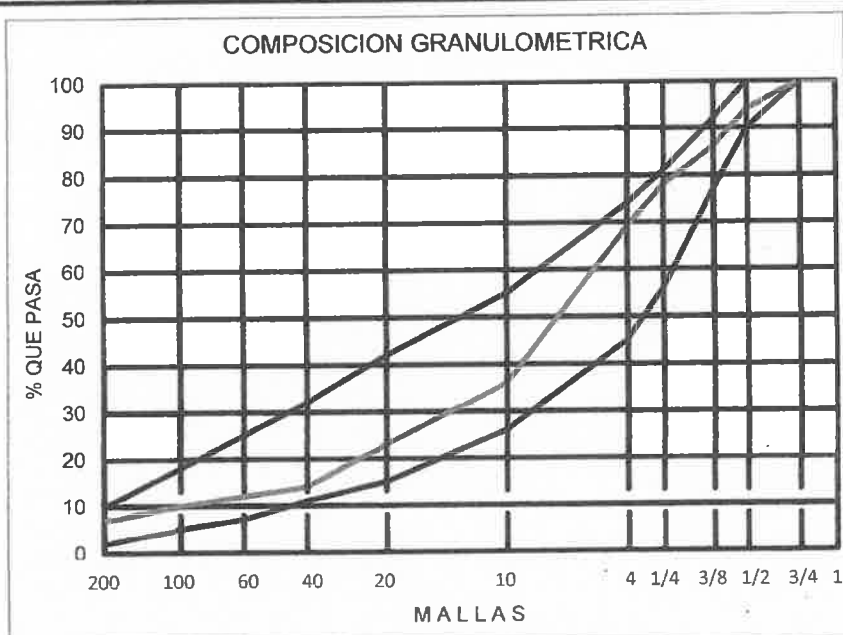

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESEPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	155	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2367	
ESTABILIDAD, kg.	1124	817.5 MIN.
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	3.4	DE 3 A 5
VAM, %	14.50	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.4	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

MEZCLA RESULTANTE:
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN BACHEO.

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO PLANTA CYP CRUZ SAENZ
EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. FECHA RECIBO 05/08/2026
FECHA INFORME 07/08/2026

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	82	72-89
	3/8"	72	60-82
	1/4"	64	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Num. 10	31	20-46
	Núm. 20	18	12-35
	Núm. 40	12	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	6	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

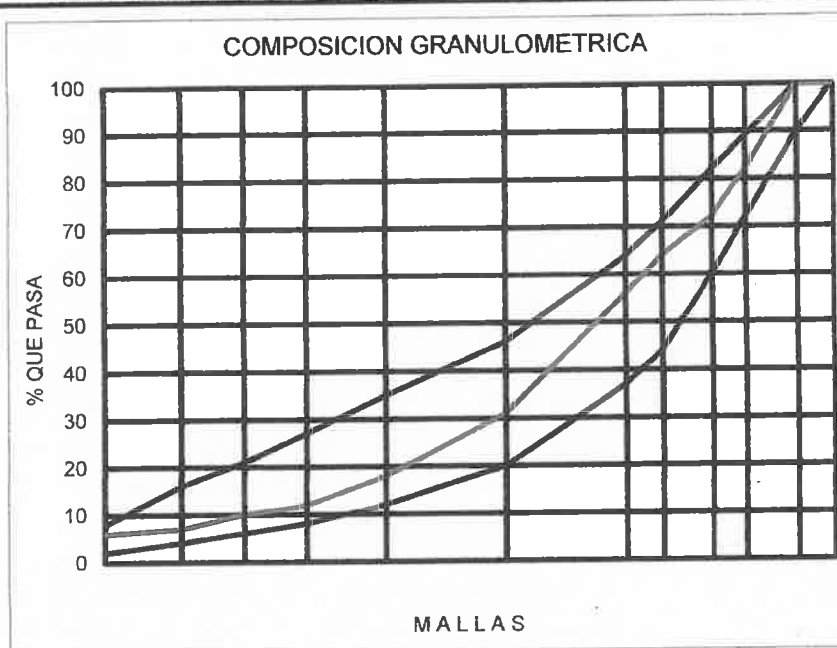

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	156	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2293	
ESTABILIDAD, kg.	1103	817.5
FLUJO, mm	2.7	2 - 3.5
VACIOS, %	4.3	DE 3 A 5
VAM, %	15.6	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ACEPTABLE PARA SU EMPLEO EN CONCRETO ASFÁLTICO.

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA **PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO** PLANTA **CYP CRUZ SAENZ**
LOCALIZACION **EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.** FECHA RECIBO **07/08/2026**
FECHA INFORME **09/08/2026**

MUESTRA **MEZCLA ASFALTICA 3/4"**
DESCRIPCION DEL MATERIAL **ROCA CALIZA**
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO **TRITURACION TOTAL**
CLASE DE DEPOSITO MUESTREO **AL TENDER**
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO **MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA**

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	96	90-100
	1/2"	80	72-89
	3/8"	74	60-82
	1/4"	63	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Num. 10	30	20-46
	Núm. 20	16	12-35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	9	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	6	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

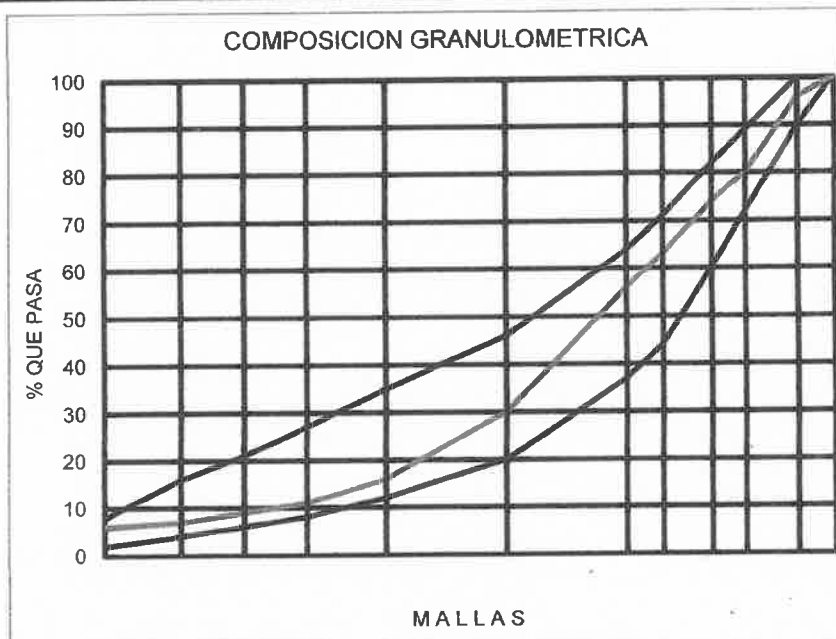

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		158
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2072
ESTABILIDAD, kg.	1191	817.5
FLUJO, mm	3.3	2 - 3.5
VACIOS, %	3.8	DE 3 A 5
VAM, %	15.5	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.4	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACIÓN :	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	FECHA RECIBO	10/08/2026
		FECHA INFORME	12/08/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	100
	1/2"	100	90-100
	3/8"	92	76-92
	1/4"	81	56-81
	Núm. 4	66	45-74
	Num. 10	38	25-55
	Núm. 20	27	15-42
	Núm. 40	15	11-32
	Núm. 60	11	8-25
	Núm. 100	9	5-18
	Núm. 200	5	2-9
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

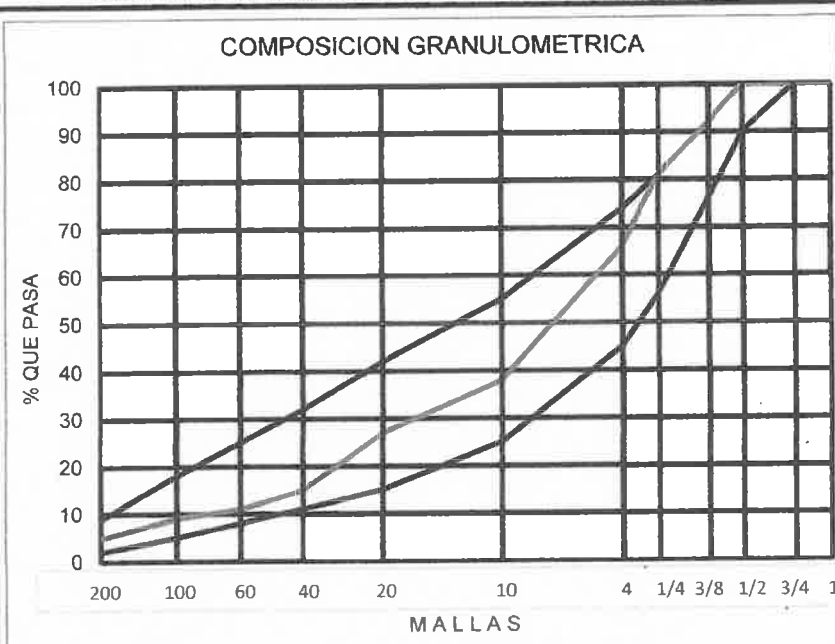

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	158	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2365	
ESTABILIDAD, kg.	1096	817.5
FLUJO, mm	2.87	2 - 3.5
VACIOS, %	4.06	DE 3 A 5
VAM, %	14.71	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO,	5.4	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFALTICA.
GERENTE GENERAL
ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ.



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA **PRUEBAS DE MEZCLA ASFATICA PARA BACHEO** PLANTA **CYP CRUZ SAENZ**
LOCALIZACION **EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.** FECHA RECIBO **12/08/2026**
FECHA INFORME **14/08/2026**

MUESTRA **MEZCLA ASFALTICA 3/4"**
DESCRIPCION DEL MATERIAL **ROCA CALIZA**
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO **TRITURACION TOTAL**
CLASE DE DEPOSITO MUESTREO **MUESTRA ENVIADA POR ING. ROIVAL**
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO **MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA**

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	97	90-100
	1/2"	84	72-89
	3/8"	76	60-82
	1/4"	64	44-71
	Núm. 4	60	37-64
	Num. 10	33	20-46
	Núm. 20	21	12--35
	Núm. 40	13	8--27
	Núm. 60	11	6--21
	Núm. 100	9	4--16
	Núm. 200	6	2--8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

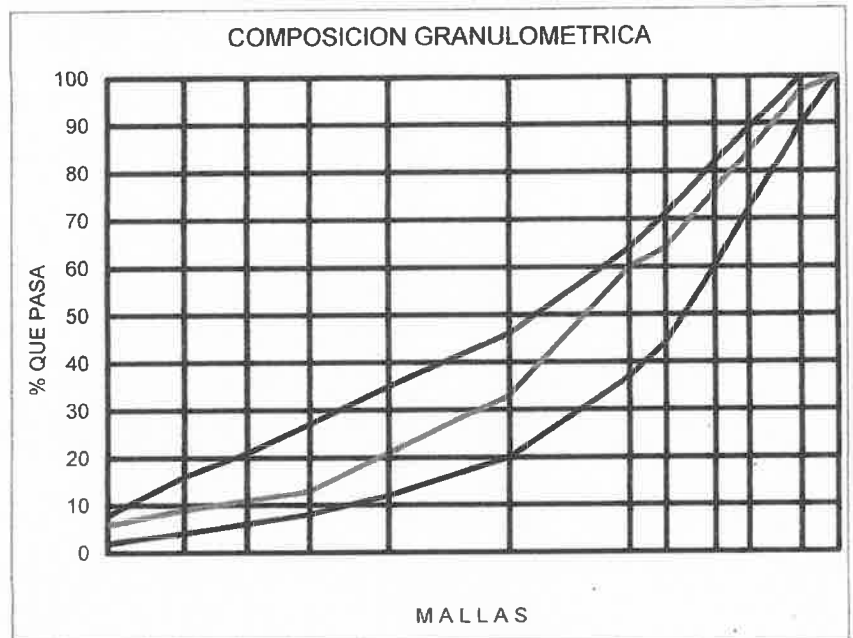

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	159	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2126	
ESTABILIDAD, kg.	1260	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	4.0	DE 3 A 5
VAM, %	15.1	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES: **LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE ESPECIFICACIONES PARA USARSE COMO MEZCLA ASFALTICA DE 3/4".**

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	FECHA RECIBO	14/08/2026
		FECHA INFORME	16/08/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCAS CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	95	90-100
	1/2"	84	72-89
	3/8"	78	60-82
	1/4"	68	44-71
	Núm. 4	61	37-64
	Num. 10	32	20-46
	Núm. 20	19	12-35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	9	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8
	RET. MALLA		%
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
	ABSORCION %		
	DENSIDAD		
	DESGASTE %		
	PART. ALARGADAS %		
	PART. LAJEADAS %		
	EQUIV. ARENA %		
	CONTRACCIÓN LINEAL %		

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

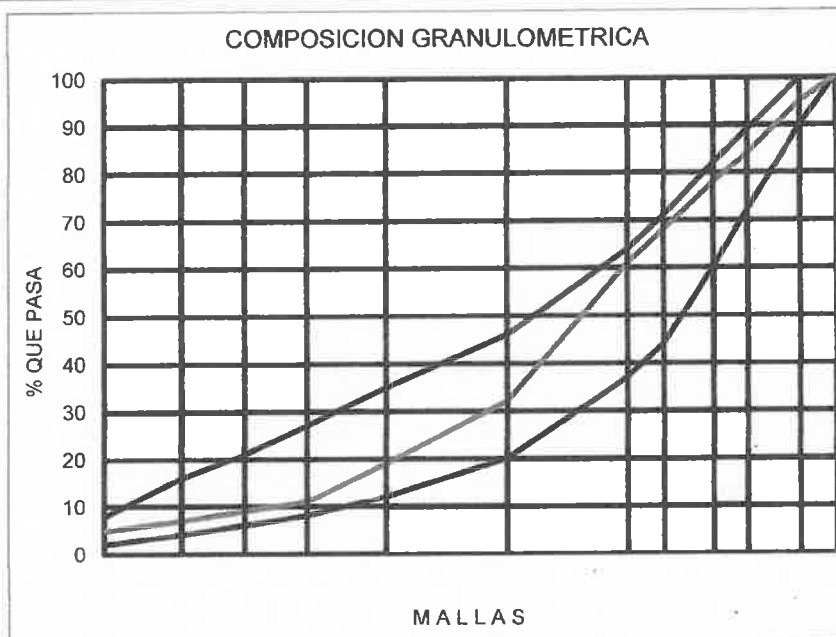

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	153	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2114	
ESTABILIDAD, kg.	1174	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	4.1	DE 3 A 5
VAM, %	16.2	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.4	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.

	EL JEFE DEL LABORATORIO C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	
--	--	--




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		PLANTA CYP CRUZ SAENZ	
LOCALIZACION EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.		FECHA RECIBO 17/08/2026	
		FECHA INFORME 19/08/2026	
MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"			
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER			
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA			
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	97	90-100
	1/2"	84	72-89
	3/8"	76	60-82
	1/4"	66	44-71
	Núm. 4	55	37-64
	Num. 10	33	20-46
	Núm. 20	16	12-35
	Núm. 40	11	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	8	4-16
	Núm. 200	5	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO AC - 30			
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			

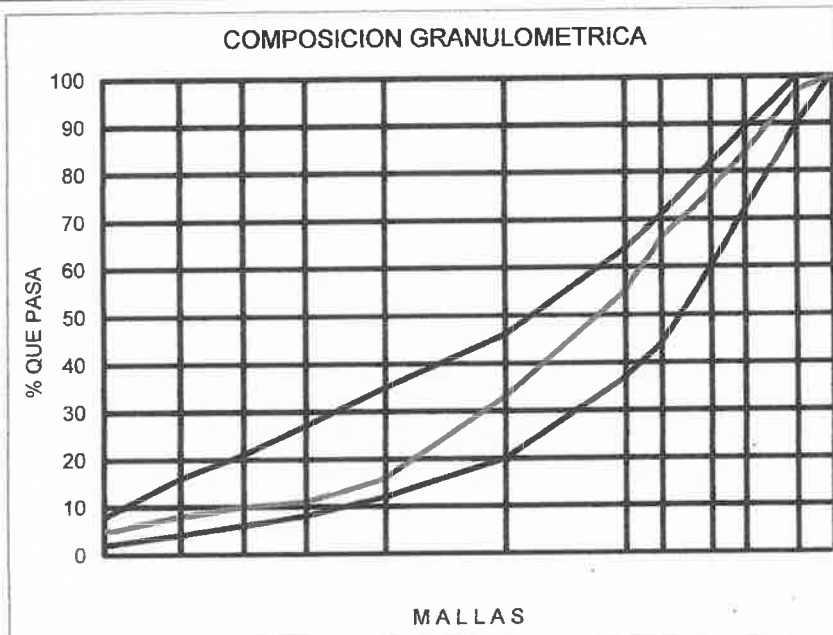

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	158	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2031	
ESTABILIDAD, kg.	1207	817.5
FLUJO, mm	2.8	2 - 3.5
VACIOS, %	3.7	DE 3 A 5
VAM, %	15.6	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA **PRUEBAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO** PLANTA **CYP CRUZ SAENZ**
LOCALIZACION **EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.** FECHA RECIBO **19/08/2026**
FECHA INFORME **21/08/2026**

MUESTRA **MEZCLA ASFALTICA 3/4"**
DESCRIPCION DEL MATERIAL **ROCA CALIZA**
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO **TRITURACION TOTAL**
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO **AL TENDER**
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO **MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA**

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	97	90-100
	1/2"	84	72-89
	3/8"	78	60-82
	1/4"	65	44-71
	Núm. 4	57	37-64
	Num. 10	32	20-46
	Núm. 20	22	12-35
	Núm. 40	13	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	8	4-16
	Núm. 200	6	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

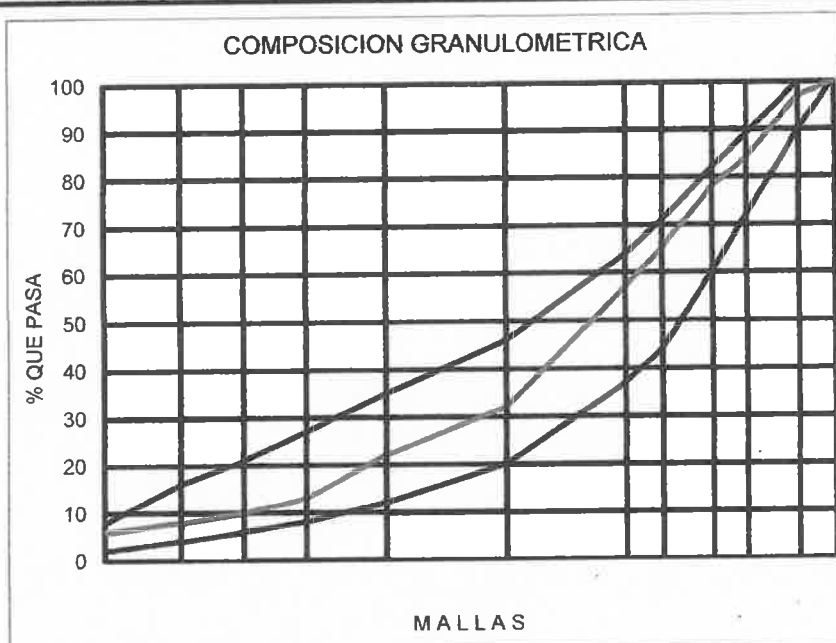

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	156	150 - 160
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2133	
ESTABILIDAD, kg.	1245	817.5
FLUJO, mm	3.3	2 - 3.5
VACIOS, %	4.2	DE 3 A 5
VAM, %	16.3	14 MIN
CONT. GEM.ASF/PETREO, %	5.5	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

F A S E EMULSIONES Y ASFALTOS

CALLE 63 No. 6313 COL. CONCORDIA CP. 31375 CHIHUAHUA, CHIH.

INFORME DE PRUEBAS LABORATORIO

PRODUCTO: EMULSION CATIONICA ECR-65

EXPEDIDO A: CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION: CHIHUAHUA

FECHA ELABORACION: 02/07/2026

ENSAYE No. 15

FECHA DE INFORME: 02/07/2026

ESTADO: CHIHUAHUA

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO TAD-CADEREYTA NL.

EMULSION CATIONICA ECR-65	ENSAYES		METODO
PRUEBAS	No	No	
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO EN MASA ;%,MINIMO	65.1		65
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 25 °C ,S, MINIMO	N/A		N/A
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 50 °C ,S, MINIMO	41		40
ASENTAMIENTO EN 5 DIAS; DIFERENCIA EN %. MAXIMO	0.005		5
RETENCION EN LA MALLA No20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ%.MAX	0.1		0.1
PASA MALLA No 20 Y SE RETIENE EN MALLA No 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %.MAXIMO	0.23		0.25
CARGA ELECTRICA DE LA PARTICULA	+		(+)
RESIDUO DE LA DESTILACION, % EN VOLUMEN (SOLVENTE)	N/A		
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MAXIMO	3		3
EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION			
VISCOSIDAD DINAMICA A 60° C;PAS(P(1)),MAXIMO	N/A		50 +- 10
PENETRACION A 25 °C; 100 g, 5 SEGG;GRADOS.	148		110-250
SOLUBILIDAD; %, MINIMO	N/A		
DUCTIBILIDAD, % 25°C, CM, MINIMO	N/A		

OBSERVACIONES:

LA EMULSION CUMPLE LOS REQUISITOS PARA UNA EMULSION ECR-65

LABORATORIO

ING. CESAR OMAR AGUILERA OLIVAS

GERENCIA

ING. MANUEL SANCHEZ MEDRANO



CERTIFICADO DE CALIDAD

PROYECTOS Y LABORATORIO **INFORME DE PRUEBAS DE CEMENTOS ASFÁLTICOS** **ASFALTO AC-30 (BETÚN DE PETROLEO)**

OBRA: CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.	REMISIÓN: 35614
LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME : 24 DE JULIO DEL 2026

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO	ASFALTOS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
TIPO DE PRODUCTO INDICADO EN LA REMISIÓN	AC- 30
DEPOSITO MUESTREADO	TANQUE CLIENTE

PRUEBAS	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS LABORATORIO AFSA	ESPECIFICACIÓN
			N-CMT-4-05-001
DEL CEMENTO ASFALTICO ORIGINAL			
PENETRACIÓN A 25°C, 100 GRAMOS, 5 SEG (EN 0.1 MM), MÍNIMO	M-MMP-4-05-006/00	52	50
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL A 135 °C, SEG, MÍNIMO	M-MMP-4-05-004/00	273	150
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C, Pa-s	M-MMP-4-05-002/02	3,014	2,400-3,600
VISCOSIDAD CINEMATICA A 135°C (CENTISTOKES), MÍNIMO	M-MMP-4-05-003/02	416	350
PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND (°C),MÍNIMO	M-MMP-4-05-007/00	306	232
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO (°C)	M-MMP-4-05-009/00	50.5	50-58
SOLUBILIDAD EN (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-008/00	99.6%	99%
DEL RESIDUO DE LA PRUEBA DE LA PELICULA DELGADA			
PERDIDA POR CALENTAMIENTO (%), MÁXIMO	M-MMP-4-05-010/02	-0.106	0.5
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C Pa-s, MÁXIMO	M-MMP-4-05-002/02	9,264	12,000
PENETRACIÓN RETENIDA 25 °C (%), MÍNIMO	M-MMP-4-05-010/02	46	40
DUCTILIDAD A 25 °C, 5 CM/MIN, CM, MÍNIMO	M-MMP-4-05-011/07	64	58

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES COMO UN AC-30



INGENIERO DE PRUEBA

Norma
L.Q. NORMA ROMÁN






CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
LOCALIZACION	MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CYP CRUZ	FECHA RECIBO	05/07/2025
		FECHA INFORME	13/07/2025
MUESTRA	PETREO CLASIFICADO DE MALLA No. 4 A FINOS (POLVILLO)		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	100	60-82
	1/4"	100	44-71
	Núm. 4	100	37-64
	Num. 10	64	20-46
	Núm. 20	39	12-35
	Núm. 40	23	8-27
	Núm. 60	19	6-21
	Núm. 100	15	4-16
	Núm. 200	12	2-8
RET. MALLA			%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		1620	
ABSORCION %			
DENSIDAD		2.71	(2.4 MIN)
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %		65	(50 MIN)
CONTRACCION LINEAL %		1.2	

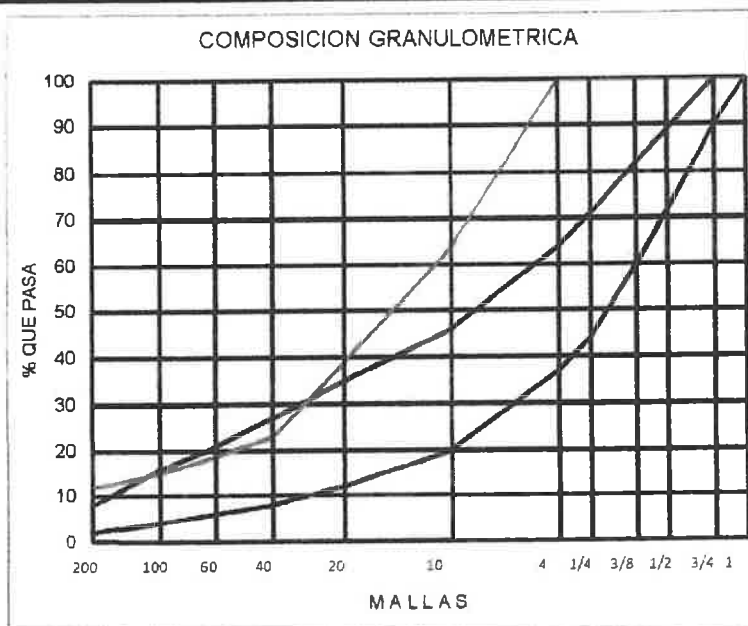

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. GEM ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

OBSERVACIONES:

REPORTAMOS LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA No. 4 Y FINOS.

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. PLANTA CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONSTRUCTORA CYP CRUZ FECHA RECIBO 05/07/2025
PETREO DE 3/8" A No. 10 (SELLO) FECHA INFORME 13/07/2025

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	78	60-82
	1/4"	43	44-71
	Núm. 4	21	37-64
	Num 10	2	20-46
	Núm 20	0	12-35
	Núm 40	0	8-27
	Núm 60	0	6-21
	Núm. 100	0	4-16
	Núm 200	0	2-8
RET. MALLA			%
P V SECO SUELTO Kg/m ³			1460
ABSORCION %		0.72	
DENSIDAD		2.68	(2.4 MIN)
DESGASTE %		26.3	(35 MAX)
PART. ALARGADAS %		9.0	
PART. LAJEADAS %		11.9	
EQUIV ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

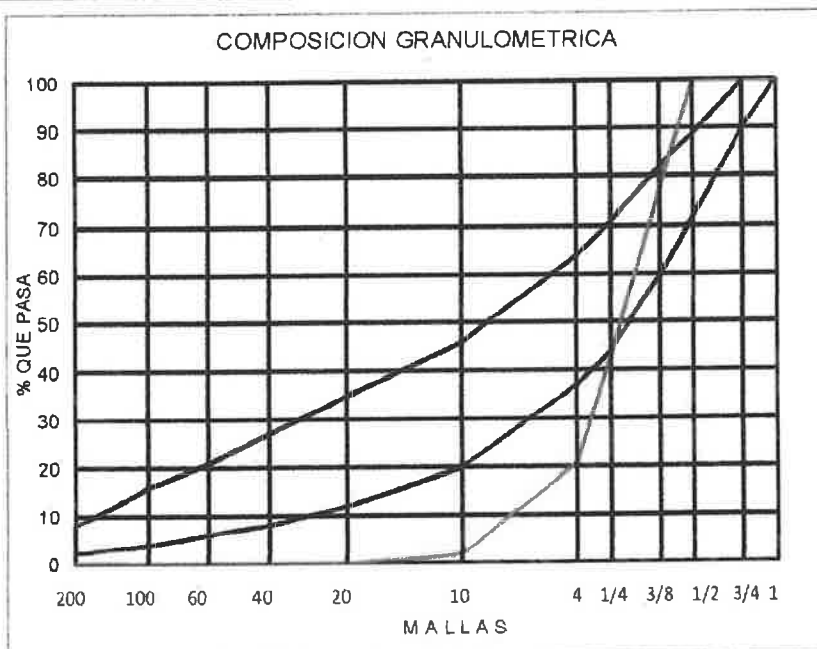

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION. °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. GEM ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C A	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

OBSERVACIONES:

REPORTAMOS LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA 3/8" A No. 10.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.		PLANTA	CYP CRUZ	
LOCALIZACION	MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CYP CRUZ			FECHA RECIBO	05/07/2025
				FECHA INFORME	13/07/2025
MUESTRA	PETREO CLASIFICADO DE 3/4" A MALLA No. 4 (GRAVA)				
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA				
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL				
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS				
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	GCC EN COLONIA NOMBRE DE DIOS				
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA				
	CARPETA ASFALTICA				
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO	
		1"	100		
		3/4"	99	90-100	
		1/2"	81	72-89	
		3/8"	52	60-82	
		1/4"	12	44-71	
		Núm. 4	3	37-64	
		Núm. 10	1	20-46	
		Núm. 20	0	12-35	
		Núm. 40	0	8-27	
		Núm. 60	0	6-21	
		Núm. 100	0	4-16	
		Núm. 200	0	2-8	
		RET. MALLA		%	
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		1539		
	ABSORCION %		0.85		
	DENSIDAD		2.68 (2.4 MIN)		
	DESGASTE %		26 (35 MAX)		
PART. ALARGADAS % 10.1		} (35MAX)			
PART. LAJEADAS % 9.8					
EQUIV. ARENA %		(50 MIN)			
CONTRACCION LINEAL %					
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO					
TIPO					
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg					
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg					
COMPOSICION GRANULOMETRICA					
N-CMT.04-04/17					
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA			ESPECIFICACIONES		
TEMP. DE ELABORACION, °C			170 - 180		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³					
ESTABILIDAD kg			817.5		
FLUJO, mm			2 - 3.5		
VACIOS, %			DE 3 A 5		
VAM, %			14 MIN		
CONT. CEM ASF/PETREO, %					
ADITIVO USADO	MARCA				
	TIPO				
	CANTIDAD/ C.A.				
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO				
OBSERVACIONES:					
EL MATERIAL ENSAYADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ELABORACION DE MEZCLA ASF.					
		EL JEFE DEL LABORATORIO			
		ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTARITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ	PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	05/07/2025
20% MATERIAL CLASIFICADO DE MALLA 3/4 A No. 4 (GRAVA), 20% DE MATERIAL ENTRE MALLA 3/8" Y No. 4, 60% MATERIAL DE MALLA No. 4 A FINOS.		FECHA INFORME	13/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA		
CARPETA ASFALTICA		
MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	100-100
3/4"	100	88 - 100
1/2"	90	74 - 100
3/8"	84	65 - 85
1/4"	70	54 - 72
Núm. 4	64	47 - 65
Núm. 10	32	32 - 48
Núm. 20	20	21 - 34
Núm. 40	13	14 - 24
Núm. 60	11	10 - 18
Núm. 100	9	7 - 13
Núm. 200	7	4 - 9
RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³	1672	
ABSORCION %	2.1	
DENSIDAD	2.69	(2.4 MIN)
DESGASTE %	26.7	(35 MAX)
PART. ALARGADAS %	10.4	} (40MAX)
PART. LAJEADAS %	9.9	
EQUIV. ARENA %	71	(50 MIN)
CONTRACCION LINEAL %	1	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC - 30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

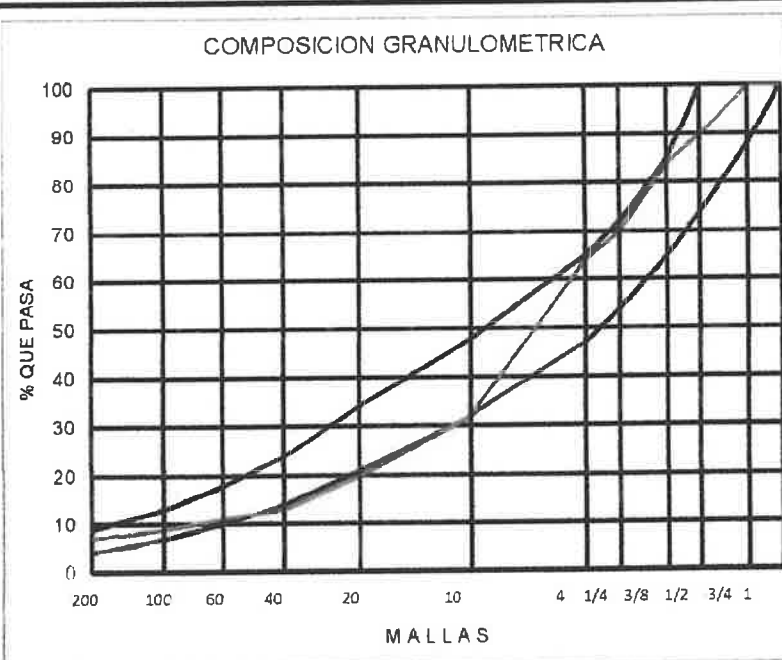

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD kg.		817.5
FLUJO, mm		DE 2 A 4
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA DE MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE UNA MEZCLA ASFALTICA DE TAM. MAX DE 3/4".

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ



LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

BLVD. DIAZ ORDAZ No 1811, COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH.






TELS.

(614) 4 10 60 32 , (614) 3 46 94 04

PRUEBA MARSHALL

OBRA PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN CYP CRUZ SAENZ
BANCO ALMACEN EN LA PLANTA

FECHA 13-jul-25
CARPETA TAMAÑO 3/4"
Tipo de asfalto: AC-30
Densidad del asfalto: .985 T/M3

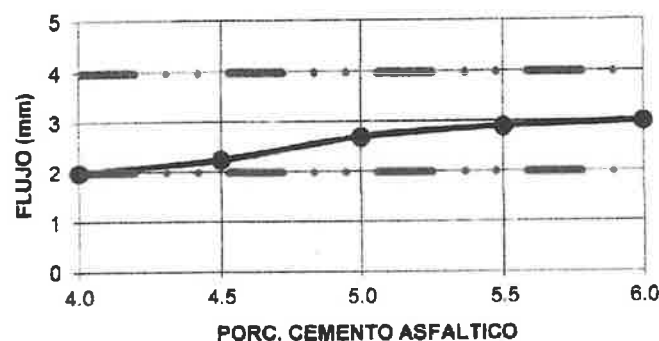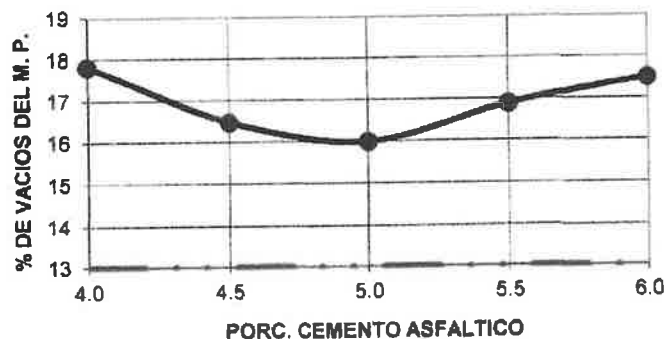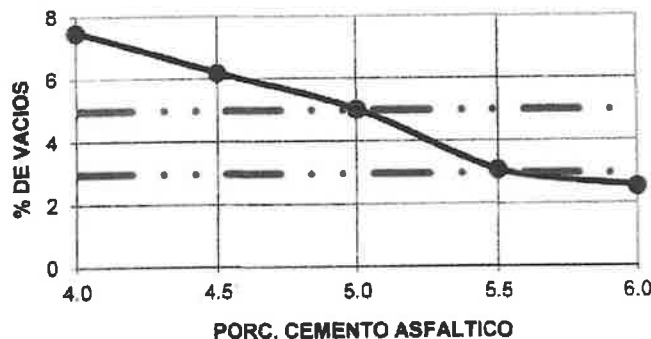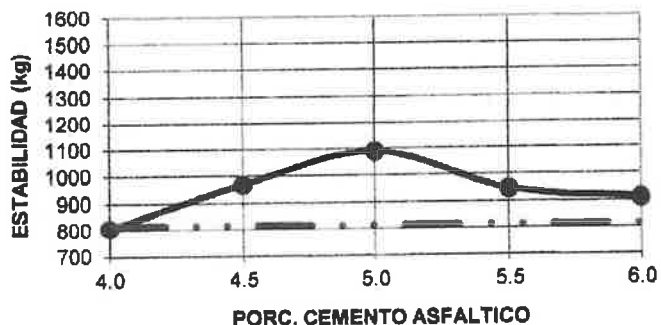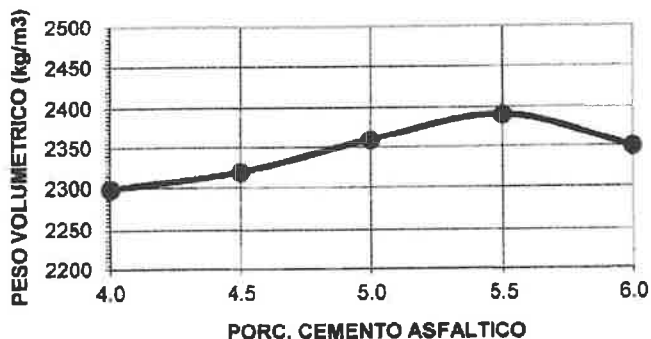

TEMPERATURA DE ELABORACION
TEMPERATURA DE TENDIDO

170° -180°
166°

CARACTERISTICAS	DATOS OBTENIDOS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO OPTIMO DE C.A. (%):	5.00	
ESTABILIDAD (kg):	1248	817
VACIOS (%):	3.50	DE 3 A 5
PESO VOLUMETRICO (kg/m3):	2384	
FLUJO (mm):	2.70	DE 2 A 4
VACIOS DEL M. P. (%):	15.40	13 MIN

EL LABORATORISTA

EL JEFE DE LABORATORIO

NOTA IMPORTANTE

HACEMOS NOTAR QUE EN LA PLANTA
SE DEBERA EFECTUAR LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA OBTENER ESTOS
RESULTADOS

ING.FAUSTO CHAVEZ M.



LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OFICIO No. 1

Chihuahua, Chih., a 24 de Junio de 2026

GRUPO CORPOSIIA S.A DE C.V
CALLE LOURDES GARZA No.8628
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 31063
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente me permito enviar a Usted, resultados obtenidos en ensayos de laboratorio efectuados en:

OBRA: Pavimentación con Mezcla Asfáltica en Entrada Principal a Ejido Sacramento.
LOCALIZACION: Ejido Sacramento Chihuahua

CONTENIDO DEL OFICIO
COMPACTACIONES

17/06/2026	4
19/06/2026	7

TOTAL 11

MEZCLA ASFALTICA
23/06/2026 1

TOTAL 1

INFORME DE RIEGO DE LIGA

23/06/2026	1
------------	---

TOTAL 1

INFORME DE TEMPERATURA

23/06/2026	1
------------	---

TOTAL 1

Sin otro asunto de momento, quedo de Usted.

Atentamente,
GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ

**LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ****INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN**

OBRA: PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN ENTRADA PRINCIPAL **FECHA** 17/06/2026
A EJIDO SACRAMENTO
LOCALIZACION: EJIDO SACRAMENTO CHIHUAHUA

COMPACTACION DE PROYECTO 90% **ESPESOR DE PROYECTO** 20 CMS.
REPORTE DE COMPACTACION DE: TERRENO NATURAL EN C. BENITO JUAREZ TRAMO 0+000 - 0+100

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1840	1765	1676	12.9	5.3	91
		CEN	20	1840	1837	1715	12.9	7.1	93
		IZQ	20	1840	1846	1695	12.9	8.9	92
		CEN	20	1840	1846	1711	12.9	7.9	93
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR									

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.
OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO

TECNICO : HUGO CONTRERAS
AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN ENTRADA PRINCIPAL A EJIDO SACRAMENTO
LOCALIZACION: EJIDO SACRAMENTO CHIHUAHUA

COMPACTACION DE PROYECTO 100% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS.
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE EN C. BENITO JUAREZ TRAMO 0+000 - 0+100

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		IZQ	20	1880	1966	1809	11.9	8.7	96
		CEN	20	1880	1958	1805	11.9	8.5	96
		DER	20	1880	1935	1770	11.9	9.3	94
		IZQ	20	1880	1978	1825	11.9	8.4	97
20/06/2026 RECOMPACTACION									
		IZQ	20	1880	2034	1883	11.9	8.0	100
		CEN	20	1880	2065	1903	11.9	8.5	101
		DER	20	1880	2045	1888	11.9	8.3	100

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:
LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS DESPUES DE RECOMPACTAR SON SATISFACTORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO
19-jun-26

TECNICO : HUGO CONTRERAS

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
CS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

IMPREGNACION

ENSAYES No.

FECHA DE RECIBO	23-jun-26
FECHA DE INFORME	24-jun-26

LOCALIZACIÓN: EJIDO SACRAMENTO CHIHUAHUA

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION	07:50	HORA DE DETERMINACION	8:05AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Lt/m2	TEMPERATURA DE APLICACION	65°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 Lt/m2	CANTIDAD EMPLEADA	896.70
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RÁPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA		TEMPERATURA AMBIENTE	26°C		
SOLEADO					

DE KM A KM	LADO	FRANJA	LONGITUD M	ANCHO M	AREA M2	PRODUCTO ASF. REGADO LITROS	TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA LA CAPA ANTES DE SU IMPREGNACION
						L/M2	

TRAMO No 1 CALLE ATILANO ALBERTOS

[illegible]

	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
--	----------------------------------

EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ




OBRA	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN ENTRADA PRINCIPAL A EJIDO SACRAMENTO.		ENSAYES No.	481
			FECHA DE RECIBO	23-jun.-26
LOCALIZACION	EJIDO SACRAMENTO CHIHUAHUA		FECHA DE INFORME	24-jun.-26
MEZCLA ASFALTICA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"	PG 76 - 22	ESPOSOR DE PROYECTO DE LA CAPA	6.0
PIANTA EN Km	NIRVANA		ESPOSOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR	6.9

[illegible]

LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y AL COMPACTAR SON SATISFATORIOS

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN ENTRADA
PRINCIPAL A EJIDO SACRAMENTO.

PLANTA NIRVANA
FECHA RECIBO 23/06/2026
FECHA INFORME 24/06/2026

MUESTRA

MEZCLA ASFALTICA 3/4"

DESCRIPCION DEL MATERIAL

ROCA DE ORIGEN CALIZO

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO

TRITURACION TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO

ALMACEN EN PLANTA DE MEZCLADO

UBICACIÓN DEL BANCO DEL PETREO

MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA

CARPETA ASFALTICA

MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	100	100
1/2"	94	100
3/8"	86	90-100
1/4"	78	70-89
Núm. 4	69	56-82
Num. 10	36	28-64
Núm. 20	23	18-49
Núm. 40	14	13-37
Núm. 60	12	10-29
Núm. 100	10	6-21
Núm. 200	7	2-10
RET. MALLA		

P. V. S. SUELTO KG/M3

ABSORCION % (2.4 MIN)

DENSIDAD (30 MAX)

DESGASTE % (35 MAX)

PART. ALARGADAS % (35 MAX)

PART. LAJEADAS % (50 MIN)

EQUIV. ARENA % 69.8

CONTRACCIÓN LINEAL %


CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO

TIPO **PG 76 -22**

PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg

COMPOSICION GRANULOMETRICA

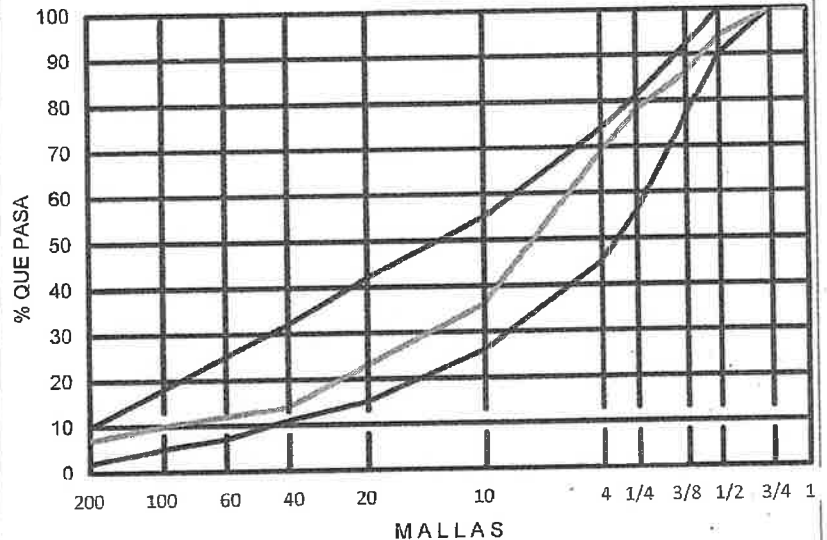

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	175	170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2367	
ESTABILIDAD, kg.	1124	817.5 MIN.
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	3.4	DE 3 A 5
VAM, %	14.50	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.5	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		

MEZCLA RESULTANTE:

LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFÁLTICA 3/4".

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN ENTRADA PLANTA NIRVANA
PRINCIPAL A EJIDO SACRAMENTO. FECHA RECIBO 23/06/2026
FECHA INFORME 24/06/2026

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA DE ORIGEN CALIZO
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO ALMACEN EN PLANTA DE MEZCLADO
UBICACIÓN DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA		
CARPETA ASFALTICA		
MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	100	100
1/2"	94	100
3/8"	86	90-100
1/4"	78	70-89
Núm. 4	69	56-82
Núm. 10	36	28-64
Núm. 20	23	18-49
Núm. 40	14	13-37
Núm. 60	12	10-29
Núm. 100	10	6-21
Núm. 200	7	2-10
RET. MALLA		
P. V. S. SUELTO KG/M3		
ABSORCION %		(2.4 MIN)
DENSIDAD		(30 MAX)
DESGASTE %		(35 MAX)
PART. ALARGADAS %		(35 MAX)
PART. LAJEADAS %		(50 MIN)
EQUIV. ARENA %		69.8
CONTRACCIÓN LINEAL %		
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO		
TIPO	PG 76 -22	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.		
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg		

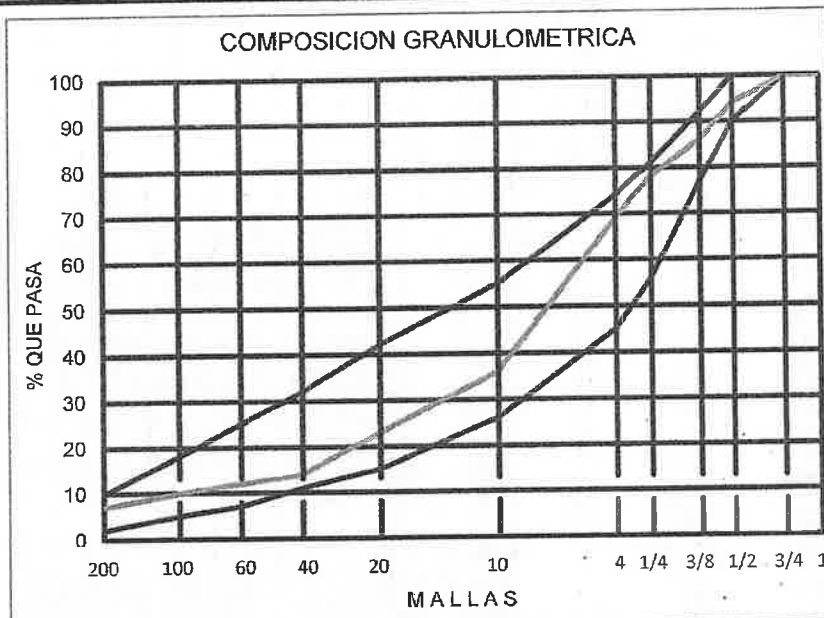

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	175	170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2367	
ESTABILIDAD, kg.	1124	817.5 MIN.
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	3.4	DE 3 A 5
VAM, %	14.50	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.5	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		

MEZCLA RESULTANTE:

LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFÁLTICA 3/4".

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
CS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-80-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

INFORME DE RIEGOS DE LIGA	X	IMPREGNACION	
---------------------------	---	--------------	--

IMPREGNACION

OBRA :	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENTRADA PRINCIPAL A EJIDO SACRAMENTO.	ENSAYES No.	FECHA DE RECIBO
LOCALIZACIÓN :	EJIDO SACRAMENTO	CHIUAHUA	FECHA DE INFORME
			23-jun-26
			24-jun-26

REPORTE DE CAMPIO No.		HORA DE INICIACION	07:50	HORA DE DETERMINACION	8:05AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Lt/m2	TEMPERATURA DE APLICACION	65°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 Lt/m2	CANTIDAD EMPLEADA	896.70
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RÁPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA		TEMPERATURA AMBIENTE		26°C	
SOLEADO					

[illegible]

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN ENTRADA PRINCIPAL A EJIDO SACRAMENTO
LOCALIZACION: EJIDO SACRAMENTO CHIHUAHUA

COMPACTACION DE PROYECTO 90% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS.
REPORTE DE COMPACTACION DE: TERRENO NATURAL EN C. BENITO JUAREZ TRAMO 0+000 - 0+100

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1840	1765	1676	12.9	5.3	91
		CEN	20	1840	1837	1715	12.9	7.1	93
		IZQ	20	1840	1846	1695	12.9	8.9	92
		CEN	20	1840	1846	1711	12.9	7.9	93

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.
OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO

TECNICO : HUGO CONTRERAS
AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL


CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONST.	CYP CRUZ SAENZ	FECHA RECIBO	02/07/2025
MUESTREO:	PETREO CLASIFICADO DE MALLA 1/2" A MALLA No. 10 (SELLO).	FECHA INFORME	09/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	76	60-82
	1/4"	35	44-71
	Núm. 4	15	37-64
	Num. 10	1	20-46
	Núm. 20	0	12-35
	Núm. 40	0	8-27
	Núm. 60	0	6-21
	Núm. 100	0	4-16
	Núm. 200	0	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %		0.72	
DENSIDAD		2.65	(2.4 MIN)
DESGASTE %		26.3	(35 MAX)
PART. ALARGADAS %		8.5	
PART. LAJEADAS %		11.1	(35MAX)
EQUIV. ARENA %			(50 MIN)
CONTRACCIÓN LINEAL %			

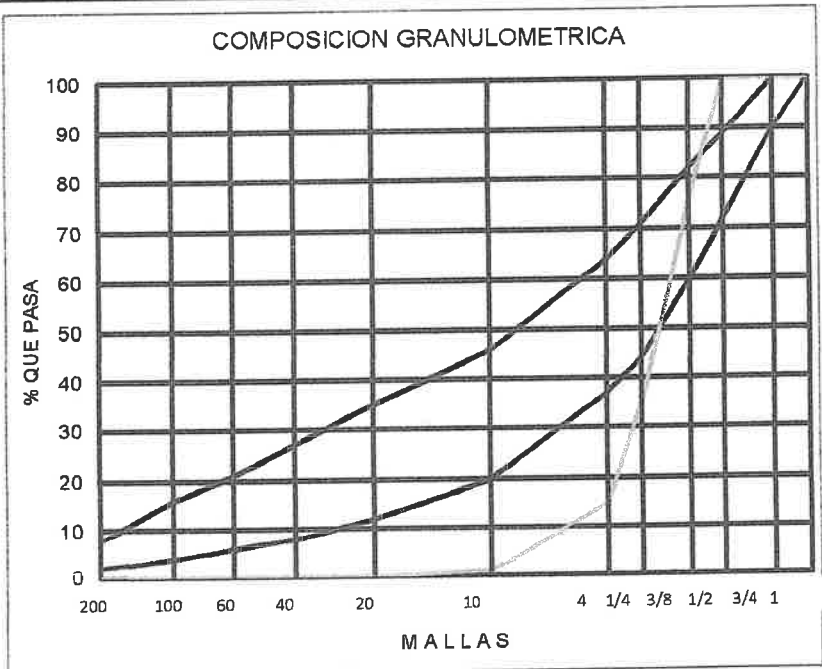

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3		
ESTABILIDAD, kg.		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:	
REPORTAMOS LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA 3/8" A No. 10.	
EL JEFE DEL LABORATORIO ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTÍNEZ	


CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
MEZCLA 70% MAT. CLASIFICADO DE 3/8" A FINOS (ARENA), 20% MAT. CLASIF. DE 3/4" A 3/8" (GRAVA) Y 10% MATERIAL 3/8" A No. 10 (SELLO).		FECHA RECIBO	02/07/2025
MUESTRA: PETREO CLASIFICADO DE 3/4" A FINOS.		FECHA INFORME	09/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL		ROCA CALIZA	
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO		TRITURACION TOTAL	
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO		EN OBRA	
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO		MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA	

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	99	90-100
	1/2"	87	72-89
	3/8"	78	60-82
	1/4"	65	44-71
	Núm. 4	55	37-64
	Num. 10	38	20-46
	Núm. 20	26	12-35
	Núm. 40	20	8-27
	Núm. 60	16	6-21
	Núm. 100	12	4-16
	Núm. 200	6	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

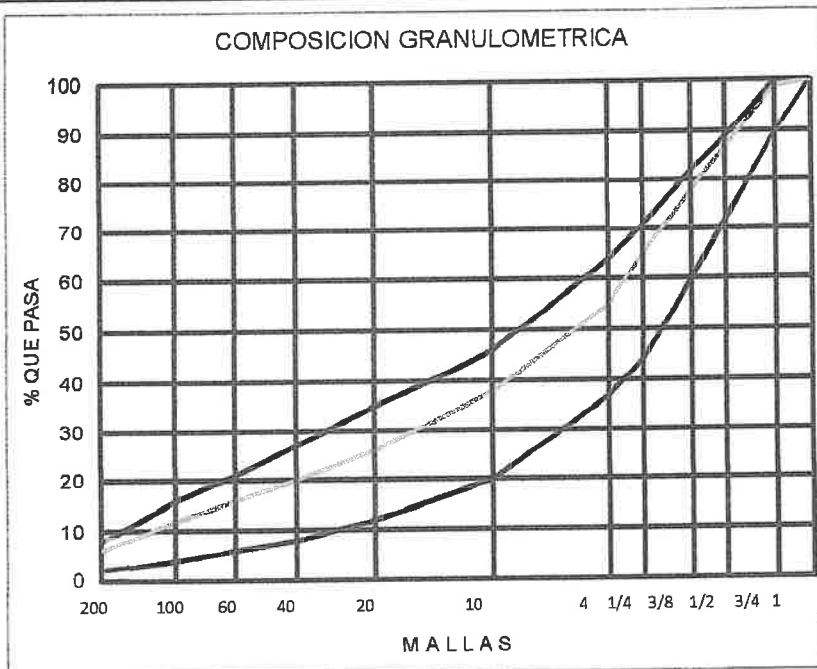

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm³		
ESTABILIDAD, kg.		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA DE MATERIALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE UNA MEZCLA ASF. DE TAM. MAX 3/4".

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTÍNEZ

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

BLVD. DIAZ ORDAZ No. 1811, COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH.

TELS.

(614) 4 10 60 32 , (614) 3 46 94 04

PRUEBA MARSHALL

OBRA PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.

BANCO ALMACEN EN LA PLANTA






FECHA

09-jul-25

CARPETA TAMAÑO 3/4"

tipo de asfalto: PG 76-22

densidad del asfalto: .998 T/M3

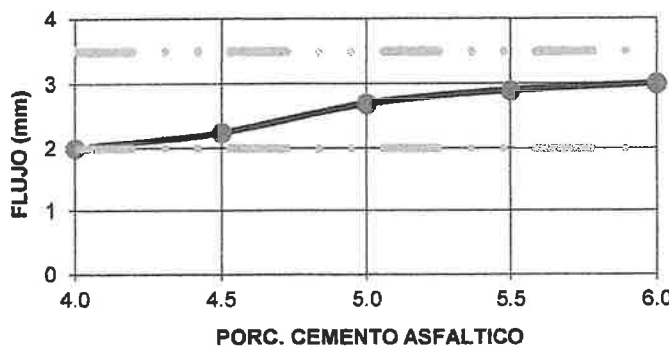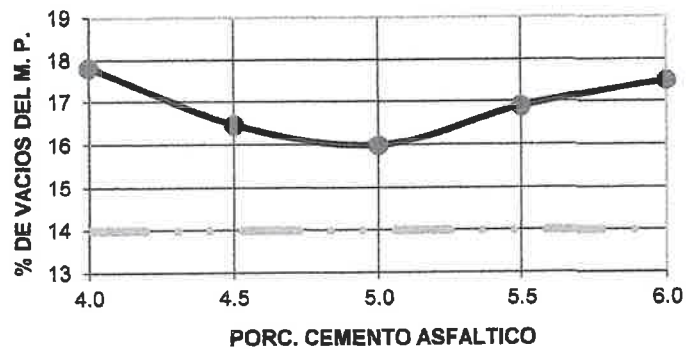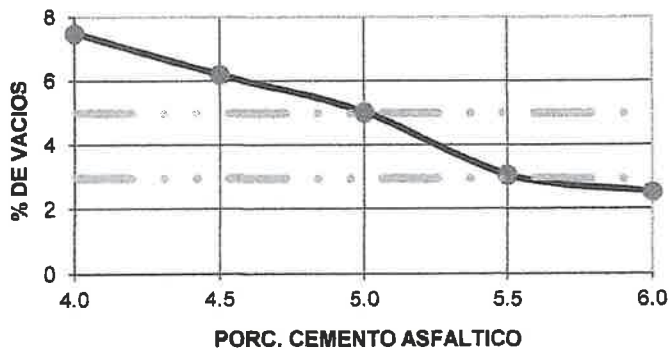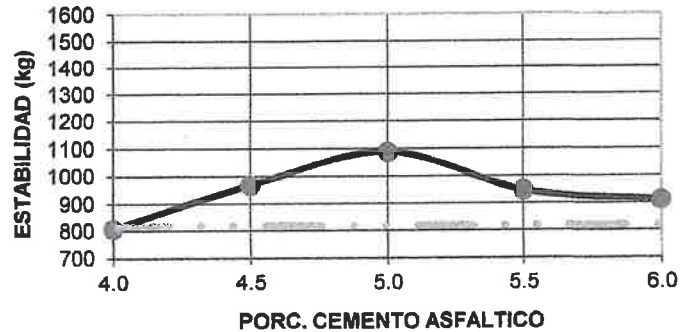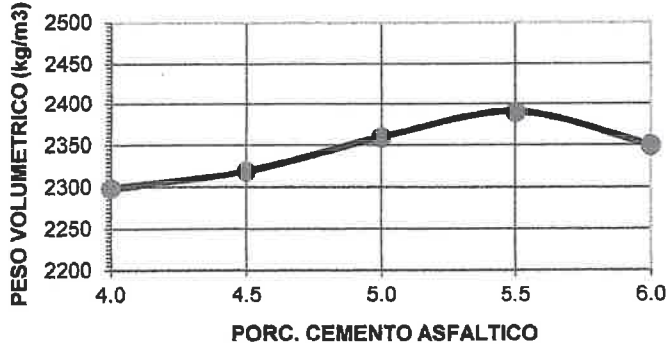

TEMPERATURA DE ELABORACION

150° -165°

TEMPERATURA DE TENDIDO

160°

CARACTERISTICAS	DATOS OBTENIDOS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO OPTIMO DE C.A. (%)	5.00	
ESTABILIDAD (kg):	1248	817
VACIOS (%):	3.50	DE 3 A 5
PESO VOLUMETRICO (kg/m³):	2384	
FLUJO (mm):	2.70	DE 2 A 4
VACIOS DEL M. P. (%):	15.40	13 MIN

EL LABORATORISTA

EL JEFE DE LABORATORIO


NOTA IMPORTANTE

HACEMOS NOTAR QUE EN LA PLANTA SE DEBERA EFECTUAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA OBTENER ESTOS RESULTADOS

ING.FAUSTO CHAVEZ M.



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

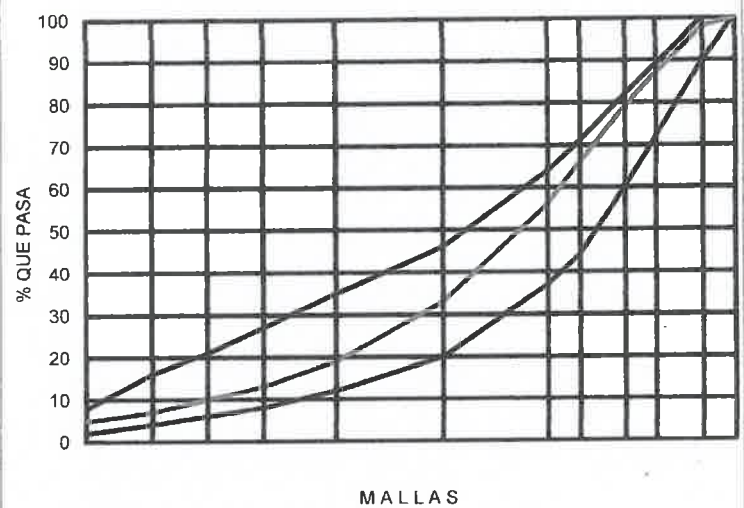OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA PLANTA		CYP CRUZ SAENZ	
EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA		FECHA RECIBO 29/06/2026	
(KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM 0+349.60).		FECHA INFORME 30/06/2026	
MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"			
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER			
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA			
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	98	90-100
	1/2"	87	72-89
	3/8"	79	60-82
	1/4"	66	44-71
	Núm. 4	56	37-64
	Núm. 10	33	20-46
	Núm. 20	19	12-35
	Núm. 40	13	8-27
	Núm. 60	10	6-21
	Núm. 100	7	4-16
	Núm. 200	5	2-8
RET. MALLA		%	
P.V. SECO SUELTO Kg/m³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
			
N-CMT.04-04/17			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES	
TEMP. DE ELABORACION, °C 180		170 - 180	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm³ 2348			
ESTABILIDAD, kg. 1216		817.5	
FLUJO, mm 3.0		2 - 3.5	
VACIOS, % 3.9		DE 3 A 5	
VAM, % 15.8		14 MIN	
CONT. CEM ASF/PETREO, % 5.2		5.3	
ADITIVO USADO	MARCA		
	TIPO		
	CANTIDAD/ C.A.		
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO		
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFALTICA.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85) (ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60).	ENSAYES No. 635
	29-jun.-26
	29-jun.-26
	FECHA DE RECIBO
	FECHA DE INFORME

CAPA CARPETA ASFALTICA 3/4	ESPOR DE PROYECTO DE LA CAPA	3.5
PLANTA EN Km.	ESPOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR	4.1
	CYP CRUZ SAENZ	

[illegible]

LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y AL COMPACTAR SON SATISFACTORIOS

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA PLANTA	CYP CRUZ SAENZ
	EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA	FECHA RECIBO 01/07/2026
	(KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM 0+349.60).	FECHA INFORME 02/07/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACIÓN DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	98	90-100
	1/2"	88	72-89
	3/8"	80	60-82
	1/4"	67	44-71
	Núm. 4	57	37-64
	Num. 10	34	20-46
	Núm. 20	20	12--35
	Núm. 40	15	8--27
	Núm. 60	11	6--21
	Núm. 100	7	4--16
	Núm. 200	5	2--8
	RET. MALLA		%
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
	ABSORCION %		
	DENSIDAD		
	DESGASTE %		
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

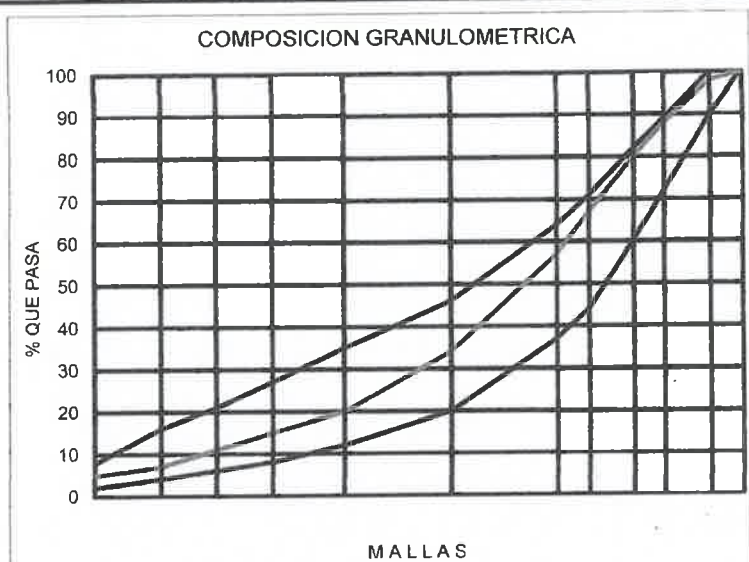

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	180	170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2319	
ESTABILIDAD, kg.	1248	817.5
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	3.6	DE 3 A 5
VAM, %	15.5	14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %	5.2	5.3
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ENSAYADA SE CONSIDERA ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFALTICA.

EL JEFE DEL LABORATORIO	
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	

OBRA :	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60)	ENSAYES No.	640
		FECHA DE RECIBO	01-jul-26
		FECHA DE INFORME	02-jul-26

OBRA :	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60)	ENSAYES No.	640
		FECHA DE RECIBO	01-jul-26
		FECHA DE INFORME	02-jul-26

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION		08:00	HORA DE DETERMINACION	8:10AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	61 L/m2	TEMPERATURA DE APLICACION		150°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 L/m2	CANTIDAD EMPLEADA		1001.27
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO		RAPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA		SOLEADO		TEMPERATURA AMBIENTE		25°C

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION		08:00	HORA DE DETERMINACION	8:10AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	61 L/m2	TEMPERATURA DE APLICACION		150°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 L/m2	CANTIDAD EMPLEADA		1001.27
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO		RAPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA		SOLEADO		TEMPERATURA AMBIENTE		25°C

[illegible]

EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ



OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE ARNOLDO Y C. DEODORA (KM. 0+638.85)(ENTRADA A FRACC. LOS CEDROS KM. 0+349.60).	ENSAYES No.	638
	FECHA DE RECIBO	1-jul -26
	FECHA DE INFORME	1-jul -26

CAPA CARPETA ASFALTICA 3/4	ESPESOR DE PROYECTO DE LA CAPA	3.5
PLANTA EN Km.	ESPESOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR	4.1
	CYP CRUZ SAENZ	

VIJES		MUESTRA		HORAS		TEMPERATURAS DE MEZCLA					TENDIDO			ESPESOR		
CAMION	VOL.			SALIDA	DESCARGA	AL SALIR	AL TENDER	AL COM-	DE Km.	A Km.	LADO o	CALZADA	ANCHO	DE CAPA		
No.	m3	No.		EN PLANTA	EN TRAMO	DE PLANTA	EN TRAMO	PACTAR			FRANJA			TENDIDA		
TRAMO 2 ESTACION DEL 0+510 AL 0+638.84																
ROJ	28		1.0	08:00	08:20	179.0	175.0	170.0	0+510	0+617	DER		6.37		3.5	
BLA	5.7		2.0	08:20	08:40	180.0	176.0	171.0	0+617	0+638.84	DER		6.37		3.5	
BLA	22.3		2.0	08:20	09:00	180.0	172.0	168.0	0+510	0+595.2	IZQ		6.37		3.5	
AZU	11.4		3.0	08:10	08:40	180.0	172.0	168.0	0+595.2	0+638.84	IZQ		6.37		3.5	

[illegible]

LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y AL COMPACTAR SON SATISFATORIOS

GERENTE GENERAL


ING. FAUSTO JAVIER/CHAVEZ.MARTINEZ

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF. DE LA PLANTA	NIRVANA
	JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES NORTE A SUR)	FECHA RECIBO 19/07/2026
		FECHA INFORME 20/07/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFÁLTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA
		1"	100
		3/4"	100
		1/2"	90
		3/8"	81
		1/4"	70
		Núm. 4	60
		Num. 10	36
		Núm. 20	20
		Núm. 40	13
		Núm. 60	11
		Núm. 100	8
		Núm. 200	6
		RET. MALLA	%
	P.V. SECO SUELTO Kg/m ³		
	ABSORCION %		
	DENSIDAD		
	DESGASTE %		
	PART. ALARGADAS %		
	PART. LAJEADAS %		
	EQUIV. ARENA %		
	CONTRACCIÓN LINEAL %		

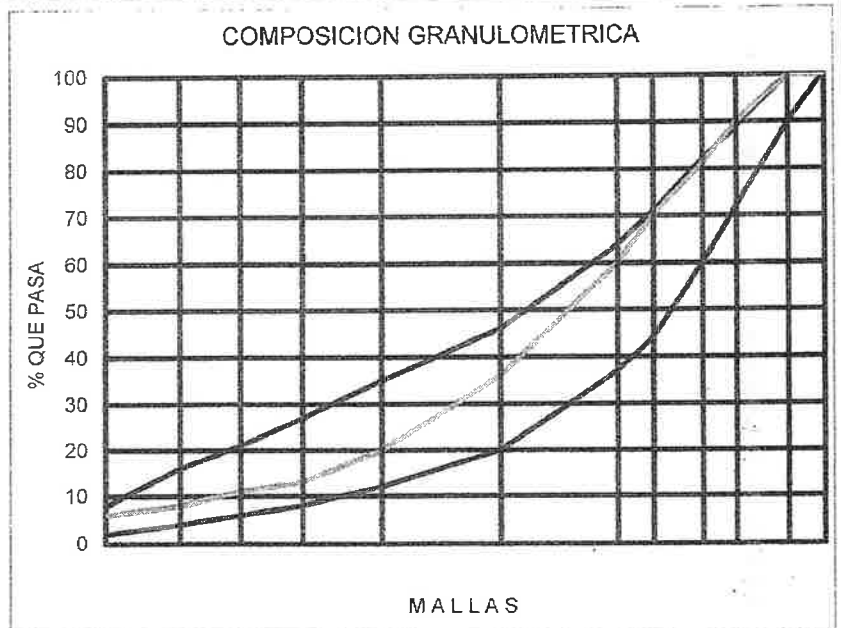

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2356
ESTABILIDAD, kg.	1189	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	3.9	DE 3 A 5
VAM, %	15.7	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.4	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	PG 76 - 22
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES: LA MEZCLA ENSAYADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA.


EL JEFE DEL LABORATORIO C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	
--	--

CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTARITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF. DE LA PLANTA NIRVANA	FECHA RECIBO 28/07/2026
JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES SUR A NORTE)	FECHA INFORME 29/07/2026

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	87	72-89
	3/8"	77	60-82
	1/4"	68	44-71
	Núm. 4	54	37-64
	Num. 10	27	20-46
	Núm. 20	16	12-35
	Núm. 40	9	8-27
	Núm. 60	8	6-21
	Núm. 100	6	4-16
	Núm. 200	4	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

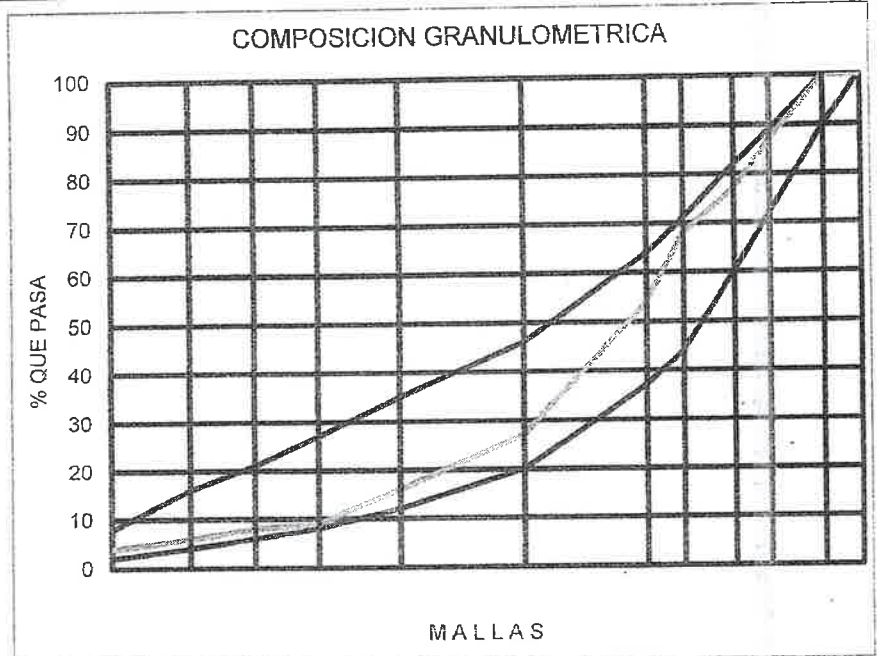

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	172	
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2389	
ESTABILIDAD, kg.	1138	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	4.1	DE 3 A 5
VAM, %	15.4	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.5	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	PG 76 - 22
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES: LA MEZCLA ENSAYADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



OFICIO No. 1

Chihuahua, Chih., a 15 de Agosto del 2026.

LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 507
COL. PANAMERICANA
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente me permito enviar a Usted, resultados obtenidos en ensayos de laboratorio efectuados en :

OBRA: Rehabilitación a base de fresado y sobre carpeta
LOCALIZACIÓN : Calle Politécnico entre Calle 12 de Octubre y
Calle Rómulo Escobar.

Sin otro asunto de momento, quedo de Usted.

Atentamente,
GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTÍNEZ


**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA	PLANTA	MURO
ASFALTICA.	CALLE POLITÉCNICO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y	FECHA RECIBO	06/08/2026
	CALLE RÓMULO ESCOBAR.	FECHA INFORME	07/08/2026
MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"	TRAMO 1 EST. 0+000 AL 0+360	
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA DE ORIGEN CALIZO		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN PLANTA DE MEZCLADO		
UBICACIÓN DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	100
	1/2"	94	100
	3/8"	86	90-100
	1/4"	78	70-89
	Núm. 4	69	56-82
	Num. 10	36	28-64
	Núm. 20	23	18-49
	Núm. 40	14	13-37
	Núm. 60	12	10-29
	Núm. 100	10	6-21
	Núm. 200	7	2-10
	RET. MALLA		
	P. V. S. SUELTO KG/M3		
	ABSORCION %		(2.4 MIN)
	DENSIDAD		(30 MAX)
	DESGASTE %		(35 MAX)
	PART. ALARGADAS %		(35 MAX)
	PART. LAJEADAS %		(50 MIN)
	EQUIV. ARENA %		69.8
	CONTRACCIÓN LINEAL %		
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	PG 76 -22		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			

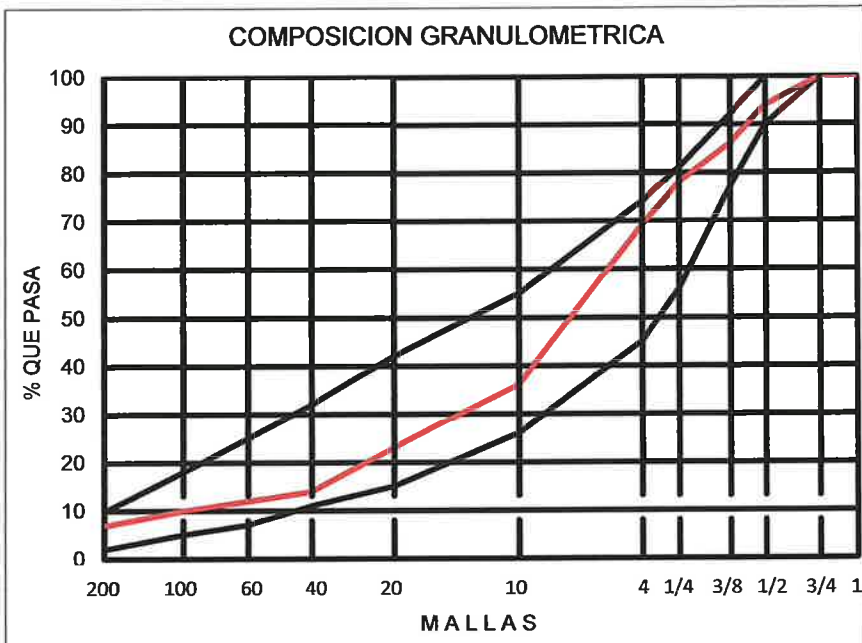**N-CMT.04-04/17**

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		177
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3		2367
ESTABILIDAD, kg.		1124
FLUJO, mm		817.5 MIN.
VACIOS, %		3.1
VAM, %		2 - 3.5
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		3.4
VAM, %		DE 3 A 5
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		14.50
VAM, %		16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		5.5
VAM, %		5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		

MEZCLA RESULTANTE:

LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFÁLTICA 3/4".

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE RIEGOS DE LIGA X

IMPREGNACION

OBRA : REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA.
CALLE POLITÉCNICO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE RÓMULO ESCOBAR.

ENSAYES No.	634
FECHA DE RECIBO	06-ago-26
FECHA DE INFORME	07-ago-26

REPORTE DE CAMPO No.	HORA DE INICIACION		09:20	HORA DE DETERMINACION	9:32PM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Lt/m2	TEMPERATURA DE APLICACION	60°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 Lt/m2	CANTIDAD EMPLEADA	1361.52
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RÁPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA	TEMLADO	TEMPERATURA AMBIENTE	25°C		

[illegible]

	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
--	----------------------------------

EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ


**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.**

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA	PLANTA	MURO
ASFÁLTICA. CALLE POLITÉCNICO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y		FECHA RECIBO	10/08/2026
CALLE RÓMULO ESCOBAR.		FECHA INFORME	11/08/2026
MUESTRA	MEZCLA ASF. 3/4" TRAMO 2 EST. 0+360 AL 0+500 LADO IZQ. Y 0+000 AL 0+360 LADO DERECHO.		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA DE ORIGEN CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREO	ALMACEN EN PLANTA DE MEZCLADO		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA
		PROYECTO	
		1"	100
		3/4"	100
		1/2"	94
		3/8"	90
		1/4"	85
		Núm. 4	79
		Núm. 10	43
		Núm. 20	26
		Núm. 40	14
		Núm. 60	12
		Núm. 100	9
		Núm. 200	7
		RET. MALLA	
	P. V. S. SUELTO KG/M3		
	ABSORCION %		(2.4 MIN)
	DENSIDAD		(30 MAX)
	DESGASTE %		(35 MAX)
	PART. ALARGADAS %		(35 MAX)
	PART. LAJEADAS %		(50 MIN)
	EQUIV. ARENA %		69.8
	CONTRACCIÓN LINEAL %		
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	PG 76 -22		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			

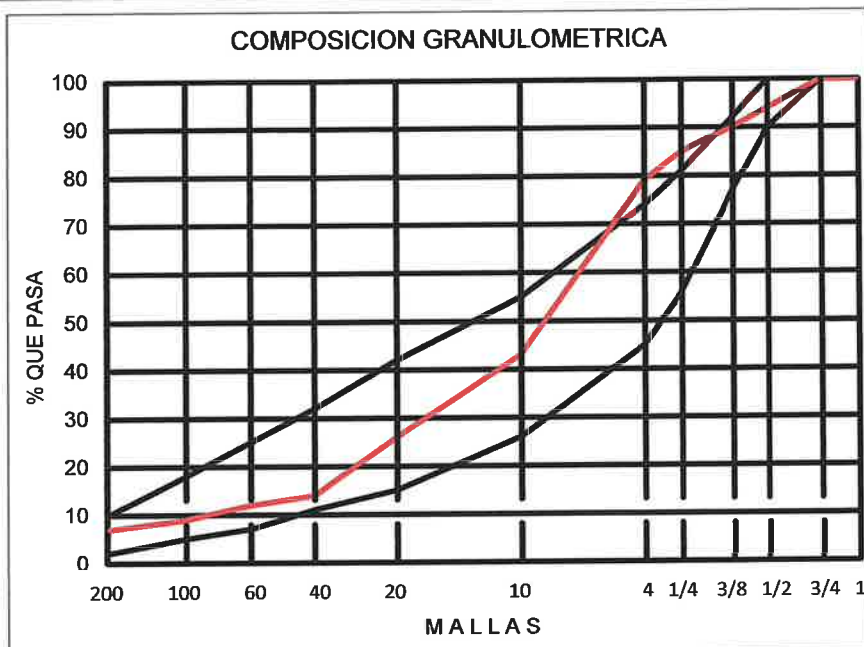**N-CMT.04-04/17**

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		175
170 - 180		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2378	
ESTABILIDAD, kg.	1124	817.5 MIN.
FLUJO, mm	3.0	2 - 3.5
VACIOS, %	4.0	DE 3 A 5
VAM, %	15.6	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		

MEZCLA RESULTANTE:
LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFÁLTICA 3/4".

GERENTE GENERAL**ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ**

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE RIEGOS DE LIGA **X**

X

IMPREGNACION

OBRA: REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA. CALLE POLITÉCNICO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE RÓMULO ESCOBAR.

635	ENSAYES No.
-----	-------------

FECHA DE RECIBO	10-ago-26
FECHA DE INFORME	11-ago-26

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION	09:50	HORA DE DETERMINACION	10:15PM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Lt/m ²	TEMPERATURA DE APLICACION	60°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 L ³ /m ²	CANTIDAD EMPLEADA	1210.24
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RAPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA		TEMPLADO	27°C		

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	

EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

EL JEFE DEL LABORATORIO


ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA. CALLE POLITECNICO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE RÓMULO ESCOBAR	PLANTA	MURO
		FECHA RECIBO	14/08/2026
		FECHA INFORME	15/08/2026
MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4" TRAMO No. 3 EST. 0+360 AL 0+500 LADO DERECHO		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA DE ORIGEN CALIZO		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN PLANTA DE MEZCLADO		
UBICACIÓN DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA
		1"	100
		3/4"	100
		1/2"	96
		3/8"	91
		1/4"	80
		Núm. 4	75
		Num. 10	45
		Núm. 20	24
		Núm. 40	17
		Núm. 60	14
		Núm. 100	9
		Núm. 200	6
		RET. MALLA	
	P. V. S. SUELTO KG/M3		
	ABSORCION %		(2.4 MIN)
	DENSIDAD		(30 MAX)
	DESGASTE %		(35 MAX)
	PART. ALARGADAS %		(35 MAX)
	PART. LAJEADAS %		(50 MIN)
	EQUIV. ARENA %		69.8
	CONTRACCIÓN LINEAL %		
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO	PG 76 - 22		
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			

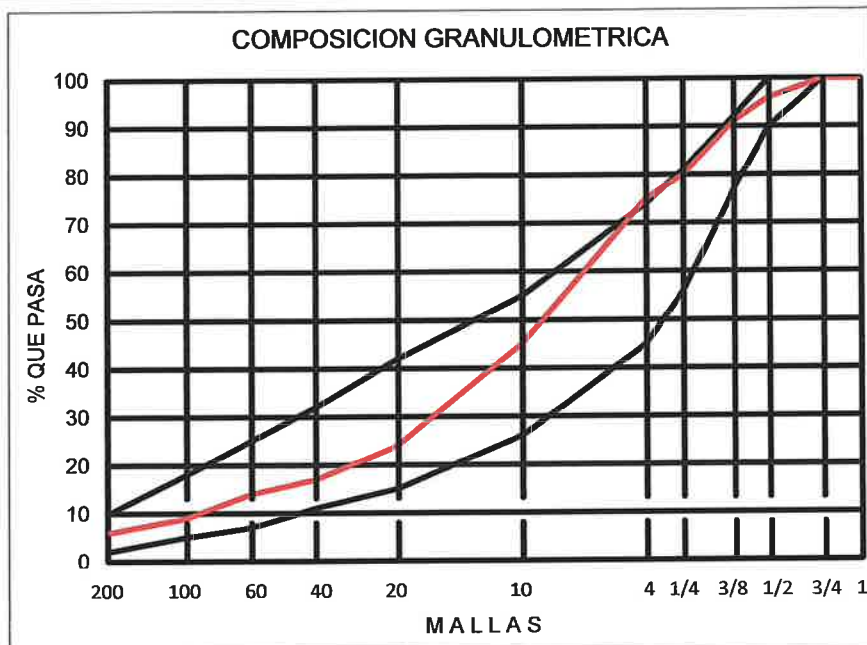

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		178
170 - 180		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2386	
ESTABILIDAD, kg.	1095	817.5 MIN.
FLUJO, mm	2.67	2 - 3.5
VACIOS, %	3.88	DE 3 A 5
VAM, %	14.95	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		

MEZCLA RESULTANTE:

LA MEZCLA ANALIZADA PRESENTA CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA SU EMPLEO EN CARPETA ASFÁLTICA 3/4".

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
 CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

X

1888

OBRA :	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA.	ENSAYES No.	636
	CALLE POLITÉCNICO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE RÓMULO ESCOBAR.	FECHA DE RECIBO	14-ago-26
		FECHA DE INFORME	15-ago-26

ENSAYES NO.	636
-------------	-----

FECHA DE RECIBO
14-ago-26

FECHA DE INFORME 15-ago-26

REPORTE DE CAMPO No.	HORA DE INICIACION	10:20	HORA DE DETERMINACION	10:33PM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION		TEMPERATURA DE APLICACION	60°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60		CANTIDAD EMPLEADA	520.80
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO		ROMPIMIENTO	RÁPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA	TEMLADO	25°C		

REPORTE DE CAMPO No.	HORA DE INICIACION	HORA DE DETERMINACION
	10:20	10:33PM

PRODUCTO ASESICADO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	60 Lt/m ²	TEMPERATURA DE APLICACION	60°C
-----------------------------	----------	----------------------	----------------------	---------------------------	------

ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	CANTIDAD EMPLEADA
		0.60 Lt/m ²	520.80

ACTIVIDADES	MECANICO	ROMPIMIENTO	RÁPIDO
EQUIPO DE BARRIDO			

CONDICIONES DEL CLIMA	TEMPLADO	TEMPERATURA AMBIENTE	25°C
-----------------------	----------	----------------------	------

DE KM A KM	LADO	FRANJA	LONGITUD M	ANCHO M	AREA M2	PRODUCTO ASF. REGADO LITROS	L/M2	TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA LA CAPA ANTES DE SU IMPREGNACION
TRAMO No. 3 EST. 0+360 AL 0+500 LADO DERECHO								

DE KM A KM	LADO	FRANJA	LONGITUD	ANCHO	AREA	PRODUCTO ASE. REGADO	TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA
------------	------	--------	----------	-------	------	----------------------	------------------------------

DE 100 A 1000	LITROS	M	M2	LITROS	L/M2
		M	M2		

[illegible]

α	β	γ	δ	ϵ	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	$\omicron$	π	ρ	σ	τ	υ	ϕ	χ	ψ	ω
0+360	A1	0+500	2	DER	140	6.20	868.00	520.80	0.60	TEXTURA CERRADA													

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	

EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

0

EL JEFE DEL LABORATORIO

15.

10/1/20

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA.	ENSAYES No.	636
CALLE POLITÉCNICO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE RÓMULO ESCOBAR.		FECHA DE RECIBO	14-ago.-26
		FECHA DE INFORME	15-ago.-26

MEZCLA ASFALTICA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"	PG 76 - 22	ESPOR DE PROYECTO DE LA CAPA	3.5
PLANTA EN K	MURO		ESPOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR	4.4

[illegible]

LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y AL COMPACTAR SON SATISFATORIOS

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ

OBRA : Trabajos diversos en la Ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua

No. DE INFORME :

1

FECHA INFORME :

2026-01-31

LOCALIZACIÓN : Planta de Mezclado en Periferico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. Ladrilleros Sur

CIUDAD :

Chihuahua

ESTADO :

Chihuahua

CLIENTE : Construcciones Nirvana

CLAVE DE LA OBRA :

DM-NV-02/26

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCION DEL MATERIAL : Pétreo para carpeta asfáltica T.N. 1/2" (Arena)

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL : Roca de Origen Calizo

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : Trituración Total

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO (*) : Almacen en Planta de Mezclado

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO : Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih.

COMPOSICION GRANULOMETRICA (*)

M.V.S.S. (Kg/m³): 1 663

MALLAS	%QUE PASA	PROYECTO
1"	25.0	100.0
3/4"	19.0	100.0
1/2"	12.5	100.0
3/8"	9.5	100.0
1/4"	6.3	100.0
N° 4	4.75	100.0
N° 10	2.00	53.4
N° 20	0.850	33.0
N° 40	0.425	24.0
N° 60	0.250	17.0
N° 100	0.150	13.0
N° 200	0.075	8.9


GRAVA

DENSIDAD RELATIVA GRAVA	-	2.4 Min.
DESGASTE DE LOS ANGELES %	-	30 % Max.
DESGASTE MICRODEVAL %	-	18 % Max.
INTEMPERISMO ACELERADO %	-	20 % Max.
PART. ALARGADAS Y LAJEADAS %	-	10% Max. (ASTM)
PART. TRITURADAS 1 CARA %	-	95 % Min.
PART. TRITURADAS 2 O MAS CARAS %	-	85 % Min.
DESP. POR FRICCIÓN %	-	20% Max.
ABSORCIÓN %	1.38	---

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	2.562	2.4 Min.
ANGULARIDAD %	45.6	45 % Min.
EQUIV. DE ARENA %	63.4	50 % Min.
AZUL DE METILENO, mg/g	10	15 Max.

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

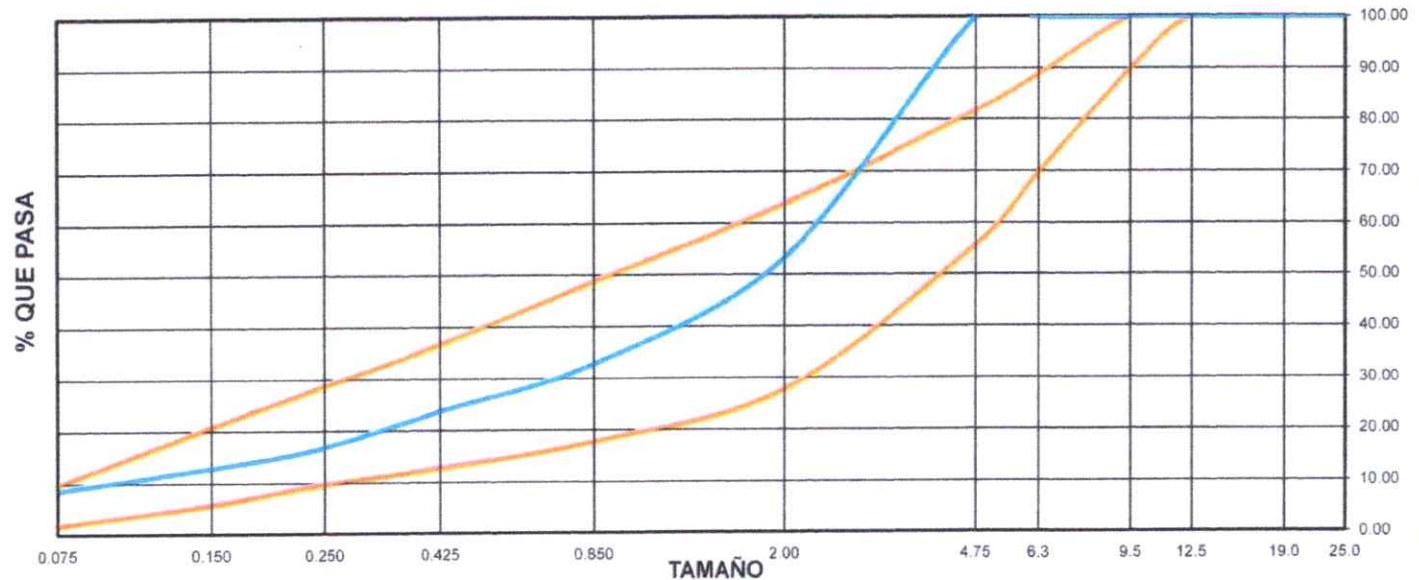

% QUE PASA

TAMAÑO

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :

Ninguna.

OBSERVACIONES :

Se informan resultados del material pétreo analizado para la elaboración de mezcla asfáltica para carpeta, el cual se considera adecuado para tal fin.

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

*Ensayo dentro del alcance de acreditación.

ASTM D4444-15	M-MMP-4-04-008/03	AASHTO T 104
ASTM C127-04	M-MMP-4-04-014/09	ASTM C 128
ASTM C 535	ASTM D2419-14	AASHTO T 304
ASTM D6929-17	ASTM C1252-17	M-MMP-4-04-009
M-MMP-4-04-005/02	TEX 438-A	ASTM C131

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :

SCT N-CMT-04-04/17 y E.P.

SIGNATARIO AUTORIZADO

Ing. Alejandro Chacón Serna

DOCUMENTO

31 ENE 2026

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-0977-183/18

OBRA : Trabajos diversos en la Ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua

No. DE INFORME :

2

FECHA INFORME :

2026-01-31

CIUDAD :

Chihuahua

ESTADO :

Chihuahua

CLAVE DE LA OBRA :

DM-NV-02/26

LOCALIZACIÓN : Planta de Mezclado en Periferico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. Ladrilleros Sur

CLIENTE : Construcciones Nirvana

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCION DEL MATERIAL : Pétreo para mezcla asfáltica T.N. 1/2" (Sello)

CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL : Roca de Origen Calizo

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : Trituración Total

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO (*) : Almacen en Planta de Mezclado

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO : Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih.

COMPOSICION GRANULOMETRICA (*)

M.V.S.S. (Kg/m³):		1 529	
MALLAS	% QUE PASA	PROYECTO	
1"	25.0	100.0	100-100
3/4"	19.0	100.0	100-100
1/2"	12.5	100.0	100-100
3/8"	9.5	100.0	90-100
1/4"	6.3	53.0	70-89
N° 4	4.75	23.0	56-82
N° 10	2.00	2.3	28-64
N° 20	0.850	0.0	18-49
N° 40	0.425	0.0	13-37
N° 60	0.250	0.0	10-29
N° 100	0.150	0.0	6-21
N° 200	0.075	0.0	2-10


GRAVA

DENSIDAD RELATIVA GRAVA	2.607	2 4 Min
DESGASTE DE LOS ANGELES %	23.5	30 % Max.
DESGASTE MICRODEVAL %	13.8	18 % Max.
INTEMPERISMO ACELERADO %	11.40	20% Max.
PART. ALARGADAS Y LAJEADAS %	5.1	10% Max. (ASTM)
PART. TRITURADAS 1 CARA %	100	95 % Min.
PART. TRITURADAS 2 O MAS CARAS %	100	85 % Min.
DESP. POR FRICCIÓN %	-	20% Max.
ABSORCIÓN %	0.91	---

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	-	2 4 Min
ANGULARIDAD %	-	45 % Min.
EQUIV. DE ARENA %	-	50 % Min.
AZUL DE METILENO, mg/g	-	15 Max.

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

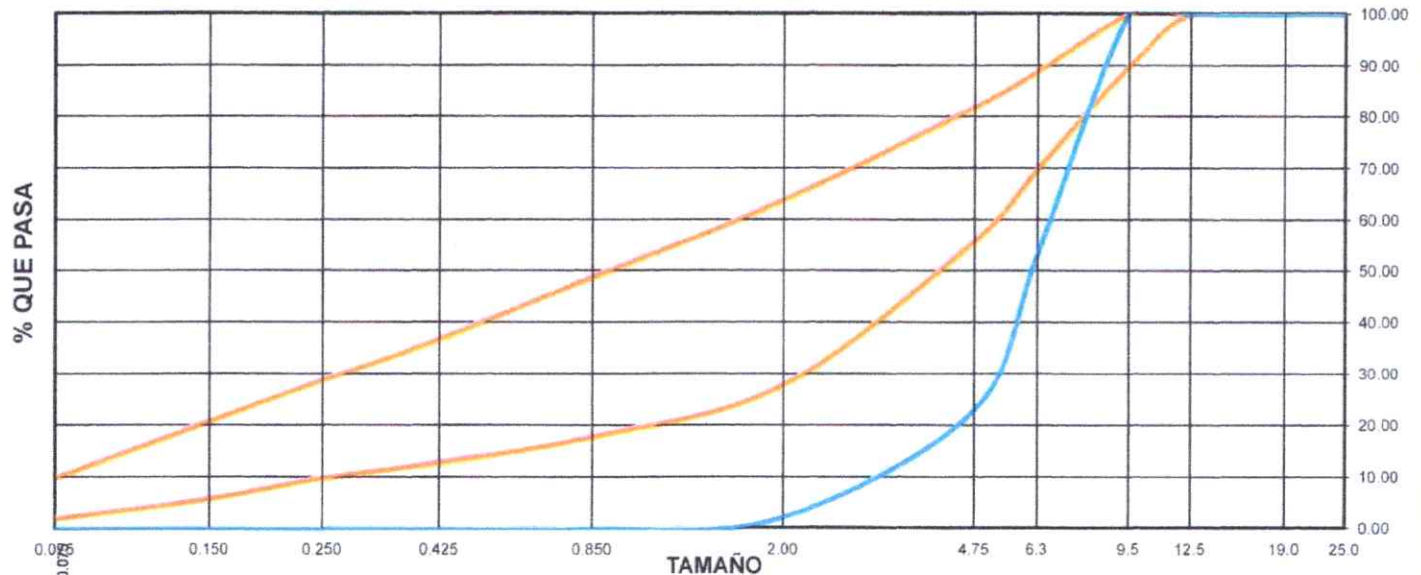

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :

Ninguna.

OBSERVACIONES :

Se informan resultados del material pétreo analizado para la elaboración de mezcla asfáltica para carpeta, el cual se considera adecuado para tal fin.

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

*Ensayo dentro del alcance de acreditación.

ASTM D5444-15 (7)	M-MMP-4-04-008/03	AASHTO T 104
ASTM C127-04	M-MMP-4-04-014/06	ASTM C 128
ASTM C 535	ASTM D2419 - 14	AASHTO T 304
ASTM D6928 - 17	ASTM C1252 - 17	M-MMP-4-04-009
M-MMP-4-04-005/02	TEX 435-A	ASTM C131

SIGNATARIO AUTORIZADO

Ino. Alejandro Chacon Serna

31 ENE 2026

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-0977-183/18

OBRA : Trabajos diversos en la Ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua

No. DE INFORME : 3

LOCALIZACIÓN : Planta de Mezclado en Periferico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. Ladrilleros Sur

FECHA INFORME : 2026-01-31

CIUDAD : Chihuahua

ESTADO : Chihuahua

CLIENTE : Construcciones Nirvana

CLAVE DE LA OBRA : DM-NV-02/26

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL : Pétreo para mezcla asfáltica T.N. 1/2" (Mezcla Teórica)

PROPORCIONES

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : Roca de Origen Calizo

65% Arena T.N. No. 10

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : Trituración Total

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO (*) : Almacén en Planta de Mezclado


35% Sello T.N. 1/4"

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO : Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih.

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA (*)

M.V.S.S. (Kg/m³)	1 616	
MALLAS	%QUE PASA	PROYECTO
1"	25.0	100.0
3/4"	19.0	100.0
1/2"	12.5	100.0
3/8"	9.5	100.0
1/4"	6.3	83.6
N° 4	4.75	73.1
N° 10	2.00	35.5
N° 20	0.850	21.5
N° 40	0.425	15.6
N° 60	0.250	11.1
N° 100	0.150	8.5
N° 200	0.075	5.8

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

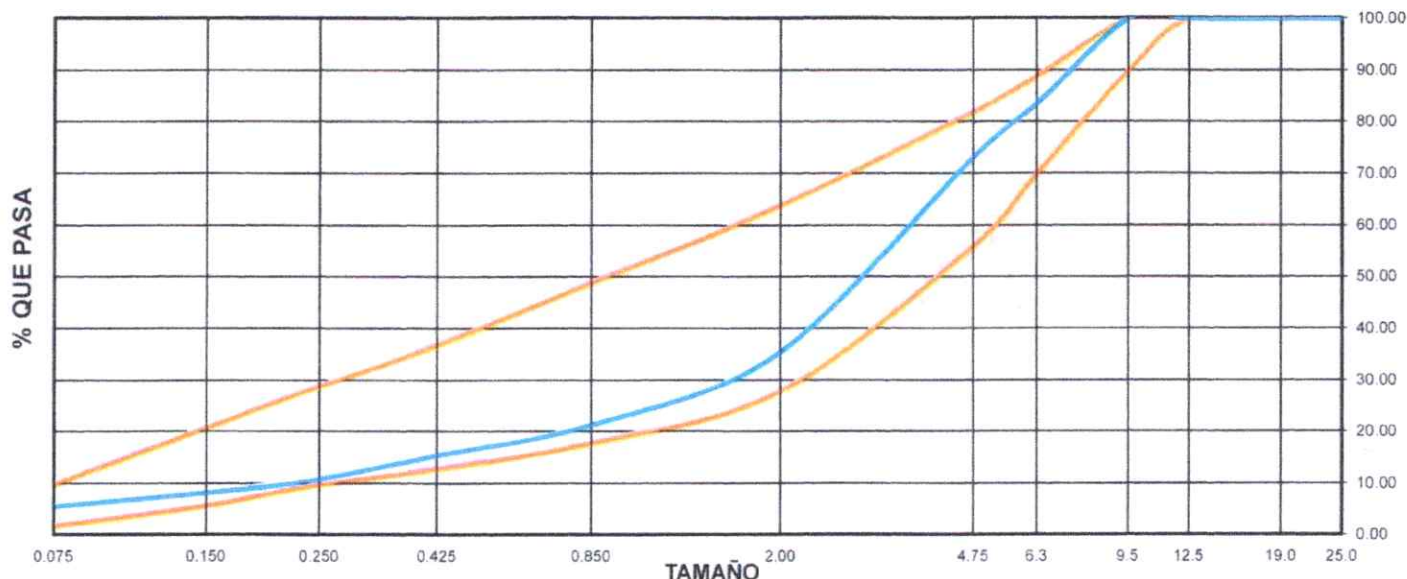

GRAVA

DENSIDAD RELATIVA GRAVA	-	2.4 Min.
DESGASTE DE LOS ANGELES %	-	30 % Max.
DESGASTE MICRODEVAL %	-	18 % Max.
INTEMPERISMO ACELERADO %	-	20% Max.
PART. ALARGADAS Y LAJEADAS %	-	10% Max. (ASTM)
PART. TRITURADAS 1 CARA %	-	95 % Min.
PART. TRITURADAS 2 O MAS CARAS %	-	85 % Min.
DESP. POR FRICCIÓN %	-	20% Max.
ABSORCIÓN %	-	---

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	-	2.4 Min.
ANGULARIDAD %	-	45 % Min.
EQUIV. DE ARENA %	-	50 % Min.
AZUL DE METILENO, mg/g	-	15 Max.

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) : El material pétreo resultante de la mezcla que se indica, se considera aceptable para emplearse en la determinación del C.O. de C.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :

SCT N-CMT-04-04/17 y E.P.

OBSERVACIONES :

Se hace notar que en la planta se deberá efectuar los ajustes necesarios para obtener esta curva granulométrica, por lo que los porcentajes que se indican de gravas y arenas pueden variar y serán los que en la planta se requieran para obtener una curva granulométrica similar a esta la cual se recomienda emplear como proyecto.

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

*Ensayo dentro del alcance de acreditación.

ASTM D5444-15 (*)	M-MMP-4-04-008/03	AASHTO T 104
ASTM C127-04	M-MMP-4-04-014/09	ASTM C 128
ASTM C 535	ASTM D2419 - 14	AASHTO T 304
ASTM C692B - 17	ASTM C1252 - 17	M-MMP 4-04-009
M-MMP-4-04-005/02	TEX 435-A	ASTM C131

SIGNATARIO AUTORIZADO

Ing. Alejandro Chacón Serna

31 ENE 2026

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-0977-183/18

OBRA : Trabajos diversos en la Ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua

No. DE INFORME :

4

FECHA INFORME :

2026-01-31

LOCALIZACIÓN : Planta de Mezclado en Periferico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. Ladrilleros Sur

CIUDAD :

Chihuahua

ESTADO :

Chihuahua

CLIENTE : Construcciones Nirvana

CLAVE DE LA OBRA :

DM-NV-02/26

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL : Pétreo para mezcla asfáltica T.N. 1/2" (Mezcla Práctica)

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL : Roca de Origen Calizo

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO : Trituración Total

CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO ⁽¹⁾ : Almacén en Planta de Mezclado

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO : Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih.

DATOS DEL MUESTREO

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA (*)

M.V.S.S. (Kg/m³):	1 710		
MALLAS	% QUE PASA	PROYECTO	
1"	25.0	100.0	100-100
3/4"	19.0	100.0	100-100
1/2"	12.5	100.0	100-100
3/8"	9.5	100.0	90-100
1/4"	6.3	83.0	70-89
Nº 4	4.75	75.0	56-82
Nº 10	2.00	33.0	28-64
Nº 20	0.850	20.0	18-49
Nº 40	0.425	14.0	13-37
Nº 60	0.250	11.0	10-29
Nº 100	0.150	7.0	6-21
Nº 200	0.075	5.2	2-10


GRAVA

DENSIDAD RELATIVA GRAVA	2.607	2.4 Min.
DESGASTE DE LOS ANGELES %	23.5	30 % Max.
DESGASTE MICRODEVAL %	13.8	18 % Max.
INTEMPERISMO ACELERADO %	11.40	20 % Max.
PART. ALARGADAS Y LAJEADAS %	5.1	10 % Max. (ASTM)
PART. TRITURADAS 1 CARA %	100	95 % Min.
PART. TRITURADAS 2 O MAS CARAS %	100	85 % Min.
DESP. POR FRICCIÓN %	-	20 % Max.
ABSORCIÓN %	0.91	---

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	2.562	2.4 Min.
ANGULARIDAD %	45.6	45 % Min.
EQUIV. DE ARENA %	63.4	50 % Min.
AZUL DE METILENO, mg/g	10	15 Max.

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

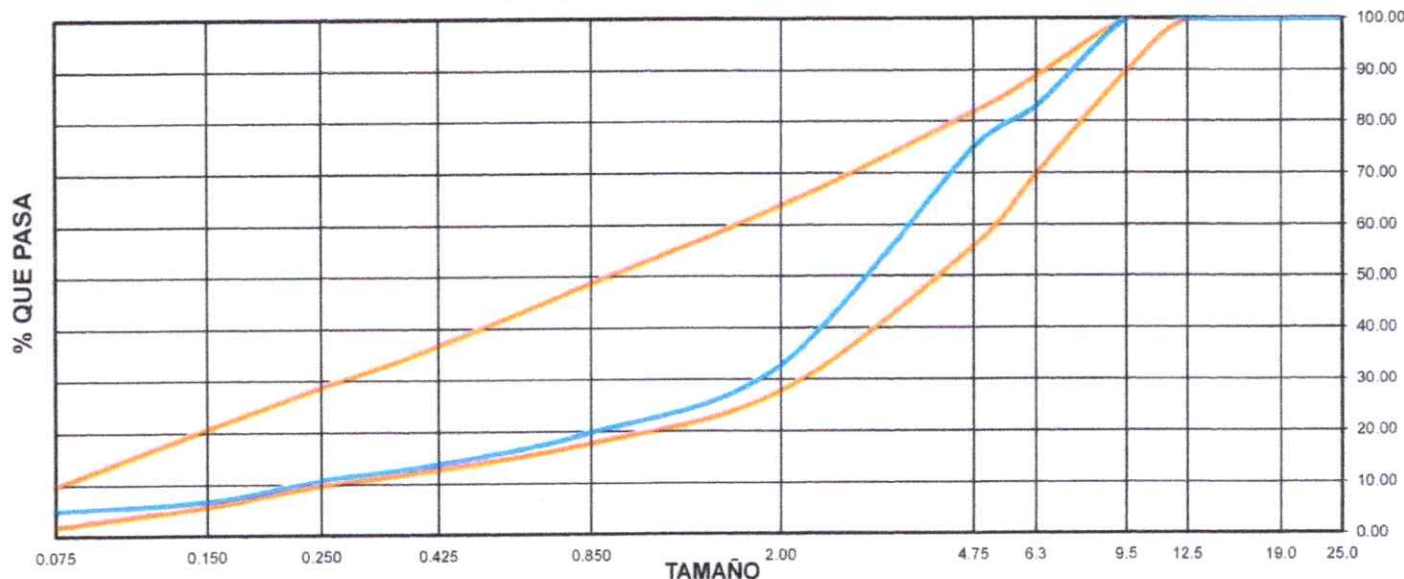

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :

El material pétreo resultante de la mezcla que se indica, se considera aceptable para emplearse en la determinación del C.O. de C.A.

OBSERVACIONES :

Se hace notar que en la planta se deberá efectuar los ajustes necesarios para obtener esta curva granulométrica, por lo que los porcentajes que se indican de gravas y arenas pueden variar y serán los que en la planta se requieran para obtener una curva granulométrica similar a esta la cual se recomienda emplear como proyecto.

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

*Ensayo dentro del alcance de acreditación.		
ASTM D5444-15 (7)	M-MMP-4-04-008/03	AASHTO T 104
ASTM C 127-04	M-MMP-4-04-014/09	ASTM C 128
ASTM C 535	ASTM D2419 - 14	AASHTO T 304
ASTM D6928 - 17	ASTM C 1252 - 17	M-MMP-4-04-009
M-MMP-4-04-005/02	TEX 436-A	ASTM C 131

SIGNATARIO AUTORIZADO

Ing. Alejandro Chacón Serna

31 ENE 2026

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-0977-183/18

	GEOPAV S.A. DE C.V.	CÓDIGO	GP-DCI-01
	DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO	VERSIÓN	00
	DENSIDAD APARENTE DEL MATERIAL PÉTREO POR INMERSIÓN EN CEMENTO ASFÁLTICO FLUIDIFICADO (DENSIDAD DEL CUERPO DE INGENIEROS)	PÁGINA	1. de 1.

OBRA / PROYECTO:	Trabajos diversos en la Ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua	No. DE INFORME:	5
LOCALIZACIÓN:	Planta de Mezclado en Periferico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. Ladrilleros Sur	FECHA DE INFORME:	2026-01-31
CONSTRUCTORA:	Construcciones Nirvana	CIUDAD:	Chihuahua
		ESTADO:	Chihuahua
		CVE. DE LA OBRA:	DM-NV-02/26


IDENTIFICACIÓN	
BANCO DE MATERIAL PÉTREO :	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih.
TIPO DE ASFALTO :	PG 64-22 RN1

Muestra No.	Wp (g)	W'a (g)	W'ap (g)	Sp
1	1 198.6	458.6	1 211.3	2.688
2	1 199.1	463.1	1 215.7	2.686
3	1 198.3	460.7	1 212.8	2.686
4	1 199.4	457.3	1 209.9	2.684

$Sp = \frac{Wp}{Wp - (W'ap - W'a)}$	DENSIDAD PROMEDIO ($\bar{Sp}$)
	2.686

DONDE:	
Sp	Densidad aparente del material pétreo por inmersión en cemento asfaltico fluidificado o Densidad del Cuerpo de Ingenieros.
Wp	Peso del material pétreo seco (g)
W'ap	Peso del recipiente con asfalto, varilla y material pétreo, sumergidos en agua. (g)
W'a	Peso del recipiente con asfalto y varilla, sumergidos en agua. (g)

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :	OBSERVACIONES :
Ninguna.	Se informan resultados obtenidos de los ensayos realizados.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :	
Ninguna.	
NORMA DE REFERENCIA (MÉTODO) :	
M-MMP-4-04-015/15	

SIGNATARIO AUTORIZADO
 Ing. Alejandro Chacón Serna



OBRA: Trabajos diversos en la Ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua.

No. DE INFORME

6

LOCALIZACIÓN: Planta de Mezclado en Periferico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. Ladrilleros Sur.

FECHA DE MUESTREO

2026-01-31

CLIENTE: Construcciones Nirvana.

CLAVE DE LA OBRA

DM-NV-02/26

MEZCLA DE MATERIAL PÉTREO	MAT. ASFALTICO: PG 64-22 RN1	ESPECIFICACIÓN	ESTABILIDAD (kg):	817	TIPO DE MATERIAL:	Mezcla Asfaltica Densa
65% Arena T.N. No. 10	ADITIVO:		VACIOS (%):	3.0 a 5.0	PROCEDENCIA:	Materiales Industriales GCC
35% Sello T.N. 1/4"	PROPORCIÓN:		FLUJO (mm):	2.0 a 3.5	Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih.	
-	COMPACTADO CON:		VAM (%):	14 MIN.		
-	TEMPERATURA:		VFA (%):	65 a 75		
					T.N.:	3/8"

DENSIDAD CPO INGENIEROS (DMP):	2.686	DENSIDAD DEL PARAFILM (DP):	0.81	DENSIDAD CEM. ASF. (DCA):	1.029	CONSTANTE DEL ANILLO (CTE):	1
--------------------------------	-------	-----------------------------	------	---------------------------	-------	-----------------------------	---

PROBETA No.	% C.A.		PESO (g)			VOLUMETRÍA						ESTABILIDAD (kg)					FLUJO	
	AGR	MEZCLA	AIRE	AIRE C/REC	REC. EN AGUA	Gmb ⁽¹⁾ (Kg/m ³)	C.A.	MAT PÉTREO	VACIO	VAM	VFA	MICROM	ESTAB.	ALTURA	FACTOR CORREC	ESTABILIDAD CORREGIDA	0.01"	mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J'	K	L	M	N	O	P	Q
		$\frac{(A)}{100 + (A)} \cdot 100$			(C)-(D)	$\frac{C}{(D-E) - \left(\frac{D-E}{DCA}\right)}$	$\frac{(B) \cdot (F)}{DCA}$	$\frac{(100-B) \cdot (F)}{DMP}$	$100 - (G) - (H)$	$100 - (J)$	$\frac{(J) - (I) \cdot 100}{J}$		(K) * CTE		TABLA	(L) * (N)		
1	4.00	3.85	1 134.3	1 136.8	649.8	2 344	8.8	83.9	7.3	16.1	54.5	804	804	6.43	0.980	788		1.93
2	4.00	3.85	1 136.1	1 139.4	651.0	2 346	8.8	84.0	7.3	16.0	54.7	801	801	6.45	0.975	781		1.89
3	4.00	3.85	1 136.1	1 140.3	650.4	2 344	8.8	83.9	7.3	16.1	54.4	798	798	6.40	0.988	788		1.87
	4.00	3.85	1 135.5	1 138.8	650.4	2 345	8.8	83.9	7.3	16.1	54.5	801	801	6.43	0.981	786		1.90
4	4.50	4.31	1 140.4	1 142.9	655.9	2 357	9.9	84.0	6.2	16.0	61.5	901	901	6.39	0.990	892		2.33
5	4.50	4.31	1 141.3	1 144.6	657.6	2 363	9.9	84.2	5.9	15.8	62.6	897	897	6.40	0.988	886		2.25
6	4.50	4.31	1 139.4	1 143.6	654.1	2 353	9.8	83.8	6.3	16.2	60.8	895	895	6.42	0.983	879		2.33
	4.50	4.31	1 140.4	1 143.7	655.9	2 358	9.9	84.0	6.1	16.0	61.6	898	898	6.40	0.987	886		2.30
7	5.00	4.76	1 146.4	1 149.0	662.4	2 372	11.0	84.1	4.9	15.9	69.0	939	939	6.39	0.990	930		2.89
8	5.00	4.76	1 143.8	1 147.1	661.3	2 374	11.0	84.2	4.8	15.8	69.5	945	945	6.38	0.993	938		2.93
9	5.00	4.76	1 145.3	1 148.3	661.3	2 370	11.0	84.0	5.0	16.0	68.7	939	939	6.40	0.988	927		2.88
	5.00	4.76	1 145.2	1 148.1	661.7	2 372	11.0	84.1	4.9	15.9	69.0	941	941	6.39	0.990	932		2.90
10	5.50	5.21	1 148.6	1 151.9	664.9	2 378	12.0	83.9	4.0	16.1	75.0	987	987	6.36	0.998	985		3.48
11	5.50	5.21	1 146.5	1 150.2	664.2	2 381	12.1	84.0	3.9	16.0	75.6	986	986	6.35	1.000	986		3.52
12	5.50	5.21	1 147.4	1 150.8	664.4	2 379	12.1	84.0	4.0	16.0	75.2	983	983	6.34	1.003	985		3.49
	5.50	5.21	1 147.5	1 151.0	664.5	2 380	12.1	84.0	4.0	16.0	75.3	985	985	6.35	1.000	985		3.50
13	6.00	5.66	1 150.0	1 153.3	664.2	2 371	13.0	83.3	3.7	16.7	78.0	977	977	6.36	0.998	975		4.68
14	6.00	5.66	1 149.7	1 152.4	664.4	2 372	13.0	83.3	3.6	16.7	78.2	979	979	6.31	1.010	989		4.76
15	6.00	5.66	1 149.3	1 152.8	664.5	2 375	13.1	83.4	3.5	16.6	78.7	983	983	6.35	1.000	983		4.73
	6.00	5.66	1 149.7	1 152.8	664.4	2 373	13.1	83.3	3.6	16.7	78.3	980	980	6.34	1.003	982		4.72
16	6.50	6.10	1 151.5	1 154.6	664.8	2 369	14.1	82.8	3.1	17.2	81.9	893	893	6.34	1.003	895		5.49
17	6.50	6.10	1 148.8	1 152.3	663.5	2 371	14.1	82.9	3.0	17.1	82.2	887	887	6.32	1.008	894		5.51
18	6.50	6.10	1 150.6	1 154.4	664.0	2 369	14.1	82.8	3.1	17.2	81.7	893	893	6.31	1.010	902		5.53
	6.50	6.10	1 150.3	1 153.8	664.1	2 370	14.1	82.8	3.1	17.2	81.9	891	891	6.32	1.007	897		5.51

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):

OBSERVACIONES:

N/A

Se informan resultados obtenidos de los ensayos realizados a los especímenes de prueba.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Ninguna.

SIGNATARIO AUTORIZADO

Ing. Alejandro Chacon Serna

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-0977-183/18




GEOPAV S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO
DISEÑO MARSHALL

CÓDIGO GP-DM-01
VERSIÓN 01
PÁGINA 1. de 1.

OBRA:	Trabajos diversos en la Cd. de chihuahua.	No. DE INFORME:	7
LOCALIZACIÓN:	Planta de mezclado en periférico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. ladrilleros sur.	FECHA DE INFORME:	2026-01-31
CLIENTE:	Construcciones Nirvana	CIUDAD / ESTADO:	Chihuahua
		CLAVE DE LA OBRA:	DM-NV-02/26
MATERIAL PARA CAPA:	Mezcla asfáltica para carpeta asfáltica	T.N.:	3/8"
UBICACIÓN DE PLANTA:	Periférico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. ladrilleros sur.	ESTUDIO:	(x)
UBICACIÓN DEL BANCO:	Materiales Industriales Gcc Nombre de Dios	REVISIÓN:	()

PROPORCIONES DE MATERIAL PÉTREO:	65% 35% -	Arena T.N. No. 10 Sello T.N. 1/4" -	TIPO DE ASFALTO:	PG 64-22 RN1
----------------------------------	-----------------	---	------------------	--------------

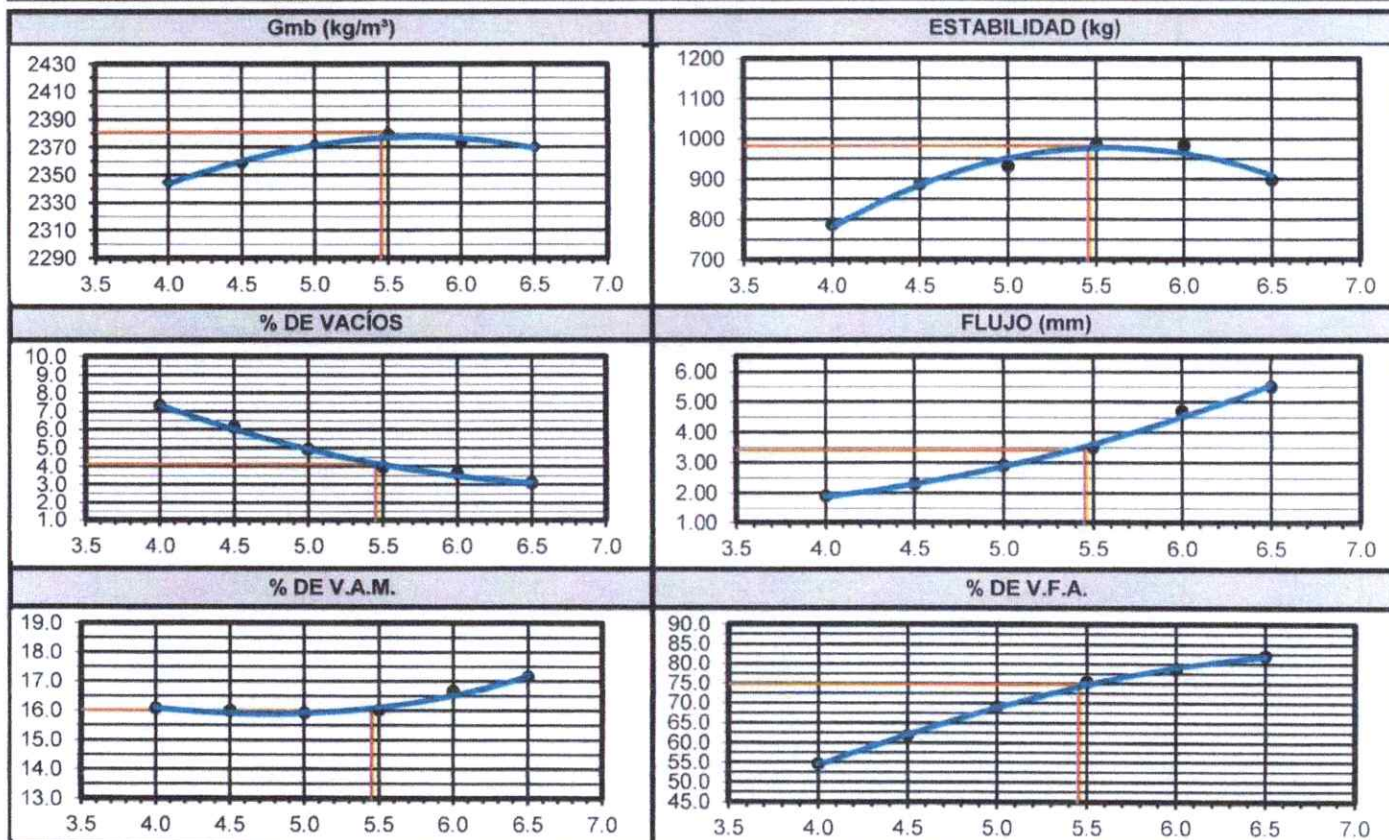

CARACTERÍSTICA	RESULTADO OBTENIDO	ESPECIFICACIONES	OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):
(*) ÓPTIMO CON RESPECTO AL AGREGADO PÉTREO (%)	5.45	± 0.15%	N/A
ÓPTIMO CON RESPECTO A LA MEZCLA INFORMATIVO (%)	5.17	± 0.15%	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Gmb (kg/m³)	2 381	-	N-CMT-04-04/17, SCT N-CMT-4-05-003-16 y E.P.
ESTABILIDAD (kg)	982	817	NORMA DE REFERENCIA (MÉTODO):
FLUJO (mm)	3.4	2 a 3.5	SCT: 012-D.05
Va (%)	4.1	3 A 5	OBSERVACIONES:
V.A.M. (%)	16.0	14 MIN	Se informan las gráficas de diseño obtenidas del análisis de muestras elaboradas en laboratorio, con diferentes contenidos de cemento asfáltico, de las cuales se determina el % óptimo que deberá ser incorporado en la elaboración de mezcla asfáltica en planta estacionaria. (*) Este % de cemento asfáltico será el que deberá adicionarse a la mezcla.
V.F.A. (%)	74.7	65 A 75	
CONSUMO DE C.A. (kg/m³)	116.90	-	
SIGNATARIO AUTORIZADO			
Ing. Alejandro Chacón Serna			

	GEOPAV S.A. DE C.V.	CÓDIGO	GP-DPF-01
	DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO	VERSIÓN	01
	AFINIDAD PETREO-ASFALTO DESPRENDIMIENTO POR FRICCIÓN	PÁGINA	1. de 1.


OBRA :	Trabajos diversos en la Ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua	No. DE INFORME :	8
LOCALIZACIÓN :	Planta de mezclado en periférico Vicente Lombardo Toledano S/N, Col. Iadrilleros sur.	FECHA DE INFORME :	2026-01-31
CLIENTE :	Construcciones Nirvana	CIUDAD :	Chihuahua
		ESTADO :	Chihuahua
		CLAVE DE LA OBRA :	NV-02/26

BANCO DE MATERIAL PÉTREO :	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih.
TIPO DE MATERIAL PÉTREO :	Roca de Origen Calizo
PROVEEDOR DE LIGANTE ASF. :	Asfaltos de la Frontera
TIPO DE LIGANTE ASFALTICO :	PG 64-22 RN1

PROPORCIÓN %	FRACCIÓN DE AGREGADO PÉTREO
65%	Arena T.N. No. 10
35%	Sello T.N. 1/4"
-	-

ESPECIMEN	% DE ADITIVO	% DE DESPRENDIMIENTO	% PROMEDIO DE DESPRENDIMIENTO
1	SIN ADITIVO	13	13
2	SIN ADITIVO	12	
3	SIN ADITIVO	13	

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :	OBSERVACIONES :
N/A	Se informan resultados obtenidos de los ensayos realizados.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :	
Norma de referencia : M-CMT-4-04/17 Menor a 20%	

SIGNATARIO AUTORIZADO
 Ing. Alejandro Chacón Serna





ASJ CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y LABORATORIO CERTIFICADO DE CALIDAD

INFORME DE PRUEBAS DE CEMENTO ASFALTICO

EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65

OBRA: CALLE POLITECNICO	ENSAYE No: 305
CLIENTE: LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FECHA DE INFORME: 08/08/2026
CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE ENTREGA: 11/08/2026
ESTADO: CHIHUAHUA	NUMERO DE REMISION: 1732

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO	CADEREYTA, .N.L.
TIPO DE PRODUCTO: INDICADO EN LA REMISION	ECR-65
DEPOSITO MUESTREADO	TANQUE No 6

ESPECIFICACION REQUERIDA	RESULTADOS	ESPECIFICACION
PRUEBAS A LA EMULSION ASFALTICA	ASJ	SCT
Viscosidad SAYBOL - FUROL a 50° C, segundos	43	30
Residuo de destilación, por ciento en peso mínimo	65.4	65
Retenido en la malla No. 20 % max.	0.02	0.10
Asentamiento en 5 dias, diferencia en por ciento máximo	0	5
Carga de la partícula	Positiva	Positiva
Disolvente en volumen	0	3
PRUEBAS EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION		
Penetración 25° C, 100 g, segundos, grados	65	40 - 100
Solubilidad tetracloruro de carbono, por ciento mínimo	98	97
Ductilidad, 25° C cm. Mínimo	93	40

NOTAS:

LA EMULSION CUMPLE CON LA ESPECIFICACION

ING. J. VICENTE GAMON I.
LABORATORIO



ASJ CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y LABORATORIO CERTIFICADO DE CALIDAD

INFORME DE PRUEBAS DE CEMENTO ASFALTICO

EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65

OBRA: CALLE POLITECNICO	ENSAYE No: 305
CLIENTE: LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FECHA DE INFORME: 08/08/2026
CIUDAD: CHIHUAHUA	FECHA DE ENTREGA: 11/08/2026
ESTADO: CHIHUAHUA	NUMERO DE REMISION: 1732

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO	CADEREYTA, .N.L.
TIPO DE PRODUCTO: INDICADO EN LA REMISION	ECR-65
DEPOSITO MUESTREADO	TANQUE No 6

ESPECIFICACION REQUERIDA	RESULTADOS	ESPECIFICACION
PRUEBAS A LA EMULSION ASFALTICA	ASJ	SCT
Viscosidad SAYBOL - FUROL a 50° C, segundos	43	30
Residuo de destilación, por ciento en peso mínimo	65.4	65
Retenido en la malla No. 20 % max.	0.02	0.10
Asentamiento en 5 dias, diferencia en por ciento máximo	0	5
Carga de la partícula	Positiva	Positiva
Disolvente en volumen	0	3
PRUEBAS EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION		
Penetración 25° C, 100 g, segundos, grados	65	40 - 100
Solubilidad tetracloruro de carbono, por ciento mínimo	98	97
Ductilidad, 25° C cm. Mínimo	93	40

NOTAS:

LA EMULSION CUMPLE CON LA ESPECIFICACION

ING. J. VICENTE GAMON I.
LABORATORIO



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OFICIO No. 1

Chihuahua, Chih., a 17 de Agosto de 2026

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente me permito enviar a Usted, resultados obtenidos en ensayos de laboratorio efectuados en:

OBRA: Pavimentación a Base de Carpeta Asfáltica.
LOCALIZACION: Rancho Guadalupe (PP-178-2026)

CONTENIDO DEL OFICIO
COMPACTACIONES

06/08/2026	7
11/08/2026	3
14/08/2026	5
17/08/2026	3

TOTAL 18

Sin otro asunto de momento, quedo de Usted.

Atentamente,
GERENTE GENERAL


ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 06/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 90% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE TERRENO NATURAL

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
					TRAMO 1 0+100 AL 0+335				
		DER	20	1840	1878	1734	12.9	8.3	94
		CEN	20	1840	1850	1707	12.9	8.4	93
		IZQ	20	1840	1857	1713	12.9	8.4	93
		DER	20	1840	1835	1696	12.9	8.2	92
		CEN	20	1840	1811	1680	12.9	7.8	91
					TRAMO 2 0+000 AL 0+025				
		DER	20	1840	1840	1699	12.9	8.3	92
					TRAMO 3 0+000 AL 0+026				
		IZQ	20	1840	1861	1715	12.9	8.5	93

15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO
06-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 11/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 90% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE TERRENO NATURAL

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1840	1814	1672	12.9	8.5	91
		CEN	20	1840	1788	1654	12.9	8.1	90
		IZQ	20	1840	1825	1691	12.9	7.9	92

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

11-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 14/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 100% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE HIDRAULICA

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.	
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR		
					TRAMO 1 0+100 AL 0+235					
		DER	20	1920	2058	1929	12.7	6.7	100	
		CEN	20	1920	2067	1943	12.7	6.4	101	
		IZQ	20	1920	2039	1907	12.7	6.9	100	
					TRAMO 2 0+000 AL 0+025					
		DER	20	1920	2091	1963	12.9	6.5	102	
					TRAMO 3 0+000 AL 0+026					
		IZQ	20	1920	2076	1940	12.9	7.0	101	
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCFE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR										

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

14-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 17/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 100% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE HIDRAULICA

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1920	TRAMO 4 0+000 AL 0+027 2115	1980	12.7	6.8	103
		CEN	20	1920	TRAMO 5 0+000 AL 0+027 2055	1935	12.7	6.2	101
		IZQ	20	1920	TRAMO 6 0+000 AL 0+056 2084	1955	12.7	6.6	102

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

17-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OFICIO No. 1

Chihuahua, Chih., a 17 de Agosto de 2026

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente me permito enviar a Usted, resultados obtenidos en ensayos de laboratorio efectuados en:

OBRA: Pavimentación a Base de Carpeta Asfáltica.
LOCALIZACION: Rancho Guadalupe (PP-178-2026)

CONTENIDO DEL OFICIO
COMPACTACIONES

06/08/2026	7
11/08/2026	3
14/08/2026	5
17/08/2026	3

TOTAL 18

Sin otro asunto de momento, quedo de Usted.

Atentamente,
GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 06/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 90% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE TERRENO NATURAL

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.	
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR		
					TRAMO 1 0+100 AL 0+335					
		DER	20	1840	1878	1734	12.9	8.3	94	
		CEN	20	1840	1850	1707	12.9	8.4	93	
		IZQ	20	1840	1857	1713	12.9	8.4	93	
		DER	20	1840	1835	1696	12.9	8.2	92	
		CEN	20	1840	1811	1680	12.9	7.8	91	
					TRAMO 2 0+000 AL 0+025					
		DER	20	1840	1840	1699	12.9	8.3	92	
					TRAMO 3 0+000 AL 0+026					
		IZQ	20	1840	1861	1715	12.9	8.5	93	

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO
06-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 11/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 90% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE TERRENO NATURAL

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1840	1814	1672	12.9	8.5	91
		CEN	20	1840	1788	1654	12.9	8.1	90
		IZQ	20	1840	1825	1691	12.9	7.9	92

FORMA 02 REV. 02 04 DE FEBRERO DE 2013

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

11-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 14/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 100% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE HIDRAULICA

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
					TRAMO 1 0+100 AL 0+235				
		DER	20	1920	2058	1929	12.7	6.7	100
		CEN	20	1920	2067	1943	12.7	6.4	101
		IZQ	20	1920	2039	1907	12.7	6.9	100
					TRAMO 2 0+000 AL 0+025				
		DER	20	1920	2091	1963	12.9	6.5	102
					TRAMO 3 0+000 AL 0+026				
		IZQ	20	1920	2076	1940	12.9	7.0	101
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR									

FORMA 02 REV 02 04 DE FEBRERO DE 2013

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

14-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 17/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 100% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE HIDRAULICA

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1920	TRAMO 4 0+000 AL 0+027 2115	1980	12.7	6.8	103
		CEN	20	1920	TRAMO 5 0+000 AL 0+027 2055	1935	12.7	6.2	101
		IZQ	20	1920	TRAMO 6 0+000 AL 0+056 2084	1955	12.7	6.6	102

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

17-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA		FECHA DE INFORME:	01/09/2026
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)		FOLIO DE INFORME:	GUADALUPE 1-A
CLIENTE Y DIRECCION: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC		FECHA DE RECEPCION:	26/08/2026
CALLE RIO MADEIRA No. 2026 COL. RIBERAS DE SACRAMENTO I Y II CHIHUAHUA, CHIH			
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.		1-A	
TOMADA DE: GUARNICIONES EN TRAMO 1			
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kgf/cm ²)	200		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	28		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	30		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	S/A		
* Métodos de prueba acreditados ante la ena Norma únicamente de referencia * Métodos de apoyo no acreditados			
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION REVOLVEDOR AMERICAS OESTE	CEMENTO	CPC 30-R
REMISION	SIN REMISION	REVENIMIENTO (cm)	12.0
FORMA DE COMPACTACION	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACION	GUADALUPE 1-A		
DIAMETRO (cm)	9.95		
ALTURA (cm)	20.05		
AREA (cm ²)	77.76		
FECHA DE COLADO	25/08/2026		
FECHA DE RUPTURA	01/09/2026		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA (kgf)	12200		
CARGA DE RUPTURA (kN)	119.6		
RESISTENCIA (kgf/cm ²)	156.9		
RESISTENCIA MPa	15.4		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	78.4		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
SE REPORTA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN LOS TELEFONOS (614)410-60-32, Y EN EL CORREO ELECTRONICO: faustolaboratorio@hotmail.com			
ELABORO:		AUTORIZO:	
CINTHIA ALEJANDRA GONZALEZ REYES		ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	
Laboratorio de Ensayo acreditado por ema, a.c. con acreditación No. C-1141-214/19 IECH-CCYSISA-02			
PÁGINA 1 DE 1			



INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA		FECHA DE INFORME:	04/09/2026
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)		FOLIO DE INFORME:	GUADALUPE 2-A
CLIENTE Y DIRECCION: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC		FECHA DE RECEPCION:	29/08/2026
CALLE RIO MADEIRA No. 2026 COL. RIBERAS DE SACRAMENTO I Y II CHIHUAHUA, CHIH			
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
MUESTRA No.		2-A	
TOMADA DE: GUARNICIONES EN TRAMO 2 Y 3			
DATOS DE PROYECTO			
f'c (kgf/cm2)	200		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12±2		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	29		
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	30		
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19		
ADITIVO	S/A		
* Métodos de prueba acreditados ante la emi Norma únicamente de referencia * Métodos de apoyo no acreditados			
DATOS DE LA OBRA			
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION REVOLVEDOR AMERICAS OESTE	CEMENTO	CPC 30-R
REMISION	SIN REMISION	REVENIMIENTO (cm)	11.0
FORMA DE COMPACTACION	VARILLADO ☒	VIBRADO ☐	
DATOS DEL ESPECIMEN			
IDENTIFICACION	GUADALUPE 2-A		
DIAMETRO (cm)	10.00		
ALTURA (cm)	20.00		
AREA (cm²)	78.54		
FECHA DE COLADO	28/08/2026		
FECHA DE RUPTURA	04/09/2026		
EDAD (DIAS)	7		
DATOS DEL ENSAYE			
TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL		
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO		
CARGA DE RUPTURA (kgf)	11650		
CARGA DE RUPTURA (kN)	114.2		
RESISTENCIA (kgf/cm²)	148.3		
RESISTENCIA MPa	14.5		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	74.2		
TIPO DE FALLA	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
SE REPORTA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD.			
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO			
PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN LOS TELEFONOS (614)410-60-32, Y EN EL CORREO ELECTRONICO: faustolaboratorio@hotmail.com			
ELABORO:		AUTORIZO:	
CINTHIA ALEJANDRA GONZALEZ REYES		ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	
Laboratorio de Ensayo acreditado por emi, a.c. con acreditación No. C-1141-214/19			
IECH-CCYSISA-02			
PÁGINA 1 DE 1			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OFICIO No. 1

Chihuahua, Chih., a 17 de Agosto de 2026

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente me permito enviar a Usted, resultados obtenidos en ensayos de laboratorio efectuados en:

OBRA: Pavimentación a Base de Carpeta Asfáltica.
LOCALIZACION: Rancho Guadalupe (PP-178-2026)

CONTENIDO DEL OFICIO COMPACTACIONES	
06/08/2026	7
11/08/2026	3
14/08/2026	5
17/08/2026	3
TOTAL 18	

Sin otro asunto de momento, quedo de Usted.

Atentamente,
GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 06/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 90% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE TERRENO NATURAL

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER CEN IZQ DER CEN	20	1840	TRAMO 1 0+100 AL 0+335			8.3 8.4 8.4 8.2 7.8	94 93 93 92 91
					1878	1734	12.9		
					1850	1707	12.9		
					1857	1713	12.9		
					1835	1696	12.9		
		DER	20	1840	TRAMO 2 0+000 AL 0+025			8.3	92
					1840	1699	12.9		
		IZQ	20	1840	TRAMO 3 0+000 AL 0+026			8.5	93
					1861	1715	12.9		

MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-418-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 MÉTODO CON DENSÍMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES: LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO
06-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 11/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 90% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE TERRENO NATURAL

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1840	TRAMO 4 0+000 AL 0+027 1814	1672	12.9	8.5	91
		CEN	20	1840	TRAMO 5 0+000 AL 0+027 1788	1654	12.9	8.1	90
		IZQ	20	1840	TRAMO 6 0+000 AL 0+056 1825	1691	12.9	7.9	92

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.
OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO
11-ago-26

TECNICO: ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

COMPACTACION DE PROYECTO	100%	ESPESOR DE PROYECTO	20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE HIDRAULICA			

[illegible]

MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003

MEJORES DE PRUEBA NORMALIZADOS A LOS ELEMENTOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO. LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS

CPN 2

14-ago-26

AUTOPRIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: RANCHO GUADALUPE (PP-178-2026)

FECHA 17/08/2026

COMPACTACION DE PROYECTO 100% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE HIDRAULICA

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	20	1920	TRAMO 4 0+000 AL 0+027 2115	1980	12.7	6.8	103
		CEN	20	1920	TRAMO 5 0+000 AL 0+027 2055	1935	12.7	6.2	101
		IZQ	20	1920	TRAMO 6 0+000 AL 0+056 2084	1955	12.7	6.6	102
FORMA 02 REV. 02 04 DE FEBRERO DE 2013									


METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCC-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.
OBSERVACIONES: LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO
17-ago-26

TECNICO : ROSENDO CARREON

AUTORIZO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ
GERENTE GENERAL



DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO

INFORME DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA (MARSHALL)

Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Escudero entre Av. Independencia y Av. Universidad

LOCALIZACIÓN: Calle Escudero entre Av. Independencia y Av. Univesidad

CLIENTE: Nirvana construcciones

DESCRIPCION DEL MATERIAL : Mezcla asfáltica de tamaño nominal de 9.5 mm

PARA USARSE EN: **Carpeta asfáltica (franja derecha)**


TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO:	Mezclado en planta
---------------------------------	--------------------

Muestra tomada por el cliente

PROCEDENCIA DEL MATERIAL PÉTREO: **Materiales Industriales GCC**

COMPOSICION GRANULOMETRICA (%)		M.V.S. Kg/m ³	MALLAS		%QUE PASA	PROYECTO
1"	25.0		100	100-100		
3/4"	19.0		100	100-100		
1/2"	12.5		100	100-100		
3/8"	9.5		100	90-100		
1/4"	6.3		86	70-89		
Nº 4	4.75		79	56-82		
Nº 10	2.00		37	28-64		
Nº 20	0.850		22	18-49		
Nº 40	0.425		14	13-37		
Nº 60	0.250		11	10-29		
Nº 100	0.150		7	6-21		
Nº 200	0.075		2.6	2-10		

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

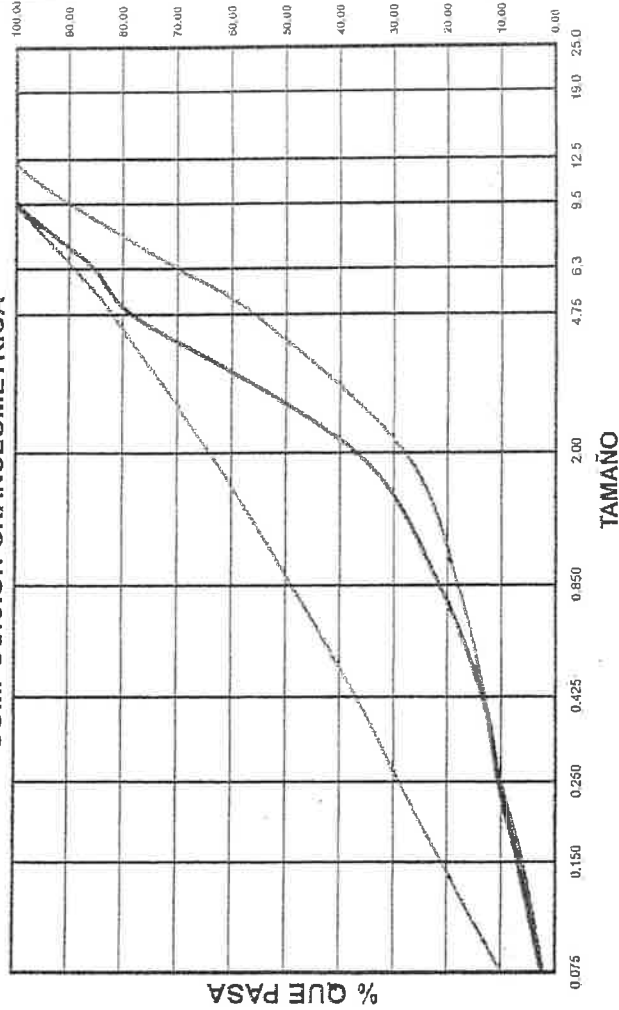

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :

NINGLINA

OBSERVACIONES:

SE INFORMA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :

SIGNATARIO AUTORIZADO

ING. VICTOR ALEJANDRO REED ORTEGA

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUELLE O SUGERENCIA ESTADOS A SU DISPOSICION EN EL TELEFONO 04119759257, EN EL CORREO ELECTRONICO gozar.telesigra@cel.ve O EN LA CALLE J VELÁZQUEZ DE TEJON, 5172, COL. GRADINAS, UNIVERSIDAD LA REPUBLICA, CARACAS, VENEZUELA. C.V.

OBRA :	Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle escudero entre Av. Independencia y Av. Universidad
LOCALIZACIÓN :	Calle Escudero entre Av. Independencia y Av. Universidad
CLIENTE :	Nirvana construcciones
No. DE INFORME :	6
FECHA INFORME :	2023-08-25
CIUDAD :	Chihuahua
ESTADO :	Chihuahua
CLAVE DE LA OBRA :	15.0

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL :	Mezcla asfáltica de tamaño nominal de 9.5 mm
PARA USARSE EN :	Carpeta asfáltica (franja izquierda)
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO :	Mezclado en planta
CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO (1) :	Muestra tomada por el cliente
PROCEDENCIA DEL MATERIAL PÉTREO :	Materiales Industriales GCC


COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA (4)	M.V.S. Kg/m ³		PROYECTO	
	MALLAS	% QUE PASA	100	100-100
	1"	25.0	100	100-100
	3/4"	19.0	100	100-100
	1/2"	12.5	100	100-100
	3/8"	9.5	100	90-100
	1/4"	6.3	89	70-89
	N° 4	4.75	76	56-92
	N° 10	2.00	43	28-64
	N° 20	0.850	20	18-49
	N° 40	0.425	12	13-37
	N° 60	0.250	9	10-29
	N° 100	0.150	7	6-21
	N° 200	0.075	6.1	2-10
N° DE MUESTRA				
1				

HORA :	
TEMPERATURA :	
OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :	
NINGUNA	

OBSERVACIONES :	SE INFORMA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA ANALIZADA.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :	

SIGNATARIO AUTORIZADO	
ING. VÍCTOR ALEJANDRO REED ORTEGA	

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

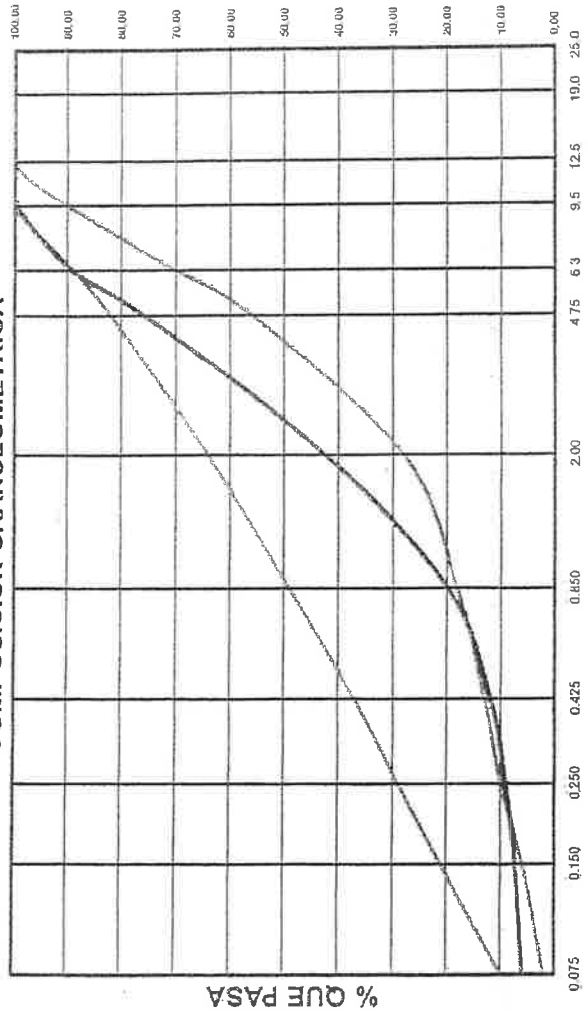

TAMAÑO

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECÍMEN		ESPECIFICACIÓN
Gmb (2) Kg/m ³	2.374	
ESTABILIDAD, Kg	1.138	117 MIN
FLUJO, mm	3.7	2 A 3.5
V.A. %	2.4	3 A 5
V.A.M. %	16.3	13 MIN
V.F.A. %	85.3	65 A 75
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		DEL PROYECTO
C.A. CON RESPECTO A LA MEZCLA (3) %	6.05	5.17 A 0.15
C.A. CON RESPECTO AL AGREGADO (3) %	6.44	5.45 A 0.15
NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)		
(1, 2, 3, 4) - Ensayo dentro del alcance de acreditación.		
ASTM D970-16 (1) ASTM D8926 - 20		
ASTM D1188-15 (2) AASHTO T 209		
ASTM D2172-17 (3) ASTM C702 - 11		
ASTM D5444-15 (4) ASTM D3549-11		
ASTM D2726-14 M-MMP-4-05-04/9/15		
ASTM D6927-15 M-MMP-4-04-00/2/02		

CERTIFICADO DE CALIDAD

PROYECTOS Y LABORATORIO

INFORME DE PRUEBAS DE GRADO DE DESEMPEÑO

ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO (BETÚN DE PETRÓLEO)

OBRA: CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.	REMISIÓN: 33634
LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME: 13 DE SEPTIEMBRE 2026

REFINERÍA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO	ASFALTOS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
TIPO DE PRODUCTO INDICADO EN LA REMISIÓN	ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO
DEPÓSITO MUESTREADO	TANQUE CLIENTE

PRUEBAS	NORMATIVA	RESULTADOS AFSA LABORATORIO	ESPECIFICACIÓN SCT
DEL CEMENTO ASFALTICO ORIGINAL			
PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND °C MÍNIMO	ASTM 8254-19	290	230
VISCOSIDAD ROTACIONAL 135 °C Pa-s, MÁXIMO	ASTM D4402/15	1.25	3
MÓDULO REOLÓGICO CORTE DINÁMICO (G*/senδ) kPa, MÍNIMO	ASTM D7175/15	1.65	1
TEMPERATURA DE ENSAYO @ 10 rad/s, °C	ASTM D7175/15	76	76
RECUPERACIÓN ELASTICA POR TORSIÓN. 25 °C. %, MÍNIMO	M-MMP-4-05-024/21	45	40
RESIDUO DEL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA			
PERDIDA POR CALENTAMIENTO, % MÁXIMO	ASTM D2872/19	-0.117	1
MÓDULO REOLÓGICO CORTE DINÁMICO (G*/senδ) kPa MÍNIMO	ASTM D7175/15	2.81	2.2
TEMPERATURA DE ENSAYO @ 10 rad/s, °C	ASTM D7175/15	76	76
RESIDUO DE LA VASIJA DE ENVEJECIMIENTO (PAV)			
MÓDULO REOLÓGICO CORTE DINÁMICO (G*/senδ) kPa, MÁXIMO	ASTM D7175/15	3,146	5,000
TEMPERATURA DE ENSAYO @ 10 rad/s, °C	ASTM D7175/15	31	31
TEMPERATURA DE ENVEJECIMIENTO, °C	ASTM D6521/19	100	100
ÍNDICE DE ENDURECIMIENTO FÍSICO, MÁXIMO	ASTM D6648/08	185 (0.301)	-
RIGIDEZ DE FLEXIÓN S(t), Mpa, MÁXIMO (m=0.3 min.)	ASTM D6648/08	181 (0.302)	300
TEMPERATURA DE PRUEBA @ 60s, °C	ASTM D6648/08	-12	-12

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE ESPECIFICACIONES PARA UN PG 76-22 MODIFICADO



INGENIERO DE PRUEBA

L.Q. NORMA E. ROMÁN D.



F A S E EMULSIONES Y ASFALTOS

CALLE 63 No. 6313 COL. CONCORDIA CP. 31375 CHIHUAHUA, CHIH.

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: EMULSION CATIONICA ECR-65

EXPEDIDO A: CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA ELABORACION: 19/09/2026

ENSAYE No. 20

FECHA DE INFORME: 19/09/2026

ESTADO: CHIHUAHUA

REFINERIA DE DONDE PROCEDE EL CEMENTO
TIPO DE CEMENTO ASFALTICO UTILIZADO

TAD-CADEREYTA NL.
EKBE 64-22

EMULSION CATIONICA ECR-65	ENSAYES		METODO
PRUEBAS	No	No	
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO EN MASA ;%,MINIMO	65.1		65
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 25 °C ,S, MINIMO	N/A		N/A
VISCOSIDAD SAYBOT-FUROL a 50 °C ,S, MINIMO	42		40
ASENTAMIENTO EN 5 DIAS; DIFERENCIA EN %. MAXIMO	0.005		5
RETENCION EN LA MALLA No20 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ%.MAX	0.1		0.1
PASA MALLA No 20 Y SE RETIENE EN MALLA No 60 EN LA PRUEBA DEL TAMIZ; %.MAXIMO	0.24		0.25
CARGA ELECTRICA DE LA PARTICULA	+		(+)
RESIDUO DE LA DESTILACION, % EN VOLUMEN (SOLVENTE)	N/A		
DISOLVENTE EN VOLUMEN; %, MAXIMO	3		3
EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION			
VISCOSIDAD DINAMICA A 60° C;PAS(P(1)),MAXIMO	N/A		50 +- 10
PENETRACION A 25 °C; 100 g, 5 SEGG;GRADOS.	135		110-250
SOLUBILIDAD; %, MINIMO	N/A		
DUCTIBILIDAD, % 25°C, CM, MINIMO	N/A		

OBSERVACIONES:

LA EMULSION CUMPLE LOS REQUISITOS PARA UNA EMULSION ECR-65

LABORATORIO

ING. CESAR OMAR AGUILERA OLIVAS

GERENTE

ING. MANUEL SANCHEZ MEDRANO




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONST.	CYP CRUZ SAENZ	FECHA RECIBO	02/07/2025
MUESTRA:	PETREO CLASIFICADO DE MALLA No. 4 A FINOS (POLVILLO)	FECHA INFORME	09/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	100	60-82
	1/4"	100	44-71
	Núm. 4	100	37-64
	Num. 10	64	20-46
	Núm. 20	39	12-35
	Núm. 40	23	8-27
	Núm. 60	19	6-21
	Núm. 100	15	4-16
	Núm. 200	12	2-8
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD 2.66 (2.4 MIN)			
DESGASTE % (35 MAX)			
PART. ALARGADAS % (40MAX)			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA % (50 MIN)			
CONTRACCION LINEAL %			

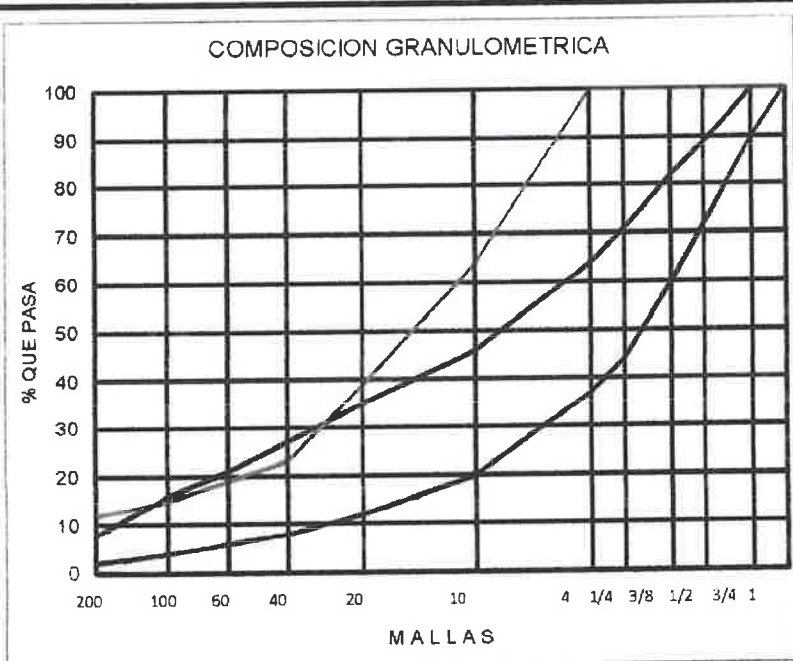

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25 C, 100 gr, 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:

REPORTAMOS LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA No. 4 A FINOS.

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	PLANTA	CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONST. CYP CRUZ SAENZ		FECHA RECIBO	02/07/2025
MUESTREO: PETREO CLASIFICADO DE MALLA 1/2" A MALLA No. 10 (SELLO).		FECHA INFORME	09/07/2025
DESCRIPCION DEL MATERIAL		ROCA CALIZA	
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO		TRITURACION TOTAL	
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO		ALMACEN EN LA PLANTA DE ASFALTOS	
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO		MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA	

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	100	72-89
	3/8"	76	60-82
	1/4"	35	44-71
	Núm. 4	15	37-64
	Núm. 10	1	20-46
	Núm. 20	0	12-35
	Núm. 40	0	8-27
	Núm. 60	0	6-21
	Núm. 100	0	4-16
	Núm. 200	0	2-8
RET. MALLA			%
P V SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %		0.72	
DENSIDAD		2.65	(2.4 MIN)
DESGASTE %		26.3	(35 MAX)
PART. ALARGADAS %		8.5	(35MAX)
PART. LAJEADAS %		11.1	(50 MIN)
EQUIV. ARENA %			(50 MIN)
CONTRACCION LINEAL %			

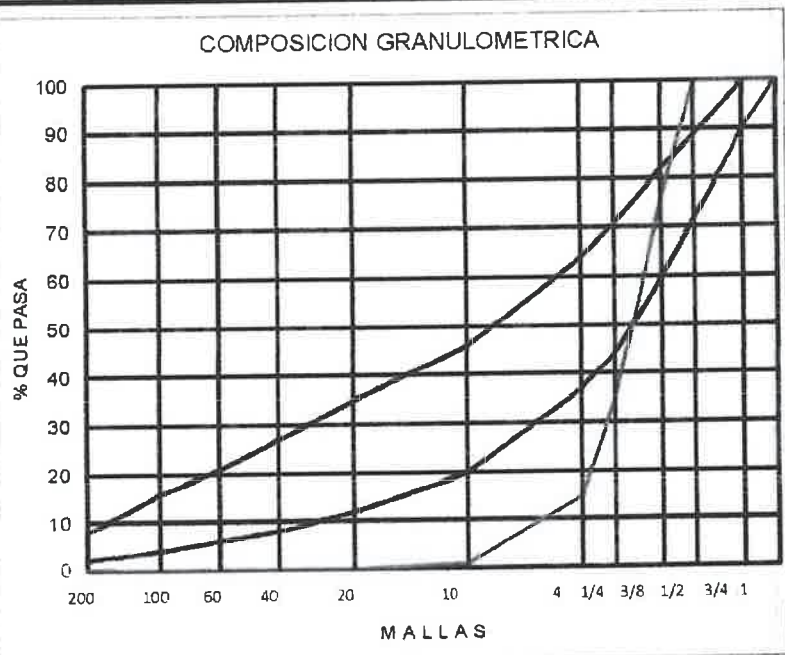

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg.		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM. ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C, 100 gr. 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES: REPORTAMOS LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CLASIFICADO ENTRE MALLA 3/8" A No. 10.	
EL JEFE DEL LABORATORIO ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTÍNEZ	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. PLANTA CYP CRUZ
MUESTRA OBTENIDA DEL ALMACEN DE CONST. CYP CRUZ SAENZ FECHA RECIBO 02/07/2025
MUESTREO: PETREO CLASIFICADO DE 3/4" A 3/8" (GRAVA). FECHA INFORME 09/07/2024
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN OBRA
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	99	90-100
	1/2"	44	72-89
	3/8"	10	60-82
	1/4"	0	44-71
	Núm. 4	0	37-64
	Num 10	0	20-46
	Núm 20	0	12-35
	Núm. 40	0	8-27
	Núm 60	0	6-21
	Núm. 100	0	4-16
	Núm. 200	0	2-8
RET. MALLA			%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %		1.31	
DENSIDAD		2.55	(2.4 MIN)
DESGASTE %		26.1	(35 MAX)
PART. ALARGADAS %		13.6	(40MAX)
PART. LAJEADAS %		9.0	(50 MIN)
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION, 25°C. 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

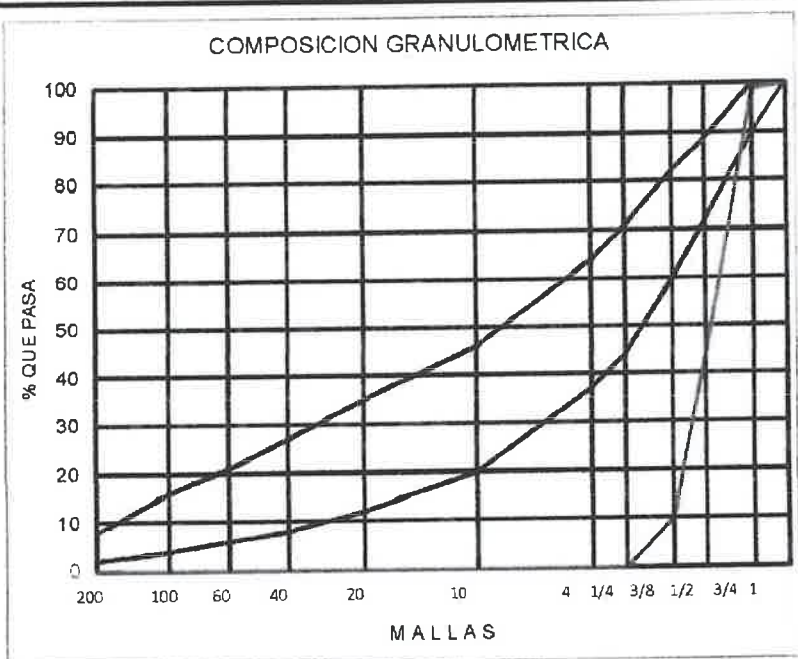

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO PRESENTA CARACTERÍSTICAS SATISFACTORIAS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA DIVERSAS OBRAS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

PLANTA : CYP CRUZ

MEZCLA 70% MAT. CLASIFICADO DE 3/8" A FINOS (ARENA), 20% MAT. CLASIF.

FECHA RECIBO 02/07/2025

DE 3/4" A 3/8" (GRAVA) Y 10% MATERIAL 3/8" A No. 10 (SELLO).

MUESTRA: PETREO CLASIFICADO DE 3/4" A FINOS.

FECHA INFORME 09/07/2025

DESCRIPCION DEL MATERIAL

ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO

TRITURACION TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO

EN OBRA

UBICACION DEL BANCO DEL PETREO

MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA

CARPETA ASFALTICA

MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	99	90-100
1/2"	87	72-89
3/8"	78	60-82
1/4"	65	44-71
Núm. 4	55	37-64
Núm. 10	38	20-46
Núm. 20	26	12-35
Núm. 40	20	8-27
Núm. 60	16	6-21
Núm. 100	12	4-16
Núm. 200	6	2-8
RET. MALLA		%

P.V. SECO SUELTO Kg/m³

ABSORCION %

2

DENSIDAD

2.53

(2.4 MIN)

DESGASTE %

30.1

(35 MAX)

PART. ALARGADAS %

14.8

(40MAX)

PART. LAJEADAS %

10.0

EQUIV ARENA %

67.10

(50 MIN)

CONTRACCION LINEAL %

1.6

(2.0 MAX)


CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO

TIPO

PENETRACION, 25 °C, 100 gr, 5 seg.

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg.

COMPOSICION GRANULOMETRICA

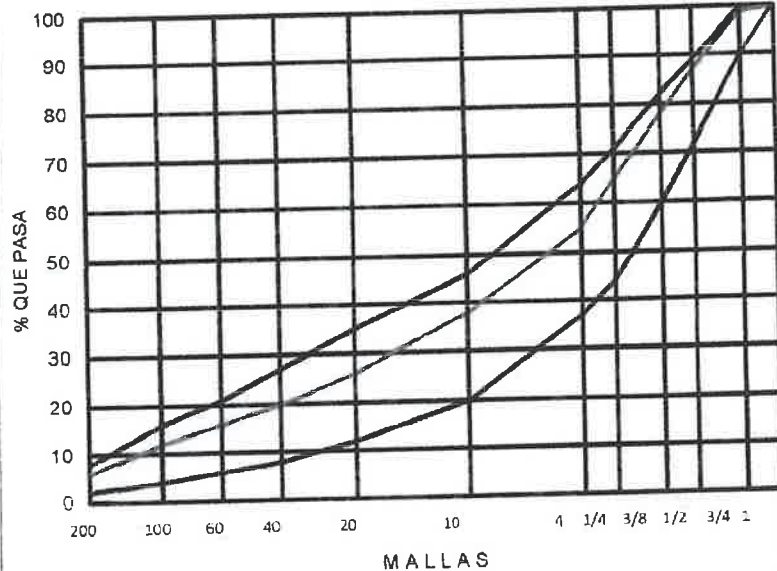

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170 - 180
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		
ESTABILIDAD, kg.		817.5
FLUJO, mm		2 - 3.5
VACIOS, %		DE 3 A 5
VAM, %		14 MIN
CONT. CEM ASF/PETREO, %		
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD		BUENA SIN ADITIVO

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA DE MATERIALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE UNA MEZCLA ASF. DE TAM. MAX 3/4".

EL JEFE DEL LABORATORIO
ING. FAUSTO J. CHAVEZ MARTINEZ

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

BLVD. DIAZ ORDAZ No 1811, COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH.

TELS.

(614) 4 10 60 32 . (614) 3 46 94 04

PRUEBA MARSHALL

OBRA PLANTA DE ASFALTOS CYP CRUZ SAENZ

LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.






BANCO ALMACEN EN LA PLANTA

FECHA 09-jul-25

CARPETA TAMAÑO 3/4"

tipo de asfalto: PG 76-22

densidad del asfalto: .998 T/M3

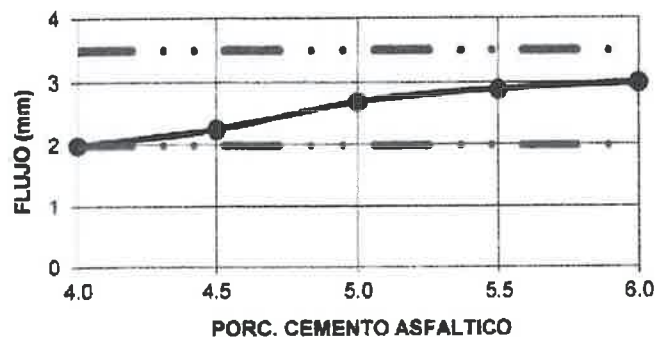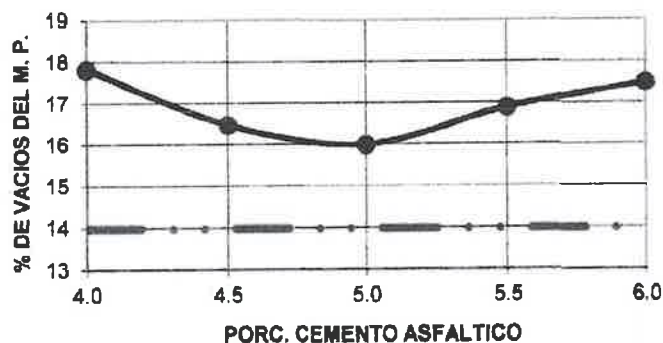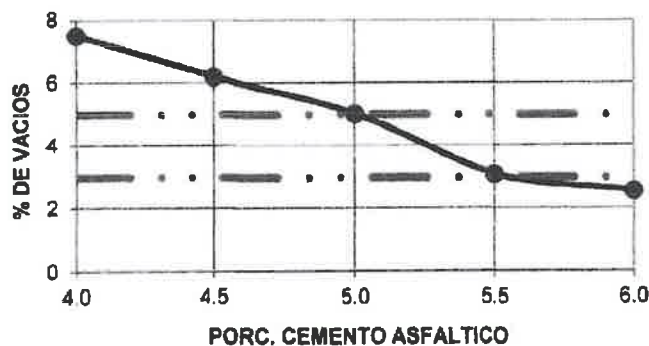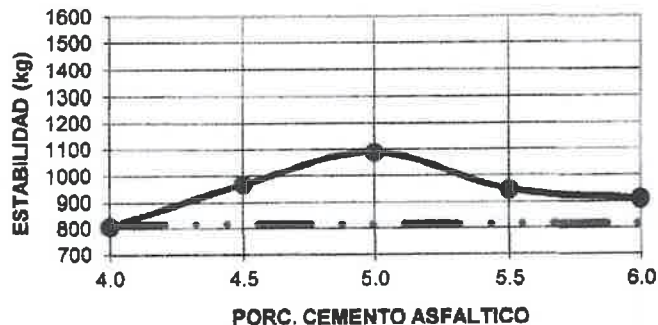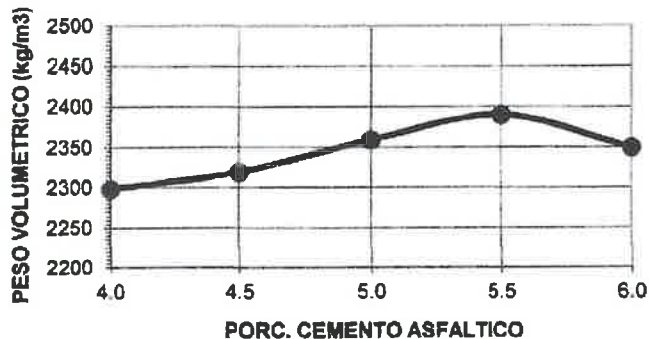

TEMPERATURA DE ELABORACION

150° -165°

TEMPERATURA DE TENDIDO

160°

CARACTERISTICAS	DATOS OBTENIDOS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO OPTIMO DE C.A. (%):	5.00	
ESTABILIDAD (kg):	1248	817
VACIOS (%):	3.50	DE 3 A 5
PESO VOLUMETRICO (kg/m³):	2384	
FLUJO (mm):	2.70	DE 2 A 4
VACIOS DEL M. P. (%):	15.40	13 MIN

EL LABORATORISTA

EL JEFE DE LABORATORIO

NOTA IMPORTANTE

HACEMOS NOTAR QUE EN LA PLANTA SE DEBERA EFECTUAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA OBTENER ESTOS RESULTADOS

ING.FAUSTO CHAVEZ M.




CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA PLANTA CYP CRUZ SAENZ
EN BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO PORTILLO FECHA RECIBO 21/09/2026
(CUERPO SUR A NORTE) FECHA INFORME 23/09/2026

MEZCLA ASFALTICA 3/4" TRAMO No. 1
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	85	72-89
	3/8"	72	60-82
	1/4"	56	44-71
	Núm. 4	42	37-64
	Num. 10	25	20-46
	Núm. 20	18	12-35
	Núm. 40	12	8-27
	Núm. 60	11	6-21
	Núm. 100	8	4-16
	Núm. 200	5	2-8
	RET. MALLA		%
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

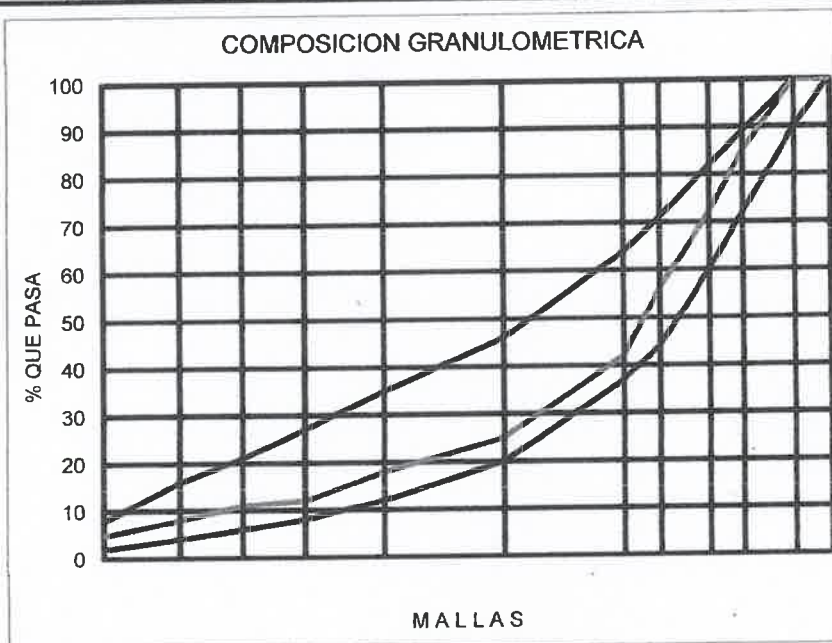

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	174	160 - 175
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2428	
ESTABILIDAD, kg.	1729	817.5
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	3.3	DE 3 A 5
VAM, %	15.2	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.5	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)	
ENSAYES		353
FECHA RECIBO		21-sep.-26
FECHA INFORME		22-sep.-26

CAPA		3.5 CM	CARPETA ASFALTICA 3/4"	PG 76 - 22	ESPESOR DE PROYECTO DE LA CAPA				3.5			
PLANTA :		PLANTA CYP CRUZ SAENZ			ESPESOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR				4.5			
VIAJES		MUESTRA		HORAS		TEMPERATURAS DE MEZCLA				TENDIDO		ESPESOR
CAMION	VOL.	SALIDA		DESCARGA	AL SALIR	AL TENDER	AL COM-	DE Km.	A Km.	LADO o	ANCHO	DE CAPA
No.	m3	EN PLANTA		EN TRAMO	DE PLANTA	EN TRAMO	PACTAR			FRANJA		TENDIDA
TRAMO 1.												

[illegible]

LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y/AL COMPACTAR SON SATISFACTORIOS

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTINEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

1000

ENSAYES No.	354
FECHA DE RECIBO	21-sep-26
FECHA DE INFORME	22-sep-26

HORA DE DETERMINACION	8:25AM
TEMPERATURA DE APLICACION	62°C
CANTIDAD EMPLEADA	671.00
ROMPIMIENTO	RÁPIDO

[illegible]

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
CCSS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

IMPREGNACION

OBRA :	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)
ENSAYES No.	356
FECHA DE RECIBO	22-sep-26
FECHA DE INFORME	23-sep-26

REPORTE DE CAMPO No.	HORA DE INICIACION		8:10AM	HORA DE DETERMINACION		8:25AM
PRODUCTO APTALITICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Lvl/ml2	TEMPERATURA DE APLICACION		62°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 Lvl/m2	CANTIDAD EMPLEADA		671.00
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO		RAPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA	SOLEADO	TEMPERATURA AMBIENTE		25°C		

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ





OBRA REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDO Y SOBRE CARPETA ASFALTI PLANTA		CYP CRUZ SAENZ	
EN BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO PORTIL		FECHA RECIBO 24/09/2026	
(CUERPO SUR A NORTE)		FECHA INFORME 26/09/2026	
MEZCLA ASFALTICA 3/4" TRAMO No. 2			
ROCA CALIZA			
TRITURACION TOTAL			
AL TENDER			
MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA			
DESCRIPCION DEL MATERIAL			
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO			
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO			
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO			
CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
MALLAS			
RET. MALLA			
Num. 200			
5			
2--8			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
RET. MALLA			
Num. 200			
7			
4-16			
9			
6-21			
13			
8-27			
17			
12-35			
24			
20-46			
44			
37-64			
58			
44-71			
73			
60-82			
86			
72-89			
100			
90-100			
100			
3/4"			
100			
1"			
MALLAS			
% PASA			
PROYECTO			
CARPETA ASFALTICA			
CLASIFICACION PETROGRAFICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
RET. MALLA			
Num. 200			
5			
2--8			
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO			
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO			
PENETRACION, 25°C, 100 gr., 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FURUL, seg			
OBSERVACIONES:			
LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES.			
EL JEFE DEL LABORATORIO			
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON			
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA			
ESPECIFICACIONES			
TEMP. DE ELABORACION, °C			
172			
160 - 175			
PESO VOLUMETRICO, kg/cm ³			
2442			
ESTABILIDAD, kg.			
1731			
817.5			
FLUJO, mm			
3.2			
2 - 3.5			
VACIOS, %			
3.5			
DE 3 A 5			
VAM, %			
15.2			
14 MIN			
CONT. CEM ASF/PETREO, %			
5.4			
5.4			
BUENA SIN ADITIVO			
AFINIDAD			
ADITIVO USADO			
TIPO			
MARCA			
CANTIDAD/C.A.			
N-CMT.04-04/17			
MALLAS			
COMPOSICION GRANULOMETRICA			
% QUE PASA			
0			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
100			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
CCSS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)

ENSAYES	357
FECHA RECIBO	24-sep.-26

FECHA INFORME 25-sep.-26

CAPA	3.5 CM	CARPETA ASFALTICA 3/4"	PG 76 - 22
PLANTA:	PLANTA CYP CRUZ SAENZ		

**ESPOSOR DE PROYECTO DE LA CAPA
ESPOSOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR**

3.5
4.5

[illegible]



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE RIEGOS DE LIGA	X
---------------------------	---

X

IMPREGNACION

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)	ENSAYES No. 358
	FECHA DE RECIBO 24-sep-26
	FECHA DE INFORME 25-sep-26

FECHA DE RECIBO	24-sep-26
FECHA DE INFORME	25-sep-26

FECHA DE INFORME	25-sep-26
-------------------------	-----------

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION	9:00AM	HORA DE DETERMINACION	9:20AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Ltr/m2	TEMPERATURA DE APLICACION	62°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 Ltr/m2	CANTIDAD EMPLEADA	671.00
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RAPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA	SOLEADO	TEMPERATURA AMBIENTE	25°C		

[illegible]



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
CCSS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)

ENSAYES	359
FECHA RECIBO	25-sep.-26

FECHA INFORME 26-sep.-26

CAPA	3.5 CM	CARPETA ASFALTICA 3/4"	PG 76 - 22
PLANTA :	PLANTA CYP CRUZ SAENZ		

ESPEJOR DE PROYECTO DE LA CAPA	3.5
ESPEJOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR	4.5

PLANTA: PLANTA CYP CRUZ SAENZ

[illegible]


LOS GRADOS DE TEMPERATURA AL TENDER Y AL COMPACTAR SON SATISFACTORIOS

GERENTE GENERAL

ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ



OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA PLANTA CYP CRUZ SAENZ
EN BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO PORTILLO RECIBO 28/09/2026
(CUERPO SUR A NORTE) FECHA INFORME 30/09/2026
MEZCLA ASFALTICA 3/4" TRAMO No. 3
ROCA CALIZA
TRITURACION TOTAL
AL TENDER
MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

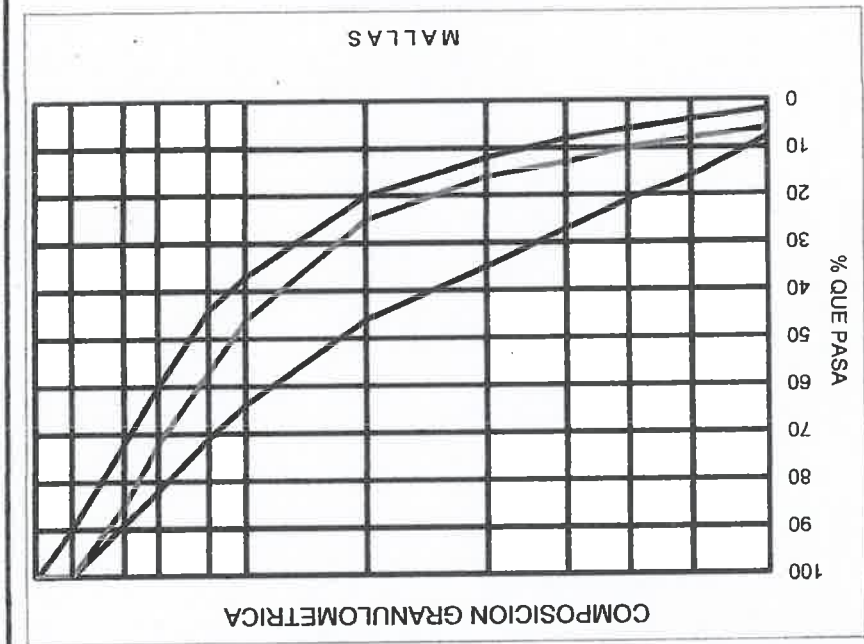

CLASIFICACION PETROGRAFICA
CARPETA ASFALTICA

COMPOSICION GRANULOMETRICA		MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"		100		
3/4"		100		
1/2"		85		
3/8"		72		
1/4"		57		
Num. 4		46		
Num. 10		25		
Num. 20		16		
Num. 40		13		
Num. 60		10		
Num. 100		8		
Num. 200		6		
RET. MALLA				
				%

P.V. SECO SUELTO kg/m ³	
ABSORCION %	
DENSIDAD	
DESGASTE %	
PART. ALARGADAS %	
PART. LAJADAS %	
EQUIV. ARENA %	
CONTRACCION LINEAL %	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	
PENETRACION 25°C. 100 gr. 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONES:
LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES.

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C	172	160 - 175
PESO VOLUMETRICO, kg/cm ³	2432	
ESTABILIDAD, kg.	1736	817.5
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	3.3	DE 3 A 5
VAM, %	15.3	14 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.6	5.4
ADITIVO USADO		
MARCA		
TIPO		
CANTIDAD/ C.A.		
BUENA SIN ADITIVO		

N-CMT.04-04/17

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)

ENSAYES	361
FECHA RECIBO	28-sep.-26

FECHA INFORME 29-sep.-26

CAPA	3.5 CM	CARPETA ASFALTICA 3/4"	PG 76 - 22
PLANTA:	PLANTA CYP CRUZ SAENZ		

ESPEJOR DE PROYECTO DE LA CAPA	3.5
ESPEJOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR	4.5

[illegible]



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
CCSS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA,
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

IMPREGNACION

OBRA :	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)	ENSAYES No.	362
		FECHA DE RECIBO	28-sep-26
		FECHA DE INFORME	29-sep-26

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION	9.20AM	HORA DE DETERMINACION	9.40AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Lt/m ²	TEMPERATURA DE APLICACION	62°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 Lt/m ²	CANTIDAD EMPLEADA	838.75
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RAPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA	SOLEADO	TEMPERATURA AMBIENTE	26°C		

[illegible]

EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ





CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE

OBRA REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA EN BULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE)

ENSAYES	363
----------------	------------

FECHA RECIBO 29-sep.-26

FECHA INFORME	30-sep.-26
----------------------	------------

CAPA	3.5 CM	CARPETA ASFALTICA 3/4"	PG 76 - 22
PLANTA :	PLANTA CYP CRUZ SAENZ		

ESPOSOR DE PROYECTO DE LA CAPA
ESPOSOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR

3.5
4.5

PLANTA: PLANTA CYP CRUZ SAENZ

[illegible]



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA,
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

X

IMPREGNACION

--	--

ENSAYES NO.	364
FECHA DE RECIBO	29-sep-26
FECHA DE INFORME	30-sep-26

REPORTE DE CAMPO No.		HORA DE INICIACION	8:00AM	HORA DE DETERMINACION	8:20AM
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO	EMULSION	CANTIDAD RECOMENDADA	.60 Lt/m ²	TEMPERATURA DE APLICACION	61°C
ADITIVO EMPLEADO	ECR-60	CANTIDAD APLICADA	0.61 Lt/m ²	CANTIDAD EMPLEADA	838.75
EQUIPO DE BARRIDO	MECANICO			ROMPIMIENTO	RÁPIDO
CONDICIONES DEL CLIMA	SOLEADO	TEMPERATURA AMBIENTE	28°C		

[illegible]

EL RIEGO DE LIGA APLICADO ES SATISFACTORIO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ



1. de 1.

CLAVE DE LA OBRA

UBICACION DEL BANCO DE MATERIAL PETREO: Materiales Industriales GCC Nombre de Dios

PAUL DE METREUX 1845	11	1944
----------------------	----	------

[illegible]

ET RFSD 1760

ACREDITADO C-0977-183/18

PARA CUATRO JERARQUÍA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE ENTREGAMOS QUEJA O SUGERENCIAS TAMOS A SU DISPOSICION EN EL TELEFONO 164179-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRONICO grupotecnico@signal.cl PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GIOVANI S.A. DE C.V.


OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES SUR A NORTE).	Nº DE INFORME:	GP-PMA-01-02
LOCALIZACIÓN:	PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	FECHA INFORME:	2026-07-24
CLIENTE:	APSA INGENIERIA	CIUDAD:	Chihuahua
		ESTADO:	Chihuahua
		CLAVE DE LA OBRA:	

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	Pétreo para carpeta asfáltica T.M. 3/4" (Grava)
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL:	Roca Caliza
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO:	Trituración Total
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO:	Almacén en Planta de Mezclado
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PÉTREO:	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios

COMPOSICION GRANULOMETRICA	M.V.S.S. (Kg/m³):		T 668	
	MALLAS		%QUE PASA	PROYECTO
	1"	250	100.0	100-100
	3/4"	118	100.0	100-100
	1/2"	125	81.0	90-100
	3/8"	60	50.0	76-92
	1/4"	30	21.0	56-81
	Nº 4	4.75	17.0	45-74
	Nº 10	2.00	7.0	25-55
	Nº 20	0.850	6.0	15-42
Nº 40	0.425	4.0	11-32	
Nº 60	0.250	4.0	8-25	
Nº 100	0.150	4.0	5-18	
Nº 200	0.075	3.0	2-9	

GRAVA		
DENSIDAD RELATIVA GRAVA	2.690	2.400 Min
DESAGASTE DE LOS ÁNGULOS %	21.3	30 % Max
DESAGASTE MORTUO %	-	18 % Max
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN %	11.30	20 % Max
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN %	-	40 % Max
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN %	100	95 % Min
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN %	100	85 % Min
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN %	-	20 % Max
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN %	0.62	-

ARENA		
DENSIDAD RELATIVA ARENA	-	2.400 Min
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN %	-	40 % Max
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN %	-	50 % Min
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN %	-	15 % Max

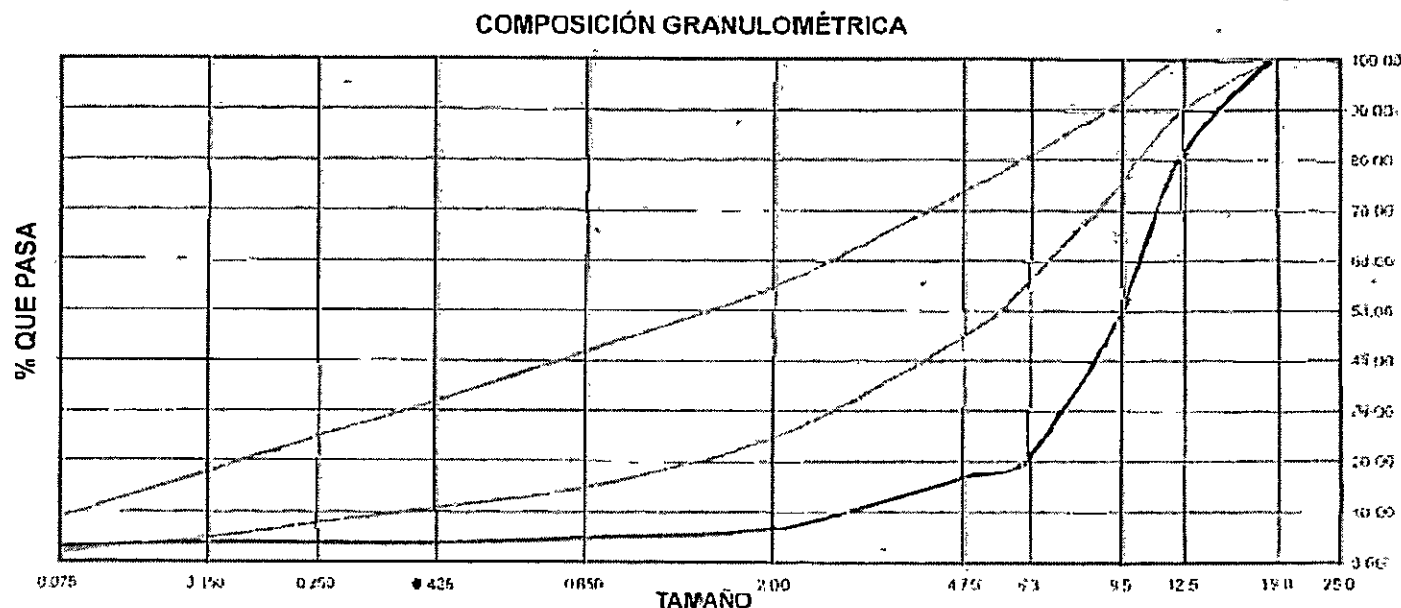

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):	OBSERVACIONES:	NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS):
	SE HAN REALIZADO LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DEL MATERIAL PÉTREO, RESULTANDO EN VALORES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA (MARSHALL).	ENsayos dentro del laboratorio de ensayo: ASTM C136-07 DENSIDAD RELATIVA DE AGREGADOS GRANULARES ASTM C137-07 DENSIDAD RELATIVA DE AGREGADOS FINOS ASTM C138-07 DENSIDAD RELATIVA DE AGREGADOS GRANULARES Y FINOS ASTM C143-07 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE AGREGADOS GRANULARES ASTM C144-07 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE AGREGADOS GRANULARES ASTM C145-07 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE AGREGADOS GRANULARES
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:		



GEOPAV S.A. DE C.V.

DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO

INFORME DE CALIDAD DE MATERIAL PÉTREO PARA MEZCLA ASFÁLTICA (MARSHALL)

CÓDIGO

GP-PMA-01

VERSIÓN

01

PÁGINA

1. de 1.

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES SUR A NORTE).

LOCALIZACIÓN: PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.

No. DE INFORME: 003

FECHA INFORME: 2025-07-24

CIUDAD: Chihuahua

ESTADO: Chihuahua

CLAVE DE LA CBRA: -

CLIENTE: APSA INGENIERIA

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Pétreo para carpeta asfáltica T.M. 3/4" (Sollo)

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL: Roca Caliza

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: Trituración Total

CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO: Almacén en Planta de Mezclado

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PÉTREO: Materiales Industriales GCC Nombre de Dios

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

M.V.S.S. (Kg/m³):		1 634	
MALLAS	% QUE PASA	PROYECTO	
1"	25.0	100.0	100-100
3/4"	19.0	100.0	100-100
1/2"	12.5	100.0	93-100
3/8"	9.5	100.0	76-92
1/4"	6.3	64.0	56-81
Nº 4	4.75	24.0	45-74
Nº 10	2.00	2.0	25-55
Nº 20	0.850	0.0	15-42
Nº 40	0.425	0.0	11-32
Nº 60	0.250	0.0	8-26
Nº 100	0.150	0.0	5-18
Nº 200	0.075	0.0	2-9

GRAVA


DENSIDAD RELATIVA GRAVA	2.610	2.400 Min
DESGASTE DE LOS ÁNGELES %	21.3	30 % Max.
DESGASTE MICROEVAL %	-	18 % Max.
INTemperismo ACCELERADO %	11.30	20% Max.
PART. ALARGADAS Y LAMINADAS %	-	40% Max.
PART. TRITURADAS 1 CARA %	100	95 % Min.
PART. TRITURADAS 2 O MAS CARAS %	100	85 % Min.
DESP. PLUM. FRICCIÓN %	-	20% Max.
ABSORCIÓN %	0.77	-

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	-	2.400 Min.
ANGULARIDAD %	-	45 % Min.
EQUIV. DE ARENA %	-	50 % Min.
AZUL DE METILENO, mg/g	-	15 Max.

% QUE PASA

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

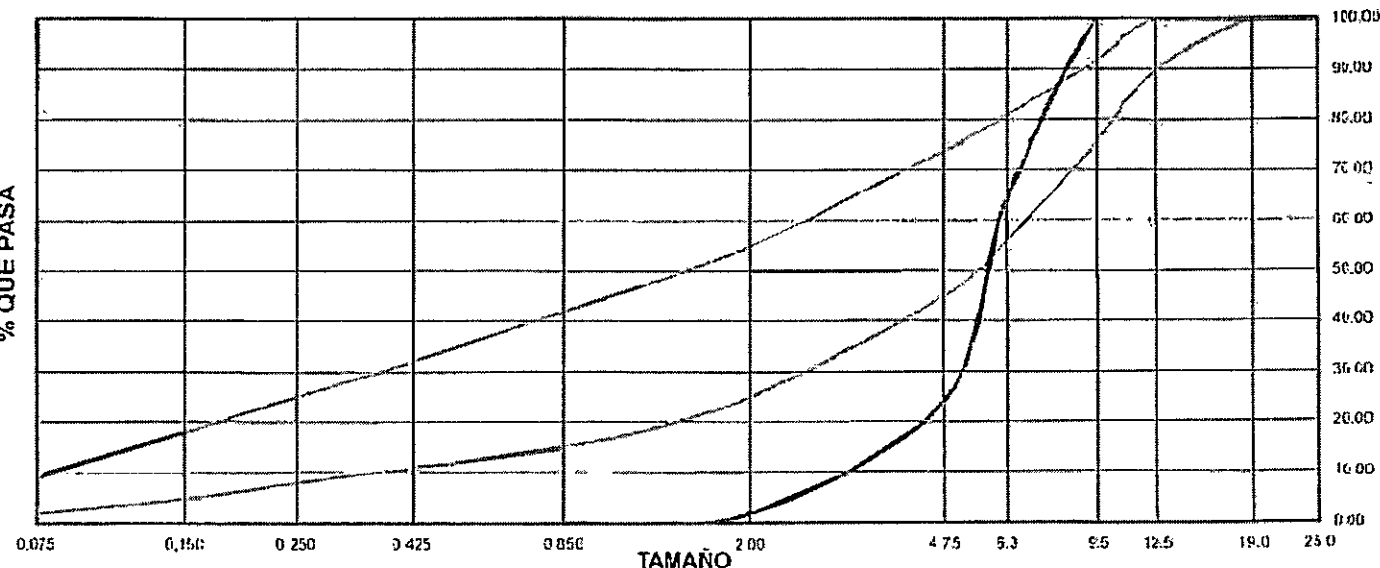

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):

OBSERVACIONES:

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

SE CUMPLE

SIGNATARIO AUTORIZADO

ACREDITADO C-0977-183/18

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUE LA PRESENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL TELÉFONO (614) 79-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRÓNICO: geopavtecnico@gmail.com
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.



1. de 1.

CLAVE DE LA OBRA :

PROPORCIONES

25% Sello T.M. de 3/8"

AZUL DE METILENO, mg/g	-	15 Max.
------------------------	---	---------

NAME/F 444 10502 IT: 438.2 ASTA C13

GEOVA
L'ASSICURATRICE

ema 
ACREDITADO C-0877-183/18

Y CUALQUIER RESULTADO SOLO ES VALIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES SUR A NORTE).
-------	--

No. DE INFORME: 5

FECHA INFORME :	2026-07-24
-----------------	------------

LOCALIZACION:	PERIFERICO DE LA JUVENTUD.
---------------	----------------------------

CIUDAD:	Chihuahua
---------	-----------

ESTADO:	Chihuahua
---------	-----------

CLIENTE:	APSA INGENIERIA
----------	-----------------

CLAVE DE LA OBRA :

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCION DEL MATERIAL	Pótreo para carpeta asfáltica T.M. 3/4" (Mezcla Práctica)
--------------------------	---

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL Roca Caliza

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	Trituración Total
--------------------------------	-------------------

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO "1": Almacen en Planta de Mezclado

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PETREO: Materiales Industriales GCC Nombre de Dios

COMPOSICION GRANULOMETRICA

M.V.S.S. (Kg/m³):		1787	
MALLAS		%QUE PASA	PROYECTO
1"	25.0	100.0	100-100
3/4"	19.0	100.0	100-100
1/2"	12.5	95.0	90-100
3/8"	9.5	88.0	76-92
1/4"	6.3	73.0	56-81
Nº 4	4.75	63.0	45-74
Nº 10	2.00	38.0	25-55
Nº 20	0.850	22.0	15-42
Nº 40	0.425	14.0	11-32
Nº 60	0.250	11.0	8-25
Nº 100	0.150	9.0	5-18
Nº 200	0.075	6.0	2-9


GRAVA

DENSIDAD RELATIVA GRAVA	2.690	2.400 (Mn.)
DESGASTE DE LOS ANGELES %	21.3	30 % Max
DESGASTE MICRODEVAL %	-	18 % Max
INTemperismo ACCELERADO %	11.30	20% Max.
PART. ALARGADAS Y LAMINADAS %	-	40% Max.
PART. TRITURADAS Y CARA %	100	95 % Min.
PART. INTRINADIZ O OSCURAS %	100	85 % Min.
DENS. FORMACION %	-	20% Max.
ABSORCION %	0.62	...

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	2.680	2.400 Mm
ANGULARIDAD %	45.9	45 % Min
EQUIVO DE ARENA %	72.8	50 % Min.
AZUL DE METILENO, mg/g	11	15 Max

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

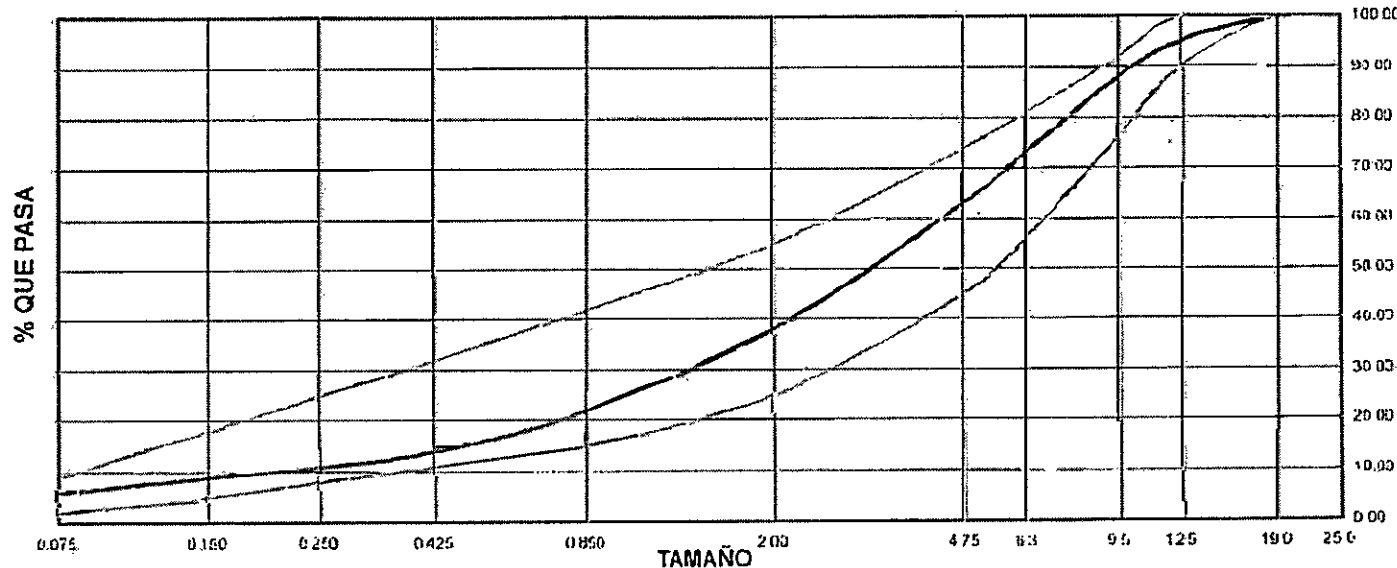

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :

OBSERVACIONES:

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

EL EMPLEADO PARTICIPARÁ EN TODAS LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE REALICEN EN EL ÁREA DE SU RESPONSABILIDAD.	SE ASEGURA QUE EL EMPLEADO PARTICIPARÁ EN TODAS LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE REALICEN EN EL ÁREA DE SU RESPONSABILIDAD.	Ensayo dentro del ámbito de actividades
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :	ASPECTOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

1

SIGNATARIO AUTORIZADO



ema 
ACREDITADO C-0977-183/18

 GEOPAV LABORATORIO DE ENSAYOS	GEOPAV S.A. DE C.V.	CÓDIGO	GP-DCI-01
	DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO	VERSIÓN	000
	DENSIDAD APARENTE DEL MATERIAL PÉTREO POR INMERSIÓN EN CEMENTO ASFÁLTICO FLUIDIFICADO (DENSIDAD DEL CUERPO DE INGENIEROS)	PÁGINA	1 de 1.

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES SUR A NORTE).	No. DE INFORME:	6
LOCALIZACIÓN:	PERIFERICO DE LA JUVENTUD:	FECHA DE INFORME:	2026-07-24
		CIUDAD:	Chihuahua
		ESTADO:	Chihuahua
CONSTRUCTORA:	APSA INGENIERIA:	CVE. DE LA OBRA:	

IDENTIFICACIÓN	
BANCO DE MATERIAL PÉTREO:	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios
TIPO DE ASFALTO:	PG 76-22

Muestra No.	Wp (g)	W'a (g)	W'ap (g)	Sp
1	1 501.3	389.4	1 328.6	2.671
2	1 500.8	385.3	1 323.7	2.669
3	1 498.9	390.7	1 328.4	2.671
4	1 501.6	388.9	1 328.0	2.670
$Sp = \frac{Wp}{Wp - (W'ap - W'a)}$				DENSIDAD PROMEDIO ($\bar{Sp}$) 2.670

DONDE:	
Sp	Densidad aparente del material pétreo por inmersión en cemento asfáltico fluidificado o Densidad del Cuerpo de Ingenieros.
Wp	Peso del material pétreo seco (g)
W'ap	Peso del recipiente con asfalto, varilla y material pétreo, sumergidos en agua. (g)
W'a	Peso del recipiente con asfalto y varilla, sumergidos en agua. (g)

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):	OBSERVACIONES:
N/A	SE INFORMAN RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:	
NINGUNA	
NORMA DE REFERENCIA (MÉTODO):	
M-MMP-1-04-015/13	

SIGNATARIO AUTORIZADO
 GEOPAV LABORATORIO DE ENSAYOS NOMBRE Y FIRMA

EL RESULTADO SOLO ES VALIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL TELEFONO (614) 179-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRONICO. geopav_tecnico@gmail.com
 PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.



GEOPAV

ESTUDIOS, PROYECTOS Y LABORATORIO

GEOPAV S.A. DE C.V.

DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO

DISEÑO MARSHALL

CÓDIGO

GP-PM-01

VERSIÓN

00

PÁGINA

1 de 1

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES SUR A NORTE).	No. DE INFORME:	7
LOCALIZACIÓN:	PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	FECHA DE MUESTREO:	2026-07-24
CLIENTE:	Apsa Ingeniería	CLAVE DE LA OBRA:	

MÉZCLA DE MATERIAL PÉTREO	MAT. ASFÁLTICO:	PG 76-22	ESTABILIDAD (KG)	817	TIPO DE MATERIAL:	Carpete Asfáltico Denso
50% Arena con T.M. de 3/16"	ADITIVO:	-	VACIOS (%)	3.0 a 5.0	PROCEDECIA:	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, Chilt.
25% Grava con T.M. de 3/4"	PROPORCIÓN:	-	FLUJO (MM)	2.0 a 3.5		
25% Sello con T.M. de 3/8"	COMPACTADO CON:	75 GOLFES	VAM (%)	14 MIN.		
	TEMPERATURA:	145 °C	VFA (%)	65 a 75		
					T.M.N.:	1/2"

DENSIDAD CPO INGENIEROS (DMP):	2.670	DENSIDAD DE LA PARAFINA (DP):	0.75	DENSIDAD CEM. ASF. (DCAI):	1.025	CONSTANTE DEL ANILLO (CTE):	8.34
--------------------------------	-------	-------------------------------	------	----------------------------	-------	-----------------------------	------

PROBETA No.	% C.A.		PESO (g)			VOLUMETRÍA						ESTABILIDAD (KG)					FLUJO.																
	AGR	MEZCLA	AIRE	AIRE C/REC	REC. EN AGUA	Gmb ⁽¹⁾	C.A.	MAT PÉTREO	VACIO	VAM	VFA	MICROM	ESTAB.	ALTURA	FACTOR CORREC	ESTABILIDAD CORREGIDA	0.01"	mm															
						(Kg/m ³)																											
						F													G	H	I	J	J'	K	L	M	N	O	P	Q			
A	B	C	D	E	$\frac{C}{100 - \frac{(H - I) \cdot (J - J')}{100}}$	$\frac{(H) \cdot (F)}{100}$	$\frac{(100 - E) \cdot (I)}{100}$	$100 \cdot (G) - (H)$	$100 \cdot (H)$	$\frac{(J) - (J')}{100} \cdot 100$	K	L	M	N	O	P	Q																
1	3.80	3.66	1 194.3	1 195.1	680.2	2 324	8.3	83.9	7.8	16.1	51.5	115	959	6.35	1.003	959		1.80															
2	3.80	3.66	1 192.9	1 193.9	680.0	2 327	8.3	84.0	7.7	16.0	51.9	113	942	6.35	1.003	942		1.79															
3	3.80	3.66	1 192.3	1 193.0	680.2	2 329	8.3	84.0	7.6	16.0	52.1	112	934	6.38	0.993	927		1.78															
	3.80	3.66	1 193.2	1 194.0	680.1	2 327	8.3	84.0	7.7	16.0	51.8	113	945	6.36	0.998	943		1.79															
4	4.30	4.12	1 206.7	1 207.4	690.3	2 338	9.4	83.9	6.6	16.1	58.6	118	984	6.39	0.990	974		2.00															
5	4.30	4.12	1 205.8	1 206.6	691.0	2 343	9.4	84.2	6.4	15.8	59.5	114	951	6.35	1.000	951		2.07															
6	4.30	4.12	1 206.6	1 207.5	690.7	2 340	9.4	84.0	6.6	16.0	59.0	112	934	6.35	1.000	934		2.09															
	4.30	4.12	1 206.4	1 207.2	690.7	2 340	9.4	84.0	6.5	16.0	59.0	115	956	6.36	0.997	953		2.05															
7	4.80	4.58	1 197.0	1 197.9	689.1	2 358	10.5	84.3	5.2	15.7	67.0	129	1 076	6.35	1.000	1 076		2.50															
8	4.80	4.58	1 197.5	1 198.3	690.0	2 361	10.5	84.4	5.1	15.6	67.5	127	1 059	6.34	1.003	1 062		2.41															
9	4.80	4.58	1 198.5	1 199.3	689.3	2 355	10.5	84.2	5.3	15.8	66.4	127	1 059	6.36	0.998	1 057		2.42															
	4.80	4.58	1 197.7	1 198.5	689.5	2 358	10.5	84.3	5.2	15.7	67.0	128	1 065	6.35	1.000	1 065		2.44															
10	5.30	5.03	1 196.2	1 196.9	690.6	2 367	11.6	84.2	4.2	15.8	73.5	129	1 076	6.32	1.008	1 084		3.20															
11	5.30	5.03	1 195.5	1 196.4	689.9	2 366	11.6	84.2	4.2	15.8	73.3	131	1 093	6.30	1.013	1 106		3.18															
12	5.30	5.03	1 194.4	1 195.3	689.3	2 366	11.6	84.2	4.2	15.8	73.3	130	1 084	6.28	1.018	1 103		3.09															
	5.30	5.03	1 195.4	1 196.2	689.9	2 366	11.6	84.2	4.2	15.8	73.4	130	1 084	6.30	1.013	1 098		3.16															
13	5.80	5.48	1 202.3	1 203.0	692.6	2 360	12.6	83.5	3.8	16.5	76.7	129	1 076	6.36	0.998	1 073		3.50															
14	5.80	5.48	1 202.0	1 203.0	691.5	2 356	12.6	83.4	4.0	16.6	75.9	125	1 043	6.38	0.993	1 035		3.53															
15	5.80	5.48	1 201.1	1 201.8	692.4	2 362	12.6	83.6	3.7	16.4	77.1	128	1 068	6.41	0.985	1 052		3.49															
	5.80	5.48	1 201.8	1 202.6	692.2	2 359	12.6	83.5	3.9	16.5	76.6	127	1 062	6.38	0.992	1 053		3.51															
16	6.30	5.93	1 198.8	1 199.6	688.3	2 350	13.6	82.8	3.6	17.2	78.9	124	1 034	6.38	0.993	1 026		3.76															
17	6.30	5.93	1 198.3	1 199.0	687.2	2 346	13.6	82.6	3.8	17.4	78.1	125	1 043	6.37	0.995	1 037		3.85															
18	6.30	5.93	1 196.9	1 197.7	686.9	2 348	13.6	82.7	3.7	17.3	78.6	130	1 084	6.35	1.009	1 084		3.84															
	6.30	5.93	1 198.0	1 198.8	687.5	2 348	13.6	82.7	3.7	17.3	78.6	126	1 054	6.37	0.996	1 049		3.81															

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE): OBSERVACIONES:

N/A DE INFORMAR RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

NINGUNA

SIGNATARIO AUTORIZADO

 GEOPAV
 LABORATORIO DE ENSAYO

ema
 ACREDITADO C-0977-183/18

EL RESULTADO SOLO ES VALIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA
 PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL TEL. 0604 179-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRONICO: geopav.ingenieros@gmail.com
 PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.

**GEOPAV**
INDUSTRIAS Y LABORATORIOS**GEOPAV S.A. DE C.V.****DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO****DISEÑO MARSHALL****CÓDIGO****GP-DM-01****VERSIÓN****01****PÁGINA****1. de 1.****OBRA :**

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES SUR A NORTE)

LOCALIZACIÓN :

PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.

Nº DE INFORME**8ª****FECHA DE INFORME****2026-07-24****CLIENTE :**

APSA INGENIERIA

Ciudad/Estado**Chihuahua****CLAVE DE LA OBRA****MATERIAL PARA CAPA :** Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa**T.M.N.:****3/4"****UBICACIÓN DE PLANTA:** Periferico Vicente Lombardo Toledado 14601, Col. Ladrilleros**ESTUDIO:****(X)****UBICACIÓN DEL BANCO:** Materiales Industriales GCC Nombre de Dios**REVISIÓN:****()****MATERIAL RESULTANTE DE MEZCLAR:****50%**







Arena con T.M. de 3/16"

25%

Grava con T.M. de 3/4"

25%

Sello con T.M. de 3/8"

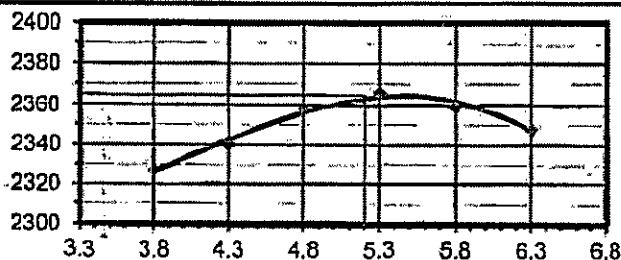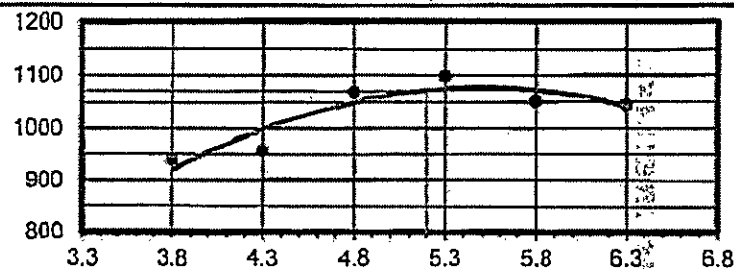**TIPO DE
ASFALTO:****PG 76****Gmb (kg/m³)****ESTABILIDAD (KG)****% DE VACÍOS****FLUJO (mm)****% DE V.A.M.****% DE V.F.A.****CARACTERÍSTICA****RESULTADO
OBTENIDO****ESPECIFICACIONES****OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :**

N/A

**ÓPTIMO CON RESPECTO AL
AGREGADO PÉTREO (%)**

5.20

± 0.15%

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :**ÓPTIMO CON RESPECTO A LA
MEZCLA (%)**

4.94

± 0.15%

N-CMT-04-04/17 Y SCT N-CMT-4-05-003-16

PESO ESPECÍFICO (kg/m³)

2365

NORMA DE REFERENCIA (MÉTODO) :**ESTABILIDAD (kg)**

1070

817

SCT: 012-D.05

FLUJO (mm)

3.0

2 a 3.5

OBSERVACIONES :**Va (%)**

4.3

3 A 5

SE INFORMAN LAS GRÁFICAS DE DISEÑO OBTENIDAS DEL ANÁLISIS DE MUESTRAS ELABORADAS EN LABORATORIO, CON DIFERENTES CONTENIDOS DE CEMENTO ASFÁLTICO, DE LAS CUALES SE DETERMINA EL % ÓPTIMO QUE DEBE SER INCORPORADO EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA ESTACIONARIA.

V.A.M. (%)

15.8

14 MIN.

V.F.A. (%)

72.5

65 A 75

Nº. DE GOLPES:

75

TEMPERATURA :

145°C

**SIGNATARIO AUTORIZADO****GEOPAV****ING. ALEJANDRO CHAGÓN SERNA****ema****ACREDITADO C-0977-183/18**PARA CUALQUIERA DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE ENTREGAMOS, QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN EL TELÉFONO (614) 79-52-97 Y EN EL CORREO ELECTRÓNICO: geopav@geopav.com. EL RESULTADO SOLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA, PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.**

R.F.C. CCS860409-IDA, BOULEVARD DIAZ GRDAZ No. 1811, COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL: 614-410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF. DE LA PLANTA NIRVANA
JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES SUR A NORTE) **FECHA RECIBO** 28/07/2026
FECHA INFORME 29/07/2026

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	87	72-89
	3/8"	77	60-82
	1/4"	68	44-71
	Núm. 4	54	37-64
	Num. 10	27	20-46
	Núm. 20	16	12-35
	Núm. 40	9	8-27
	Núm. 60	8	6-21
	Núm. 100	6	4-16
	Núm. 200	4	2-8
RET. MALLA %			
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	PG 76 - 22
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

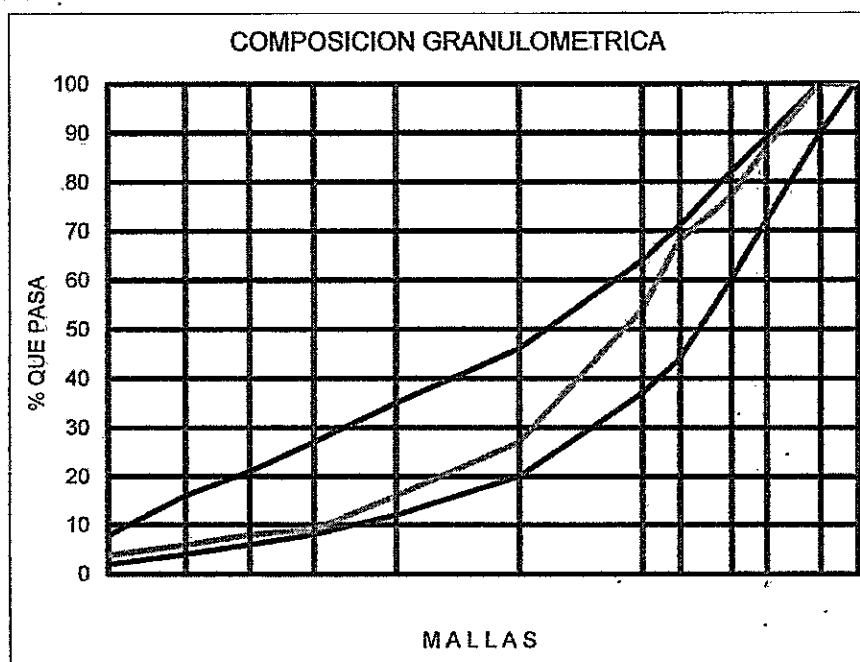

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		172
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2389
ESTABILIDAD, kg.	1138	817.5
FLUJO, mm'	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	4.1	DE 3 A 5
VAM, %	15.4	14 MIN
CONT. CEMASF/PETREO, %	5.5	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES: LA MEZCLA ENSAYADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES NORTE A SUR).	No. DE INFORME :	2
LOCALIZACIÓN:	PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	FECHA INFORME :	2026-07-16
		CIUDAD :	Chihuahua
		ESTADO :	Chihuahua
CLIENTE:	APSA INGENIERIA	CLAVE DE LA OBRA:	

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	Pétreo para carpeta asfáltica T.M. 3/4" (Grava)
	CLASIFICACION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	Roca Caliza
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	Trituración Total
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO "B"	Almacén en Planta de Mezclado
	UBICACION DEL BANCO DE MATERIAL PETREO	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios

[illegible]

SIGNATARIO AUTORIZADO



GEO PAV

NOTICE OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

TESTESULHACOSIDISVALILOTRABAAPULSIREANALIZADA



ACREDITADO C-0977-183/18

PARA TUALDUE REMPLAZADA CON LOS RESULTADOS QUE TENDAMOS QUE LA SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL TELEFONO 06144179 52-52 Y EN EL CORREO ELECTRONICO geodyn@ciencia.unam.mx
 PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOLOGIA DE-IV



GEOPAV S.A. DE C.V.

DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO

INFORME DE CALIDAD DE MATERIAL PÉTREO PARA MEZCLA ASFÁLTICA (MARSHALL)

CÓDIGO

GP-PMA-01

VERSIÓN


01

PÁGINA

1. de 1.

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES NORTE A SUR).	No. DE INFORME:	3
LOCALIZACIÓN:	PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	FECHA INFORME:	2026-07-16
CLIENTE:	APSA INGENIERIA	CIUDAD:	Chihuahua
		ESTADO:	Chihuahua
		CLAVE DE LA OBRA:	-

DATOS DEL MUESTREO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Pétreo para carpeta asfáltica T.M. 3/4" (Sollo)
	CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL	Roca Caliza
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	Trituración Total
	CLASE DE DEPÓSITO MUESTREADO	Almacén en Planta de Mezclado
	UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PÉTREO	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios

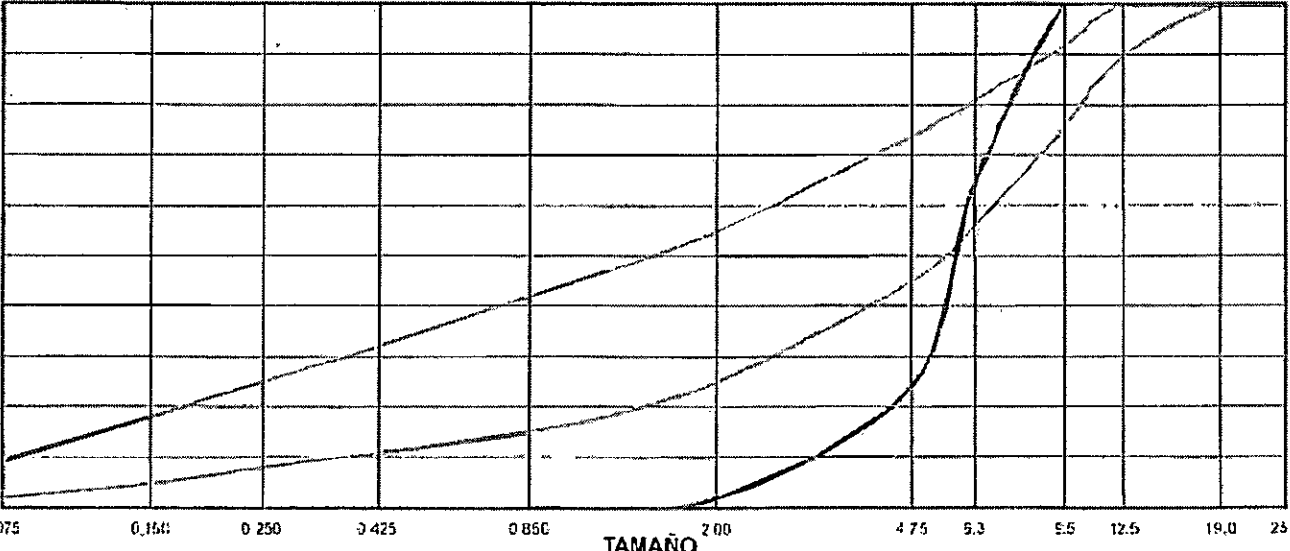COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	MLV.S.S. (Kg/m³):	1634	COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 	
	MALLAS	% QUE PASA		
	1"	25.0	100.0	100-100
	3/4"	19.0	100.0	100-100
	1/2"	12.5	100.0	80-100
	3/8"	9.5	100.0	76-92
	1/4"	6.3	64.0	56-81
	N° 4	4.75	24.0	45-74
	N° 10	2.00	2.0	25-55
	N° 20	0.850	0.0	15-42
	N° 40	0.425	0.0	11-32
	N° 60	0.250	0.0	8-26
	N° 100	0.150	0.0	5-18
	N° 200	0.075	0.0	2-9
	GRAVA			
	DENSIDAD RELATIVA GRAVA	2.610	2.400 Min.	
	DESGASTE DE LOS ANGELES %	21.3	30 % Max.	
	DESGASTE MORCOWAL %	-	18 % Max.	
	INTENSIVIDAD ACCELERADO %	11.30	20% Max.	
	PART. ALARGADAS Y LACRADAS %	-	40% Max.	
	PART. TRITURADAS: CARA %	100	95% Min.	
	PART. TRITURADAS 20 MAS CAPAS %	100	85% Min.	
	DESP. PUN. FLOJOS %	-	20% Max.	
	ABSORCIÓN %	0.77	...	
	ARENA			
	DENSIDAD RELATIVA ARENA	-	2.400 Min.	
	ANGULARIDAD %	-	45 % Min.	
	EQUIV. DE ARENA %	-	50 % Min.	
	AZUL DE METILENO, mg %	-	15 Max.	

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):

OBSERVACIONES:

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

NORMAS

EL MATERIAL PÉTREO DE EXTREM. PÉTREO ANALIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA CARRETERA DE INTERMEDIO. PROYECTO: EN

Ensayo dentro del alcance de acreditación

ASTM D 1557	ASTM D 1557	ASTM D 1557
ASTM D 1557	ASTM D 1557	ASTM D 1557
ASTM D 1557	ASTM D 1557	ASTM D 1557
ASTM D 1557	ASTM D 1557	ASTM D 1557
ASTM D 1557	ASTM D 1557	ASTM D 1557

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

SOLAMENTE PARA

SIGNATARIO AUTORIZADO



PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUE LA REFERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL TELÉFONO (614) 79-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRÓNICO: geopav tecnico@gmail.com
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.



DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO

INFORME DE CALIDAD DE MATERIAL PÉTREO PARA MEZCLA ASFÁLTICA (MARSHALL)

GP-PNA-01

01

1. de 1.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES NORTE A SUR).

4

2026-07-16

PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

Chihuahua

Chihuahua

CLAVE DE LA OBRA:

UBICACION DEL BANCO DE MATERIAL PETRO

PROPORCIONES

25% Sello T.M. de 3/8"

M.V.S.S. (Kg/m ³):		1 684.	
MALLAS		QUE PASA	PROYECTO
1"	25.0	100.0	100-100
3/4"	19.0	100.0	100-100
1/2"	12.5	95.3	90-100
3/8"	9.5	87.5	76-92
1/4"	6.3	71.3	56-81
N° 4	4.75	59.8	45-74
N° 10	2.00	34.8	25-55
N° 20	0.850	21.5	15-42
N° 40	0.425	14.3	11-32
N° 60	0.250	11.5	8-25
N° 100	0.150	9.0	5-18
N° 200	0.075	6.0	2-9


GRAVA

DESGASTE RELATIVA GRAVA	-	2 400 Mm.
DESGASTE DE LOS ANGELES %	-	30 % Max.
DESGASTE MICRODEVAL %	-	18 % Max
INTENSIDAD ACCELERADO %	-	20 % Max.
PART ALFAS 40*5 Y LAJAS %	-	40% Max.
PART ENTUBADAS I CARA %	-	95 % Mm
PART ENTUBADAS 2 CARAS %	-	85 % Mm

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	-	2 400 Mg
ANGULARIDAD %	-	45 % Min
EQUIV. DE ARENA %	-	50 % Min
AZÚL DE METIL. ENO. mg/g	-	15 Max

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

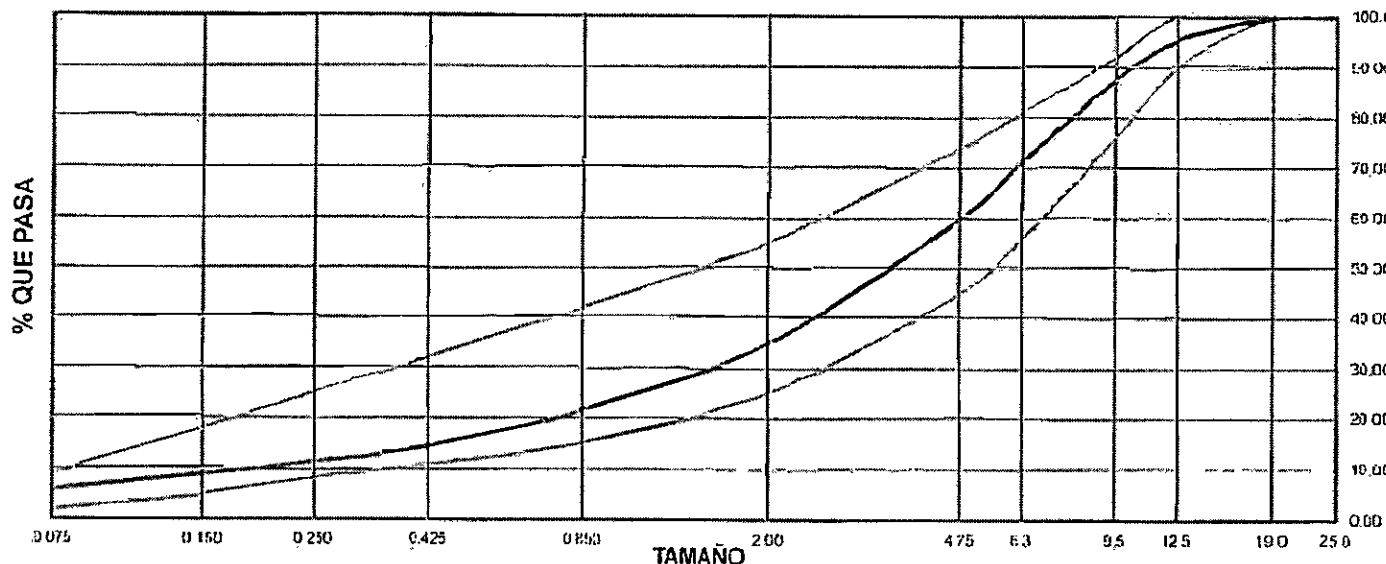

OPINION Y/O INTERPRETACION (CUANDO APLIQUE) :

OBSERVACIONES :

NORMAS DE REFERÊNCIA (MÉTODOS)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
TEL: 773/835-5000 FAX: 773/835-5001
WWW.CHICAGOPRESS.COM

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

[illegible]

*Examen final del proceso de adaptación

AUTM 444.95	MAMF 444.6000	ASSTU 1.38
AUTM 442.74	MAMF 444.6000	ASTM 6.57A
ASTM 4.575	ASTM 6.57A	ASTM 6.57A
ASTM 6.57A	ASTM 6.57A	MAFM 4.0400
MAMF 444.6000	ITC 438A	ASTM 6.57A

SIGNATARIO AUTORIZADO

GEOGRAPHY
LESCOMBREYRUA

ema 
ACREDITADO C-0977-183/1

PARA CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS DE ENTREGAS, QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL TELEFONO (614) 179 52 57 Y EN EL CORREO ELECTRONICO, geopavitecnico@gmail.com



GEOPAV S.A. DE C.V.

DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO

INFORME DE CALIDAD DE MATERIAL PÉTREO PARA MEZCLA ASFÁLTICA (MARSHALL)

CÓDIGO

GP-PMA-01

VERSIÓN

01

PÁGINA

1. de 1.

OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES, CENTRALES NORTE A SUR).

No. DE INFORME:

5

LOCALIZACIÓN:

PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.

FECHA INFORME:

2026-07-16

CIUDAD:

Chihuahua

ESTADO:

Chihuahua

CLIENTE:

APSA INGENIERIA,

CLAVE DE LA OBRA:

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Pétreo para carpeta asfáltica T.M. 3/4" (Mezcla Práctica)

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DEL MATERIAL

Roca Caliza

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO

Trituración Total

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO

Almacén en Planta de Mezclado

UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PÉTREO

Materiales Industriales GCC Nombre de Dios

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA (%)

M.V.S.S. (Kg/m³):		1 787	
MALLAS	% QUE PASA	PROYECTO	
1"	250	100.0	100-100
3/4"	190	100.0	100-100
1/2"	125	95.0	90-100
3/8"	9.5	88.0	76-92
1/4"	6.3	73.0	56-81
Nº 4	4.75	63.0	45-74
Nº 10	2.00	38.0	25-55
Nº 20	0.850	22.0	15-42
Nº 40	0.425	14.0	11-32
Nº 60	0.250	11.0	8-25
Nº 100	0.150	9.0	5-18
Nº 200	0.075	6.0	2-9


GRAVA

DENSIDAD RELATIVA GRAVA	2.690	2.400 Min.
DESGASTE DE LOS ÁNGELES %	21.3	30 % Max
DESGASTE MICRODEVAL %	-	18% Max
INTENSIFICADO ACCELERADO %	11.30	20% Max.
PART. ALARGADAS Y LAJADAS %	-	40% Max.
PART. TRITURADAS Y CARA %	100	95 % Min.
PART. TRITURADAS Y COMASCARAS %	100	85 % Min.
DENS. POR FLOTACIÓN %	-	20% Max.
ABSORCIÓN %	0.62.	-

ARENA

DENSIDAD RELATIVA ARENA	2.680	2.400 Min.
ANGULARIDAD %	45.9	45 % Min.
EQUIV. DE ARENA %	72.8	50 % Min.
AZUL DE METILENO, mg/g	11	15 Max

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

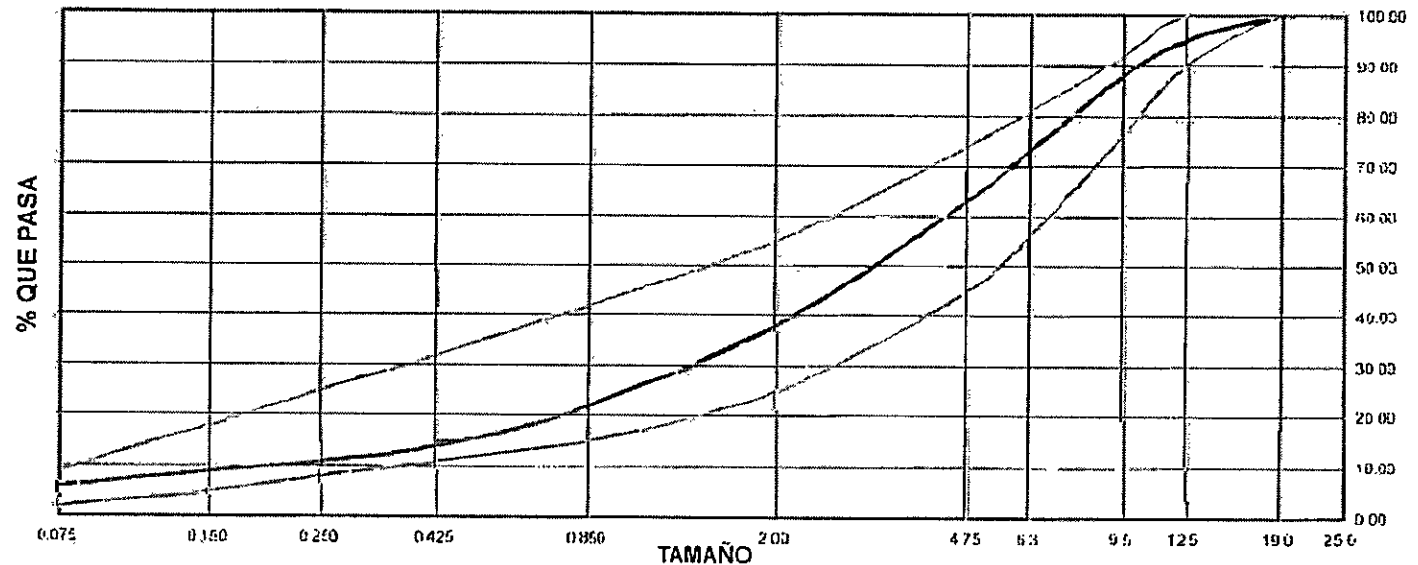

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :

EL MATERIAL PÉTREO QUE SE ENTREGA A LA MEZCLA QUE SE PREPARA SE CONSIDERA ADECUADO PARA EL USO QUE SE LE DA EN LA MEZCLA DE PAVIMENTO.


OBSERVACIONES :

EL MATERIAL QUE SE ENTREGA A LA MEZCLA QUE SE PREPARA SE CONSIDERA ADECUADO PARA EL USO QUE SE LE DA EN LA MEZCLA DE PAVIMENTO. SE LE DA LA ALICATA SE MUESTRA PARA OBTENER UNA MEZCLA DE PAVIMENTO QUE SE LE DA LA ALICATA SE MUESTRA PARA OBTENER UNA MEZCLA DE PAVIMENTO.

NORMAS DE REFERENCIA (MÉTODOS)

Ensayo dentro del alcance de acreditación	
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17
ASTM D 2444 - 17	ASTM D 2444 - 17

SIGNATARIO AUTORIZADO



ACREDITADO C-0977-183/18

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS, QUE SI SU SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL TELÉFONO (614) 170-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRÓNICO: geopavtecnico@gmail.com
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.

 GEOPAV INDUSTRIAS PROMEX S.A. DE C.V.	GEOPAV S.A. DE C.V.	CÓDIGO	GP-DCI-01
	DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO	VERSIÓN	00
	DENSIDAD APARENTE DEL MATERIAL PÉTREO POR INMERSIÓN EN CEMENTO ASFÁLTICO FLUIDIFICADO (DENSIDAD DEL CUERPO DE INGENIEROS)	PÁGINA	1 de 1.

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES NORTE A SUR).	No. DE INFORME:	6
LOCALIZACIÓN:	PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD:	FECHA DE INFORME:	2026-07-16
CONSTRUCTORA:	APSA INGENIERIA	CIUDAD:	Chihuahua
		ESTADO:	Chihuahua
		CVE. DE LA OBRA:	

IDENTIFICACIÓN	
BANCO DE MATERIAL PÉTREO:	Materiales Industriales GCC Nombre de Dios
TIPO DE ASFALTO:	PG 76-22

Muestra No.	Wp (g)	W'a (g)	W'ap (g)	Sp
1	1 501.3	389.4	1 328.6	2.671
2	1 500.8	385.3	1 323.7	2.669
3	1 498.9	390.7	1 328.4	2.671
4	1 501.6	388.9	1 328.0	2.670

$Sp = \frac{Wp}{Wp - (W'ap - W'a)}$	DENSIDAD PROMEDIO ($\bar{Sp}$)
	2.670

DONDE:	
Sp	Densidad aparente del material pétreo por inmersión en cemento asfáltico fluidificado o Densidad del Cuerpo de Ingenieros.
Wp	Peso del material pétreo seco (g)
W'ap	Peso del recipiente con asfalto, varilla y material pétreo, sumergidos en agua. (g)
W'a	Peso del recipiente con asfalto y varilla, sumergidos en agua. (g)

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):	OBSERVACIONES:
N/A	SE INFORMAN RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:	
NINGUNA	
NORMA DE REFERENCIA (MÉTODO):	
M-MMP-4-04-015/15	

 SIGNATARIO AUTORIZADO GEOPAV LABORATORIO DE ENSAYOS NOMBRE Y FIRMA
--

EL RESULTADO SOLO ES VALIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA PARA CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE EMITIMOS. QUEJA O SUGERENCIA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL TELEFONO (614)178-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRONICO: geopav.tecnico@gmail.com PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.



GEOPAV
ESTUDIOS, PROYECTOS Y LABORATORIO

GEOPAV S.A. DE C.V.

DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO

DISEÑO MARSHALL

CÓDIGO

GP-PM-01

VERSIÓN

00

PÁGINA

1 de 1

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES NORTE A SUR)

LOCALIZACIÓN: PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD

CLIENTE: Apsa Ingeniería

No. DE INFORME:

7

FECHA DE MUESTREO:

2026-07-16

CLAVE DE LA OBRA:

MEZCLA DE MATERIAL PÉTREO	MAT. ASFALTICO: PG 76-22	ESPECIFICACIÓN	ESTABILIDAD (KG)	817	TIPO DE MATERIAL: Carpeta Asfáltica Densa PROCEDENCIA: Materiales Industriales GCC Nombre de Dios, Chih.
50% Arena con T.M. de 3/16"	ADITIVO:		VACÍOS (%)	3.0 a 5.0	
25% Grava con T.M. de 3/4"	PROPORCIÓN:		FLUJO (MM)	2.0 a 3.5	
25% Sello con T.M. de 3/8"	COMPACTADO CON:		VAM (%)	14 MIN.	
	TEMPERATURA:		VFA (%)	65 a 75	
					T.M.N.: 1/2"

DENSIDAD CPO INGENIEROS (DMP):

2.670

DENSIDAD DE LA PARAFINA (DP):

0.75

DENSIDAD CEM ASF. (DCAI):

1.025

CONSTANTE DEL ANILLO (CTE):

8.34

PROBETA No.	% C.A.		PESO (g)			VOLUMETRÍA						ESTABILIDAD (KG)					FLUJO	
	AGR	MEZCLA	AIRE	AIRE C/REC	REC. EN AGUA	Gmb ^{1/2} (Kg/m ³)	C.A.	MAT PÉTREO	VACIO	VAM	VFA	MICROM	ESTAB.	ALTURA	FACTOR CORREC	ESTABILIDAD CORREGIDA	0.01"	mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J'	K	L	M	N	O	P	Q
		$\frac{(A) \cdot (B)}{100 - (A) \cdot (B)}$			$\frac{(E) \cdot (D)}{(E) \cdot (D)}$	$\frac{C}{100 - (C) \cdot (D)}$	$\frac{(H) \cdot (F)}{(H) \cdot (F)}$	$\frac{(100 - (I) \cdot (J))}{100}$	$\frac{100 - (G) \cdot (H)}{100}$	$\frac{100 - (J)}{100}$	$\frac{(J') \cdot (J)}{(J') \cdot (J)}$		$\frac{(K) \cdot (L)}{(K) \cdot (L)}$		$\frac{100}{100}$	$\frac{(O) \cdot (N)}{(O) \cdot (N)}$		
1	3.80	3.66	1 194.3	1 195.1	680.2	2 324	8.3	83.9	7.8	16.1	51.5	115	959	6.35	1.003	959		1.80
2	3.80	3.66	1 192.9	1 193.9	680.0	2 327	8.3	84.0	7.7	16.0	51.9	113	942	6.35	1.000	942		1.79
3	3.80	3.66	1 192.3	1 193.0	680.2	2 329	8.3	84.0	7.6	16.0	52.1	112	934	6.38	0.993	927		1.78
	3.80	3.66	1 193.2	1 194.0	680.1	2 327	8.3	84.0	7.7	16.0	51.8	113	945	6.36	0.998	943		1.79
4	4.30	4.12	1 206.7	1 207.4	690.3	2 338	9.4	83.9	6.6	16.1	58.6	118	984	6.39	0.990	974		2.00
5	4.30	4.12	1 205.8	1 206.6	691.0	2 343	9.4	84.2	6.4	15.8	59.5	114	951	6.35	1.000	951		2.07
6	4.30	4.12	1 206.6	1 207.5	690.7	2 340	9.4	84.0	6.6	16.0	59.0	112	934	6.35	1.000	934		2.09
	4.30	4.12	1 206.4	1 207.2	690.7	2 340	9.4	84.0	6.6	16.0	59.0	112	934	6.35	1.000	934		2.09
7	4.80	4.58	1 197.0	1 197.9	689.1	2 358	10.5	84.3	5.2	15.7	67.0	129	1 076	6.35	1.000	1 076		2.50
8	4.80	4.58	1 197.5	1 198.3	690.0	2 361	10.5	84.4	5.1	15.6	67.5	127	1 059	6.34	1.003	1 062		2.41
9	4.80	4.58	1 198.5	1 199.3	689.3	2 355	10.5	84.2	5.3	15.8	66.4	127	1 059	6.36	0.998	1 057		2.42
	4.80	4.58	1 197.7	1 198.5	689.5	2 358	10.5	84.3	5.2	15.7	67.0	128	1 065	6.35	1.000	1 065		2.44
10	5.30	5.03	1 196.2	1 196.9	690.6	2 367	11.6	84.2	4.2	15.8	73.5	129	1 076	6.32	1.008	1 084		3.20
11	5.30	5.03	1 195.5	1 196.4	689.9	2 366	11.6	84.2	4.2	15.8	73.3	131	1 093	6.30	1.013	1 106		3.18
12	5.30	5.03	1 194.4	1 195.3	689.3	2 366	11.6	84.2	4.2	15.8	73.3	130	1 084	6.28	1.018	1 103		3.09
	5.30	5.03	1 195.4	1 196.2	689.9	2 366	11.6	84.2	4.2	15.8	73.4	130	1 084	6.30	1.013	1 098		3.16
13	5.80	5.48	1 202.3	1 203.0	692.6	2 360	12.6	83.5	3.8	16.5	76.7	129	1 076	6.36	0.998	1 073		3.50
14	5.80	5.48	1 202.0	1 203.0	691.5	2 356	12.6	83.4	4.0	16.6	75.9	125	1 043	6.38	0.993	1 035		3.53
15	5.80	5.48	1 201.1	1 201.8	692.4	2 362	12.6	83.6	3.7	16.4	77.1	128	1 068	6.41	0.985	1 052		3.49
	5.80	5.48	1 201.8	1 202.6	692.2	2 359	12.6	83.5	3.9	16.5	76.6	127	1 062	6.38	0.992	1 053		3.51
16	6.30	5.93	1 198.8	1 199.6	688.3	2 350	13.6	82.8	3.6	17.2	78.9	124	1 034	6.38	0.993	1 026		3.75
17	6.30	5.93	1 198.3	1 199.0	687.2	2 346	13.6	82.6	3.8	17.4	78.1	125	1 043	6.37	0.995	1 037		3.85
18	6.30	5.93	1 196.9	1 197.7	686.9	2 348	13.6	82.7	3.7	17.3	78.6	130	1 084	6.35	1.000	1 084		3.84
	6.30	5.93	1 198.0	1 198.8	687.5	2 348	13.6	82.7	3.7	17.3	78.6	126	1 054	6.37	0.996	1 049		3.81

OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE):

N/A

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

NINGUNA

OBSERVACIONES:

SE INTERPRETAN RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA

SIGNATARIO AUTORIZADO



GEOPAV


NOMBRE DEL REPRESENTANTE

ema

ACREDITADO C-0977-183/18

 GEOPAV INSTRUMENTACIÓN Y LABORATORIO	GEOPAV S.A. DE C.V.		CÓDIGO	GP-DM-01
	DIVISIÓN LABORATORIO DE ENSAYO		VERSIÓN	01
	DISEÑO MARSHALL		PÁGINA	1 de 1.
OBRA :	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES CENTRALES NORTE A SUR)		Nº DE INFORME	8
LOCALIZACIÓN :	PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.		FECHA DE INFORME	2026-07-16
CLIENTE :	APSA INGENIERÍA		Ciudad / Estado	Chihuahua
MATERIAL PARA CAPA : Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa			T.M.N.:	3/4"
UBICACIÓN DE PLANTA: Periferico Vicente Lombardo Toledado 14601, Col. Ladrilleros			ESTUDIO:	(X)
UBICACIÓN DEL BANCO: Materiales Industriales GCC Nombre de Dios			REVISIÓN:	()

MATERIAL RESULTANTE DE MEZCLAR:	50%	Arena con T.M. de 3/16"	TIPO DE ASFALTO:	PG 76
	25%	Grava con T.M. de 3/4"		
	25%	Sello con T.M. de 3/8"		

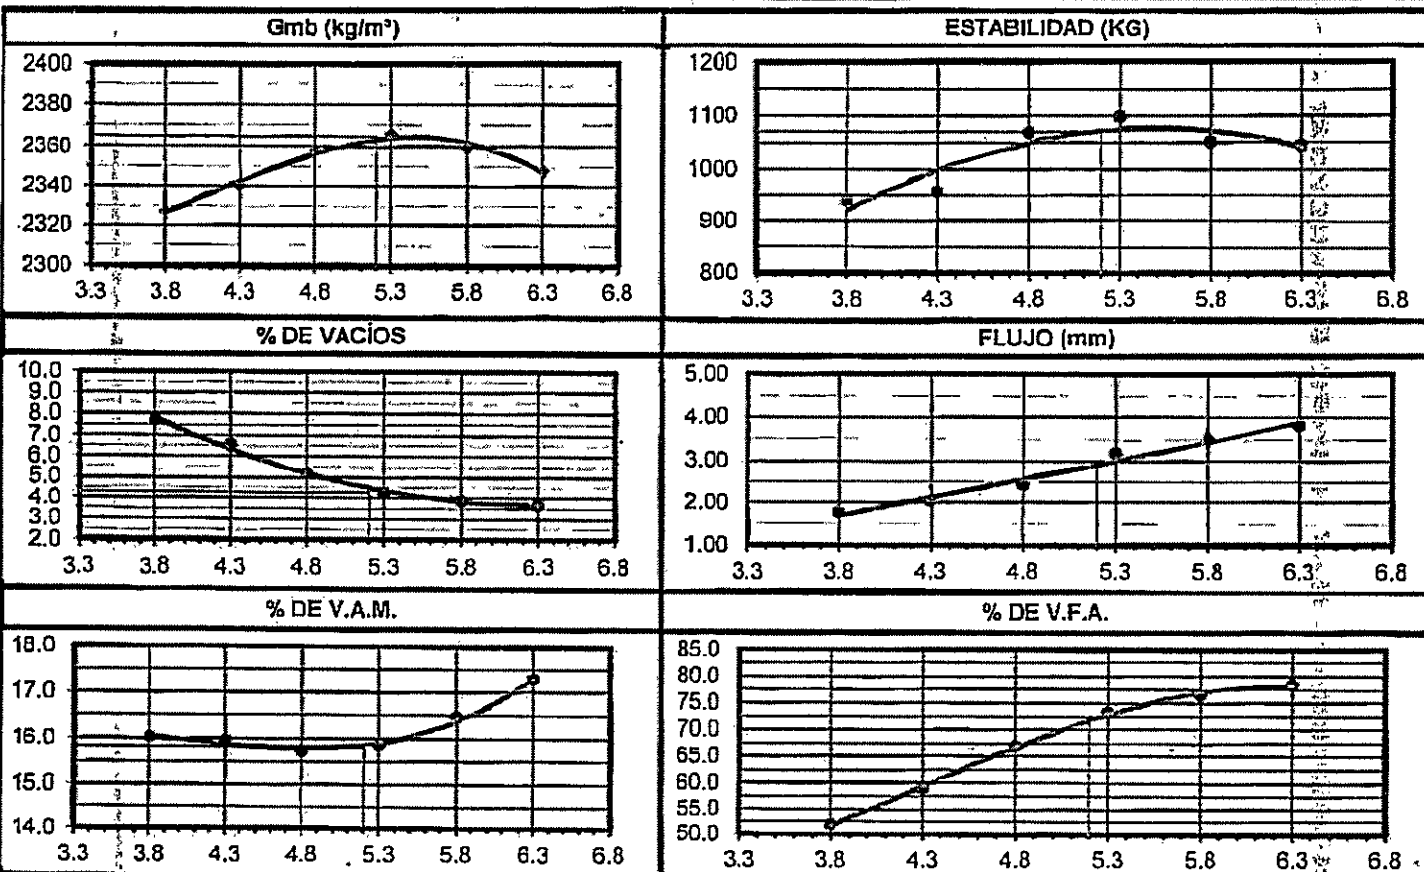

CARACTERÍSTICA	RESULTADO OBTENIDO	ESPECIFICACIONES	OPINIÓN Y/O INTERPRETACIÓN (CUANDO APLIQUE) :
ÓPTIMO CON RESPECTO AL AGREGADO PÉTREO (%)	5.20	± 0.15%	N/A
ÓPTIMO CON RESPECTO A LA MEZCLA (%)	4.94	± 0.15%	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :
PESO ESPECÍFICO (kg/m³)	2365	-	N-CMT-04-04/17 Y SCT N-CMT-4-05-003-16
ESTABILIDAD (kg)	1070	817	NORMA DE REFERENCIA (MÉTODO) :
FLUJO (mm)	3.0	2 a 3.5	SCT: 012-D.05
Va (%)	4.3	3 A 5	OBSERVACIONES :
V.A.M. (%)	15.8	14 MIN.	SE INFORMAN LAS GRÁFICAS DE DISEÑO OBTENIDAS DEL ANÁLISIS DE MUESTRAS ELABORADAS EN LABORATORIO, CON DIFERENTES CONTENIDOS DE CEMENTO ASFÁLTICO, DE LAS CUALES SE DETERMINA EL % ÓPTIMO QUE DEBERÁ SER INCORPORADO EN LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA ESTACIONARIA.
V.F.A. (%)	72.5	65 A 75	
Nº. DE GOLPES :	75	TEMPERATURA :	145°C

 SIGNATARIO AUTORIZADO ING. ALEJANDRO CHACÓN SERNA	 ACREDITADO C-0977-183/18
--	--

PARA CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LOS RESULTADOS QUE ENTREGAMOS, QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN EL TELÉFONO (614) 294-52-57 Y EN EL CORREO ELECTRÓNICO: geopavtecnico@gmail.com
 EL RESULTADO SOLO ES VÁLIDO PARA LA MUESTRA ANALIZADA, PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO DE GEOPAV S.A. DE C.V.



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.
R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL: 614-410-80-32 CHIHUAHUA, CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ


OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF. DE LA PLANTA NIRVANA
JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARRILES CENTRALES NORTE A SUR) FECHA RECIBO 23/07/2026
FECHA INFORME 24/07/2026

MUESTRA MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO AL TENDER
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	90-100
	1/2"	90	72-89
	3/8"	81	60-82
	1/4"	70	44-71
	Núm. 4	60	37-64
	Num. 10	36	20-46
	Núm. 20	20	12-35
	Núm. 40	13	8-27
	Núm. 60	11	6-21
	Núm. 100	8	4-16
	Núm. 200	6	2-8
	RET. MALLA		%

P.V. SECO SUELTO Kg/m ³	
ABSORCION %	
DENSIDAD	
DESGASTE %	
PART. ALARGADAS %	
PART. LAJEADAS %	
EQUIV. ARENA %	
CONTRACCIÓN LINEAL %	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	PG 76 - 22
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

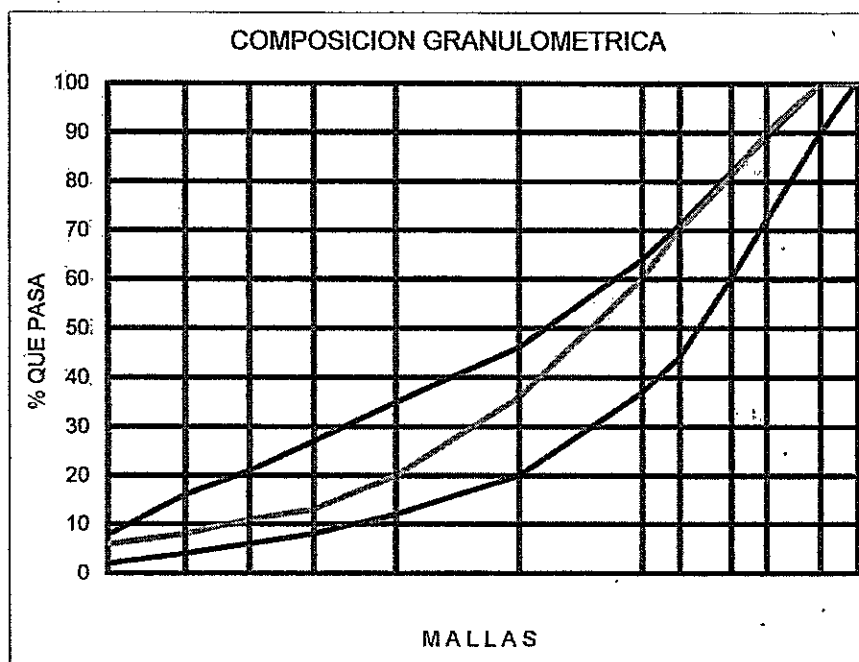

N-CMT.04-04/17

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		170
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2356
ESTABILIDAD, kg.	1189	817.5
FLUJO, mm	2.9	2 - 3.5
VACIOS, %	3.9	DE 3 A 5
VAM, %	15.7	14 MIN
CONT. CEMASF/PETREO, %	5.4	5.4
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONES: LA MEZCLA ENSAYADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO EN CARPETA.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
