DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BASICA

OBRA: **REHABILITACIÓN DE PARQUE EN FRACC. LAS PALMAS IV**


CARACTERISTICAS: REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CIRCUITO MIGRACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS IV, INCLUYE: LUMINARIAS, MALLA CICLONICO, PASTO SINTETICO, MODULO DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y CESTOS DE BASURA.

CONTRATO:	014/2018
MONTO DE CONTRATO:	$1,435,350.00
CONTRATISTA:	INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO:	12/03/2018
FECHA DE INICIO REAL:	12/03/2018
FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO:	30/04/2018
FECHA DE TERMINO REAL:	OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

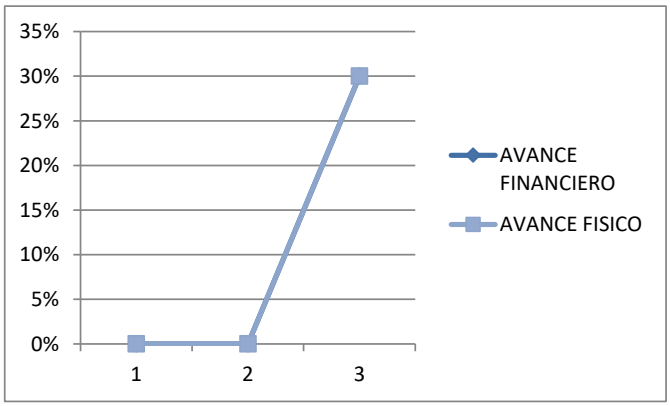

MES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
ENERO:	0.00%	0%
FEBRERO:	0.00%	0%
MARZO:	30.00%	30%
TOTAL:	**30.00%**	**30%**
