Constructora Prourvika S.A. de C. V.

R.F.C. CPR1108125Z8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA
C 327

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedicion:
	03	Pago en una sola Exhibición	2016-12-12T12:46:58	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P.31370

Folio Fiscal
A8C00D7E-D5DF-45E9-B50C-B7D832964B40

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT
00001000000404341938
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000400248443
Fecha y hora de certificación
2016-12-12T12:46:58

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 1, DEL CONTRATO No. 200/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN.	$ 672,089 33	$ 672,089.33
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.---------- RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO:---------- 0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA ----------$ 3,360.45 0.2% DIF----------$ 1,344.18 0.2% CMIC----------$ 1,344.18 0.2% I.C.I.C----------$ 1,344.18 SUMA----------$ 7,392.99 NETO A RECIBIR---------- $ 538,343.54	$ -201,626.80	$ -201,626.80

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M N

SUBTOTAL	$ 470,462.53
DESCUENTO	$
IVA 16.00 %	$ 75,274.00
TOTAL	$ 545,736.53

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DIA ULTIMO DE CADA MES
*EFECTOS FISCALES AL PAGO
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Sello digital del CFDI

PiymOHUCYoPsjSvpIM6/6bQ2llmGv5FSivFYJRlrMCaXfn+sdmAb6Hxao1gwlRt1WkpSEIKMVJJRL6k+7puQHWTMVNY1sfppd3CCIJmohuVj4JYN5udWihM6gkf6hHZvrJddB1Mj2Td3Te5Zu4uuW+CH+6U5kK3VLbQ4Y4+7mqeBeHQhEk37kbn/tt3KgDZXa8WrmlpUHtMTZouqIxeBZe2KGQdsG6Df1X6vA2PUvyRU3AtkGQpozX+crYqywvx7yXaqBo34m6dlxivDdx0WfivZSEdG3H6DpyzE/o1w3tTMAcRxkmzapJNg4+Xz5JS1JOBd3BW7SVlMtExP6pMxqg==

Sello del SAT

P3/V33sUc99l7PaTl/fPNPSoci2z4OtYiaqYKieOEHRolkHH78OkV8EhiGeWiHvd58HvImftqPAsXBwfxNsZNR95XTcy7HTL2EMeSuPWPBdbx1rSwNP0lDD8iC/lz2qbroOuvLouIioZKMry8LvtCvzTrE32aLwtQrb6PqIT6CYWYXGYJmuBJhXcWe2dTkEfMw52AlRyl9vE4MPCgLPmqbPqhqJsQ7b4pj4jpOQ/EFGll6Nt0yhi8gg4iCaNG7r4aMKUm2ZX442fbuT9esf8vOedCSGh4kRyuAnxRWnJPI3Vl1r4qyW88B4k5wzOrMCABQzPbKyyoDOcjz/lun9uA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A8C00D7E-D5DF-45E9-B50C-B7D832964B40|2016-12-12T12:46:58|PymOHUCYoPsjSvpIM6/6bQ2llmGv5FSivFYJRlrMCaXfn+sdmAb6Hxao1gwlRt1WkpSEIKMVJJRL6k+7puQHWTMVNY1sfppd3CCIJmohuVj4JYN5udWihM6gkf6hHZvrJddB1Mj2Td3Te5Zu4uuW+CH+6U5kK3VLbQ4Y4+7mqeBeHQhEk37kbn/tt3KgDZXa8WrmlpUHtMTZouqIxeBZe2KGQdsG6Df1X6vA2PUvyRU3AtkGQpozX+crYqywvx7yXaqBo34m6dlxivDdx0WfivZSEdG3H6DpyzE/o1w3tTMAcRxkmzapJNg4+Xz5JS1JOBd3BW7SVlMtExP6pMxqg==|00001000000404341938||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT

B1SOFT PROVEEDOR AUTORIZADO DEL FACTURA ELECTRONICA
B1SOFT
NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT 83250

SHCP SAT Servicio de Administración Tributaria gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPR1108125Z8	Constructora Prourvika S.A. de C. V	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	**Fecha de Expedición**	**Fecha Certificación SAT**	**PAC que Certificó**
A8C00D7E-D5DF-45E9-B50C-B7D832964B40	2016-12-12T12:46:58	2016-12-12T12:46:58	STB080508339
Total del CFDI	**Efecto del Comprobante**	**Estado CFDI**	
$545,736.53	ingreso	Vigente	

Imprimir

AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA 2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 200/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	$ 3,010,159.61 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	$ 779,623.62 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	$ 718,902.74 CON IVA
RFC	CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	$ 1,498,526.36 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	OBRA NORMAL	$ **656,038.98**	
	OBRA EXTRAORDINARIA	$ **16,050.35**	
	IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	$ **672,089.33**	

DESCUENTOS		
0.5% INSP. Y VIGILANCIA		**3,360.45**
0.2% DIF		**1,344.18**
0.2% CMIC	$	**1,344.18**
0.2% I.C.I.C.	$	**1,344.18**
SUMA DESCUENTOS		**7,392.99**

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	$	**672,089.33**
AMORT ANTICIPO	$	**201,626.80**
SUB-TOTAL	$	**470,462.53**
I.V.A.	$	**75,274.00**
TOTAL	$	**545,736.53**

(CON LETRA)

(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)

DESCUENTOS	$	**7,392.99**
SALDO NETO A RECIBIR	$	**538,343.54**

Vo. Bo.

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE DE OBRA

ELABORO

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZÒ

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

REVISO

ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

AUTORIZO

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CHIHUAHUA, CHIH., 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: **$ 538,343.54**
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. **3 (TRES)** CONTRATO No. **200/2016** POR LA CANTIDAD DE : **$ 3,010,159.61** (INCLUYE CONVENIO)
TRES MILLONES DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

ALCANCE DE LA ESTIMACION	$	**672,089.33**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	**201,626.80**
SUBTOTAL	$	**470,462.53**
IVA	$	**75,274.00**
TOTAL	$	**545,736.53**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
INSP. Y VIGILANCIA 0.5%	3,360.45
DIF 0.2%	1,344.18
CMIC 0.2%	1,344.18
I.C.I.C. 0.2%	1,344.18
SUMA	**7,392.99**

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO		**CONTRATO**
IMPORTE CONTRATADO	$	2,810,953.08
PRIMERA ASIGNACION	$	2,710,389.53
SEGUNDA ASIGNACION	$	100,563.55
CONVENIO MODIFICATORIO	$	199,206.53
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	$	718,902.74
ESTA ESTIMACION	$	779,623.62
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	$	1,498,526.36
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	$	1,211,863.17
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	$	100,563.55
POR EJERCER CONVENIO MODIFICATORIO	$	199,206.53
POR EJERCER	$	1,511,633.25

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO		**CONTRATO**
IMPORTE DE ANTICIPO	$	843,285.92
PRIMERA ASIGNACION	$	813,116.86
SEGUNDA ASIGNACION	$	30,169.06
ACUMULADO ANTERIOR	$	215,670.83
ESTA ESTIMACION	$	233,887.09
ACUMULADO ACTUAL	$	449,557.92
POR AMORTIZAR PRIMERA ASIGNACION	$	363,558.94
POR AMORTIZAR SEGUNDA ASIGNACION	$	30,169.06
POR AMORTIZAR	$	393,728.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.5% INSP. Y VIGILANCIA	DIF 0.2%	CMIC 0.2%	I.C.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	$ 3,098.72	$ 1,239.49	$ 1,239.49	$ 1,239.49
ESTA ESTIMACION	$ 3,360.45	$ 1,344.18	$ 1,344.18	$ 1,344.18
ACUMULADO ACTUAL	$ 6,459.17	$ 2,583.67	$ 2,583.67	$ 2,583.67

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR1108125Z8

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 200/2016

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	OBRA NORMAL	**$ 656,038.98**
	OBRA EXTRAORDINARIA	**$ 16,050.35**

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SUBTOTAL	**672,089.33**
I.V.A.	**107,534.29**
TOTAL	**779,623.62**

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 200/2016

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERIODO: 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Clave	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL									**$ 656,038.98**
	1	**PRELIMINARES**							**$ 3,601.62**
1	1.1	Trazo y nivelación de terreno natural con manguera y estableciendo referencias. incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	816.00	656.87	451.09	205.78	$ 8.11	$ 1,668.88
3	1.3	Excavación con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.00 m de profundidad en una sección de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye: afine de talud y del fondo de excavación, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavación a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	74.80	53.65	38.70	14.95	$ 129.28	$ 1,932.74
	2	**CIMENTACION**							**$ 43,981.31**
4	2.1	Construcción de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centímetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diámetro con f´y= 4,200 kg/cm2, tres varillas de 3/8" en ambos sentidos distribuidas en el ancho de la zapata, T.M.A. de 3/4", comprende la colocación de plantilla de concreto simple de 5 centímetros de espesor con concreto f´c= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye: el habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	272.00	203.00	142.00	61.00	$ 375.77	$ 22,921.97
5	2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de excavación. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	135.32	36.51	26.51	10.00	$ 82.27	$ 822.70
6	2.3	Dala de desplante de 0.15 x 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de ¼" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de f´y= 6,000 kg/cm2 con concreto hidráulico hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 acabado común. Incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	870.40	524.42	364.32	160.10	$ 126.40	$ 20,236.64
	3	**ALBAÑILERIA**							**$ 441,024.41**
7	3.1	Muro de block macizo de la región con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un máximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena en proporción 1:4 colocado a plomo y regla con un máximo de desplome del 0.40%. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1531.36	1012.68	700.23	312.45	$ 220.45	$ 68,879.60
8	3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado pulido fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm máximo de espesor. incluye: agua en pipa para humedecer superficie con una altura de hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3690.36	1447.14	0.00	1447.14	$ 102.48	$ 148,302.91
9	3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidráulico hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 T.M.A. con estructura electro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 10.1 cm y una separación a cada 15.8 cm de fý = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	920.72	574.36	401.50	172.86	$ 115.08	$ 19,892.73
10	3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 x 0.20 m de concreto hidráulico hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 T.M.A, armado con estructura electro soldada de 15 x 20-4 grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de f´y = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: acarreos de materiales, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	870.40	544.76	374.26	170.50	$ 131.86	$ 22,482.13

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 200/2016

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERIODO: 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Clave	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
11	3.5	Losa de concreto hidráulico f´c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto. incluye: acarreo, habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	964.92	718.24	487.99	230.25	$ 531.92	$ 122,474.58
12	3.6	Construcción de piso firme de concreto hidráulico hecho en obra de resistencia f´c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabado pulido con llana metálica. Incluye: preparación de la superficie, arena limpia, grava de la región T.M.A 3/4", nivelación, relleno con material mejorado y/o producto de excavación, apisonado, cimbrado, descimbrado, colado, curado con agua, acarreo de los materiales hasta el lugar de la ejecución de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	679.32	373.37	0.00	373.37	$ 158.00	$ 58,992.46
	4	**INSTALACION ELECTRICA**							**$ 42,576.10**
13	4.1	Instalación eléctrica en cuarto comprende el suministro y colocación de lámpara incandescente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibre 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	68.00	35.00	0.00	35.00	$ 1,216.46	$ 42,576.10
	5	**ACABADOS**							**$ 124,855.54**
14	5.1	Pintura colores básicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparación de la superficie con sellador vinílica clásico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4370.36	1995.60	0.00	1995.60	$ 41.63	$ 83,076.83
15	5.2	Impermeabilización en azotea con emulsión elastomérica base agua, anti reflejante color terracota con resinas acrílicas comprende la limpieza de la losa, sellado de fisuras, humedecido y colocación de impermeabilizante a 2 manos. Incluye: desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza.	m2	964.92	460.27	0.00	460.27	$ 90.77	$ 41,778.71
OBRA EXTRAORDINARIA									**$ 16,050.35**
	EXT.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 2.10 M DE ALTURA Y 0.90 MTS DE ANCHO INCLUYE MARCO METALICO, MATERIAL MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA,EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	pza	0.00	5.00	0.00	5.00	$ 2,043.74	$ 10,218.70
	EXT.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINO ANONIZADO NATURAL DE 1.0 M DE ALTURA Y 1.0 MTS DE ANCHO CON VIDRIO CLARO DE 3 MM INCLUYE, MOSQUITERO,MATERIAL MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA,EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	pza	0.00	5.00	0.00	5.00	$ 1,166.33	$ 5,831.65

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

15 de noviembre de 2016

ING. CARLOS ALONSO RUACHO VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 03 de noviembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1",** que al amparo del contrato **No. 200/2016,** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Suministro y colocación de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 mts de ancho incluye marco metálico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	$ 2,043.74
EXT.02	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 mts de ancho con vidrio claro de 3 mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	$ 1,166.33
EXT.03	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts, dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción... hasta dos metros de profundidad, incluye la compactación del fondo de la excavación al 90 % de su PVSM.	170	m3	$ 184.66
EXT.04	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	102	m3	$ 117.29
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto f'c = 100 kg/cm2.	272	m2	$ 399.64

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.**municipiochihuahua**.gob.mx

	Incluye: materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, proporción 1:5, elaboración y colocación de concreto para relleno, agua, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra...y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f´c= 100 kg/cm2.	100	m3	$	1,827.81
EXT.07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f´c= 200 kg/cm2.	51	m3	$	2,277.72
EXT.08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye: habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8".	24,557.52	kg	$	25.25
EXT.09	Aplanado de yeso en losa y muros interiores acabado pulido de 2.5cm de espesor, a una altura de 0,00 m a 3,50 m incluye material, desperdicios de los materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2,700.00	m2	**NO PROCEDE**	
EXT.10	Construcción de chaflán de 10 cms de altura por 10 cms de ancho con mortero-cemento arena incluye: materiales, desperdicios de los materiales, andamios, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	748	ml	$	112.59
EXT.11	Pretil a base de muro de adobón de 7x14x28 cms acabado normal, incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	150	m2	$	385.70
EXT.12	Colocación de botaguas de lámina galvanizada cal 26 de 10 cms x 10 cms, incluye, material necesario para su fijación, cortes, desperdicios, fijación a chaflán/o pretil, mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	500	m	$	164.86
EXT.13	Demolición de concreto simple existente en el lugar, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, retiro del	25	m3	$	519.21

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

	material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
EXT.14	Suministro y colocación de caliche cribado en cimentaciones compactado al 90 % de su P.V.S.M., incluye, herramienta, equipo, mano de obra, compactación, retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	48	m3	$	258.62

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO $1'539,261.05 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcn*

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.**municipiochihuahua**.gob.mx

	ESTIMACION 3 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1 PERIODO: DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			TRAZO Y NIVELACION	EXCAVACION	ZAPATA	RELLENO	DALA DESPLANTE	MURO DE BLOCK	CASTILLO	CADENA CERRAMIENTO	LOSA
				1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.3	3.4	3.5
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	M2	M3	PZA	M3	M	M2	M	M	M2
1	ISABEL SALGADO CHAVIRA	MINA SAN CARLOS 17541	EL PORVENIR	11.23	0.76	4.00	0.48	9.45	18.00	10.50	9.45	12.62
2	BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE	CHE GUEVARA 413	20 ANIVERSARIO	12.34	0.76	4.00	0.48	10.13	19.35	10.32	10.13	13.79
3	MARIA SANCHEZ URBINA	CDP 611	20 ANIVERSARIO	12.68	1.08	4.00	0.74	9.99	19.28	11.34	9.99	14.16
4	MARIA LERMA MOLINA	DESIERTO DE CHALBI 17914	SAHUAROS	11.80	0.54	2.00	0.36	13.16	27.32	10.50	13.16	13.94
5	ALICIA CELIS JUAREZ	RIO EBRO 2202	RIBERA DE SACRAMENTO	12.69	0.81	3.00	0.54	7.76	15.31	8.61	10.73	13.86
6	BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	ARCOS 3933	EL PORVENIR	11.70	0.76	4.00	0.48	9.43	17.88	10.50	9.43	13.15
7	FRANCISCA PALMA MORENO	DIEGO LUCERO 1022	20 ANIVERSARIO	12.43	0.81	3.00	0.54	7.09	12.10	7.97	7.09	13.88
8	DAYSI MACEDONIA RAMOS	MINA VICTORIA 3707	EL PORVENIR	11.84	0.76	4.00	0.48	13.46	28.06	10.50	13.46	13.29
9	CLAUDIA ZEFERNIA HERNANDEZ	RIO MISSOURI 25901	RIBERA DE SACRAMENTO	11.82	1.08	4.00	0.74	9.30	15.21	10.67	9.30	13.27
10	GEORGINA VARGAS PEÑA	DESIERTO MOJAVE 3526	EL PORVENIR	11.02	0.57	3.00	0.36	6.55	14.57	7.77	6.55	12.21
11	CLAUDIA RODRIGUEZ ACEVEZ	RIO ODRA 1625	RIBERA DE SACRAMENTO	11.90	1.08	4.00	0.74	9.68	17.26	10.70	9.68	11.97
12	ESTHER PEÑA SOTO	RIO RINH 2427	RIBERA DE SACRAMENTO	13.26	1.08	4.00	0.74	9.15	17.85	11.34	9.15	14.77
13	CARLOS GUSTAVO CHAVIRA	RIO GUADIANA 1810	RIBERA DE SACRAMENTO	12.40	1.08	4.00	0.74	10.80	19.98	10.70	10.80	13.86
14	MARIA ELIZABETH NORIEGA	RIO AMMUR 2225	RIBERA DE SACRAMENTO	10.75	0.54	2.00	0.36	4.33	9.25	7.42	7.90	12.33
15	MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ	METALURGICA NACIONAL 1	JUAN GUERECA	13.24	1.08	4.00	0.74	9.21	19.25	11.34	9.21	14.74
16	MARIA FORTUNATO D ELA CRUZ	LOTE 7 MANZANA 660	GRANJAS DEL VALLE	12.48	1.08	4.00	0.74	9.86	20.56	11.34	13.72	14.59
17	LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ	ANTIMONIO 1206	JUAN GUERECA	12.20	1.08	4.00	0.74	10.75	21.22	11.34	10.75	13.82
			SUBTOTAL 1	**205.78**	**14.95**	**61.00**	**10.00**	**160.10**	**312.45**	**172.86**	**170.50**	**230.25**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

BZURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.23	M2

	M	M	M2
	LARGO	ANCHO	ÁREA
	3.73	3.01	11.23

3.01

TOTAL **11.23 M2**

3.73

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA
DOMICILIO : C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.76	M3

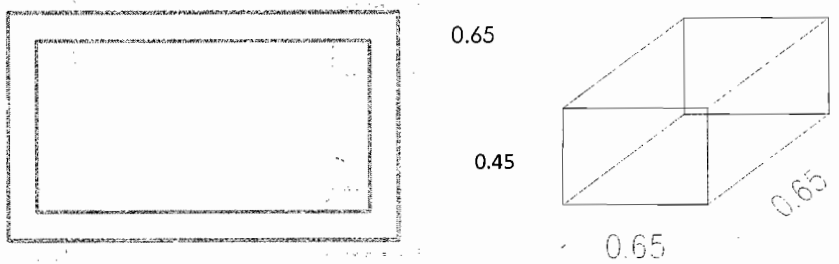

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.45	0.19
2	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19

TOTAL **0.76 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DIS"INTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



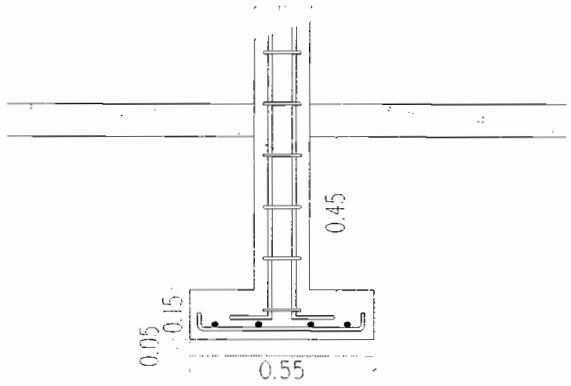

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.48	M3

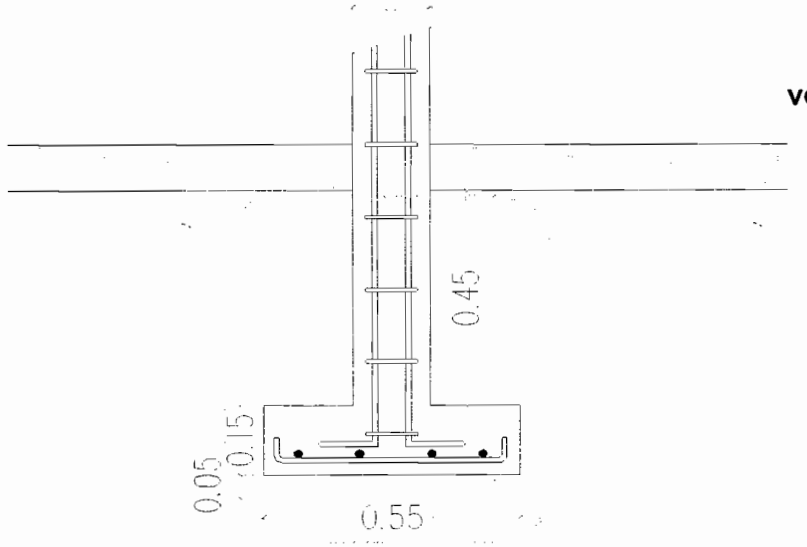

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.45 x 4 =	0.76
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 X 4=	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.21 X 4 =	-0.04
TOTAL		0.48 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.45	m

MURO EXIST.	LONGITUD MUROS	
	1	3.01
	2	3.01
	3	3.43

3.01

3.01

TOTAL **9.45 M**

3.43

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDD EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	18.00	M2

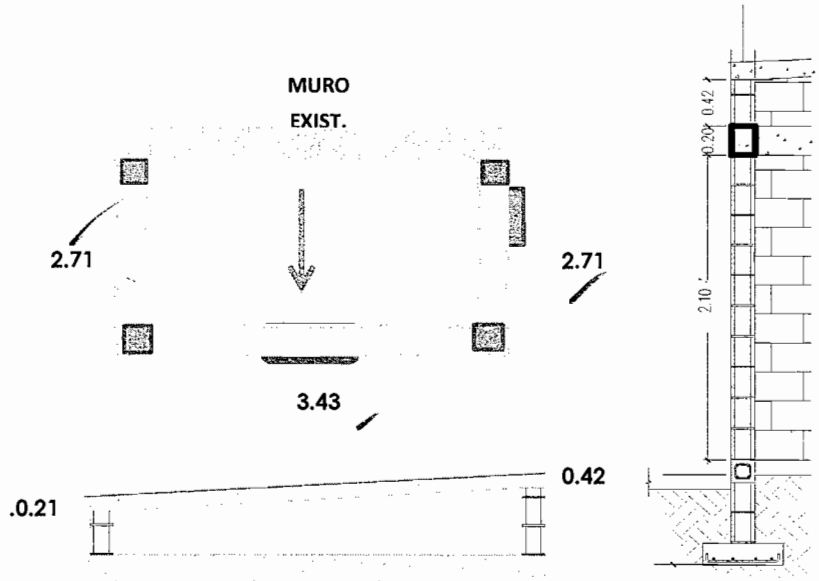

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.71	2.10	5.69
2	2.71	2.10	5.69
3	3.43	2.10	7.20
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.71	0.32	0.87
2	2.71	0.32	0.87
3	3.43	0.21	0.72

TOTAL **18.00** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.50	M

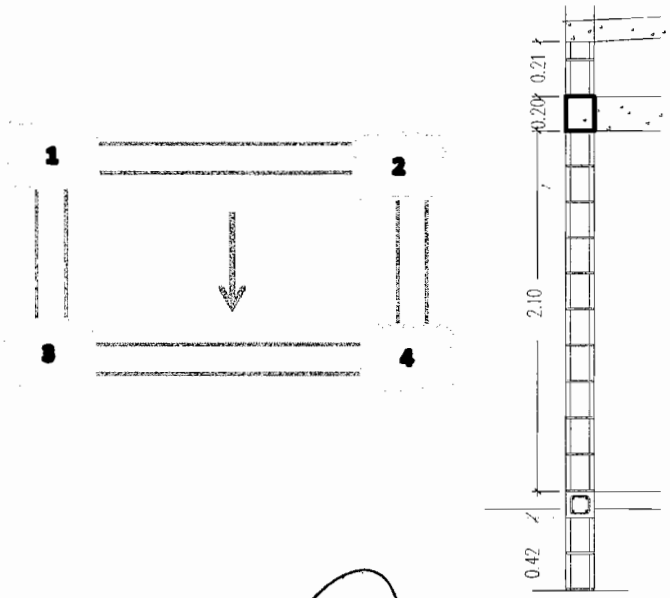

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.52
4	2.52

TOTAL 10.50 **M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.45	M

		M
MURO		LONGITUD MUROS
EXIST.	1	3.01
	2	3.01
	3	3.43
3.01	3.01	
	TOTAL	9.45 M
3.43		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	12.62	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
3.93		3.93	3.21	12.62
	3.21			

TOTAL **12.62 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ISABEL SALGADO CHAVIRA
DOMICILIO : **C.MINA SAN CARLOS # 17540 COL. EL PORVENIR**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

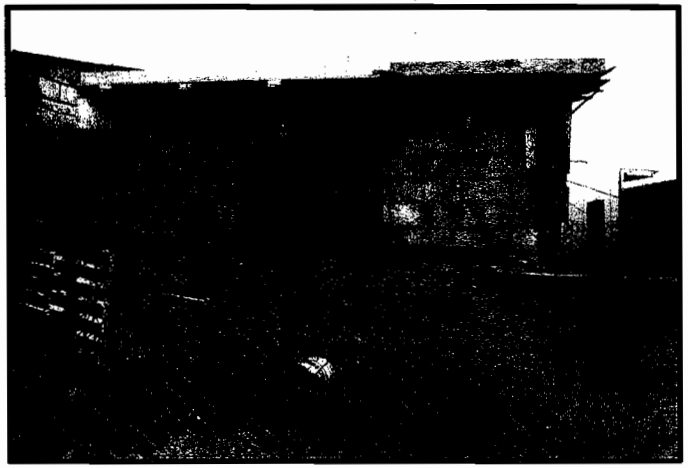

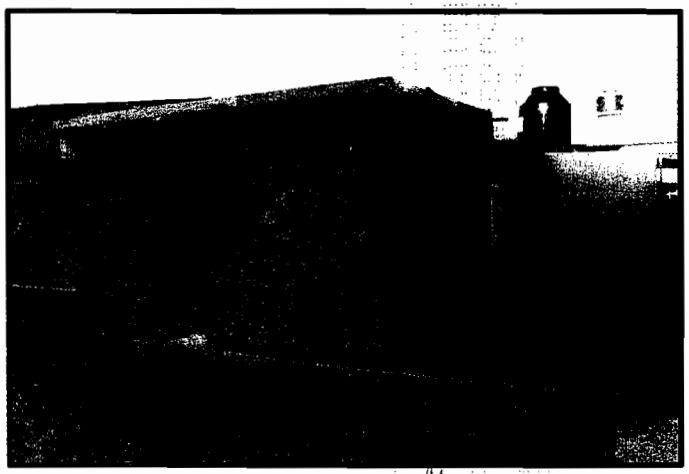

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGNAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.34	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	3.63	3.40	12.34

MURO EXIST 3.4

3.63

TOTAL 12.34 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.76	M3



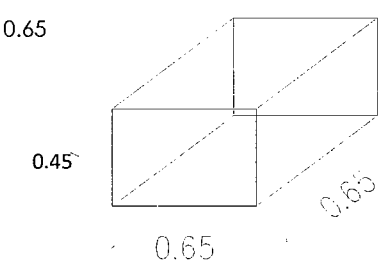

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.45	0.19
2	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19
4	0.65	0.65	0.45	0.19

TOTAL **0.76 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIOO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



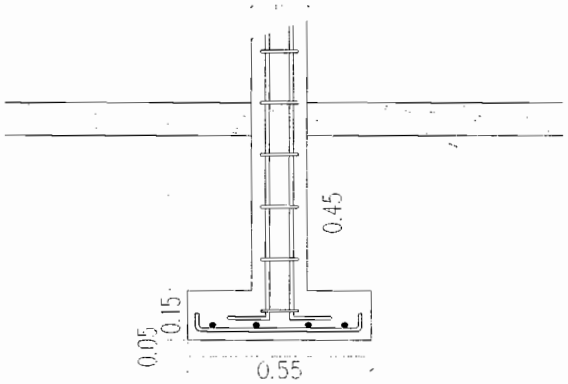

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.48	M3

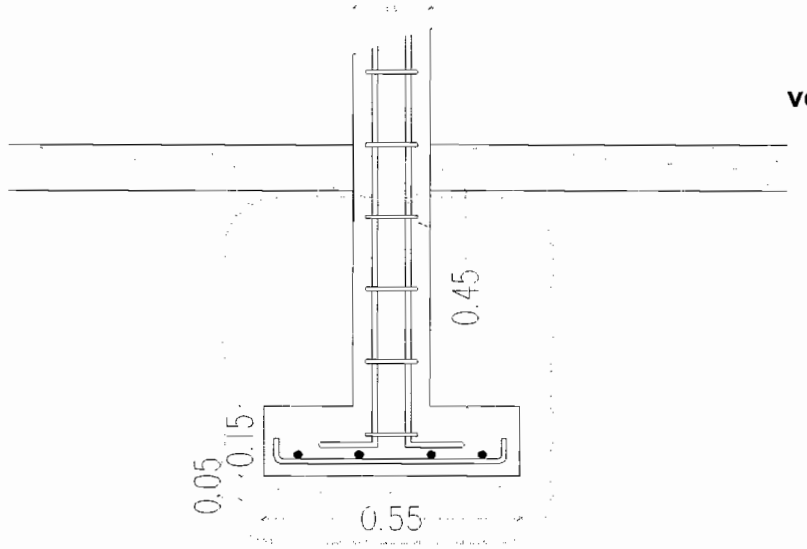

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.45 x 4 =	0.76
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.21 x 4 =	-0.04

TOTAL **0.48** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.13	m

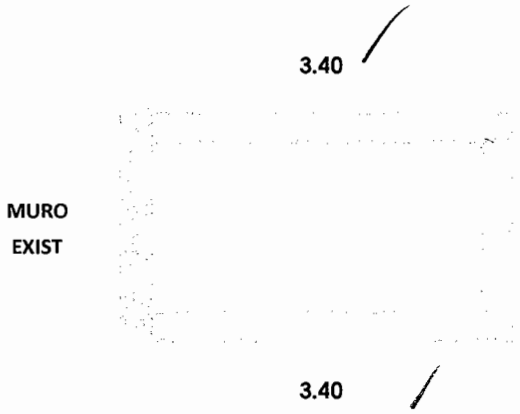

LONGITUD MUROS

1	3.40
2	3.33
3	3.40

TOTAL 10.13 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	19.35	M2

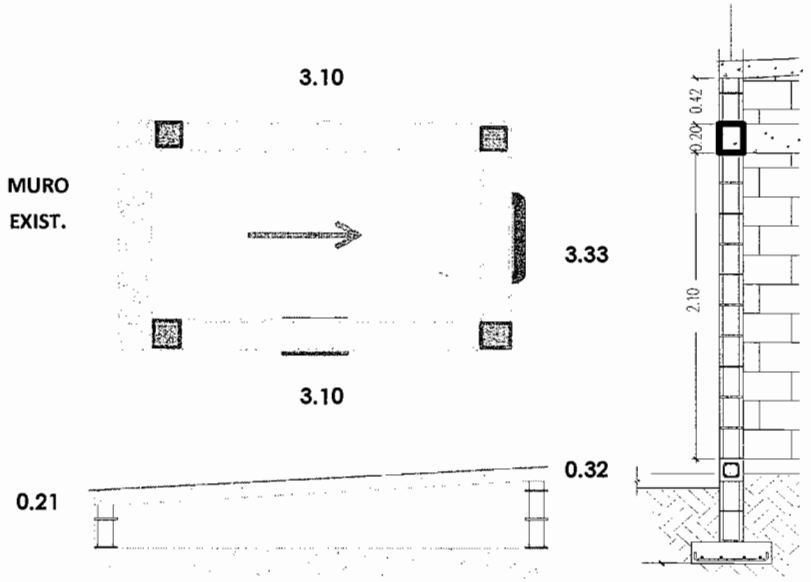

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.10	2.10	6.51
2	3.33	2.10	6.99
3	3.10	2.10	6.51
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.10	0.27	0.84
2	3.33	0.21	0.70
3	3.10	0.27	0.84

TOTAL 19.35 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.32	M

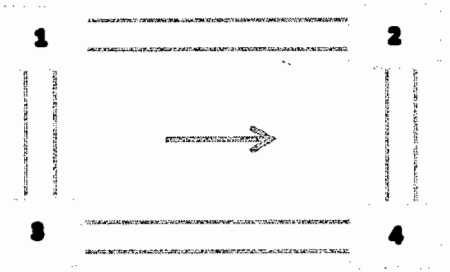



4.33 LOSOTROS 2

CASTILLO	M ALTURA	
1		2.64
2		2.52
3		2.64
4		3.52

TOTAL 10.32 **M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEOA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.13	M

			M
	3.40	LONGITUD MUROS	
		1	3.40
		2	3.33
		3	3.40
MURO EXIST	3.33		
		TOTAL	10.13 M
	3.40		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.79	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
3.83		3.83	3.60	13.79
3.6				

TOTAL **13.79 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

DOMICILIO : C.CHE GUEVARA # 413 COL. 20 ANIVERSARIO


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

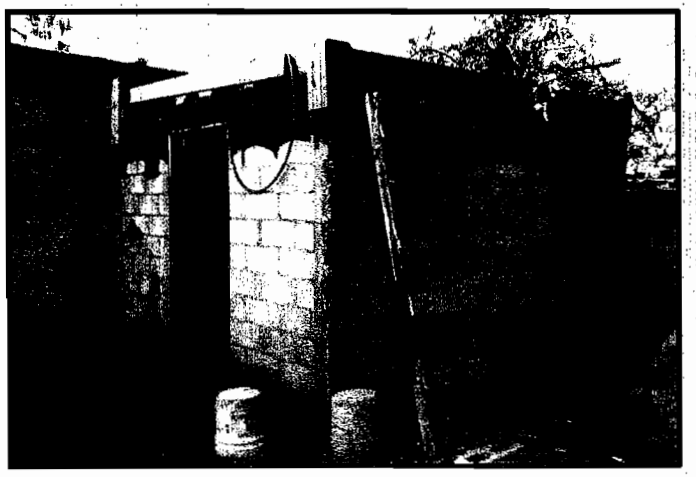



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDD EL USO PARTA FINES OISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.68	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	3.10	4.09	12.68

MURO EXIST



TOTAL **12.68 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

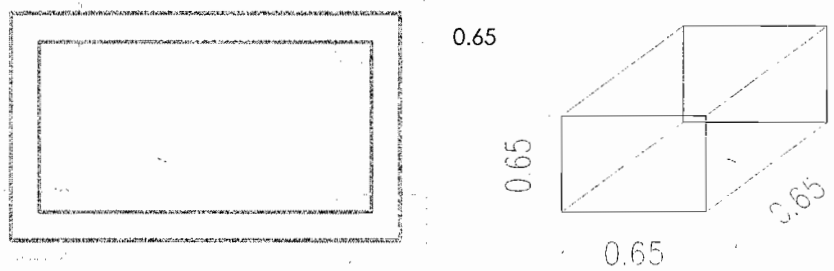

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



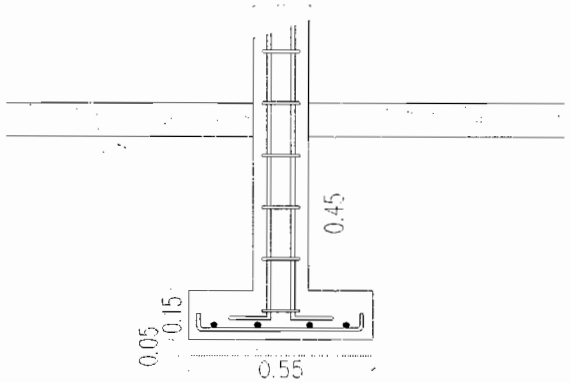

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

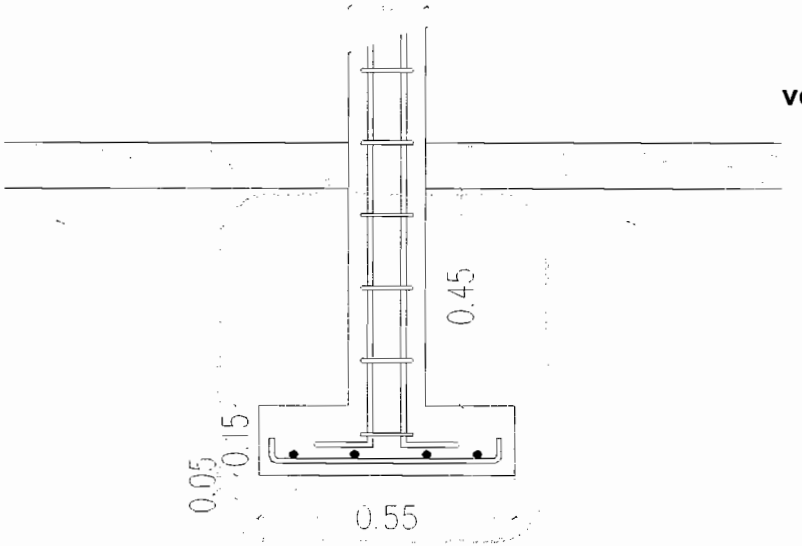

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10
TOTAL		**0.74 M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.99	m

LONGITUD MUROS

1	3.10
2	3.79
3	3.10

3.10

MURO EXIST

3.79

TOTAL 9.99 M

3.10

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	19.28	M2

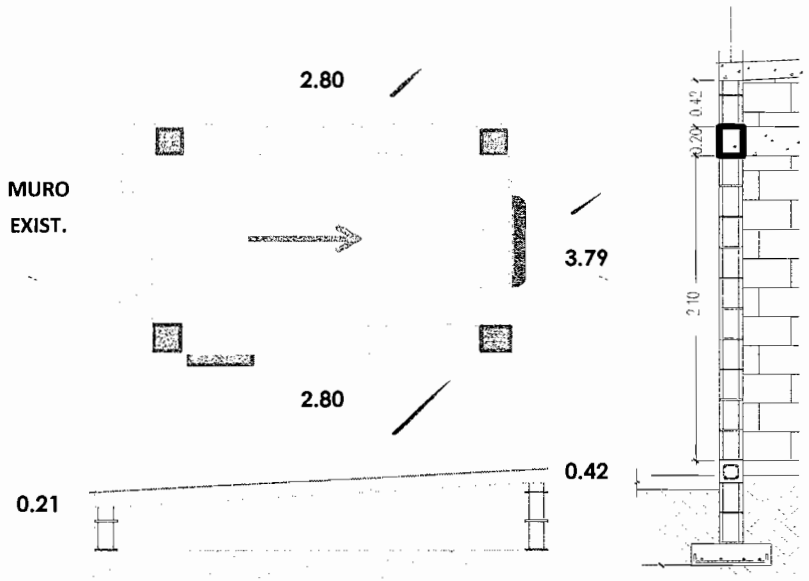

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.80	2.10	5.88
2	3.79	2.10	7.96
3	2.80	2.10	5.88
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.80	0.32	0.90
2	3.79	0.21	0.80
3	2.80	0.32	0.90

TOTAL 19.28 **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

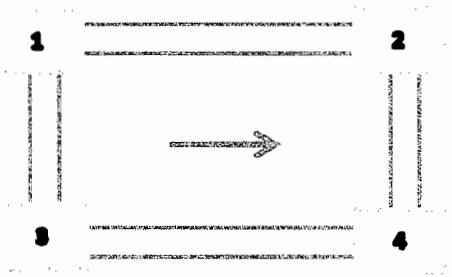

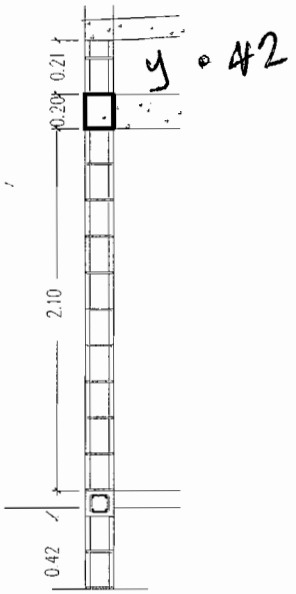

y = 42

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.73
3	2.94
4	2.73
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIOO POLITICO,QUEOA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.99	M

M

3.10

LONGITUD MUROS

1	3.10
2	3.79
3	3.10

MURO EXIST 3.79

TOTAL 9.99 M

3.10

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIOOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	14.16	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.29		4.29	3.30	14.16
	3.30			

TOTAL **14.16 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.80	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
3.63	3.25	11.80



TOTAL **11.80 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016.

PERIODO: 24/11/2016 al 30/11/2016.


BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA


DOMICILIO : C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.54	M3

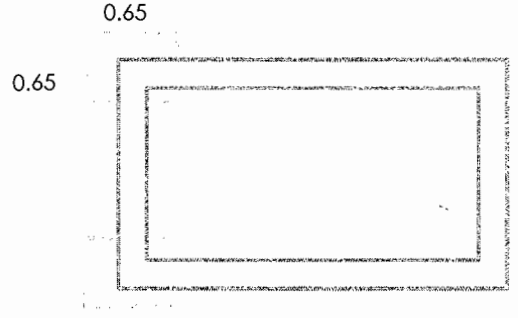

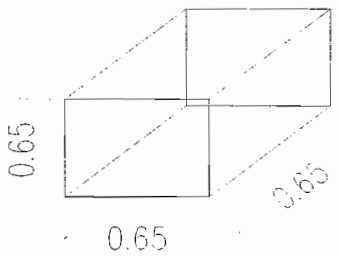

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **0.54 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 NOV 2016

PERIODO: 24 NOV 2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	2.00	PZA

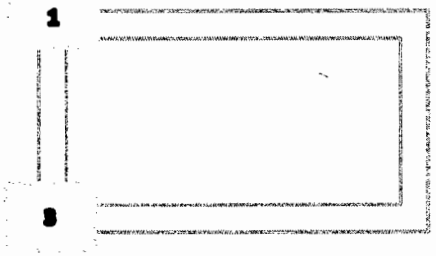

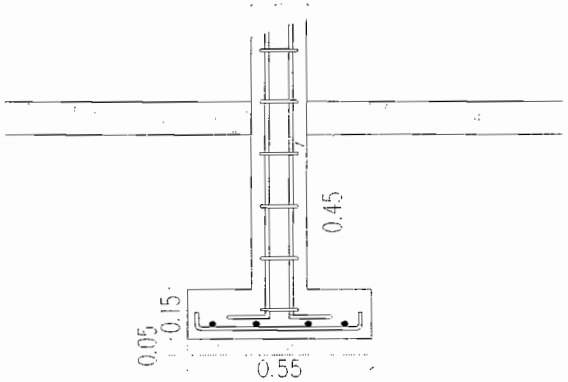

TOTAL 2.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016.

PERIODO: 24/11/2016. 30/11/2016.


BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.36	M3

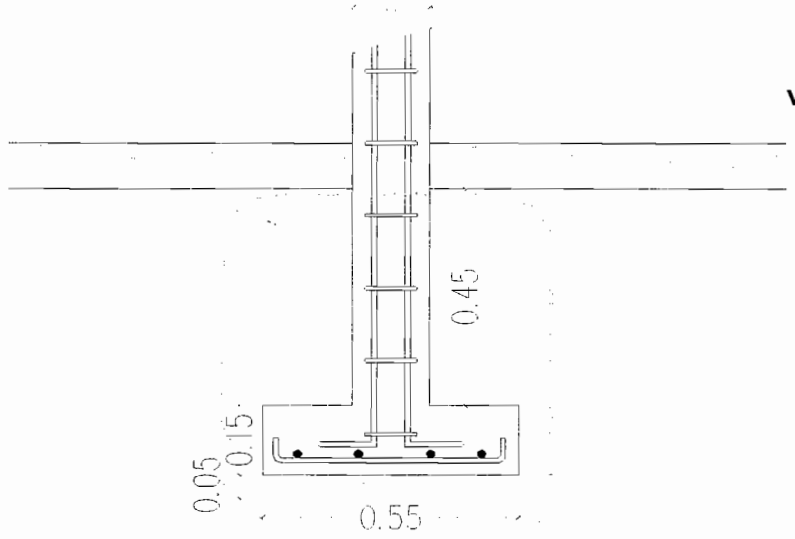

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 2 =	0.54
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 2 =	-0.12
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.06

TOTAL 0.36 **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016.

PERIODO: 24/11/16 AL 30/11/16

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	13.16	m

SE CONSTRUYERON LOS 4 MUROS

LONGITUD MUROS

1	3.63
2	2.95
3	3.63
4	2.95

TOTAL 13.16 M

3.63

2.95 2.95

3.63

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016.

PERIODO: 24/11/16 al 30/11/16.

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA


DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	27.32	M2

SE CONSTRUYERON LOS CUATRO MUROS.

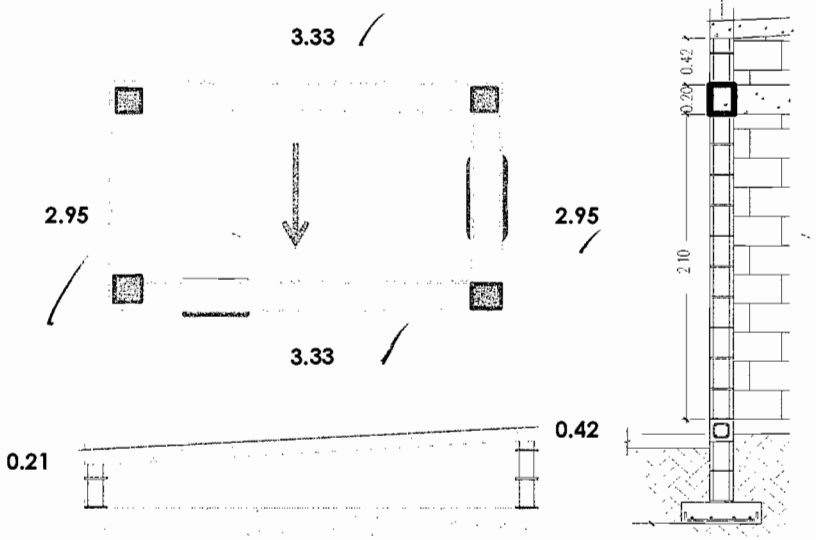

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.33	2.10	6.99
2	2.95	2.10	6.20
3	3.33	2.10	6.99
4	2.95	2.10	6.20
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.33	0.42	1.40
2	2.95	0.32	0.94
3	3.33	0.21	0.70
4	2.95	0.32	0.94

TOTAL 27.32 **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016.

PERIODO: 24/11/16 al 30/11/16.


BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.50	M

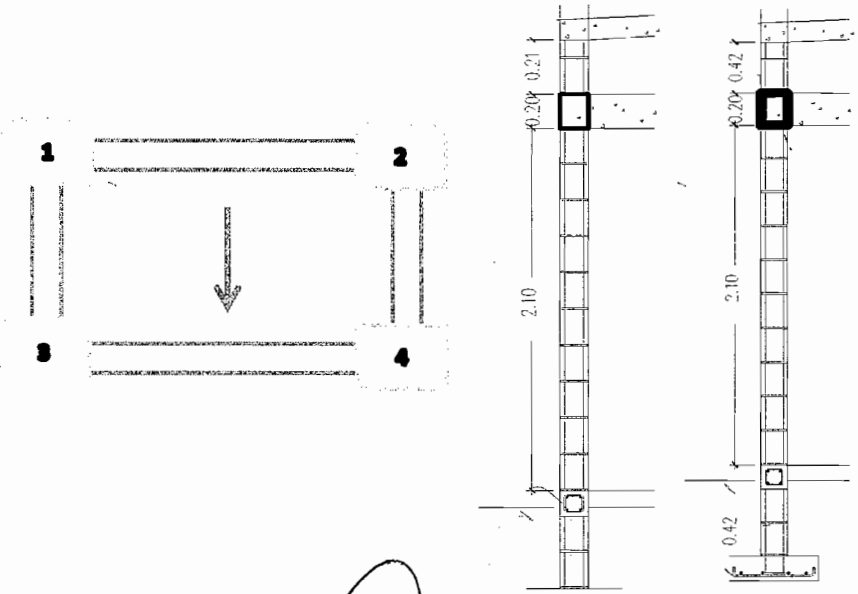

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.94
3	2.31
4	2.31
TOTAL	**10.50 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016.

PERIODO: 24/11/16 al 30/11/16

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	13.16	M

M

LONGITUD MUROS

1	3.63
2	2.95
3	3.63
4	2.95

TOTAL 13.16 M

3.63

2.95 2.95

3.63

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016

PERIODO: 24/11/16 al 30/11/16.

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.94	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.03	4.03	3.46	13.94
3.46			

TOTAL **13.94 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 Nov 2016.

PERIODO: 24/11/16 al 30/11/16.

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA


DOMICILIO : C. DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



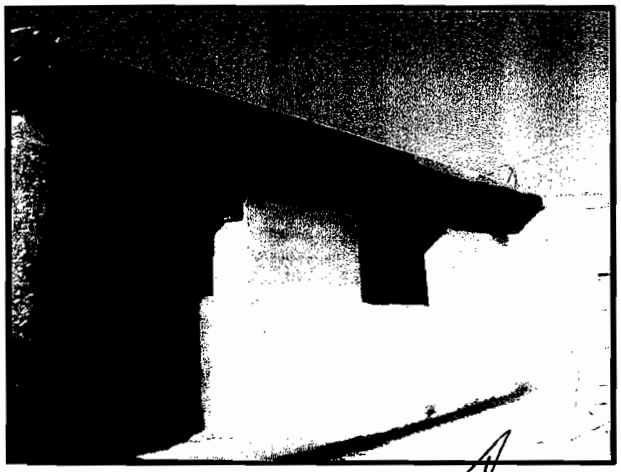

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.69	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	3.88	3.27	12.69

MURO EXIST

3.27

3.88

TOTAL 12.69 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDD EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ
DOMICILIO : C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.81	M3

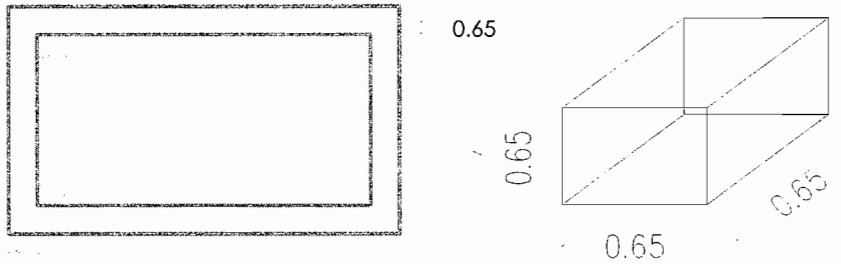

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **0.81 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,OUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	3.00	PZA

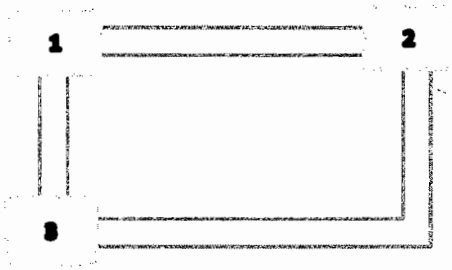

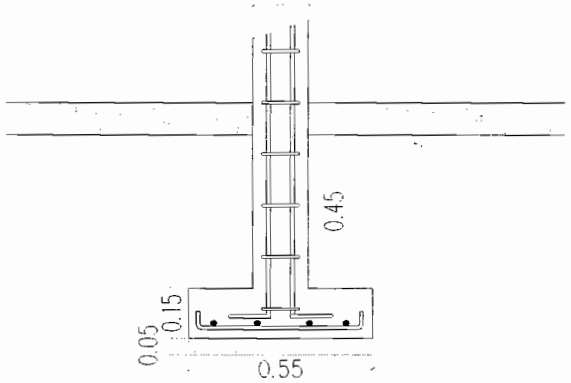

TOTAL **3.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.54	M3

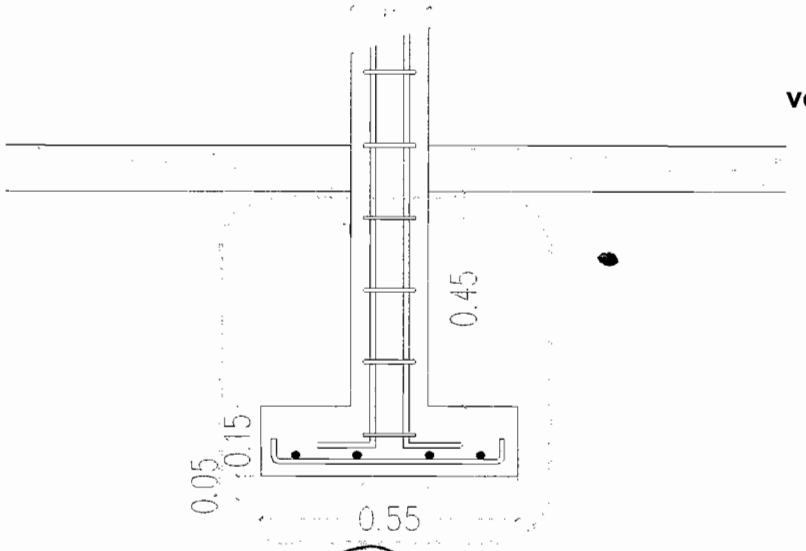

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 3 =	0.81
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x3=	-0.18
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 3 =	-0.09
TOTAL		0.54 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	7.76	m

LONGITUD MUROS

1	3.88
2	0.00
3	3.88

TOTAL **7.76 M**

3.88

MURO EXIST

3.88

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	15.31	M2

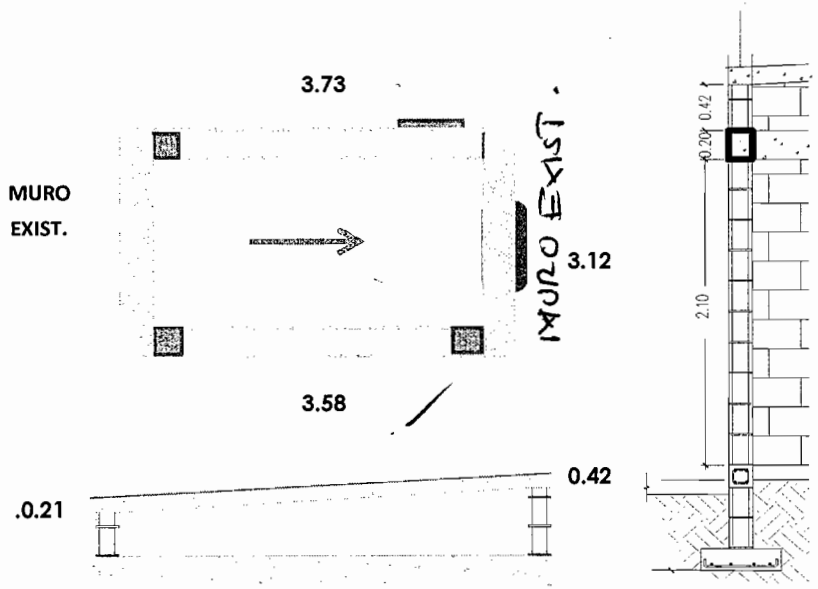

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.73	2.10	7.83
2	3.12	0.00	0.00
3	3.58	2.10	7.52
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.73	0.32	1.19
2	3.12	0.21	0.66
3	3.58	0.32	1.15

TOTAL 15.31 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIOO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	8.61	M

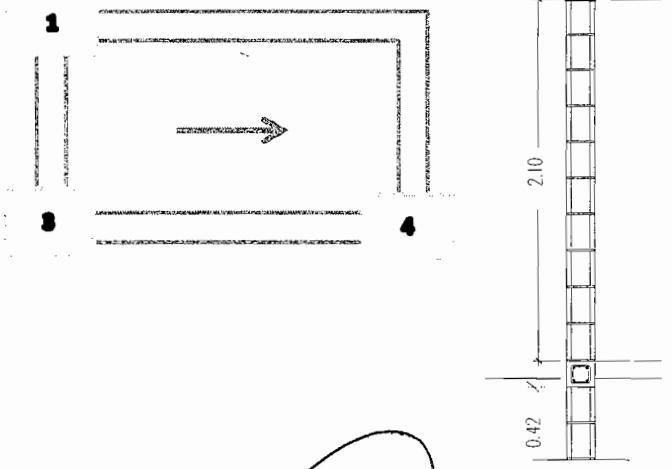

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	0.00
3	2.94
4	2.73
TOTAL	**8.61 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PRDHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.73	M



	M
LONGITUD MUROS	
1	3.88
2	2.97
3	3.88

TOTAL 10.73 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.86	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.20		4.20	3.30	13.86
	3.3			
	TOTAL			13.86 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

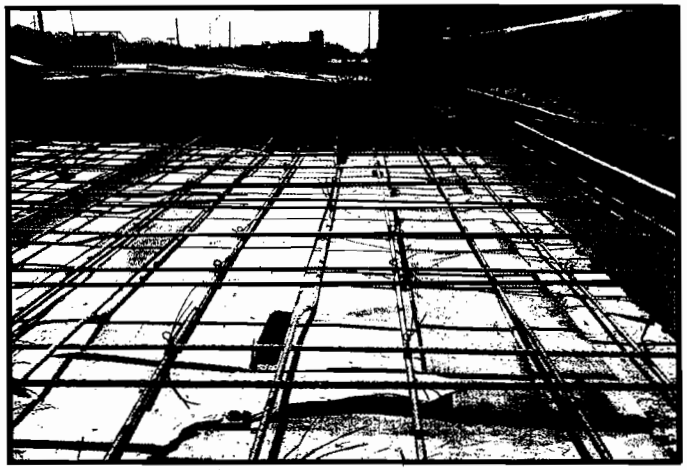



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.70	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.35	2.69	11.70

2.69

4.35

TOTAL **11.70 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.76	M3

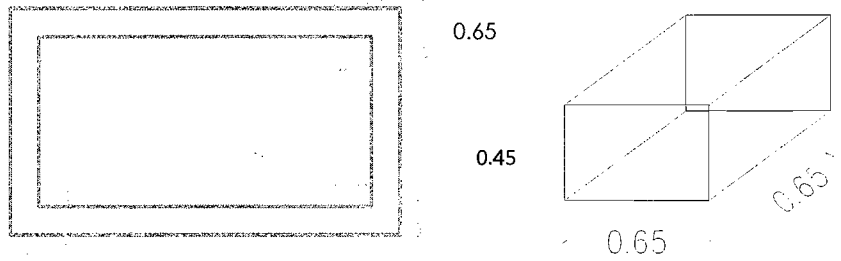

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.45	0.19
2	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19
			TOTAL	**0.76 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIOO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

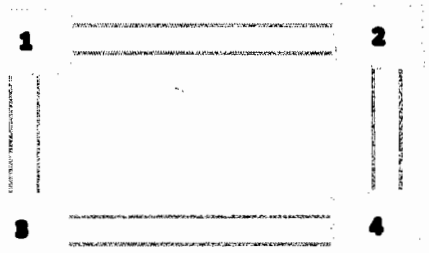

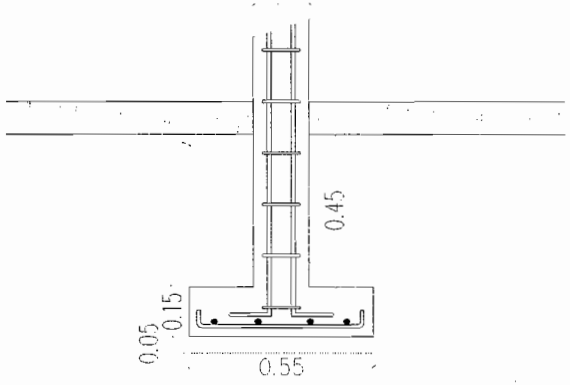

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.48	M3

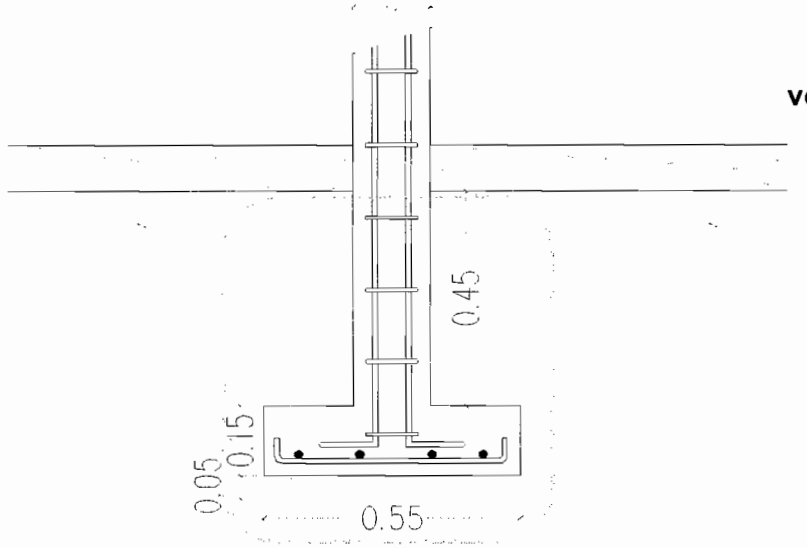

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.45 x 4 =	0.76
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 X 4=	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.21 X 4 =	-0.04

TOTAL **0.48** **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.43	m

MURO EXIST.

LONGITUD MUROS	
1	2.69
2	2.69
3	4.05

2.69 2.69

4.05

TOTAL 9.43 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	17.88	M2

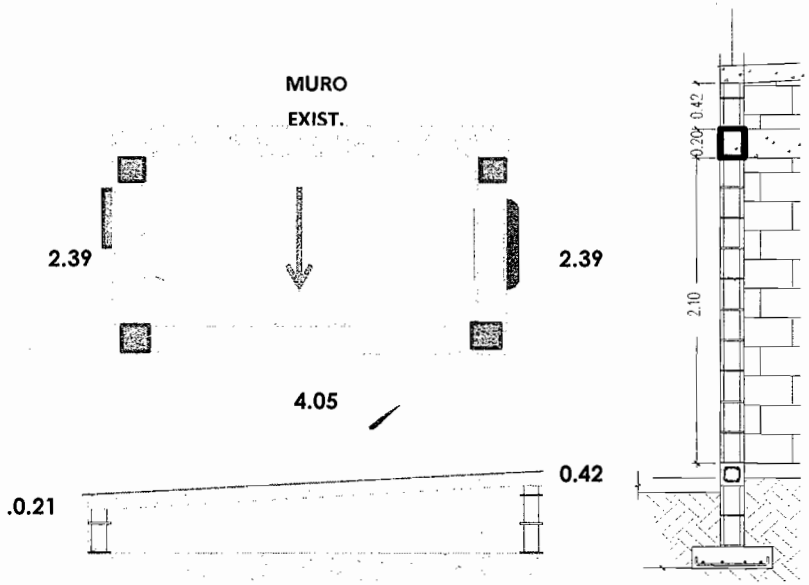

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.39	2.10	5.02
2	2.39	2.10	5.02
3	4.05	2.10	8.51
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.39	0.32	0.76
2	2.39	0.32	0.76
3	4.05	0.21	0.85

TOTAL **17.88** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSDS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICD,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos tisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.50	M

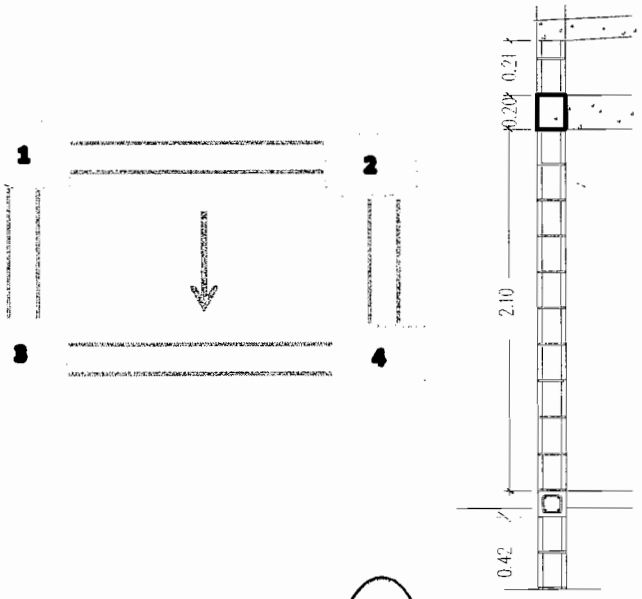

CASTILLO	M ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.52
4	2.52

TOTAL 10.50 **M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.43	M

M

MURO	LONGITUD MUROS	
EXIST.	1	2.69
	2	2.69
	3	4.05

2.69 2.69

4.05

TOTAL 9.43 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEOA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.15	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.55	4.55	2.89	13.15
2.89			

TOTAL **13.15 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

DOMICILIO : C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

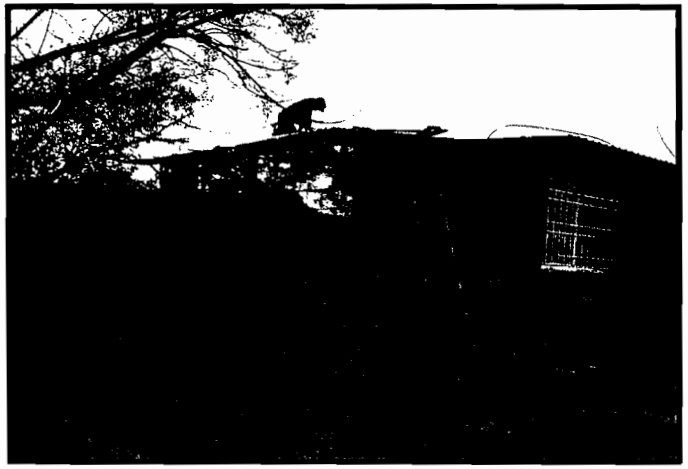

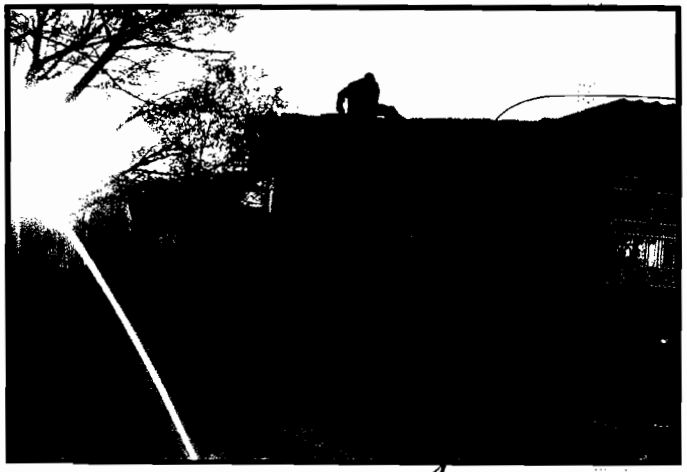

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.43	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	3.50	3.55	12.43

MURO EXIST

3.55

3.50

TOTAL **12.43 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSDS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO
DOMICILIO : C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.81	M3



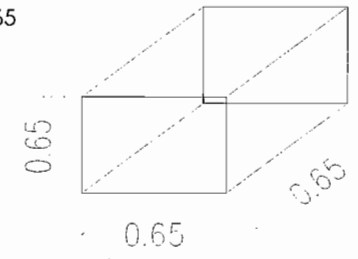

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **0.81 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	3.00	PZA



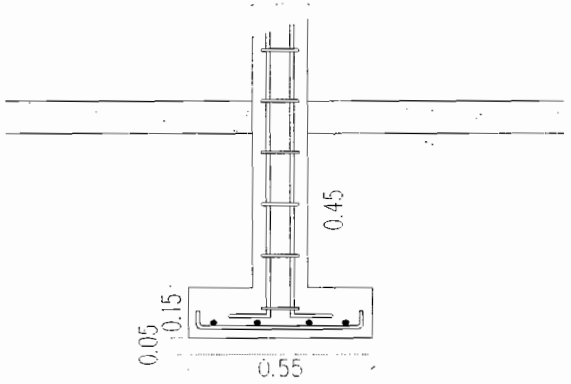

TOTAL **3.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.54	M3

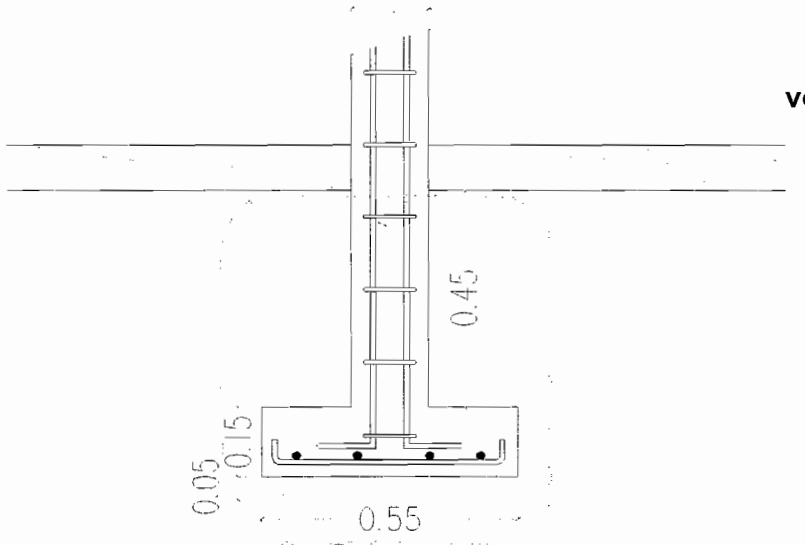

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 3 =	0.81
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x3=	-0.18
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 3 =	-0.09
	TOTAL	**0.54 M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	7.09	m

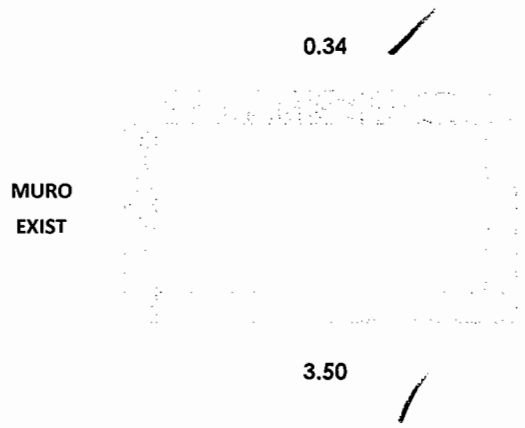

LONGITUD MUROS

1	0.34
2	3.25
3	3.50

TOTAL **7.09 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDD POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	12.10	M2

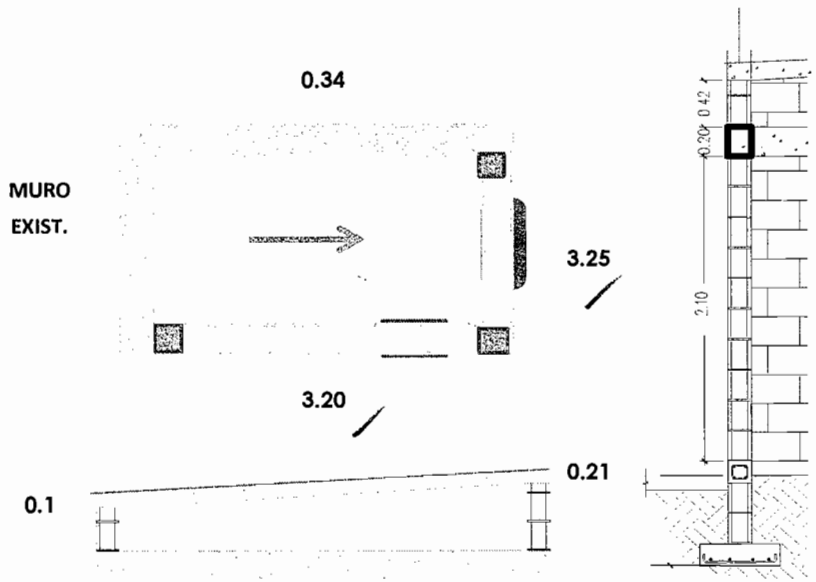

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	0.34	2.10	0.71
2	3.25	2.10	6.83
3	3.20	2.10	6.72
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	0.34	0.12	0.04
2	3.25	0.10	0.33
3	3.20	0.16	0.51

TOTAL **12.10** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	7.97	M

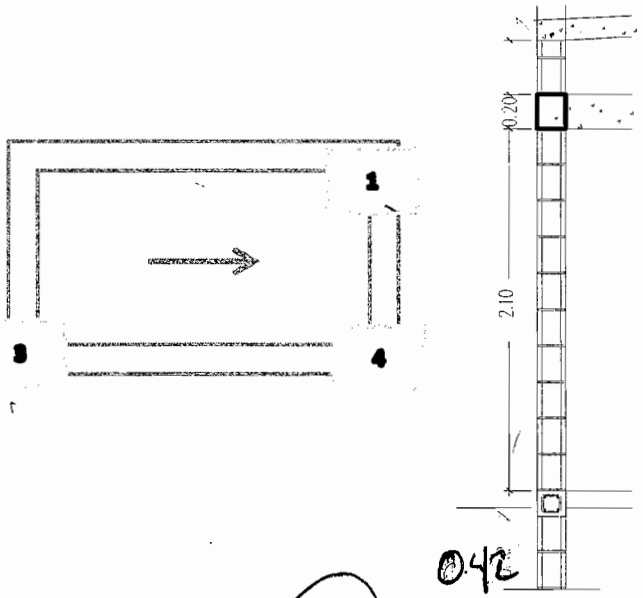

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.62
2	0.00
3	2.73
4	2.62
TOTAL	**7.97 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	7.09	M

			M
	0.34	LONGITUD MUROS	
		1	0.34
		2	3.25
		3	3.50
MURO EXIST	3.25		
		TOTAL	7.09 M
	3.50		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.88	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
3.75		3.75	3.70	13.88
	3.7			

TOTAL **13.88 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO
DOMICILIO : **C.DIEGO LUCERO # 1022 COL. 20 ANIVERSARIO**

No. CONTRATO: **200/2016**
No. ESTIMACION: **3**

Testigo fotografico cuarto adosado

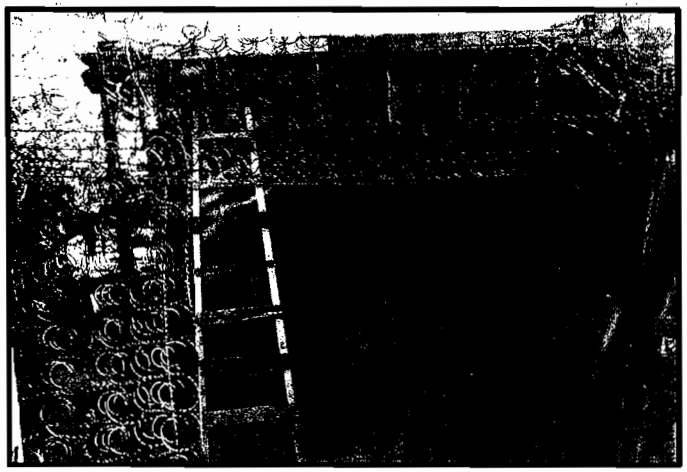



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.84	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.23	2.80	11.84

2.80

4.23

TOTAL **11.84 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDD EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.76	M3

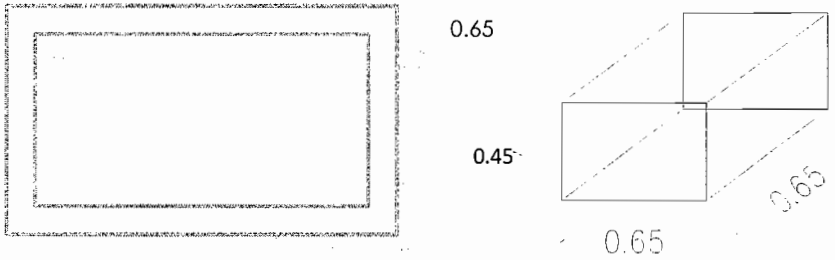

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.45	0.19
2	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19

TOTAL **0.76 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



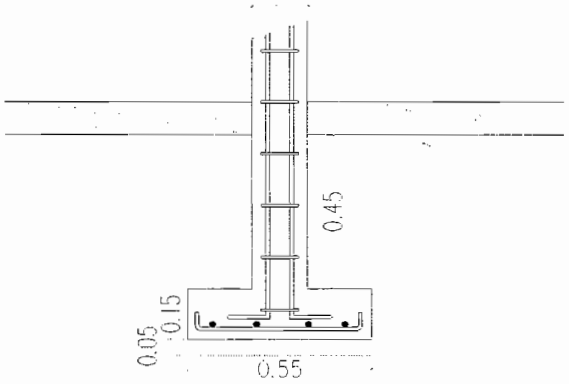

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.48	M3

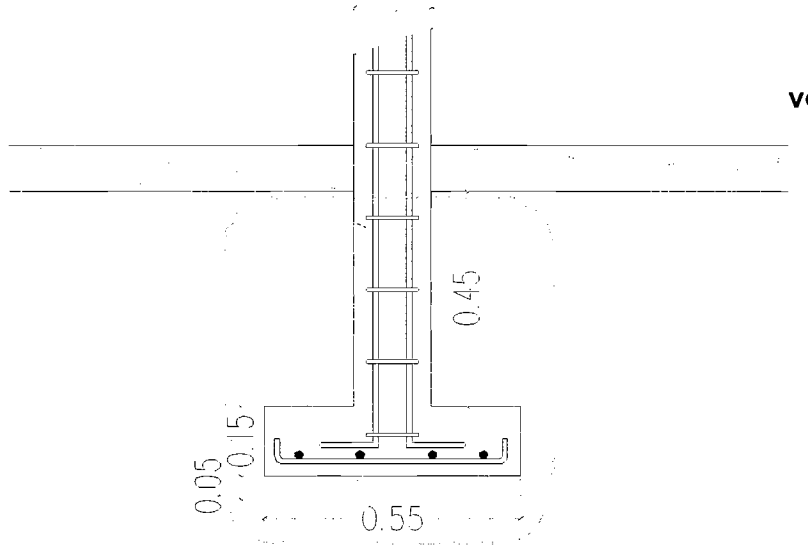

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.45 x 4 =	0.76
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 X 4=	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.21 X 4 =	-0.04

TOTAL **0.48** **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	13.46	m

4.23

2.5 2.50

4.23

LONGITUD MUROS

1	2.50
2	4.23
3	4.23
4	2.50

TOTAL 13.46 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDD POLITICO,QUEDA PROHIBIDD EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	28.06	M2

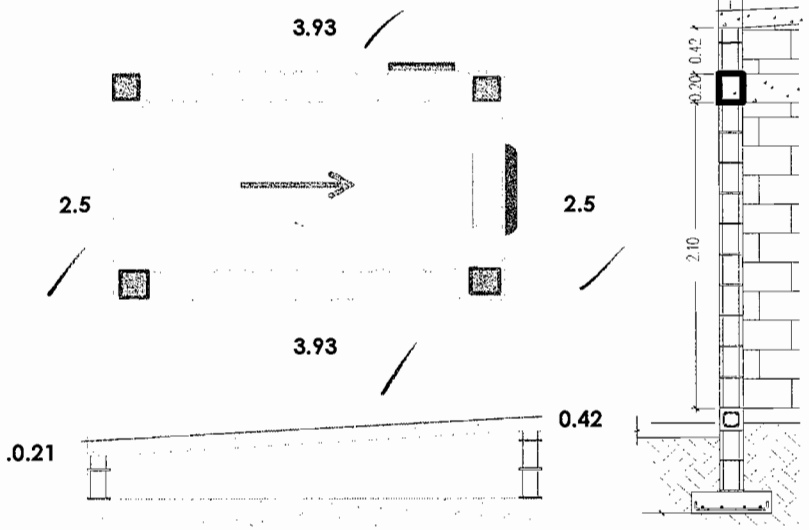

SE HICIERON LOS CUATRO MUROS.

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.93	2.10	8.25
2	2.50	2.10	5.25
3	3.93	2.10	8.25
4	2.50	2.10	5.25
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.93	0.32	1.26
2	2.50	0.42	1.05
3	3.93	0.32	1.26
4	2.50	0.21	0.53
TOTAL			**28.06 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.50	M

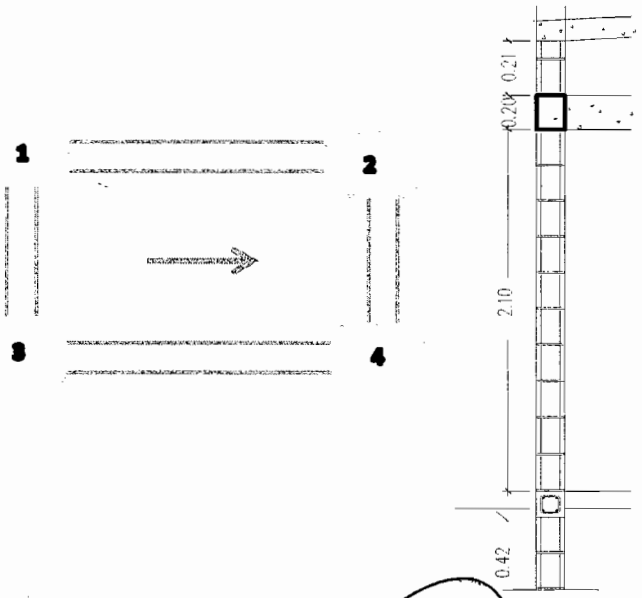

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94 2.73
2	2.73 2.52
3	2.94 2.73
4	2.73 2.52

TOTAL 10.50 **M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	13.46	M



	M
LONGITUD MUROS	
1	4.23
2	2.50
3	4.23
4	2.50

TOTAL 13.46 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.29	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.43	3.00	13.29

TOTAL **13.29 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

DOMICILIO : C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

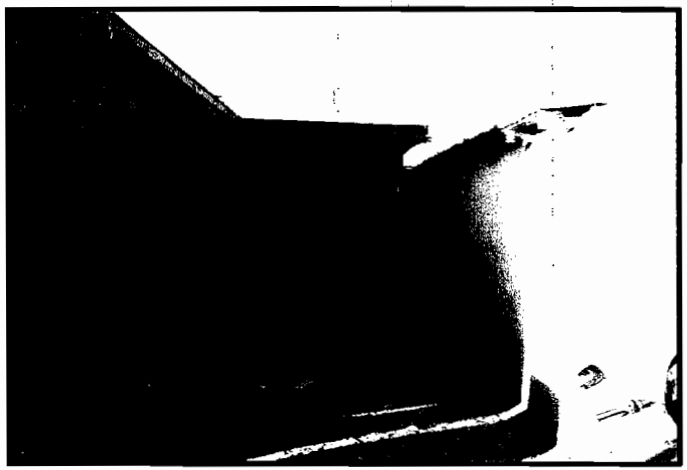

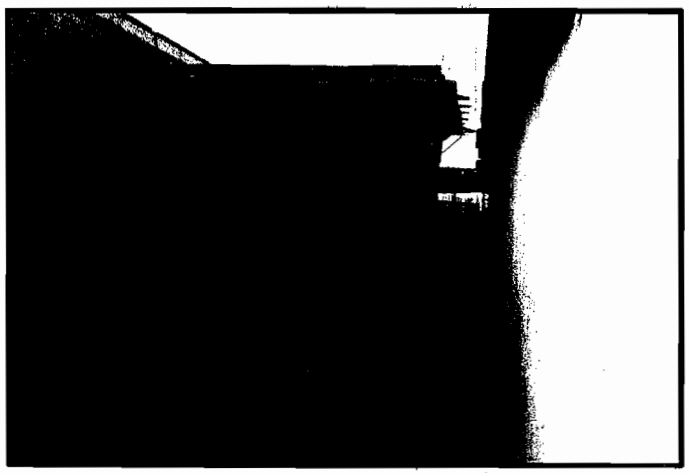

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.82	M2

	M	M	M2
MURO EXIST	LARGO	ANCHO	ÁREA
	4.02	2.94	11.82



TOTAL 11.82 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

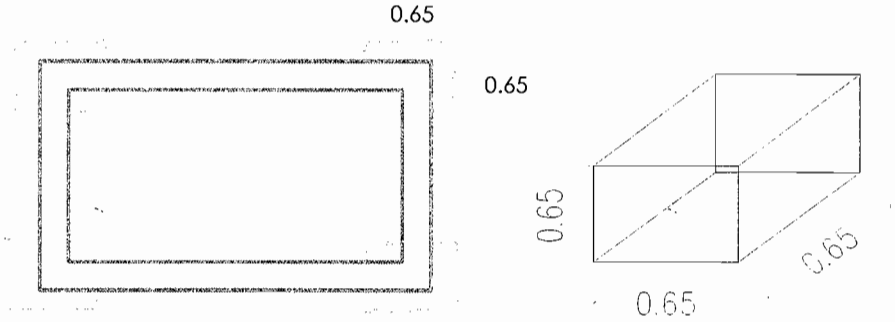

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



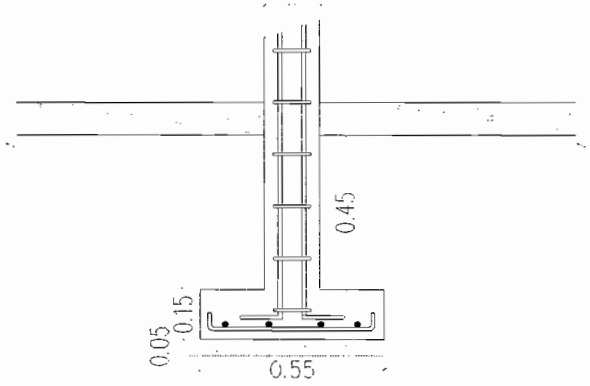

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

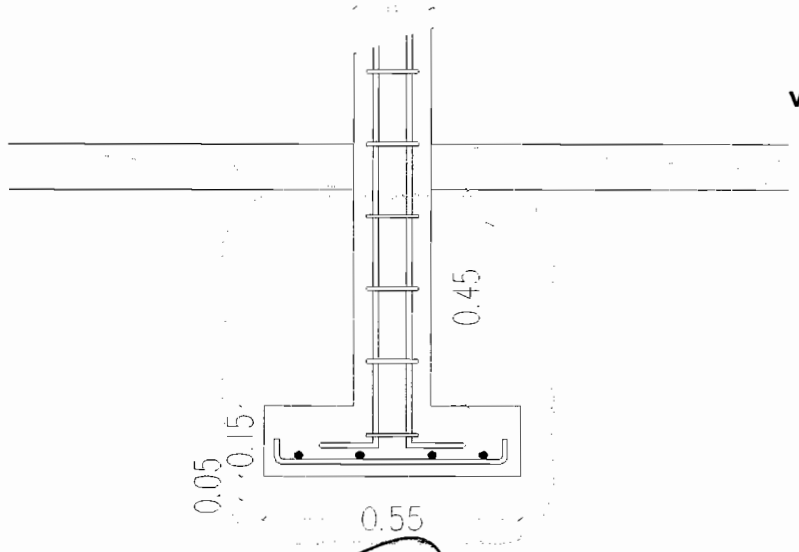

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10
TOTAL		**0.74 M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.30	m

MURO EXIST	LONGITUD MUROS	
	1	2.64
	2	2.64
	3	4.02

2.64 2.64

TOTAL 9.30 M

4.02

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	15.21	M2

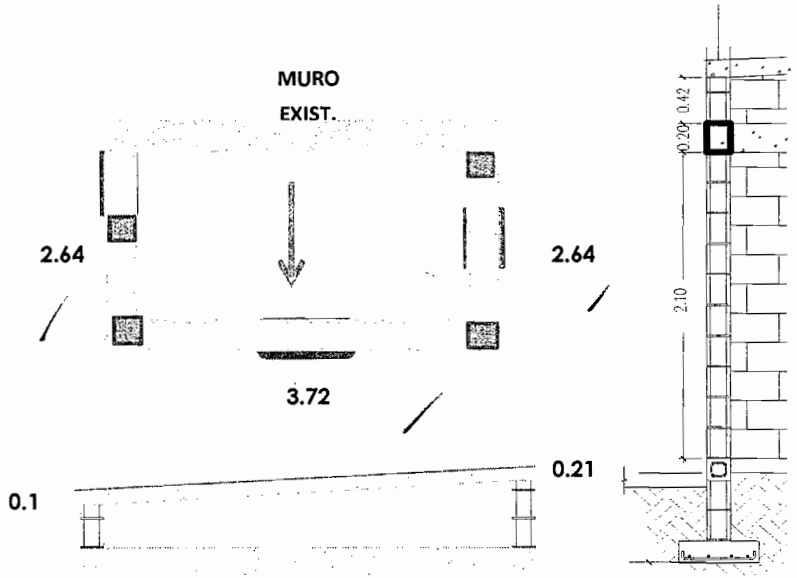

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.64	2.10	5.54
2	2.64	2.10	5.54
3	3.72	2.10	7.81
PTA	0.88	2.10	-1.85
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.64	0.16	0.42
2	2.64	0.16	0.42
3	3.72	0.10	0.37

TOTAL **15.21** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIOOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.67	M

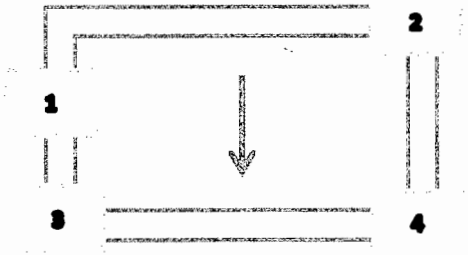



CASTILLO	M ALTURA
1	2.70
2	2.73
3	2.62
4	2.62
TOTAL	**10.67 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.30	M

M

MURO

EXIST

	LONGITUD MUROS
1	2.64
2	2.64
3	4.02

2.64 **2.64**

4.02

TOTAL 9.30 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.27	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.20		4.20	3.16	13.27
	3.16			

TOTAL **13.27 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

DOMICILIO : C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: Georgina Noyola Peña.

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.02	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	2.90	3.80	11.02

MURO EXIST 3.80

2.90

TOTAL 11.02 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: Georgina Vargas Reña

DOMICILIO : C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. Incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.57	M3

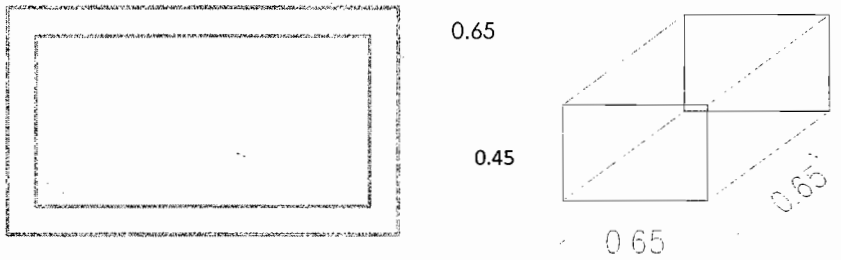

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.45	0.19
2	0.65	0.65	0.45	0.19
3	0.65	0.65	0.45	0.19

TOTAL **0.57 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDD POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: Georgina Vargas Peña

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	3.00	PZA



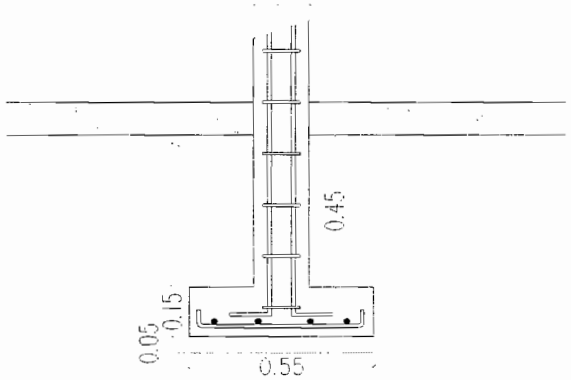

TOTAL 3.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: Georgina Vargas Peña.

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	14.57	M2

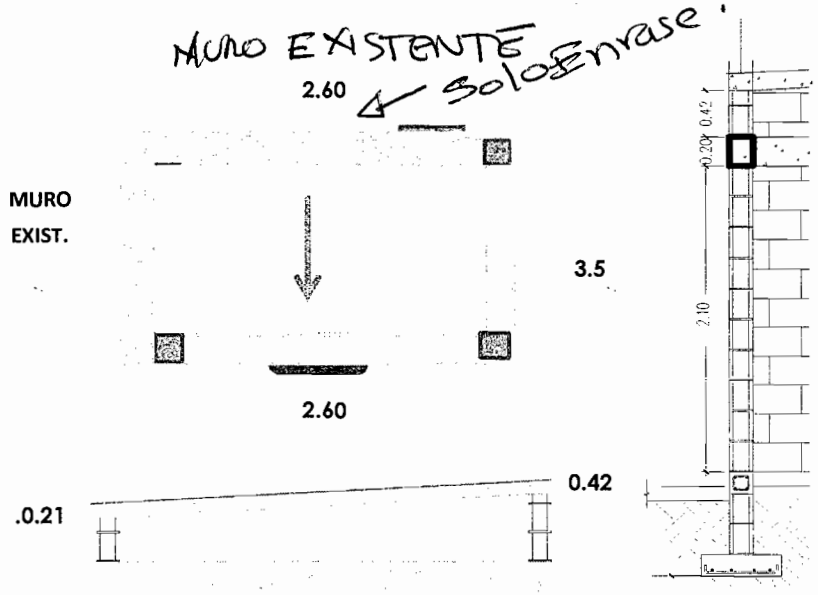

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.60	2.10	5.46
2	3.50	2.10	7.35
3	2.60	0.00	0.00
PTA	0.00	0.00	0.00
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.60	0.42	1.09
2	3.50	0.32	1.12
3	2.60	0.21	0.55

TOTAL 14.57 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: Georgina Vargas Reyna

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	6.55	M

		M
LONGITUD MUROS		
1	0.00	
2	3.80	
3	2.75	
MURO EXIST	3.8	
TOTAL		6.55 M

2.75

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: ~~ALICIA CELIS JUAREZ~~ Georgina Vargas Paz.

DOMICILIO : C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



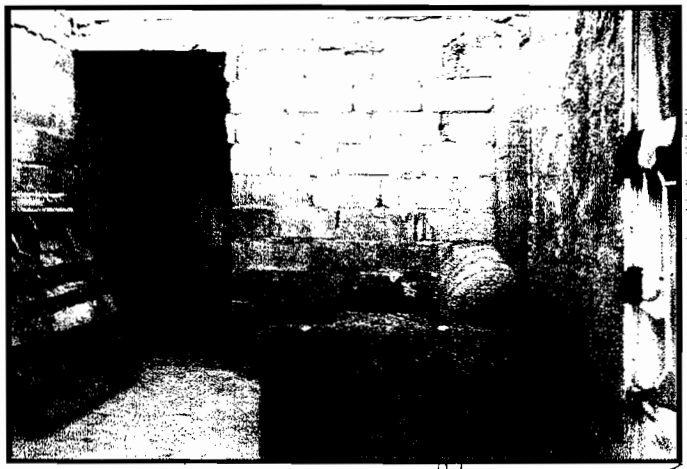

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.90	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	3.02	3.94	11.90

MURO EXIST 3.94

3.02

TOTAL 11.90 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3



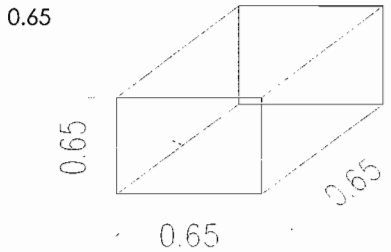

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIOOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



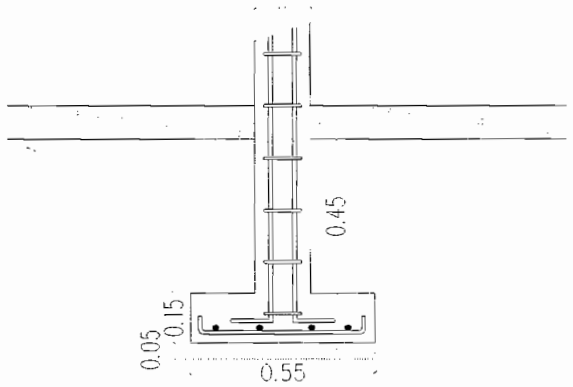

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDD POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

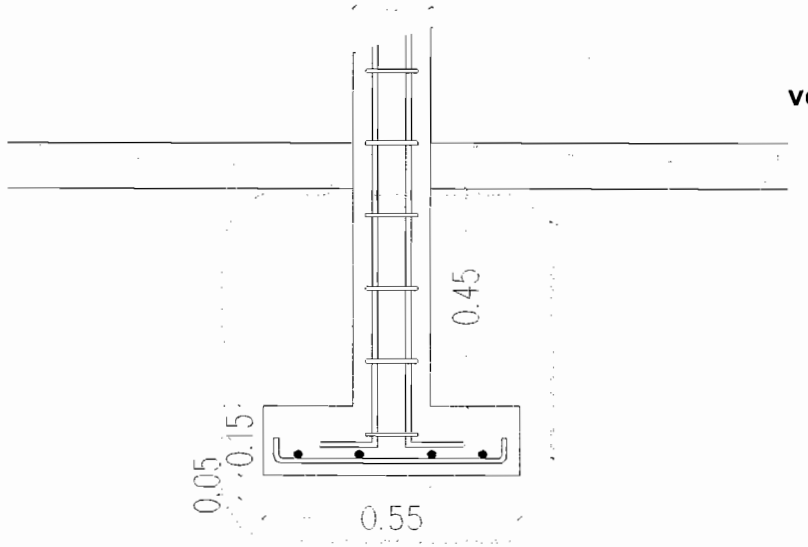

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.68	m

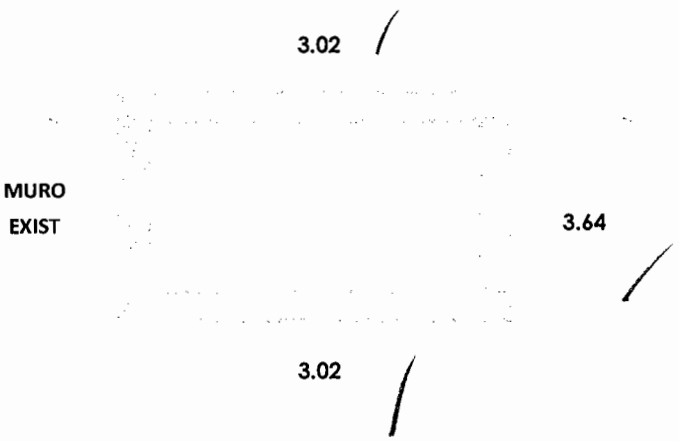

LONGITUD MUROS

1	3.02
2	3.64
3	3.02

TOTAL 9.68 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	17.26	M2

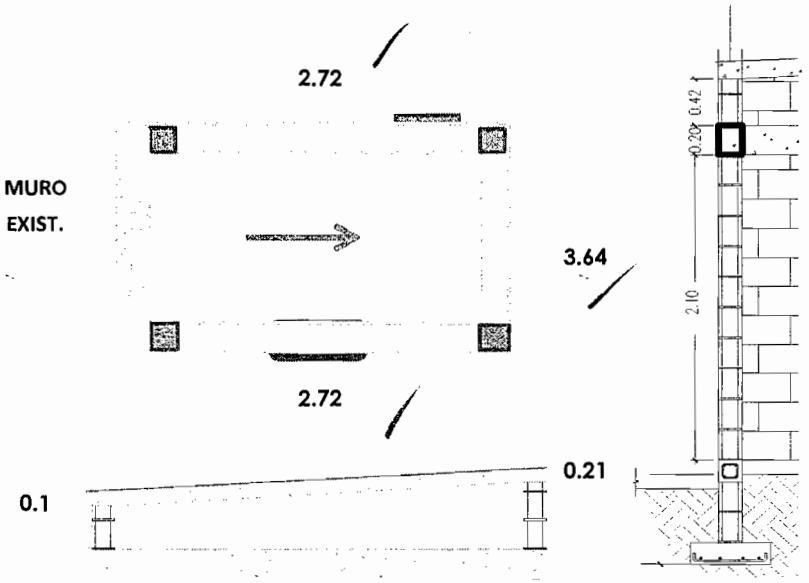

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.72	2.10	5.71
2	3.64	2.10	7.64
3	2.72	2.10	5.71
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.72	0.16	0.44
2	3.64	0.10	0.36
3	2.72	0.16	0.44

TOTAL 17.26 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.70	M

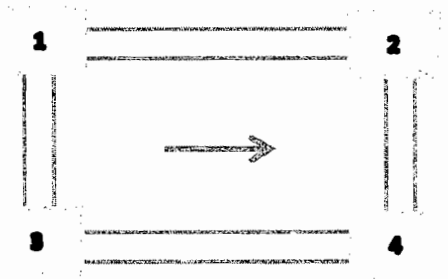



	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.62
3	2.73
4	2.62
TOTAL	**10.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.68	M

			M	
	3.02		LONGITUD MUROS	
			1	3.02
			2	3.64
			3	3.02
MURO EXIST		3.64		
			TOTAL	9.68 M
	3.02			

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	11.97	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
3.95		3.95	3.03	11.97
	3.03			

TOTAL **11.97 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ
DOMICILIO : **C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

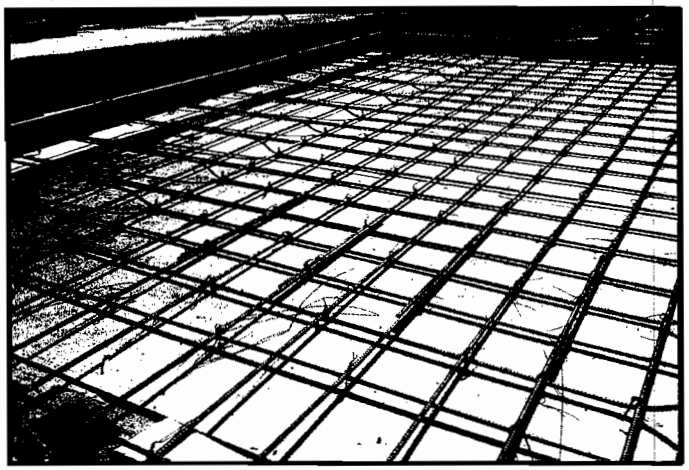



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13.26	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	4.17	3.18	13.26

MURO EXIST 3.18

4.17

TOTAL 13.26 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES OISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

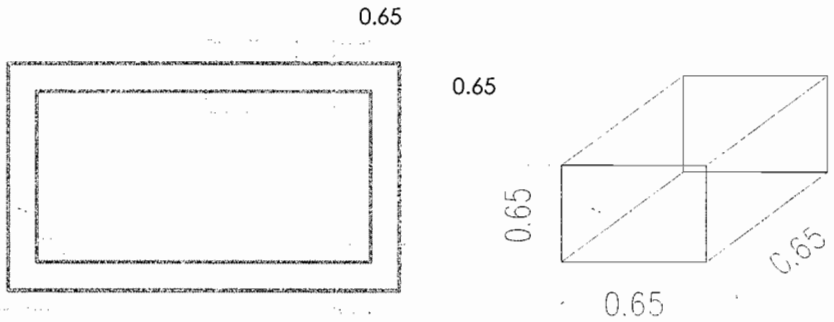

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



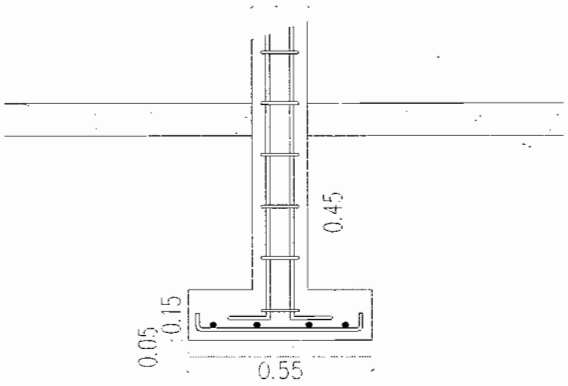

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

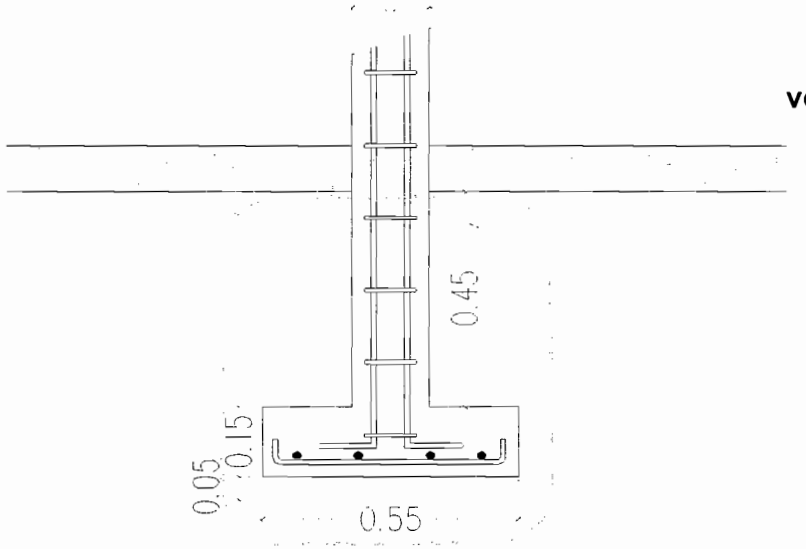

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.15	m



LONGITUD MUROS

1	2.10
2	2.88
3	4.17

TOTAL 9.15 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	17.85	M2

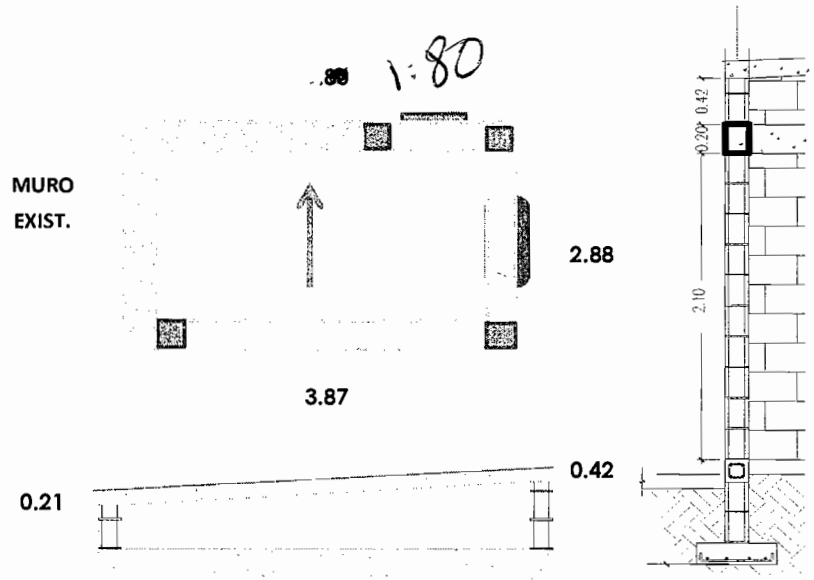

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	1.80	2.10	3.78
2	2.88	2.10	6.05
3	3.87	2.10	8.13
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	1.80	0.21	0.38
2	2.88	0.32	0.92
3	3.87	0.42	1.63

TOTAL 17.85 **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

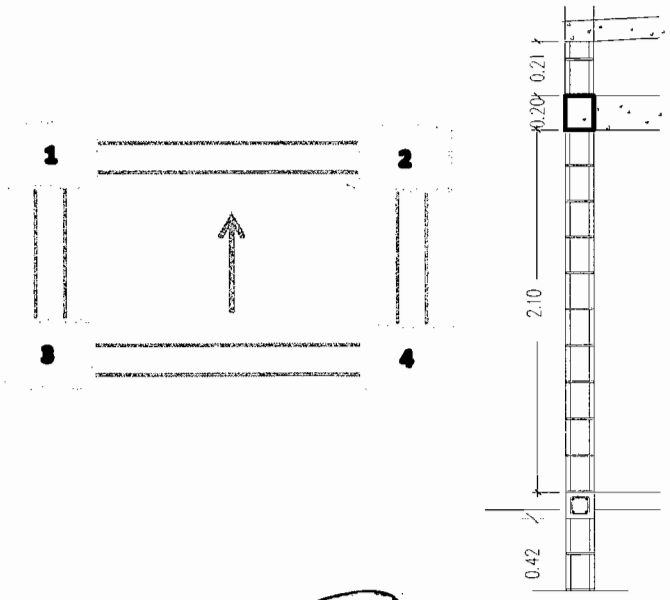

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.94
4	2.94
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.15	M

M

LONGITUD MUROS

1	2.10
2	2.88
3	4.17

TOTAL 9.15 M



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	14.77	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.37		4.37	3.38	14.77
	3.38			

TOTAL **14.77 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

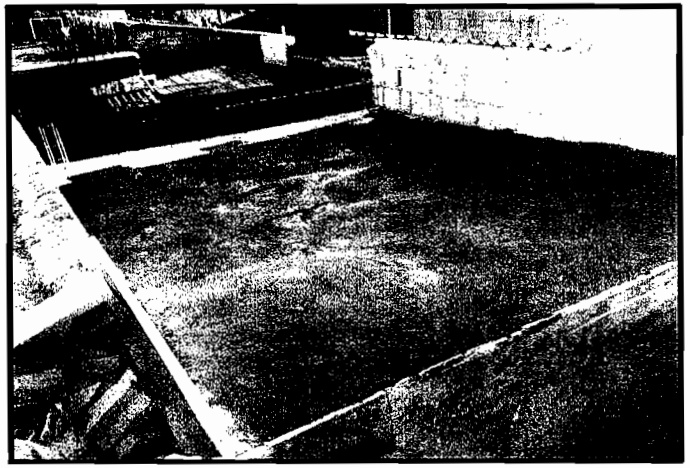

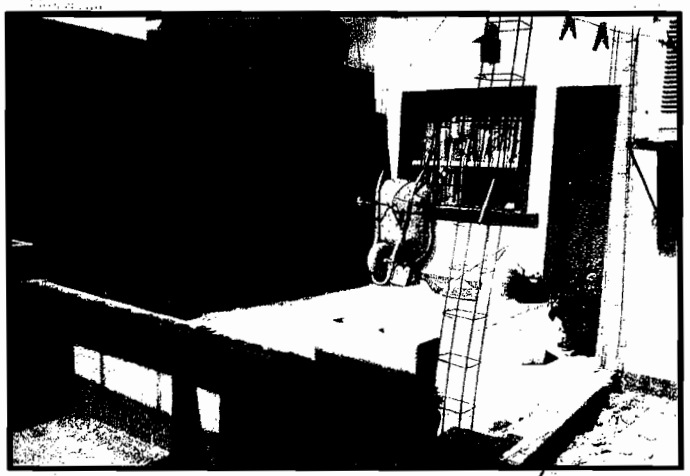

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTDS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.40	M2

		M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
MURO EXIST	3.1	4.00	3.10	12.40

TOTAL **12.40 M2**

4.00

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

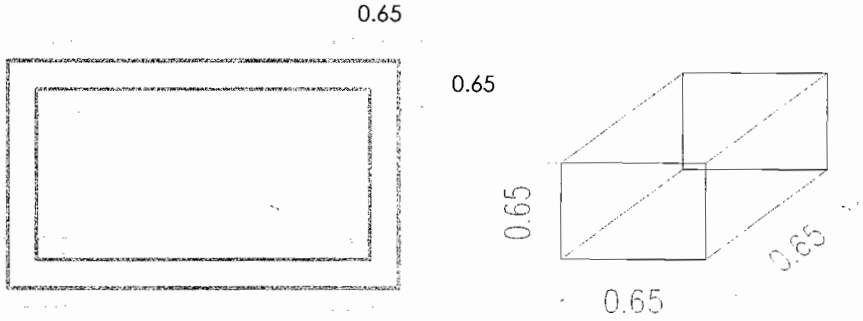

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

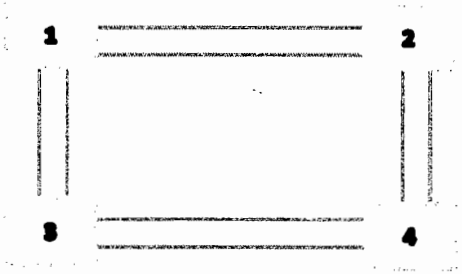

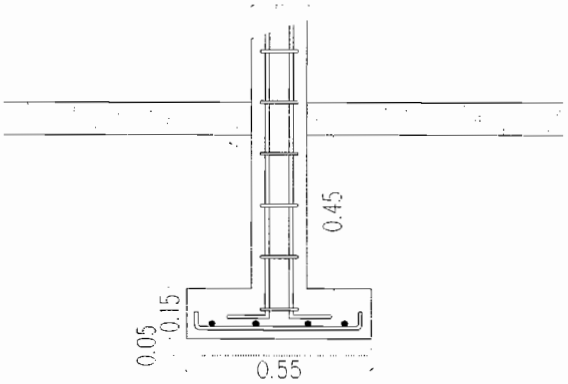

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZAOA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

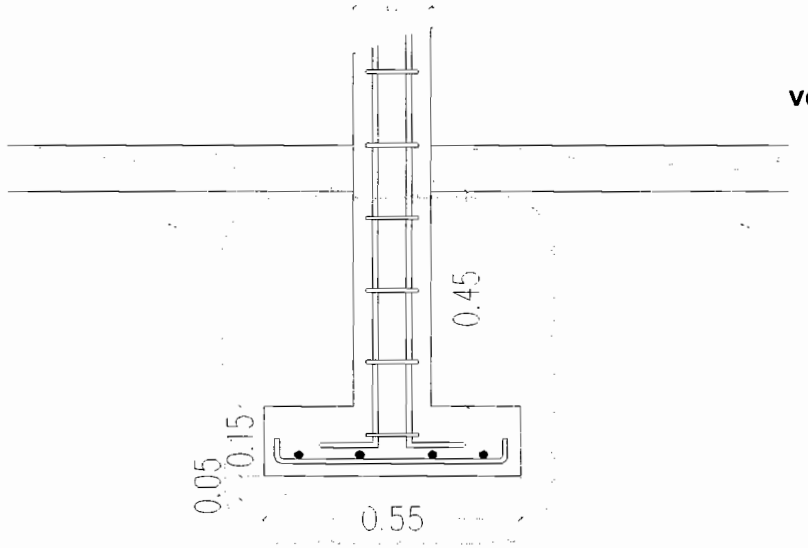

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.80	m

LONGITUD MUROS

1	4.00
2	2.80
3	4.00

4.00

MURO EXIST

2.8

4.00

TOTAL 10.80 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	19.98	M2

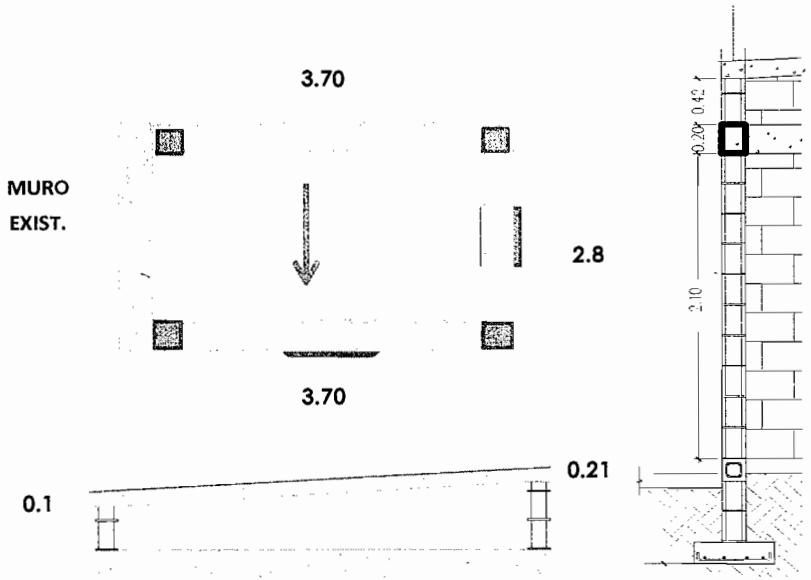

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.70	2.10	7.77
2	2.80	2.10	5.88
3	3.70	2.10	7.77
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.70	0.21	0.78
2	2.80	0.16	0.45
3	3.70	0.10	0.37

TOTAL **19.98** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.70	M





	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.62
4	2.62
TOTAL	**10.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEOA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.80	M

			M
	4.00	LONGITUD MUROS	
		1	4.00
		2	2.80
		3	4.00
MURO EXIST	2.8		
		TOTAL	10.80 M
	4.00		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.86	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.20		4.20	3.30	13.86
3.3				

TOTAL **13.86 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

DOMICILIO : C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

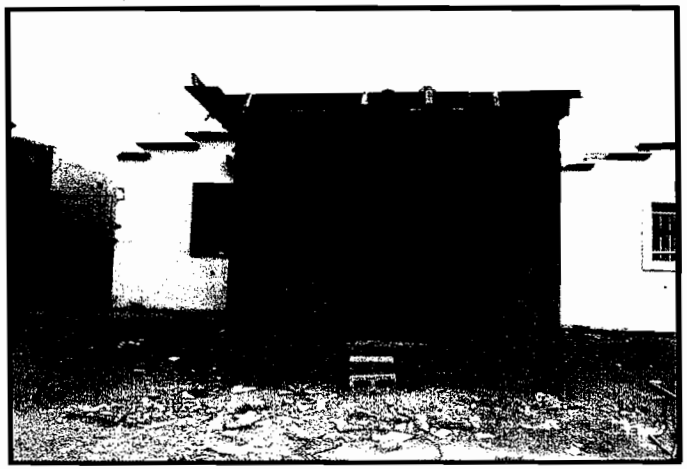

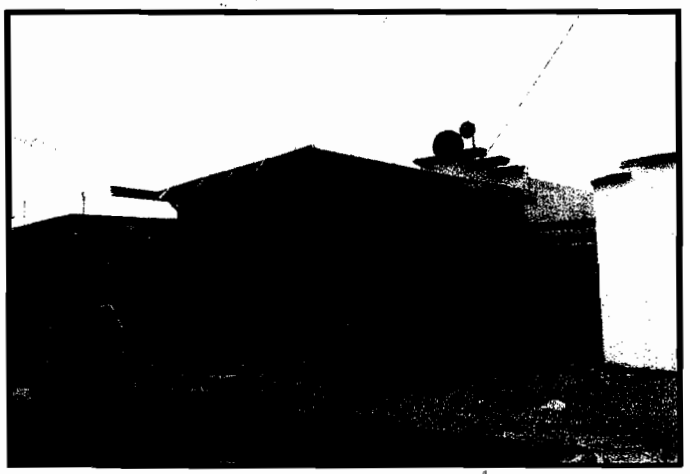

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDD EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	10.75	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
MURO EXIST	2.89	3.72	10.75

TOTAL **10.75 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.54	M3

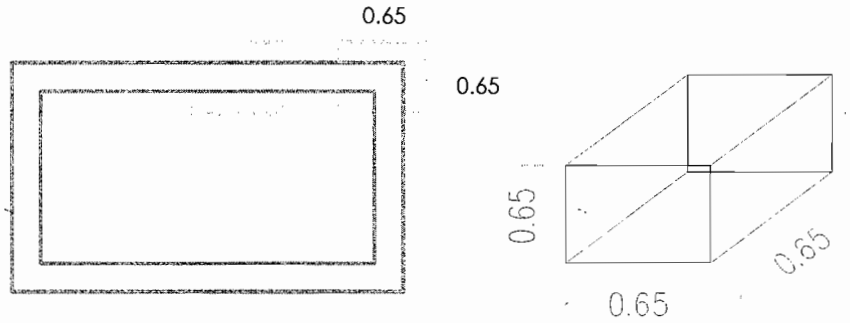

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **0.54 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	2.00	PZA



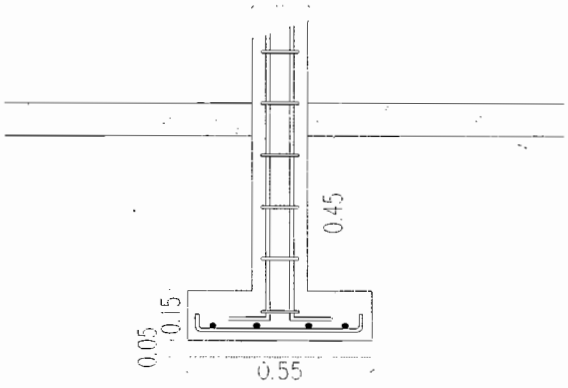

TOTAL **2.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.36	M3

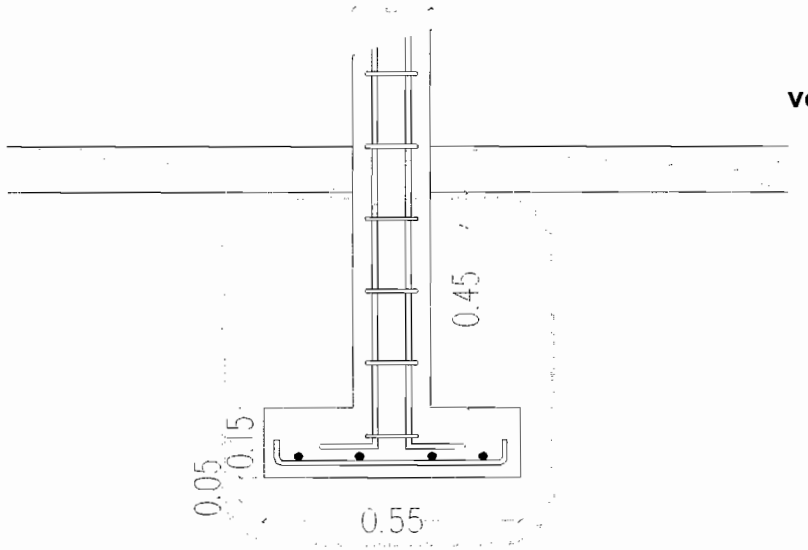

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 2 =	0.54
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x3=	-0.12
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 3 =	-0.06

TOTAL **0.36** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	4.33	m

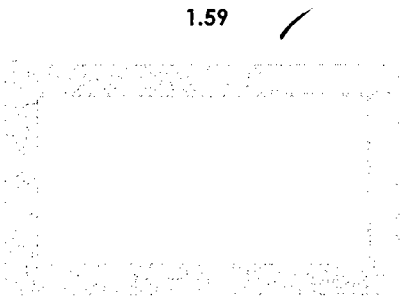

LONGITUD MUROS

1	1.59
2	2.74
3	0.00

TOTAL 4.33 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.25	M2

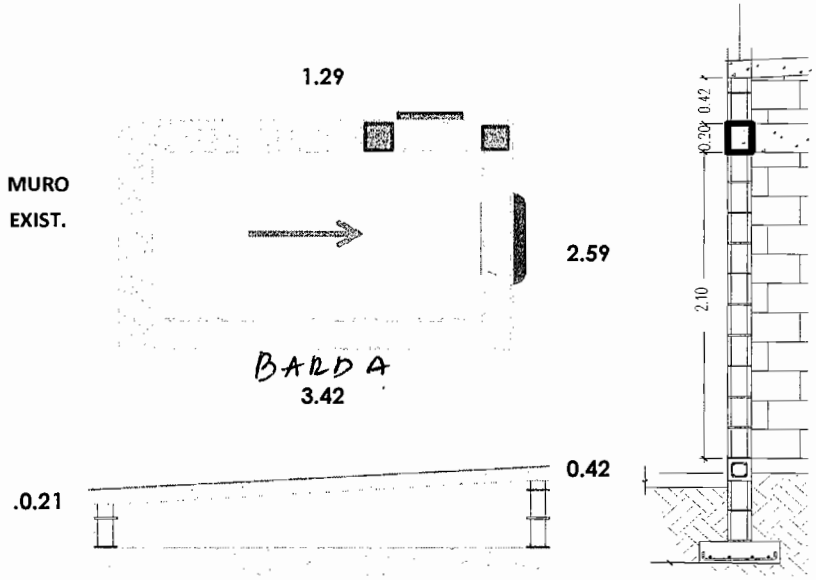

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	1.29	2.10	2.71
2	2.59	2.10	5.44
3	3.42	0.63	2.15
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	1.29	0.28	0.36
2	2.59	0.21	0.54
3	3.42	0.32	1.09

TOTAL 9.25 **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	7.42	M

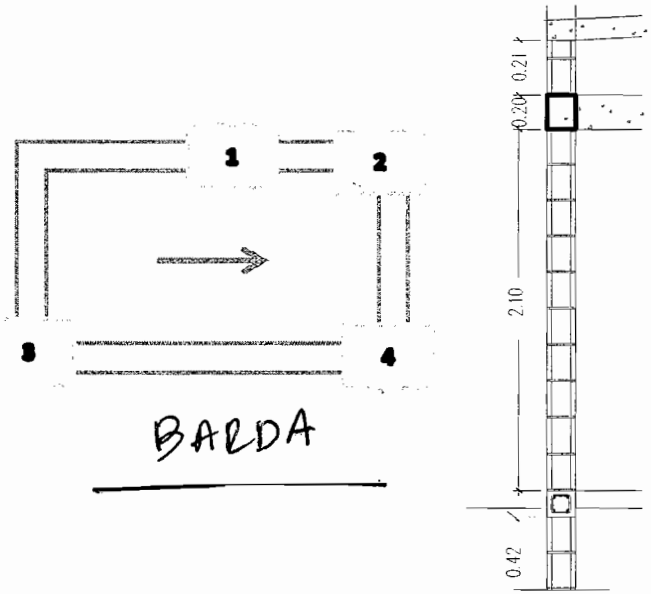

CASTILLO	M ALTURA
1	2.80
2	2.73
3	1.05
4	0.84
TOTAL	**7.42 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	7.90	M

M

LONGITUD MUROS

1	1.59
2	2.59
3	3.72

1.59

MURO EXIST

2.59

TOTAL **7.90 M**

3.72

BARDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEOA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	12.23	M2

3.94

0.3

1.78

2.97

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.94	2.97	11.70
	1.78	0.30	0.53

TOTAL 12.23 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA
DOMICILIO : C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



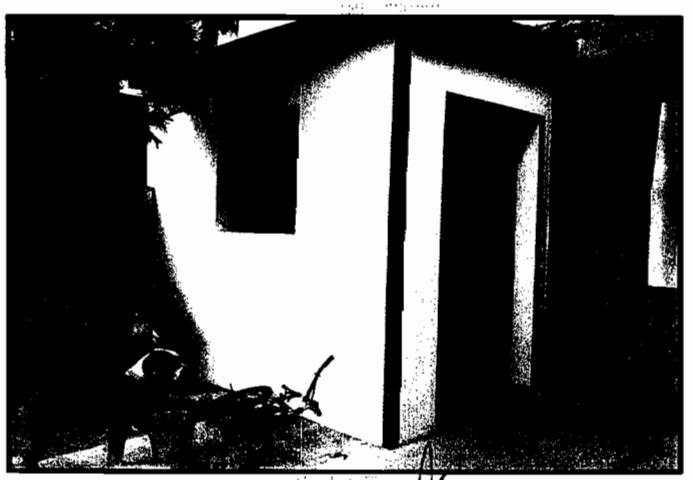

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13.24	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
MURO EXIST	3.85	3.44	13.24

TOTAL **13.24 M2**

3.44

3.85

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LDS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

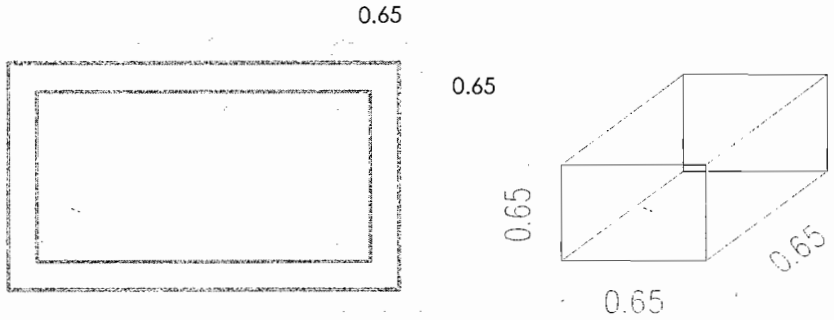

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIOO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

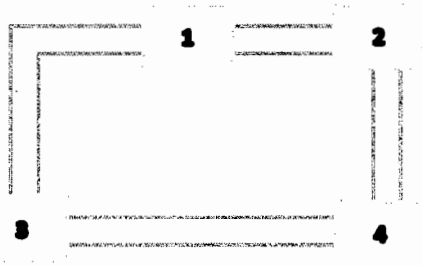

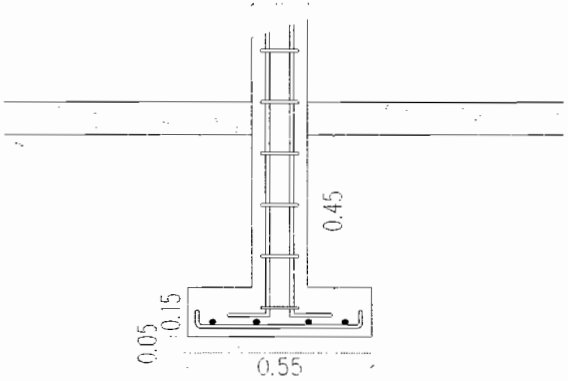

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

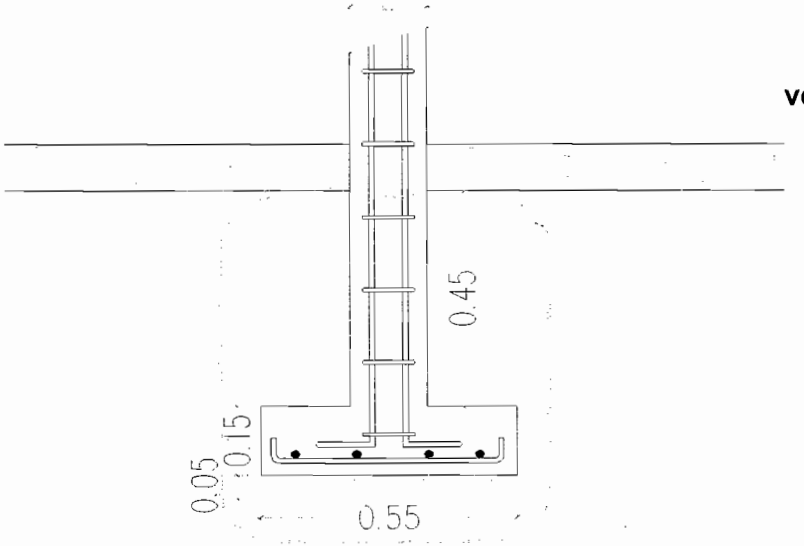

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.21	m

2.22

3.14

3.85

MURO EXIST

LONGITUD MUROS

1	2.22
2	3.14
3	3.85

TOTAL 9.21 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,OUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	19.25	M2

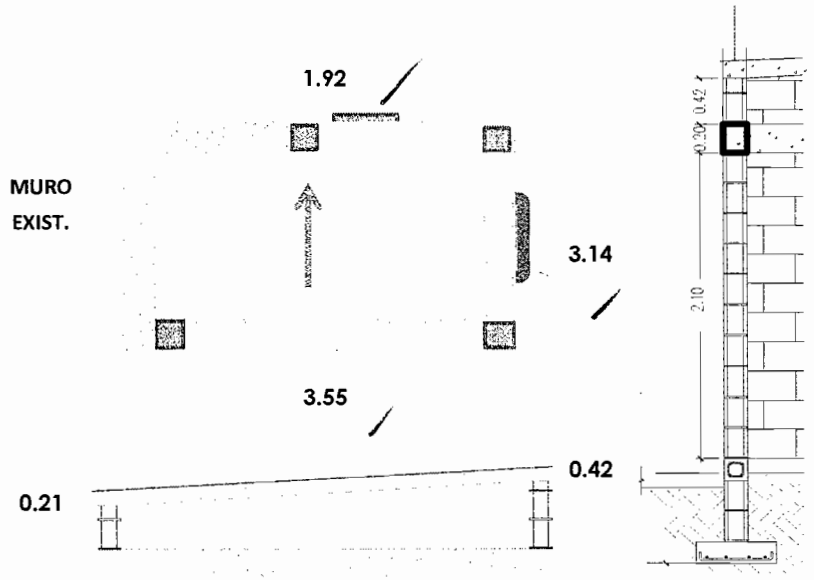

* Se Colocaron 2 Hiladas de enrase en el muro existente.

MURO	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA MURO
1	1.92	2.10	4.03
2	3.14	2.10	6.59
3	3.55	2.10	7.46
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	1.92	0.21	0.40
2	3.14	0.32	1.00
3	3.55	0.42	1.49
* 4	3.14	0.42	1.32

TOTAL 19.25 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

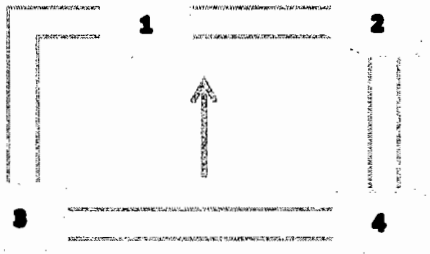



	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.94
4	2.94
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.21	M

			M
	2.22	LONGITUD MUROS	
		1	2.22
		2	3.14
		3	3.85
MURO EXIST	3.14		
		TOTAL	9.21 M
	3.85		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	14.74	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.06		4.06	3.63	14.74
	3.63			

TOTAL **14.74 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

DOMICILIO : C.METALURGICA NACIONAL # 1623 COL. JUAN GUERECA

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.48	M2

		M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
MURO EXIST		3.00	4.16	12.48
	4.16			
	3.00			

TOTAL **12.48 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3



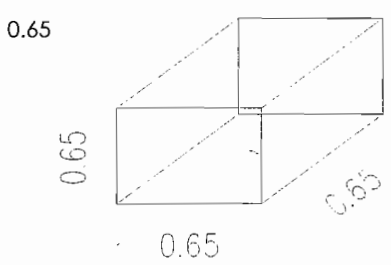

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



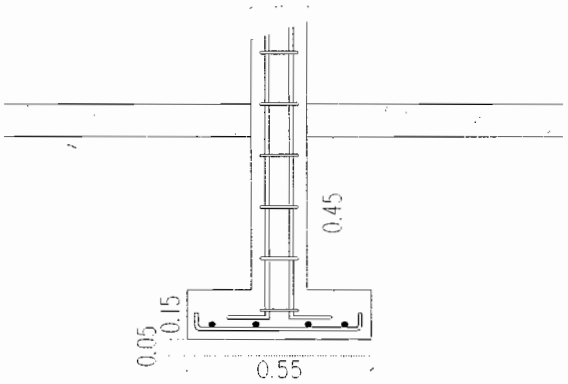

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEOERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

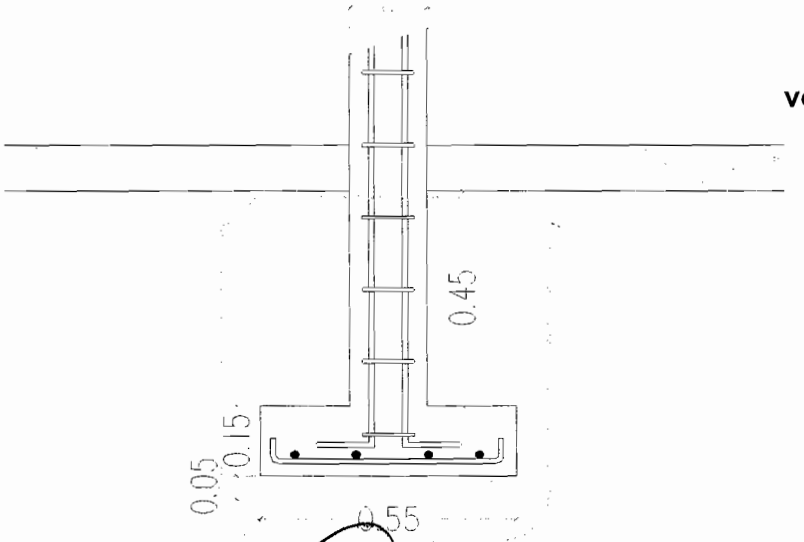

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10
TOTAL		**0.74 M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.86	m

3.00

MURO EXIST

3.86

3.00

LONGITUD MUROS

1	3.00
2	3.86
3	3.00

TOTAL **9.86 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	20.56	M2

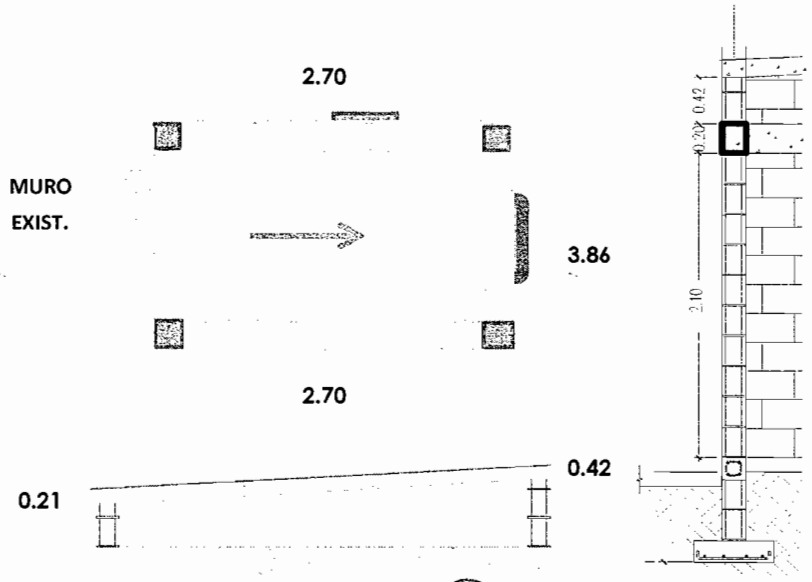

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.70	2.10	5.67
2	3.86	2.10	8.11
3	2.70	2.10	5.67
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.70	0.32	0.86
2	3.86	0.21	0.81
3	2.70	0.32	0.86
4	3.86	0.42	1.62
		TOTAL	**20.56** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

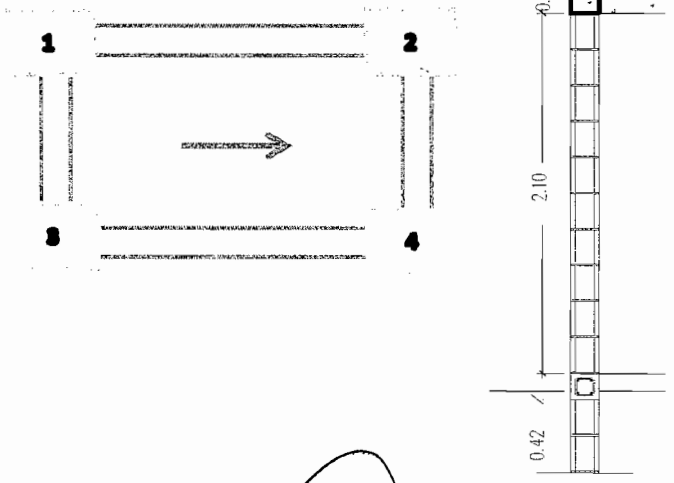

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.73
3	2.94
4	2.73
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	13.72	M

			M	
	3.00		LONGITUD MUROS	
			1	3.00
			2	3.86
			3	3.00
3.86			4	3.86
		3.86		
			TOTAL	13.72 M
	3.00			

SE Hizo cadena cerramiento en muro existente.

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	14.59	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.56		4.56	3.20	14.59
	3.2			

EXISTENTE

TOTAL **14.59 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA FORTUNATO DE LA CRUZ
DOMICILIO : C.LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.20	M2

	M LARGO	M ANCHO	M2 ÁREA
	4.00	3.05	12.20

MURO EXIST 3.05

4.00

TOTAL 12.20 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

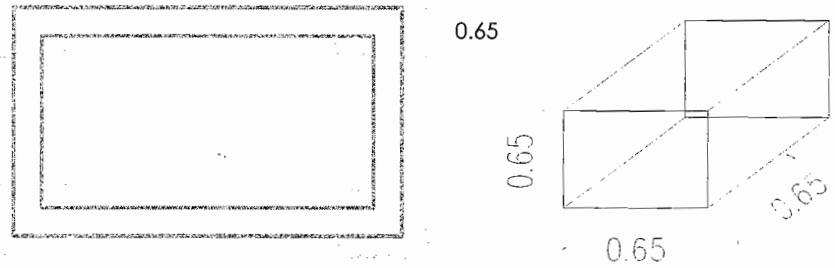

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



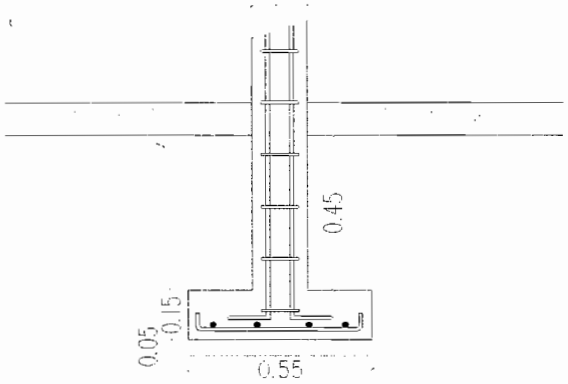

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

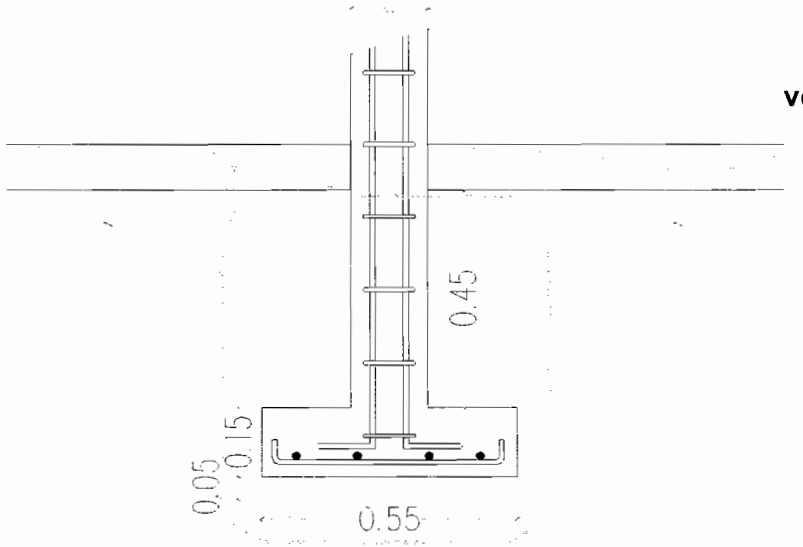

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10
TOTAL		0.74 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.75	m

LONGITUD MUROS

1	4.00
2	2.75
3	4.00

4.00

MURO EXIST

2.75

4.00

TOTAL **10.75 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	21.22	M2

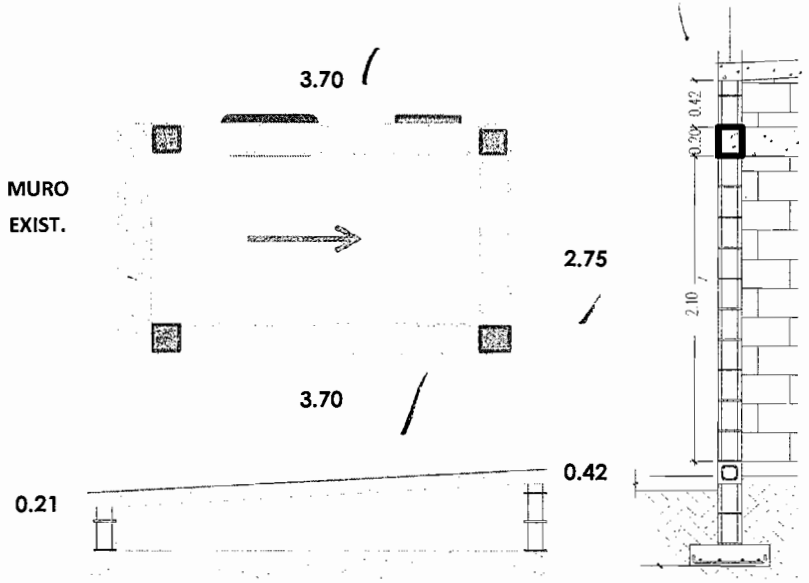

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.70	2.10	7.77
2	2.75	2.10	5.78
3	3.70	2.10	7.77
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.70	0.32	1.18
2	2.75	0.21	0.58
3	3.70	0.32	1.18

TOTAL 21.22 **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

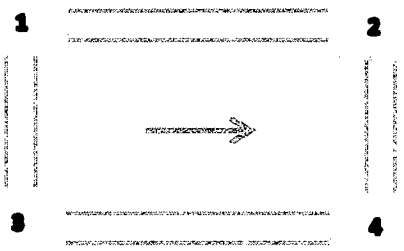



	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.73
3	2.94
4	2.73
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.75	M

			M
	4.00	LONGITUD MUROS	
		1	4.00
		2	2.75
		3	4.00
MURO EXIST	2.75		
		TOTAL	10.75 M
	4.00		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.82	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.32	4.32	3.20	13.82
3.2			

TOTAL **13.82 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO
DOMICILIO : C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

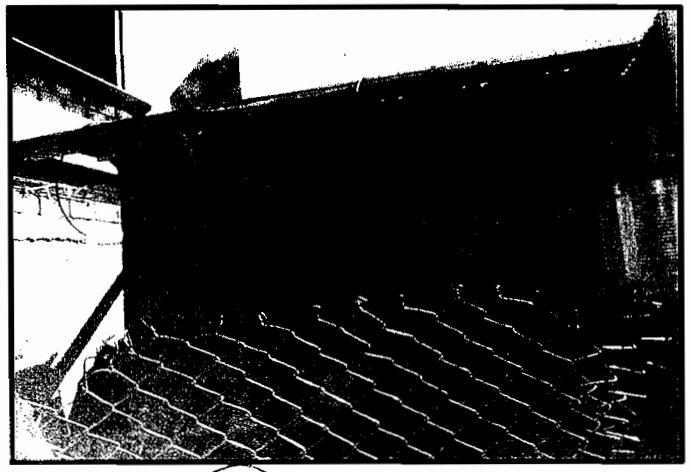

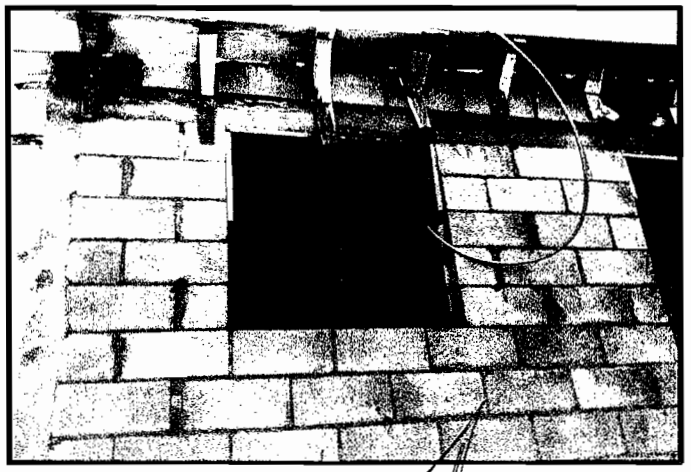

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

	ESTIMACION 3 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1 PERIODO : DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			APLANADO EN MURO	FIRME	INSTALACION ELECRICA	PINTURA	IMPERMEABILIZACION	PUERTA	VENTANA
				3.2	3.6	4.1	5.1	5.2	EXT 01	EXT 02
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	M2	M3	PZA	M3	M	M2	M
1	GUADALUPE SOLIS VERDUGO	RIO NUECEZ 2S922	RIVERAS DE SACRAMENTO	40.16	11.03	1.00	63.50	13.34	0.00	0.00
2	ELSA ROBLEDO ORTIZ	RIO MURRAY 1410	RIVERAS DE SACRAMENTO	50.16	10.76	1.00	66.95	13.60	0.00	0.00
3	ROSALIA PORTILLO CARDENAS	RIO DIAMANTE 2402	RIVERAS DE SACRAMENTO	41.60	10.61	1.00	54.12	13.78	0.00	0.00
4	ANAIS JUAREZ REYES	RIO META 2006	RIVERAS DE SACRAMENTO	33.79	11.16	1.00	61.62	12.70	0.00	0.00
5	ROCIO CISNEROS ROJAS	RIO VENTUARY 25910	RIVERAS DE SACRAMENTO	40.42	10.49	1.00	52.79	13.33	0.00	0.00
6	MARIA LERMA MOLINA	DESIERTO DE CHALBI 17914	SAHUAROS	58.23	10.35	1.00	70.49	13.94	1.00	1.00
7	ESPERANZA RIOS CRUZ	RIO NEUQEL 1811	RIVERAS DE SACRAMENTO	48.08	10.45	1.00	60.34	12.45	0.00	0.00
8	HEIDI CAZARES PEREA	RIO NEUQEL 1832	RIVERAS DE SACRAMENTO	41.86	10.66	1.00	54.42	13.57	0.00	0.00
9	BLANCA OCHOA OCHOA	RIO MENDOZA 1813	RIVERAS DE SACRAMENTO	41.71	10.70	1.00	54.31	13.48	0.00	0.00
10	SANTIAGO TORRES GONZALES	RIO AMARILLO 1423	RIVERAS DE SACRAMENTO	33.39	11.20	1.00	57.13	12.99	0.00	0.00
11	MARINA SANDOVAL TARANGO	RIO OBI 2009	RIVERAS DE SACRAMENTO	28.52	10.32	1.00	46.66	11.72	0.00	0.00
12	VICTORIA CALAMACO CALAMACO	RIO VAAL 2029	RIVERAS DE SACRAMENTO	38.36	10.70	1.00	60.35	12.60	0.00	0.00
13	TERESA MARMOLEJO HIDALGO	RIO ODRA 1423	RIVERAS DE SACRAMENTO	42.02	10.56	1.00	54.48	13.65	0.00	0.00
14	JOSE ROMERO RODRIGUEZ	RIO ZAIRE 2403	RIVERAS DE SACRAMENTO	36.36	10.75	1.00	48.01	12.32	0.00	0.00
15	CYNTHIA GRACIELA JUAREZ	RIO SALADO 2440	RIVERAS DE SACRAMENTO	54.52	10.96	1.00	67.38	13.57	0.00	0.00
16	ANDREA SAENZ ARENALES	OSCAR SOTO MAYNEZ 16711	SAHUAROS	57.16	10.14	1.00	69.21	13.81	1.00	1.00
17	MANUELA ACOSTA ESTUPIÑON	RIO HERRERA 1616	RIVERAS DE SACRAMENTO	38.11	10.73	1.00	50.68	12.95	0.00	0.00
18	LAURA ROSALIA RODRIGUEZ	RIOA ARAUCA 1422	RIVERAS DE SACRAMENTO	32.71	10.66	1.00	52.43	12.91	0.00	0.00
19	MARIA ISABEL NORIEGA	RIO AMMUR 2225	RIVERAS DE SACRAMENTO	34.12	9.81	1.00	44.59	12.33	0.00	0.00
20	IVONNE RODRIGUEZ OCHOA	RIO AMMUR 1620	RIVERAS DE SACRAMENTO	51.04	10.58	1.00	64.57	14.16	0.00	0.00
21	BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ	RIO YUKON 2007	RIVERAS DE SACRAMENTO	30.48	10.96	1.00	58.52	12.62	0.00	0.00
22	ALMA BOJORQUEZ DURAN	RIO CAUCA 1625	RIVERAS DE SACRAMENTO	39.13	10.62	1.00	61.11	12.69	0.00	0.00
23	NORMA VENEGAS MUÑOZ	RIO AMARILLO 1609	RIVERAS DE SACRAMENTO	36.03	10.96	1.00	55.43	13.95	0.00	0.00
24	MARBELLA ALMEIDA CARRILLO	PVD RIO COLORADO 2S904	RIVERAS DE SACRAMENTO	51.65	11.01	1.00	70.23	14.07	0.00	0.00
25	FELICITAS MERAZ ROMO	DESIERTO DE SONORA 1723	SAHUAROS	37.71	10.77	1.00	57.33	13.63	1.00	1.00
26	MARIA RIOS VALERIO	RIO HERRERA 1809	RIVERAS DE SACRAMENTO	40.24	10.66	1.00	52.71	12.45	0.00	0.00
27	JOEL VELGARA PEÑA	RIO ZAIRE 2422	RIVERAS DE SACRAMENTO	31.04	10.46	1.00	42.43	11.55	0.00	0.00
28	MARIA ZAMARRON AVILA	RIO SALADO 1621	RIVERAS DE SACRAMENTO	40.90	10.71	1.00	53.51	13.58	0.00	0.00
29	CARLA IMELDA CHAVIRA	RIO SALADO 1609	RIVERAS DE SACRAMENTO	42.64	10.48	1.00	55.03	13.66	0.00	0.00
30	ADRIANA OAXACA VAZQUEZ	RIO VAAL 1606	RIVERAS DE SACRAMENTO	52.46	10.64	1.00	65.02	13.73	0.00	0.00
31	SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE	RIO NEUQUEL 1802	RIVERAS DE SACRAMENTO	42.01	10.88	1.00	54.81	13.79	0.00	0.00
32	KARLA NALLELY VENEGAS	RIO VAAL 1626	RIVERAS DE SACRAMENTO	39.54	10.81	1.00	52.25	13.64	0.00	0.00
33	LUCILA GONZALEZ VILLA	RIO ROJO 1406	RIVERAS DE SACRAMENTO	48.52	10.98	1.00	61.75	12.30	0.00	0.00
34	ELIUD MORAIMA ESTRADA	DESIERTO DE LIBIA 1902	SAHUAROS	35.14	10.08	1.00	46.02	11.87	1.00	1.00
35	MARIA DOMITILA DIAZ	DESIERTO DE COLORADO 17715	SAHUAROS	37.33	10.73	1.00	55.42	13.54	1.00	1.00
			SUBTOTAL 1	**1447.14**	**373.37**	**35.00**	**1995.60**	**460.27**	**5.00**	**5.00**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

PROARVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	40.16	M2

2.87 2.70 2.7 1.02

4.03

4.38

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.61	0.00
	2.70	2.48	6.70
	2.70	2.48	6.70
	4.03	2.40	9.67
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.87	2.70	7.75
	4.38	2.59	11.34
	1.02	2.65	2.70
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 40.16

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.03	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.70	4.03	10.88
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **11.03 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	63.50	M2

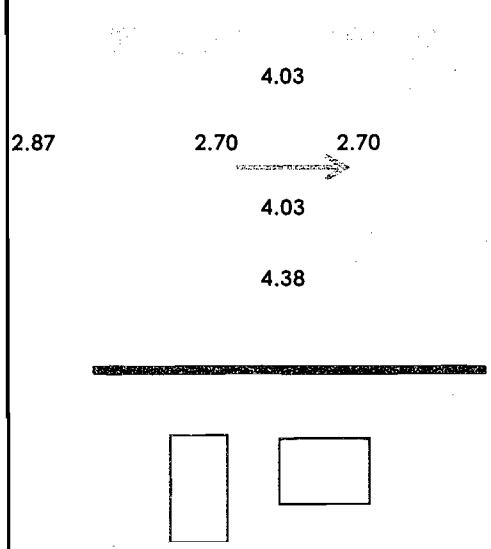

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.58	10.40
	2.70	2.48	6.70
	2.70	2.48	6.70
	4.03	2.40	9.67
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.87	2.70	7.75
	4.38	2.59	11.34
	1.02	2.65	2.70
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	2.70	0.20	0.54
	2.90	0.08	0.23
2	4.58	0.20	0.92
	4.58	0.08	0.37

Pintura Techo = 4.03 x 2.70 = 10.88

TOTAL 63.50

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.34	M2

4.60

2.90

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.60	2.90	13.34
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.34 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO
DOMICILIO : C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

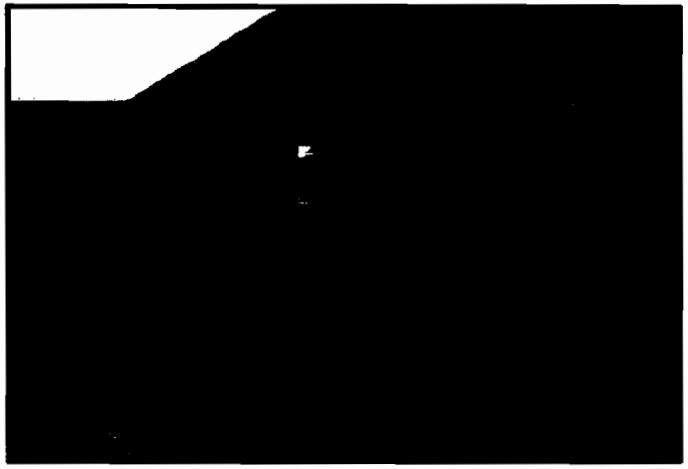

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELSA ROBLEDO ORTIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	50.16	M2

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
3.72	3.55	2.50	8.88
3.55	3.55	2.50	8.88
3.72	2.99	2.41	7.21
PTA	2.10	0.97	-2.04
2.99	1.00	1.00	-1.00
3.32			
VENT.			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.72	2.92	10.86
	3.32	2.75	9.13
	3.72	2.66	9.90
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 50.16

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELSA ROBLEDO ORTIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.76	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.55	2.99	10.61
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.76 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELSA ROBLEDO ORTIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	SALIDA

TOTAL 10 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ELSA ROBLEDO ORTIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	∴ 66.95	M2

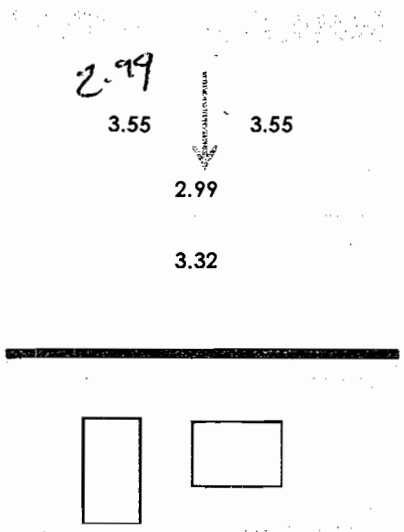

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.99	2.62	7.83
	3.55	2.50	8.88
	3.55	2.50	8.88
	2.99	2.41	7.21
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.10	0.97	-2.04
VENT EXTRA	1.28	1.28	-1.64

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.72	2.92	10.86
	3.32	2.75	9.13
	3.72	2.66	9.90
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.92	0.20	0.78
	3.92	0.08	0.31
2	3.32	0.20	0.66
	3.52	0.08	0.28

Pintura Techo = 2.99 x 3.55 = 10.61

TOTAL ∴ 66.95.

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELSA ROBLEDO ORTIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.60	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
3.92		3.92	3.47	13.60
	3.47			

TOTAL 13.60 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ELSA ROBLEDO ORTIZ


DOMICILIO : **C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

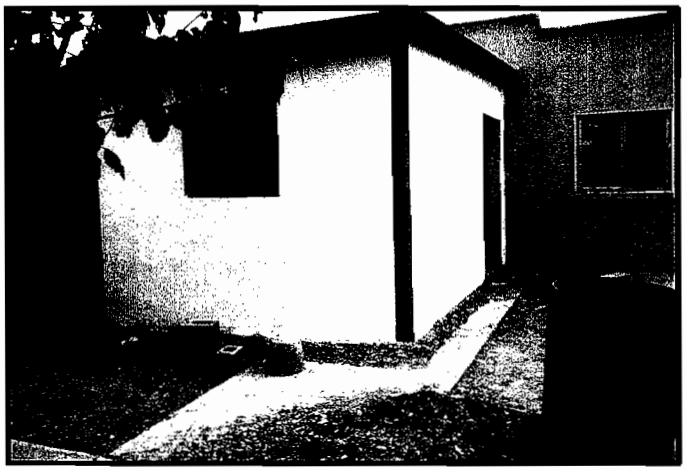

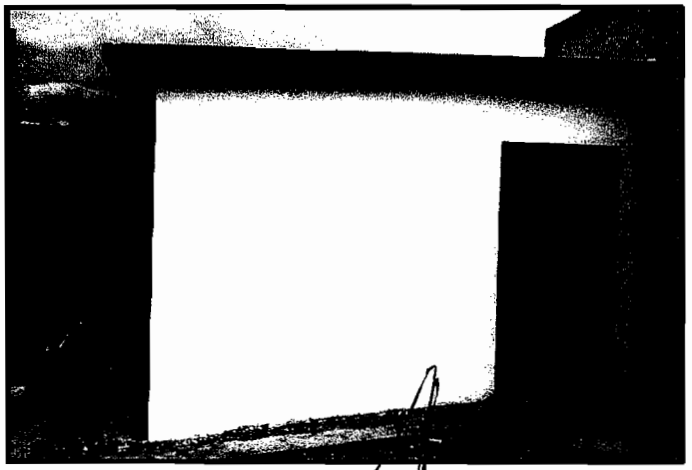

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	41.60	M2

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.57	0.00
4.01	3.83	3.83		3.83	2.60	9.96
				3.83	2.58	9.88
		2.73		2.73	2.50	6.83
			PTA	2.10	0.97	-2.04
		3.01	VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.01	2.80	11.23
	3.01	2.79	8.40
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 41.60

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS
DOMICILIO : C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.61	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.83	2.73	10.46
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.61 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA



TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.12	M2

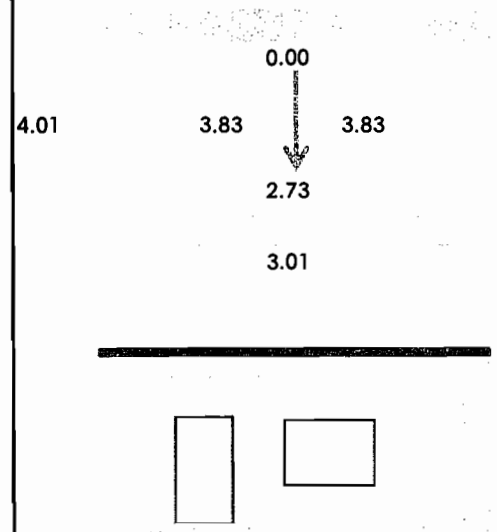

INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
		0.00	0.00	0.00
		3.83	2.60	9.96
4.11		3.83	2.58	9.88
		2.73	2.50	6.83
	PTA	2.10	0.97	-2.04
	VENT.	1.00	1.00	-1.00
	PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.01	2.80	11.23
	3.01	2.79	8.40
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.08	0.34
2	3.09	0.20	0.62
	3.26	0.08	0.26

Pintura Techo = 2.73 x 3.83 = 10.46

TOTAL 54.12

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.78	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.20	4.20	3.25	13.65

3.25

TOTAL M2

13.78

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

BENEFICIARIO: ROSALIA PORTILLO CARDENAS

DOMICILIO : **C.RIO DIAMANTE # 2402 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

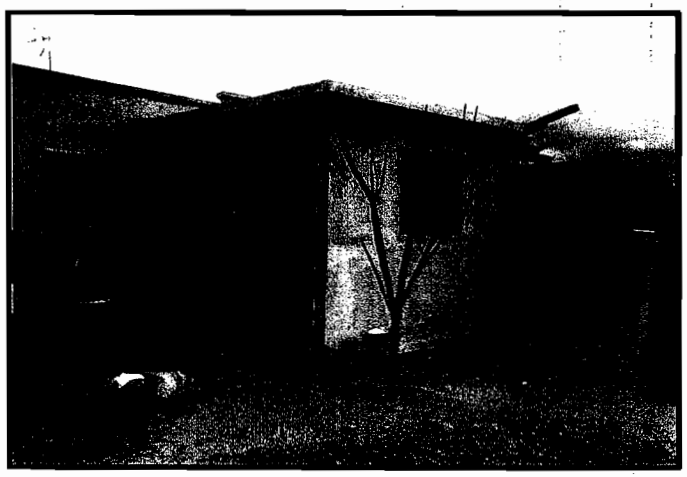



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	33.79	M2

Existente

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.57	0.00
3.03	2.86	0.9	1.05	2.86	2.43	6.95
				0.90	2.40	2.16
	3.85			3.85	2.37	9.12
			PTA	2.10	0.97	-2.04
	4.17		VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.03	2.53	7.67
	4.17	2.38	9.92
	1.05	2.54	2.67
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 33.79

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES
DOMICILIO : C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.16	M2

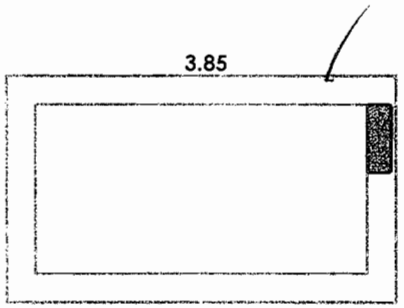

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.86	3.85	11.01
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.16 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	SALIDA



TOTAL 10 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	61.62	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.85	2.50	9.63
	2.86	2.43	6.95
	2.86	2.43	6.95
	3.85	2.37	9.12
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.03	2.53	7.67
	4.17	2.38	9.92
	1.05	2.54	2.67
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.23	0.20	0.65
	3.23	0.08	0.26
2	4.17	0.20	0.83
	4.37	0.08	0.35
3	1.05	0.20	0.21
	1.25	0.08	0.10

Pintura Techo = 3.85 x 2.86 = 11.01

TOTAL 61.62

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.70	M2

4.00

0.6

1.03

3.02

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.00	3.02	12.08
	0.60	1.03	0.62

TOTAL 12.70 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : **C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

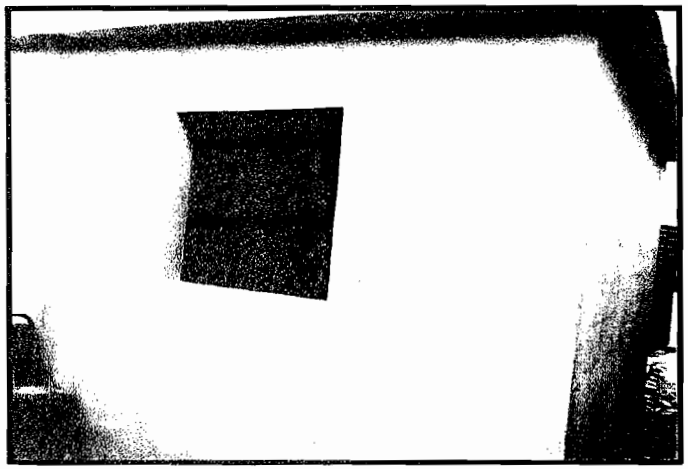



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS

DOMICILIO: C.RIO VENTUARY # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	40.42	M2

EXIST.

3.85 3.68 3.68

2.81

3.14

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.61	0.00
	3.68	2.59	9.53
	3.68	2.59	9.53
	2.81	2.50	7.03
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.85	2.74	10.55
	3.14	2.70	8.48
	0.00	2.65	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 40.42

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS
DOMICILIO : C.RIO VENTUARY # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.49	M2

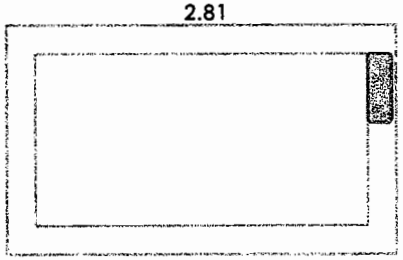

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.68	2.81	10.34
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.49 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VENTUARY # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VENTUARY # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	52.79	M2

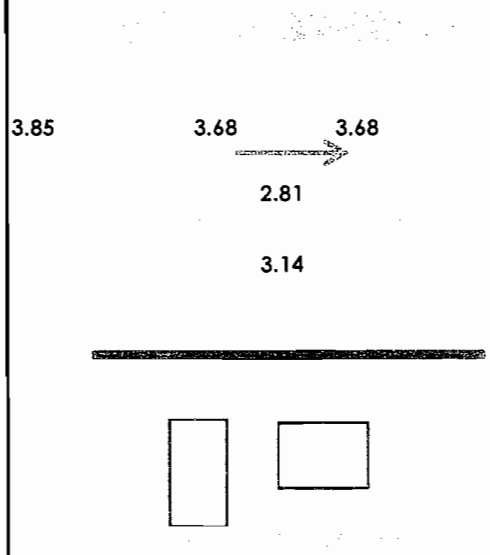

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.68	2.59	9.53
	3.68	2.59	9.53
	2.81	2.50	7.03
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.85	2.74	10.55
	3.14	2.70	8.48
	0.00	2.65	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	3.85	0.20	0.77
	4.05	0.08	0.32
2	3.34	0.20	0.67
	3.34	0.08	0.27

Pintura Techo 2.81 x 3.68 = 10.34

TOTAL 52.79

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VENTUARY # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.33	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.04		4.04	3.30	13.33
		0.00	0.00	0.00
	3.30			

TOTAL **13.33 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ROCIO CISNEROS ROJAS
DOMICILIO : **C.RIO VENTUARY # 25910 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

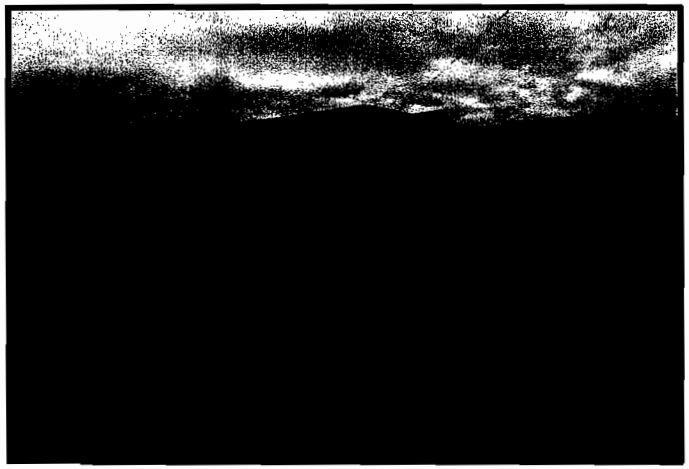

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	58.23	M2

					INTERIORES				EXTERIORES		
		3.63			M	M	M2		M	M	M2
		3.48			LARGO	ALTO	ÁREA		LARGO	ALTO	ÁREA
					3.48	2.48	8.63		3.25	2.63	8.55
3.25	2.93		2.93	3.25	2.93	2.58	7.56		3.63	2.65	9.62
					2.93	2.58	7.56		3.63	2.80	10.16
		3.48			3.48	2.65	9.22		3.25	0.50	1.63
				PTA	2.10	0.97	-2.04	PTA	2.10	0.97	-2.04
		3.63		VENT.	1.00	1.00	-1.00	VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 58.23

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.35	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.93	3.48	10.20
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.35 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA

TOTAL 1.00 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	70.49	M2

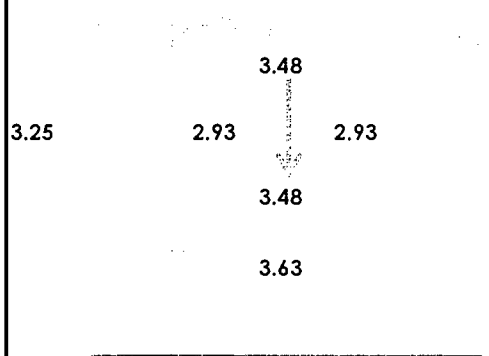


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.48	2.48	8.63
	2.93	2.58	7.56
	2.93	2.58	7.56
	3.48	2.65	9.22
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.25	2.63	8.55
	3.63	2.65	9.62
	3.63	2.80	10.16
	3.25	0.50	1.63
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.45	0.20	0.69
	3.45	0.08	0.28
2	3.83	0.20	0.77
	4.03	0.08	0.32

Pintura Techo 3.48x2.93= 10.20

TOTAL 70.49

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.94	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.03		4.03	3.46	13.94
	3.46			

TOTAL 13.94 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA/PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT .01	Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho imcluye marco metalico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidadad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
GT02	Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho con vidrio claro de 3mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00 pza

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA MARGARITA LERMA MOLINA
DOMICILIO : C.DESIERTO DE CHALBI # 17914 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	48.08	M2

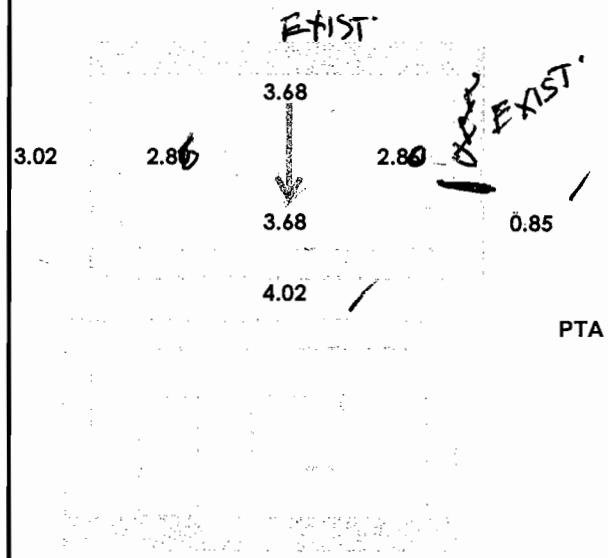

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.68	2.57	9.46
	2.80	2.52	7.06
	2.86	2.52	7.21
	3.68	2.47	9.09
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.10	0.78	-1.64

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.02	2.63	7.94
	4.02	2.64	10.61
	0.85	2.70	2.30
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.78	0.15	1.00	0.12

TOTAL 48.08

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : **C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.45	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.80	3.68	10.30
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.45 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	60.34	M2

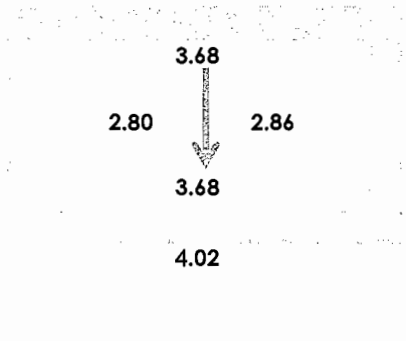


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.68	2.57	9.46
	2.80	2.52	7.06
	2.86	2.52	7.21
	3.68	2.47	9.09
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.10	0.78	-1.64

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.02	2.63	7.94
	4.02	2.64	10.61
	0.85	2.70	2.30
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.78	0.15	1.00	0.12

VOLADOS

1	4.15	0.20	0.83
	4.15	0.08	0.33
2	2.80	0.20	0.56
	3.0	0.08	0.24

Pintura Techo 3.68 x 2.80 = 10.30

TOTAL 60.34

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.45	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.15	4.15	3.00	12.45
3.00			

TOTAL 12.45 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ


DOMICILIO : C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

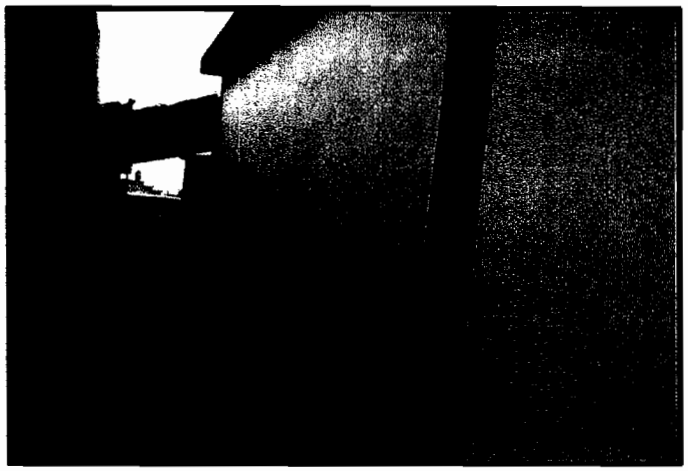

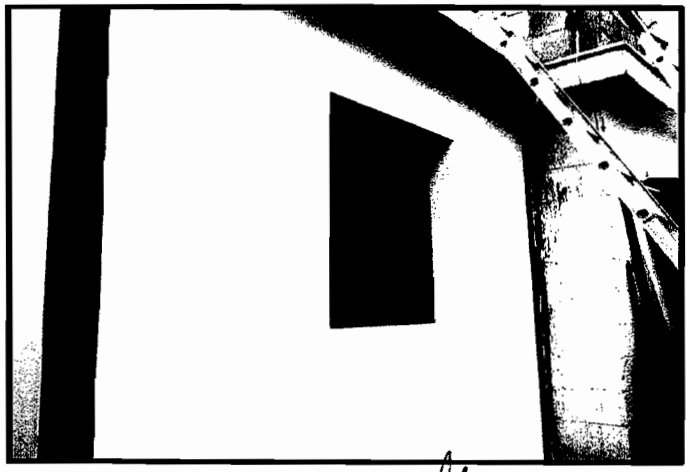

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	41.86	M2

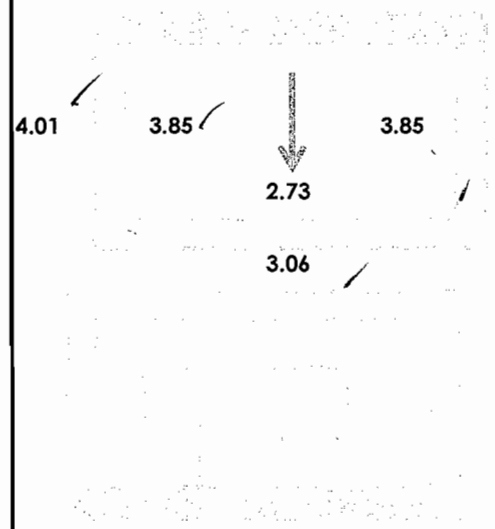

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.85	2.58	9.93
	3.85	2.58	9.93
	2.73	2.55	6.96
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.01	2.77	11.11
	3.06	2.82	8.63
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 41.86

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA

No. CONTRATO: **200/2016**

DOMICILIO : **C.RIO NEUQUEL # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. ESTIMACION: **3**

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	**Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.**	**10.66**	**M2**

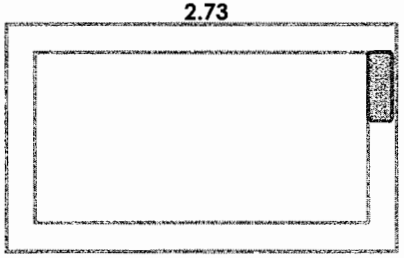

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.85	2.73	10.51
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.66 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.42	M2

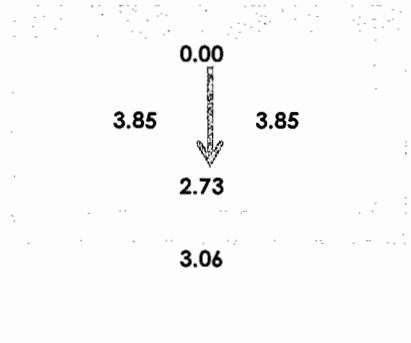


INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
		0.00	2.57	0.00
		3.85	2.58	9.93
0		3.85	2.58	9.93
		2.73	2.55	6.96
	PTA	2.10	0.97	-2.04
	VENT.	1.00	1.00	-1.00
	PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.01	2.77	11.11
	3.06	2.82	8.63
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.21	0.20	0.84
	4.21	0.08	0.34
2	3.06	0.20	0.61
	3.26	0.08	0.26

Pintura Techo = 2.73 x 3.85 = 10.51

TOTAL 54.42

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.57	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.20	4.20	3.23	13.57
3.23			

TOTAL 13.57 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: HEIDI AMERICA CAZARES PEREA
DOMICILIO : **C.RIO NEUQUEL # 1832 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	41.71	M2

INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
3.99		0.00	2.57	0.00
3.85		3.85	2.58	9.93
	3.85	3.85	2.58	9.93
2.74		2.74	2.46	6.74
	PTA	2.10	0.97	-2.04
3.05	VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.99	2.78	11.09
	3.05	2.86	8.72
	0.00	2.83	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 41.71

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.70	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.85	2.74	10.55
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.70 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA



TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.31	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.85	2.58	9.93
0	3.85	2.58	9.93
	2.74	2.46	6.74
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.99	2.78	11.09
	3.05	2.86	8.72
	0.00	2.83	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.19	0.20	0.84
	4.19	0.08	0.34
2	3.05	0.20	0.61
	3.25	0.08	0.26

Pintura techo 2.74 X 3.85 = 10.55

TOTAL 54.31

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.48	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.20	4.20	3.21	13.48
	0.00	0.00	0.00
3.21			

TOTAL 13.48 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA


DOMICILIO : **C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



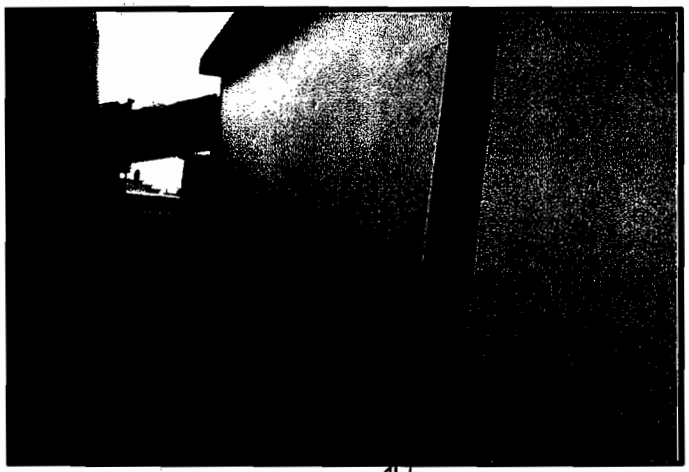

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales. de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	33.39	M2

Existentes

1.32 1.14 3.61 3.97 3.06 2.54

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	1.14	2.41	2.75
	3.61	2.37	8.56
	3.06	2.44	7.47
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	1.32	2.46	3.25
	2.54	2.54	6.45
	3.97	2.42	9.61
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 33.39

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.20	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.61	3.06	11.05
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.20 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	57.13	M2

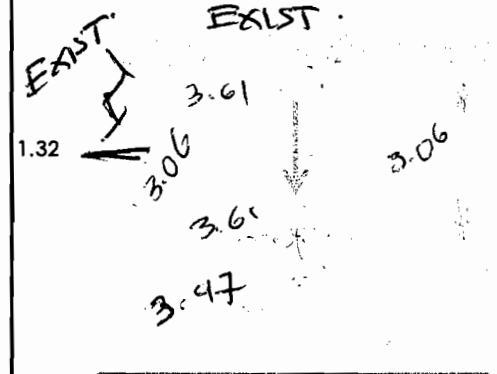

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.06	2.44	7.47
	3.61	2.50	9.03
	3.61	2.37	8.56
	3.06	2.44	7.47
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.10	0.83	-1.74
VENT EXTRA			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	1.32	2.46	3.25
	2.54	2.54	6.45
	3.97	2.42	9.61
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	2.54	0.20	0.51
	2.54	0.08	0.20
2	1.32	0.20	0.26
	1.32	0.08	0.11
3	3.40 x	0.20	0.68
	3.00 x	0.08	0.30

Pintura Techo = 3.06 x 3.61 = 11.05

TOTAL 57.13

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.99	M2

			M	M	M2
3.80			Largo	Ancho	Área
	0.55				
		1.3	3.80	3.23	12.27
			1.30	0.55	0.72
	3.23				

TOTAL **12.99 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

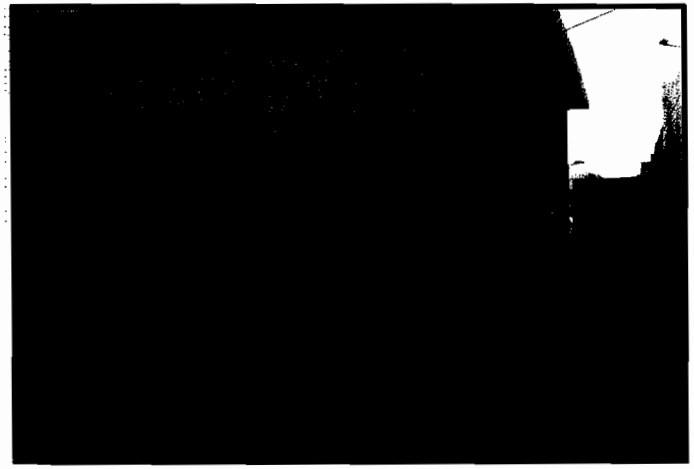



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	28.52	M2

3.12

3.12 : 3.26

3.48

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.51	0.00
	3.26	2.60	8.48
	3.26	2.48	8.08
	3.12	2.53	7.89
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	3.03	0.00
	3.48	2.52	8.77
	0.00	2.72	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 28.52

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO
DOMICILIO : C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.32	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.26	3.12	10.17
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.32 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1,0	SALIDA

TOTAL 1,0 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales. de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	46.66	M2

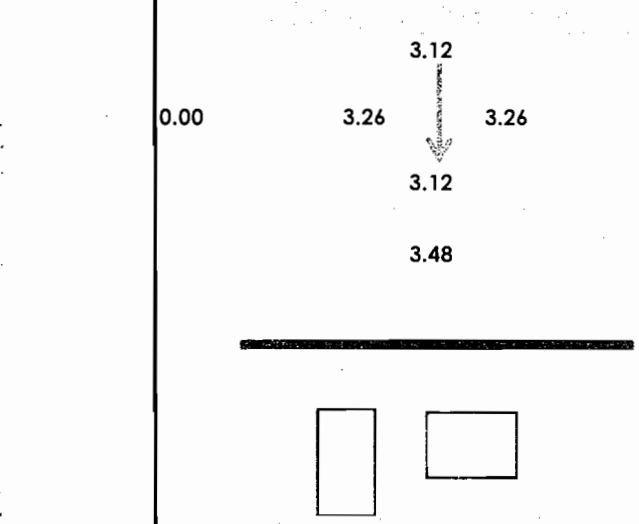

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.12	2.56	7.99
	3.26	2.60	8.48
0	3.26	2.48	8.08
	3.12	2.53	7.89
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.05	0.94	-1.93

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	3.03	0.00
	3.48	2.52	8.77
	0.00	2.72	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.48	0.20	0.70
	3.48	0.08	0.28

Pintura Techo 3.12 x 3.26 = 10.17

TOTAL 46.66

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	11.72	M2

3.60

0.40

0.40

3.21

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.60	3.21	11.56
	0.40	0.40	0.16

TOTAL **11.72 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO

DOMICILIO : **C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	38.36	M2

3.00 2.86 2.86 3.69 4.03

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	2.86	2.48	7.09
	2.86	2.68	7.66
	3.69	2.56	9.45
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.62	7.86
	4.03	2.73	11.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 38.36

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.70	M2

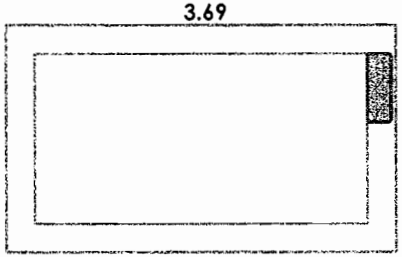

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.86	3.69	10.55
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.70 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	SALIDA



TOTAL 10 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	60.35	M2

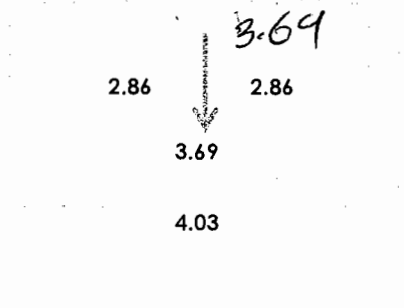

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.69	2.56	9.45
	2.86	2.48	7.09
0	2.86	2.68	7.66
	3.69	2.56	9.45
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.62	7.86
	4.03	2.73	11.00
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.0	0.20	0.6
	3.0	0.08	0.24
2	4.03	0.20	0.81
	4.23	0.08	0.34

Pintura Techo = 3.69x2.86 = 10.55

TOTAL : 60.35

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. JUAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.60	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.20		4.20	3.00	12.60
	3.00			

TOTAL 12.60 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO
DOMICILIO : **C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	42.02	M2

INTERIORES

			M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
4.02	3.84	3.84	0.00	2.61	0.00
			3.84	2.66	10.21
			3.84	2.66	10.21
	2.71		2.71	2.57	6.96
		PTA	2.10	0.97	-2.04
	3.06	VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.02	2.68	10.77
	3.06	2.80	8.57
	0.00	2.65	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 42.02

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO
DOMICILIO : C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.56	M2

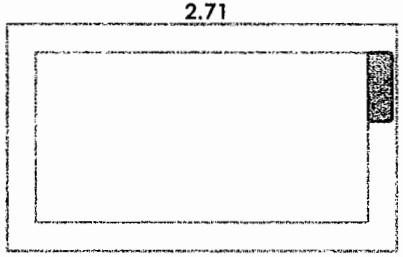

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.84	2.71	10.41
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.56 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA



TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.48	M2

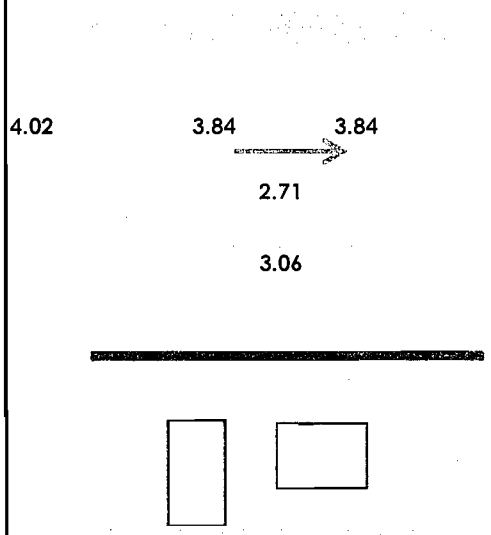

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.84	2.66	10.21
	3.84	2.66	10.21
	2.71	2.57	6.96
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.02	2.68	10.77
	3.06	2.80	8.57
	0.00	2.65	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	4.02	0.20	0.80
	4.22	0.08	0.34
2	3.26	0.20	0.65
	3.26	0.08	0.26

Pintura techo = 2.71 x 3.84 = 10.41

TOTAL 54.48

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.65	M2

4.20

3.25

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.25	13.65
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.65 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : **C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

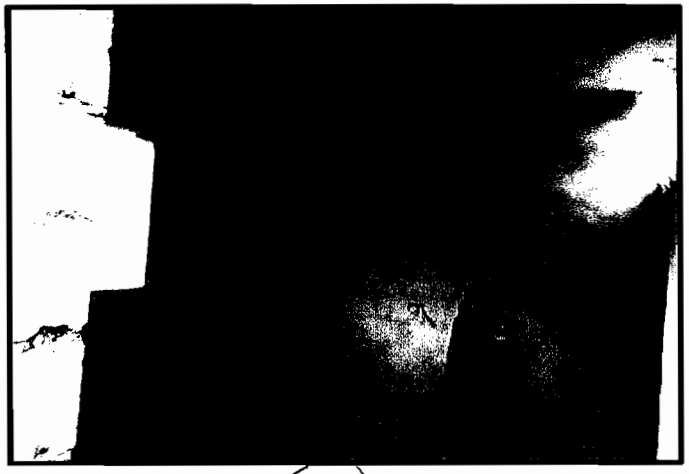

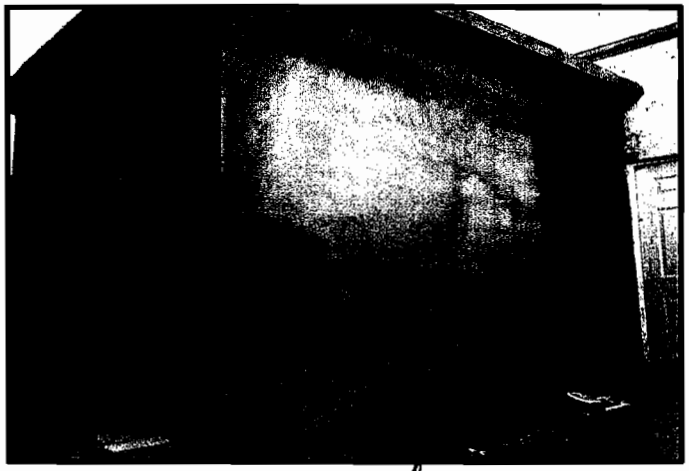

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	36.36	M2

Exist

				INTERIORES M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA		EXTERIORES M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.09			3.09	2.61	8.06		3.73	2.70	10.07
3.73	3.43	3.43		3.43	2.50	8.58		0.00	2.79	0.00
				3.43	2.70	9.26		0.00	2.80	0.00
	3.09			3.09	2.61	8.06	PTA	2.10	0.97	-2.04
			PTA	2.10	0.97	-2.04	VENT.	1.00	1.00	-1.00
			VENT.	1.00	1.00	-1.00				
			PTA EXTRA	2.07	0.95	-1.97				
			VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00				

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 36.36

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.75	M2

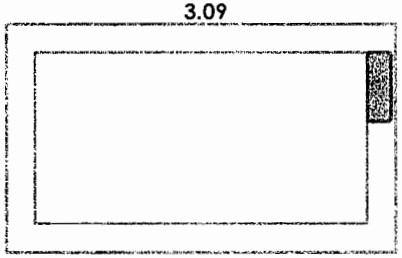

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.43	3.09	10.60
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.75 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	48.01	M2

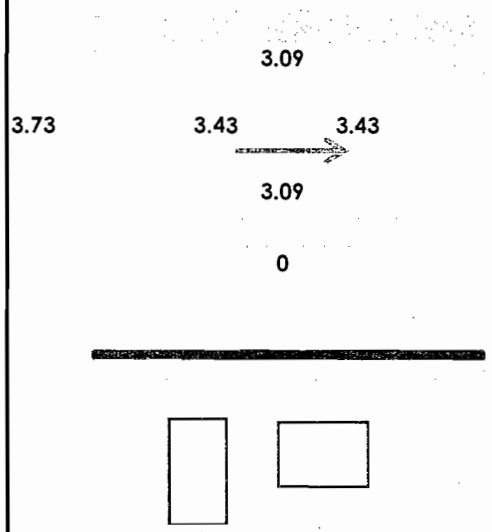

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.09	2.61	8.06
	3.43	2.50	8.58
	3.43	2.70	9.26
	3.09	2.61	8.06
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.07	0.95	-1.97
VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.73	2.70	10.07
	0.00	2.79	0.00
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	3.73	0.20	0.75
	3.73	0.08	0.30

Pintura Techo = 3.09 x 3.43 = 10.60

TOTAL 48.01

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.32	M2

3.60

0.20

0.40

3.40

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.60	3.40	12.24
	0.40	0.20	0.08

TOTAL **12.32 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ
DOMICILIO : **C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

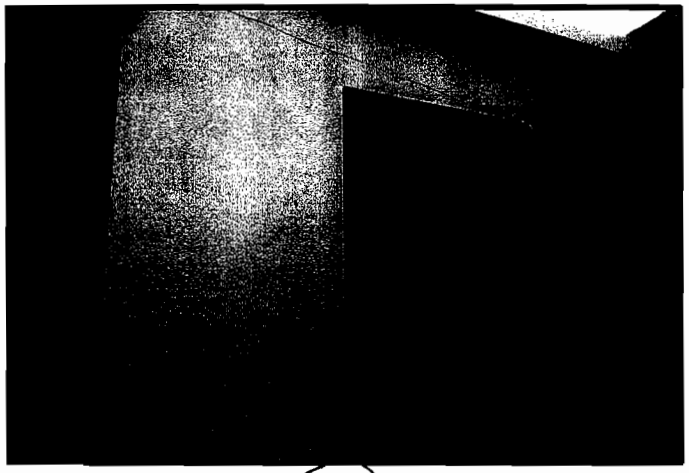

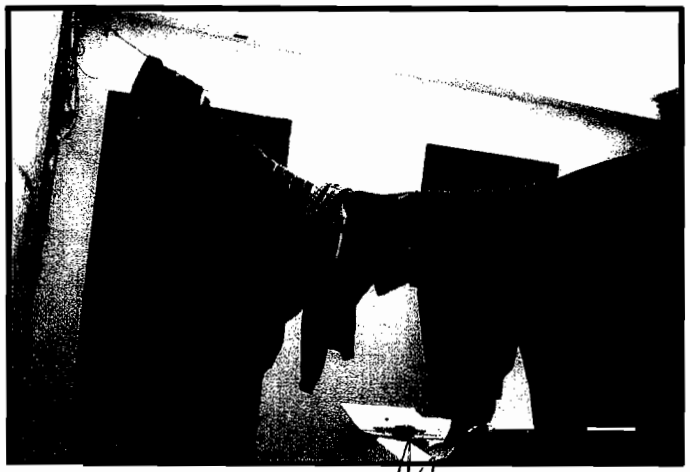

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.52	M2

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.57	0.00
4.08	3.93		3.93	3.93	2.46	9.67
			4.11	3.93	2.51	9.86
		2.75		2.75	2.37	6.52
			PTA	2.10	0.97	-2.04
		3.08	VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.08	3.08	12.57
	3.08	2.95	9.09
	4.11	2.80	11.51
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 54.52

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.96	M2

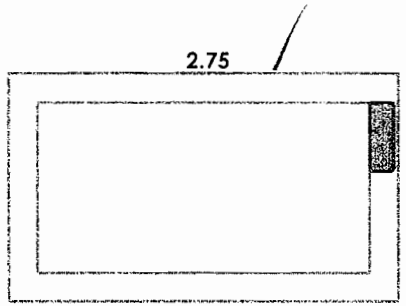

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.93	2.75	10.81
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.96 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	67.38	M2

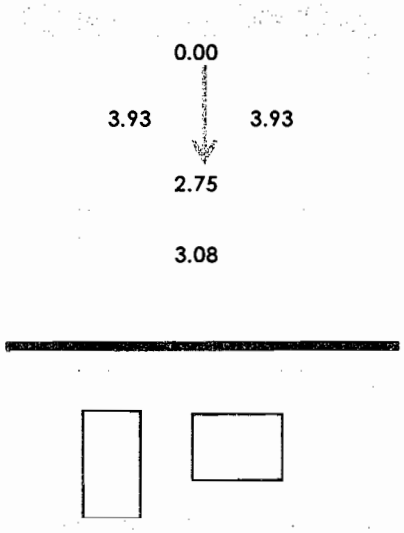

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.93	2.46	9.67
	3.93	2.51	9.86
	2.75	2.37	6.52
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.08	3.08	12.57
	3.08	2.95	9.09
	4.11	2.80	11.51
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.08	0.34
2	3.03	0.20	0.61
	3.23	0.08	0.26

Pintura Techo = 2.75 x 3.93 = 10.81

TOTAL 67.38

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.57	M2

4.20

M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.30	3.23	13.89

3.23

TOTAL 13.57 **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO
DOMICILIO : **C.RIO SALADO # 2440 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

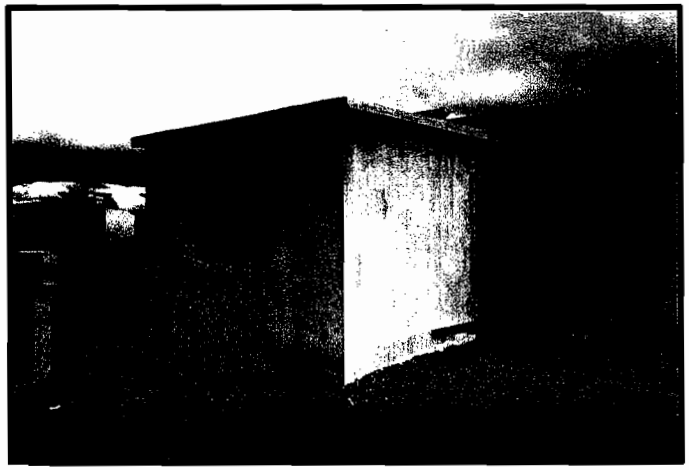



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. OSCAR SOTO MAYNEZ # 16711 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	57.16	M2

3.99

3.7

3.05 2.70 2.7

3.7

4.03

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.70	2.45	9.07
	2.70	2.54	6.86
	2.70	2.54	6.86
	3.70	2.63	9.73
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.05	2.65	8.08
	4.03	2.80	11.28
	3.99	2.50	9.98
	0.00	0.50	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 57.16

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. OSCAR SOTO MAYNEZ # 16711 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.14	M2

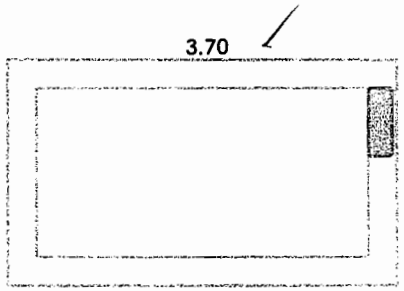

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.70	3.70	9.99
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.14 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. OSCAR SOTO MAYNEZ # 16711 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1	SALIDA

TOTAL 1 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. OSCAR SOTO MAYNEZ # 16711 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	69.21	M2

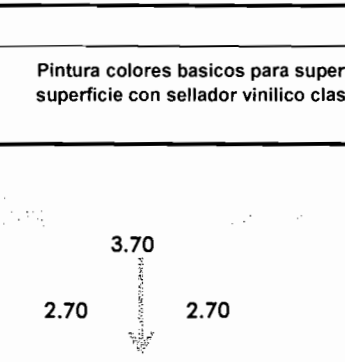


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.70	2.45	9.07
	2.70	2.54	6.86
	2.70	2.54	6.86
	3.70	2.63	9.73
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.05	2.65	8.08
	4.03	2.80	11.28
	3.99	2.50	9.98
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.25	0.20	0.65
	3.25	0.08	0.26
2	4.03	0.20	0.81
	4.23	0.08	0.34

Pintura Techo. 3.70 X 2.70 = 9.99

TOTAL 69.21

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. OSCAR SOTO MAYNEZ # 16711 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.81	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.25		4.25	3.25	13.81
	3.25			

TOTAL 13.81 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 COL. SOLIDARIDAD

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT .01	Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho imcluye marco metalico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidadad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 COL. SOLIDARIDAD

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT02	Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho con vidrio claro de 3mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00 pza

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ANDREA SAENZ ARENALES
DOMICILIO : **C. OSCAR SOTO MAYNEZ # 16711 COL. SAHUAROS**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

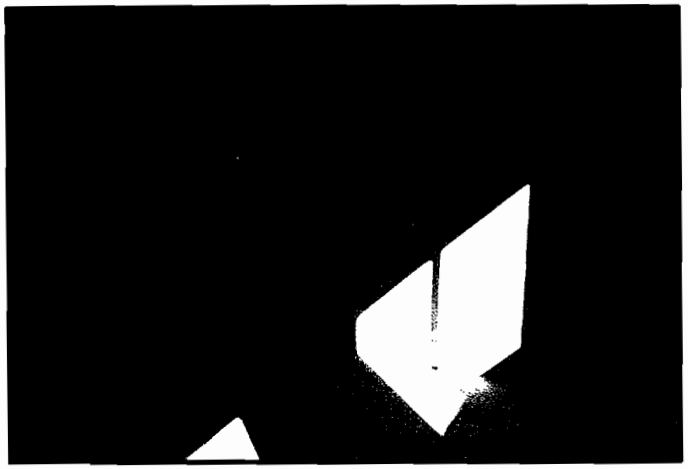



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	38.11	M2

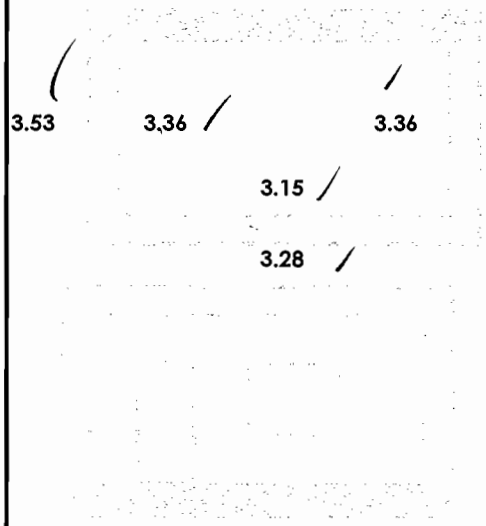

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.36	2.55	8.57
	3.36	2.55	8.57
	3.15	2.44	7.69
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.53	2.64	9.32
	3.28	2.64	8.66
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 38.11

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON

No. CONTRATO: **200/2016**

DOMICILIO : **C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. ESTIMACION: **3**

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.73	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.36	3.15	10.58
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.73 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	50.68	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.36	2.55	8.57
	3.36	2.55	8.57
	3.15	2.44	7.69
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.53	2.64	9.32
	3.28	2.64	8.66
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.73	0.20	0.75
	3.73	0.08	0.30
2	3.28	0.20	0.66
	3.48	0.08	0.28

Pintura Techo 3.72 x 3.48 = 10.58

TOTAL 50.68

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.95	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
3.72		3.72	3.48	12.95
	3.48			

TOTAL **12.95 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPIÑON
DOMICILIO : **C.RIO HERRERA # 1616 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



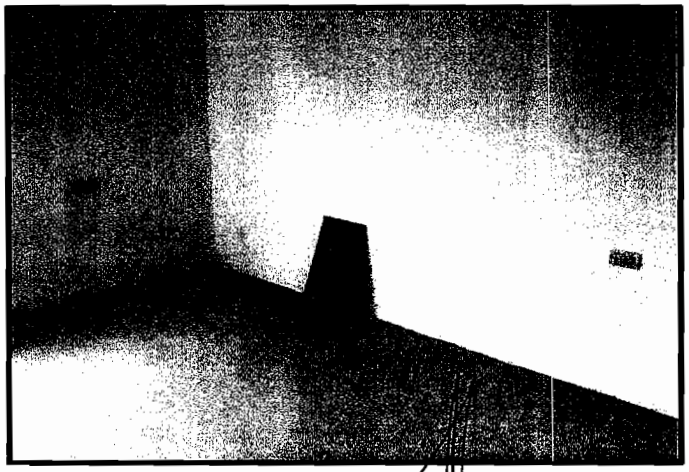

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	32.71	M2

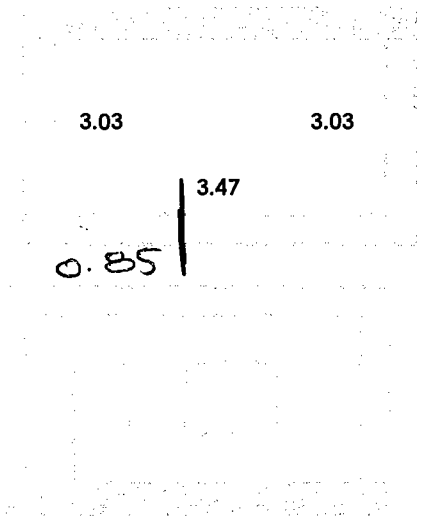

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.70	2.52	1.76
	3.03	2.56	7.76
	3.03	2.72	8.24
	3.47	2.60	9.02
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.64	0.00
	3.30	2.56	8.45
	0.85	2.56	2.18
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 32.71

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL
DOMICILIO : **C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016
No. CONTRATO: **200/2016**
No. ESTIMACION: **3**

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.66	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.03	3.47	10.51
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.66 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA



TOTAL 10 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	52.43	M2

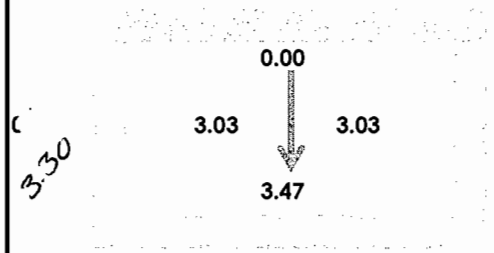



INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.70	2.52	1.76
	3.03	2.56	7.76
	3.03	2.72	8.24
	3.47	2.60	9.02
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST	3.47	2.60	9.02
VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.64	0.00
	3.30	2.56	8.45
	0.85	2.56	2.18
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	0.85	0.20	0.17
	1.05	0.08	0.08
2	3.30	0.20	0.66
	3.50	0.08	0.28

Pintura techo. 3.47 x 3.03 = 10.51

TOTAL 52.43

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.91	M2

4.00

0.50

0.86

3.12

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.00	3.12	12.48
	0.86	0.50	0.43

TOTAL 12.91 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL
DOMICILIO : **C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	34.12	M2

INTERIORES

			M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
			0.00	2.57	0.00
3.54	3.54		3.54	2.73	9.66
			3.54	2.73	9.66
2.73	1.59		2.73	2.62	7.15
		PTA	2.10	0.97	-2.04
2.89		VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	3.02	0.00
	2.89	2.76	7.98
	1.59	2.75	4.37
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 34.12

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA
DOMICILIO : C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.81	M2

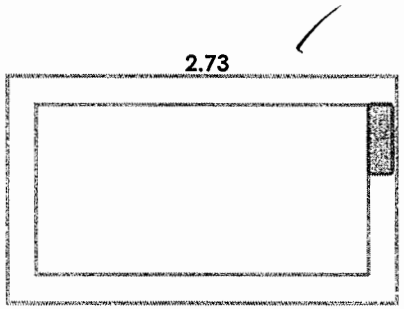

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.54	2.73	9.66
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **9.81 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	44.59	M2

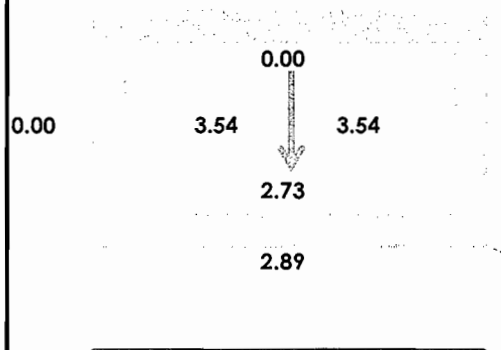


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.54	2.73	9.66
	3.54	2.73	9.66
	2.73	2.62	7.15
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	3.02	0.00
	2.89	2.76	7.98
	1.59	2.75	4.37
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	0.00	0.20	0.00
	0.00	0.08	0.00
2	2.89	0.20	0.58
	2.89	0.08	0.23

Pintura Techo. 2.73 x 3.54 = 9.66

TOTAL = 44.59

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.23	M2

3.94

0.30

1.78

2.97

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.94	2.97	11.70
	1.78	0.30	0.53

TOTAL 12.23 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA


DOMICILIO : C.RIO AMUR # 2225 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



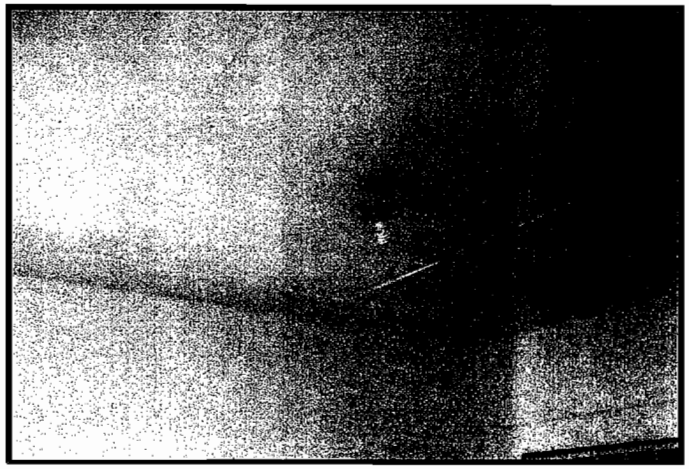

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	51.04	M2

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.57	0.00
3.66	3.50		3.5	3.50	2.67	9.35
				3.50	2.67	9.35
		2.98	3.66	2.98	2.52	7.51
			PTA	2.10	0.97	-2.04
		3.32	VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.66	2.77	10.14
	3.32	2.72	9.03
	3.66	2.83	10.36
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 51.04

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA
DOMICILIO : C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.58	M2

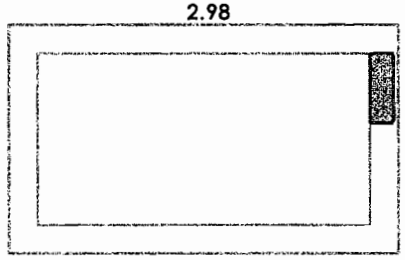

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.50	2.98	10.43
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.58 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA



TOTAL 1.0 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	64.57	M2

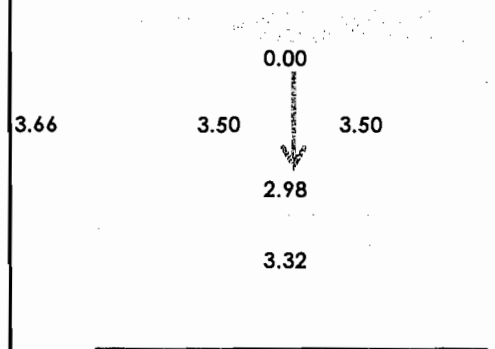


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.50	2.67	9.35
	3.50	2.67	9.35
	2.98	2.52	7.51
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.66	2.77	10.14
	3.32	2.72	9.03
	3.66	2.83	10.36
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.86	0.20	0.77
	3.86	0.08	0.31
2	3.25	0.20	0.65
	3.65	0.08	0.29
3	3.86	0.20	0.77
	3.86	0.08	0.31

Pintura techo = 2.98 x 3.50 = 10.43

TOTAL 64.57

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.16	M2

3.88

3.65

M	M	M2
Largo	Ancho	Área
3.88	3.65	14.16
0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.16 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA
DOMICILIO : **C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

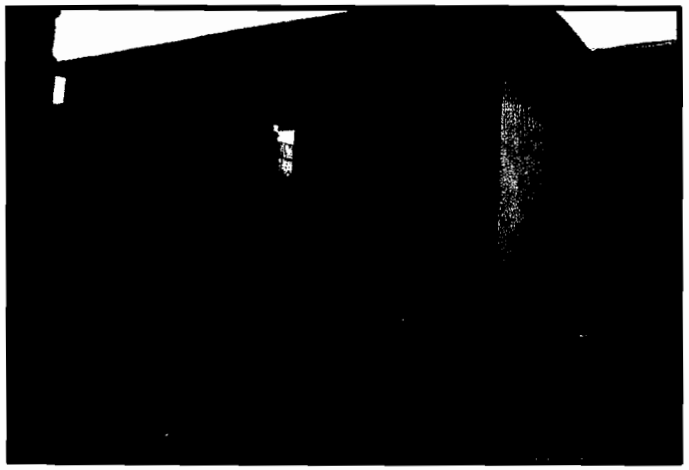

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO YOKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	30.48	M2

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.57	0.00
2.85	2.67			2.67	2.54	6.78
				0.00	2.50	0.00
	4.05			4.05	2.50	10.13
			PTA	2.10	0.97	-2.04
	4.2		VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.85	2.64	7.52
	4.20	2.56	10.75
	0.00	2.66	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 30.48

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO YOKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.96	M2

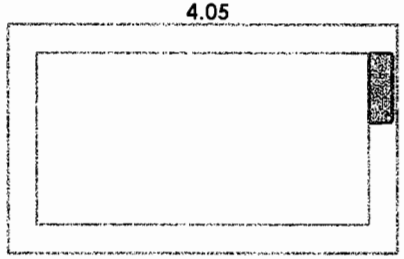

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.67	4.05	10.81
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.96 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO YOKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO YOKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	58.52	M2

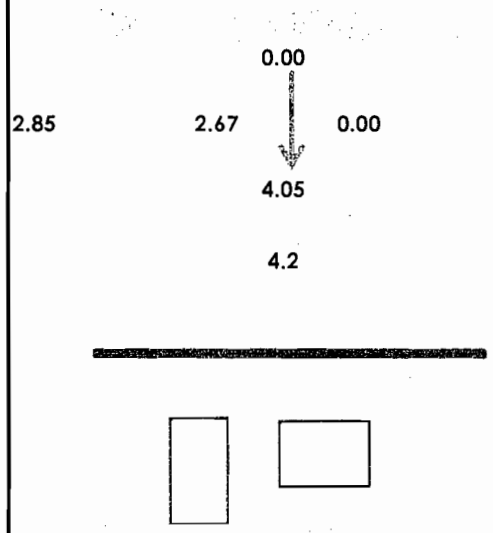

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.67	2.51	6.70
	2.67	2.54	6.78
	4.05	2.60	10.53
	4.05	2.50	10.13
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.10	0.97	-2.04
VENT EXTRA			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.85	2.64	7.52
	4.20	2.56	10.75
	0.00	2.66	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.05	0.20	0.61
	3.05	0.08	0.24
2	4.20	0.20	0.84
	4.40	0.08	0.35

Pintura Techo = 4.05 x 2.67 = 10.91

TOTAL 58.52

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO YOKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.62	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.35		4.35	2.90	12.62
	2.90			

TOTAL 12.62 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA


DOMICILIO : C.RIO YOKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



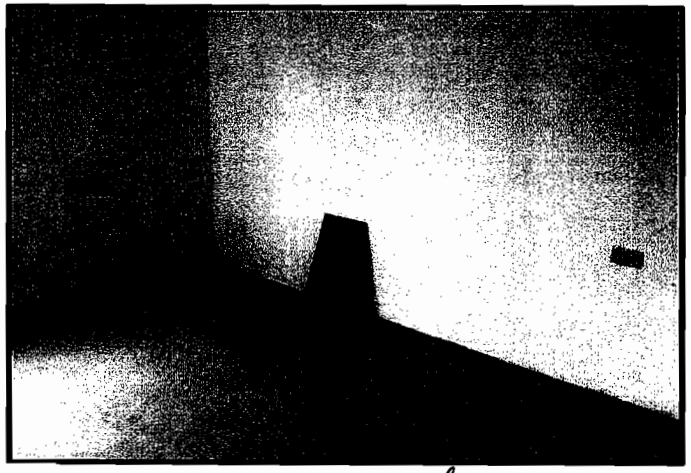

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos. electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	39.13	M2

EXISTENTE.

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.61	0.00
3.00	2.86	2.86	1.07	2.86	2.50	7.15
				2.86	2.50	7.15
	3.66			3.66	2.40	8.78
			PTA	2.10	0.97	-2.04
	3.95		VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.64	7.92
	3.95	2.56	10.11
	1.07	2.54	2.72
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 39.13

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.62	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.86	3.66	10.47
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.62 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	61.11	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.66	2.60	9.52
	2.86	2.50	7.15
	2.86	2.50	7.15
	3.66	2.40	8.78
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.64	7.92
	3.95	2.56	10.11
	1.07	2.54	2.72
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	2.85	0.20	0.57
	3.20	0.08	0.26
2	4.15	0.20	0.83
	4.15	0.08	0.33

Pintura Techo 3.66 x 2.86 = 10.47

TOTAL 61.11

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.69	M2

4.16

3.05

M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.16	3.05	12.69
0.00	0.00	0.00

TOTAL 12.69 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN
DOMICILIO : **C.RIO CAUCA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

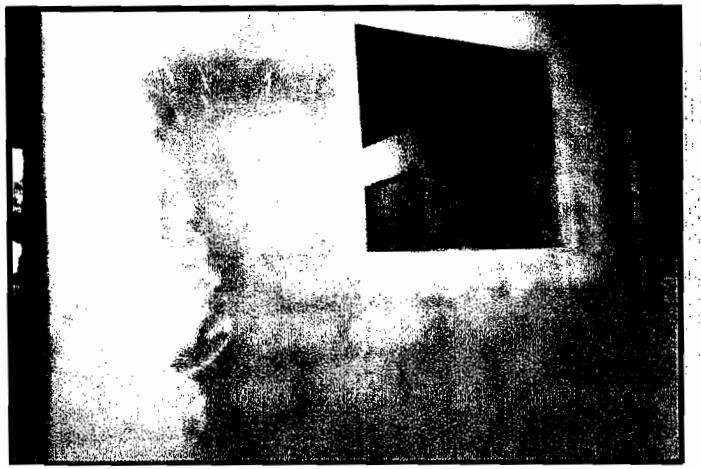



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	36.03	M2

EXISTENTE

EXIST.

1.25 / 1.10 / 4.05 / 4.24

2.67

3.00

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	1.10	2.52	2.77
	4.05	2.40	9.72
	2.67	2.44	6.51
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	1.25	2.80	3.50
	3.00	2.60	7.80
	4.24	2.46	10.43
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 36.03

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ
DOMICILIO : C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.96	M2

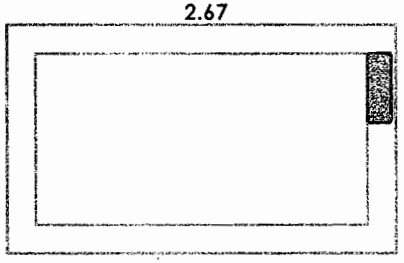

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	4.05	2.67	10.81
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.96 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	55.43	M2

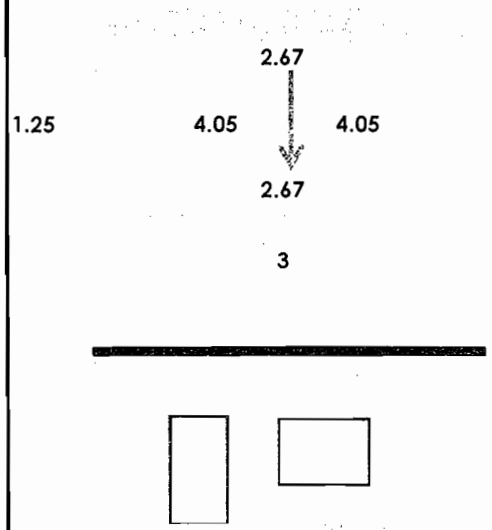

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.67	2.44	6.51
	4.05	2.52	2.77
	4.05	2.40	9.72
	2.67	2.44	6.51
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.10	0.97	-2.04
VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	1.25	2.80	3.50
	3.00	2.60	7.80
	4.24	2.46	10.43
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.43	0.20	0.89
	4.43	0.08	0.35
2	2.95	0.20	0.59
	3.15	0.08	0.25

Techo 4.05 x 2.67 = 10.81

TOTAL 55.43

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.95	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.43	4.43	3.15	13.95
3.15			

TOTAL 13.95 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ
DOMICILIO : **C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

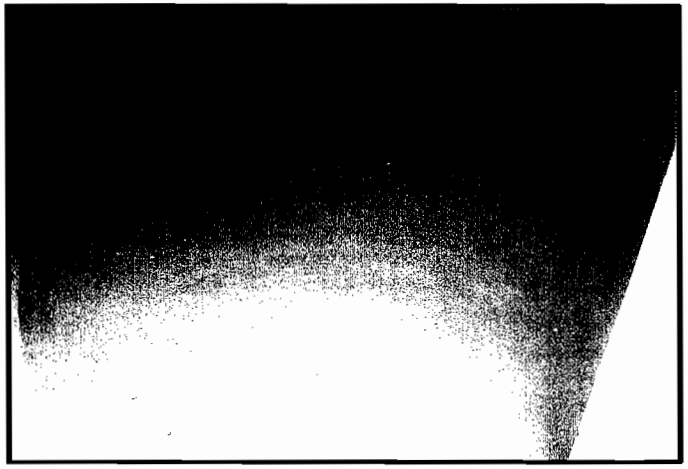



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.PRIV RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	51.65	M2

EXISTENTE.

				INTERIORES M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA		EXTERIORES M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.51	0.00		3.03	3.03	9.18
3.03	3.85	3.85		3.85	2.73	10.51		3.17	2.77	8.78
				3.85	2.49	9.59		4.02	2.72	10.93
	2.82	4.02		2.82	2.61	7.36	PTA	2.10	0.97	-2.04
			PTA	2.10	0.97	-2.04	VENT.	1.00	1.00	-1.00
	3.17		VENT.	1.00	1.00	-1.00				

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 51.65

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.PRIV RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.01	M2

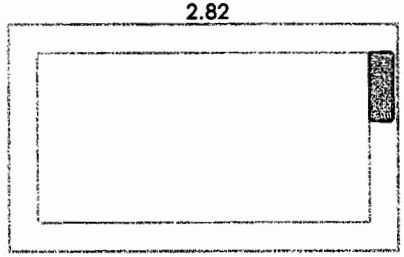

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.85	2.82	10.86
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.01 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.PRIV RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA



TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.PRIV RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	70.23	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.82	2.61	7.36
	3.85	2.73	10.51
	3.85	2.49	9.59
	2.82	2.61	7.36
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.20	1.43	-1.72

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.03	3.03	9.18
	3.17	2.77	8.78
	4.02	2.72	10.93
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	0.00	0.20	0.00
	0.00	0.08	0.00
2	3.17	0.20	0.63
	3.37	0.08	0.27
3	4.22	0.20	0.84
	4.22	0.08	0.34

Pintura Techo = 2.82 x 3.85 = 10.86

TOTAL 70.23

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.PRIV RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.07	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.20		4.20	3.35	14.07
		0.00	0.00	0.00
	3.35			

TOTAL **14.07 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO


DOMICILIO : **C.PRIV RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



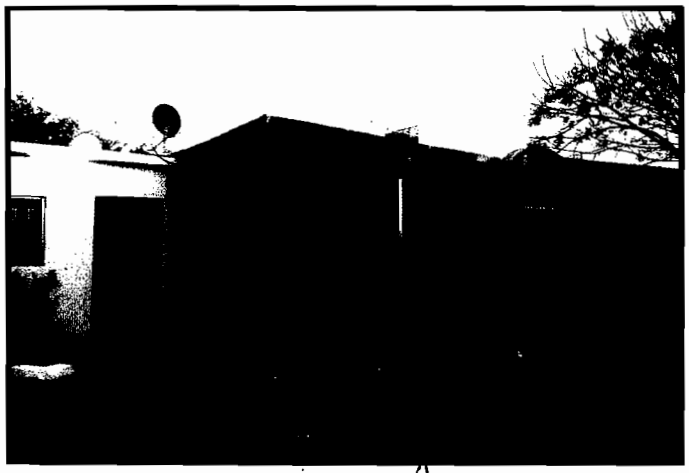

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	37.71	M2

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
				0.00	2.51	0.00
3.04	2.87		2.87	2.87	2.53	7.26
				2.87	2.53	7.26
	3.7			3.70	2.42	8.95
			PTA	2.10	0.97	-2.04
	4.05		VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.04	2.70	8.21
	4.05	2.65	10.73
	0.00	2.52	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 37.71

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USC PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.77	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.87	3.70	10.62
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.77 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	57.33	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.70	2.67	9.88
	2.87	2.53	7.26
0	2.87	2.53	7.26
	3.70	2.42	8.95
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.03	0.91	-1.85
VENT EXTRA	1.20	0.91	-1.09

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.04	2.70	8.21
	4.05	2.65	10.73
	0.00	2.52	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.24	0.20	0.65
	3.24	0.08	0.26
2	4.05	0.20	0.81
	4.25	0.08	0.34
3	0.00	0.20	0.00
	0.00	0.08	0.00

Pintura Techo - 3.70 x 2.87 = 10.62

TOTAL 57.33

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.63	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.22		4.22	3.23	13.63
		0.00	0.00	0.00
	3.23			

TOTAL 13.63 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT .01	Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho imcluye marco metalico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidadad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. JUAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversiónes de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO
DOMICILIO : C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
Ext 02	Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho con vidrio claro de 3mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00 pza

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO

DOMICILIO : C.DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

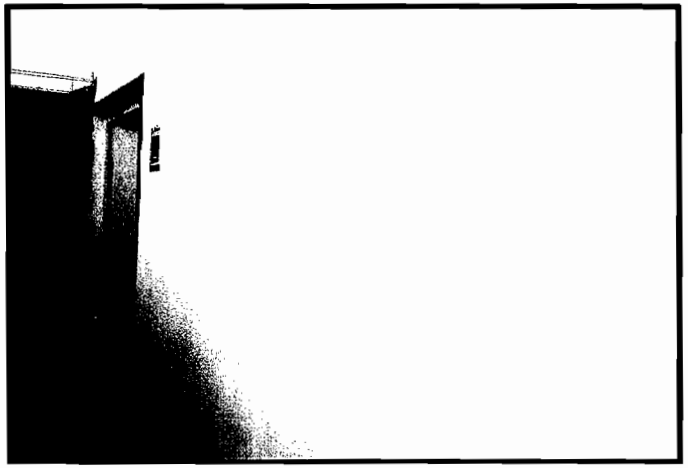

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	40.24	M2

					INTERIORES				EXTERIORES		
					M	M	M2		M	M	M2
					LARGO	ALTO	ÁREA		LARGO	ALTO	ÁREA
					0.00	2.57	0.00		3.01	2.67	8.04
3.01	2.84		2.84	0.85	2.84	2.60	7.38		4.00	2.63	10.52
					2.84	2.60	7.38		0.85	2.66	2.26
		3.70			3.70	2.53	9.36				
				PTA	2.10	0.97	-2.04	PTA	2.10	0.97	-2.04
		4.00		VENT.	1.00	1.00	-1.00	VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 40.24

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO
DOMICILIO : C.RIO HERRERA # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.66	M2

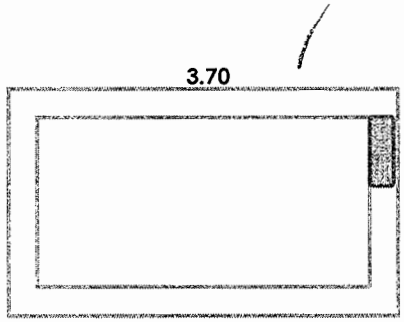

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.84	3.70	10.51
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.66 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	52.71	M2

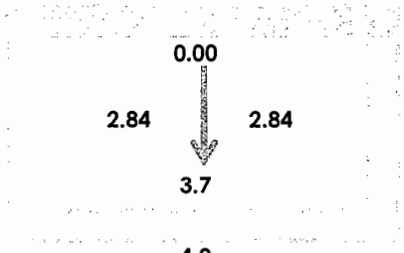


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	2.84	2.60	7.38
	2.84	2.60	7.38
	3.70	2.53	9.36
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.01	2.67	8.04
	4.00	2.63	10.52
	0.85	2.66	2.26
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1 2.80 — 0.20 0.56
3.0 — 0.08 0.24
2 — 0.20 0.83
4.15
4.15 — 0.08 0.33

Pintura Techo. 3.70 x 2.84 = 10.51

TOTAL 52.71

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERA # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.45	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.15	3.00	12.45

TOTAL 12.45 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : **C.RIO HERRERA # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

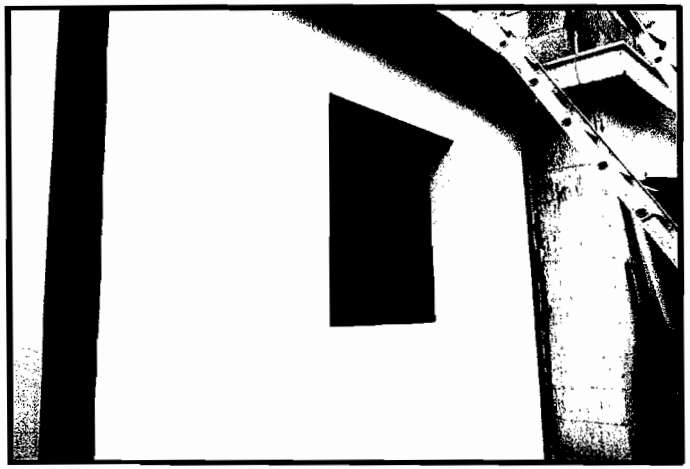

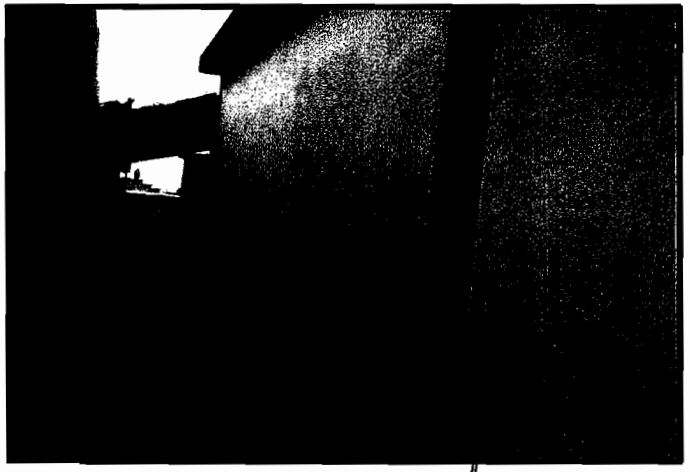

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	31.04	M2

EXISTENTE

3.85 3.63 3.63

2.84

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.63	2.60	9.44
	3.63	2.50	9.08
	2.84	2.58	7.33
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.85	2.57	9.89
	0.00	2.79	0.00
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 31.04

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.46	M2

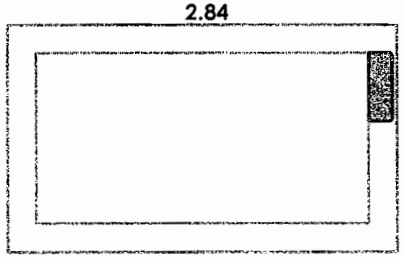

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.63	2.84	10.31
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.46 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	42.43	M2

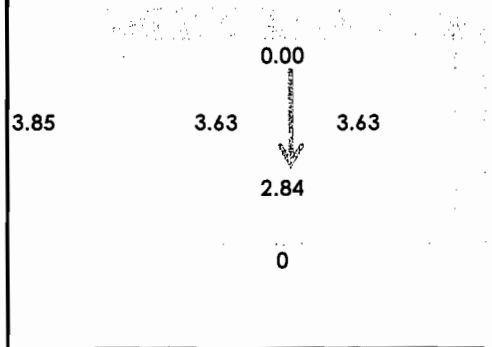


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.63	2.60	9.44
	3.63	2.50	9.08
	2.84	2.58	7.33
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.85	2.57	9.89
	0.00	2.79	0.00
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.85	0.20	0.77
	3.85	0.08	0.31

Pintura Techo = 2.84 x 3.63 = 10.31

TOTAL 42.43

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	11.55	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
3.50		3.50	3.30	11.55
	3.30			

TOTAL 11.55 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA
DOMICILIO : C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	40.90	M2

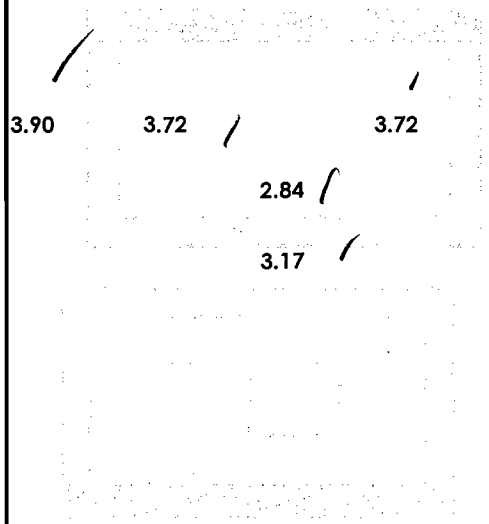

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.72	2.54	9.45
	3.72	2.54	9.45
	2.84	2.45	6.96
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.90	2.94	11.47
	3.17	2.61	8.27
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 40.90

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
DOMICILIO : C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.71	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.72	2.84	10.56
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.71 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	SALIDA

TOTAL 10 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	53.51	M2

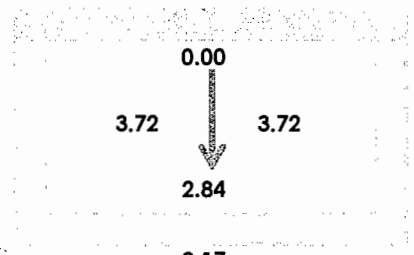


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.72	2.54	9.45
	3.72	2.54	9.45
	2.84	2.45	6.96
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.90	2.94	11.47
	3.17	2.61	8.27
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.10	0.20	0.82
	4.10	0.08	0.33
2	3.17	0.20	0.63
	3.37	0.08	0.27

Pintura Techo = 2.84 x 3.72 = 10.56

TOTAL 53.51

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.58	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.09	3.32	13.58

TOTAL 13.58 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA
DOMICILIO : C.RIO SALADO # 1621 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

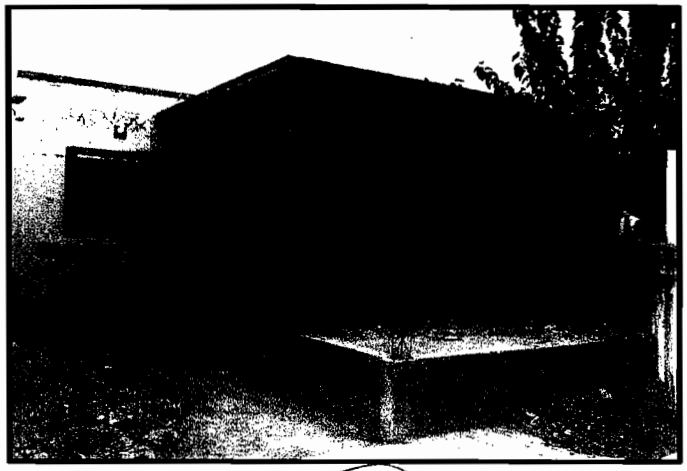

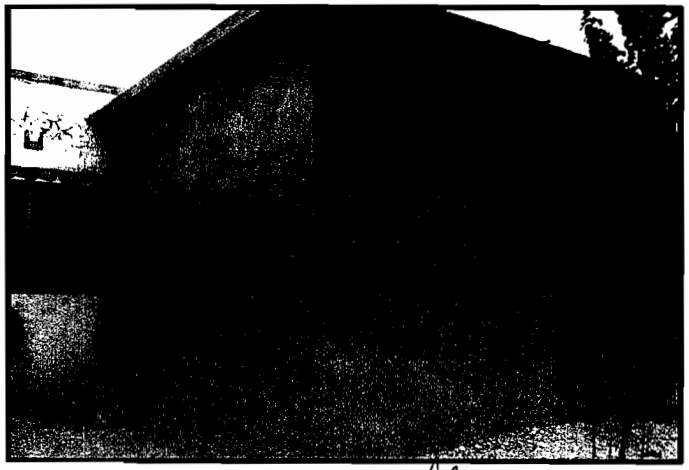

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	42.64	M2

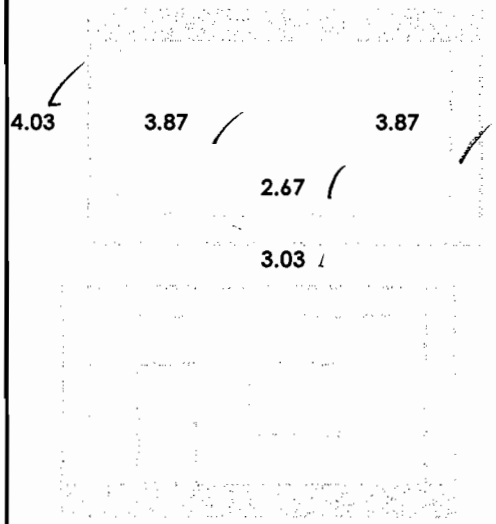

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.87	2.57	9.95
	3.87	2.57	9.95
	2.67	2.47	6.59
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.97	11.97
	3.03	2.93	8.88
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 42.64

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ
DOMICILIO : C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.48	M2

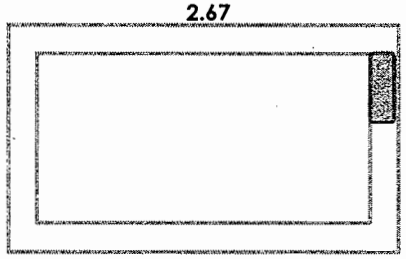

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.87	2.67	10.33
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.48 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	55.03	M2

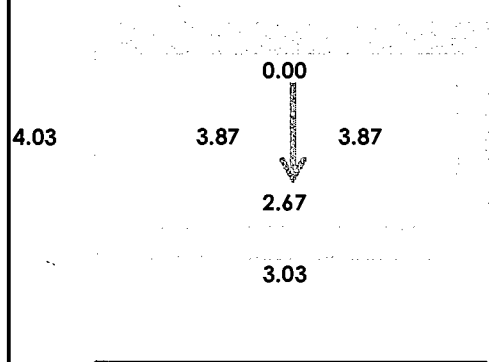


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.87	2.57	9.95
4.03	3.87	2.57	9.95
	2.67	2.47	6.59
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.97	11.97
	3.03	2.93	8.88
	0.00	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.23	0.20	0.85
	4.23	0.08	0.34
2	3.03	0.20	0.61
	3.23	0.08	0.26

Pintura techo = 2.67 x 3.87 = 10.33

TOTAL 55.03

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.66	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.23	3.23	13.66

TOTAL 13.66 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ
DOMICILIO : **C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



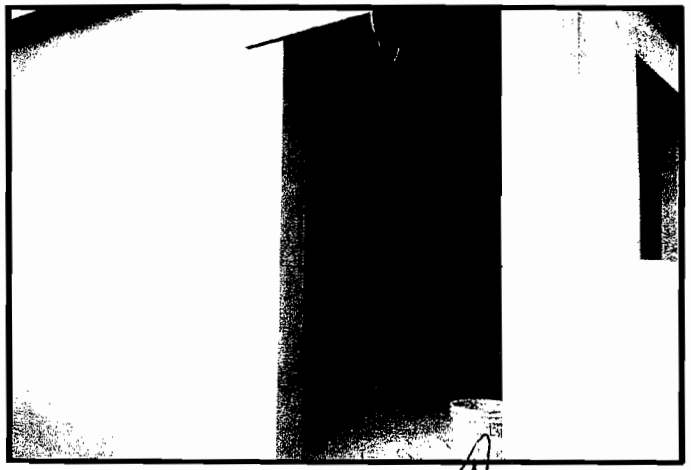

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	52.46	M2

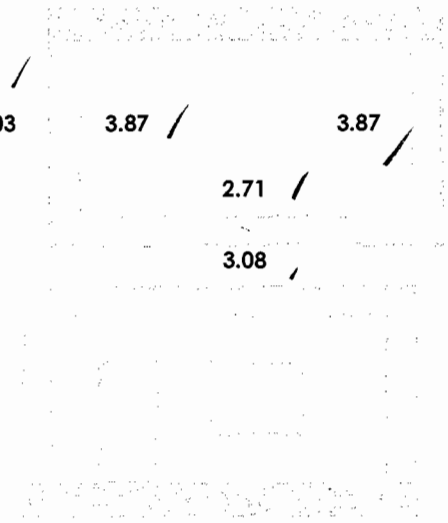

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.87	2.57	9.95
	3.87	2.57	9.95
	2.71	2.47	6.69
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.77	11.16
	3.08	2.64	8.13
	4.03	2.80	11.28
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 52.46

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ
DOMICILIO : **C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	**Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.**	**10.64**	**M2**

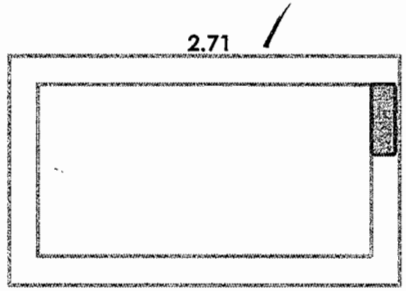

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.87	2.71	10.49
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.64 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	SALIDA



TOTAL 10 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	65.02	M2

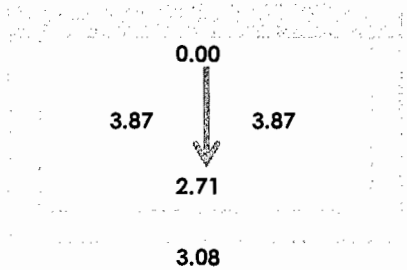



INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
		0.00	2.57	0.00
		3.87	2.57	9.95
4.03		3.87	2.57	9.95
		2.71	2.47	6.69
	PTA	2.10	0.97	-2.04
	VENT.	1.00	1.00	-1.00
	PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.77	11.16
	3.08	2.64	8.13
	4.03	2.80	11.28
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.23	0.20	0.85
	4.23	0.08	0.34
2	3.08	0.20	0.62
	3.28	0.08	0.26

Pintura Techo = 2.71 x 3.87 = 10.49

TOTAL 65.02

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.73	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.25	3.23	13.73

TOTAL 13.73 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ


DOMICILIO : C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

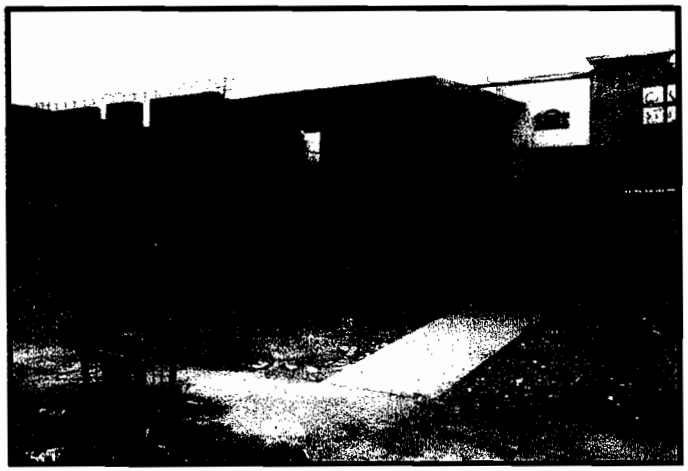

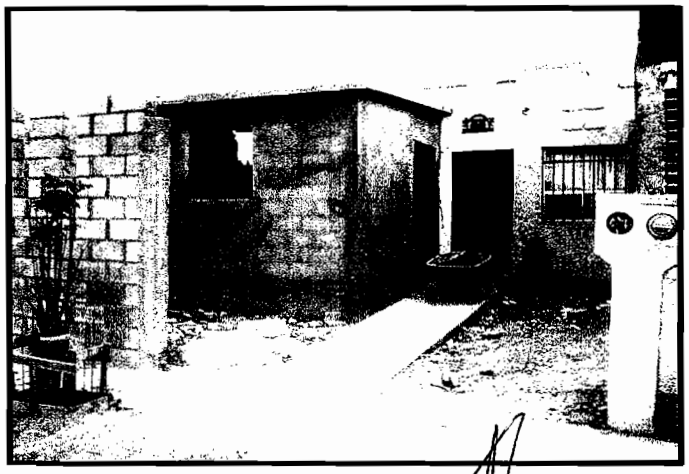

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	42.01	M2

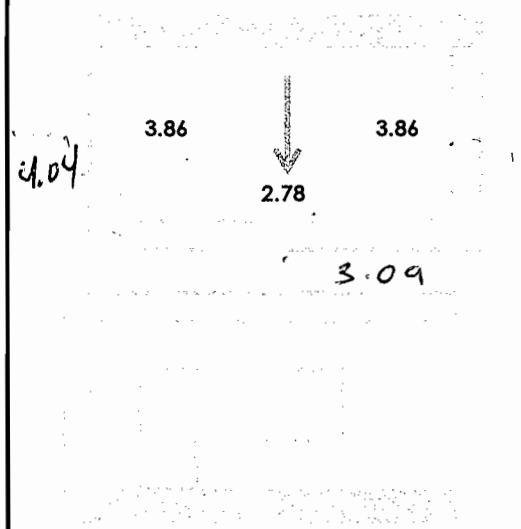

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.86	2.56	9.88
	3.86	2.56	9.88
	2.78	2.45	6.81
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.09	2.87	8.87
	4.04	2.79	11.27
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 42.01

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE
DOMICILIO : C.RIO NEUQUEL # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.88	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.86	2.78	10.73
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.88 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.81	M2

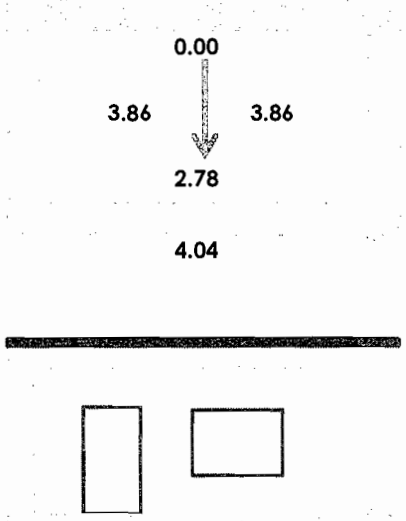

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	3.86	2.56	9.88
0	3.86	2.56	9.88
	2.78	2.45	6.81
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.09	2.87	8.87
	4.04	2.79	11.27
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.29	0.20	0.66
	3.29	0.08	0.26
2	4.04	0.20	0.81
	4.24	0.08	0.34

Pintura Techo 2.78 x 3.86 = 10.73

TOTAL 54.81

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.79	M2

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
4.23	4.23	3.26	13.79
3.26			

TOTAL 13.79 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE
DOMICILIO : **C.RIO NEUQUEL # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	39.54	M2

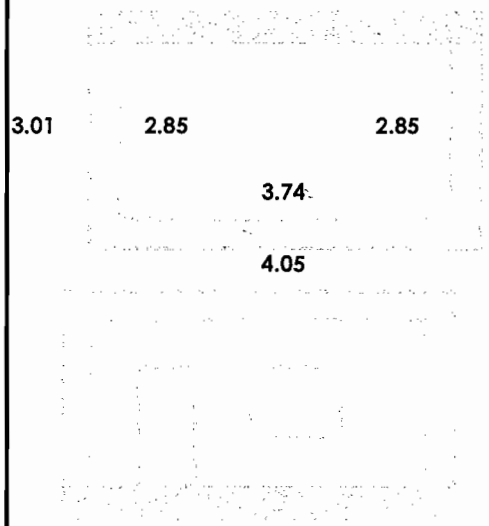

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	2.85	2.55	7.27
	2.85	2.55	7.27
	3.74	2.46	9.20
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.01	2.80	8.43
	4.05	2.98	12.07
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 39.54

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : **C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO**

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.81	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.85	3.74	10.66
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.81 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	52.25	M2

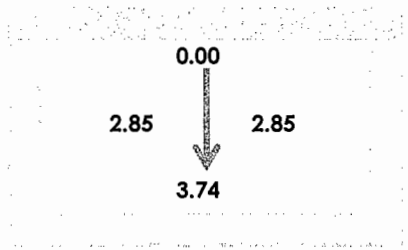


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.57	0.00
	2.85	2.55	7.27
0	2.85	2.55	7.27
	3.74	2.46	9.20
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.01	2.80	8.43
	4.05	2.98	12.07
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.21	0.20	0.64
	3.21	0.08	0.26
2	4.05	0.20	0.81
	4.25	0.08	0.34

Pintura Techo = 3.74 x 2.85 = 10.66

TOTAL 52.25

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.64	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.21		4.21	3.24	13.64
3.24				

TOTAL **13.64 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICÓ, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ


DOMICILIO : C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

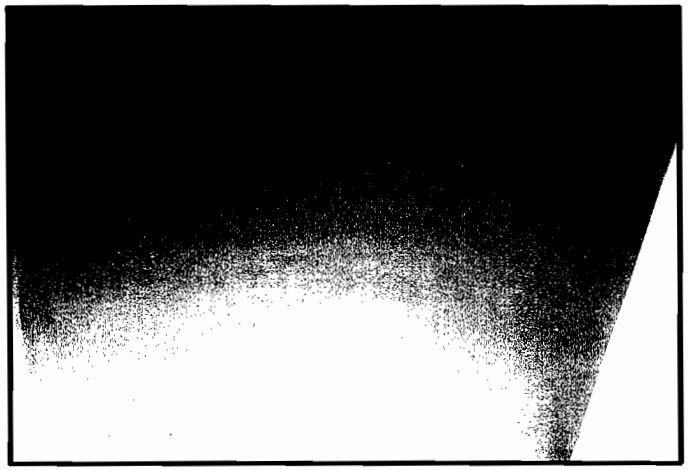

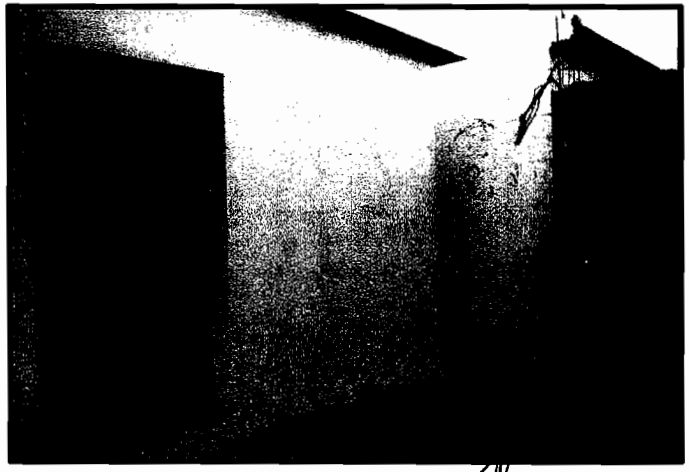

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	48.52	M2

INTERIORES

				M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.8			3.80	2.51	9.54
3.00	2.85	2.85		2.85	2.45	6.98
				2.85	2.45	6.98
	3.8	1.07		3.80	2.40	9.12
			PTA	2.10	0.97	-2.04
	4.03		VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.54	7.62
	4.03	2.55	10.28
	1.07	2.52	2.70
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 48.52

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

8ENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA
DOMICILIO : C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.98	M2

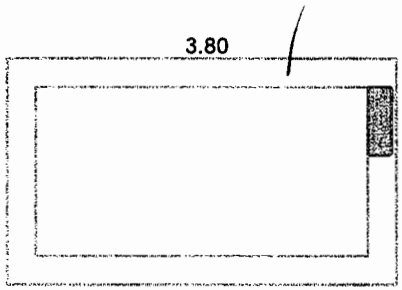

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.85	3.80	10.83
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.98 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	SALIDA

TOTAL 10 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	61.75	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.80	2.51	9.54
	2.85	2.45	6.98
	2.85	2.45	6.98
	3.80	2.40	9.12
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.54	7.62
	4.03	2.55	10.28
	1.07	2.52	2.70
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.20	0.20	0.64
	3.20	0.08	0.26
2	4.03	0.20	0.81
	4.23	0.08	0.34
3	1.27	0.20	0.25
	1.27	0.08	0.10

Pintura Techo = 3.80 x 2.85 = 10.83

TOTAL 61.75

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.30	M2

		M	M	M2
		Largo	Ancho	Área
4.10		4.10	3.00	12.30
		0.00	0.00	0.00
	3.00			

TOTAL 12.30 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA
DOMICILIO : C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

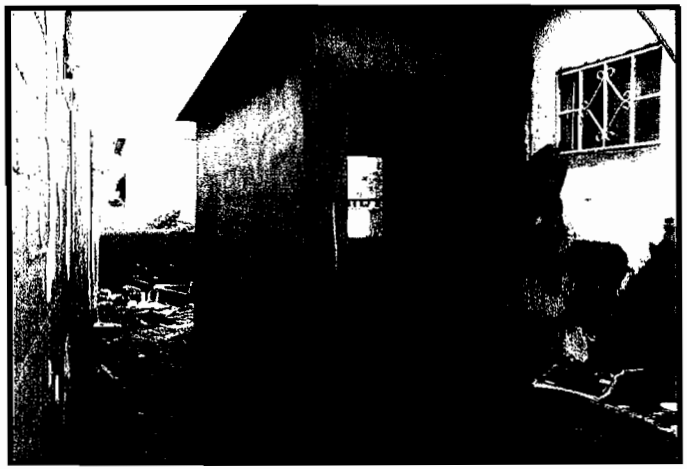

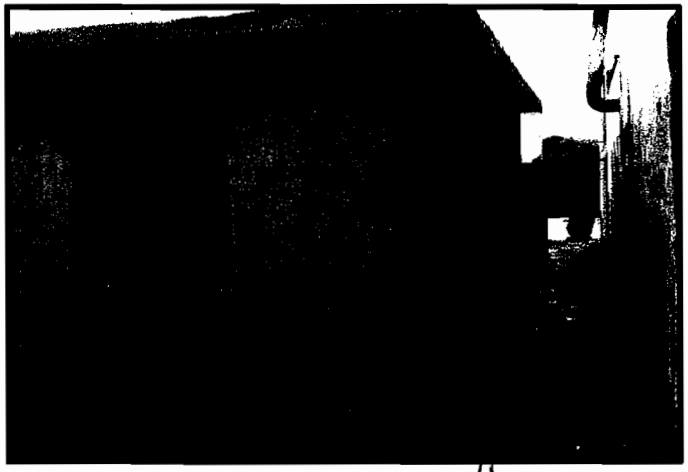

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELIUD MORAIMA ESTRADA GARCIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	35.14	M2

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
3.4	3.40	2.52	8.57
2.92 2.92	2.92	2.50	7.30
	2.92	2.50	7.30
3.4	3.40	2.45	8.33
PTA	2.10	0.97	-2.04
3.51 VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT ext.	1.0	1.0	-1.0

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.70	0.00
	3.51	2.66	9.34
	0.00	2.52	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 35.14

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ELIUD MORAIMA ESTRADA GARCIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.08	M2

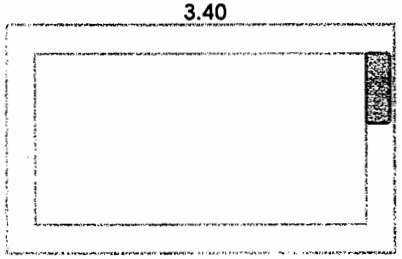

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.92	3.40	9.93
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.08 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELIUD MORAIMA ESTRADA GARCIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	SALIDA

TOTAL 10 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: ELIUD MORAIMA ESTRADA GARCIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	46.02	M2

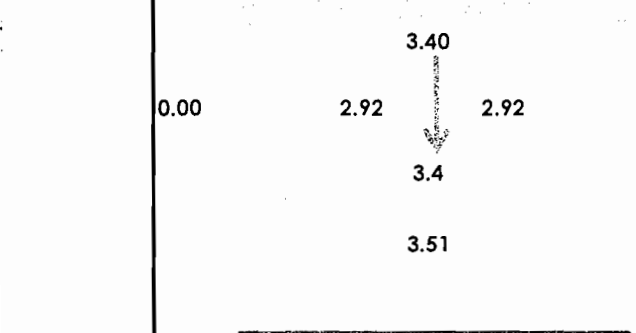

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.40	2.52	8.57
	2.92	2.50	7.30
0	2.92	2.50	7.30
	3.40	2.45	8.33
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	1.0	1.0	-1.0
VENT EXTRA			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.70	0.00
	3.51	2.66	9.34
	0.00	2.52	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	0.00	0.20	0.00
	0.00	0.08	0.00
2	3.40	0.20	0.68
	3.40	0.08	0.27
3	0.00	0.20	0.00
	0.00	0.08	0.00

Pintura Techo = 3.40 x 2.92 = 9.93

TOTAL 46.02

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELIUD MORAIMA ESTRADA GARCIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	11.87	M2

		M	M	M2
3.44		Largo	Ancho	Área
		3.44	3.45	11.87
		0.00	0.00	0.00
	3.45			

TOTAL **11.87 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELIUD ESTRADA GARCIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT .01	Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho imcluye marco metalico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidadad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

BENEFICIARIO: ELIUD ESTRADA GARCIA
DOMICILIO : C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT02	Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho con vidrio claro de 3mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00 pza

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: ELIUD MORAIMA ESTRADA GARCIA
DOMICILIO : **C.DESIERTO DE LIBIA # 1902 COL. SAHUAROS**

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado

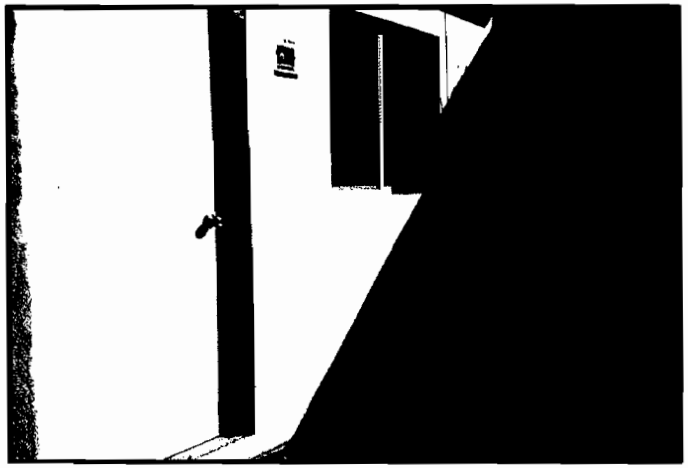

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	37.33	M2

INTERIORES

			M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
			0.00	2.52	0.00
4.03	3.92	3.92	3.92	2.32	9.09
			3.92	2.32	9.09
	2.7		2.70	2.31	6.24
		PTA	2.10	0.97	-2.04
	2.85	VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.60	10.48
	2.85	2.50	7.13
	0.00	2.52	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 37.33

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO
DOMICILIO : C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.73	M2

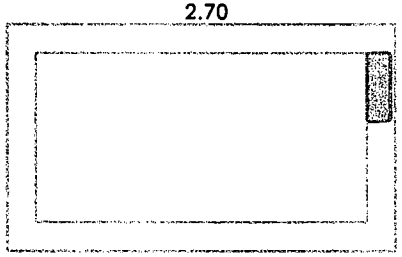

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.92	2.70	10.58
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.73 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.0	SALIDA

TOTAL 1.0 **SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016


BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	55.42	M2

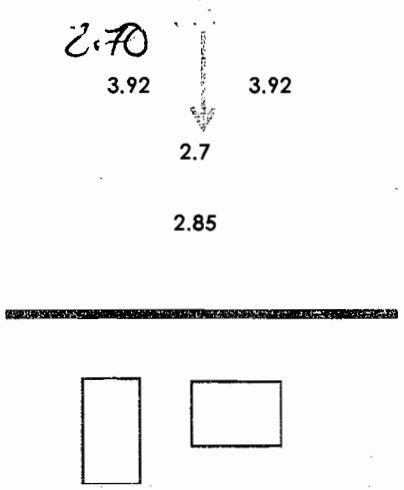

INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
		2.70	2.36	6.37
		3.92	2.32	9.09
0		3.92	2.32	9.09
		2.70	2.31	6.24
	PTA	2.10	0.97	-2.04
	VENT.	1.00	1.00	-1.00
	PTA EXTRA			
	VENT EXTRA	1.00	0.86	-0.86

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.60	10.48
	2.85	2.50	7.13
	0.00	2.52	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.23	0.20	0.85
	4.23	0.08	0.34
2	2.85	0.20	0.57
	3.05	0.08	0.24
3	0.00	0.20	0.00
	0.00	0.08	0.00

Pintura Techo 2.70 x 3.92 = 10.58

TOTAL 55.42

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.54	M2

4.23

3.20

	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.23	3.20	13.54
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.54 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DIAZ MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT02	Suministro y colocacion de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 m de ancho con vidrio claro de 3mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00 pza

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

BENEFICIARIO: MARIA DIAZ MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

No. ESTIMACION: 3

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT .01	Suministro y colocacion de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 m de ancho imcluye marco metalico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidadad de obra terminada.	1.00	pza

[redacted]

TOTAL 1.00

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: MARIA DOMITILA DIAZ MORENO

DOMICILIO : C.DESIERTO DE COLORADO # 17715 COL. SAHUAROS

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 24/11/2016 AL 30/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 3

Testigo fotografico cuarto adosado



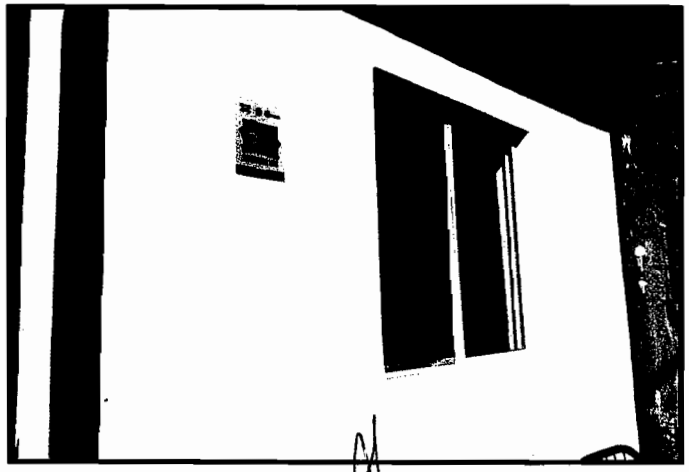

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. DE C.V.

GEOTECNIA ,MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

INFORME DE ENSAYE DE AGREGADOS PARA CONCRETO Y/O MORTERO

OBRA: CUARTOS ADOSADOS ZONA 1

LOCALIZACION: MATERIALES GALLEGOS AVE. INDUSTRIAS Y CALLE MINA LLUVIA DE ORO COL. EL PORVENIR

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

ENSAYE No. 1
FECHA DE RECIBO: 26-oct-16
FECHA DE INFORME: 29-oct-16
USO DEL MATERIAL:

GRAVA ARENA DE RIO.


PARA USARSE CON TAMAÑO MAXIMO DE: 3/4" y Malla numero

AGREGADOS	ARENA	GRAVA
ENSAYE NUMERO		
PESO VOL.SUELTO (kg/m3)	1320	1471
PESO VOL. COMPACTO (kg/m3)	1430	1572
DENSIDAD APARENTE	2.21	2.29
ABSORCION(%)	6.5	3.4
MATERIA ORGANICA (SIN LAVADO)	PASA	
MATERIA ORGANICA (CON LAVADO)	PASA	
% DE GRAVA EN LA ARENA		
% DE ARENA EN LA GRAVA		0
% DE CONTRACCION LINEAL		
% DE EQUIVALENTE DE ARENA		

COMPOSICION GRANULOMETRICA

MALLAS	RETENIDO ACUMULADO	MALLAS	RETENIDO ACUMULADO
		3/8"	0
		No.4	5
1 1/2	0	No. 8	18
1"	3	No. 16	45
3/4"	17	No. 30	71
3/8	70	No. 50	86
4	87	No. 100	94
8	100	No. 200	96
		M. F.	2.9
T. MAX.		T. MAX.	

GRAFICAS DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

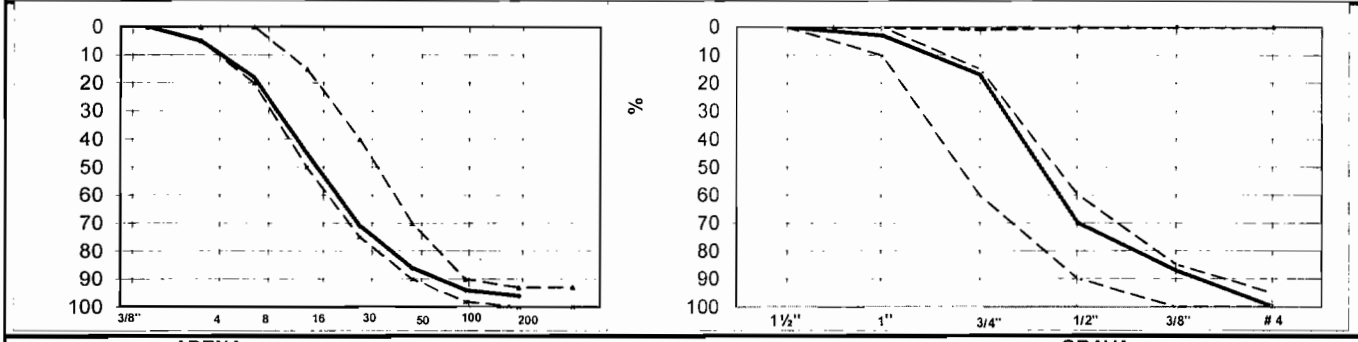

ARENA MALLAS GRAVA

OBSERVACIONES

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANALISIS DE LOS AGREGADOS NOS INDICAN QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CONCRETO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE DOSIFICACION.

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

ING. ALONSO VALENZUELA ESTRADA

ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. DE C.V

GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

ENSAYE Y REPORTE DIMENSIONAL , A COMPRESION Y ABSORCION EN BLOCK

REPORTE No. 1
ARCHIVO INGSI-001
COMPAI CONSTRUCTORA PROURVIKA, S A DE C V — FECHA MUESTREO 26/10/2016
OBRA: CUARTOS ADOSADOS ZONA 1 — FECHA INFORME 29/10/2016
PROVEE/UBICACION: BOQUERA JAQUEZ S A DE C V CALLE TABALOAPA 9906 COL PALESTINA
DESCRIP: BLOCK ARENA CEMENTO NUMERO 6

RESULTADOS OBTENIDOS

RESISITENCIA A LA COMPRESION

BLOCK	DIMENSIONES EN cm.			CARGA		AREA	ESFUERZO	
No.	Largo	Ancho	Alto	N	Kgf	en cm2	N/cm2	Kgf/cm2
1	39.5	14 3	19 8		38,940	565		69
2	39.5	14 4	19.9		38,920	569		68
3	39.6	14.4	19 9		37,250	570		65
4	39.5	14.3	19.8		39,500	565		70
5	39.6	14.4	19.9		42,160	570		74
							PROMEDIO	69.3

ABSORCION MAXIMA EN 24 hrs

BLOCK	PESO SECO	PESO SAT	DIF	ABSORCION
No	en kg	24 HRS en kg	en kg	en %.
6	13.050	13.702	0.652	5.0
7	12,940	13.781	0.841	6.5
8	13,120	13.841	0.721	5 5
9	12.870	13.793	0.923	7 2
10	12.920	13.695	0.775	6 0
			PROMEDIO	6 0

NMX -C-036	NMX -C-037	NMX -C-038	NMX-C-404
ESPECIFICACIONES PARA BLOCK DE USO NO ESTRUCTURAL DIMENSIONES ALTURA+ - 3 0mm LARGO Y ANCHO+ - 2 0mm ABSORCION MAXIMA PROMEDIO 25 % ABSORCION MAXIMA INDIVIDUAL 27% ESF MIN A COMPRESION PROMEDIO 35 kgf/cm2 ESF MIN A COMPRESION INDIVIDUAL 30 kgf/cm2	ESPECIFICACIONES PARA BLOCK DE USO ESTRUCTURAL DIMENSIONES ALTURA+ 3 0mm LARGO Y ANCHO+ 2 0mm ABSORCION 12% MAXIMO RESISTENCIA MINIMA INDIV. A. 60 kg/cm2 Mínimo RESISTENCIA MEDIA 90 kg/cm2 Mínimo ABSORCION INICIAL MAXIMA 5 gr/m.n		CORREESPONDENCIA ENTRE UNIDADES 1N ES IGUAL A 0 1019 kgf 1N CM IGUAL A 10 kPA

OBSERVACIONES

LAS PIEZAS ENSAYADAS CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES

Alonso Valenzuela Estrada

ING. ALONSO VALENZUELA ESTRADA
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

FOR 256 REVISION 02

LOS RESULTADOS SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMS ESTADOS
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. DE C.V.

ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.

GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 9

Archivo INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-12-04

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de: ■ 15x30 cm ☐ 10x20 cm

DATOS GENERALES

CUARTOS ADOSADOS ZONA 1

Obra

Cliente CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

atencion: ING IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE
NMX-C-161-ONNCCE
NMX-C-156-ONNCCE
NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-160-ONNCCE
NMX-C-083-ONNCCE
NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en GCC Resistencia de Proyecto, (kgf/cm^2) 200

Revenimiento de Proyecto, (cm) 14 0 Agregado T Max (cm) 2 0 Aditivo SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Dias)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Área (cm^2)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm^2	
25	2016-11-28	6	2016-12-04	16	176.71	310,220	31,633	1,790	179	90%
Ubicación de colado	LOSAS COL. EL PORVENIR CALLE MINA SAN CARLOS 17540 ISABEL SALGADO CHAVIRA CALLE MINA VICTORIA 3707 DAISSY RAMOS RAMOS CALLE DESIERTO MOJAVE 3526 ALICIA CELIS JUAREZ							RESULTADO A 28 DIAS		NA

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0,10197 kgf
1 N/cm^2 es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA

Signatario Autorizado
Ing Alonso valenzuela estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DIAS DEBERAN TOMARSE SOLO COMO UNA POSIBLE TENDENCIA A OBTENER A LOS 28 DIAS LA RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA

LOS RESULTADOS SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMS ENSAYADOS. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE, S A DE C. V.

ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.

GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 10

Archivo INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-12-08

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de: ■ 15x30 cm ☐ 10x20 cm

DATOS GENERALES

CUARTOS ADOSADOS ZONA 1

Obra

Cliente CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A DE C V.

atencion: ING. IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE
NMX-C-161-ONNCCE
NMX-C-156-ONNCCE
NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-160-ONNCCE
NMX-C-083-ONNCCE
NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas.

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en GCC Resistencia de Proyecto, (kgf/cm^2). 200

Revenimiento de Proyecto, (cm). 14.0 Agregado T. Max (cm) 2.0 Aditivo SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Dias)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Área (cm^2)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm^2	
28	2016-12-02	6	2016-12-08	15	176.71	280,520	28,605	1,619	162	81%
Ubicación de colado	LOSAS CALLE RIO RINH 2427 ESTER PEÑA SOTO CALLE RIO ODRA 1625 CLAUDIA RODRIGUEZ ACEVES CALLE RIO EBRO 2202 ALICIA CELIS JUAREZ							RESULTADO A 28 DIAS		NA

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0,10197 kgf
1 N/cm^2 es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA

Alonso Valenzuela Estrada

Signatario Autorizado
Ing. Alonso valenzuela estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DIAS DEBERAN TOMARSE SOLO COMO UNA POSIBLE TENDENCIA A OBTENER A LOS 28 DIAS LA RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA

LOS RESULTADOS SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMS ENSAYADOS. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S A DE C v

ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.

GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 8

Archivo INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-11-28

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de: ■ 15x30 cm ☐ 10x20 cm

DATOS GENERALES

Obra	CUARTOS ADOSADOS ZONA 1
Cliente	CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
atencion:	ING IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE
NMX-C-161-ONNCCE
NMX-C-156-ONNCCE
NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-160-ONNCCE
NMX-C-083-ONNCCE
NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en GCC — Resistencia de Proyecto, (kgf/cm²). 200

Revenimiento de Proyecto, (cm) 14.0 — Agregado T Max (cm) 2 0 — Aditivo SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Dias)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Área (cm²)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm²	
22	2016-11-21	7	2016-11-28	14	174.73	296,640	30,248	1,731	173	87%
Ubicación de colado	ZAPATAS CALLE RIO RINH 2427 CALLE RIO ODRA 1625 CALLE RIO EBRO 2202							RESULTADO A 28 DIAS		NA

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0,10197 kgf
1 N/cm² es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA

Signatario Autorizado
Ing. Alonso valenzuela estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DIAS DEBERAN TOMARSE SOLO COMO UNA POSIBLE TENDENCIA A OBTENER A LOS 28 DIAS LA RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA

LOS RESULTADOS SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMS ENSAYADOS. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE, S A DE C. V.

ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.

GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 7

Archivo INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-11-27

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de: ■ 15x30 cm ☐ 10x20 cm

DATOS GENERALES

CUARTOS ADOSADOS ZONA 1

Obra

Cliente CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

atencion: ING. IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE
NMX-C-161-ONNCCE
NMX-C-156-ONNCCE
NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-160-ONNCCE
NMX-C-083-ONNCCE
NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en GCC Resistencia de Proyecto, (kgf/cm²). 150

Revenimiento de Proyecto, (cm). 10.0 Agregado T. Max (cm) 2.0 Aditivo SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Dias)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Area (cm²)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm²	
19	2016-11-20	7	2016-11-27	12	176.71	198,850	20,277	1,147	115	76%
Ubicación de colado	FIRMES CALLE RIO NEUQUEL 1802 SILVINA PALAFOX AGUIRRE CALLE RIO NEUQUEL 1811 ESPERANZA RIOS CRUZ CALLE RIO VAL 1626 KARLA VENEGAS GONZALEZ CALLE RIO CAUCA 1806 MARIA REY CHAVEZ CALLE RIO CAUCA 1625 ALMA BOJORQUEZ DURAN CALLE RIO ROJO 1406 LUCIA GONZALEZ VILLA							RESULTADO A 28 DIAS		NA

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0.10197 kgf
1 N/cm² es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES
LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA AL EVALUARLA CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA NORMA NMX-C-155-ONNCCE.

Alonso Valenzuela Estrada

Signatario Autorizado
Ing. Alonso valenzuela estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DIAS DEBERAN TOMARSE SOLO COMO UNA POSIBLE TENDENCIA A OBTENER A LOS 28 DIAS LA RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA

LOS RESULTADOS SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMS ENSAYADOS. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE, S. A. DE C. V.
