Constructora Prourvika S.A. de C. V.

R.F.C. CPR1108125Z8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA
C 340

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	03	Pago en una sola Exhibición	2016-12-16T11:58:52	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P.31370

Folio Fiscal
654A4C2E-C1CC-419F-AF97-AB3C32B0CF05

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT
00001000000404341938
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000400248443
Fecha y hora de certificación
2016-12-16T11:58:52

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 1, DEL CONTRATO No. 200/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN.	$ 675,234.28	$ 675,234.28
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.---------- RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO:---------- 0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA ----------$ 3,376.17 0.2% DIF----------$ 1,350.47 0.2% CMIC----------$ 1,350.47 0.2% I.C.I.C----------$ 1,350.47 SUMA----------$ 7,427.58 NETO A RECIBIR---------- $ 481,100.70	$ -254,089.21	$ -254,089.21

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DIA ULTIMO DE CADA MES.
*EFECTOS FISCALES AL PAGO.
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUBTOTAL	$ 421,145.07
DESCUENTO	$
IVA 16.00 %	$ 67,383.21
TOTAL	$ 488,528.28

Sello digital del CFDI

WDTHhedlzAtvlil0hdutLSEhuQOaGgURBzsvKMfbbF34Ewsl882QGGF1bmAScNCNfnP/puw7wMOTR8YK/S9YldKdr1lB9gRVjJlzFWkISi+U+rxCGnbOUHblfWClhpd4NXUC/RbkMqsjxsqMZ/3CDxap6TsTGOAcnr14dH5hAopgjnSJsmVHtGGuGX64ED2CkFcTzMxTJ5vqPwT43aNXnI5P+TxtSEo8K1xOGhcfVIEwx8G5hUf7qWpsDb+xgb689llrgSv0xPBQcvpVE2YuD1ZvaN5vyyiQ6eENsfHSbSoAFG3UfJ8H6uySaKF2oC7D46jqNQhleqbp5DCpXmW0EA==

Sello del SAT

Oa/fACokIcCFA01qWiNj+DjEh1/jdcSWrW83tGdlDXTMUaMEyRgD2Wj8ENC1vkDLUiAcg7DlbfMQo8w3hqi0fRKy8xfmaiCOTEBLGCMmVnw8dC4hThjlloytgvm6eEuPeEcY6QDpu4XYAXCzzSQl/+el34iU0HSJzNNiZ4FC2gLkih1wrv1E4y9huhn+VotYgElm936eUS/mOT1bw3kjlkeibUmJmScRQ/0pzI9vjui+sEVT8Gi6HLDginlWwGbFC7NHBLm+b98QFpSs32jD4u96IzobT1QEeK8d4+AlSSBC4FUNtPbcz6d4sz46vET8rKGqTiLjFgHz50UbtAKqMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|654A4C2E-C1CC-419F-AF97-AB3C32B0CF05|2016-12-16T11:58:52|WDTHhedlzAtvlil0hdutLSEhuQOaGgURBzsvKMfbbF34Ewsl882QGGF1bmAScNCNfnP/puw7wMOTR8YK/S9YldKdr1lB9gRVjJlzFWkISi+U+rxCGnbOUHblfWClhpd4NXUC/RbkMqsjxsqMZ/3CDxap6TsTGOAcnr14dH5hAopgjnSJsmVHtGGuGX64ED2CkFcTzMxTJ5vqPwT43aNXnI5P+TxtSEo8K1xOGhcfVIEwx8G5hUf7qWpsDb+xgb689llrgSv0xPBQcvpVE2YuD1ZvaN5vyyiQ6eENsfHSbSoAFG3UfJ8H6uySaKF2oC7D46jqNQhleqbp5DCpXmW0EA==|00001000000404341938||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT

PROVEEDOR AUTORIZADO DE FACTURA ELECTRONICA
B1SOFT
FOLIO DE AUTORIZACION DEL SAT 68236

SHCP SAT Servicio de Administración Tributaria gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPR1108125Z8	Constructora Prourvika S.A. de C. V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	**Fecha de Expedición**	**Fecha Certificación SAT**	**PAC que Certificó**
654A4C2E-C1CC-419F-AF97-AB3C32B0CF05	2016-12-16T11:58:52	2016-12-16T11:58:52	STB080508339
Total del CFDI	**Efecto del Comprobante**	**Estado CFDI**	
$488,528.28	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 200/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1	ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)	$ 3,010,159.61 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	$ 783,271.76 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	$ 1,745,583.43 CON IVA
RFC	CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	$ 2,528,855.19 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	OBRA NORMAL	**$ 593,697.88**	
	OBRA EXCEDENTE	**$ 6,686.78**	
	OBRA EXTRAORDINARIA	**$ 74,849.62**	
	IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	**$ 675,234.28**	

DESCUENTOS		
0.5% INSP. Y VIGILANCIA		**3,376.17**
0.2% DIF		**1,350.47**
0.2% CMIC	$	**1,350.47**
0.2% I.C.I.C.	$	**1,350.47**
SUMA DESCUENTOS		**7,427.58**

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	$	**675,234.28**
AMORT ANTICIPO	$	**254,089.21**
SUB-TOTAL	$	**421,145.07**
I.V.A.	$	**67,383.21**
TOTAL	$	**488,528.28**

(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.)

DESCUENTOS	$	**7,427.58**
SALDO NETO A RECIBIR	$	**481,100.70**

Vo. Bo.

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ELABORO

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

REVISO

ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

AUTORIZO

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CHIHUAHUA, CHIH., 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: **$ 481,100.70**
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN PESOS 70/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. **5 (CINCO)** CONTRATO No. **200/2016** POR LA CANTIDAD DE : **$ 3,010,159.61** (INCLUYE CONVENIO)
TRES MILLONES DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

ALCANCE DE LA ESTIMACION	$	675,234.28
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	254,089.21
SUBTOTAL	$	421,145.07
IVA	$	67,383.21
TOTAL	$	488,528.28

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
INSP. Y VIGILANCIA 0.5%	3,376.17
DIF 0.2%	1,350.47
CMIC 0.2%	1,350.47
I.C.I.C. 0.2%	1,350.47
SUMA	**7,427.58**

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

		CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	$	2,810,953.08
PRIMERA ASIGNACION	$	2,710,389.53
SEGUNDA ASIGNACION	$	100,563.55
CONVENIO MODIFICATORIO	$	199,206.53
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	$	1,745,583.43
ESTA ESTIMACION	$	783,271.76
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	$	2,528,855.19
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	$	290,815.21
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	$	100,563.55
POR EJERCER CONVENIO MODIFICATORIO	$	89,925.66
POR EJERCER	$	481,304.42

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

		CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	$	843,285.92
PRIMERA ASIGNACION	$	813,116.86
SEGUNDA ASIGNACION	$	30,169.06
ACUMULADO ANTERIOR	$	490,890.78
ESTA ESTIMACION	$	294,743.48
ACUMULADO ACTUAL	$	785,634.26
POR AMORTIZAR PRIMERA ASIGNACION	$	27,482.60
POR AMORTIZAR SEGUNDA ASIGNACION	$	30,169.06
POR AMORTIZAR	$	57,651.66

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

		0.5% INSP. Y VIGILANCIA		DIF 0.2%		CMIC 0.2%		I.C.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	$	7,524.07	$	3,009.64	$	3,009.64	$	3,009.64
ESTA ESTIMACION	$	3,376.17	$	1,350.47	$	1,350.47	$	1,350.47
ACUMULADO ACTUAL	$	10,900.24	$	4,360.11	$	4,360.11	$	4,360.11

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR1108125Z8

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 200/2016

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	OBRA NORMAL	**$ 593,697.88**
	OBRA EXCEDENTE	**$ 6,686.78**
	OBRA EXTRAORDINARIA	**$ 74,849.62**

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SUBTOTAL	**675,234.28**
I.V.A.	**108,037.48**
TOTAL	**783,271.76**

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 200/2016

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERIODO: 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Clave	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL									**$ 593,697.88**
	1	PRELIMINARES							$ 2,966.02
1	1.1	Trazo y nivelación de terreno natural con manguera y estableciendo referencias. incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	816.00	816.00	656.87	159.13	$ 8.11	$ 1,290.55
3	1.3	Excavación con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.00 m de profundidad en una sección de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye: afine de talud y del fondo de excavación, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavación a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	74.80	66.61	53.65	12.96	$ 129.28	$ 1,675.47
	2	CIMENTACION							$ 34,848.19
4	2.1	Construcción de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centímetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diámetro con f´y= 4,200 kg/cm2, tres varillas de 3/8" en ambos sentidos distribuidas en el ancho de la zapata, T.M.A. de 3/4", comprende la colocación de plantilla de concreto simple de 5 centímetros de espesor con concreto f´c= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye: el habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	272.00	251.00	203.00	48.00	$ 375.77	$ 18,036.96
5	2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de excavación. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	135.32	45.36	36.51	8.85	$ 82.27	$ 728.09
6	2.3	Dala de desplante de 0.15 x 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de ¼" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de f´y= 6,000 kg/cm2 con concreto hidráulico hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 acabado común. Incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	870.40	651.66	524.42	127.24	$ 126.40	$ 16,083.14
	3	ALBAÑILERIA							$ 391,920.07
7	3.1	Muro de block macizo de la región con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un máximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena en proporción 1:4 colocado a plomo y regla con un máximo de desplome del 0.40%. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1531.36	1255.84	1012.68	243.16	$ 220.45	$ 53,604.62
8	3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado pulido fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm máximo de espesor. incluye: agua en pipa para humedecer superficie con una altura de hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3690.36	3017.80	1447.14	1570.66	$ 102.48	$ 160,961.24
9	3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidráulico hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 T.M.A. con estructura electro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 10.1 cm y una separación a cada 15.8 cm de fý = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	920.72	714.98	574.36	140.62	$ 115.08	$ 16,182.55
10	3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 x 0.20 m de concreto hidráulico hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 T.M.A, armado con estructura electro soldada de 15 x 20-4 grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de f´y = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: acarreos de materiales, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	870.40	679.50	544.76	134.74	$ 131.86	$ 17,766.82

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 200/2016

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERIODO: 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Clave	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
11	3.5	Losa de concreto hidráulico f´c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto. incluye: acarreo, habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	964.92	896.96	718.24	178.72	$ 531.92	$ 95,064.74
12	3.6	Construcción de piso firme de concreto hidráulico hecho en obra de resistencia f´c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabado pulido con llana metálica. Incluye: preparación de la superficie, arena limpia, grava de la región T.M.A 3/4", nivelación, relleno con material mejorado y/o producto de excavación, apisonado, cimbrado, descimbrado, colado, curado con agua, acarreo de los materiales hasta el lugar de la ejecución de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	679.32	679.32	373.37	305.95	$ 158.00	$ 48,340.10
	4	**INSTALACION ELECTRICA**							**$ 38,926.72**
13	4.1	Instalación eléctrica en cuarto comprende el suministro y colocación de lámpara incandescente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibre 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	68.00	67.00	35.00	32.00	$ 1,216.46	$ 38,926.72
	5	**ACABADOS**							**$ 125,036.88**
14	5.1	Pintura colores básicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparación de la superficie con sellador vinílica clásico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4370.36	4046.97	1995.60	2051.37	$ 41.63	$ 85,398.53
15	5.2	Impermeabilización en azotea con emulsión elastomérica base agua, anti reflejante color terracota con resinas acrílicas comprende la limpieza de la losa, sellado de fisuras, humedecido y colocación de impermeabilizante a 2 manos. Incluye: desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza.	m2	964.92	896.96	460.27	436.69	$ 90.77	$ 39,638.35
OBRA EXCEDENTE									**$ 6,686.78**
	1	**PRELIMINARES**							**$ 20.76**
1	1.1	Trazo y nivelación de terreno natural con manguera y estableciendo referencias. incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	816.00	818.56	816.00	2.56	$ 8.11	$ 20.76
	3	**ALBANILERIA**							**$ 6,666.02**
12	3.6	Construcción de piso firme de concreto hidráulico hecho en obra de resistencia f´c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabado pulido con llana metálica. Incluye: preparación de la superficie, arena limpia, grava de la región T.M.A 3/4", nivelación, relleno con material mejorado y/o producto de excavación, apisonado, cimbrado, descimbrado, colado, curado con agua, acarreo de los materiales hasta el lugar de la ejecución de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	679.32	721.51	679.32	42.19	$ 158.00	$ 6,666.02
OBRA EXTRAORDINARIA									**$ 74,849.62**
	EXT.03	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts. dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción... HASTA DOS METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE LA COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE SU PVSM	m3	0.00	102.62	57.88	44.74	$ 184.66	$ 8,261.69
	EXT.04	Relleno en zanjas. Compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	m3	0.00	53.19	29.91	23.28	$ 117.29	$ 2,730.51
	EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... Rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto F'c = 100 kg/cm2. incluye : materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, PROPORCION 1:5 ,elaboracion y colocacion de concreto para relleno, agua, y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T	m2	0.00	141.05	79.43	61.62	$ 399.64	$ 24,625.82

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 200/2016

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERIODO: 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Clave	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	EXT.06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra,mano de obra...y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, De F´c= 100 Kg/cm2	m3	0.00	7.07	4.00	3.07	$ 1,827.81	$ 5,611.38
	EXT.07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra,mano de obra...y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, De F´c= 200 Kg/cm2	m3	0.00	21.20	12.04	9.16	$ 2,277.72	$ 20,863.92
	EXT.08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye:habilitado,colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres,herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, En diametros mayores a 3/8"	kg	0.00	1041.16	535.96	505.20	$ 25.25	$ 12,756.30

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

15 de noviembre de 2016

ING. CARLOS ALONSO RUACHO VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 03 de noviembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1",** que al amparo del contrato **No. 200/2016,** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Suministro y colocación de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 mts de ancho incluye marco metálico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	$ 2,043.74
EXT.02	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 mts de ancho con vidrio claro de 3 mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	$ 1,166.33
EXT.03	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts, dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción... hasta dos metros de profundidad, incluye la compactación del fondo de la excavación al 90 % de su PVSM.	170	m3	$ 184.66
EXT.04	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	102	m3	$ 117.29
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto f'c = 100 kg/cm2.	272	m2	$ 399.64

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

	Incluye: materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, proporción 1:5, elaboración y colocación de concreto para relleno, agua, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra...y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f´c= 100 kg/cm2.	100	m3	$	1,827.81
EXT.07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f´c= 200 kg/cm2.	51	m3	$	2,277.72
EXT.08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye: habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8".	24,557.52	kg	$	25.25
EXT.09	Aplanado de yeso en losa y muros interiores acabado pulido de 2.5cm de espesor, a una altura de 0,00 m a 3,50 m incluye material, desperdicios de los materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2,700.00	m2	**NO PROCEDE**	
EXT.10	Construcción de chaflán de 10 cms de altura por 10 cms de ancho con mortero-cemento arena incluye: materiales, desperdicios de los materiales, andamios, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	748	ml	$	112.59
EXT.11	Pretil a base de muro de adobón de 7x14x28 cms acabado normal, incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	150	m2	$	385.70
EXT.12	Colocación de botaguas de lámina galvanizada cal 26 de 10 cms x 10 cms, incluye, material necesario para su fijación, cortes, desperdicios, fijación a chaflán/o pretil, mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	500	m	$	164.86
EXT.13	Demolición de concreto simple existente en el lugar, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, retiro del	25	m3	$	519.21

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.**municipiochihuahua**.gob.mx

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

	material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
EXT.14	Suministro y colocación de caliche cribado en cimentaciones compactado al 90 % de su P.V.S.M., incluye, herramienta, equipo, mano de obra, compactación, retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	48	m3	$	258.62

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO $1'539,261.05 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcn*

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.**municipiochihuahua**.gob.mx

	ESTIMACION 5 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1 PERIODO : DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			TRAZO	EXCAVACION	ZAPATA	RELLENO	DALA DESPLANTE	MURO	CASTILLO	CADENA CERRAMIENTO	LOSA
				1.1	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.3	3.4	3.5
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	M2	M3	PZA	M3	M	M2	M	M	M2
1	MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA	C. DESIERTO DE SONORA 3502	EL PORVENIR	12.39	1.08	4.00	0.74	10.98	20.37	10.70	10.98	12.94
2	RAMONA MARGARITA VALENZUELA	C. DESIERTO DE SONORA 3321	EL PORVENIR	11.59	0.81	3.00	0.55	6.77	12.66	8.08	10.72	12.80
3	CESAR LARA SILORO	C DEL YESO #3501	LADRILLEROS	12.40	1.08	4.00	0.74	10.81	21.35	11.34	10.81	13.57
4	MARISELA LOPEZ GUTIERREZ	C ADOBE # 3506	LADRILLEROS	13.29	1.08	4.00	0.74	10.32	20.39	11.34	10.32	14.80
5	HEREDIA TERRAZAS DOLORES	C. TUPAMAROS # 207	VICENTE GUERECA	12.16	1.08	4.00	0.74	10.74	22.34	11.34	10.74	14.14
6	LORIBELLA PAREDES RUIZ	C MINERAL DEL VALLECILLO # 155	REAL DE MINAS	12.54	0.54	2.00	0.36	6.67	11.38	10.50	6.67	14.17
7	REYES RIVAS RODRIGUEZ	C. MINA ARROYO HONDO #3743	EL PORVENIR	12.02	1.08	4.00	0.74	9.72	18.40	11.20	9.72	13.46
8	VENTURA CARO MONJE	C. FELIPE ANGELES RAMIREZ	NOMBRE DE DIOS	12.35	1.08	4.00	0.74	10.16	18.53	10.70	10.16	13.98
9	MARIA SOCORRO ORTIZ CERVANTES	C. LLANO DEL CARRIZAL #5812	MEZQUITES	12.26	1.08	4.00	0.74	13.56	28.29	11.34	13.56	13.72
10	LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA	C. MARTIRES DE CHICAGO # 611	TIERRA Y LIBERTAD	12.00	1.08	4.00	0.74	9.70	17.50	10.70	9.70	13.44
11	BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS	C. HACIENDA DE CANADA # 16900	AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	12.25	1.08	4.00	0.74	9.81	17.54	10.70	9.81	13.06
12	IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON	C. RIO ARNO #2024	RIVERAS DE SACRAMENTO	14.28	0.81	3.00	0.54	8.22	15.31	11.34	11.77	15.03
13	PAULA SIGALA	PVD DESIERTO DE SONORA #3311	COL EL PORVENIR	12.16	1.08	4.00	0.74	9.78	19.10	11.34	9.78	13.61
			SUBTOTAL 1	**161.69**	**12.96**	**48.00**	**8.85**	**127.24**	**243.16**	**140.62**	**134.74**	**178.72**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

PROCRYKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.39	M2



M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
3.55	3.49	12.39

TOTAL **12.39 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

DOMICILIO : C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR


FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016


PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

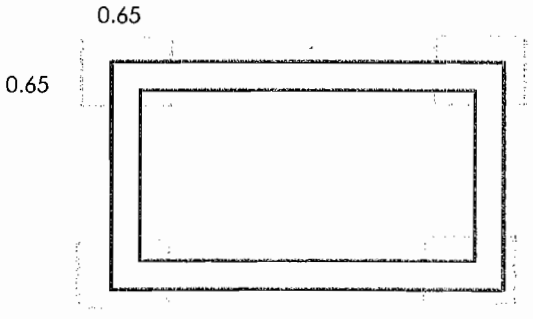

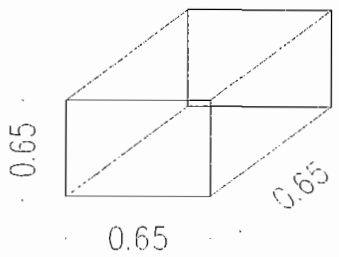

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

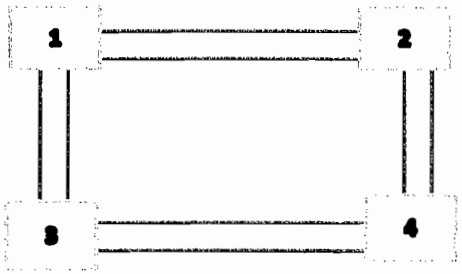

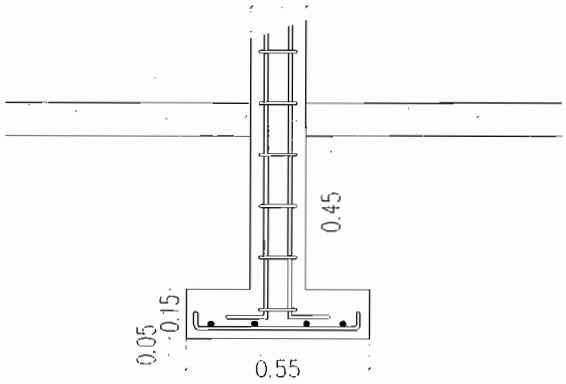

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

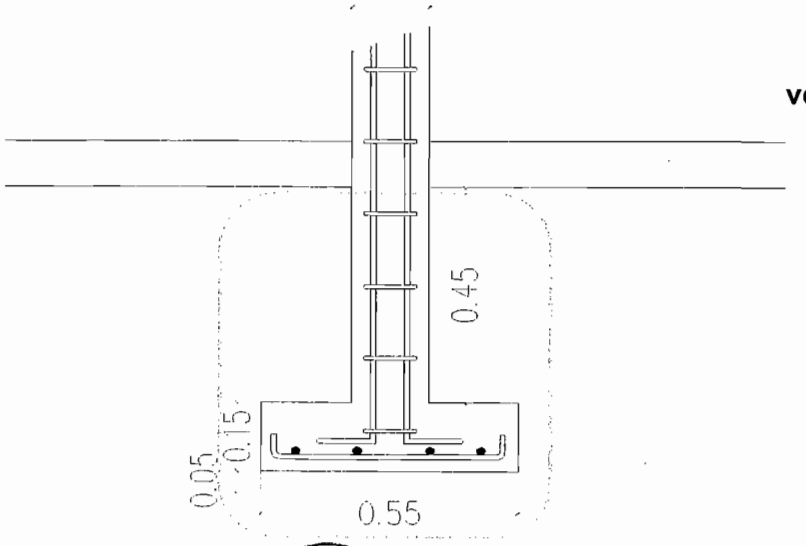

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10
TOTAL		**0.74 M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.98	m

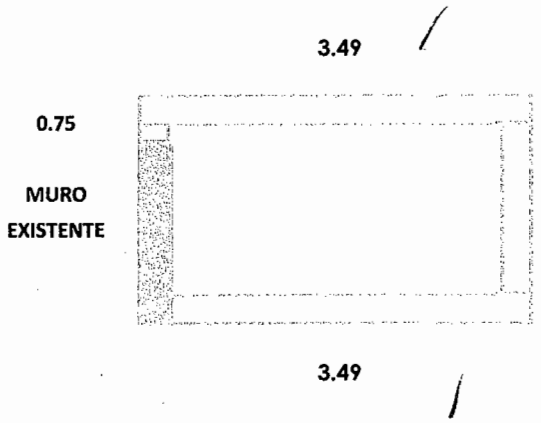

LONGITUD MUROS

1	3.49
2	3.25
3	3.49
4	0.75

TOTAL 10.98 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	20.37	M2

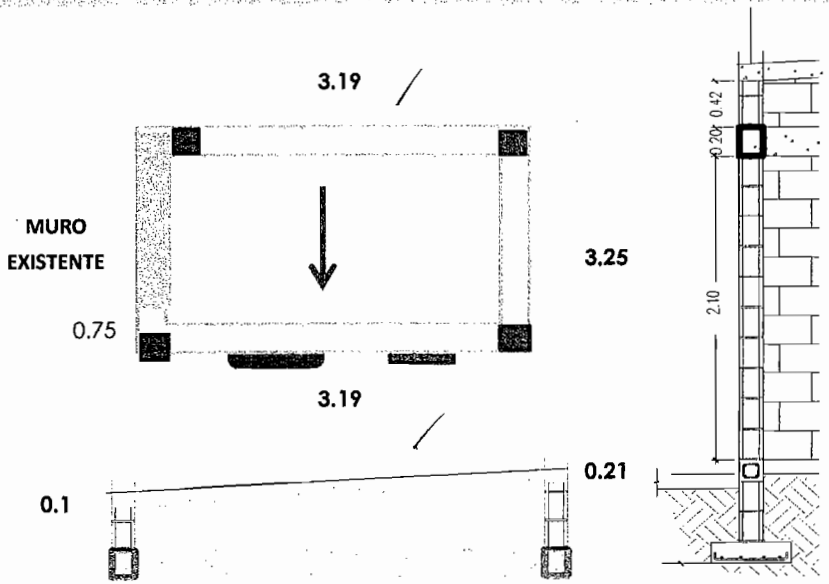

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.19	2.10	6.70
2	3.25	2.10	6.83
3	3.19	2.10	6.70
4	0.75	2.10	1.58
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.19	0.21	0.67
2	3.25	0.16	0.52
3	3.19	0.10	0.32
4	0.75	0.12	0.09
		TOTAL	**20.37** M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.70	M

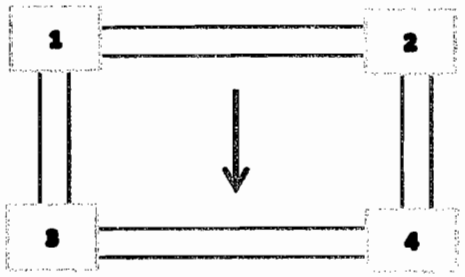

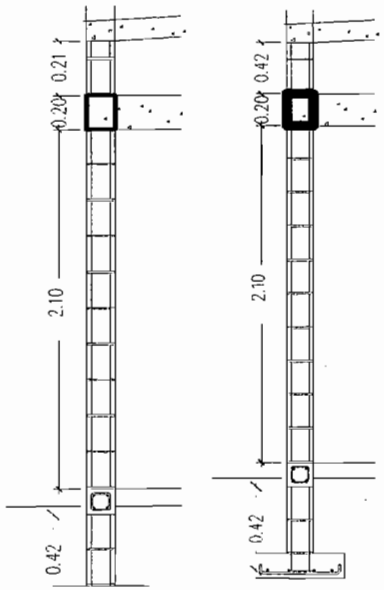

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.62
4	2.62
TOTAL	**10.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.98	M



	M
LONGITUD MUROS	
1	3.49
2	3.25
3	3.49
4	0.75
TOTAL	**10.98 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	12.94	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.75	3.45	12.94

TOTAL **12.94 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

DOMICILIO : C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

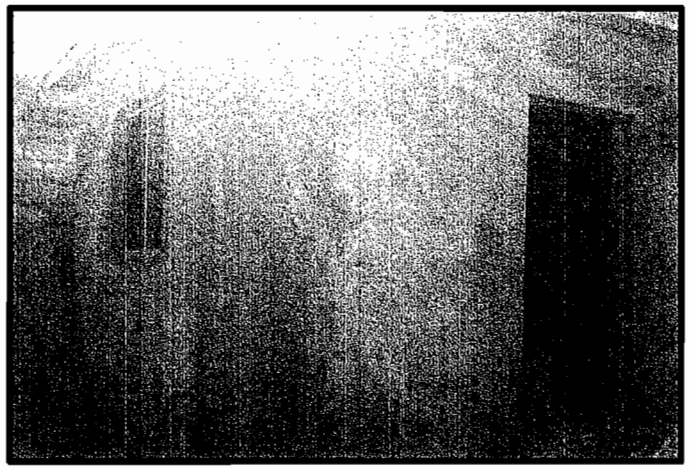

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.59	M2

	M	M	M2
	LARGO	ANCHO	ÁREA
	4.11	2.82	11.59



TOTAL 11.59 **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,


DOMICILIO : C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.81	M3

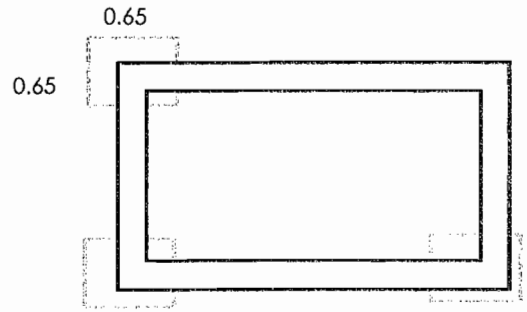

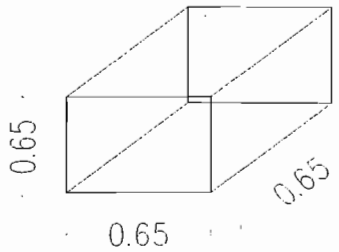

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **0.81 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	3.00	PZA

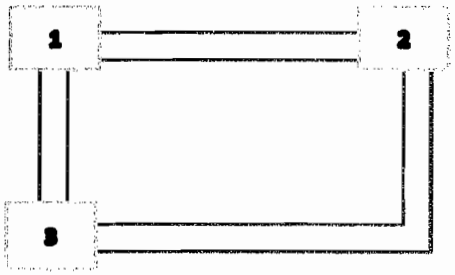

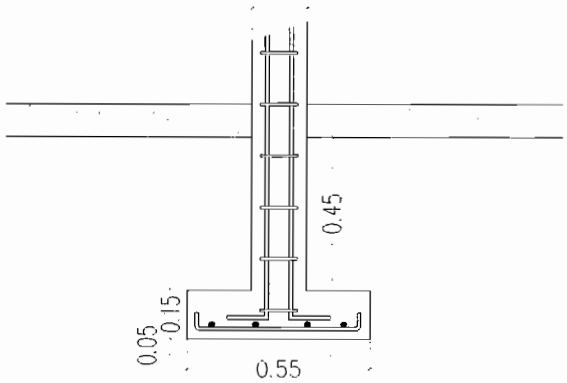

TOTAL **3.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.55	M3

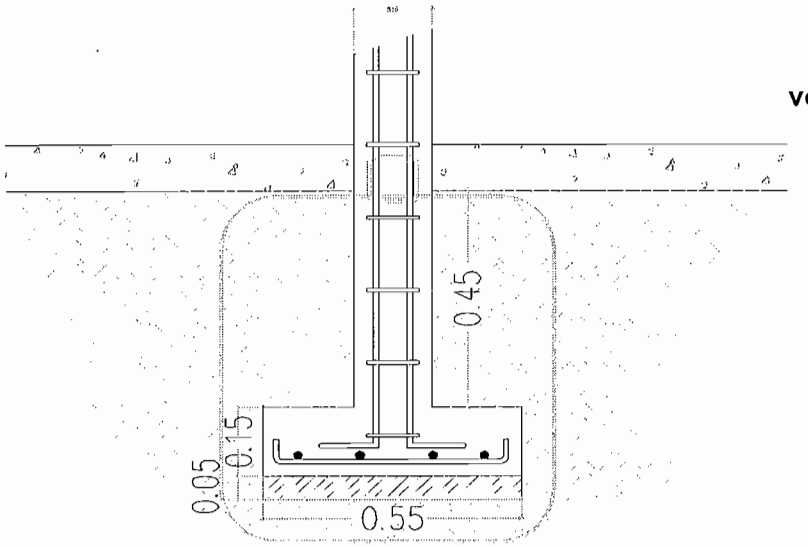

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 3 =	0.81
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 3 =	-0.18
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 3 =	-0.08
TOTAL		**0.55 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	6.77	m



LONGITUD MUROS	
1	4.10
2	2.67
3	0.00

TOTAL **6.77 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	12.66	M2

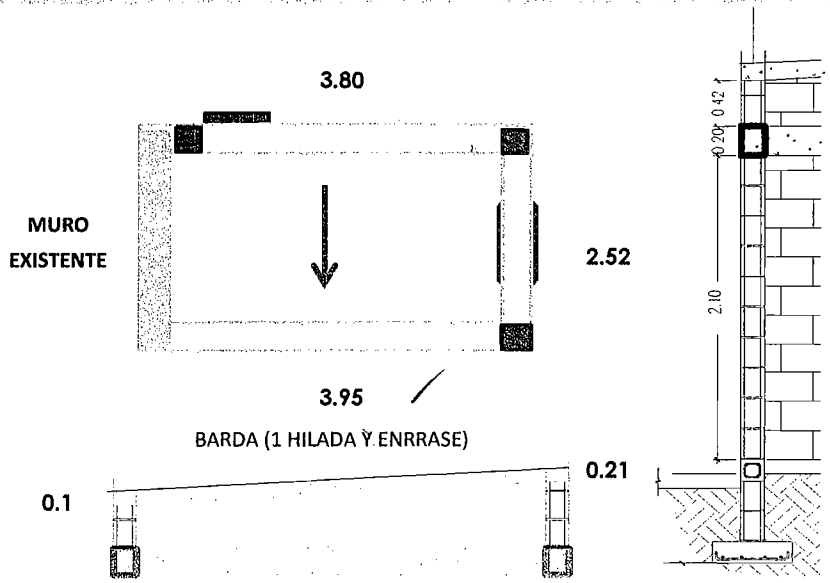

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.80	2.10	7.98
2	2.52	2.10	5.29
3	3.95	0.21	0.83
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.80	0.21	0.80
2	2.52	0.16	0.40
3	3.95	0.10	0.40

TOTAL **12.66** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,


DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estructura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	8.08	M

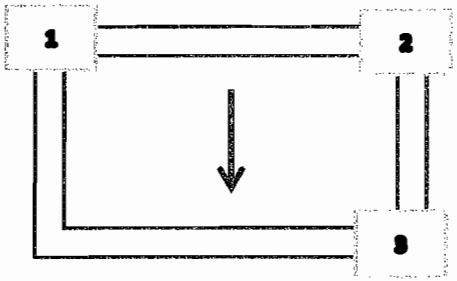

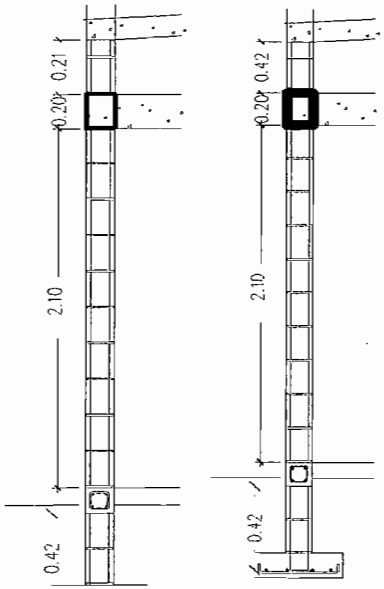

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.62
TOTAL	**8.08 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.72	M



M

LONGITUD MUROS

1	4.10
2	2.52
3	4.10

TOTAL 10.72 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	12.80	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.00	3.20	12.80

TOTAL **12.80 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

DOMICILIO : C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

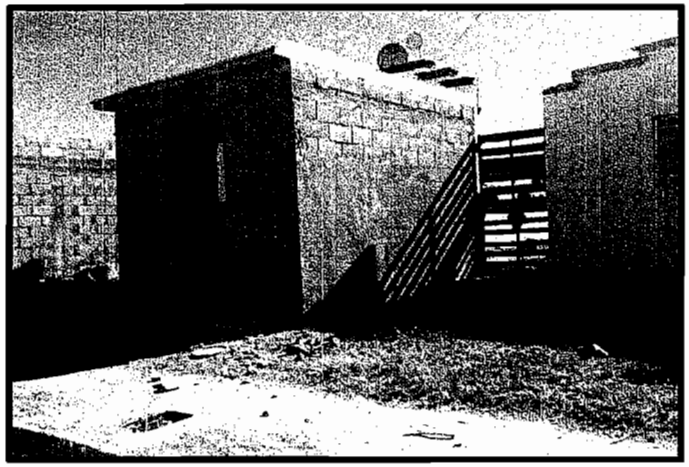

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.40	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.00	3.10	12.40



TOTAL **12.40 M2**

12.40

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO
DOMICILIO : C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

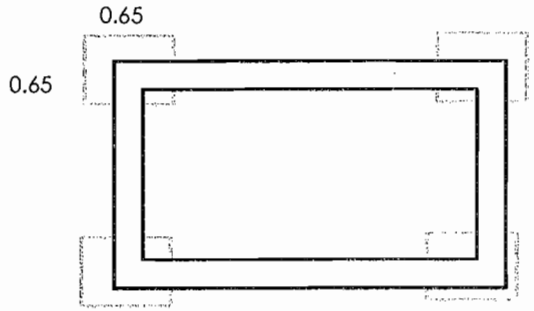

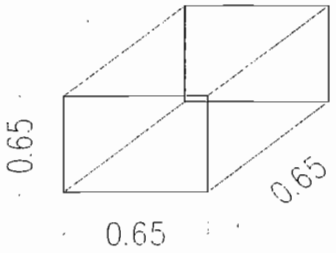

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye el habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

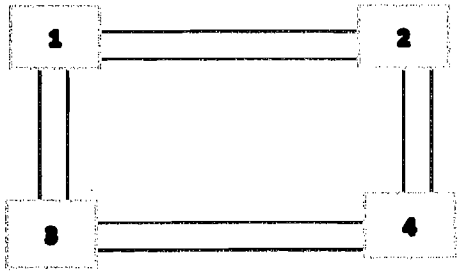

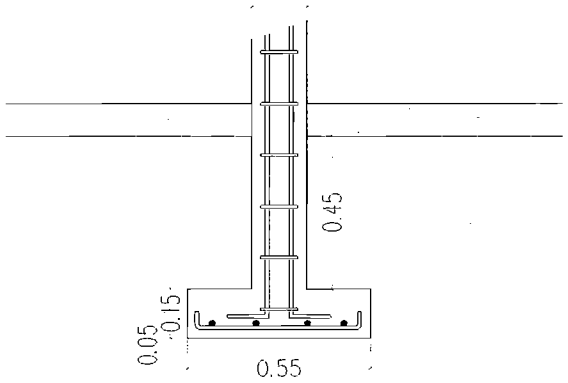

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

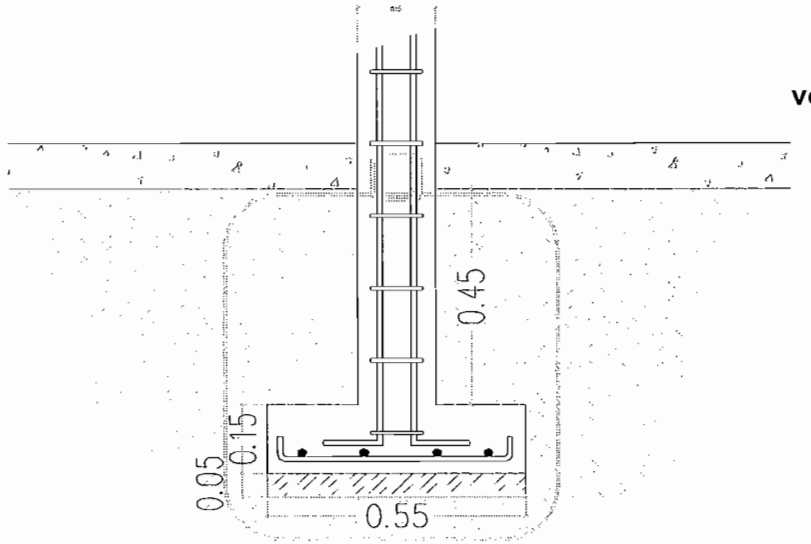

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10
TOTAL		**0.74 M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.81	m



LONGITUD MUROS

1	4.00
2	2.81
3	4.00

TOTAL 10.81 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	21.35	M2

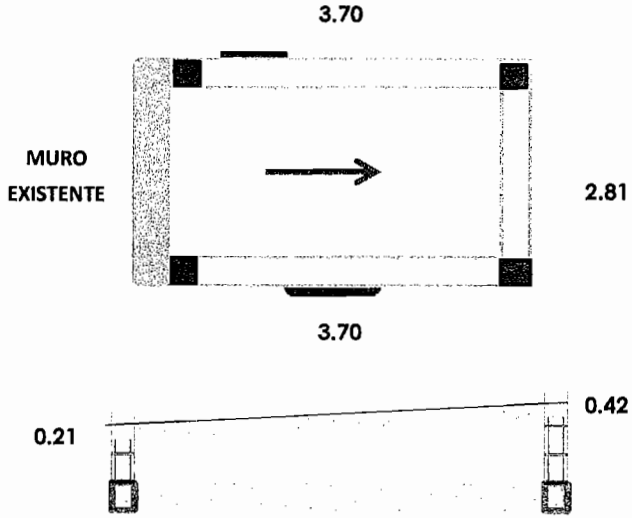



	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.70	2.10	7.77
2	2.81	2.10	5.90
3	3.70	2.10	7.77
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.70	0.32	1.18
2	2.81	0.21	0.59
3	3.70	0.32	1.18

TOTAL **21.35** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

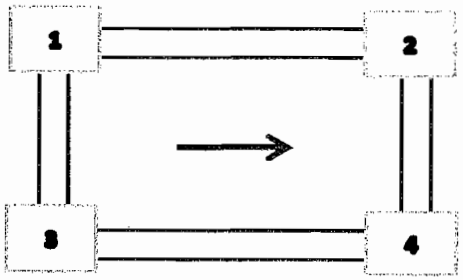

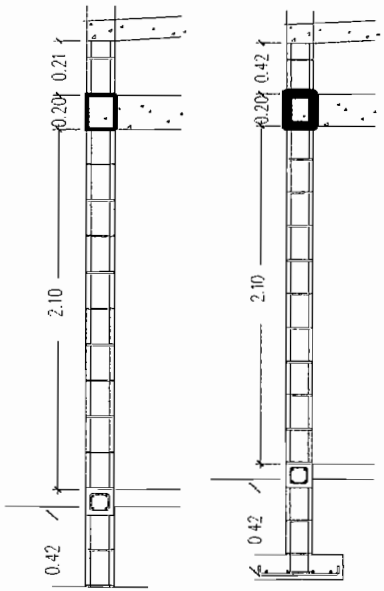

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.73
3	2.94
4	2.73
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.81	M



	M
LONGITUD MUROS	
1	4.00
2	2.81
3	4.00

TOTAL 10.81 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.57	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.23	13.57

TOTAL **13.57 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V


M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO
DOMICILIO : C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

Testigo fotografico cuarto adosado

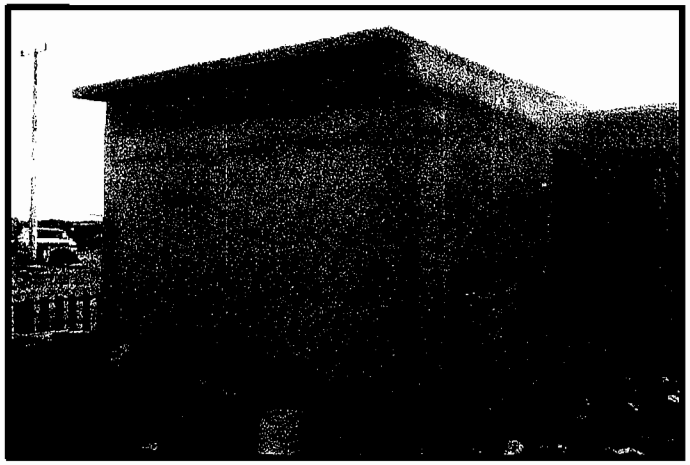

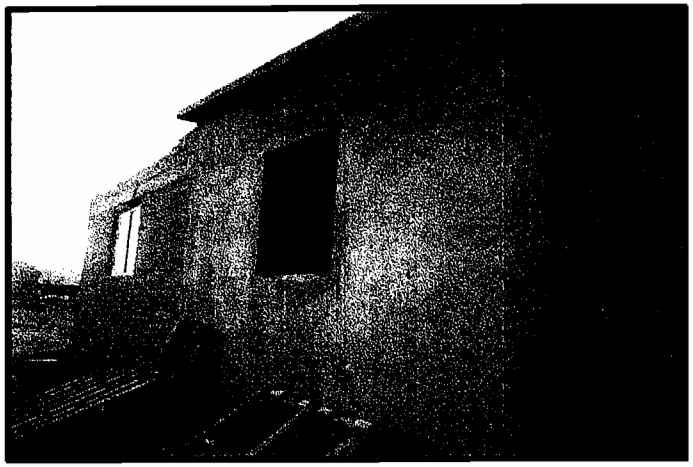

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13.29	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.04	3.29	13.29



TOTAL 13.29 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

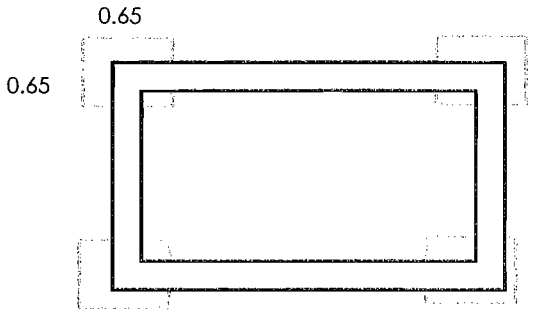

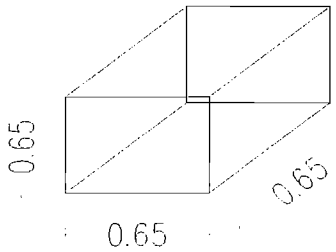

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL 1.08 M3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: ~~5 (CINCO)~~

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

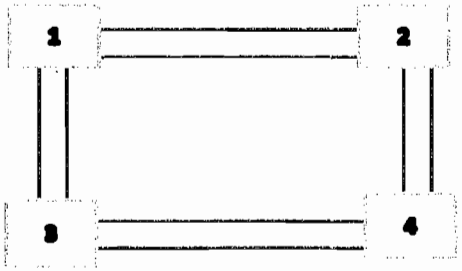

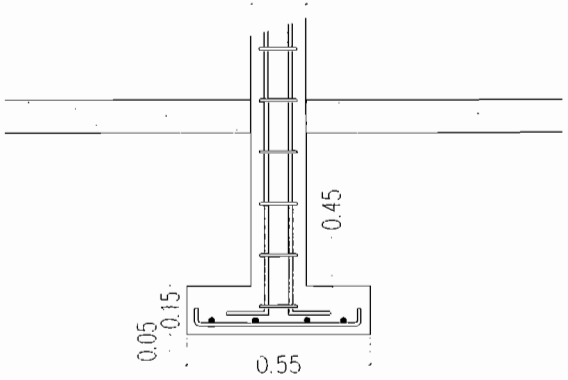

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

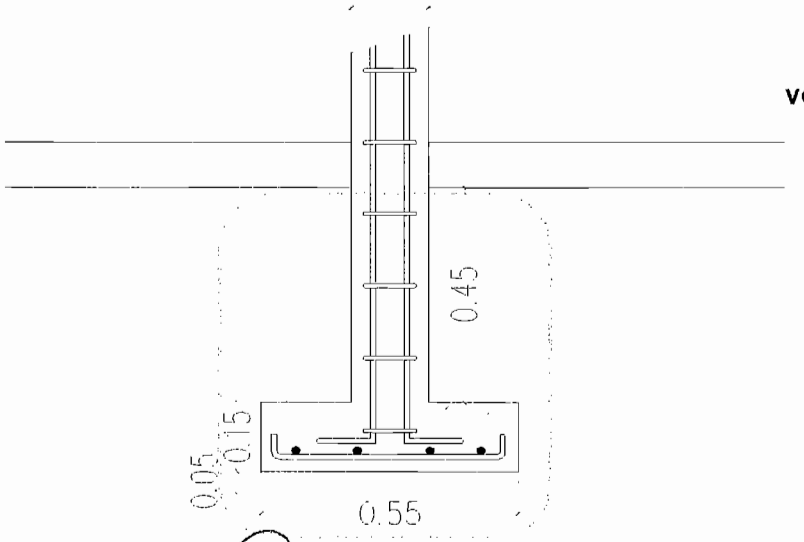

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.12

TOTAL 0.74 **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.32	m



LONGITUD MUROS

1	3.29
2	3.74
3	3.29

TOTAL 10.32 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	20.39	M2

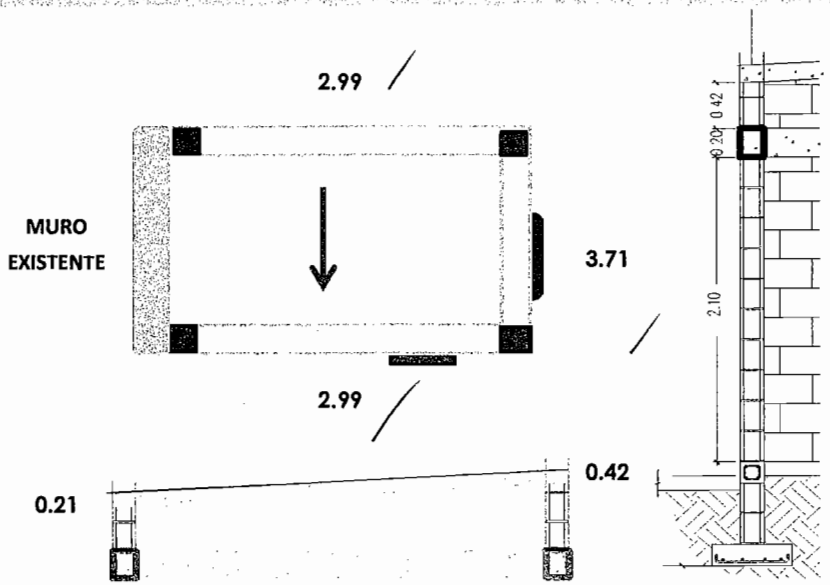

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	2.99	2.10	6.28
2	3.71	2.10	7.79
3	2.99	2.10	6.28
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.99	0.42	1.26
2	3.71	0.32	1.19
3	2.99	0.21	0.63
		TOTAL	**20.39** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

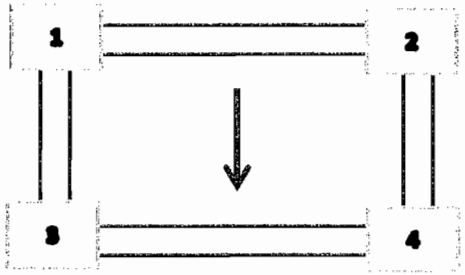

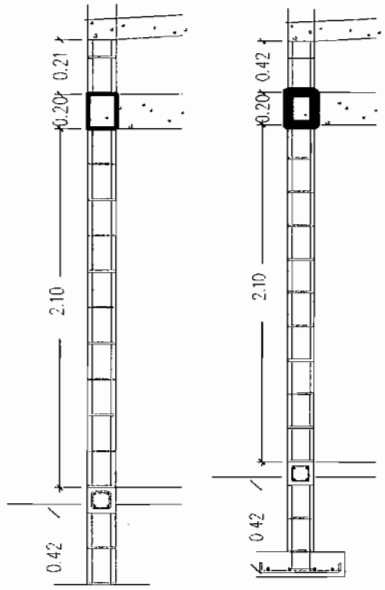

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.94
3	2.73
4	2.73
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.32	M



M

LONGITUD MUROS	
1	3.29
2	3.74
3	3.29

TOTAL 10.32 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	14.80	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.24	3.49	14.80

TOTAL **14.80 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


DOMICILIO : C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

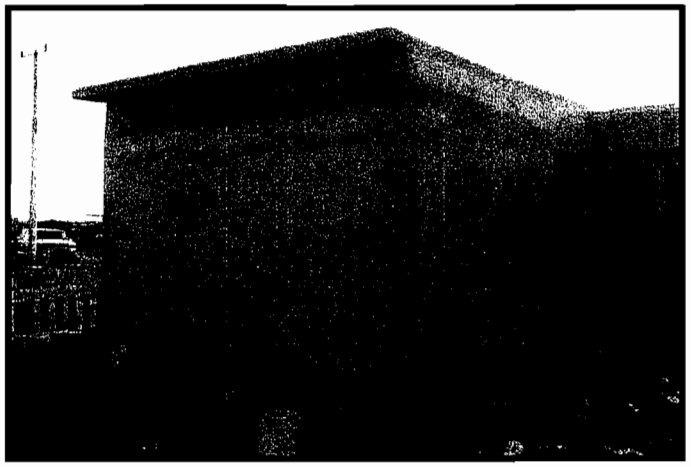

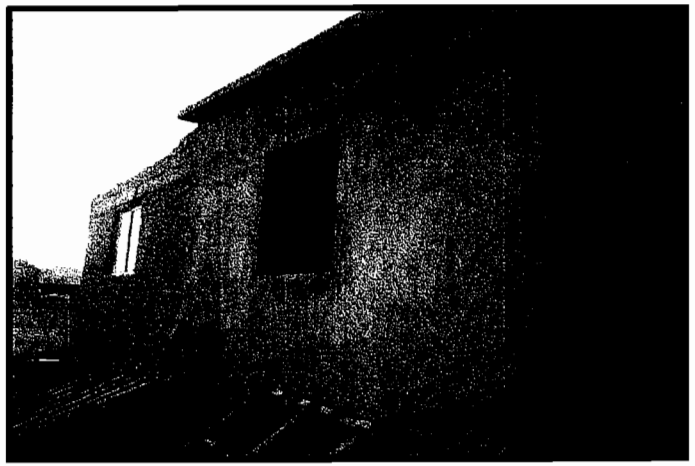

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.16	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.00	3.04	12.16



TOTAL 12.16 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES
DOMICILIO : C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

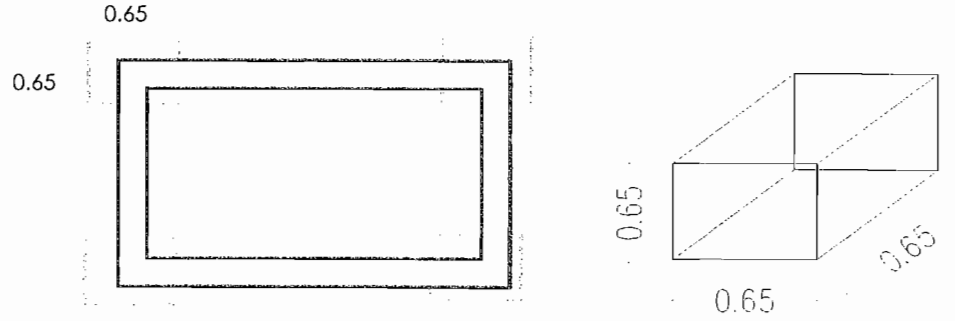

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

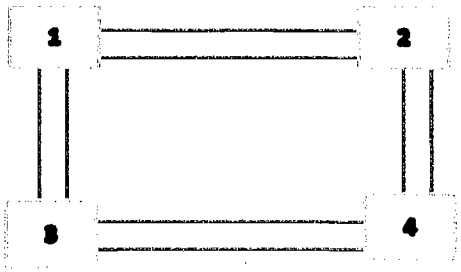

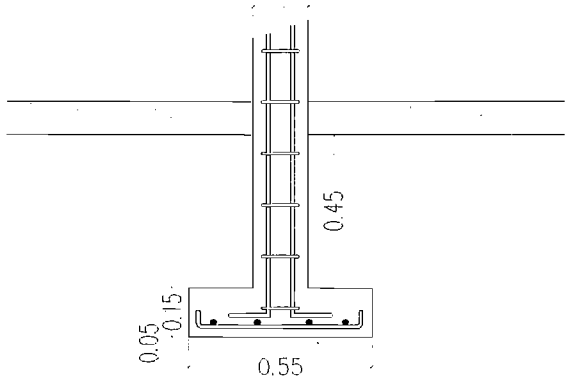

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

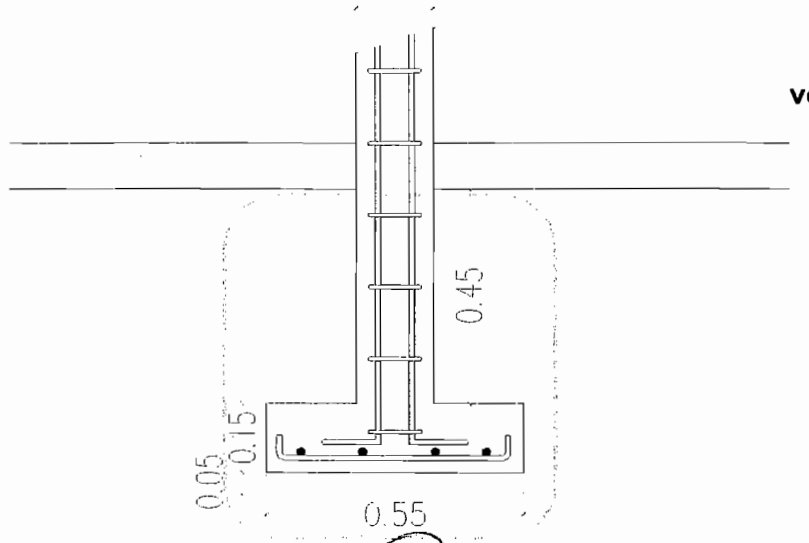

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.12

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.74	m

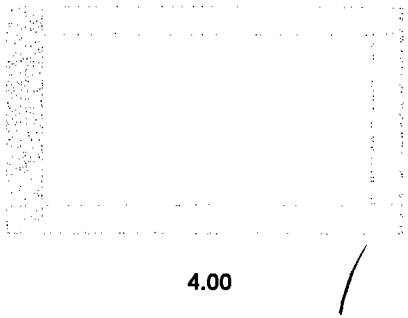

LONGITUD MUROS

1	4.00
2	2.74
3	4.00

TOTAL 10.74 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	22.34	M2

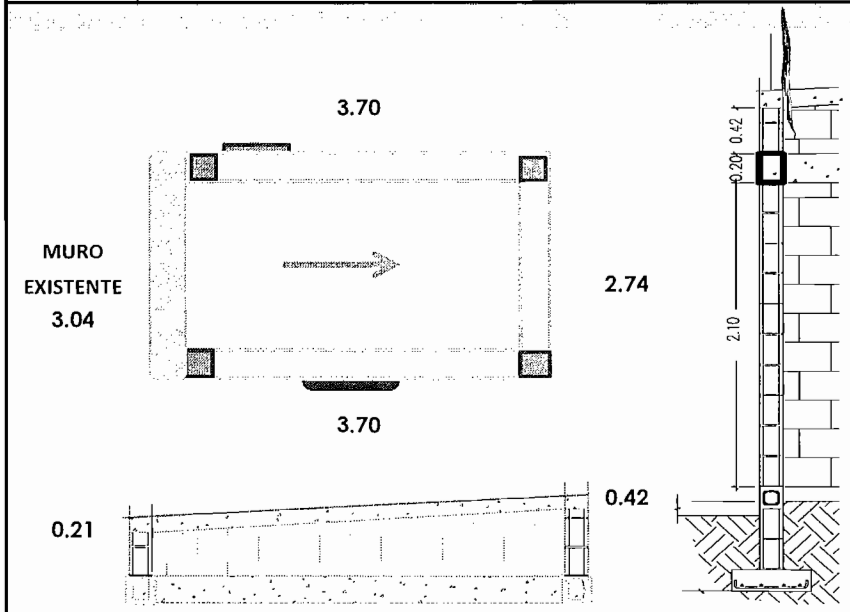

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.70	2.10	7.77
2	2.74	2.10	5.75
3	3.70	2.10	7.77
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.70	0.32	1.18
2	2.74	0.21	0.58
3	3.70	0.32	1.18
4	2.74	0.42	1.15
		TOTAL	**22.34** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

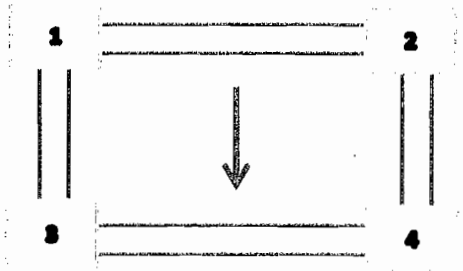

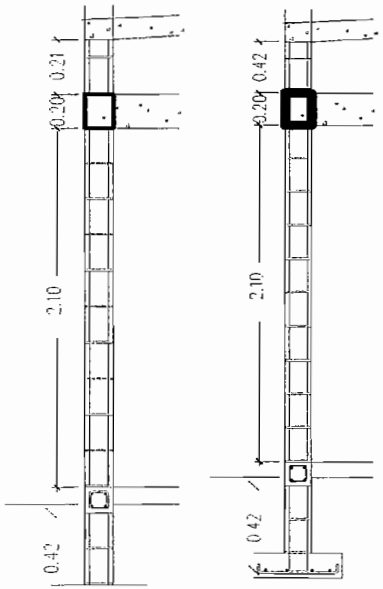

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.73
3	2.94
4	2.73
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 60 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.74	M



	M
LONGITUD MUROS	
1	4.00
2	2.74
3	4.00

TOTAL 10.74 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	14.14	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.42	3.20	14.14

TOTAL 14.14 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


No. CONTRATO: **200/2016**

DOMICILIO : **C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA**

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

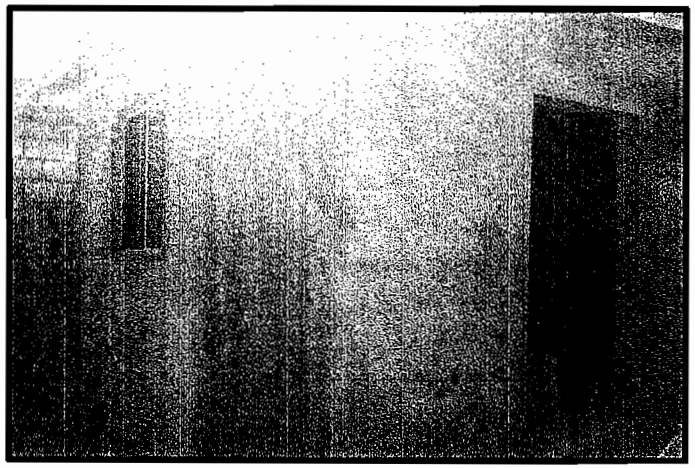

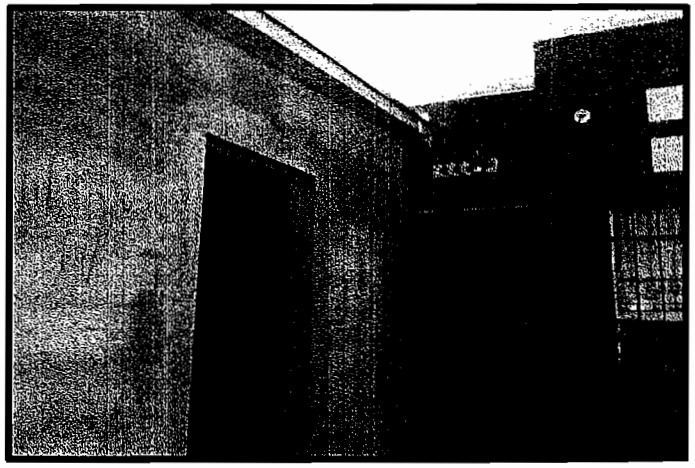

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.54	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.48	2.80	12.54



TOTAL **12.54 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ
DOMICILIO : C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.54	M3



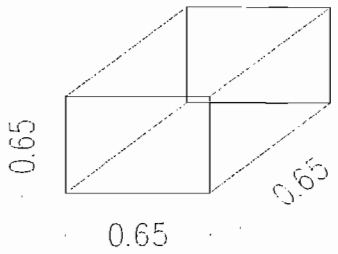

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **0.54 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	2.00	PZA



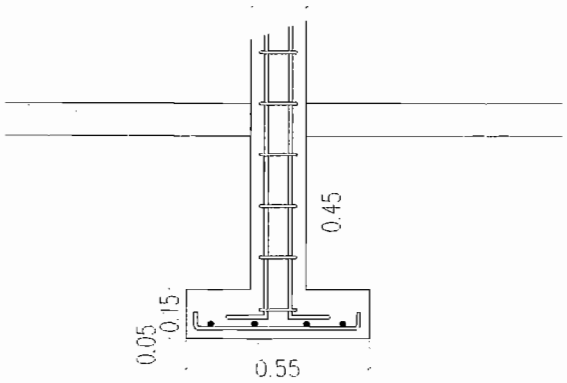

TOTAL 2.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.36	M3

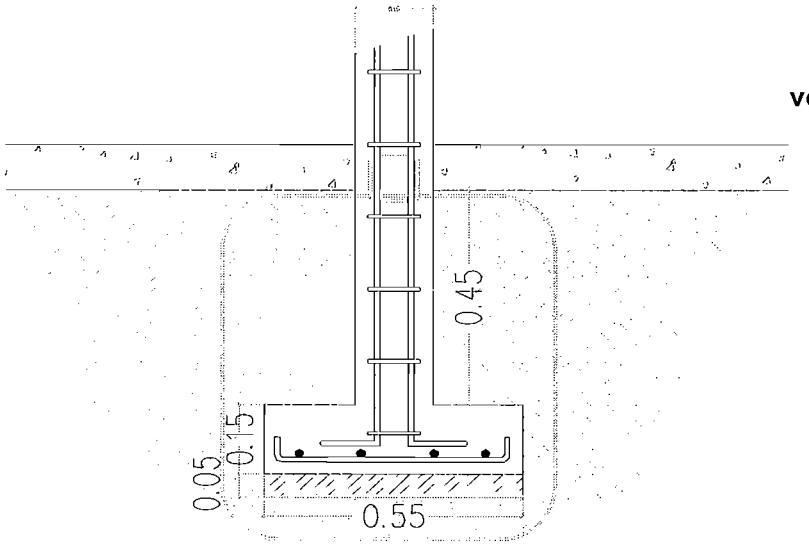

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x2 =	0.54
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 2 =	-0.12
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 2 =	-0.06

TOTAL **0.36** **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	6.67	m



LONGITUD MUROS

1	2.19
2	0.00
3	4.48

TOTAL 6.67 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.38	M2

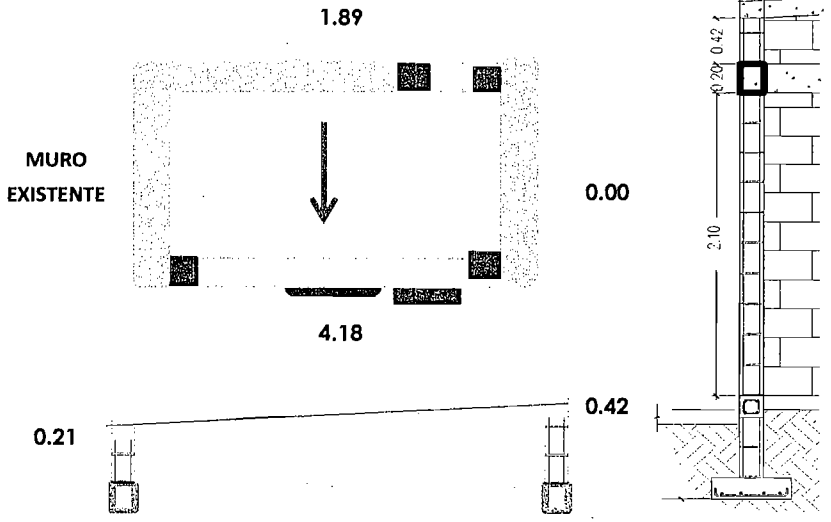

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	1.89	2.10	3.97
2	0.00	0.00	0.00
3	4.18	2.10	8.78
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	1.89	0.42	0.79
2	0.00	0.00	0.00
3	4.18	0.21	0.88

TOTAL **11.38** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.50	M

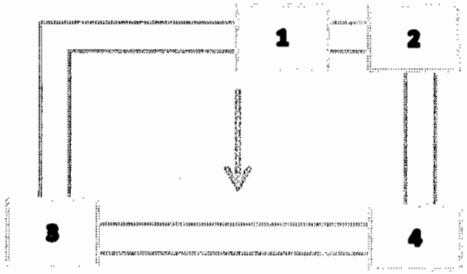

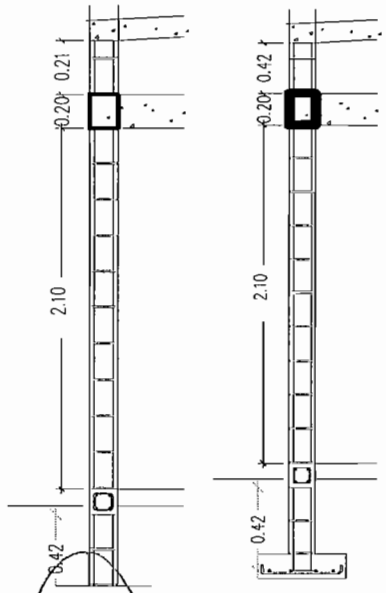

M

CASTILLO	ALTURA
1	2.52
2	2.52
3	2.73
4	2.73

TOTAL **10.50 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	6.67	M



	M
LONGITUD MUROS	
1	2.19
2	0.00
3	4.48

TOTAL 6.67 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	14.17	M2

4.63

3.06

M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.63	3.06	14.17

TOTAL **14.17 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

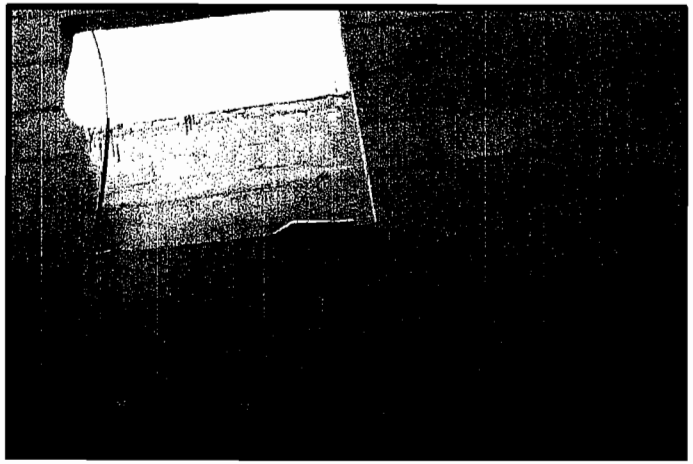

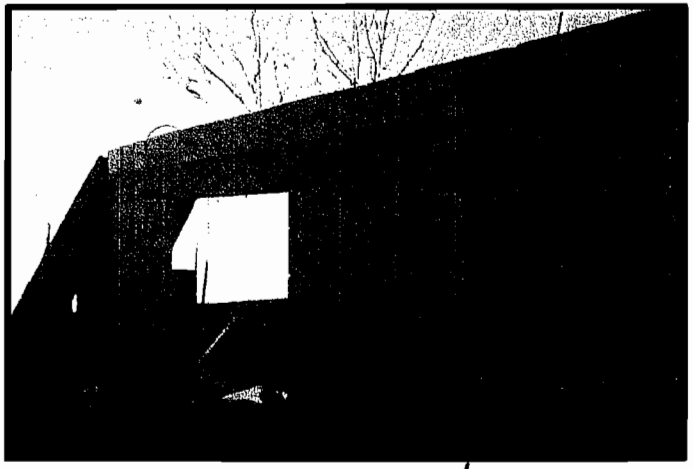

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.02	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
3.98	3.02	12.02



TOTAL **12.02 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3



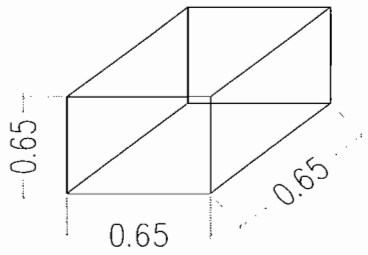

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

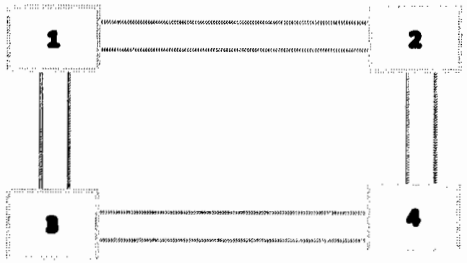

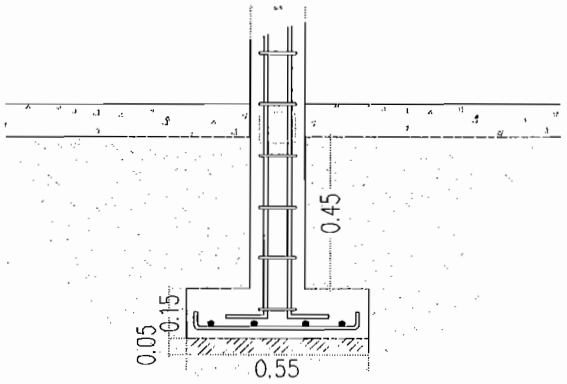

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

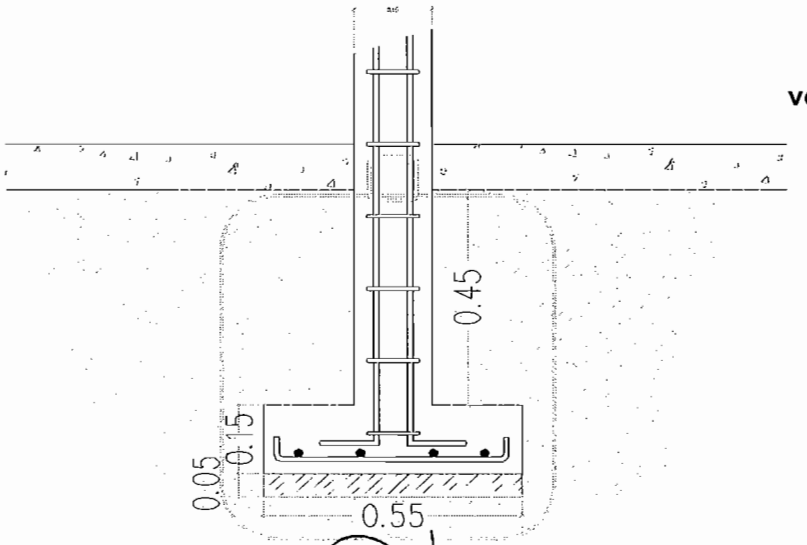

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.72	m

MURO EXISTENTE



LONGITUD MUROS

1	2.87
2	3.98
3	2.87

TOTAL 9.72 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	18.40	M2

MURO EXISTENTE

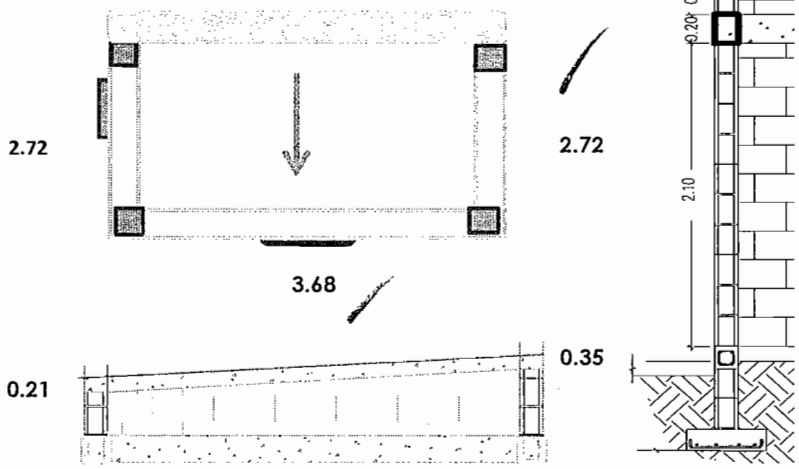

MURO	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA MURO
1	2.72	2.10	5.71
2	3.68	2.10	7.73
3	2.72	2.10	5.71
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.72	0.28	0.76
2	2.72	0.28	0.76
3	3.68	0.21	0.77

TOTAL **18.40** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.20	M

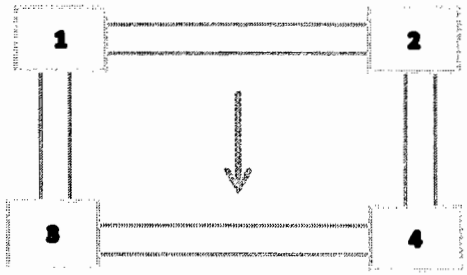

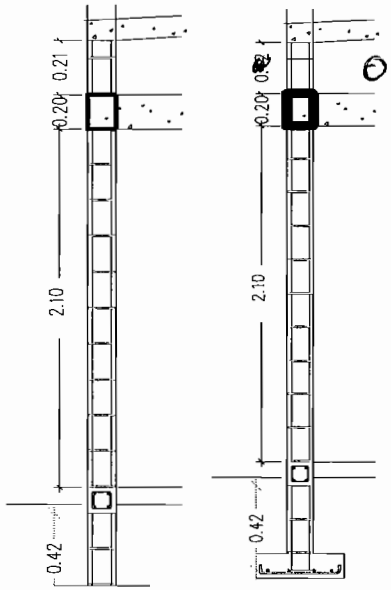

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.87
2	2.87
3	2.73
4	2.73
TOTAL	**11.20 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.72	M

MURO EXISTENTE



	M
LONGITUD MUROS	
1	2.87
2	3.98
3	2.87
TOTAL	**9.72 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.46	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.18	3.22	13.46

TOTAL **13.46 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

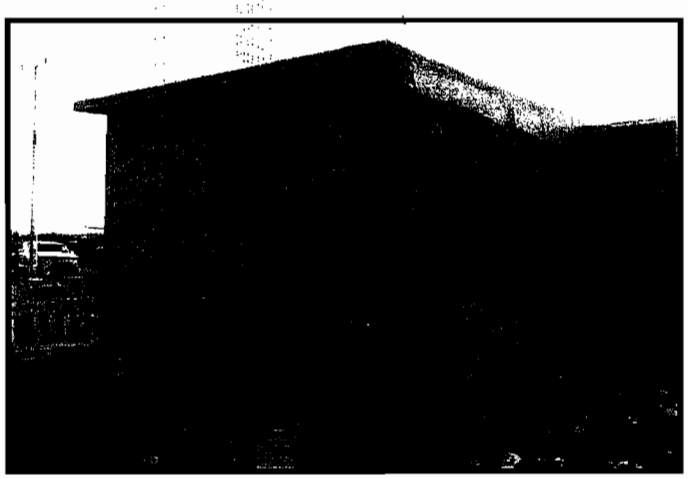

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.35	M2



M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
3.60	3.43	12.35

TOTAL 12.35 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3



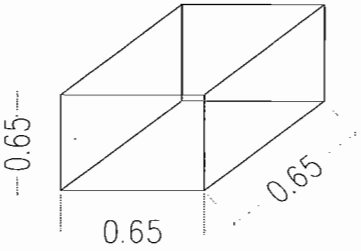

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



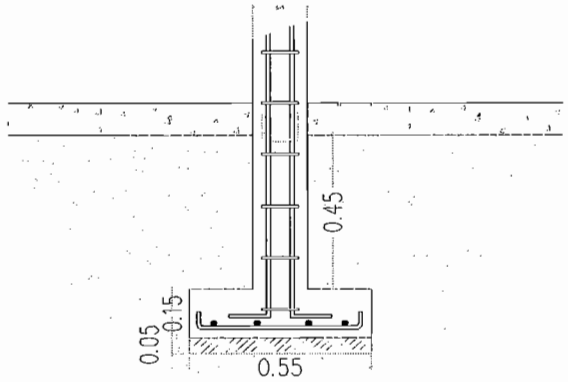

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

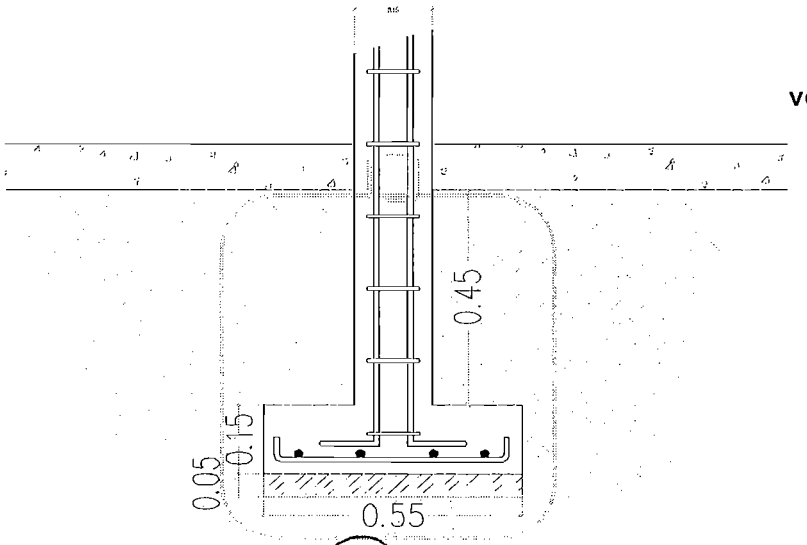

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.16	m

MURO EXISTENTE



LONGITUD MUROS

1	3.28
2	3.60
3	3.28

TOTAL 10.16 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	18.53	M2

MURO EXISTENTE

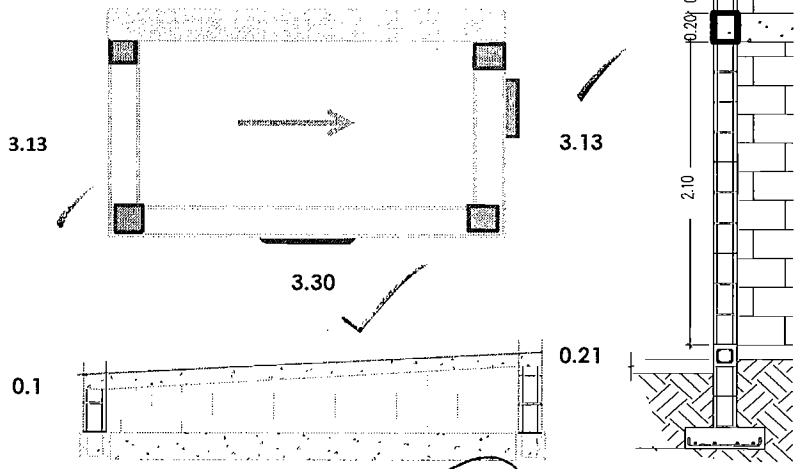

MURO	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA MURO
1	3.13	2.10	6.57
2	3.30	2.10	6.93
3	3.13	2.10	6.57
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.13	0.21	0.66
2	3.13	0.10	0.31
3	3.30	0.16	0.53

TOTAL **18.53** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.70	M

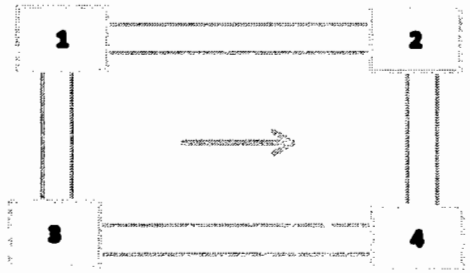

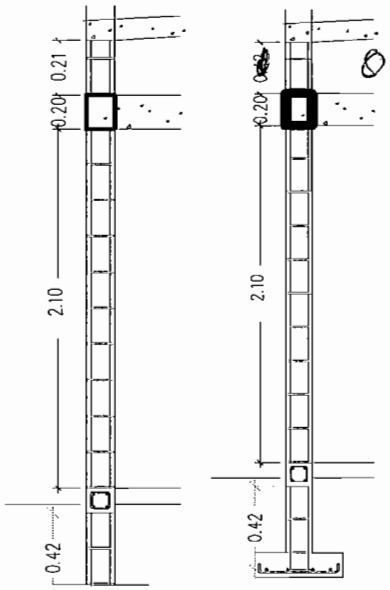

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.62
3	2.73
4	2.62
TOTAL	**10.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.16	M

MURO EXISTENTE



	M
LONGITUD MUROS	
1	3.28
2	3.60
3	3.28
TOTAL	**10.16 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.98	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
3.80	3.68	13.98

TOTAL **13.98 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

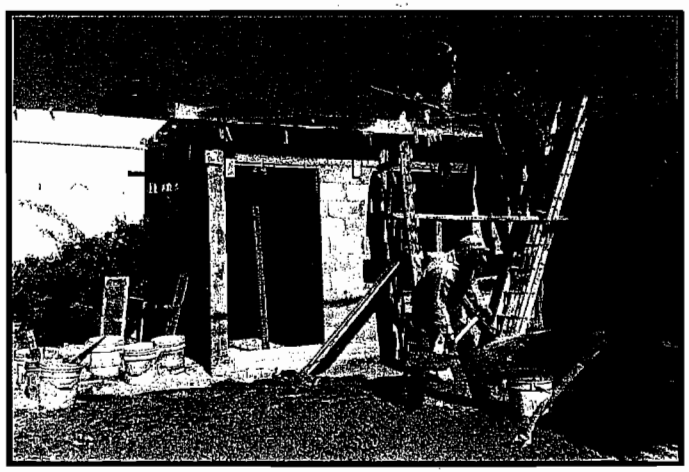

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.26	M2



M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.06	3.02	12.26

TOTAL 12.26 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


DOMICILIO : C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3



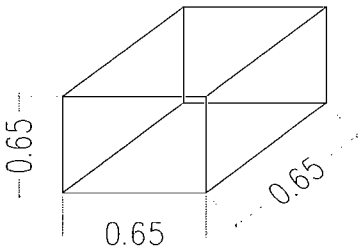

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA



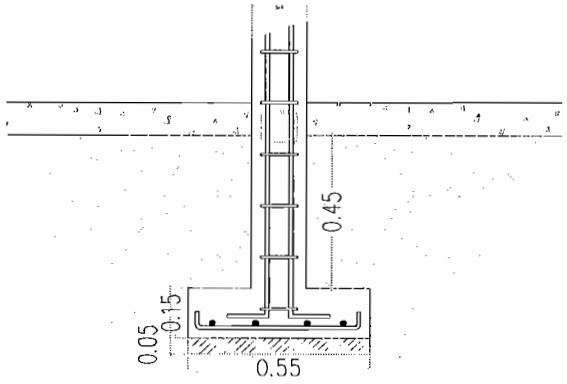

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

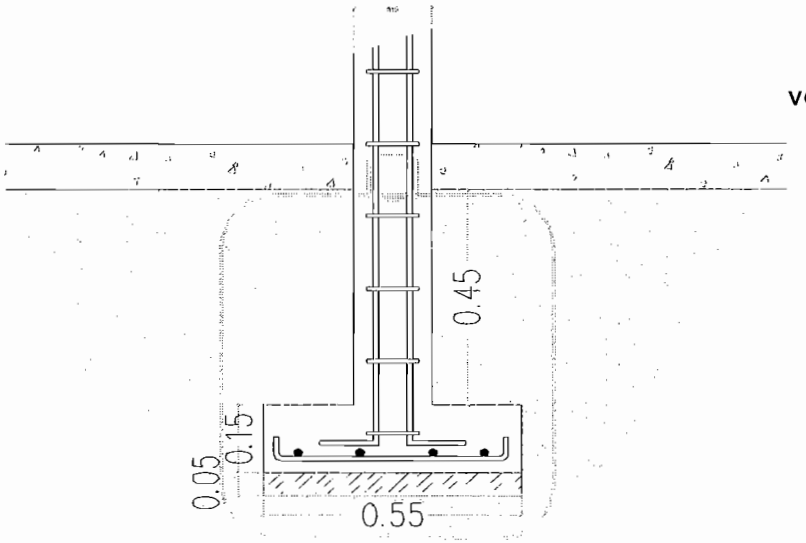

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	13.56	m

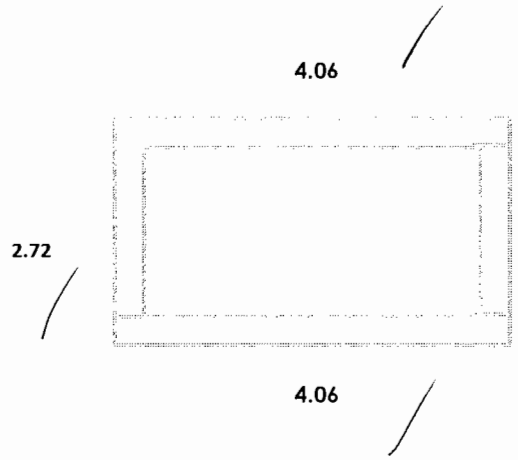

LONGITUD MUROS	
1	4.06
2	2.72
3	4.06
4	2.72

TOTAL 13.56 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DiSTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	28.29	M2

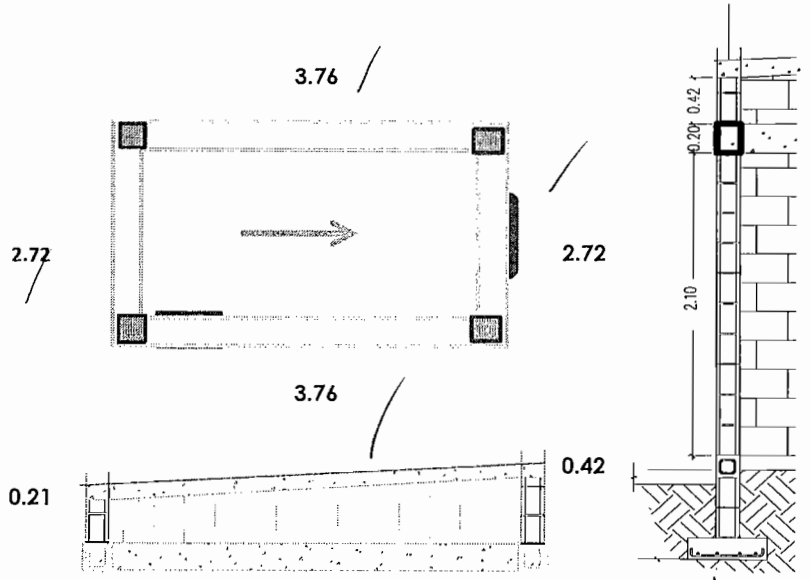

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.76	2.10	7.90
2	2.72	2.10	5.71
3	3.76	2.10	7.90
4	2.72	2.10	5.71
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.76	0.32	1.20
2	2.72	0.42	1.14
3	3.76	0.32	1.20
4	2.72	0.21	0.57
		TOTAL	**28.29** **M2**

Se hicieron los 4 muros
Porque el existente era de concreto

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

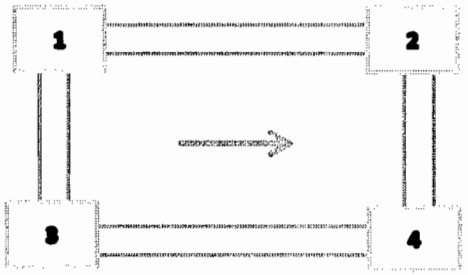

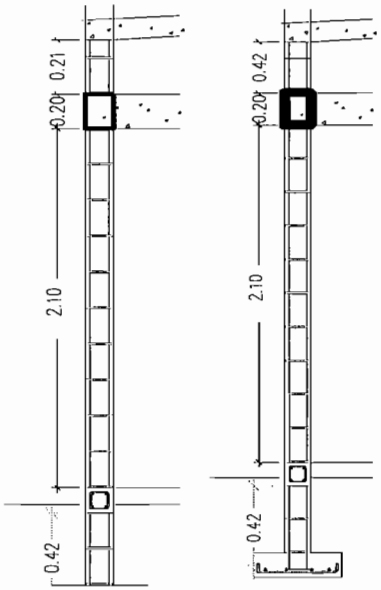

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.73
3	2.94
4	2.73
TOTAL	**11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	13.56	M

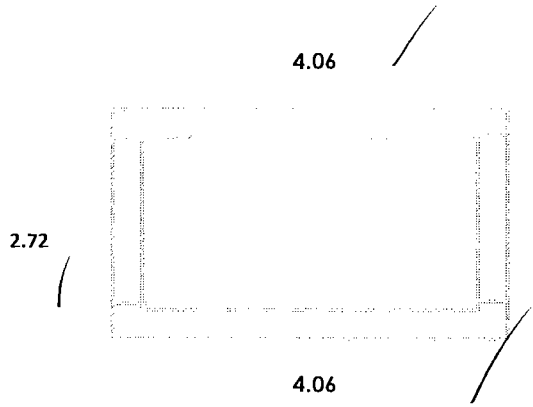

	M
LONGITUD MUROS	
1	4.06
2	2.72
3	4.06
4	2.72
TOTAL	**13.56 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.72	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.26	3.22	13.72

TOTAL **13.72 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

DOMICILIO : C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

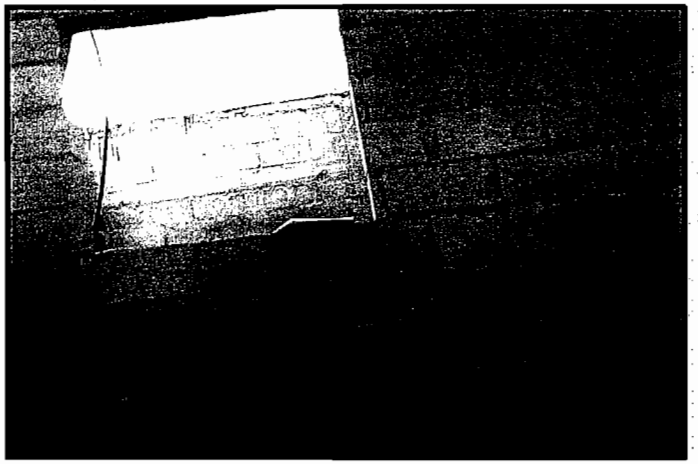



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.00	M2



M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.00	3.00	12.00

TOTAL **12.00 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

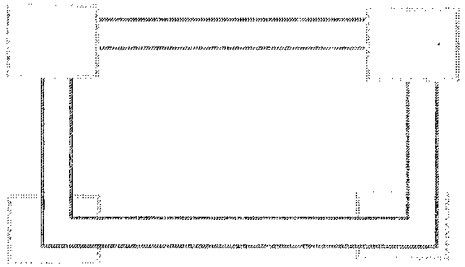

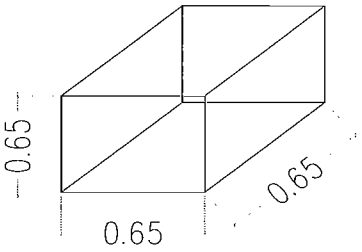

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

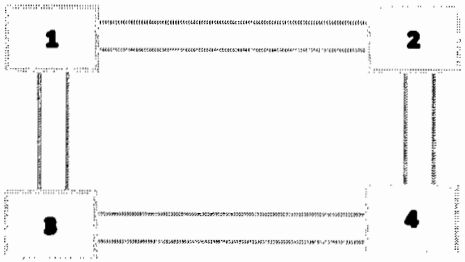

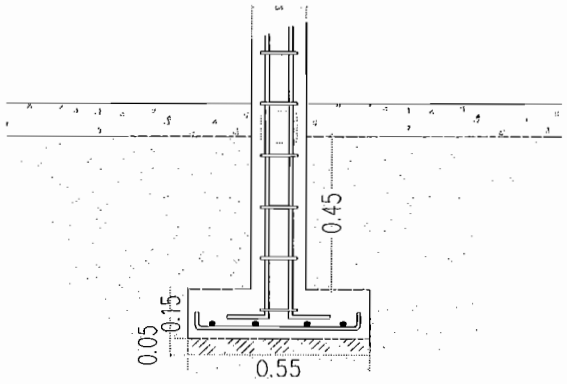

TOTAL 4.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

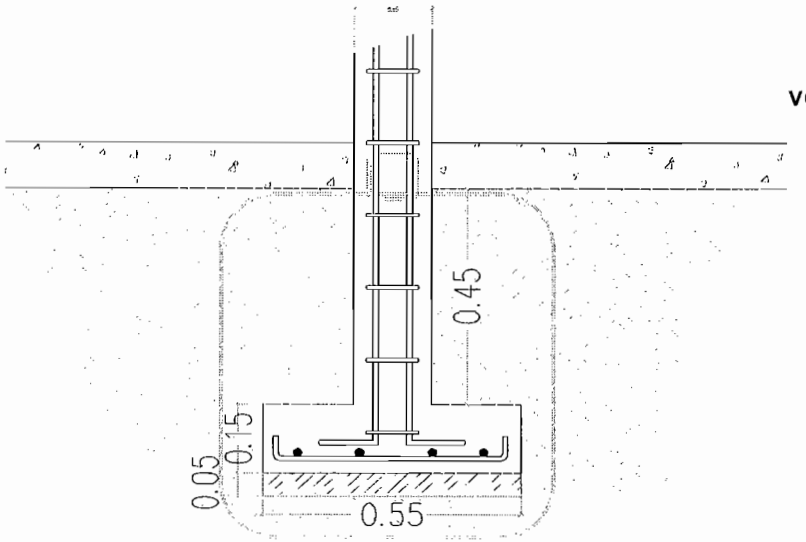

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.70	m

MURO EXISTENTE



LONGITUD MUROS

1	2.85
2	4.00
3	2.85

TOTAL **9.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	17.50	M2

MURO EXISTENTE

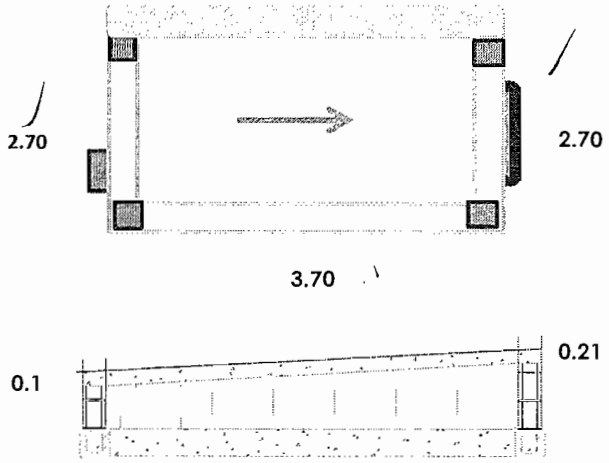



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA MURO
1	2.70	2.10	5.67
2	3.70	2.10	7.77
3	2.70	2.10	5.67
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.70	0.21	0.57
2	2.70	0.10	0.27
3	3.70	0.16	0.59

TOTAL **17.50** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.70	M

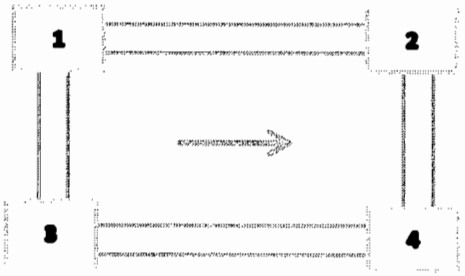

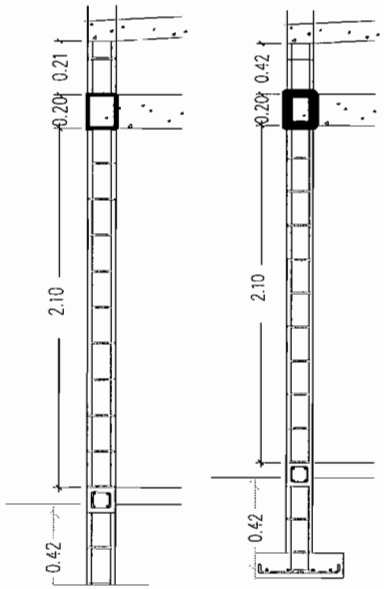

	M
CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.62
3	2.73
4	2.62
TOTAL	**10.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.70	M

MURO EXISTENTE



	M
LONGITUD MUROS	
1	2.85
2	4.00
3	2.85
TOTAL	**9.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.44	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.20	13.44

TOTAL **13.44 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

DOMICILIO : C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.25	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.03	3.04	12.25



TOTAL **12.25 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


DOMICILIO : C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3

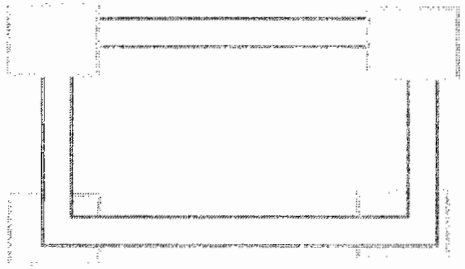

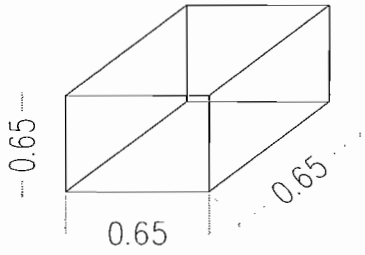

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

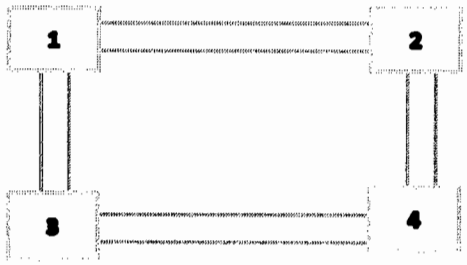

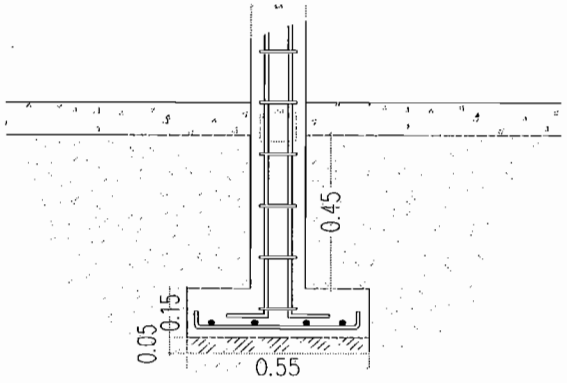

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

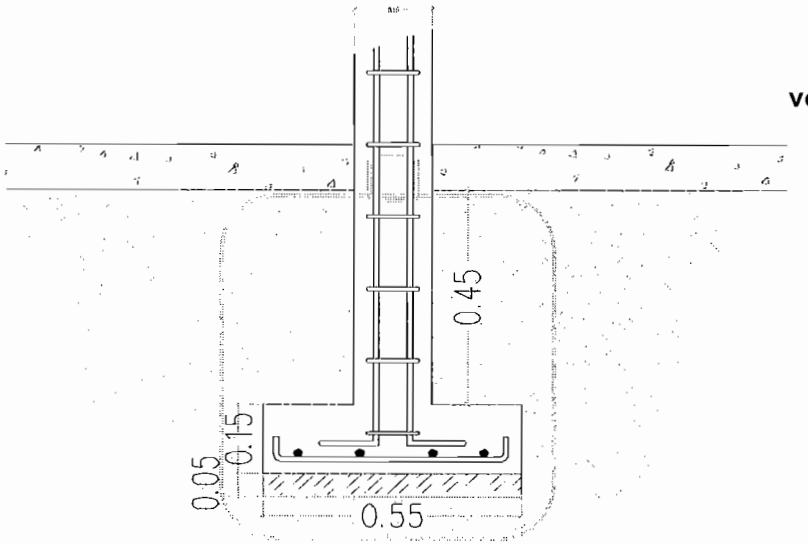

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.12

TOTAL **0.74** **M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.81	m

MURO EXISTENTE



LONGITUD MUROS

1	2.89
2	4.03
3	2.89

TOTAL 9.81 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	17.54	M2

MURO EXISTENTE

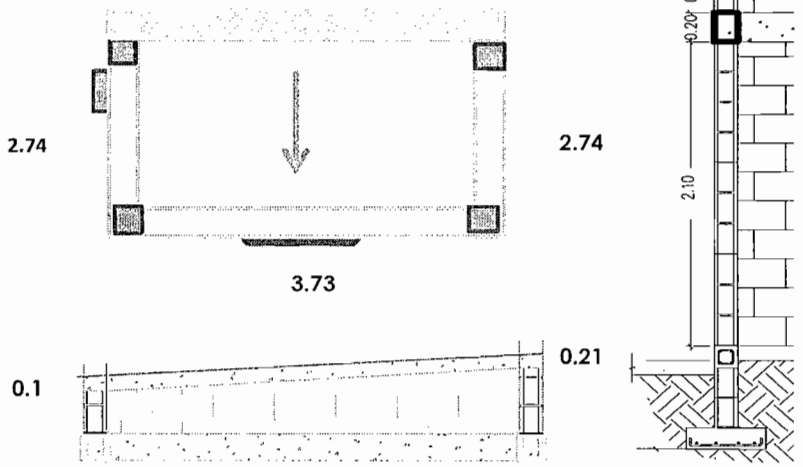

MURO	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA MURO
1	2.74	2.10	5.75
2	3.73	2.10	7.83
3	2.74	2.10	5.75
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.74	0.16	0.44
2	2.74	0.16	0.44
3	3.73	0.10	0.37

TOTAL 17.54 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	10.70	M

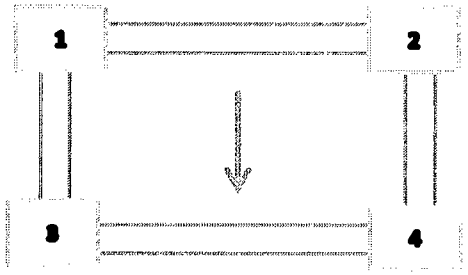

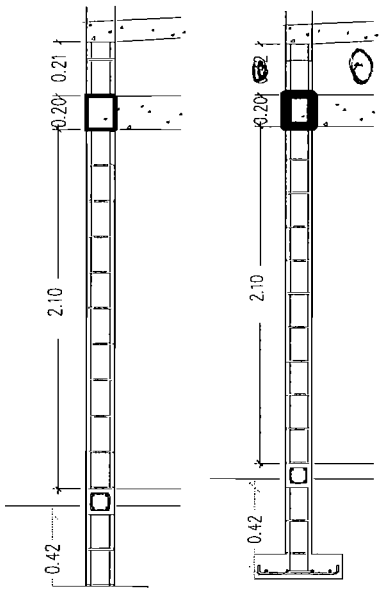

0.10

M

CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.62
4	2.62

TOTAL **10.70 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.81	M

MURO EXISTENTE



	M
LONGITUD MUROS	
1	2.89
2	4.03
3	2.89
TOTAL	**9.81 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.06	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.03	3.24	13.06

TOTAL **13.06 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	**FECHA:**	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS	**No. CONTRATO:**	200/2016
DOMICILIO:	C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO	**No. ESTIMACION:**	**5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

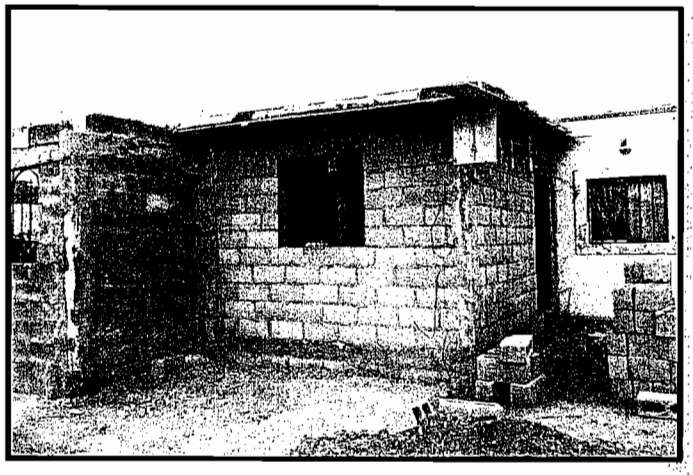

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	14.28	M2

M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
3.85	3.71	14.28



TOTAL **14.28 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	0.81	M3

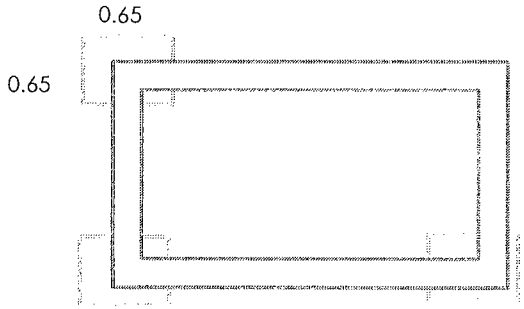

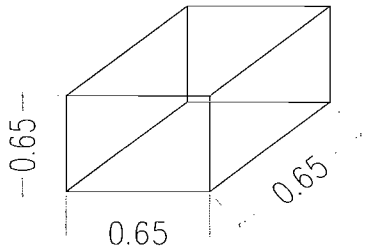

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **0.81 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	3.00	PZA

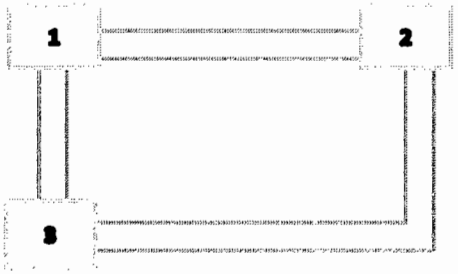

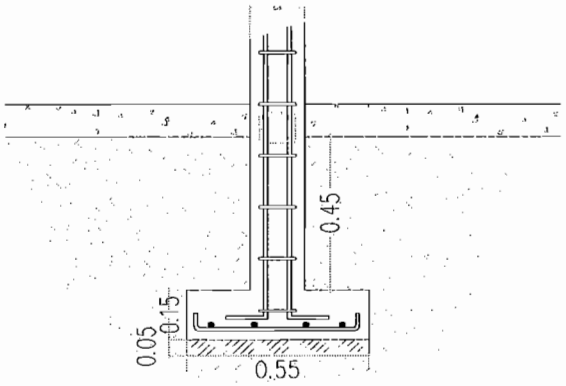

TOTAL 3.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.54	M3

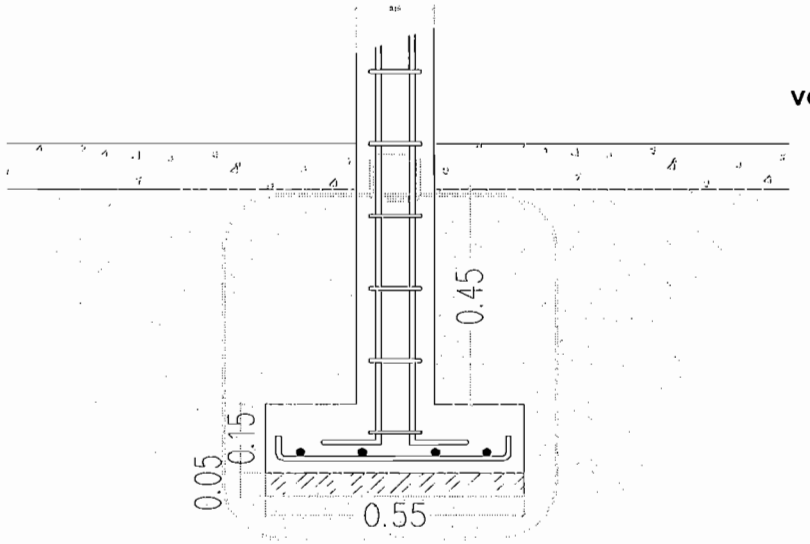

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 3 =	0.81
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 3=	-0.18
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 3 =	-0.09
TOTAL		**0.54 M3**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	8.22	m

3.71

MURO EXISTENTE

0.8



LONGITUD MUROS

1	3.71
2	0.80
3	3.71

TOTAL 8.22 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	15.31	M2

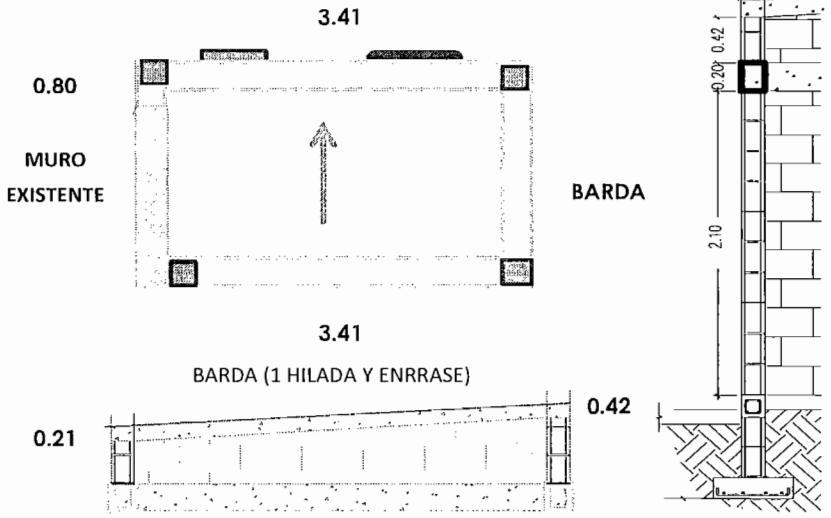

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.41	2.10	7.16
2	0.80	2.10	1.68
3	3.41	2.10	7.16
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	3.41	0.42	1.43
2	0.80	0.25	0.20
3	3.41	0.21	0.72
TOTAL			**15.31** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

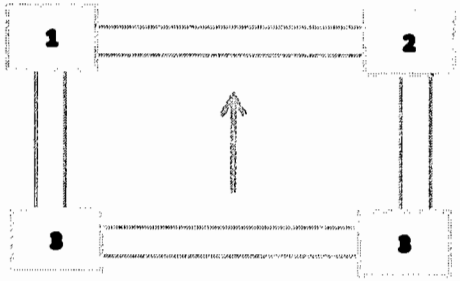

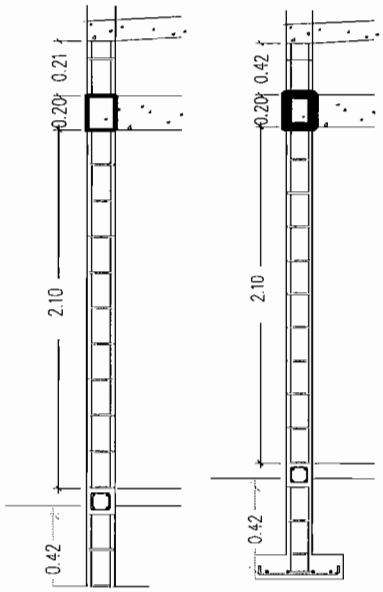

M

CASTILLO	ALTURA
1	2.73
2	2.73
3	2.94
4	2.94

TOTAL **11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.77	M



Barda

	M
LONGITUD MUROS	
1	3.71
2	3.55
3	3.71
4	0.80
TOTAL	**11.77 M**

5c Poso dala Cerramiento sobre Barda

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	15.03	M2

4.05



3.71

M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.05	3.71	15.03

TOTAL **15.03 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	**FECHA:**	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON	**No. CONTRATO:**	200/2016
DOMICILIO :	C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	**No. ESTIMACION:**	**5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

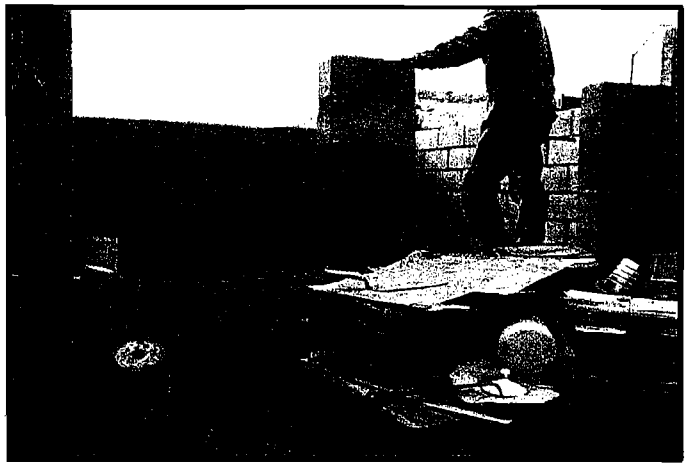

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.1	Trazo y nivelación del terreno natural con manguera y estableciendo referencias, incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producto de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.16	M2



M	M	M2
LARGO	ANCHO	ÁREA
4.00	3.04	12.16

TOTAL **12.16 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
1.2	Excavacion con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.0 m de profundidad en una seccion de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. incluye afine de talud y del fondo de excavacion, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producto de la excavacion a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalacion	1.08	M3



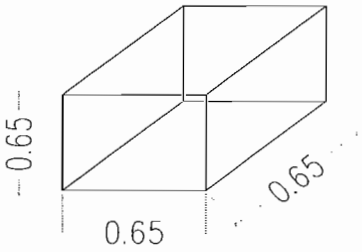

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.65	0.65	0.65	0.27
2	0.65	0.65	0.65	0.27
3	0.65	0.65	0.65	0.27
4	0.65	0.65	0.65	0.27

TOTAL **1.08 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.1	Construccion de zapata aislada de 55 x 55 x 15 centimetros con concreto armado con acero de refuerzo de 3/8" de diametro con fy = 4200 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", comprende la colocacion de plantilla de concreto simple de 5 cms de espesor con concreto fc= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4". incluye al habilitado, armado, cimbrado, colado, decimbrado, curado con agua y relleno de aproches con material producto de excavacion, mano de obra herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	4.00	PZA

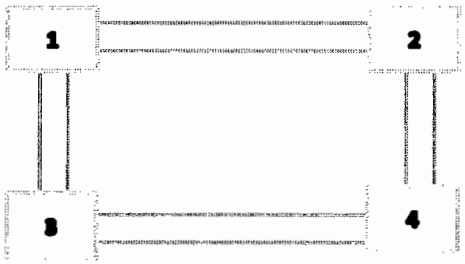

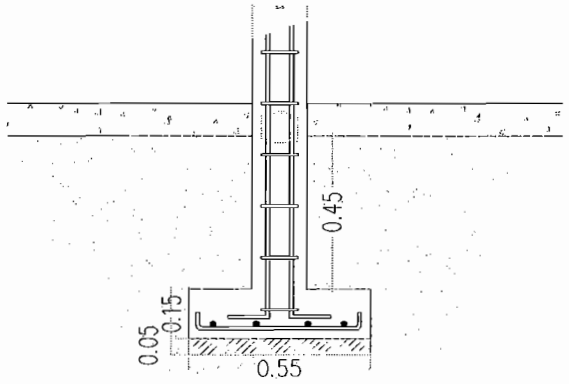

TOTAL **4.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.2	Relleno de cepa en área de zapatas con material producto de la aexcavacion. Incluye: apisonado, mano de obra y herramienta, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.74	M3

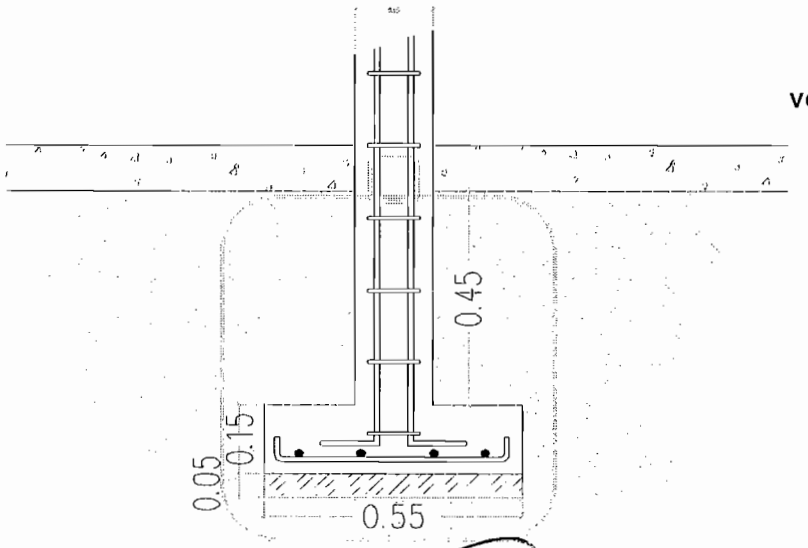

		M3
vol excavacion=	0.65 x 0.65 x 0.65 x 4 =	1.08
vol zapata y plantilla =	0.55 x 0.55 x 0.20 x 4 =	-0.24
vol rodapie =	0.15 x 0.40 X 0.42 x 4 =	-0.10
	TOTAL	**0.74 M3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.3	Dala de desplante de 0.15 X 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.78	m

MURO EXISTENTE



LONGITUD MUROS

1	2.89
2	4.00
3	2.89

TOTAL **9.78 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Muro de block macizo de la region con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con un mortero cemento arena en proporcion 1:4 colocado a plomo y regla con un maximo de desplome del 0.40 %. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas,. materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	19.10	M2

MURO EXISTENTE

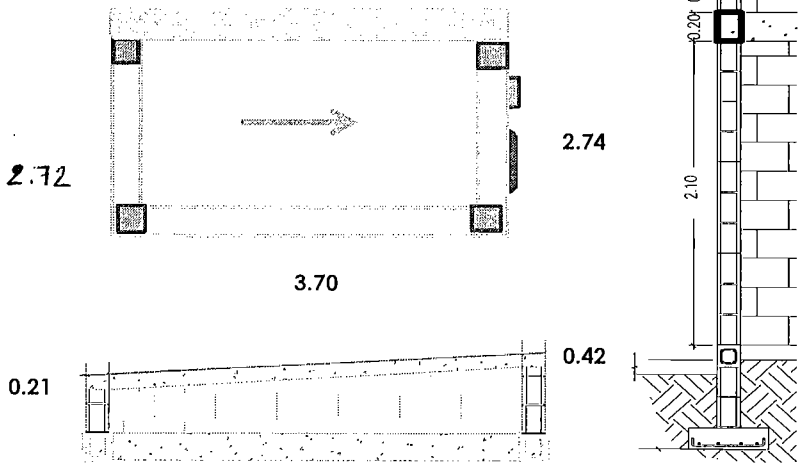



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA MURO
1	2.74	2.10	5.75
2	3.70	2.10	7.77
3	2.72	2.10	5.71
PTA	0.97	2.10	-2.04
VENTANA	1.00	1.00	-1.00
ENRASE	LARGO	ALTO	ÁREA ENRASE
1	2.74	0.42	1.15
2	2.74	0.21	0.58
3	3.70	0.32	1.18

TOTAL **19.10** **M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidraulico hecho en obra de fc= 200kg/cm2 T.M.A. con estrusctura elctro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 10.1 cm y una separacion a cada 15.8 cm de fy= 6000 kg/cm2, acabado comun, incluy: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, decimbrado, curado, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	11.34	M

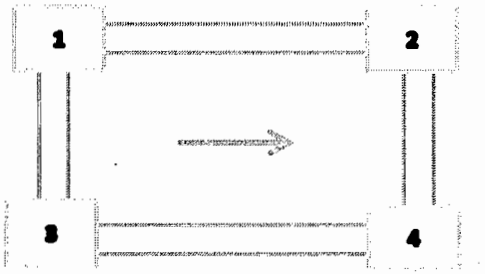

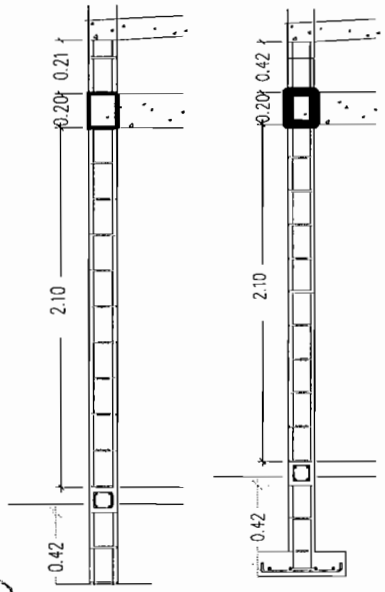

M

CASTILLO	ALTURA
1	2.94
2	2.73
3	2.94
4	2.73

TOTAL **11.34 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.4	Cadena de cerramiento de 0.15 X 0.20 m de concreto hidraulico hecho en obra fc= 200 kg/cm2 T.M.A, armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diametro con estribos lisos de grado 50 con seccion 10.1 x 15 cm con una separacion a cado 15.8 cm electro soldaddos de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidraulico heco en obra de fc = 200 kg/cm2 acabado comun, incluye: herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,traslapes,dobleces, amarres),preparacion del concreto colado, vibrado, decimbrado,curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	9.78	M

MURO EXISTENTE



	M
LONGITUD MUROS	
1	2.89
2	4.00
3	2.89
TOTAL	**9.78 M**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.5	Losa de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado aparente, armada con varillas de 3/8 según proyecto, incluye acarreo habilitado y armado de acero de refuerzo, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el area de trabajo y lo nececsario para su correcta ejecucion	13.61	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.24	13.61

TOTAL **13.61 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : PVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

	ESTIMACION 5 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1 PERIODO : 08/12/2016 AL 14/12/2016			APLANADO EN MURO	FIRME	INSTALACION ELECRICA	PINTURA	IMPERMEABILIZACION
				3.2	3.6	4.1	5.1	5.2
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	M2	M3	PZA	M3	M
1	MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ	RIO CAUCA # 1806	RIVERAS DE SACRAMENTO	38.95	10.60	1.00	61.13	12.52
2	PALMAR QUIÑONEZ RITA	C. RIO SENEGAL # 2200	RIVERAS DE SACRAMENTO	39.61	10.63	1.00	51.26	12.88
3	EYMI JANETH AGUILAR FUENTES	C. RIO COLUMBIA # 1420	RIVERAS DE SACRAMENTO	40.60	11.07	1.00	53.76	14.21
4	CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ	C. RIO MISSOURI # 25901	RIVERAS DE SACRAMENTO	38.67	10.20	1.00	54.34	13.27
5	HEREDIA TERRAZAS DOLORES	C. TUPAMAROS # 207	VICENTE GUERECA	54.12	10.73	1.00	66.94	14.14
6	VARGAS PEÑA GEORGINA	C. DESIERTO DE MOJAVE # 3526	EL PORVENIR	43.06	10.13	1.00	53.91	12.21
7	DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS	C. MINA VICTORIA #3707	EL PORVENIR	54.35	9.85	1.00	66.24	13.29
8	BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE	C. CHE GUEVARA # 413	20 ANIVERSARIO	56.25	11.14	1.00	69.43	13.79
9	LAURENCIA OFELIA FERNADEZ ALDACO	C. ANTIMONIO # 1206	JUAN GUERECA	59.25	10.62	1.00	71.93	13.82
10	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA	C. CDP # 611	20 ANIVERSARIO	45.86	11.07	1.00	59.02	14.16
11	FRANCISCA PALMA MORENO	C. DIEGO LUCERO 1022	20 ANIVERSARIO	42.41	11.26	1.00	55.72	13.88
12	BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	C. LOS ARCOS # 3933	EL PORVENIR	55.71	10.28	1.00	68.04	13.15
13	RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO	C. RIO SAN FRANCISCO # 25917	RIVERAS DE SACRAMENTO	50.72	10.42	1.00	70.68	14.38
14	FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA	LOTE 7 MANZANA 660	GRANJAS DEL VALLE	59.74	10.98	1.00	73.78	14.59
15	MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ	C. METALURGICA # 623	JUAN GUERECA	60.76	11.43	1.00	74.31	14.74
16	SALGADO CHAVIRA ISABEL	C. MINA SAN CARLO # 17540	EL PORVENIR	45.30	10.10	1.00	66.68	12.62
17	RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q	DESIERTO DE SONORA # 3321	EL PORVENIR	61.10	10.68	1.00	73.75	12.80
18	CESAR LARA SILORO	C. DEL YESO # 3501	LADRILLERAS DEL NORTE	63.01	10.86	1.00	75.91	13.57
19	MARISELA LOPEZ GUTIERREZ	C. DEL ADOBE # 3506	LADRILLERAS DEL NORTE	61.13	11.34	1.00	74.60	14.80
20	MARIA SOCORRO ORTIZ CERVANTES	C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812	LOS MEZQUITES	67.36	10.08	1.00	79.49	13.72
21	REYES RIVAS RODRIGUEZ	C. MINA ARROYO #3743	EL PORVENIR	44.92	10.94	1.00	66.16	13.46
22	VENTURA CARO MONJE	C. FELIPE ANGELEZ # 28	NOMBRE DE DIOS	45.85	11.17	1.00	59.09	13.98
23	LORIBELLA PAREDES RUIZ	C. MINERAL DEL VALLECILLO #155	REAL DE MINAS	35.85	11.67	1.00	53.49	14.17
24	IRALDA JEYSSI CONTRERAS ARAGON	C. RIO ARNO #2024	RIVERAS DE SACRAMENTO	37.34	12.97	1.00	57.81	15.03
25	BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS	C. HACIENDA DE CANADA # 16900	AMP. NUEVO TRIUNFO	51.34	11.08	1.00	63.48	13.06
26	LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA	C. MARTIRES DE CHICAGO # 611	TIERRA Y LIBERTAD	44.64	10.70	1.00	61.84	13.44
27	PAULA SIGALA	C. PVD DESIERTO DE SONORA #33	EL PORVENIR	57.49	10.94	1.00	70.47	13.61
28	ALICIA CELIS JUAREZ	C. RIO EBRO # 2202	RIVERAS DE SACRAMENTO	53.76	11.55	1.00	73.03	13.86
29	MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA	C. PVD DESIERTO DE SONORA #35	EL PORVENIR	36.68	10.58	1.00	48.15	12.94
30	CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ	C. RIO GUADIANA #1810	RIVERAS DE SACRAMENTO	54.39	11.09	1.00	67.54	13.86
31	ESTHER PEÑA SOTO	C. RIO RINH # 2427	RIVERAS DE SACRAMENTO	32.22	11.55	1.00	49.38	14.77
32	CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ	C. RIO ODRA # 1625	RIVERAS DE SACRAMENTO	38.22	10.43	1.00	60.01	11.97
			SUBTOTAL 1	**1570.66**	**348.14**	**32.00**	**2051.37**	**436.69**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

PROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	38.95	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	2.88	2.50	7.20
	2.88	2.50	7.20
	3.63	2.38	8.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.03	2.60	7.88
	3.94	2.55	10.05
	1.07	2.50	2.68
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL **38.95**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.60	M2

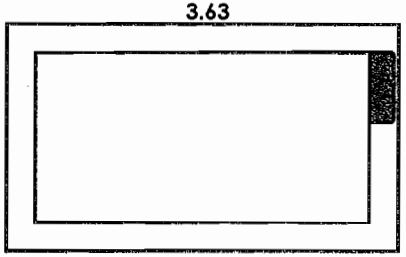

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.88	3.63	10.45
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.60 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ


DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	61.13	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.63	2.57	9.33
	2.88	2.50	7.20
	2.88	2.50	7.20
	3.63	2.38	8.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
VENT EXTRA			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.03	2.60	7.88
	3.94	2.55	10.05
	1.07	2.50	2.68
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.63	2.88	1.00	10.45

VOLADOS

1	4.16	0.20	0.83
	4.16	0.10	0.42
2	2.81	0.20	0.56
	3.01	0.10	0.30
3	0.90	0.20	0.18
	1.10	0.10	0.11

TOTAL 61.13

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.52	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.16	3.01	12.52
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 12.52 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

08/12/2016 AL 14/12/2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:

PERIODO: 5 (CINCO)


BENEFICIARIO: MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO CAUCA # 1806 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION:

Testigo fotografico cuarto adosado

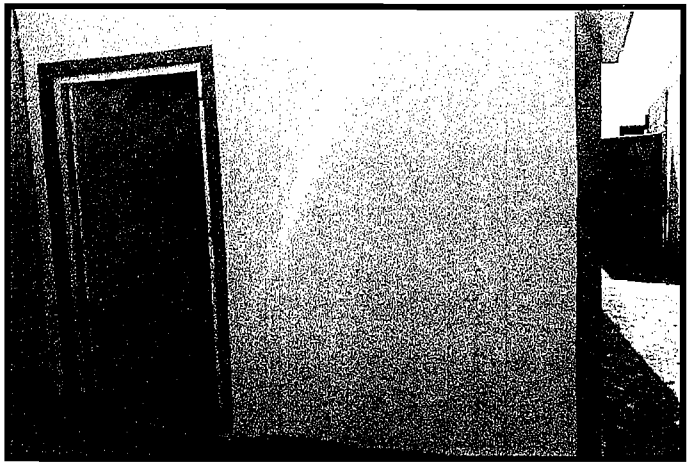

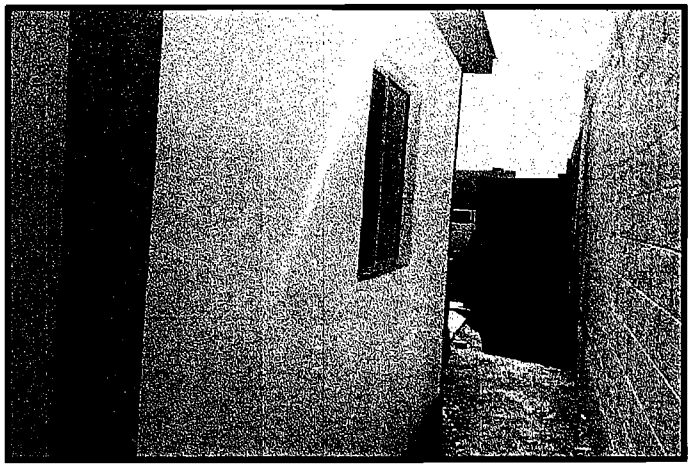

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA


No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	39.61	M2





3.9

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.73	2.60	7.10
	3.84	2.50	9.60
	3.84	2.70	10.37
	2.73	2.60	7.10
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	3.90	2.60	10.14
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 39.61

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.63	M2

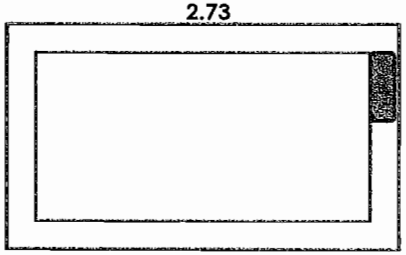

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.84	2.73	10.48
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.63 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2*, cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	51.26	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.73	2.60	7.10
	3.84	2.50	9.60
	3.84	2.70	10.37
	2.73	2.60	7.10
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
VENT EXTRA			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	3.90	2.60	10.14
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.73	3.84	1.00	10.48

VOLADOS

1	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
2	3.90	0.20	0.78
	3.90	0.10	0.39

TOTAL 51.26

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.88	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.00	3.22	12.88
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 12.88 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

08/12/2016 AL 14/12/2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:

PERIODO: 5 (CINCO)


BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION:

Testigo fotografico cuarto adosado

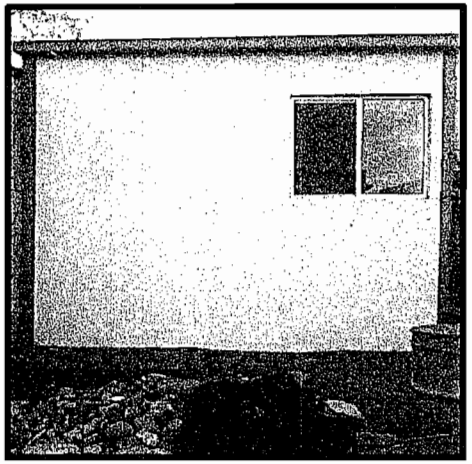

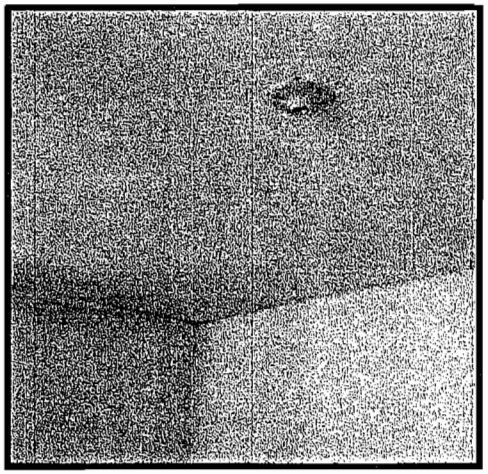

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES

DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	40.60	M2

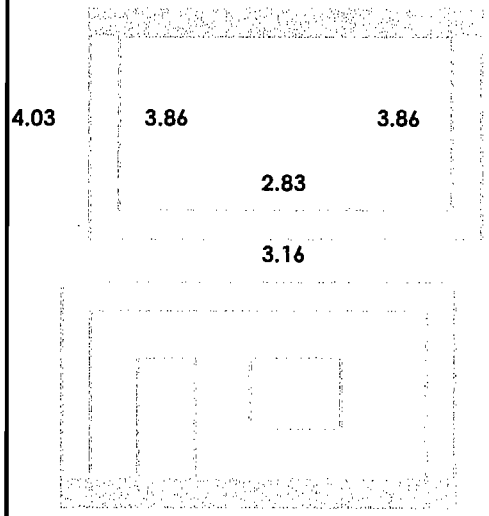

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.86	2.58	9.96
	3.86	2.58	9.96
	2.83	2.43	6.88
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.63	10.60
	3.16	2.50	7.90
	0.00	2.45	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 40.60

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:

PERIODO: 14 DE DICIEMBRE 2016


BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES

No. CONTRATO: 2[illegible]016 AL 14/12/2016

DOMICILIO : C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.07	M2

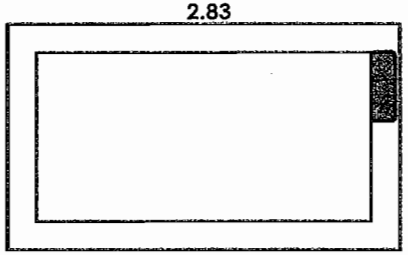

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.86	2.83	10.92
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.07 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	53.76	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.86	2.58	9.96
	3.86	2.50	9.96
	2.83	2.43	6.88
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
PTA EXTRA			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.03	2.63	10.60
	3.16	2.50	7.90
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.83	3.86	1.00	10.92

VOLADOS

1	4.23	0.20	0.85
	4.23	0.10	0.42
2	3.16	0.20	0.63
	3.36	0.10	0.34

TOTAL 53.76

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.21	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.23	3.36	14.21
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.21 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO: 5 (CINCO)

BENEFICIARIO: EYMI JANETH AGUILAR FUENTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO COLUMBIA # 1420 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION:

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5(CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	38.67	M2

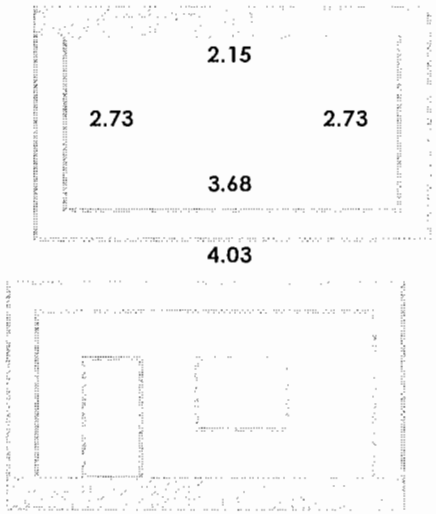

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.15	2.52	5.42
	2.73	2.50	6.83
	2.73	2.50	6.83
	3.68	2.52	9.27
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.87	2.07	-1.80

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	4.03	2.40	9.67
	2.92	2.45	7.15
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL **38.67**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.20	M2

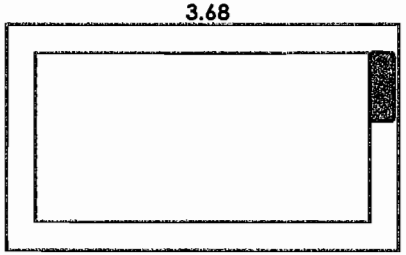

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.73	3.68	10.05
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.20 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO: 5.(CINCO)


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.34	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.68	2.41	8.87
	2.73	2.50	6.83
	2.73	2.50	6.83
	3.68	2.52	9.27
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
PTA EXTRA	0.87	2.07	-1.80

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	4.03	2.40	9.67
	2.92	2.45	7.15
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.68	2.73	1.00	10.05

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.10	0.42
2	2.96	0.20	0.59
	3.16	0.10	0.32

TOTAL 54.34

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:

BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.27	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.16	13.27
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.27 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016
08/12/2016 AL 14/12/2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:
PERIODO: 5 (CINCO)


BENEFICIARIO: CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ

DOMICILIO : C.RIO MISSOURI # 25901 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION:

Testigo fotografico cuarto adosado

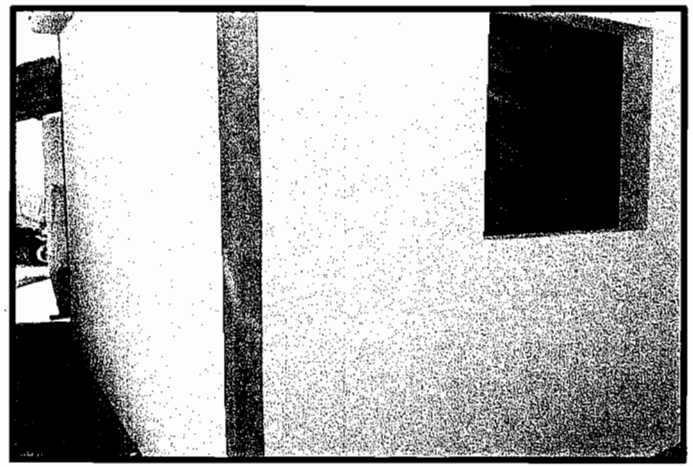

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.12	M2

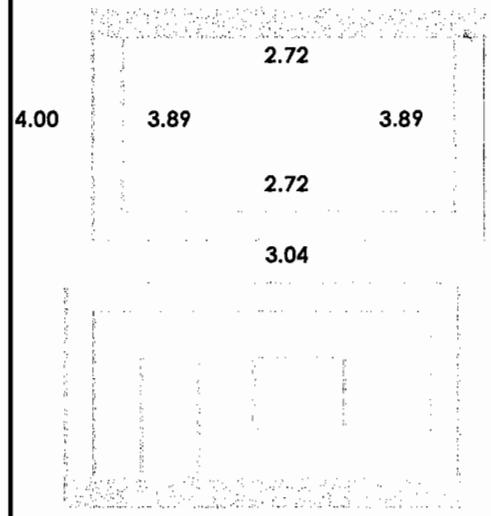

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.72	0.48	1.31
	3.89	2.53	9.84
	3.89	2.53	9.84
	2.72	2.42	6.58
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	2.70	10.80
	3.04	2.70	8.21
	4.00	3.06	12.24
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL **54.12**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: ~~5 (CINCO)~~

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES
DOMICILIO : C.TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia .fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.73	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.89	2.72	10.58
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.73 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

DOMICILIO: C.TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. CONTRATO: 200/2016$_5$ (CINCO)

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	66.94	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
4.00	2.72	0.48	1.31
	3.89	2.53	9.84
	3.89	2.50	9.84
	2.72	2.42	6.58
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	2.70	10.80
	3.04	2.70	8.21
	4.00	3.06	12.24
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.72	3.89	1.00	10.58

VOLADOS

1	4.42	0.20	0.88
	4.42	0.10	0.44
2	3.00	0.20	0.60
	3.20	0.10	0.32

TOTAL 66.94

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.14	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.42	3.20	14.14
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.14 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


DOMICILIO : C.TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

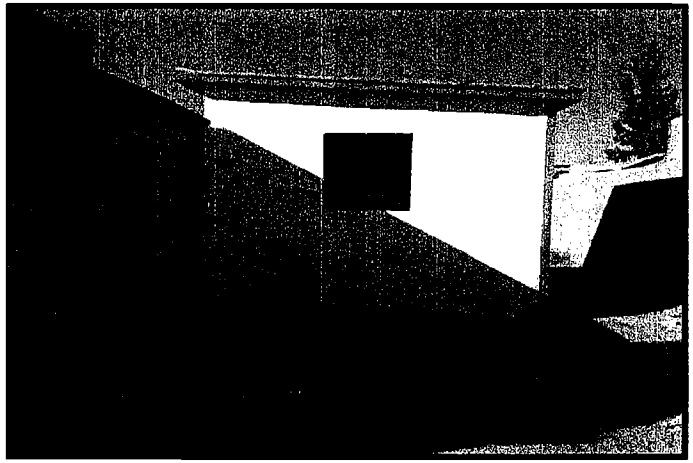

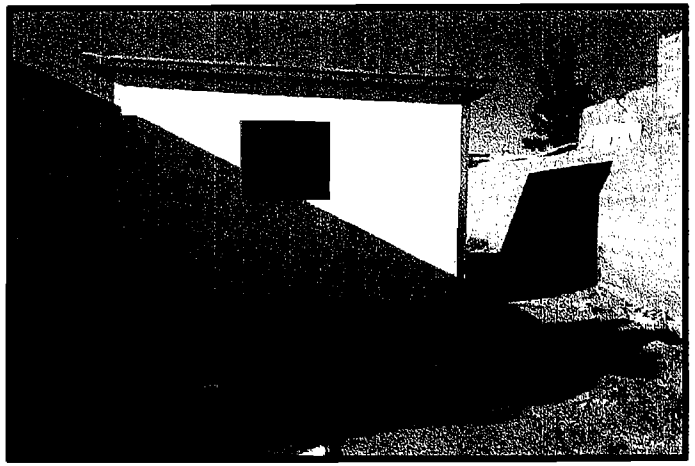

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VARGAS PEÑA GEORGINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	43.06	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.63	2.52	9.15
	2.75	2.46	6.77
	2.75	2.70	7.43
	3.63	2.52	9.15
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.90	2.63	7.63
	0.00	0.00	0.00
	2.90	2.63	7.63
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 43.06

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VARGAS PEÑA GEORGINA
DOMICILIO : C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.13	M2

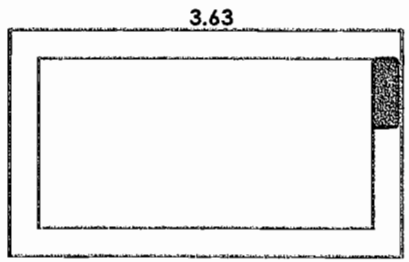

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.75	3.63	9.98
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.13 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:

BENEFICIARIO: VARGAS PEÑA GEORGINA

No. CONTRATO: 200/2016$_5$ (CINCO)

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA

TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VARGAS PEÑA GEORGINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	53.91	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.63	2.52	9.15
	2.75	2.46	6.77
	2.75	2.70	7.43
	3.63	2.52	9.15
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.90	2.63	7.63
	0.00	0.00	0.00
	2.90	2.63	7.63
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
	2.10	0.15	2.00	0.63
VENT	0.97	0.15	1.00	0.15
	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	2.90	0.20	0.58
	2.90	0.10	0.29

PINTURA TECHO =	3.63	2.75	1.00	9.98

TOTAL **53.91**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VARGAS PEÑA GEORGINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.21	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.21	2.90	12.21
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 12.21 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VARGAS PEÑA GEORGINA

DOMICILIO : C.DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.35	M2

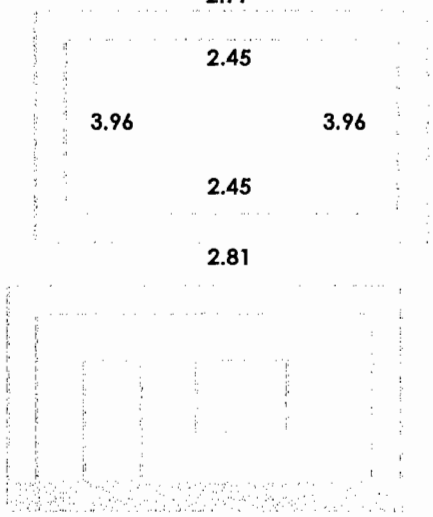

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.45	2.63	6.44
	3.96	2.54	10.06
	3.96	2.54	10.06
	2.45	2.45	6.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.77	2.96	8.20
	2.81	2.49	7.00
	4.26	2.65	11.29
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 54.35

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: **200/2016**

DOMICILIO : **C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR**

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	**Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.**	**9.85**	**M2**

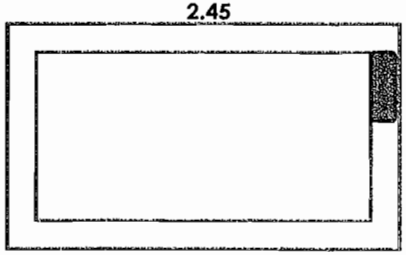

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.96	2.45	9.70
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **9.85 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:

BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA

TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	66.24	M2

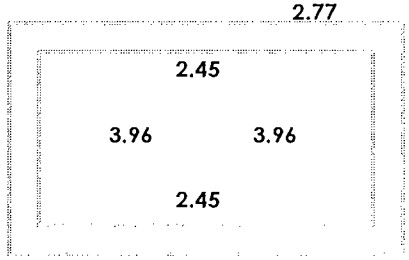


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.45	2.63	6.44
	3.96	2.54	10.06
	3.96	2.54	10.06
	2.45	2.45	6.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.77	2.96	8.20
	2.81	2.49	7.00
	4.26	2.65	11.29
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
	2.10	0.15	2.00	0.63
VENT	0.97	0.15	1.00	0.15
	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	4.43	0.20	0.89
	4.43	0.10	0.44
2	2.80	0.20	0.56
	3.00	0.10	0.30

PINTURA TECHO =	2.45	3.96	1.00	9.70

TOTAL 66.24

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.29	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.43	3.00	13.29
0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.29 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS

DOMICILIO : **C.MINA VICTORIA # 3707 COL. EL PORVENIR**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

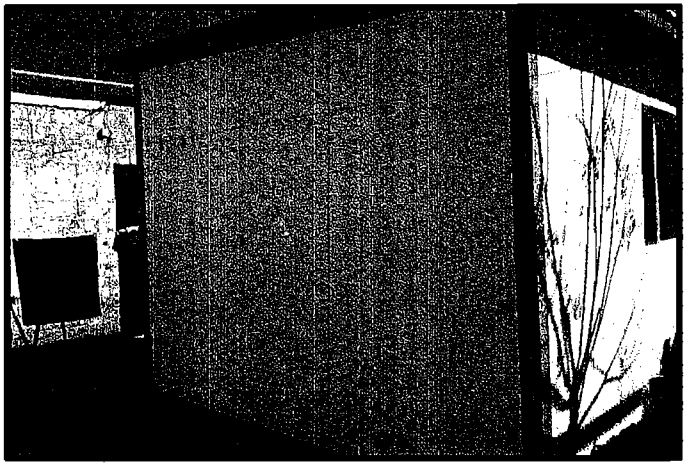

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. CHE GUEVARA 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	56.25	M2

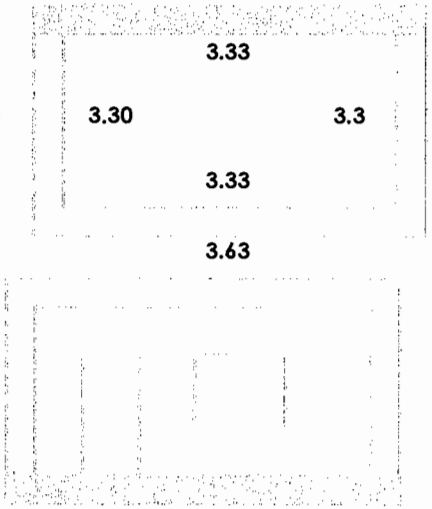

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.33	2.47	8.23
	3.30	2.55	8.42
	3.30	2.55	8.42
	3.33	2.57	8.56
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.40	2.75	9.35
	3.63	2.65	9.62
	3.40	2.75	9.35
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 56.25

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE
DOMICILIO : C. CHE GUEVARA 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.14	M2

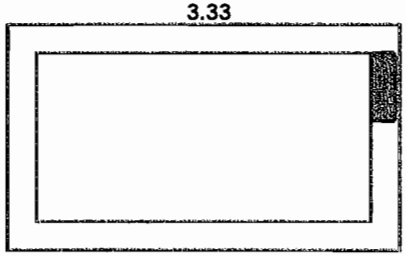

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.30	3.33	10.99
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.14 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. CHE GUEVARA 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA

TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. CHE GUEVARA 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	69.43	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
3.4	3.33	2.47	8.23
	3.30	2.55	8.42
	3.30	2.55	8.42
	3.33	2.57	8.56
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.40	2.75	9.35
	3.63	2.65	9.62
	3.40	2.75	9.35
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.33	3.30	1.00	10.99

VOLADOS

1	3.60	0.20	0.72
	3.60	0.10	0.36
2	3.63	0.20	0.73
	3.83	0.10	0.38

TOTAL 69.43

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. CHE GUEVARA 413 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.79	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.60	3.83	13.79
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.79 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE

DOMICILIO : **C. CHE GUEVARA 413 COL. 20 ANIVERSARIO**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

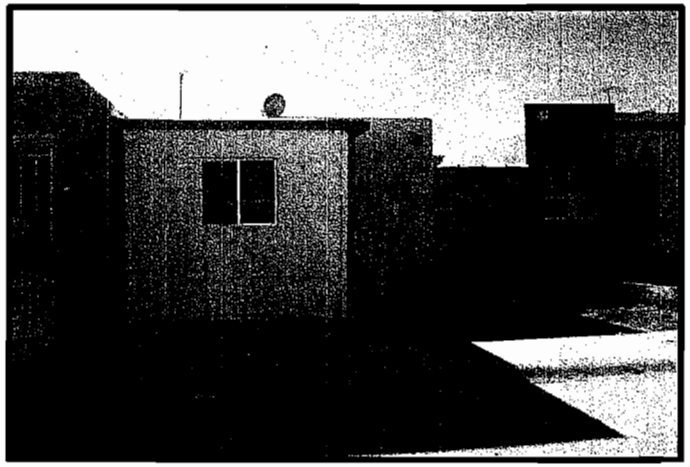

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	59.25	M2

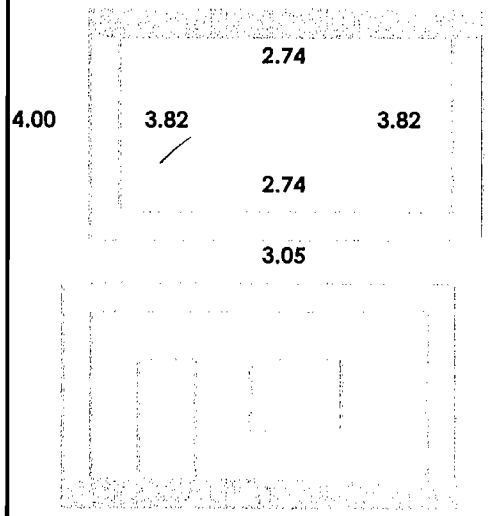

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.74	2.70	7.40
4	3.82	2.56	9.78
	3.82	2.56	9.78
	2.74	2.46	6.74
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	0.90	1.20	-1.08

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	3.00	12.00
	3.05	2.85	8.69
	4.00	2.66	10.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 59.25

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO
DOMICILIO : C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.62	M2

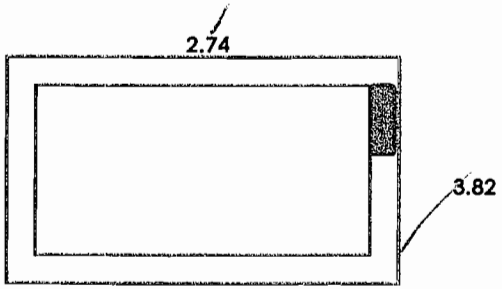

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.82	2.74	10.47
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.62 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con polducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO


DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	71.92	M2





INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
		2.74	2.70	7.40
4		3.82	2.56	9.78
		3.82	2.50	9.78
		2.74	2.46	6.74
	PTA	2.10	0.97	-2.04
	VENT.	1.00	1.00	-1.00
	MURO EXIST			
	VENT EXTRA	0.90	1.20	-1.08

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	3.00	12.00
	3.05	2.85	8.69
	4.00	2.66	10.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.32	0.20	0.86
	4.32	0.10	0.43
2	3.00	0.20	0.60
	3.20	0.10	0.32

PINTURA TECHO = 2.74 × 3.82 × 1.00 = 10.47

TOTAL 71.92

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.82	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.32	3.20	13.82
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.82 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO


DOMICILIO : **C.ANTIMONIO # 1206 COL. JUAN GUERECA**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

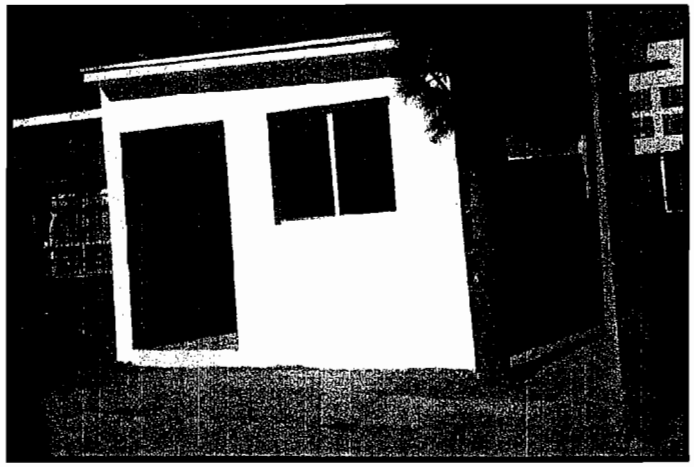

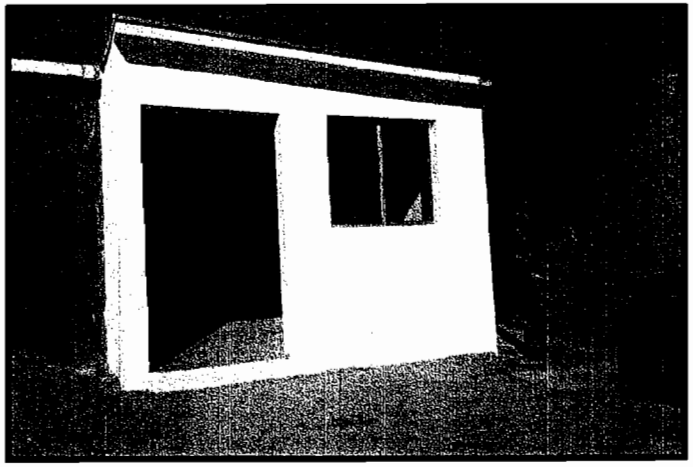

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	45.86	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.70	2.47	9.14
	2.95	2.60	7.67
	2.95	2.60	7.67
	3.70	2.67	9.88
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.00	1.40	-1.40

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.10	2.55	7.91
	4.09	2.37	9.69
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 45.86

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.07	M2

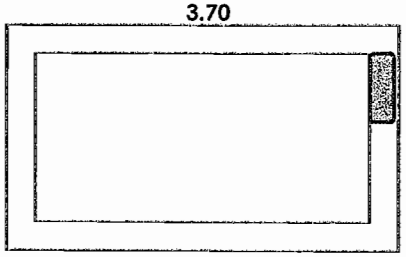

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.95	3.70	10.92
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **11.07 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	59.02	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.70	2.47	9.14
	2.95	2.60	7.67
	2.95	2.60	7.67
	3.70	2.67	9.88
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.00	1.40	-1.40

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.10	2.55	7.91
	4.09	2.37	9.69
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
	2.10	0.15	2.00	0.63
VENT	0.97	0.15	1.00	0.15
PTA EXTRA	1.00	0.15	4.00	0.60
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.29	0.20	0.86
	4.29	0.10	0.43
2	3.10	0.20	0.62
	3.30	0.10	0.33

PINTURA TECHO = 3.70 × 2.95 × 1.00 = 10.92

TOTAL 59.02

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.16	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.29	3.30	14.16
0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.16 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA


DOMICILIO : **C.CDP # 611 COL. 20 ANIVERSARIO**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

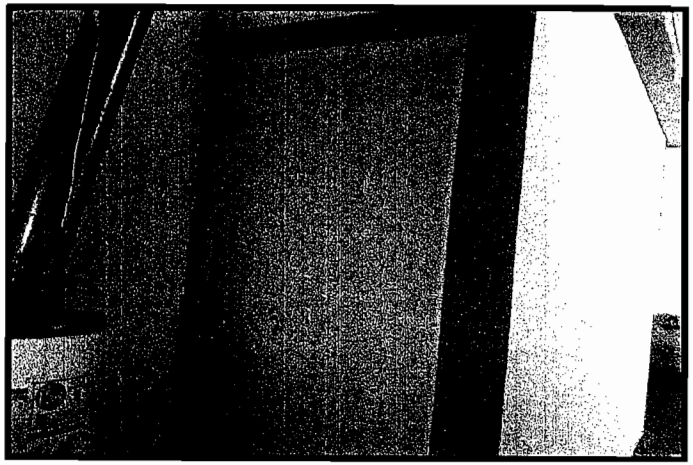

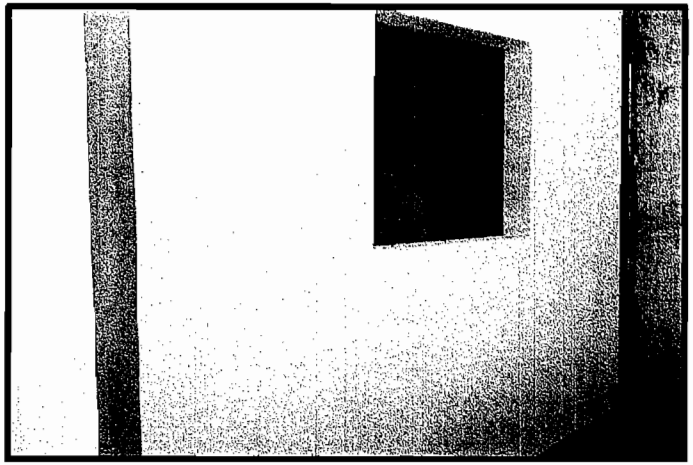

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	42.41	M2

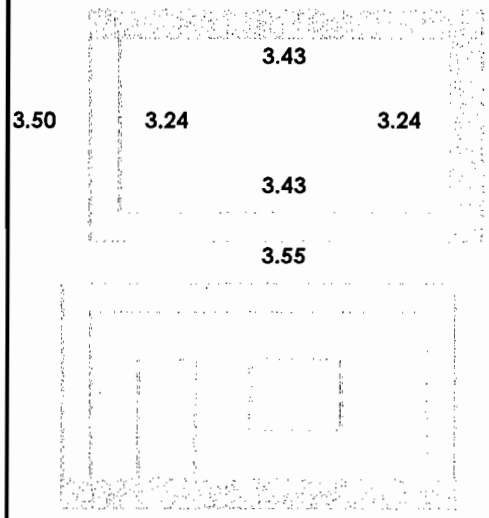

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.43	2.37	8.13
	3.24	2.47	8.00
	3.24	2.47	8.00
	3.43	2.44	8.37
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.18	1.10	-1.30
PTA EXTRA	0.90	1.90	-1.71

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.50	2.60	9.10
	3.55	2.40	8.52
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 42.41

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : **C.DIEGO LUCERO 1022 COL. 20 ANIVERSARIO**

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	**Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.**	**11.26**	**M2**

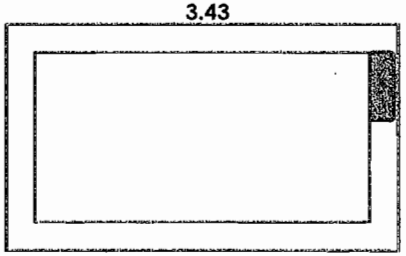

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.24	3.43	11.11
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **11.26 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	55.72	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.43	2.37	8.13
	3.24	2.47	8.00
	3.24	2.47	8.00
	3.43	2.44	8.37
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	0.90	1.90	-1.71
VENT EXTRA	1.18	1.10	-1.30

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.50	2.60	9.10
	3.55	2.40	8.52
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
	2.10	0.15	2.00	0.63
VENT	0.97	0.15	1.00	0.15
PTA EXTRA	1.00	0.15	4.00	0.60
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.75	0.20	0.75
	3.75	0.10	0.38
2	3.50	0.20	0.70
	3.70	0.10	0.37

PINTURA TECHO = 3.43 3.24 1.00 11.11

TOTAL 55.72

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DIEGO LUCERO 1022 COL. 20 ANIVERSARIO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.88	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.75	3.70	13.88
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.88 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: FRANCISCA PALMA MORENO

DOMICILIO : **C.DIEGO LUCERO 1022 COL. 20 ANIVERSARIO**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

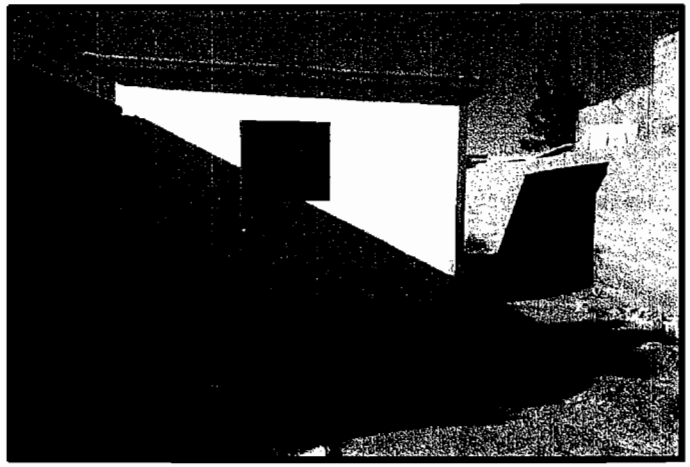

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	55.71	M2

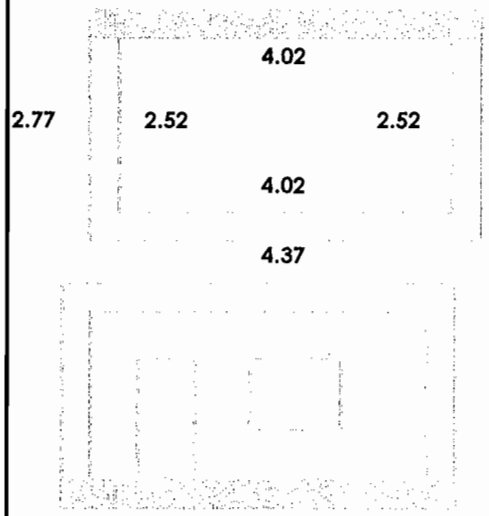

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.02	2.65	10.65
	2.52	2.58	6.50
	2.52	2.58	6.50
	4.02	2.46	9.89
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.77	2.69	7.45
	4.37	2.65	11.58
	2.80	2.80	7.84
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 55.71

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión; deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
DOMICILIO : C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.28	M2

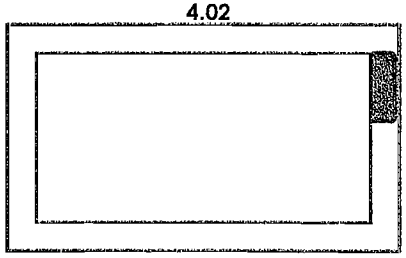

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.52	4.02	10.13
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.28 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2*, cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016 **5 (CINCO)**

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	68.04	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.02	2.65	10.65
	2.52	2.58	6.50
	2.52	2.58	6.50
	4.02	2.46	9.89
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.77	2.69	7.45
	4.37	2.65	11.58
	2.80	2.80	7.84
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
	2.10	0.15	2.00	0.63
VENT	0.97	0.15	1.00	0.15
	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	4.55	0.20	0.91
	4.55	0.10	0.46
2	2.69	0.20	0.54
	2.89	0.10	0.29

PINTURA TECHO =	4.02	2.52	1.00	10.13

TOTAL **68.04**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.15	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.55	2.89	13.15
0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.15 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ

DOMICILIO : **C.LOS ARCOS # 3933 COL. EL PORVENIR**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

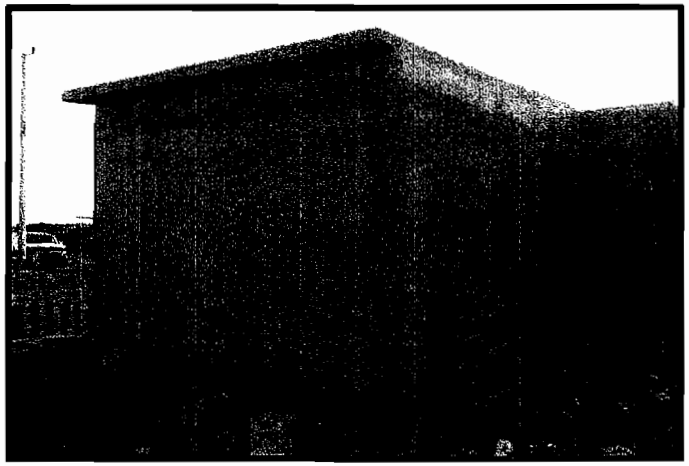

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	50.72	M2

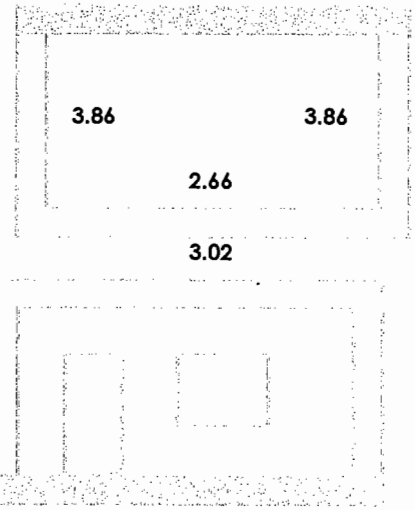

INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
4		0.00	0.00	0.00
		3.86	2.55	9.84
		3.86	2.55	9.84
		2.66	2.47	6.57
	PTA	2.10	0.97	-2.04
	VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	2.73	10.92
	3.02	2.56	7.73
	4.00	2.63	10.52
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL **50.72**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.42	M2

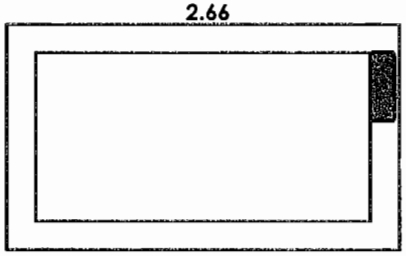

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.86	2.66	10.27
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.42 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	70.68	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.66	2.71	7.21
	3.86	2.55	9.84
	3.86	2.55	9.84
	2.66	2.47	6.57
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
VENT EXTRA	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	2.73	10.92
	3.02	2.56	7.73
	4.00	2.63	10.52
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.66	3.86	1.00	10.27

VOLADOS

1	4.23	0.20	0.85
	4.23	0.10	0.42
2	4.23	0.20	0.85
	4.23	0.10	0.42
3	3.00	0.20	0.60
	3.40	0.10	0.34

TOTAL 70.68

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.38	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.23	3.40	14.38
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.38 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO


DOMICILIO : C.RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

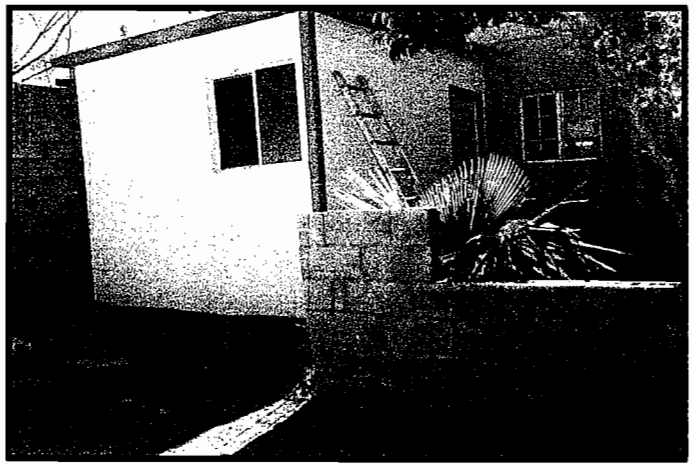

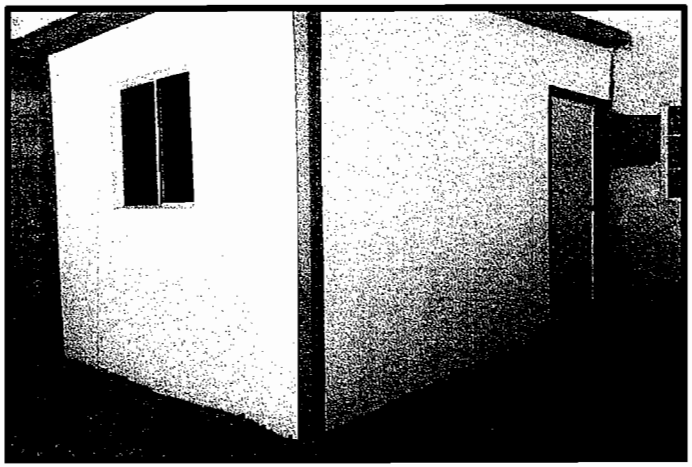

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpleza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	59.74	M2

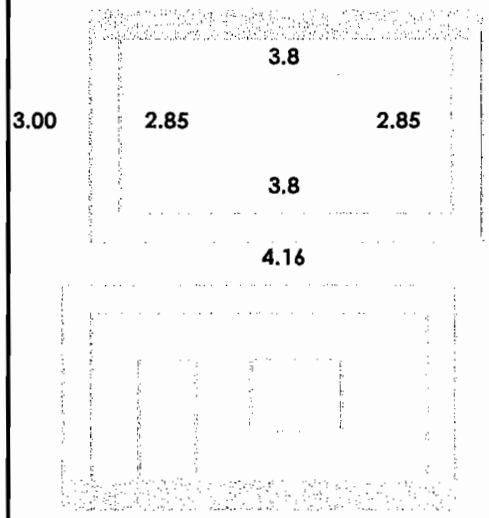

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.80	2.70	10.26
	2.85	2.60	7.41
	2.85	2.60	7.41
	3.80	2.50	9.50
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.90	8.70
	4.16	2.85	11.86
	3.00	3.10	9.30
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 59.74

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA
DOMICILIO : LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.98	M2

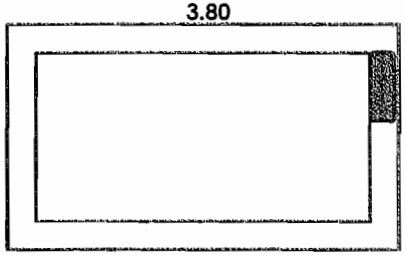

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.85	3.80	10.83
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.98 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con polidducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	73.78	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
3.00	3.80	2.70	10.26
	2.85	2.60	7.41
	2.85	2.60	7.41
	3.80	2.50	9.50
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
VENT EXTRA			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.90	8.70
	4.16	2.85	11.86
	3.00	3.10	9.30
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.80	2.85	1.00	10.83

VOLADOS

1	3.20	0.10	0.32
	3.00	0.20	0.60
2	4.56	0.20	0.91
	4.56	0.10	0.46
3	3.20	0.10	0.32
	3.00	0.20	0.60

TOTAL 73.78

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.59	M2

4.56

3.20

M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.56	3.20	14.59
0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.59 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V
M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A


14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016
PERIODO: 5 (CINCO)
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION:

BENEFICIARIO: FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA
DOMICILIO : LOTE 7 MANZANA 660 COL. GRANJAS DEL VALLE

Testigo fotografico cuarto adosado

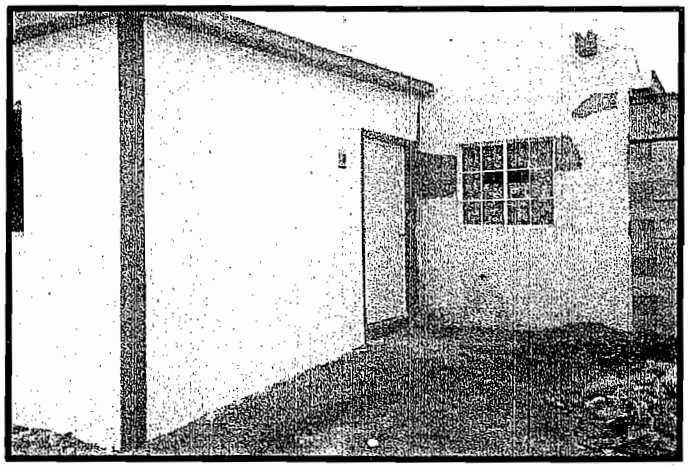

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA # 623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	60.76	M2

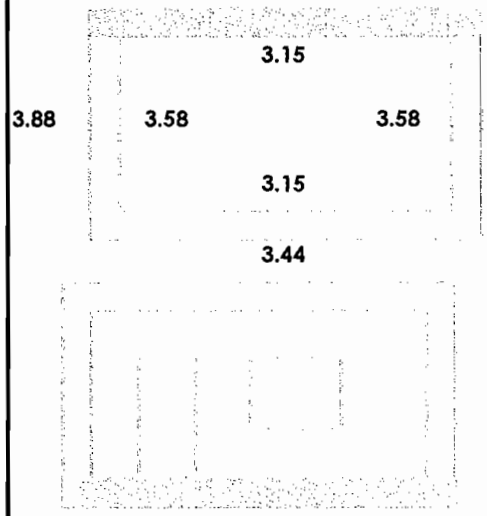

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.15	2.61	8.22
	3.58	2.50	8.95
	3.58	2.67	9.56
	3.15	2.61	8.22
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.42	1.26	-1.79

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.88	2.80	10.86
	3.44	2.85	9.80
	3.88	3.00	11.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 60.76

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:
PERIODO: 14 DE DICIEMBRE 2016
No. CONTRATO: 200/2016 08/12/2016 AL 14/12/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ
DOMICILIO : C.METALURGICA # 623 COL. JUAN GUERECA

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.43	M2

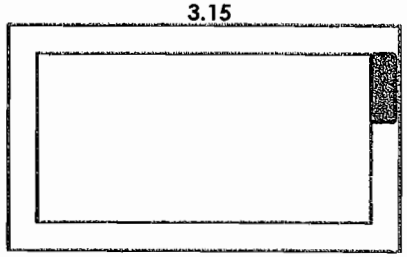

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.58	3.15	11.28
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.43 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA # 623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con polliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA # 623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	74.31	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.15	2.61	8.22
	3.58	2.50	8.95
	3.58	2.50	9.56
	3.15	2.61	8.22
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			
VENT EXTRA	1.42	1.26	-1.79

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.88	2.80	10.86
	3.44	2.85	9.80
	3.88	3.00	11.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.15	3.58	1.00	11.28

VOLADOS

1	4.06	0.20	0.81
	4.06	0.10	0.41
2	3.43	0.20	0.69
	3.63	0.10	0.36

TOTAL 74.31

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.METALURGICA # 623 COL. JUAN GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.74	M2

4.06

3.63

M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.06	3.63	14.74
0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.74 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ


DOMICILIO : **C.METALURGICA # 623 COL. JUAN GUERECA**

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

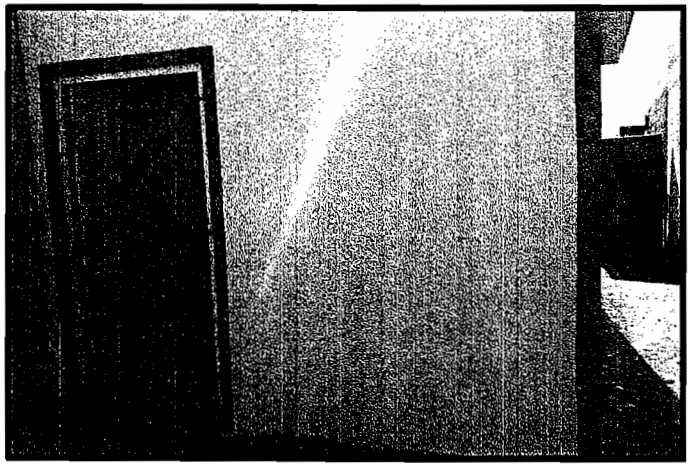

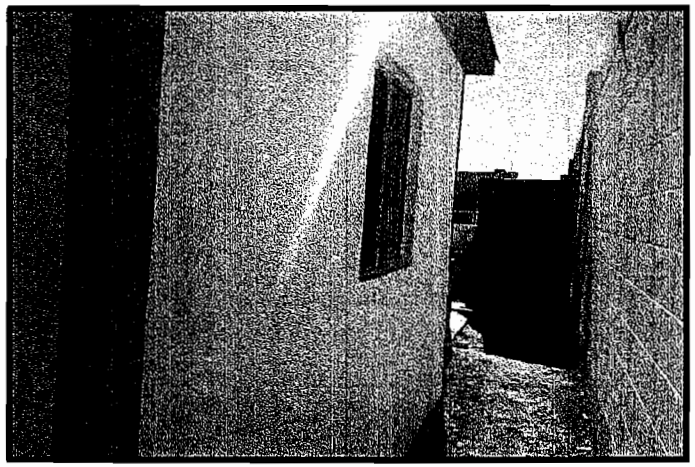

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO:


BENEFICIARIO: SALGADO CHAVIRA ISABEL


No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	45.30	M2





INTERIORES

		M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
3.2		3.43	2.50	8.58
		2.90	2.60	7.54
		2.90	2.60	7.54
	PTA	2.10	0.97	-2.04
	VENT.	1.00	1.00	-1.00
	VENT EXTRA	1.00	0.77	-0.77

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.20	2.70	8.64
	3.75	2.62	9.83
	3.20	2.70	8.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 45.30

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: SALGADO CHAVIRA ISABEL
DOMICILIO : C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.10	M2

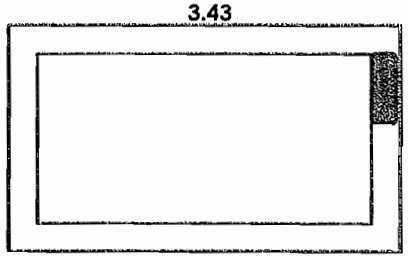

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.90	3.43	9.95
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.10 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: SALGADO CHAVIRA ISABEL

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: SALGADO CHAVIRA ISABEL

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	66.68	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
3.2	3.43	2.50	8.58
	2.90	2.60	7.54
	2.90	2.60	7.54
	3.43	2.72	9.33
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.00	0.77	-0.77

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.20	2.70	8.64
	3.75	2.62	9.83
	3.20	2.70	8.64
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
	2.10	0.15	2.00	0.63
VENT	0.97	0.15	1.00	0.15
	1.00	0.15	4.00	0.60

VOLADOS

1	3.93	0.20	0.79
	3.93	0.10	0.39
2	3.01	0.20	0.60
	3.21	0.10	0.32

PINTURA TECHO =	3.43	2.90	1.00	9.95

TOTAL 66.68

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: SALGADO CHAVIRA ISABEL

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.62	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.93	3.21	12.62
	0.00	0.00	0.00

TOTAL **12.62 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: SALGADO CHAVIRA ISABEL

DOMICILIO : **C.MINA SAN CARLO # 17540 COL. EL PORVENIR**

No. CONTRATO: **200/2016**

No. ESTIMACION: **5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

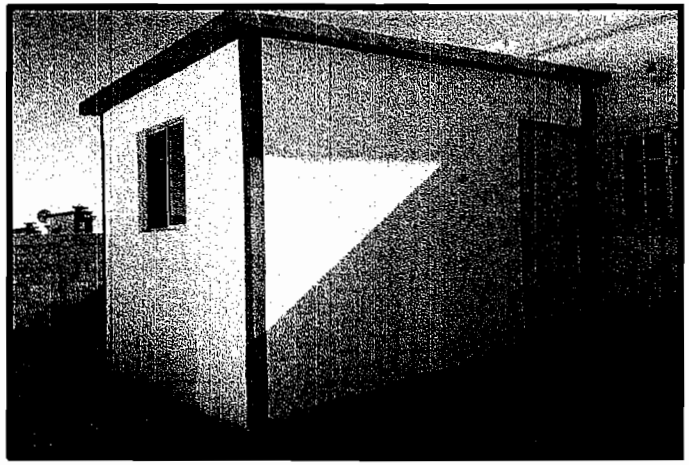

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	61.10	M2



INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.70	2.65	7.16
	3.90	2.68	10.45
	3.90	2.60	10.14
	2.70	2.65	7.16
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.12	2.87	11.82
	2.84	2.80	7.95
	4.12	2.70	11.12
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

Se aplanaron los 2 muros existentes

TOTAL 61.10

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.68	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.90	2.70	10.53
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.68 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	73.75	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.70	2.65	7.16
	3.90	2.68	10.45
	3.90	2.60	10.14
	2.70	2.65	7.16
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.12	2.87	11.82
	2.84	2.80	7.95
	4.12	2.70	11.12
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.70	3.90	1.00	10.53

VOLADOS

1	4.00	0.20	0.80
	4.00	0.10	0.40
2	3.00	0.20	0.60
	3.20	0.10	0.32

Nota: Se pintaron los 2 muros existentes.

TOTAL 73.75

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.80	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.00	3.20	12.80
0.00	0.00	0.00

TOTAL 12.80 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

DOMICILIO : C.DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

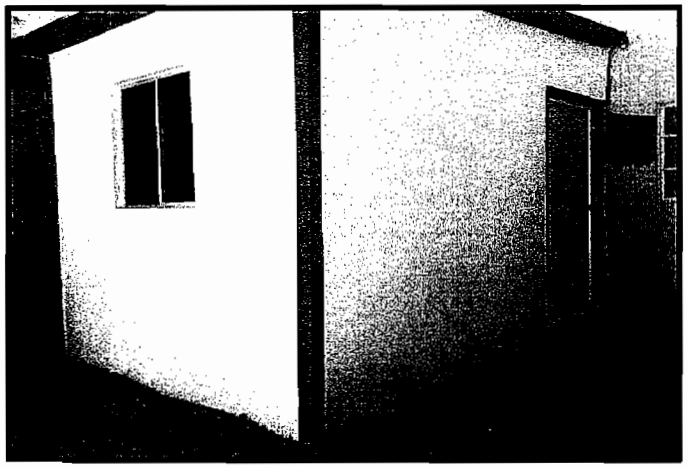

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


DOMICILIO: C.DEL YESO # 3501 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. CONTRATO: 200/2016 5 (CINCO)

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	63.01	M2

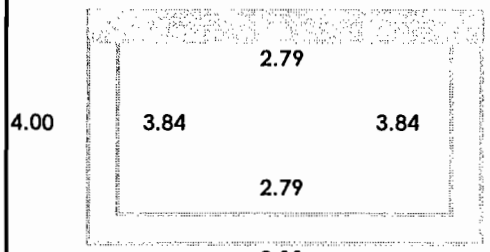



INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.79	2.60	7.25
	3.84	2.55	9.79
	3.84	2.55	9.79
	2.79	2.40	6.70
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	3.14	12.56
	3.11	3.03	9.42
	4.00	3.05	12.20
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

Nota: Se aplanó el muro existente.

TOTAL 63.01

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DEL YESO # 3501 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.86	M2

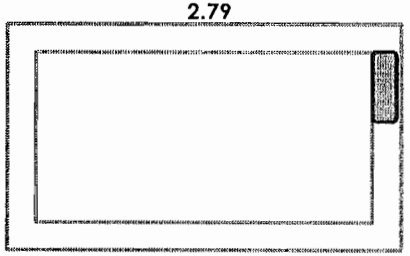

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.84	2.79	10.71
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.86 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DEL YESO # 3501 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DEL YESO # 3501 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	75.91	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.79	2.60	7.25
	3.84	2.55	9.79
	3.84	2.55	9.79
	2.79	2.40	6.70
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.00	3.14	12.56
	3.11	3.03	9.42
	4.00	3.05	12.20
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.79	3.84	1.00	10.71

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.10	0.42
2	3.03	0.20	0.61
	3.23	0.10	0.32

Nota: Se pinto el muro existente.

TOTAL 75.91

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DEL YESO # 3501 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.57	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.23	13.57
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.57 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

DOMICILIO : C.DEL YESO # 3501 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

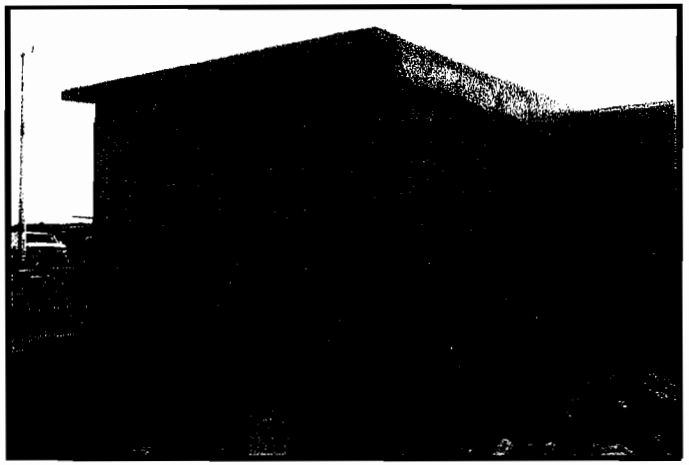

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	61.13	M2

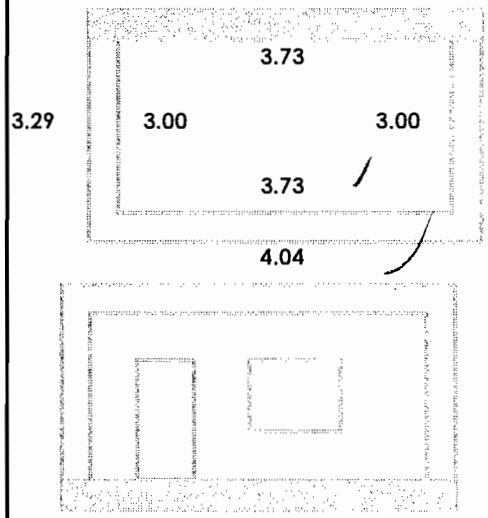

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.73	2.63	9.81
	3.00	2.73	8.19
	3.00	2.53	7.59
	3.73	2.63	9.81
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.29	2.93	9.64
	4.04	2.85	11.51
	3.29	2.82	9.28
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

Se aplano el existente.

TOTAL 61.13

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.34	M2

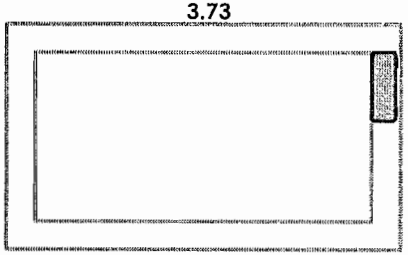

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.00	3.73	11.19
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **11.34 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2*, cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	74.60	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.73	2.63	9.81
	3.00	2.73	8.19
	3.00	2.53	7.59
	3.73	2.63	9.81
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.29	2.93	9.64
	4.04	2.85	11.51
	3.29	2.82	9.28
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.73	3.00	1.00	11.19

VOLADOS

1	4.24	0.20	0.85
	4.24	0.10	0.42
2	3.29	0.20	0.66
	3.49	0.10	0.35

Se Pintó el existente.

TOTAL 74.60

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.80	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.24	3.49	14.80
0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.80 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLERAS DEL NORTE

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

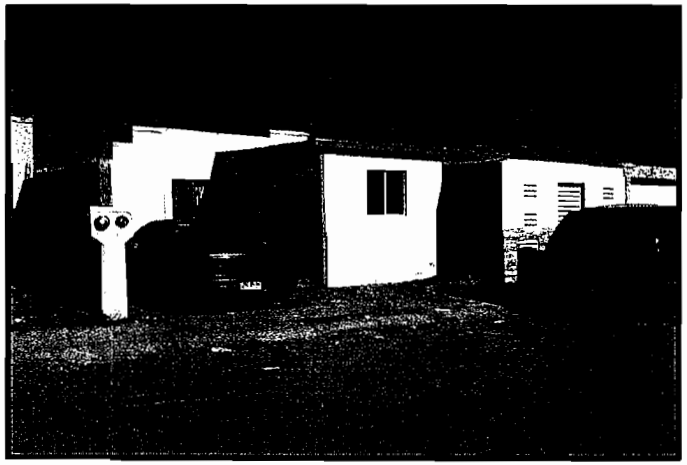

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


8ENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LLANO DEL CARRIZAL # 5812 COL. MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	67.36	M2

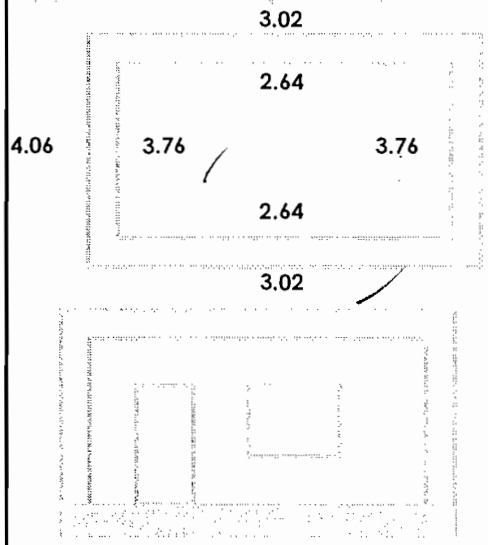

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.64	2.48	6.55
	3.76	2.52	9.48
	3.76	2.52	9.48
	2.64	2.61	6.89
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.06	2.80	11.37
	3.02	2.80	8.46
	4.06	2.80	11.37
	3.02	2.80	8.46
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

SE CONSTRUYERON LOS 4 MUROS

TOTAL 67.36

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

DOMICILIO : C.LLANO DEL CARRIZAL # 5812 COL. MEZQUITES

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.08	M2

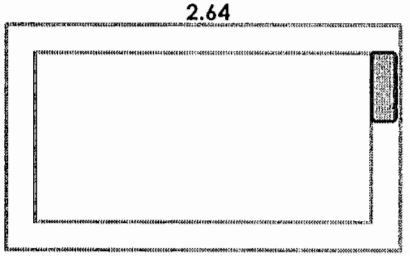

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.76	2.64	9.93
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.08 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LLANO DEL CARRIZAL # 5812 COL. MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL **1.00 SALIDA**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LLANO DEL CARRIZAL # 5812 COL. MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	79.49	M2

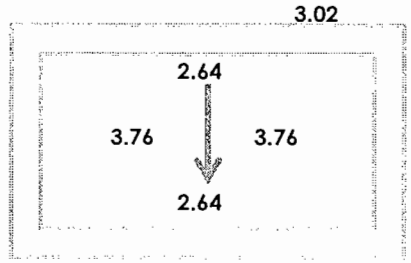


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.64	2.48	6.55
	3.76	2.52	9.48
	3.76	2.52	9.48
	2.64	2.61	6.89
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.06	2.80	11.37
	3.02	2.80	8.46
	4.06	2.80	11.37
	3.02	2.80	8.46
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.64	3.76	1.00	9.93

VOLADOS

1	4.26	0.20	0.85
	4.26	0.10	0.43
2	3.02	0.20	0.60
	3.22	0.10	0.32

Se construyeron (6) 4 muros

TOTAL 79.49

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.LLANO DEL CARRIZAL # 5812 COL. MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.72	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.26	3.22	13.72
0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.72 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

DOMICILIO : C.LLANO DEL CARRIZAL # 5812 COL. MEZQUITES

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

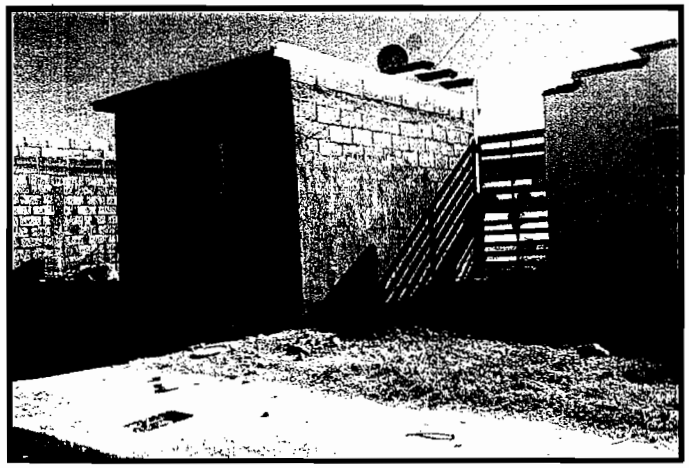

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

DOMICILIO: C.MINA ARROYO # 3743 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	44.92	M2

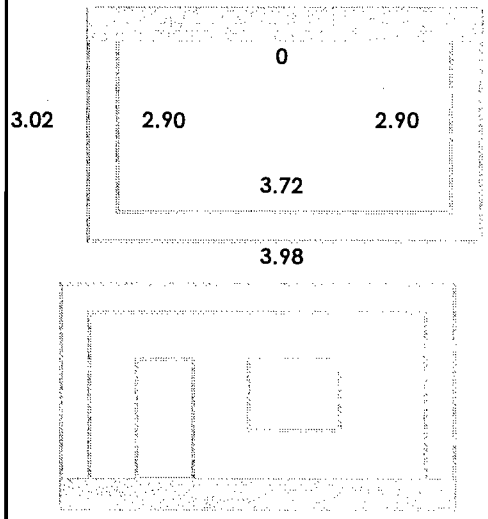

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	2.90	2.54	7.37
	2.90	2.54	7.37
	3.72	2.48	9.23
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.02	2.60	7.85
	3.98	2.50	9.95
	3.02	2.60	7.85
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 44.92

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.MINA ARROYO # 3743 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.94	M2

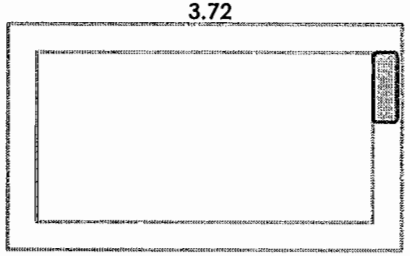

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.90	3.72	10.79
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.94 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA ARROYO # 3743 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA ARROYO # 3743 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	66.16	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.72	2.60	9.67
	2.90	2.54	7.37
	2.90	2.54	7.37
	3.72	2.48	9.23
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.00	1.40	-1.40

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.02	2.60	7.85
	3.98	2.50	9.95
	3.02	2.60	7.85
	3.02	2.80	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.72	2.90	1.00	10.79

VOLADOS

1	4.18	0.20	0.84
	4.18	0.10	0.42
2	3.02	0.20	0.60
	3.22	0.10	0.32

Se Pintó en Muro existente

TOTAL 66.16

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINA ARROYO # 3743 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.46	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.18	3.22	13.46
	0.00	0.00	0.00

TOTAL **13.46 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

DOMICILIO : C.MINA ARROYO # 3743 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

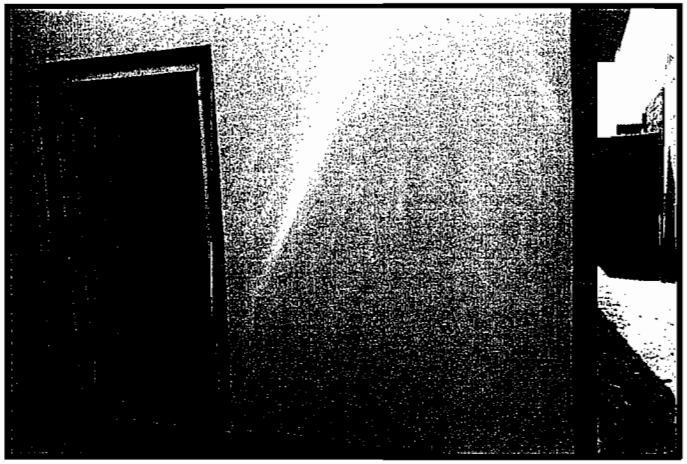

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.FELIPE ANGELEZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	45.85	M2

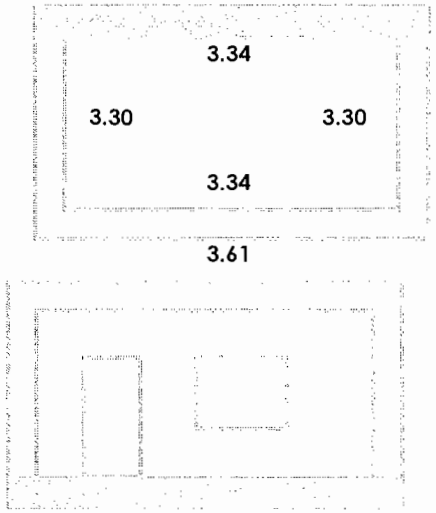

	INTERIORES M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA		EXTERIORES M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.34	2.45	8.18		3.43	2.75	9.43
	3.30	2.50	8.25		3.61	2.75	9.93
	3.30	2.43	8.02		0.00	0.00	0.00
	3.34	2.45	8.18		0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04	PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00	VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT. EXIST	1.20	1.20	-1.44				

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

SE APLANARON LOS MUROS INTERIORES EXIST.

TOTAL **45.85**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.FELIPE ANGELEZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.17	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.30	3.34	11.02
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.17 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.FELIPE ANGELEZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con polliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.FELIPE ANGELEZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	59.09	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.34	2.45	8.18
	3.30	2.50	8.25
	3.30	2.43	8.02
	3.34	2.45	8.18
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT. EXIXT	1.20	1.20	-1.44

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.43	2.75	9.43
	3.61	2.75	9.93
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.34	3.30	1.00	11.02

VOLADOS

1	3.80	0.20	0.76
	3.80	0.10	0.38
2	3.48	0.20	0.70
	3.68	0.10	0.37

Nota: Se Pintó el MURO existente.

TOTAL 59.09

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.FELIPE ANGELEZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.98	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.80	3.68	13.98
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.98 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.FELIPE ANGELEZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRAC. REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	35.85	M2

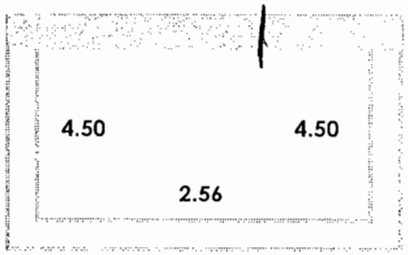

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	2.45	0.00
	4.50	2.47	11.12
	4.50	2.60	11.70
	2.56	2.55	6.53
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	4.48	2.50	11.20
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

Se colocó aplanado en 2 muros INT.

TOTAL 35.85

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRAC. REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.67	M2

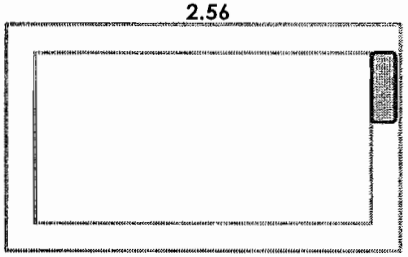

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	4.50	2.56	11.52
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.67 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRAC. REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRAC. REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	53.49	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.56	2.55	6.53
	4.50	2.47	11.12
	4.50	2.60	11.70
	2.56	2.45	6.53
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.20	1.50	-1.80

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	4.48	2.50	11.20
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	4.63	0.20	0.93
	4.63	0.10	0.46

PINTURA TECHO = 2.56 4.50 1.00 11.52

Se Pintaron todos los Muros INT.

TOTAL 53.49

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRAC. REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.17	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.63	3.06	14.17
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.17 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

DOMICILIO : C.MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRAC. REAL DE MINAS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


DOMICILIO: C.RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	37.34	M2

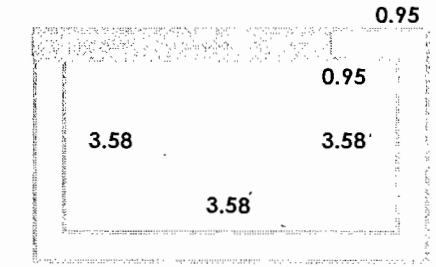



INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.95	2.54	2.41
	3.58	2.60	9.31
	3.58	2.60	9.31
	3.58	2.50	8.95
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.71	2.60	9.65
	0.95	2.54	2.41
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 37.34

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	12.97	M2



	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.58	3.58	12.82
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **12.97 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de caracter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	57.81	M2



0.95

3.71


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.58	2.60	9.31
	3.58	2.60	9.31
	3.58	2.50	8.95
	3.58	2.50	8.95
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.71	2.60	9.65
	0.95	2.54	2.41
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

MURO EXIST



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.71	0.20	0.74
	3.71	0.10	0.37

PINTURA TECHO = 3.58 3.58 1.00 12.82

SE PINTO EL MURO EXISTENTE

TOTAL 57.81

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	15.03	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.05	3.71	15.03
	0.00	0.00	0.00

TOTAL **15.03 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

No. CONTRATO: 200/2016 **5 (CINCO)**

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	51.34	M2

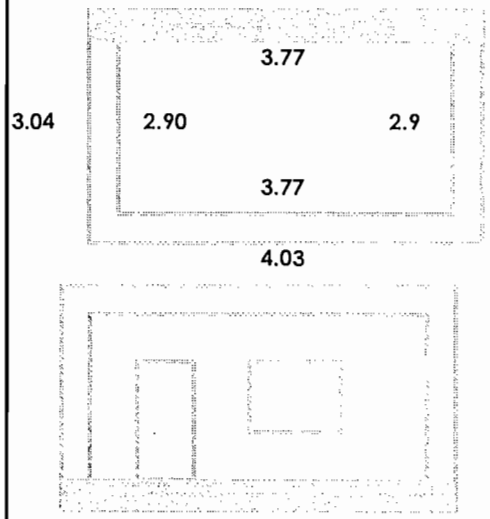

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.77	2.46	9.27
	2.90	2.40	6.96
	2.90	2.40	6.96
	3.77	2.34	8.82
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.40	1.00	-1.40

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.04	2.50	7.60
	4.03	2.50	10.08
	3.04	2.55	7.75
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

SE APLANAO MURO EXISTENTE

TOTAL **51.34**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.08	M2

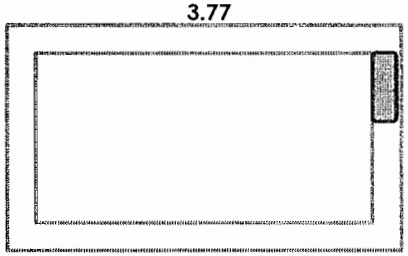

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.90	3.77	10.93
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 11.08 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2*, cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	63.48	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.77	2.46	9.27
	2.90	2.40	6.96
	2.90	2.36	6.96
	3.77	2.34	8.82
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.40	1.00	-1.40

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.04	2.50	7.60
	4.03	2.50	10.08
	3.04	2.55	7.75
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.77	2.90	1.00	10.93

VOLADOS

1	4.03	0.20	0.81
	4.03	0.10	0.40

Se Pinto el muro existente.

TOTAL **63.48**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyectó de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.06	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.03	3.24	13.06
0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.06 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

DOMICILIO : C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

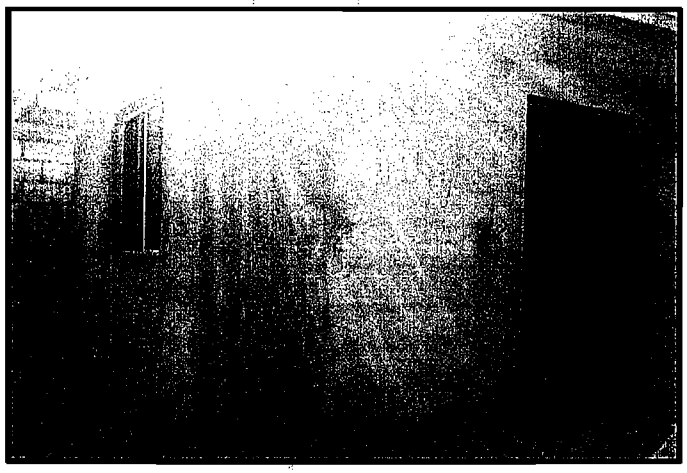

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	44.64	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	2.85	2.37	6.75
	2.85	2.44	6.95
	3.70	2.40	8.88
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.70	8.10
	4.00	2.70	10.80
	3.00	2.62	7.86
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL **44.64**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.70	M2

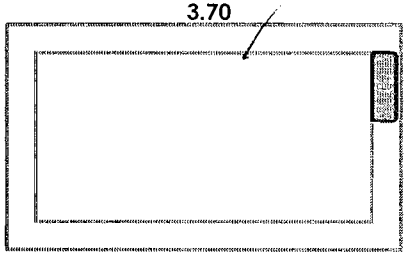

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.85	3.70	10.55
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.70 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	61.84	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.70	2.40	8.88
	2.85	2.37	6.75
	2.85	2.44	6.95
	3.70	2.40	8.88
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.50	1.60	-2.40
PTA EXTRA	0.97	2.07	-2.01

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.00	2.70	8.10
	4.00	2.70	10.80
	3.00	2.62	7.86
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.70	2.85	1.00	10.55

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.10	0.42
	3.00	0.20	0.60
	3.20	0.10	0.32

Se pintó el muro existente

TOTAL 61.84

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.44	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.20	13.44
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.44 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

DOMICILIO : C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

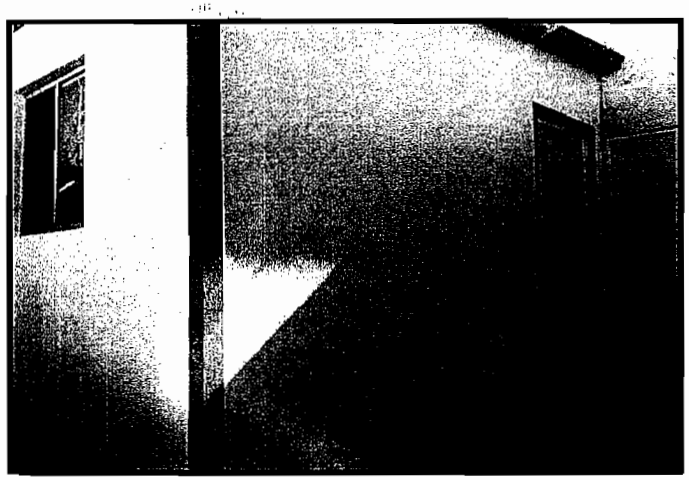

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

14 DE DICIEMBRE 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 08/12/2016 AL 14/12/2016

PERIODO: 5 (CINCO)


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. PVD DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	57.49	M2

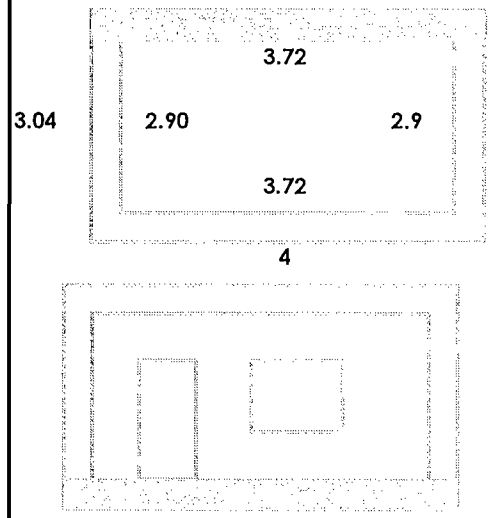

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.72	2.55	9.49
	2.90	2.44	7.08
	2.90	2.65	7.69
	3.72	2.55	9.49
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.03	0.90	-1.83

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.04	3.08	9.36
	4.00	2.97	11.88
	3.04	2.97	9.03
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

Se Ensamo el Muro Existente

TOTAL 57.49

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. PVD DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.94	M2

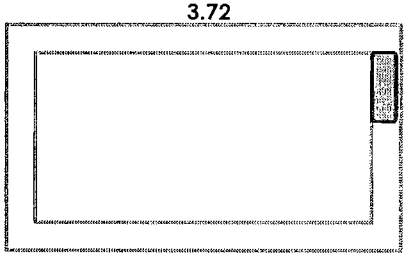

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.90	3.72	10.79
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.94 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. PVD DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. PVD DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	70.47	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.72	2.55	9.49
	2.90	2.44	7.08
	2.90	2.65	7.69
	3.72	2.55	9.49
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
PTA EXTRA	2.03	0.90	-1.83

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.04	3.08	9.36
	4.00	2.97	11.88
	3.04	2.97	9.03
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.72	2.90	1.00	10.79

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.10	0.42
2	3.04	0.20	0.61
	3.24	0.10	0.32

SE PINTÓ EL MURO EXISTENTE **TOTAL** **70.47**

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. PVD DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.61	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.20	3.24	13.61
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.61 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. PVD DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

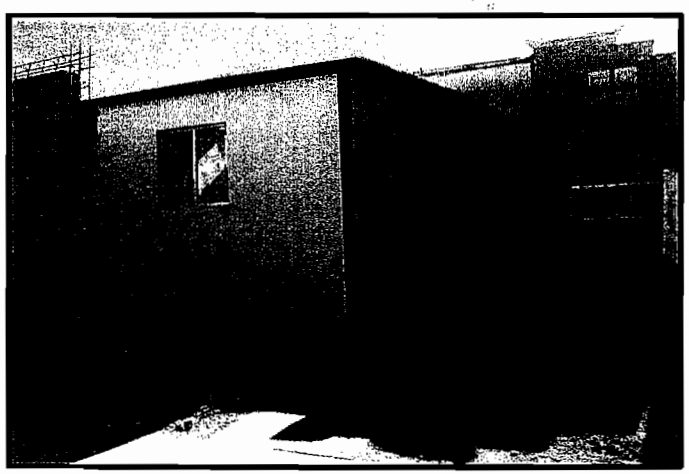

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	53.76	M2

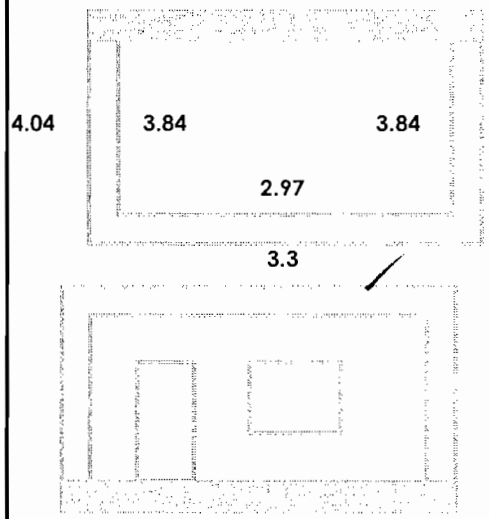

INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.84	2.55	9.79
	3.84	2.55	9.79
	2.97	2.49	7.40
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.04	2.90	11.72
	3.30	2.73	9.01
	3.84	2.80	10.75
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 53.76

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

DOMICILIO : C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.55	M2

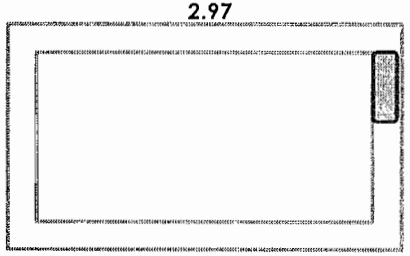

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.84	2.97	11.40
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **11.55 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2*, cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	73.03	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.97	2.49	7.40
	3.84	2.55	9.79
	3.84	2.55	9.79
	2.97	2.60	7.40
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXTRA	1.20	1.45	-1.74

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.04	2.90	11.72
	3.30	2.73	9.01
	3.84	2.80	10.75
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.97	3.84	1.00	11.40

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.10	0.42
2	3.10	0.20	0.62
	3.30	0.10	0.33

Se Pintó el Muro existente.

TOTAL 73.03

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.86	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.20	3.30	13.86
0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.86 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ALICIA CELIS JUAREZ

DOMICILIO : C.RIO EBRO # 2202 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

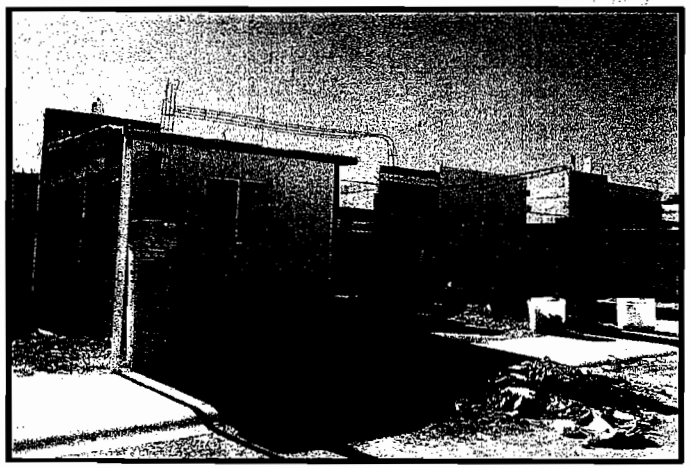

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA


DOMICILIO: PRIV. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR Priv. desierto Sonora

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	36.68	M2

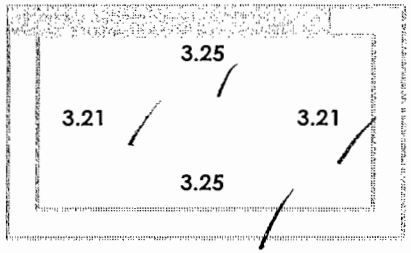



INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.25	2.28	7.41
	3.21	2.40	7.70
	3.21	2.40	7.70
	3.25	2.52	8.19
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.90	2.45	2.21
	0.00	0.00	0.00
	3.49	2.34	8.17
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

Se aplanaron los muros existentes interiores

TOTAL 36.68

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

DOMICILIO: PRIV. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR Priv. de desierto Sonor.

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.58	M2

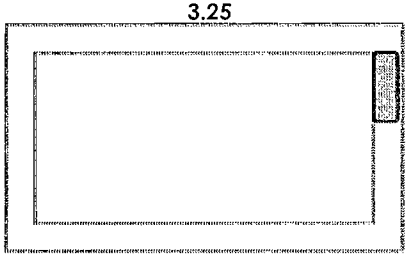

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.21	3.25	10.43
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL 10.58 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR Prol. desierto Sonora.

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión no es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR Priv.

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	48.15	M2



0.9

3.49


INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.25	2.28	7.41
	3.21	2.40	7.70
	3.21	2.40	7.70
	3.25	2.52	8.19
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

MURO EXIST

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.90	2.45	2.21
	0.00	0.00	0.00
	3.49	2.34	8.17
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

VOLADOS

1	3.45	0.20	0.69
	3.45	0.10	0.35

PINTURA TECHO = 3.25 3.21 1.00 10.43

Nota: Se pintaron los muros existentes.

TOTAL 48.15

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

DOMICILIO: C.DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR Prol. desierto Sonora

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	12.94	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	3.75	3.45	12.94
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 12.94 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA


DOMICILIO : C.DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR Prv. Desierto Sonora.

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

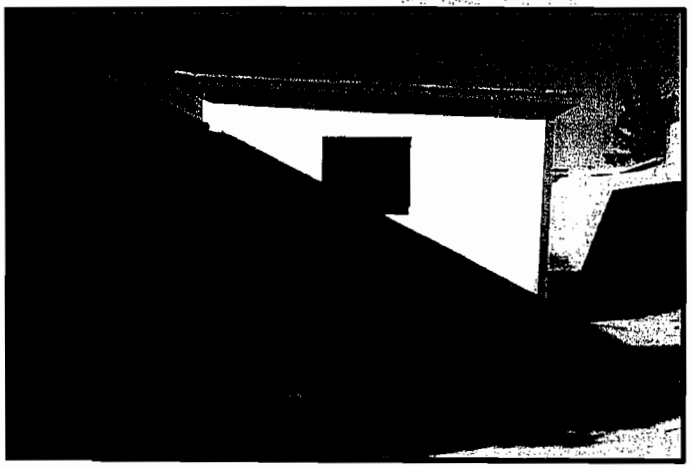

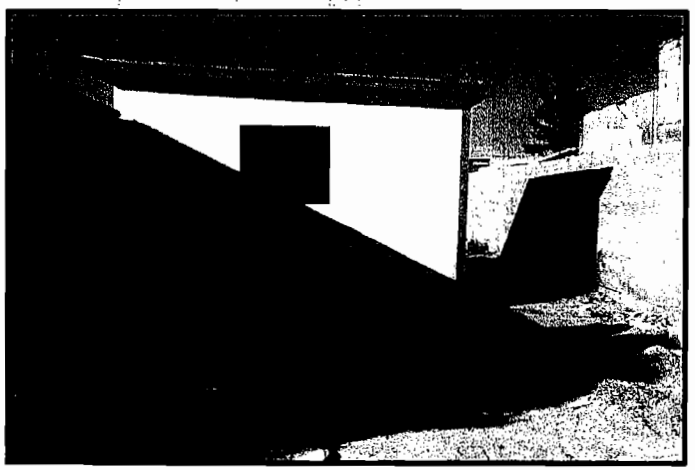

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ


DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	54.39	M2

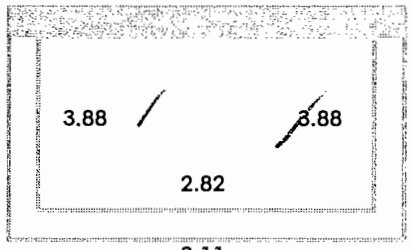



INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.88	2.46	9.54
	3.88	2.56	9.93
	2.82	2.51	7.08
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.09	2.80	11.45
	3.11	2.90	9.02
	4.09	2.95	12.07
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 54.39

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.09	M2

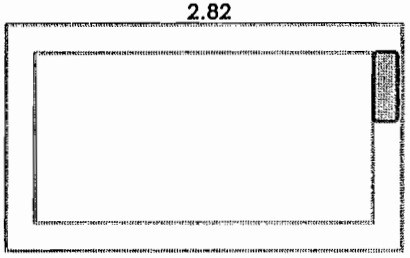

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	3.88	2.82	10.94
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **11.09 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	67.54	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
4.09	3.88	2.46	9.54
	3.88	2.56	9.93
	2.82	2.51	7.08
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
MURO EXIST			

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	4.09	2.80	11.45
	3.11	2.90	9.02
	4.09	2.95	12.07
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.82	3.88	1.00	10.94

VOLADOS

1	4.20	0.20	0.84
	4.20	0.10	0.42
2	3.10	0.20	0.62
	3.30	0.10	0.33

TOTAL 67.54

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	13.86	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
4.20	3.30	13.86
0.00	0.00	0.00

TOTAL 13.86 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CARLOS GUSTAVO CHAVIRA GOMEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO GUADIANA # 1810 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

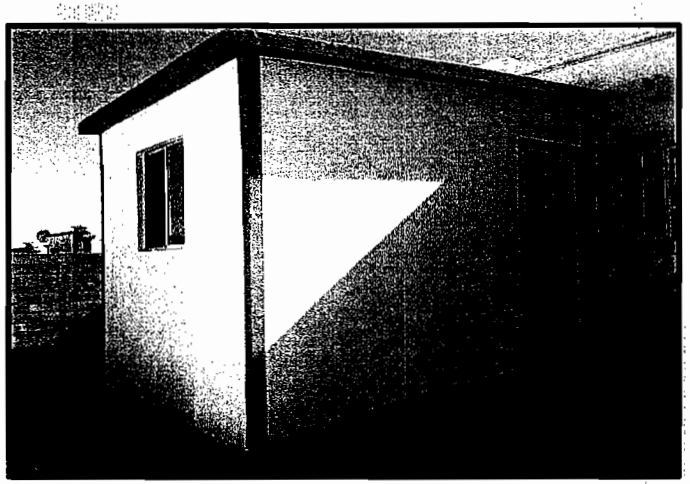

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO


DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	32.22	M2





INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	4.00	2.67	10.68
	2.00	2.47	4.94
	2.85	2.61	7.44
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.19	2.70	8.61
	2.10	2.50	5.25
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 32.22

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11.55	M2

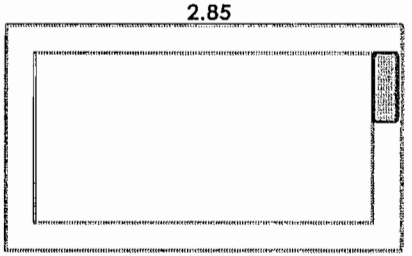

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	4.00	2.85	11.40
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **11.55 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	49.38	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	2.85	2.61	7.44
	4.00	2.67	10.68
	4.00	2.47	4.94
	2.85	2.61	7.44
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00
VENT EXISTENTE	1.20	1.20	-1.44
PTA EXISTENTE	0.93	2.05	-1.91

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	3.19	2.70	8.61
	2.10	2.50	5.25
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	2.85	4.00	1.00	11.40

VOLADOS

1	3.38	0.20	0.68
	3.38	0.10	0.34
2	2.10	0.20	0.42
	2.30	0.10	0.23

Se Pinta el muro Existente (2)

TOTAL 49.38

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	14.77	M2



	M	M	M2
	Largo	Ancho	Área
	4.37	3.38	14.77
	0.00	0.00	0.00

TOTAL 14.77 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

DOMICILIO : C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

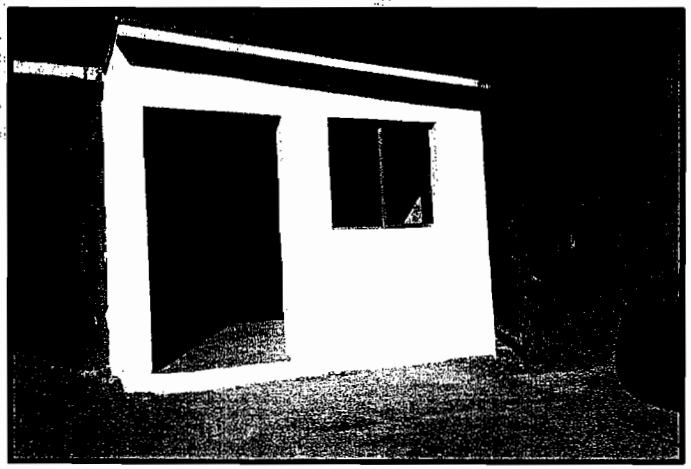

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5.(CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.2	Aplanado en muro a plomo y regla, acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 1.5 cm de maximo espesor. Incluiye agua en pipa para humedecer superficie con una altura hasta 3 metros, mano de obra, andamiaje, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	38.22	M2

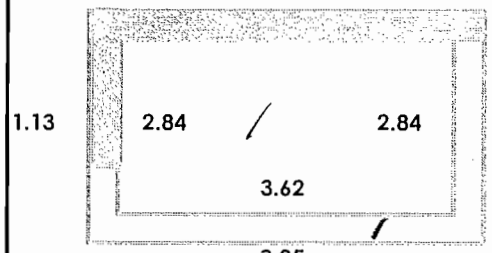



INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	0.00	0.00	0.00
	2.84	2.45	6.96
	2.84	2.45	6.96
	3.62	2.37	8.58
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	1.13	2.65	2.99
	3.95	2.50	9.88
	3.02	2.50	7.55
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60

TOTAL 38.22

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

DOMICILIO : C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.6	Construccion de piso firme de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc = 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabo pulido con llana metalica. Incluye, preparacion de la superficie, arena limpia, grava de la region T.M.A 3/4, nivelacion, relleno con material mejoprado y/o producto de excavacion, apisonado, cimbrado, decimbradocolado, curado con agua, acarreo de materiales hasta el lugar de la ejecucion de la obra, mano de obra herramienta, equipo, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10.43	M2

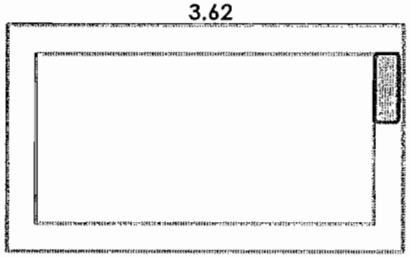

	M LARGO	M ANCHO	M2 AREA
	2.84	3.62	10.28
PUERTA	0.97	0.15	0.15

TOTAL **10.43 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
4.1	Instalacion electrica en cuarto comprende el suministro y colocacion de lampara incandesente (foco) en muro, un apagador sencillo, 2 contactos sencillos, ramaleo con poliducto color naranja de 1/2", cableado con alambre de cobre calibra 12 AWG aislado con THW anti flama. Incluye: acarreo de materiales desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta , limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	SALIDA



TOTAL 1.00 SALIDA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.1	Pintura colores basicos para superficie nueva en aplanado pulido fino en muros interiores y exteriores. Incluye: preparacion de la superficie con sellador vinilico clasico, aplicación a dos manos hasta 3 m de altura, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	60.01	M2




INTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	3.62	2.53	9.16
	2.84	2.45	6.96
	2.84	2.45	6.96
	3.62	2.37	8.58
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00

EXTERIORES

	M LARGO	M ALTO	M2 ÁREA
	1.13	2.65	2.99
	3.95	2.50	9.88
	3.02	2.50	7.55
PTA	2.10	0.97	-2.04
VENT.	1.00	1.00	-1.00



DETALLES PUERTA Y VENTANA

	LARGO	ANCHO	PZAS	ÁREA
PTA	2.10	0.15	2.00	0.63
	0.97	0.15	1.00	0.15
VENT	1.00	0.15	4.00	0.60
PTA EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA TECHO =	3.62	2.84	1.00	10.28

VOLADOS

1	3.95	0.20	0.79
	3.95	0.10	0.40
2	2.83	0.20	0.57
	3.03	0.10	0.30
3	0.90	0.20	0.18
	1.10	0.10	0.11

Se Pinto el muro existente.

TOTAL 60.01

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
5.2	Impermeabilizacion en azotea con emulsion elastomerica base agua, antireflejante color terracota con resinas acrilicas comprende la limpieza de losa, sellado de fisuras, humedecido y colocacion de impermeabilizante a 2 manos, incluye desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje y limpieza	11.97	M2



M	M	M2
Largo	Ancho	Área
3.95	3.03	11.97
0.00	0.00	0.00

TOTAL **11.97 M2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CLAUDIA NATIVIDAD RODRIGUEZ ACEVEZ

DOMICILIO : C.RIO ODRA # 1625 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

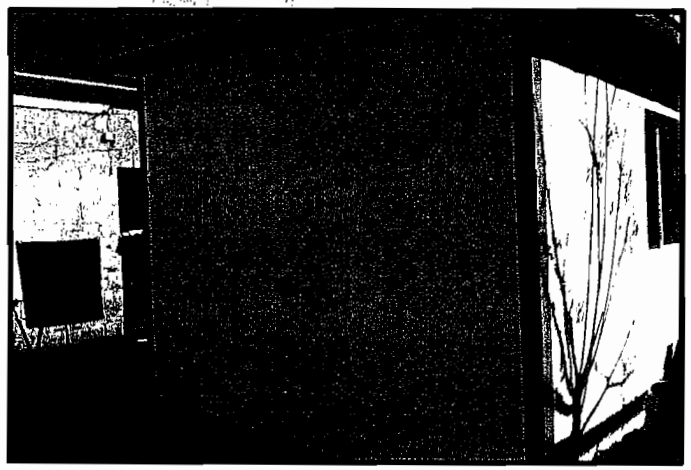

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

	ESTIMACION 5 CUARTOS ADOSADOS ZONA 1 PERIODO : 08/12/2016 AL 14/12/2016			EXCAVACION	RELLENO	RODAPIE	PLANTILLA	ZAPATA	ACERO
				EXT.03	EXT.04	EXT.05	EXT.06	EXT. 07	EXT.08
	BENEFICIARIO	DIRECCION	COLONIA	M3	M3	M2	M3	M3	KG
1	RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q	DESIERTO DE SONORA # 3321	EL PORVENIR	1.88	0.97	2.66	0.13	0.38	17.14
2	CESAR LARA SILORO	C. DEL YESO #3501	LADRILLERAS DEL NORTE	3.20	1.70	4.28	0.22	0.64	28.86
3	MARISELA LOPEZ GUTIERREZ	C. DEL ADOBE #3506	LADRILLERAS DEL NORTE	3.00	1.58	4.08	0.20	0.61	27.22
4	MARIA SOCORRO ORTIZ CERVANTES	C. LLANO DEL CARRIZAL #5812	LOS MEZQUITES	4.28	2.34	5.44	0.28	0.84	38.18
5	REYES RIVAS RORIGUEZ	C. MIN ARROYO #3743	EL PORVENIR	2.76	1.44	3.83	0.18	0.57	25.2
6	VENTURA CARO MONJE	C. FELIPE ANGELEZ #28	NOMBRE DE DIOS	2.83	1.46	4.01	0.19	0.58	25.98
7	LORIBELLA PAREDES RUIZ	C. MINERLA DEL VALLECILLO #15516	REAL DE MINAS	1.24	0.65	1.76	0.08	0.25	11.36
8	IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON	C. RIO ARNO # 2024	RIVERAS DE SACRAMENTO	1.88	0.86	3.20	0.14	0.40	17.54
9	BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS	C. HACIENDA DE CANADA #16900	AMP. NUEVO TRIUNFO	2.80	1.47	3.87	0.18	0.57	25.51
10	LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA	C. MARTIRES DE CHICAGO #611	TIERRA Y LIBERTAD	2.77	1.45	3.81	0.18	0.57	25.13
11	PAULA SIGALA	C. PVD DESIERTO DE SONORA #3311	EL PORVENIR	2.79	1.46	3.85	0.18	0.57	25.41
12	HEREDIA TERRAZAS DOLORES	C. TUPAMAROS #207	VICENTE GUERECA	3.17	1.67	4.25	0.22	0.64	28.62
13	MARIA ROSARIO GARCI A CARRANZA	PVD DESIERTO DE SONORA # 3502	EL PORVENIR	2.67	1.35	4.05	0.19	0.52	23.59
14	SAENZ ARENALES ANREA	C. OSCAR SOTOMANEZ # 16711	SOLIDARIDAD POPULAR	4.02	2.14	5.36	0.28	0.80	36.22
15	GEORGINA VARGAS PEÑA	C. DESIERTO DE MOJAVE # 3526	EL PORVENIR	1.17	0.50	1.29	0.12	0.36	15.76
16	RUIS GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO	C.RIO SAN FRANCISCO # 25917	RIVERAS DE SACRAMENTO	3.16	1.67	4.25	0.22	0.63	28.63
17	MARIA ISABEL NORIEGA	C. RIO AMUUR #2225	RIVERAS DE SACRAMENTO	1.12	0.57	1.63	0.08	0.23	10.28
18	CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ	C. RIO SALADO # 1609	RIVERAS DE SACRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15
19	MARINA SANDOVAL TARANGO	C. RIO OBI #2009	RIVERAS DE SACRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65
20	NORMA VENEGAS MUÑOZ	C. RIO AMARILLO #1609	RIVERAS DE SACRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
21	ESTHER PEÑA SOTO	C. RIO RINH # 2427	RIVERAS DE SACRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.28
			SUBTOTAL 1	**44.74**	**23.28**	**61.62**	**3.07**	**9.16**	**505.20**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

ROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	1.88	m3

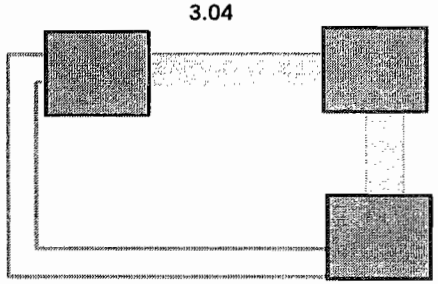

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.04	0.60	0.65	1.19
2	1.76	0.60	0.65	0.69
3	0.00	0.60	0.65	0.00

TOTAL **1.88 m3**

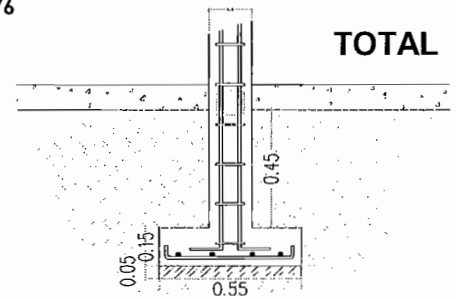

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.13	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

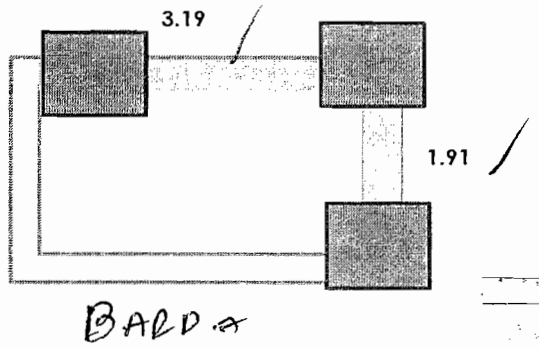

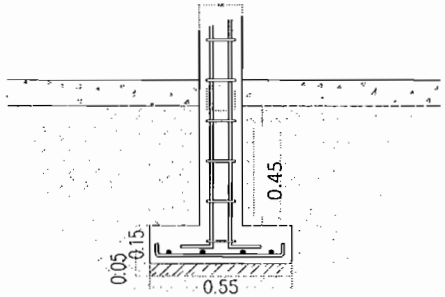

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.19	0.50	0.05	0.08
2	1.91	0.50	0.05	0.05
3	0.00	0.50	0.05	0.00

TOTAL 0.13 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q.


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.38	m3

ZAPATA CORRIDA

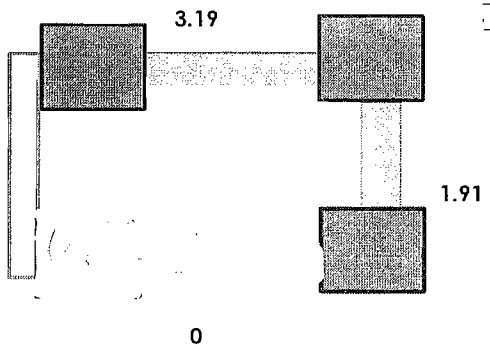

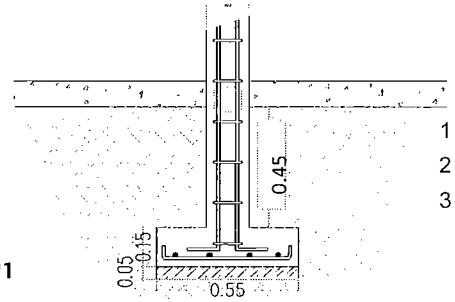

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.19	0.50	0.15	0.24
2	1.91	0.50	0.15	0.14
3	0.00	0.50	0.15	0.00

TOTAL 0.38 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	17.14	kg

ZAPATA CORRIDA

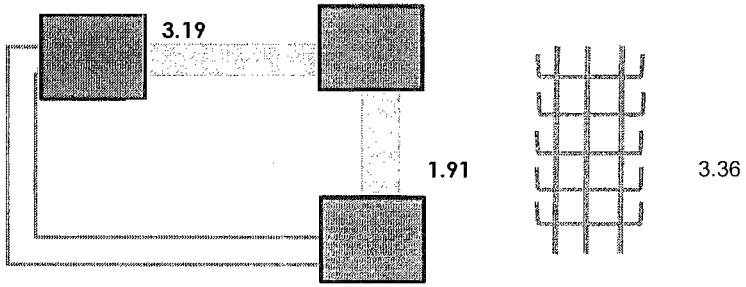

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

Kg/m

	M LARGO	factor	peso kg
1	3.19	3.36	10.72
2	1.91	3.36	6.42
3	0.00	3.36	0.00

TOTAL **17.14 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	2.66	m2

MURO EXIST.



BARDA



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.80	0.42	1.60
2	2.52	0.42	1.06
3	0.00	0.42	0.00

TOTAL **2.66 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.97	m3



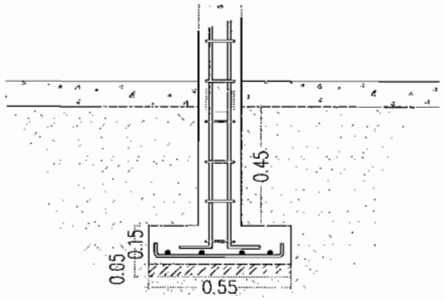

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			1.88
vol zapata			-0.38
vol plantilla			-0.13
vol rodapie	2.66	.15	-0.40

TOTAL **0.97 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RAMONA MARGARITA VALENZUELA Q,

DOMICILIO : C. DESIERTO DE SONORA # 3321 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	3.20	m3

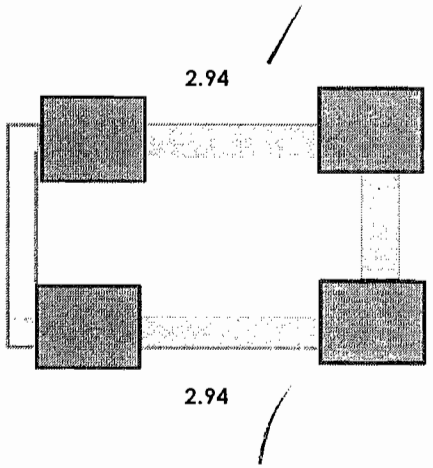

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.94	0.60	0.65	1.15
2	2.31	0.60	0.65	0.90
3	2.94	0.60	0.65	1.15

TOTAL 3.20 m3

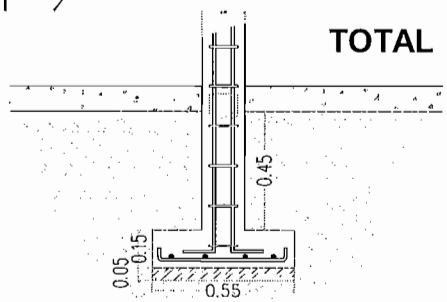

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.22	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

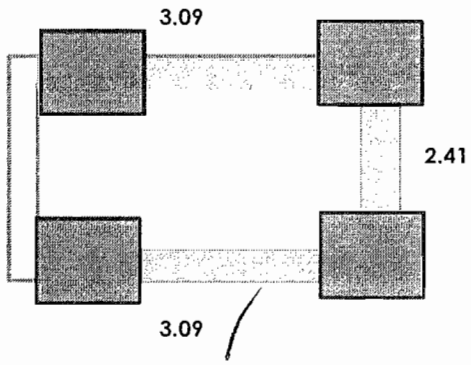

MURO EXIST.

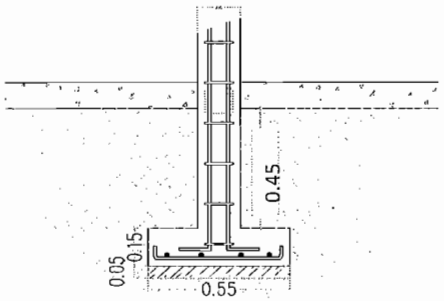

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.09	0.50	0.05	0.08
2	2.41	0.50	0.05	0.06
3	3.09	0.50	0.05	0.08

TOTAL **0.22** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.64	m3

ZAPATA CORRIDA

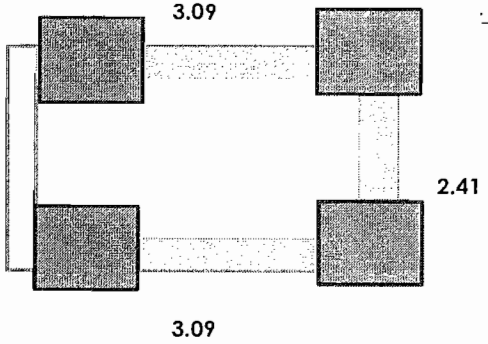

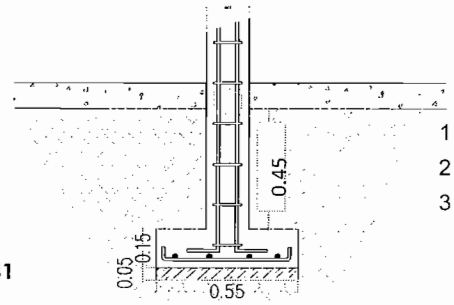

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.09	0.50	0.15	0.23
2	2.41	0.50	0.15	0.18
3	3.09	0.50	0.15	0.23

TOTAL **0.64 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	28.86	kg

ZAPATA CORRIDA

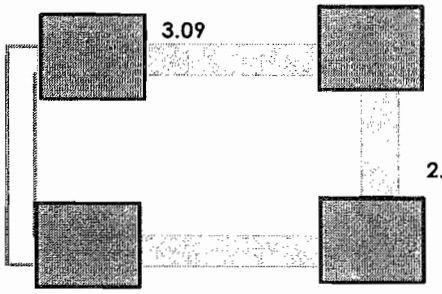



3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	factor	peso kg
1	3.09	3.36	10.38
2	2.41	3.36	8.10
3	3.09	3.36	10.38

TOTAL **28.86 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.28	m2

MURO EXIST.

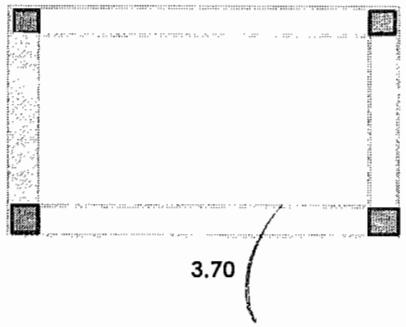



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.70	0.42	1.55
2	2.81	0.42	1.18
3	3.70	0.42	1.55

TOTAL **4.28 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO


DOMICILIO: C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.70	m3



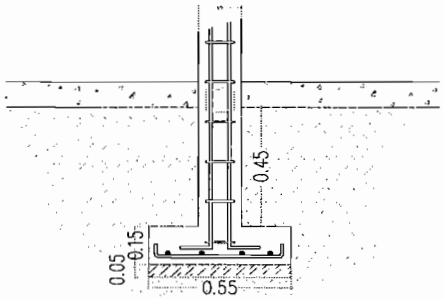

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			3.20
vol zapata			-0.64
vol plantilla			-0.22
vol rodapie	4.28	.15	-0.64

TOTAL **1.70 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CESAR LARA SILORO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. DEL YESO # 3501 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	3.00	m3

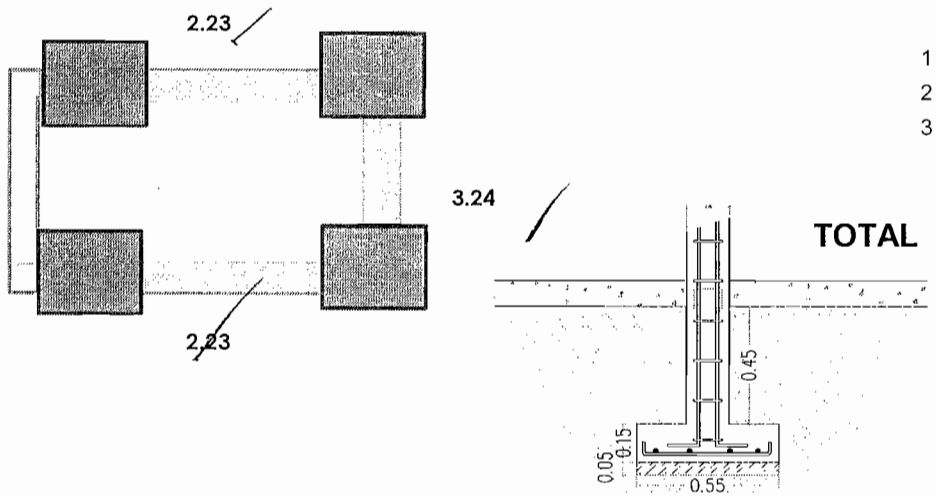

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.23	0.60	0.65	0.87
2	3.24	0.60	0.65	1.26
3	2.23	0.60	0.65	0.87

TOTAL **3.00 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.20	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

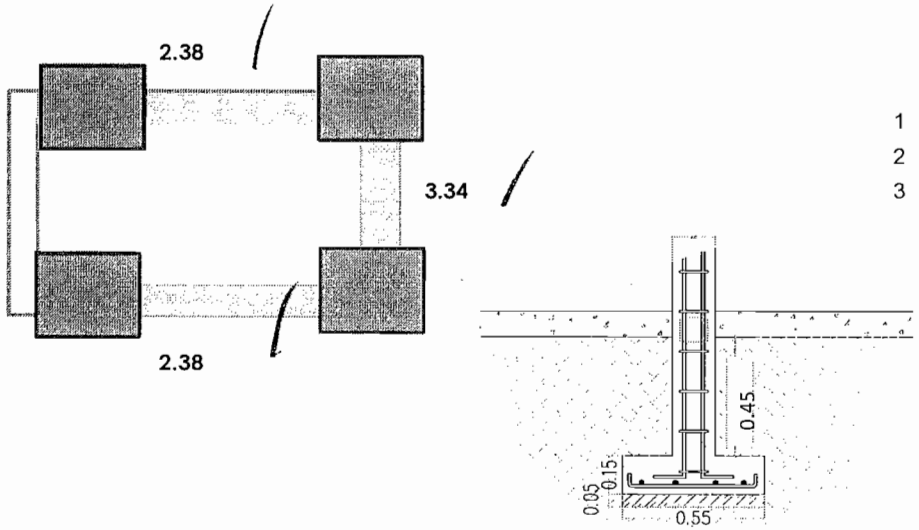

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.38	0.50	0.05	0.06
2	3.34	0.50	0.05	0.08
3	2.38	0.50	0.05	0.06

TOTAL **0.20** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.61	m3

ZAPATA CORRIDA

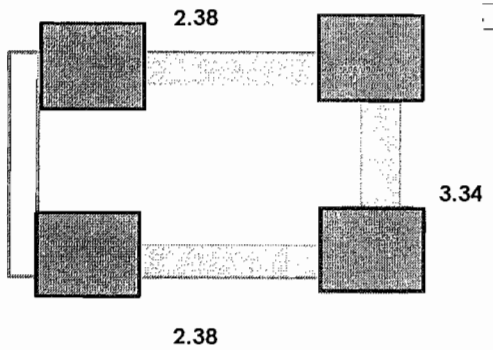

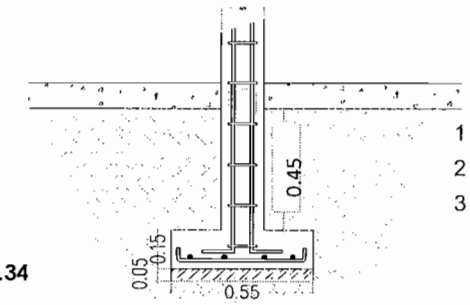

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.38	0.50	0.15	0.18
2	3.34	0.50	0.15	0.25
3	2.38	0.50	0.15	0.18

TOTAL 0.61 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	27.22	kg

ZAPATA CORRIDA

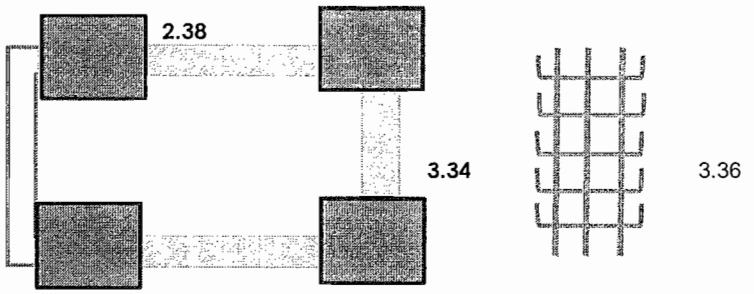

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	factor	peso kg
1	2.38	3.36	8.00
2	3.34	3.36	11.22
3	2.38	3.36	8.00

TOTAL **27.22 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de caracter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.08	m2





MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	2.99	0.42	1.26
2	3.71	0.42	1.56
3	2.99	0.42	1.26

TOTAL **4.08 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARISELA LOPEZ GUTIERREZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.58	m3



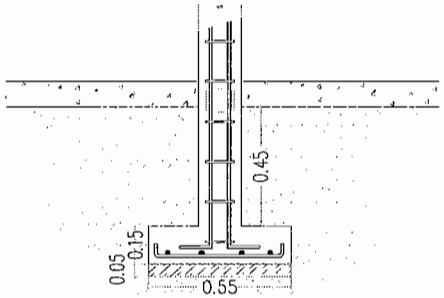

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			3.00
vol zapata			-0.61
vol plantilla			-0.20
vol rodapie	4.08	.15	-0.61

TOTAL **1.58 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	**CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**	**FECHA:**	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	MARISELA LOPEZ GUTIERREZ	**No. CONTRATO:**	**200/2016**
DOMICILIO :	**C. DEL ADOBE # 3506 COL. LADRILLEROS**	**No. ESTIMACION:**	**5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado

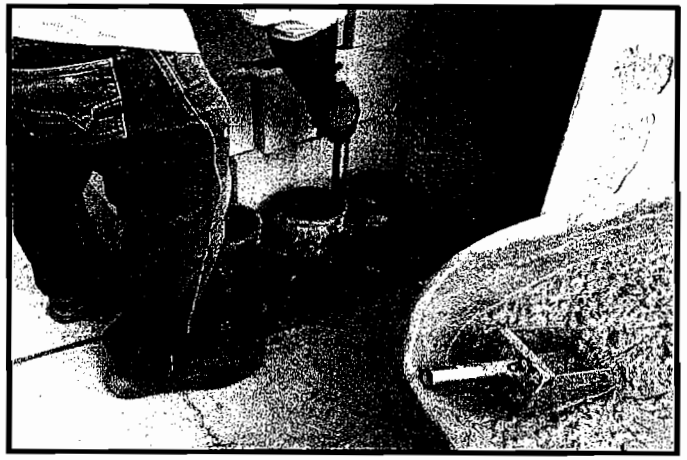



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	4.28	m3

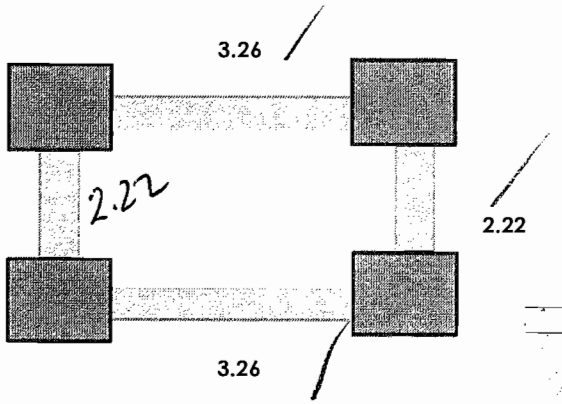

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.26	0.60	0.65	1.27
2	2.22	0.60	0.65	0.87
3	3.26	0.60	0.65	1.27
4	2.22	0.60	0.65	0.87

TOTAL **4.28 m3**

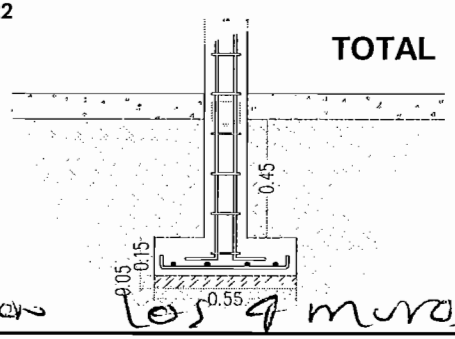

SE CONSTRUYERON los 4 muros

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.28	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

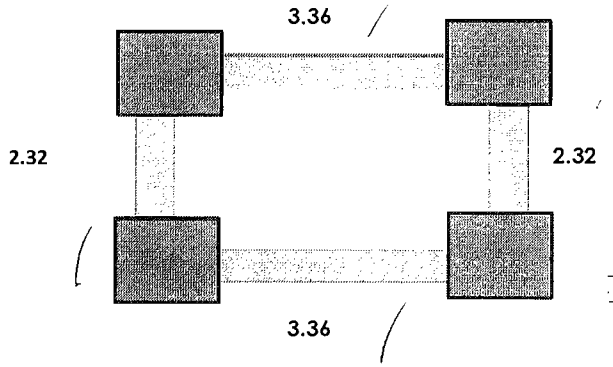

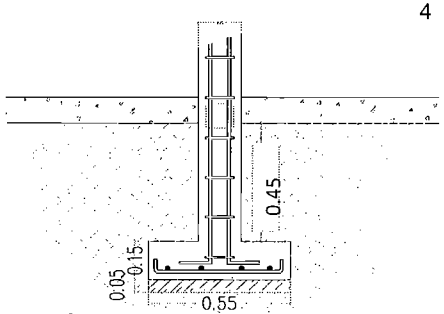

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	3.36	0.50	0.05	0.08	
2	2.32	0.50	0.05	0.06	
3	3.36	0.50	0.05	0.08	
4	2.32	0.50	0.05	0.06	

Se Hicieron los 4 muros

TOTAL 0.28 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.84	m3

ZAPATA CORRIDA

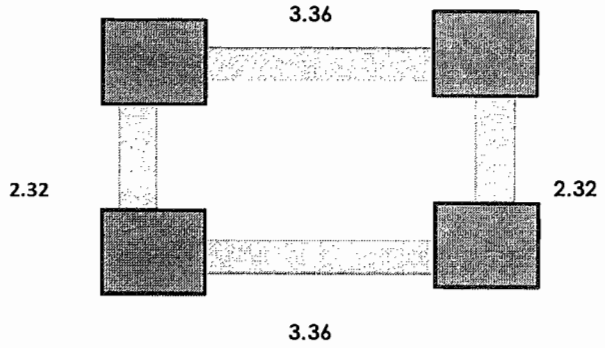

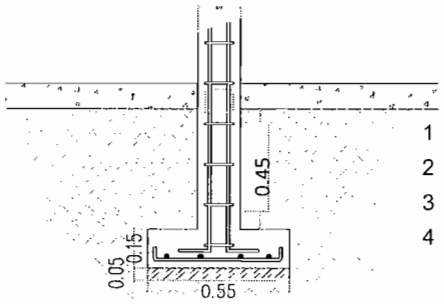

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	3.36	0.50	0.15	0.25	
2	2.32	0.50	0.15	0.17	
3	3.36	0.50	0.15	0.25	
4	2.32	0.50	0.15	0.17	

TOTAL **0.84 m3**

Se construyeron los 4 muros

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	38.18	kg

ZAPATA CORRIDA

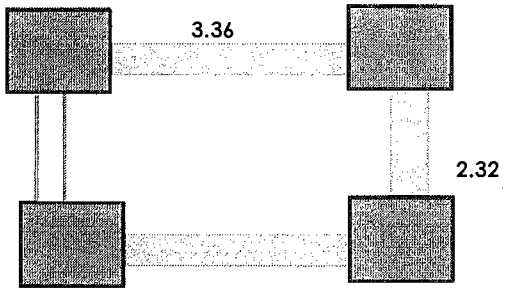



3.36

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

	M LARGO	factor	peso kg
1	3.36	3.36	11.29
2	2.32	3.36	7.80
3	3.36	3.36	11.29
4	2.32	3.36	7.80

TOTAL **38.18 kg**

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

Se construyeron los 4 muros

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	5.44	m2

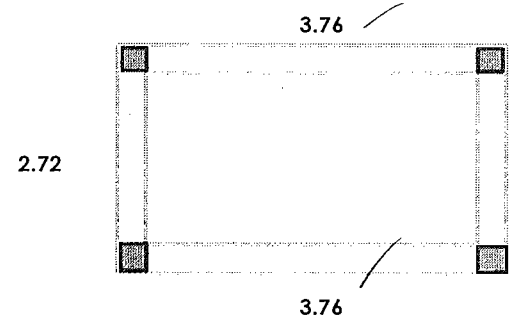



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.76	0.42	1.58
2	2.72	0.42	1.14
3	3.76	0.42	1.58
4	2.72	0.42	1.14

TOTAL **5.44 m2**

Se construyeron los 4 muros

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: María SOCORRO ORTIZ CERVANTES


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	2.34	m3

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			4.28
vol zapata			-0.84
vol plantilla			-0.28
vol rodapie	5.44	.15	-0.82



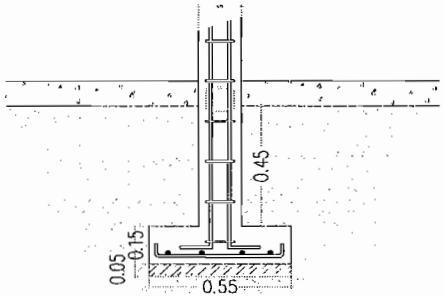

TOTAL **2.34 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	María SOCORRO ORTIZ CERVANTES	No. CONTRATO:	200/2016
DOMICILIO :	C. LLANO DEL CARRIZAL # 5812 MEZQUITES	No. ESTIMACION:	5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.76	m3

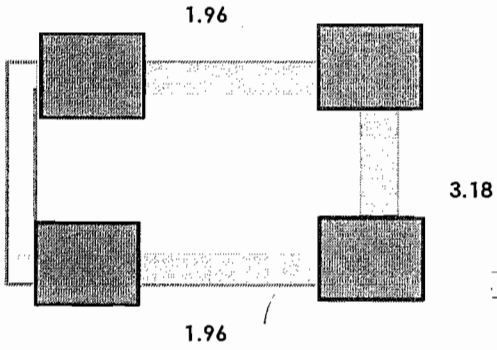

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	1.96	0.60	0.65	0.76
2	3.18	0.60	0.65	1.24
3	1.96	0.60	0.65	0.76

TOTAL **2.76 m3**

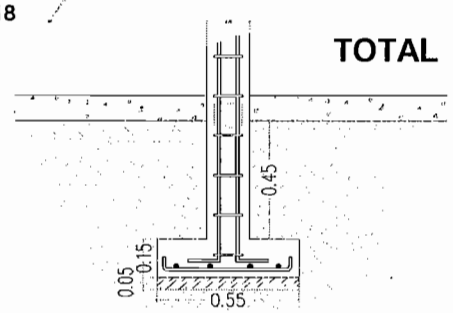

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

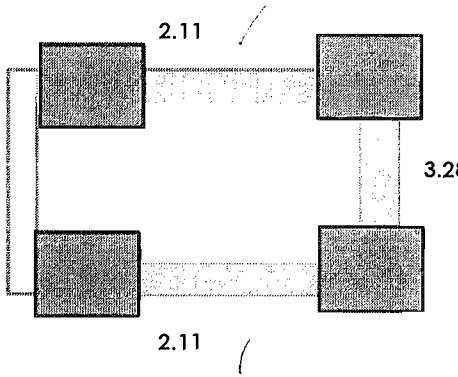

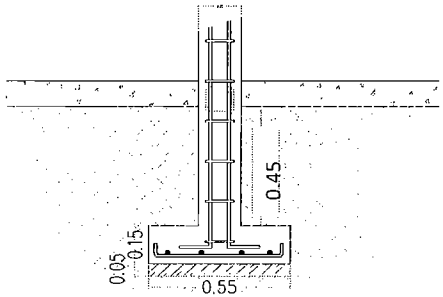

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	2.11	0.50	0.05	0.05	
2	3.28	0.50	0.05	0.08	
3	2.11	0.50	0.05	0.05	

TOTAL **0.18** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.57	m3

ZAPATA CORRIDA

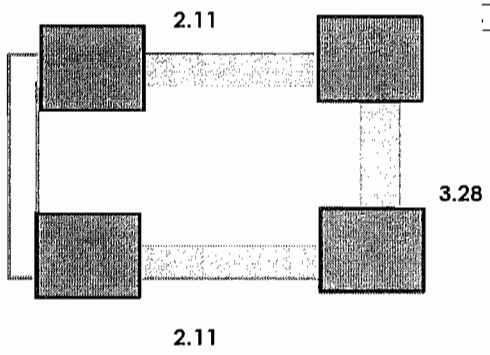

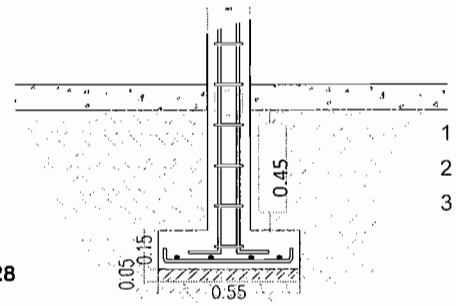

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.11	0.50	0.15	0.16
2	3.28	0.50	0.15	0.25
3	2.11	0.50	0.15	0.16

TOTAL **0.57 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.20	kg

ZAPATA CORRIDA

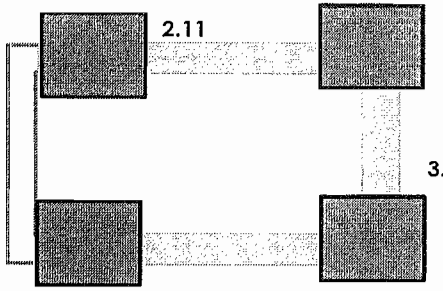



3.36

	M LARGO	factor	peso kg
1	2.11	3.36	7.09
2	3.28	3.36	11.02
3	2.11	3.36	7.09

TOTAL **25.20 kg**

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.83	m2

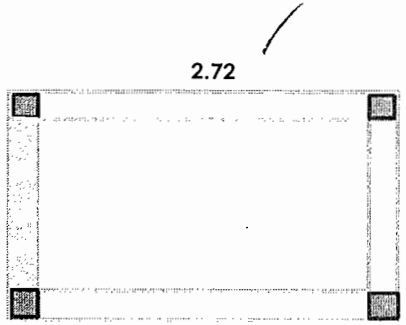



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	2.72	0.42	1.14
2	3.68	0.42	1.55
3	2.72	0.42	1.14

TOTAL **3.83 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ


DOMICILIO: C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.44	m3



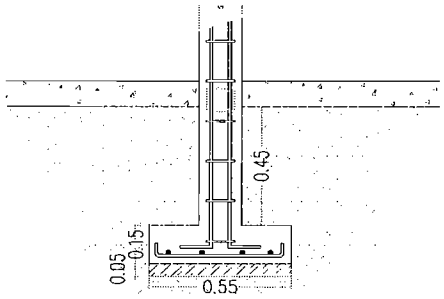

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			2.76
vol zapata			-0.57
vol plantilla			-0.18
vol rodapie	3.83	.15	-0.57

TOTAL **1.44 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: REYES RIVAS RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. MINA ARROYO HONDO # 3743 COL. PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

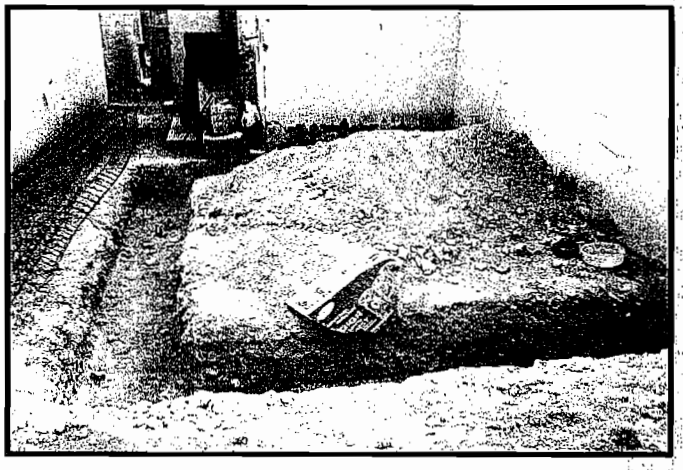

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELEZ RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	2.83	m3

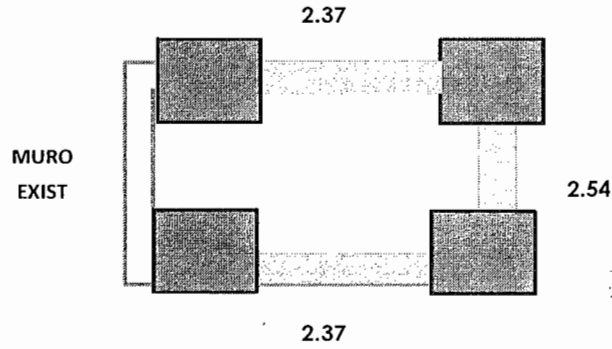

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.37	0.60	0.65	0.92
2	2.54	0.60	0.65	0.99
3	2.37	0.60	0.65	0.92

TOTAL **2.83 m3**

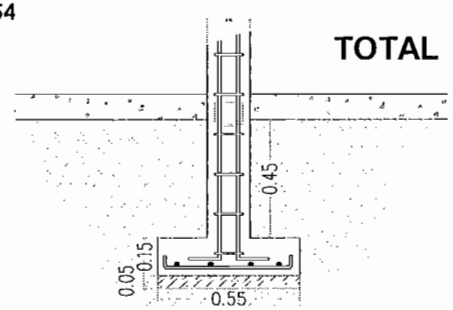

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.19	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

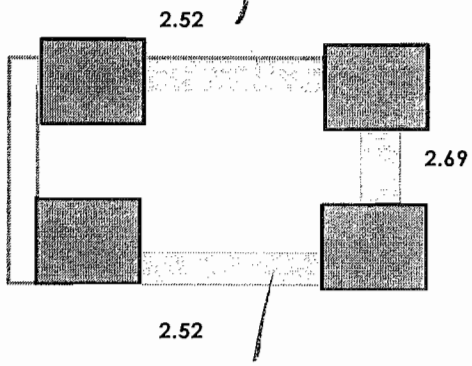

MURO EXIST.

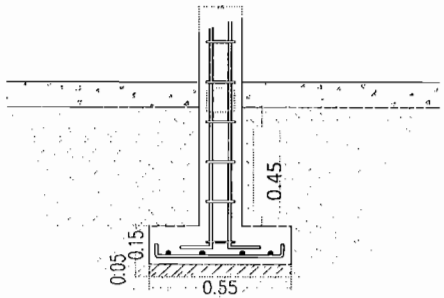

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	2.52	0.50	0.05	0.06	
2	2.69	0.50	0.05	0.07	
3	2.52	0.50	0.05	0.06	

TOTAL 0.19 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.58	m3

ZAPATA CORRIDA

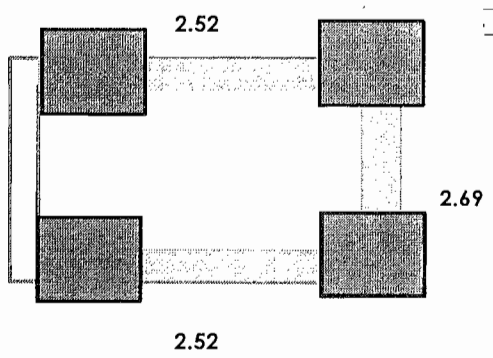

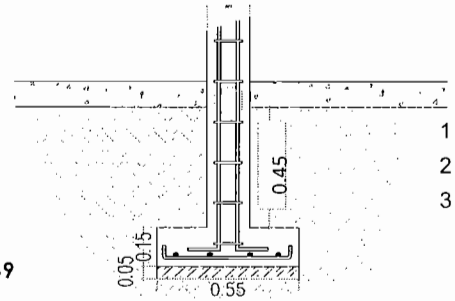

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.52	0.50	0.15	0.19
2	2.69	0.50	0.15	0.20
3	2.52	0.50	0.15	0.19

TOTAL 0.58 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.98	kg

ZAPATA CORRIDA

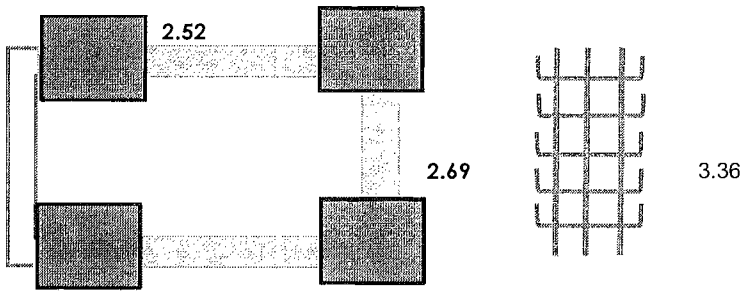

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

Kg/M

	M LARGO	factor	peso kg
1	2.52	3.36	8.47
2	2.69	3.36	9.04
3	2.52	3.36	8.47

TOTAL 25.98 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.01	m2

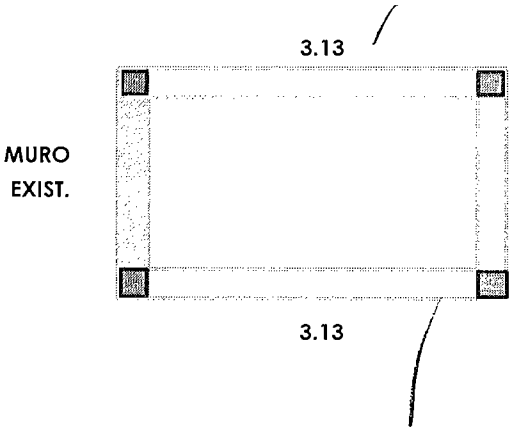



	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	REA MURO
1	3.13	0.42	1.31
2	3.30	0.42	1.39
3	3.13	0.42	1.31

TOTAL **4.01 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. FELIPE ANGELEZ RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.46	m3



	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			2.83
vol zapata			-0.58
vol plantilla			-0.19
vol rodapie	4.01	.15	-0.60

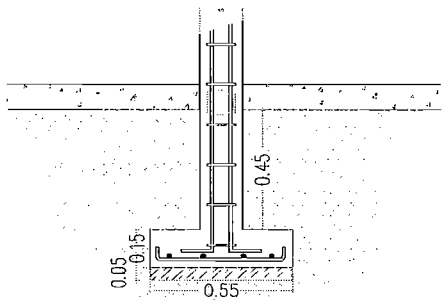

TOTAL **1.46 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: VENTURA CARO MONJE

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. FELIPE ANGELES RAMIREZ # 28 COL. NOMBRE DE DIOS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	1.24	m3

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.00	0.60	0.65	0.00
2	0.00	0.60	0.65	0.00
3	3.18	0.60	0.65	1.24

MURO EXIST

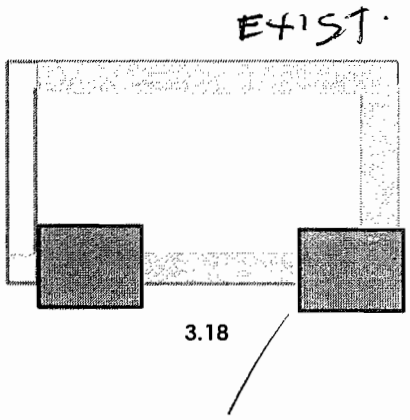

BARDA

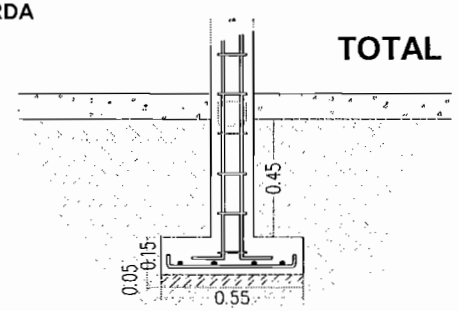

TOTAL 1.24 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.08	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

		M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
MURO EXIST.	1	0.00	0.50	0.05	0.00
	2	0.00	0.50	0.05	0.00
	3	3.38	0.50	0.05	0.08



0

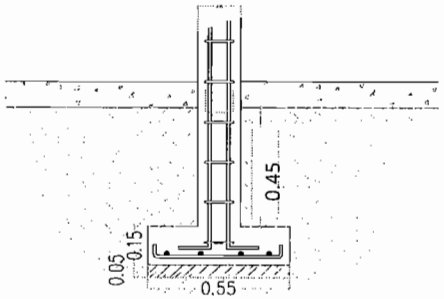

TOTAL 0.08 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.25	m3

ZAPATA CORRIDA

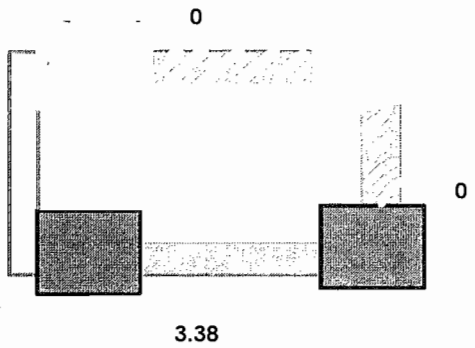

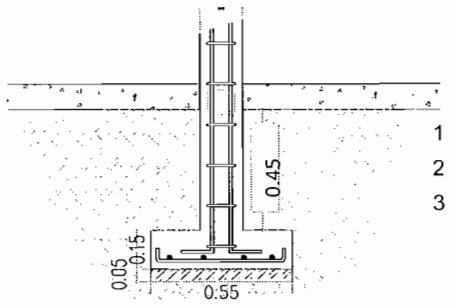

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.00	0.50	0.15	0.00
2	0.00	0.50	0.15	0.00
3	3.38	0.50	0.15	0.25

TOTAL **0.25 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	11.36	kg

ZAPATA CORRIDA

Kg/M

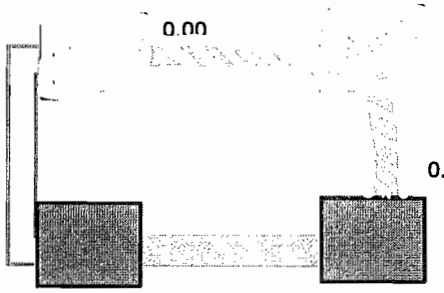



3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	factor	peso kg
1	0.00	3.36	0.00
2	0.00	3.36	0.00
3	3.38	3.36	11.36

TOTAL **11.36 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	1.76	m2





MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	0.00	0.42	0.00
2	0.00	0.42	0.00
3	4.18	0.42	1.76

TOTAL **1.76 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LORIBELLA PAREDES RUIZ

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.65	m3



	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			1.24
vol zapata			-0.25
vol plantilla			-0.08
vol rodapie	1.76	.15	-0.26

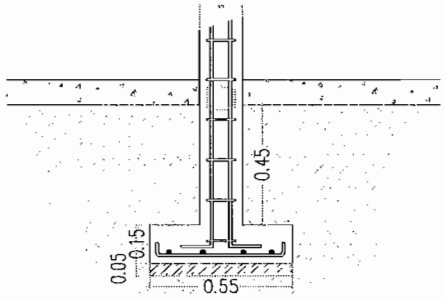

TOTAL **0.65 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	**CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**	**FECHA:**	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	LORIBELLA PAREDES RUIZ	**No. CONTRATO:**	200/2016
DOMICILIO :	**C. MINERAL DEL VALLECILLO # 15516 FRACC REAL DE MINAS**	**No. ESTIMACION:**	5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

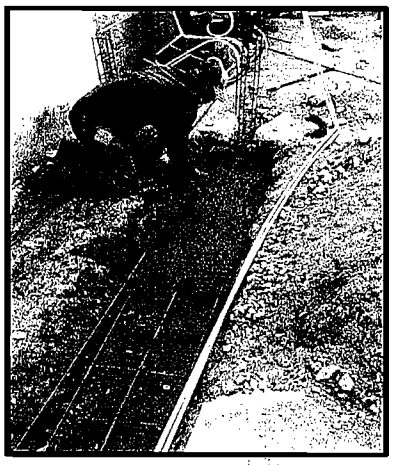



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	1.88	m3

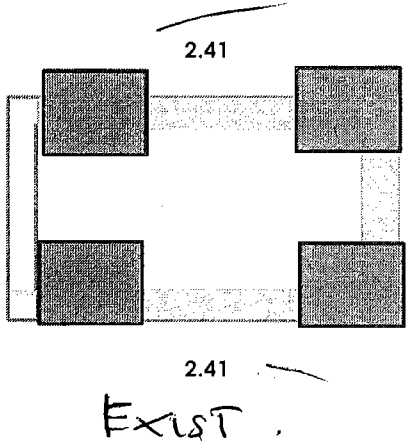

BARDA

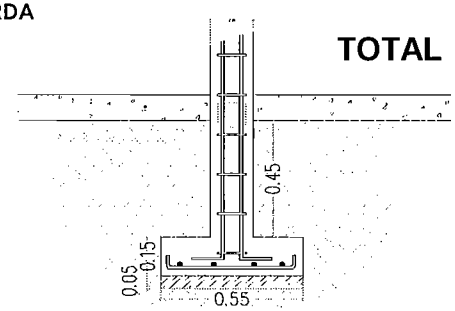

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.41	0.60	0.65	0.94
2	0.00	0.60	0.65	0.00
3	2.41	0.60	0.65	0.94

TOTAL **1.88 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.14	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

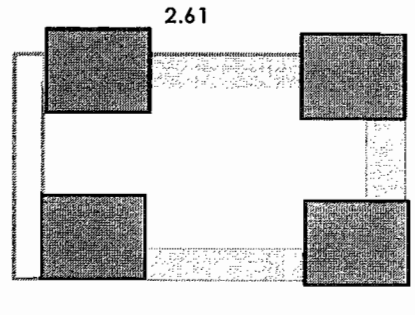


MURO EXIST.

0

Barda.

EXIST.

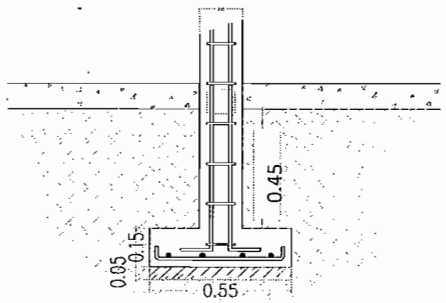

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.61	0.50	0.05	0.07
2	0.00	0.50	0.05	0.00
3	2.61	0.50	0.05	0.07

TOTAL **0.14** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.40	m3

ZAPATA CORRIDA

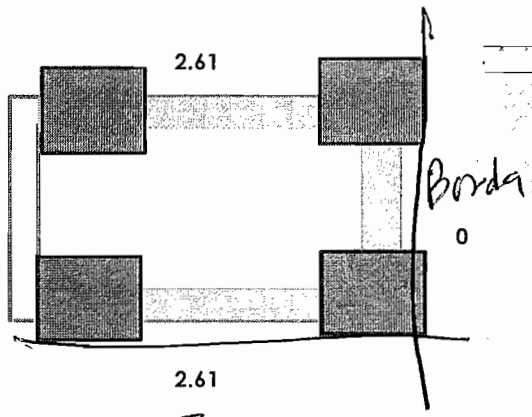

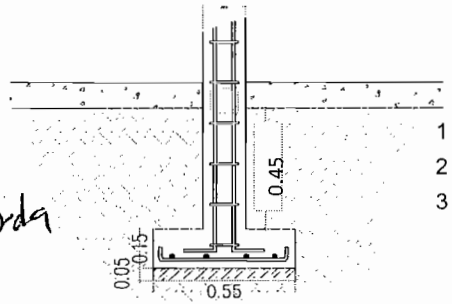

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	2.61	0.50	0.15	0.20	✓
2	0.00	0.50	0.15	0.00	
3	2.61	0.50	0.15	0.20	✓

TOTAL **0.40 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


DOMICILIO: C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	17.54	kg

ZAPATA CORRIDA

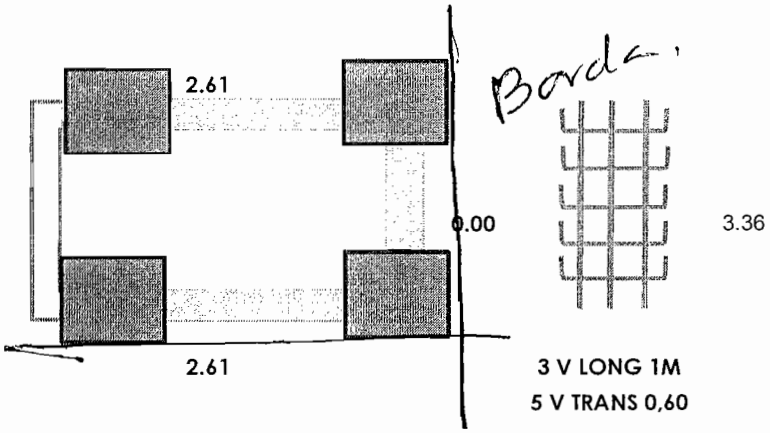

	M LARGO		factor	peso kg
1	2.61		3.36	8.77
2	0.00		3.36	0.00
3	2.61		3.36	8.77

Kg/m

TOTAL **17.54 kg**

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO ARNO #2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.20	m2

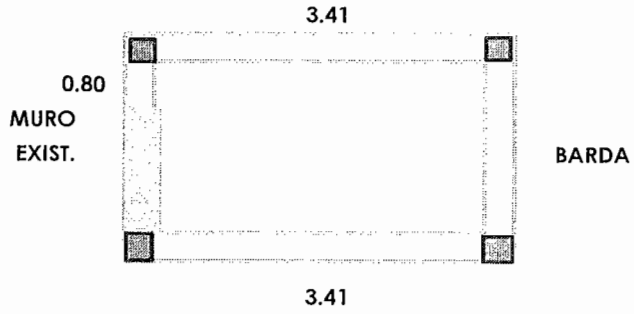



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.41	0.42	1.43
2	0.80	0.42	0.34
3	3.41	0.42	1.43

TOTAL **3.20 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO ARNO #2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.86	m3



	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			1.88
vol zapata			-0.40
vol plantilla			-0.14
vol rodapie	3.20	.15	-0.48

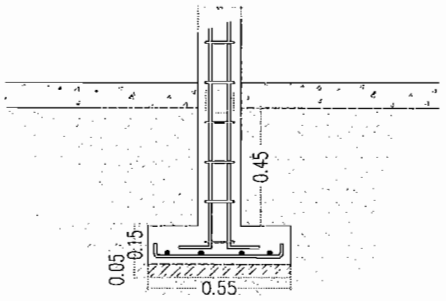

TOTAL **0.86 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: IRALDA JEYSSY CONTRERAS ARAGON

DOMICILIO : C. RIO ARNO # 2024 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

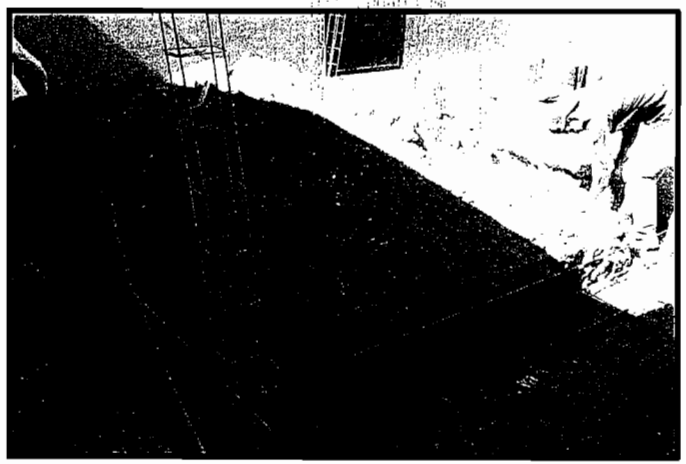



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	2.80	m3

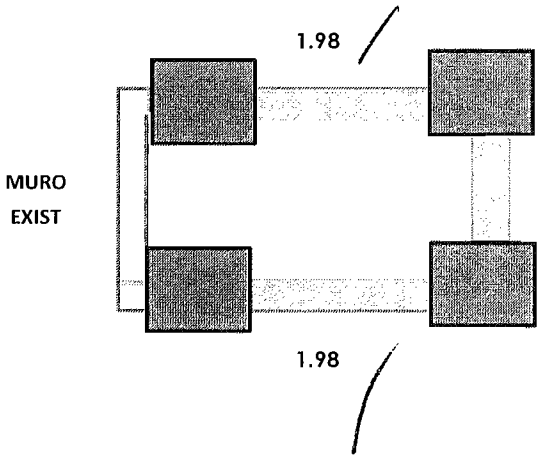

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	1.98	0.60	0.65	0.77
2	3.23	0.60	0.65	1.26
3	1.98	0.60	0.65	0.77

TOTAL **2.80 m3**

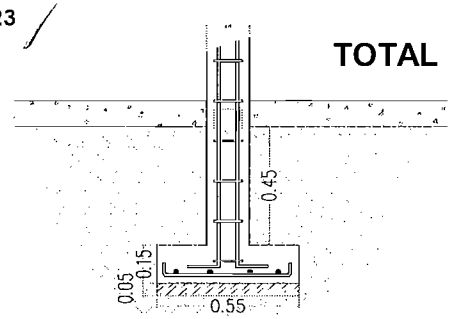

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

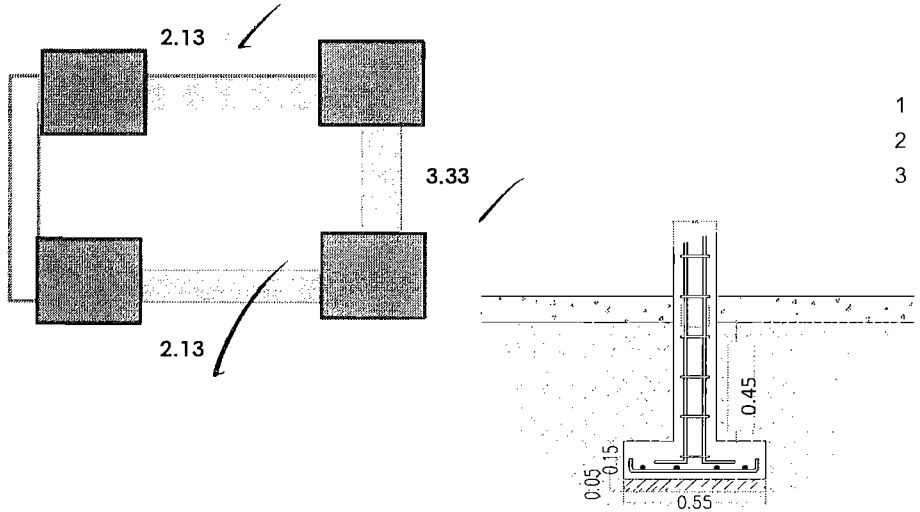

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.13	0.50	0.05	0.05
2	3.33	0.50	0.05	0.08
3	2.13	0.50	0.05	0.05

TOTAL **0.18** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.57	m3

ZAPATA CORRIDA

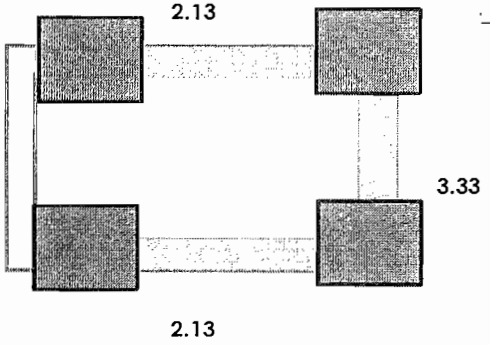

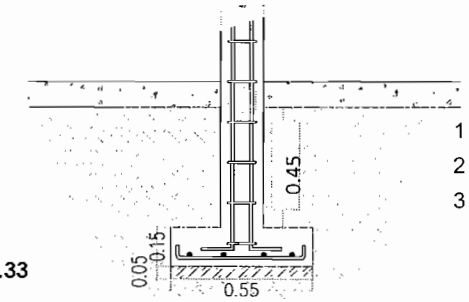

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.13	0.50	0.15	0.16
2	3.33	0.50	0.15	0.25
3	2.13	0.50	0.15	0.16

TOTAL 0.57 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.51	kg

ZAPATA CORRIDA

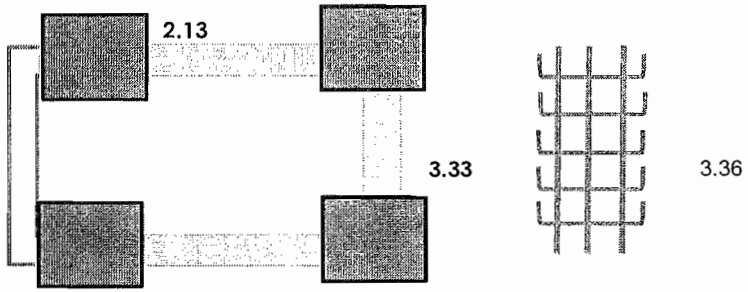

MURO EXIST.

3.36

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	factor	peso kg
1	2.13	3.36	7.16
2	3.33	3.36	11.19
3	2.13	3.36	7.16

TOTAL 25.51 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.87	m2

MURO EXIST.

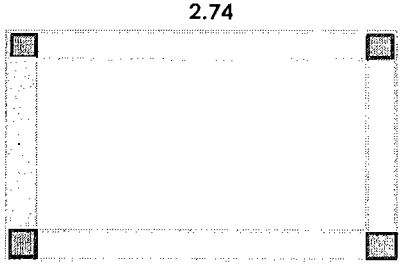



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	2.74	0.42	1.15
2	3.73	0.42	1.57
3	2.74	0.42	1.15

TOTAL **3.87 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.47	m3



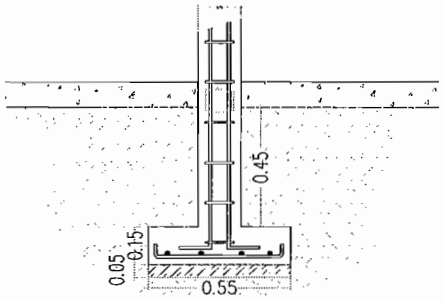

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			2.80
vol zapata			-0.57
vol plantilla			-0.18
vol rodapie	3.87	.15	-0.58

TOTAL **1.47 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: BLANCA PATRICIA ZAMORA RIOS

DOMICILIO : C. HACIENDA DE CANADA # 16900 COL. AMP. NUEVO TRIUNFO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	2.77	m3

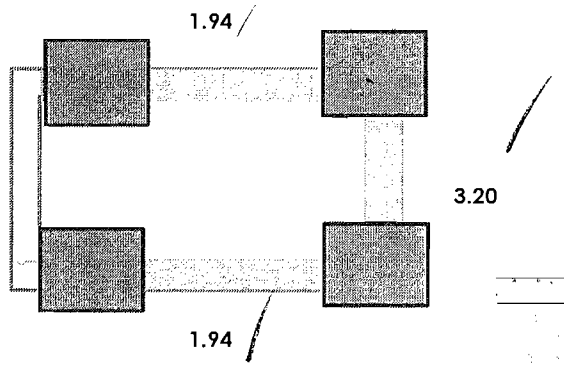

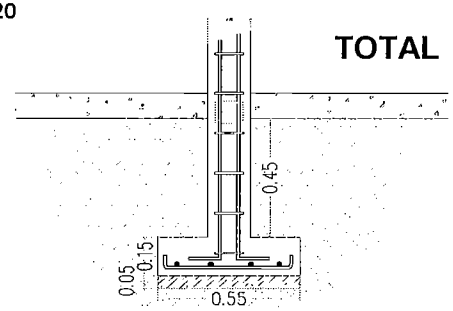

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	1.94	0.60	0.65	0.76
2	3.20	0.60	0.65	1.25
3	1.94	0.60	0.65	0.76

TOTAL 2.77 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

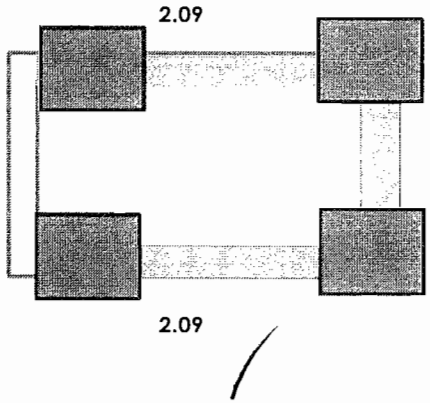

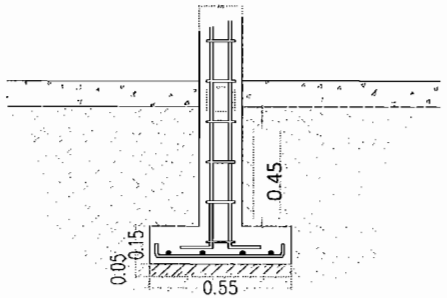

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.09	0.50	0.05	0.05
2	3.30	0.50	0.05	0.08
3	2.09	0.50	0.05	0.05

TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.57	m3

ZAPATA CORRIDA

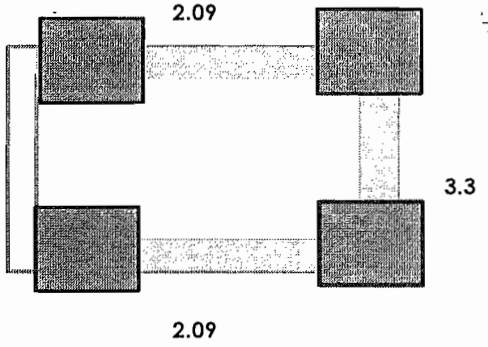

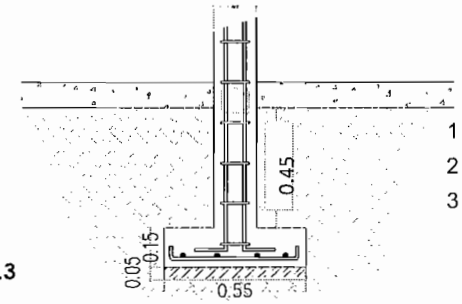

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.09	0.50	0.15	0.16
2	3.30	0.50	0.15	0.25
3	2.09	0.50	0.15	0.16

TOTAL 0.57 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.13	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.

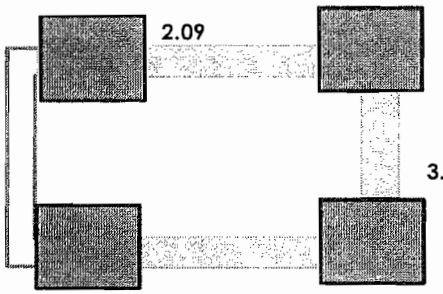



3.36

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

	M LARGO	factor	peso kg
1	2.09	3.36	7.02
2	3.30	3.36	11.09
3	2.09	3.36	7.02

TOTAL **25.13 kg**

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversiónes de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.81	m2

MURO EXIST.

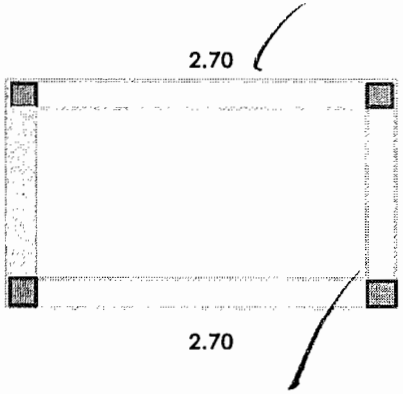



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	2.70	0.42	1.13
2	3.70	0.42	1.55
3	2.70	0.42	1.13

TOTAL **3.81 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA


DOMICILIO: C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.45	m3



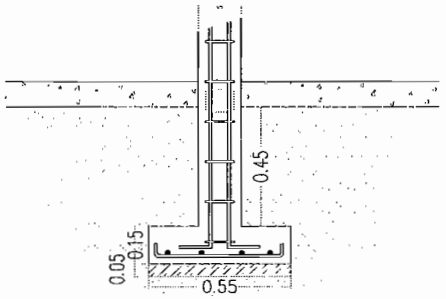

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			2.77
vol zapata			-0.57
vol plantilla			-0.18
vol rodapie	3.81	.15	-0.57

TOTAL **1.45 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	**CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.**	**FECHA:**	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	LUZ BEATRIZ PACHECO MEDINA	**No. CONTRATO:**	**200/2016**
DOMICILIO :	**C. MARTIRES DE CHICAGO # 611 COL. TIERRA Y LIBERTAD**	**No. ESTIMACION:**	**5 (CINCO)**

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

DOMICILIO: BLVD. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	2.79	m3

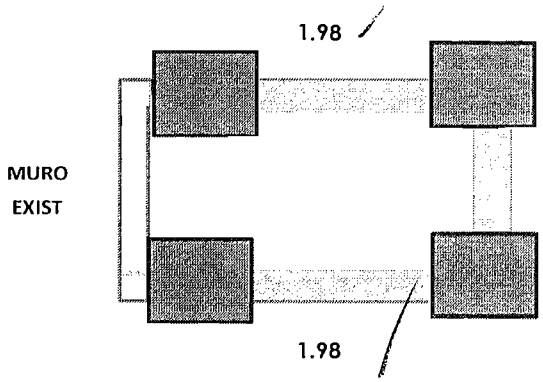

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	1.98	0.60	0.65	0.77
2	3.20	0.60	0.65	1.25
3	1.98	0.60	0.65	0.77

TOTAL 2.79 m3

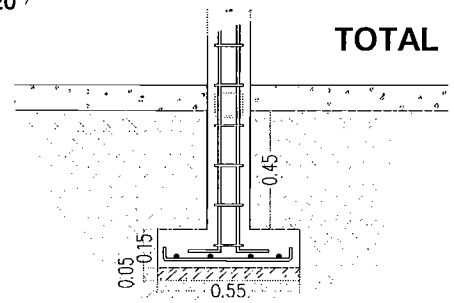

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

DOMICILIO: [redacted] DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR


Prin.

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

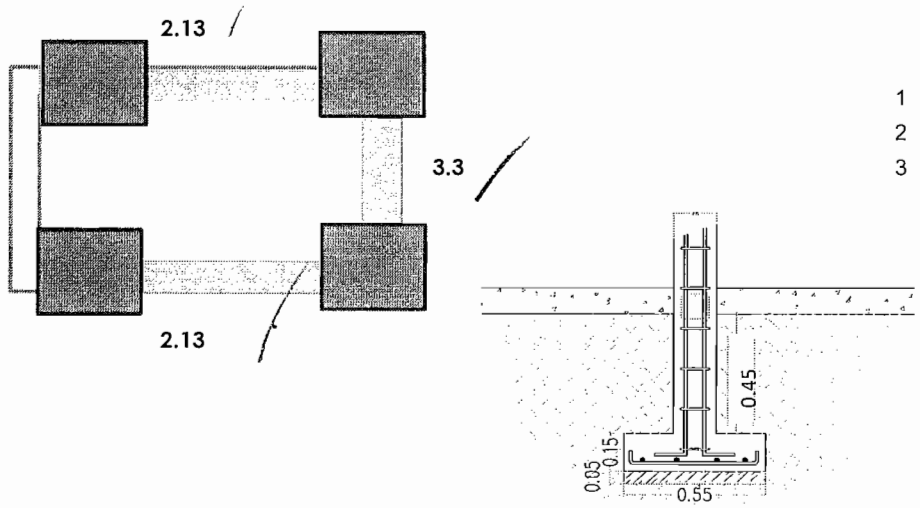

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	2.13	0.50	0.05	0.05	
2	3.30	0.50	0.05	0.08	
3	2.13	0.50	0.05	0.05	

TOTAL **0.18** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


DOMICILIO: [redacted] DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.57	m3

ZAPATA CORRIDA

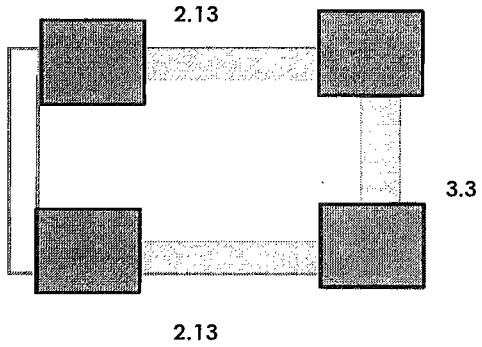

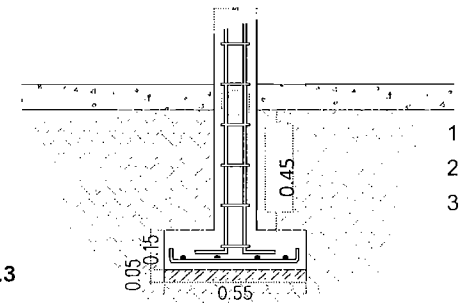

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.13	0.50	0.15	0.16
2	3.30	0.50	0.15	0.25
3	2.13	0.50	0.15	0.16

TOTAL 0.57 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


DOMICILIO: [redacted] DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.41	kg

ZAPATA CORRIDA

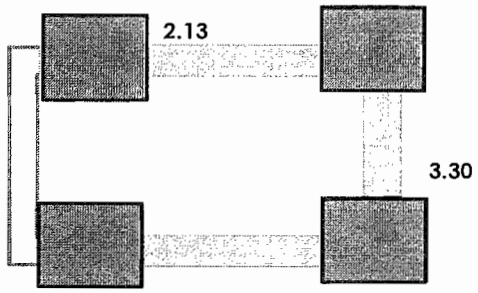

MURO EXIST.



3.36

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	factor	peso kg
1	2.13	3.36	7.16
2	3.30	3.36	11.09
3	2.13	3.36	7.16

TOTAL **25.41 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


DOMICILIO: [redacted]. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.85	m2

MURO EXIST.

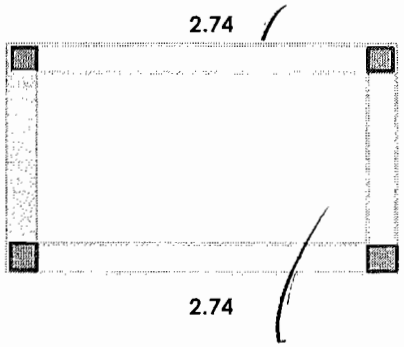



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	2.74	0.42	1.15
2	3.70	0.42	1.55
3	2.74	0.42	1.15

TOTAL 3.85 m2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA


DOMICILIO: [redacted]. DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.46	m3

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			2.79
vol zapata			-0.57
vol plantilla			-0.18
vol rodapie	3.81	.15	-0.58



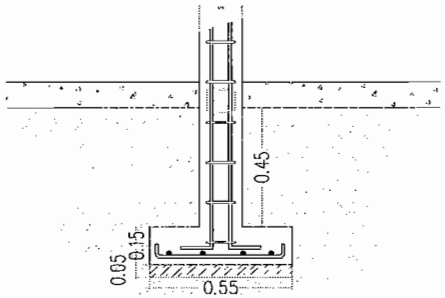

TOTAL **1.46 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: PAULA SIGALA

DOMICILIO : [redacted] DESIERTO DE SONORA # 3311 COL. PORVENIR

Piso.

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	3.17	m3

MURO EXIST

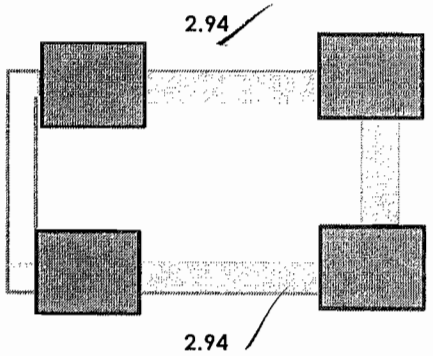

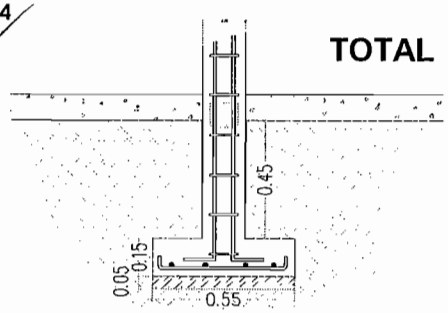

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.94	0.60	0.65	1.15
2	2.24	0.60	0.65	0.87
3	2.94	0.60	0.65	1.15

TOTAL **3.17 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.22	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

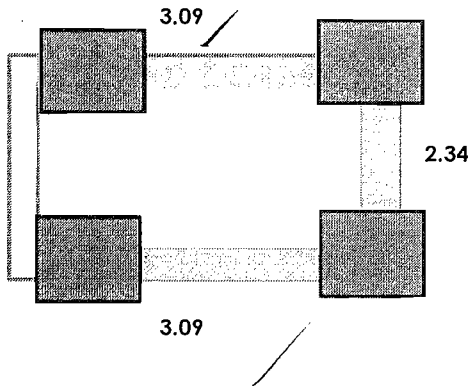

MURO EXIST.

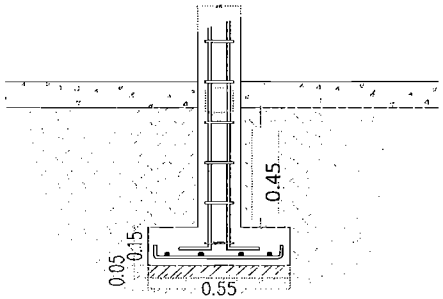

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	3.09	0.50	0.05	0.08	
2	2.34	0.50	0.05	0.06	
3	3.09	0.50	0.05	0.08	

TOTAL **0.22** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.64	m3

ZAPATA CORRIDA

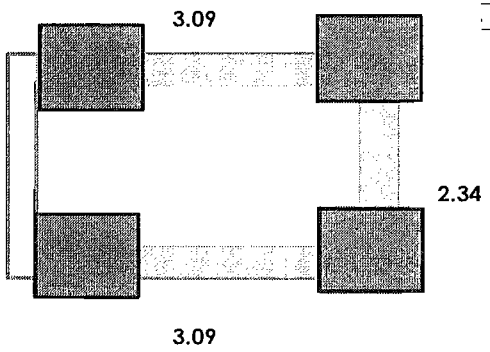

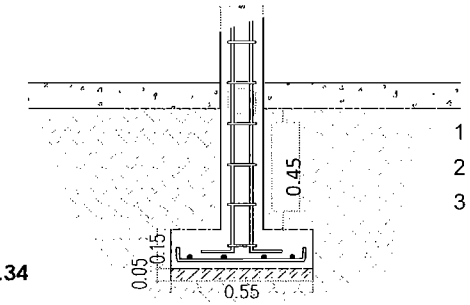

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.09	0.50	0.15	0.23
2	2.34	0.50	0.15	0.18
3	3.09	0.50	0.15	0.23

TOTAL **0.64 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	28.62	kg

ZAPATA CORRIDA

Kg/m.

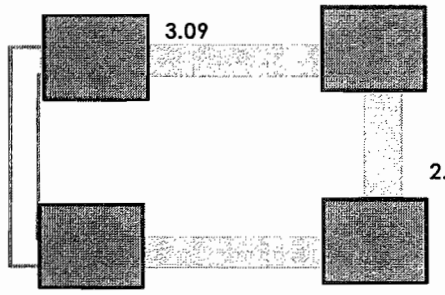

MURO EXIST.



3.36

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO		factor	peso kg
1	3.09		3.36	10.38
2	2.34		3.36	7.86
3	3.09		3.36	10.38

TOTAL **28.62 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.25	m2

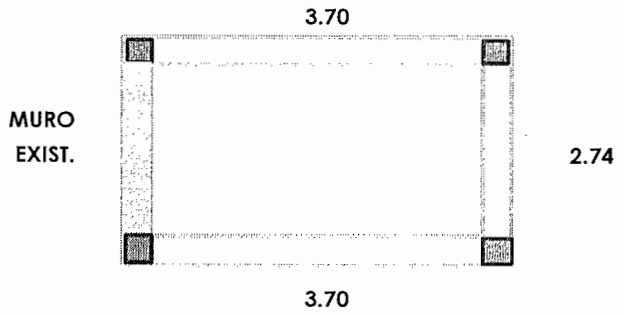



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.70	0.42	1.55
2	2.74	0.42	1.15
3	3.70	0.42	1.55

TOTAL **4.25 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: HEREDIA TERRAZAS DOLORES


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.67	m3



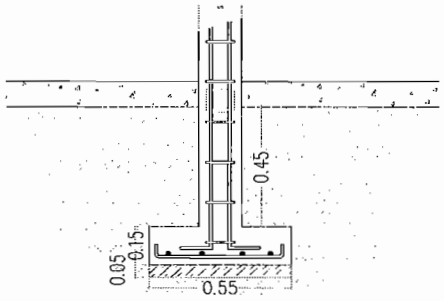

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			3.17
vol zapata			-0.64
vol plantilla			-0.22
vol rodapie	4.25	.15	-0.64

TOTAL **1.67 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


T E S T I G O F O T O G R A F I C O


PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	HEREDIA TERRAZAS DOLORES	No. CONTRATO:	200/2016
DOMICILIO :	C. TUPAMAROS # 207 COL. VICENTE GUERECA	No. ESTIMACION:	5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

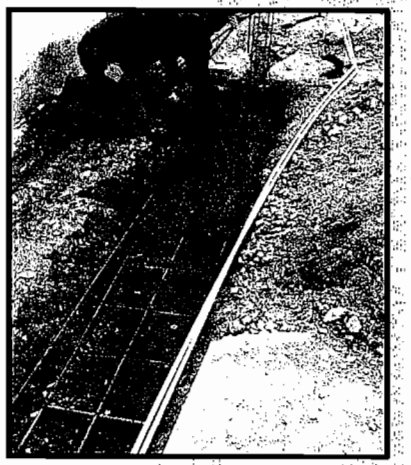

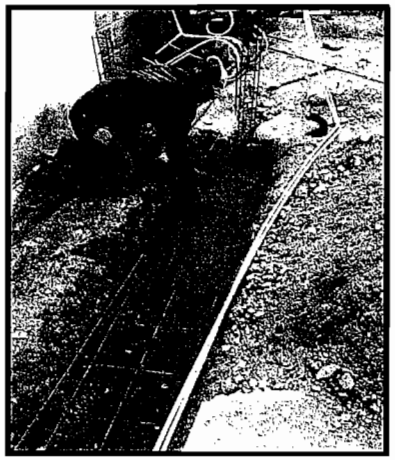

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CARRANZA

DOMICILIO: C.PVD DESIERTO DE SONORA #3502 COL.EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	2.67	m3

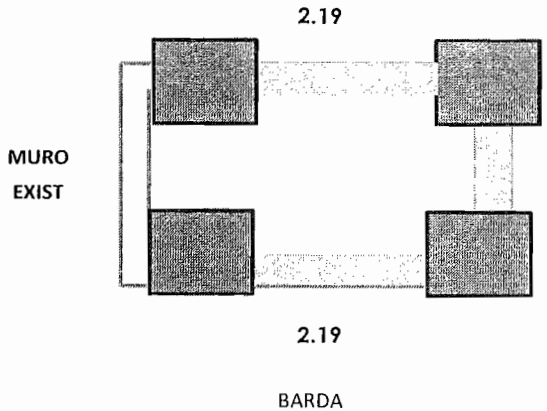

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.19	0.60	0.65	0.85
2	2.49	0.60	0.65	0.97
3	2.19	0.60	0.65	0.85

TOTAL **2.67 m3**

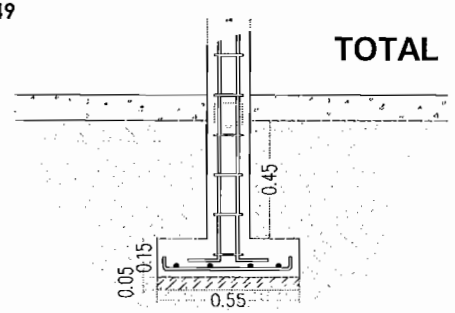

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CARRANZA


DOMICILIO: C.PVD DESIERTO DE SONORA #3502 COL.EL PORVENIR


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.19	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

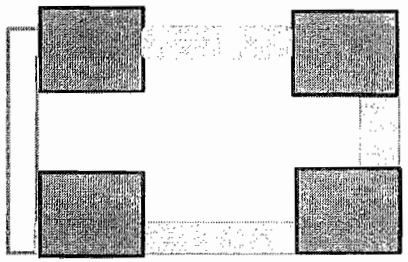

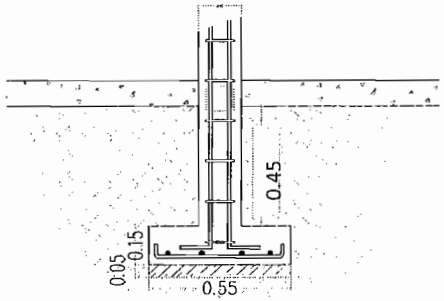

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.39	0.50	0.05	0.06
2	2.64	0.50	0.05	0.07
3	2.39	0.50	0.05	0.06

TOTAL 0.19 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CARRANZA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.PVD DESIERTO DE SONORA #3502 COL.EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.52	m3

ZAPATA CORRIDA

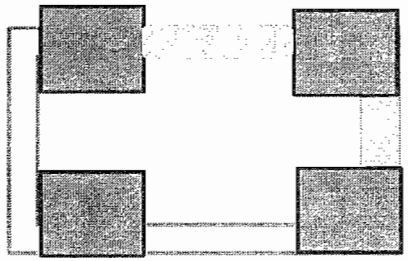

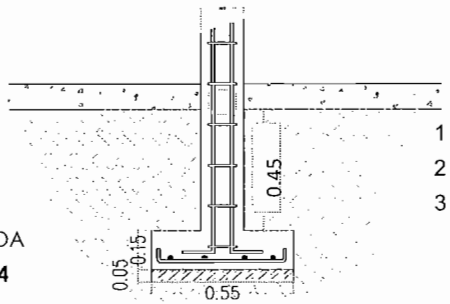

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.19	0.50	0.15	0.16
2	2.64	0.50	0.15	0.20
3	2.19	0.50	0.15	0.16

TOTAL 0.52 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CARRANZA

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.PVD DESIERTO DE SONORA #3502 COL.EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	23.59	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.

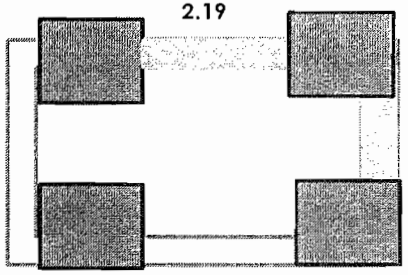

2.64



3.36

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

M

	LARGO	factor	peso kg
1	2.19	3.36	7.36
2	2.64	3.36	8.87
3	2.19	3.36	7.36

TOTAL **23.59 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA


DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.05	m2





MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.19	0.42	1.34
2	3.25	0.42	1.37
3	3.19	0.42	1.34

TOTAL **4.05 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CARRANZA


DOMICILIO: C.PVD DESIERTO DE SONORA #3502 COL.EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.35	m3



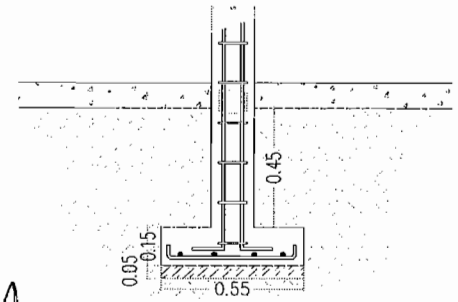

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			2.67
vol zapata			-0.52
vol plantilla			-0.19
vol rodapie	4.05	.15	-0.61

TOTAL **1.35 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA

DOMICILIO : C. DESIERTO DE SONORA # 3502 COL. EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: SAENZ ARENALES ANDREA

DOMICILIO: C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 SOLIDARIDAD POPULAR

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	4.02	m3

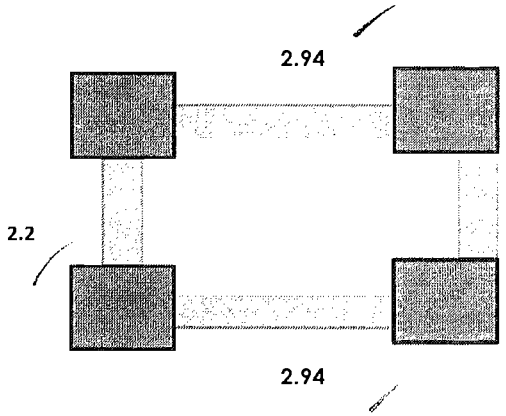

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.94	0.60	0.65	1.15
2	2.20	0.60	0.65	0.86
3	2.94	0.60	0.65	1.15
4	2.20	0.60	0.65	0.86

TOTAL 4.02 m3

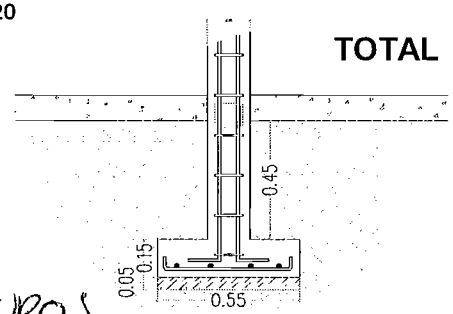

SE HICIERON LOS 4 MUROS

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: SAENZ ARENALES ANDREA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 SOLIDARIDAD POPULAR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.28	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

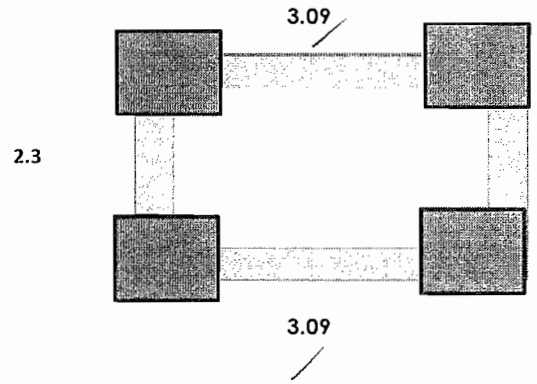

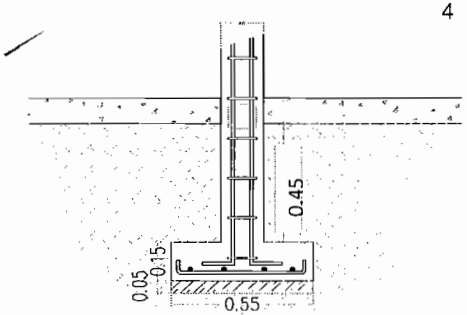

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.09	0.50	0.05	0.08
2	2.30	0.50	0.05	0.06
3	3.09	0.50	0.05	0.08
4	2.30	0.50	0.05	0.06

Se construyeron los cuatro muros

TOTAL 0.28 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: SAENZ ARENALES ANDREA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 SOLIDARIDAD POPULAR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.80	m3

ZAPATA CORRIDA

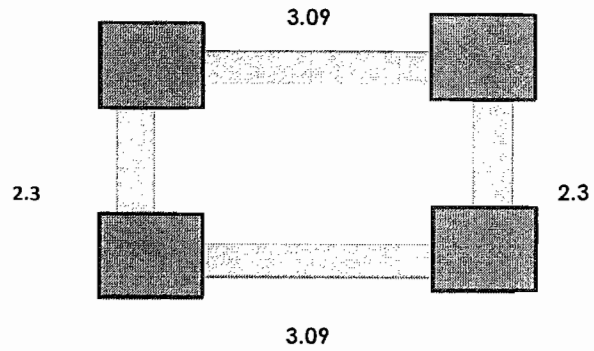

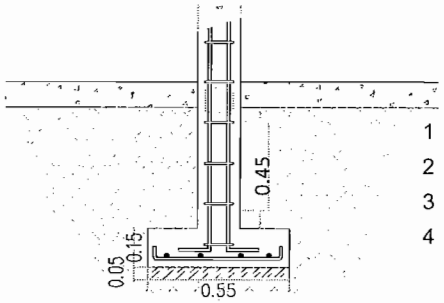

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.09	0.50	0.15	0.23
2	2.30	0.50	0.15	0.17
3	3.09	0.50	0.15	0.23
4	2.30	0.50	0.15	0.17

TOTAL **0.80 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: SAENZ ARENALES ANDREA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 SOLIDARIDAD POPULAR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	36.22	kg

ZAPATA CORRIDA

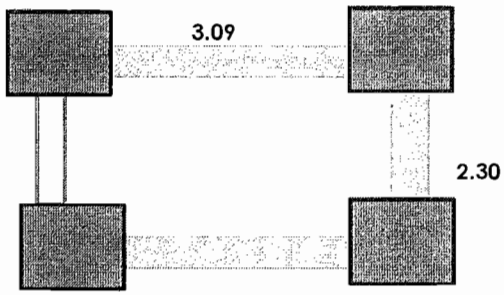



3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	Kg/M factor	peso kg
1	3.09	3.36	10.38
2	2.30	3.36	7.73
3	3.09	3.36	10.38
4	2.30	3.36	7.73

TOTAL **36.22 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: SAENZ ARENALES ANDREA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 SOLIDARIDAD POPULAR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	5.36	m2

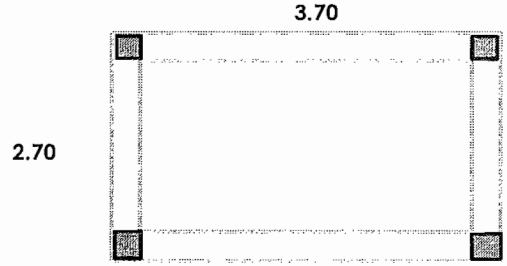



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.70	0.42	1.55
2	2.70	0.42	1.13
3	3.70	0.42	1.55
4	2.70	0.42	1.13

TOTAL **5.36 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: SAENZ ARENALES ANDREA

DOMICILIO: C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 SOLIDARIDAD POPULAR


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	2.14	m3



	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			4.02
vol zapata			-0.80
vol plantilla			-0.28
vol rodapie	5.36	.15	-0.80

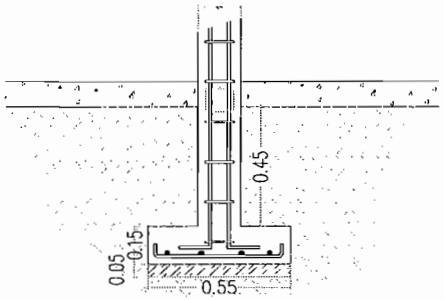

TOTAL **2.14 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: SAENZ ARENALES ANDREA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C.OSCAR SOTOMAYNEZ # 16711 SOLIDARIDAD POPULAR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

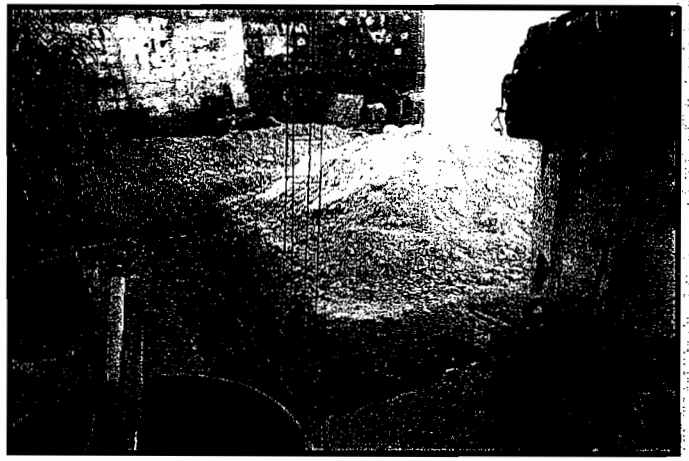



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: GEORGINA VARGAS PEÑA


DOMICILIO: C. DESIERTO DE MOJAVE #3526 COL.EL PORVENIR

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	1.17	m3


MURO EXIST

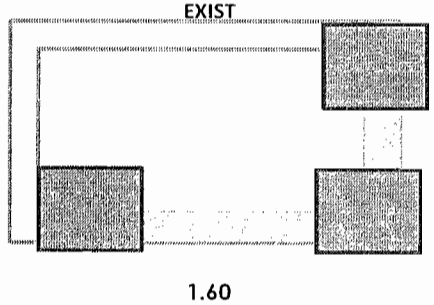

MURO EXIST

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.74	0.60	0.45	0.74
2	1.60	0.60	0.45	0.43
3	0.00	0.60	0.65	0.00

TOTAL 1.17 m3

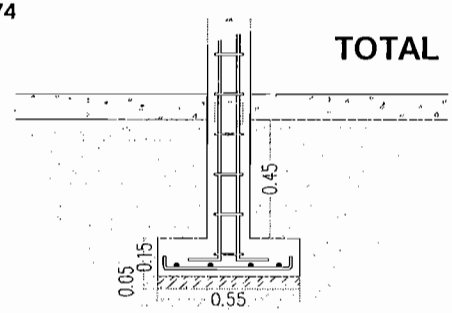

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: GEORGINA VARGAS PEÑA

DOMICILIO: C. DESIERTO DE MOJAVE #3526 COL.EL PORVENIR


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.12	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

MURO EXIST.



	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.00	0.50	0.05	0.00
2	2.89	0.50	0.05	0.07
3	1.80	0.50	0.05	0.05

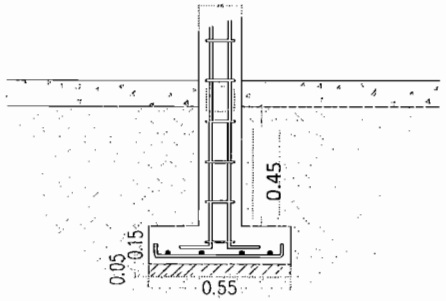

TOTAL 0.12 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: GEORGINA VARGAS PEÑA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. DESIERTO DE MOJAVE #3526 COL.EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.36	m3

ZAPATA CORRIDA



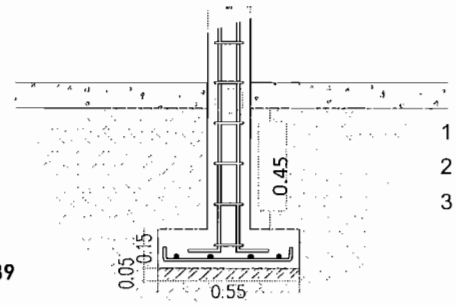

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	1.80	0.50	0.15	0.14
2	2.89	0.50	0.15	0.22
3	0.00	0.50	0.15	0.00

TOTAL **0.36 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: GEORGINA VARGAS PEÑA

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. DESIERTO DE MOJAVE #3526 COL.EL PORVENIR


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	15.76	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.





3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	factor KG/M	peso kg
1	0.00	3.36	0.00
2	2.89	3.36	9.71
3	1.80	3.36	6.05

TOTAL 15.76 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: GEROGINA VARGAS PEÑA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	1.29	m2

MURO EXIST.





MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	0.00	0.21	0.00
2	3.50	0.21	0.74
3	2.60	0.21	0.55

TOTAL **1.29 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: GEORGINA VARGAS PEÑA


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. DESIERTO DE MOJAVE #3526 COL.EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.50	m3



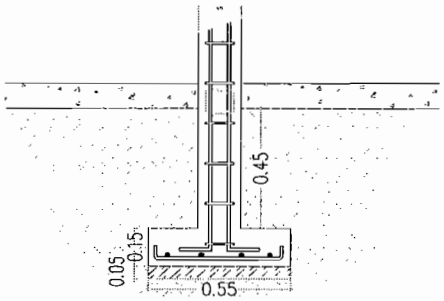

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			1.17
vol zapata			-0.36
vol plantilla			-0.12
vol rodapie	1.29	.15	-0.19

TOTAL **0.50 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: GEROGINA VARGAS PEÑA

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO : C. DESIERTO DE MOJAVE # 3526 COL. EL PORVENIR

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

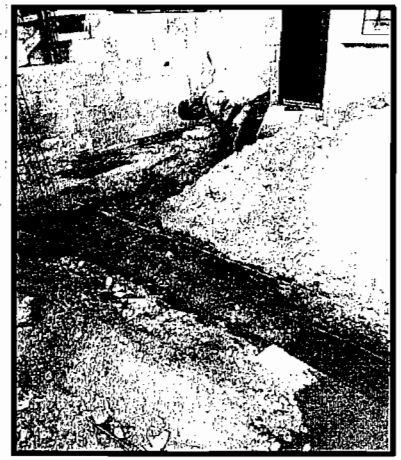



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	3.16	m3

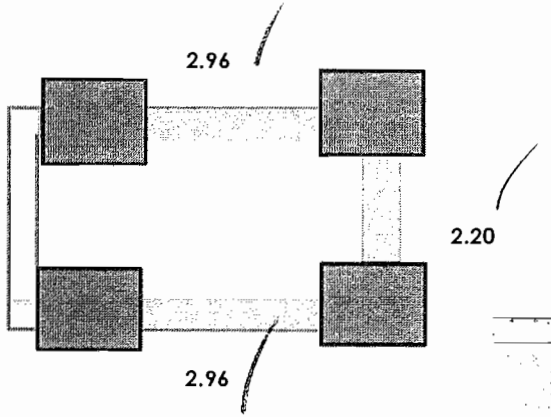

MURO EXIST

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.96	0.60	0.65	1.15
2	2.20	0.60	0.65	0.86
3	2.96	0.60	0.65	1.15

TOTAL **3.16 m3**

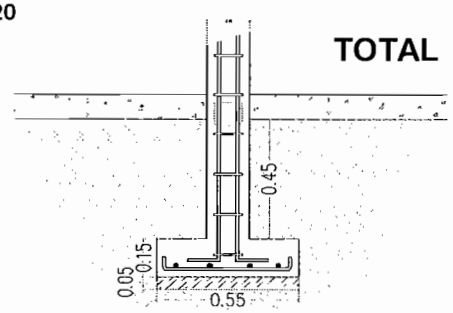

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.22	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

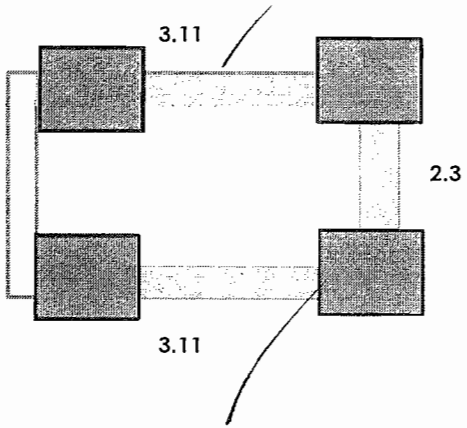

MURO EXIST.

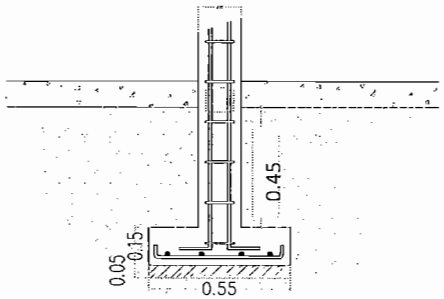

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.11	0.50	0.05	0.08
2	2.30	0.50	0.05	0.06
3	3.11	0.50	0.05	0.08

TOTAL **0.22** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.63	m3

ZAPATA CORRIDA

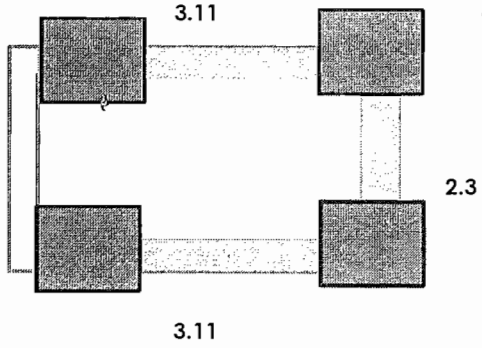

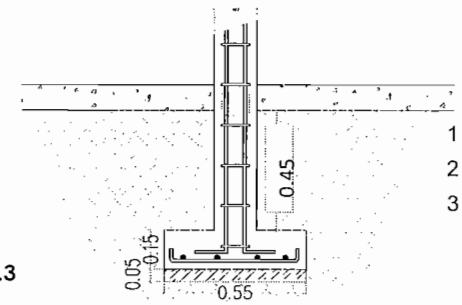

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	3.11	0.50	0.15	0.23
2	2.30	0.50	0.15	0.17
3	3.11	0.50	0.15	0.23

TOTAL **0.63 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	28.63	kg

ZAPATA CORRIDA

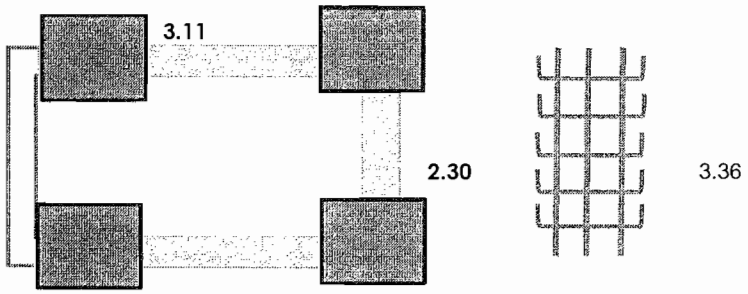

3.36

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

Kg/M

	M LARGO	factor	peso kg
1	3.11	3.36	10.45
2	2.30	3.36	7.73
3	3.11	3.36	10.45

TOTAL **28.63 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.25	m2

MURO EXIST.

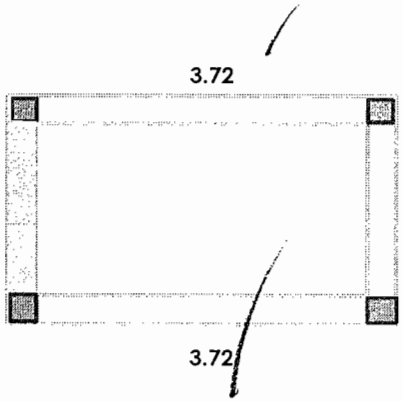



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	3.72	0.42	1.56
2	2.70	0.42	1.13
3	3.72	0.42	1.56

TOTAL **4.25 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C. RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.67	m3



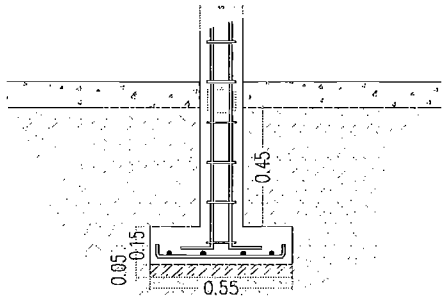

	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			3.16
vol zapata			-0.63
vol plantilla			-0.22
vol rodapie	4.25	.15	-0.64

TOTAL **1.67 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	14 DE DICIEMBRE 2016
		PERIODO:	08/12/2016 AL 14/12/2016
BENEFICIARIO:	RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO	No. CONTRATO:	200/2016
DOMICILIO :	C. RIO SAN FRANCISCO # 25917 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	No. ESTIMACION:	5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado





RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

DOMICILIO: C. RIO AMUR # 2225 COL.RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavaciòn al 90% de su PVSM.	1.12	m3

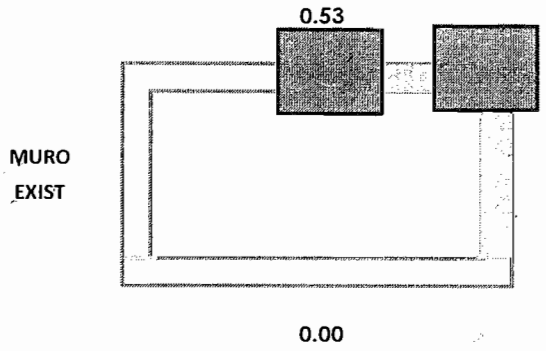

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.53	0.60	0.65	0.21
2	2.33	0.60	0.65	0.91
3	0.00	0.60	0.65	0.00

TOTAL **1.12 m3**

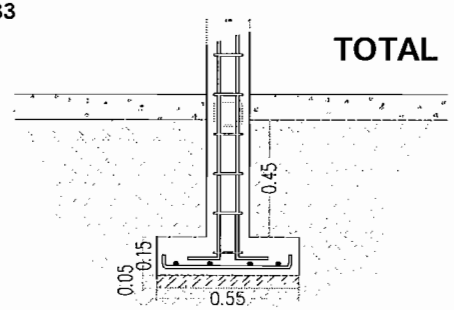

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO AMUR # 2225 COL.RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.08	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

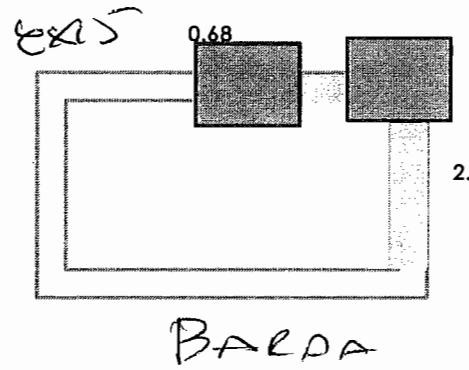

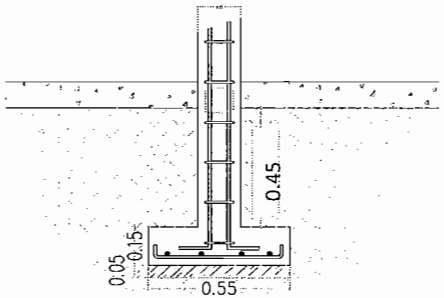

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	0.68	0.50	0.05	0.02
2	2.38	0.50	0.05	0.06
3	0.00	0.50	0.05	0.00

TOTAL **0.08** **m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO AMUR # 2225 COL.RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correca ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.23	m3

ZAPATA CORRIDA

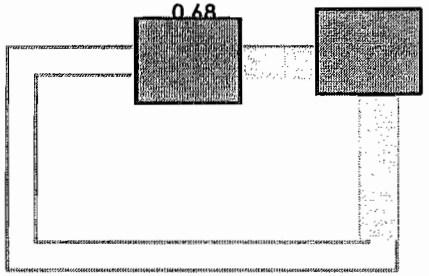

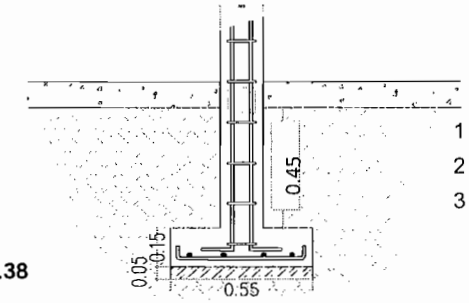

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.	
1	0.68	0.50	0.15	0.05	
2	2.38	0.50	0.15	0.18	
3	0.00	0.50	0.15	0.00	

TOTAL **0.23 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO AMUR # 2225 COL.RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	10.28	kg

ZAPATA CORRIDA

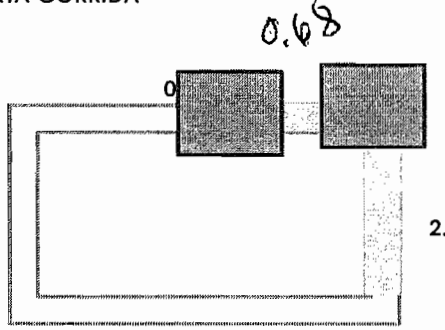



3.36

	M LARGO	factor	peso kg
1	0.68	3.36	2.28
2	2.38	3.36	8.00
3	0.00	3.36	0.00

TOTAL **10.28 kg**

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60 = 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO AMUR # 2225 COL.RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	1.63	m2

MURO EXIST.

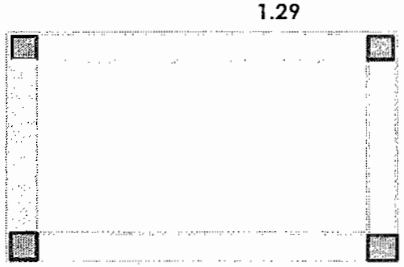



MURO	M LARGO	M ALTO	M2 REA MURO
1	1.29	0.42	0.54
2	2.59	0.42	1.09
3	0.00	0.42	0.00

TOTAL **1.63 m2**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C. RIO AMUR # 2225 COL.RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.57	m3



	AREA	ESPESOR	
vol excavacion			1.12
vol zapata			-0.23
vol plantilla			-0.08
vol rodapie	1.63	.15	-0.24

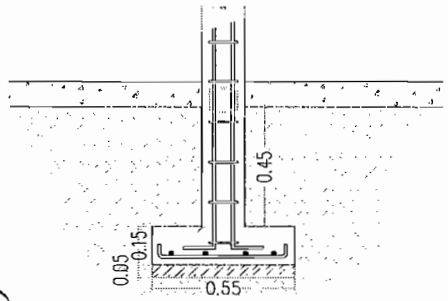

TOTAL **0.57 m3**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016


BENEFICIARIO: MARIA ISABEL NORIEGA

DOMICILIO : C. RIO AMUR # 2225 COL.RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

Testigo fotografico cuarto adosado

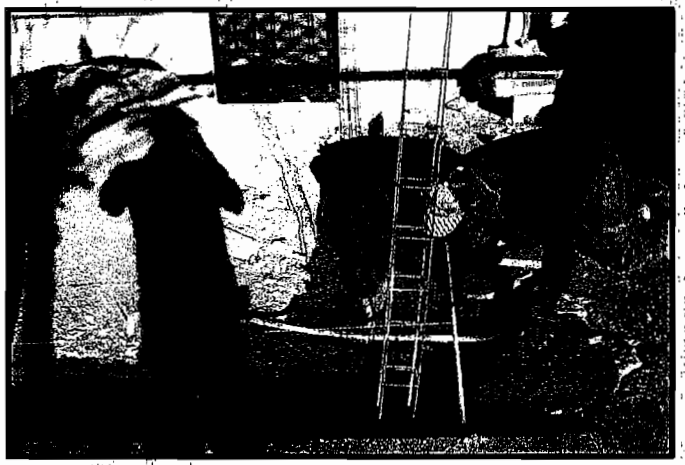

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.RIO SALADO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	28.15	kg

ZAPATA CORRIDA

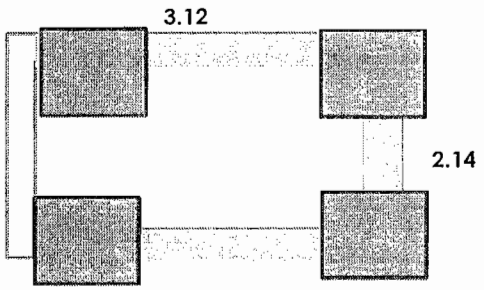



	M LARGO	factor	peso kg
1	3.12	3.36	10.48
2	2.14	3.36	7.19
3	3.12	3.36	10.48

TOTAL 28.15 kg

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

-7.19

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: MARINA SANDOVAL TARANGO


No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO OBI # 2009 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	23.65	kg

ZAPATA CORRIDA

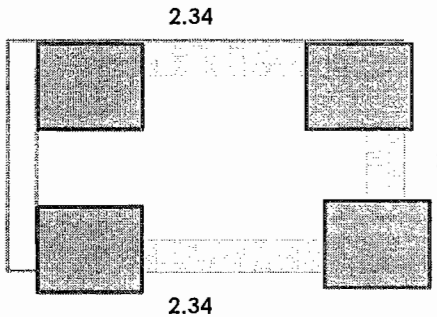



M

	LARGO	factor	peso kg
1	2.34	3.36	7.86
2	2.36	3.36	7.93
3	2.34	3.36	7.86

TOTAL 23.65 kg

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60 = 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: NORMA VENEGAS MUÑOZ


No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1609 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	19.49	kg

ZAPATA CORRIDA





M

	LARGO	factor	peso kg
1	3.31	3.36	11.12
2	2.30	3.36	7.73
3	0.19	3.36	0.64

TOTAL **19.49 kg**

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARTA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

G E N E R A D O R

PROURVIKA S.A DE C.V

M U N I C I P I O D E C H I H U A H U A

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 08/12/2016 AL 14/12/2016

BENEFICIARIO: ESTHER PEÑA SOTO

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.RIO RINH # 2427 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


No. ESTIMACION: 5 (CINCO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habiilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesraio para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	23.28	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.

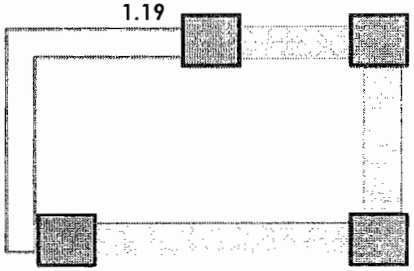



3 V LONG 1M

5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

	M LARGO	factor	peso kg
1	1.19	3.36	4.00
2	2.48	3.36	8.33
3	3.26	3.36	10.95

TOTAL **23.28 kg**

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES""ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
