CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

CONTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA980529MW0
PROGRESO 102 - 1
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
CHIHUAHUA, México C.P. 31000
(601) General de Ley Personas Morales
Teléfonos: 614-4109550
Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Factura M 84
Folio fiscal
4cfd5bd6-77d8-4165-8e45-2fa25d4aadb0
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2018-06-11 17:55:47
Lugar Expedición: 31000

RFC	MCI651010V22	**Fecha expedición**	11/06/2018 17:55:46
Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	**Uso CFDI**	(P01) Por definir
Calle	CALLE MINA 408		
Colonia	CENTRO **Municipio** CHIHUAHUA **C.P.** 31000		
Ciudad, Estado	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO	**Fecha pago**	11/06/2018

Concepto		Monto
ESTIMACIÓN NO. 11 (CONVENIO)(ULTIMA) RELATIVO A: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CD. DE CHIHUAHUA.	MONTO BASE 72151900 (E48) Unidad de servicio **Traslado** Base 2,711,543.39 (002) IVA Tipo Factor 0.160000 Importe 433,846.94	2,711,543.39
	AJUSTE DE COSTOS (+)	0.00
CONTRATO NO. 176/2017	**Traslado** Base 0.00 Tipo Factor Importe 0.00	
	AMORTIZACION ANTICIPO (-)	0.00
	SUB TOTAL	**2,711,543.39**
	(002) IVA 16 % (+)	433,846.94
	SUB TOTAL CON IVA	**3,145,390.33**
	CMIC 0.20 %	5,423.09
	DIF 0.20 %	5,423.09
	Total Retenciones Locales	**10,846.18**
	TOTAL RETENCIONES (-)	10,846.18
	SANCION POR RETRASO (-)	0.00
	SUB TOTAL MENOS RETENCIONES	**3,134,544.15**
	RETENCION POR RETRASO (-)	0.00
	REINTEGRO RETENCION (+)	0.00
	Traslado Base 0.00 0.00	
	OTRAS SANCIONES (-)	0.00
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	**TOTAL FACTURA**	**3,134,544.15**

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Condiciones pago : crédito **Forma pago :** (99) Por definir
Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000409201741

Sello digital del CFDI

Qx5BqI9C)2kgCD1sZQ2HlVNFEr8VYHS1/5NRCgfr2436MzDIyiVeqnUGCbhZOQ/t5/7a+5zhwyeSjb3anSUyQnebtLJtEVow24.0VPaJX1UF==kWQpfAbYmgk8
fPpL/8wB42pzDprGZ/NBvxjqGLNB/aZUTfotU5tEGMqi5rSLWkguPe6YWKpLHQstcQJLntLApsZWZCQUrc8heTAFpeQmh3GWuc8CHcti7/9hJdK1pE7/tT
2mn/RPe9bDYL/Cmg0SwxNXVtxbF1GUZQ8ifz5HF32I=nj/1dHRzyXuaIb+zhZ2ivZGp72IR6vh8QuCA3hvYG9rPpW21JoQg==

Sello del SAT

MjI0QRGHUY36pqsnV7yipsbDxgQDem3aCCbn6MO7e1M/IcDi5q6pDlFaUK37yNOuSayC89BMacbiw6J1OH2bK2vxuduRi+PN/9bckyvfe4CJPVlV66AR1=/
qrGYkJcP6267mPqnAkt0n6n1LMzqPOLJZNqN+PMjfAPCo0qf9D1Sm5n5aIeA/8y45=iGqP8+FCjELDrHFS7x1+I2jcbsFIfAhntxdcuqp5SqqdRHP3Q=/szn3
Zy6USTZdQFnRJCJDHHg==gyiXCdPHCbg/sZr+6TOjtNSIAZ2eULORIFnFFE+IePucRrn4+2Rx+IZ VaUfWrqFMT6LIPVUsohHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4cfd5bd6-77d8-4165-8e45-2fa25d4aadb0|2018-06-11T17:55:47|1.00|MCI651010V22|Qx5BqI9C)2kgCD1sZQ2HlVNFEr8VYHS1/5NRCgfr2436M
zDIyiVeqnUGCbhZOQ/t5/7a+5zhwyeSjb3anSUyQnebtLJtEVow24.0VPaJX1UPeiNbQrAbYmgk8fPpL/8wB42pzDprGZ/NBvxjqGLNB/aZUTfotU5tEGMqi5rSLWkguPe6YWKpLHQstcQJLntLApsZWZCQUrc8heTAFpeQmh3GWuc8CHcti7/9hJdK1pE7/tT
2mn/RPe9bDYL/Cmg0SwxNXVtxbF1GUZQ8ifz5HF32I=nj/1dHRzyXuaIb+zhZ2ivZGp72IR6vh8QuCA3hvYG9rPpW21JoQg==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

(http://www.gob.mx/) › Inicio

SHCP : SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*: **RFC emisor*:** **RFC receptor*:**



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA980529MW0	CONTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4CFD5BD6-77D8-4165-8E45-2FA25D4AADB0	2018-06-11T17:55:46	2018-06-11T17:55:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$3,134,544.15	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

English (https://www.gob.mx/en/index)
Temas (https://www.gob.mx/temas)
Reformas (http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com >

Síguenos en

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 176/2017	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)	$	32,910,879.47 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 27 al 31 de Marzo Del 2018		
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD			
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	$	3,145,390.33 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	$	29,765,489.14 CON IVA
RFC CMA-980529MW0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	$	32,910,879.47 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	OBRA NORMAL	$ -	
	OBRA EXCEDENTE	$ **(419,160.25)**	
	OBRA EXTRAORDINARIA	$ **3,130,703.64**	
	IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	$ **2,711,543.39**	

DESCUENTOS

C.M.I.C. DEL 0.2%	$	5,423.09
D.I.F. DEL 0.2%	$	5,423.09
SUMA DESCUENTOS	$	**10,846.18**

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	$	2,711,543.39
AMORT ANTICIPO	$	0.00
SUB-TOTAL	$	2,711,543.39
I.V.A.	$	433,846.94
TOTAL	$	**3,145,390.33**

(CON LETRA)

(TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 33/100 M.N.)

DESCUENTOS	$	10,846.18
SALDO NETO A RECIBIR	$	**3,134,544.15**

AUTORIZO

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE D.O.P.M

ELABORO

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

REVISO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CHIHUAHUA, CHIH., 31 de Marzo deL 2018

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: **$ 3,134,544.15**
(TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.) COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. **11 (Convenio) (Ultima)** CONTRATO No. **176/2017** POR LA CANTIDAD DE : **$ 32,910,879.47** (INCLUYE CONVENIO)
(TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION	$	**2,711,543.39**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	-
SUBTOTAL	$	**2,711,543.39**
IVA	$	**433,846.94**
TOTAL	$	**3,145,390.33**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	$	5,423.09
D.I.F. DEL 0.2%	$	5,423.09
SUMA	**$**	**10,846.18**

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	$ 26,327,329.18
CONVENIO MODIFICATORIO	$ 6,583,550.29
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	$ 29,765,489.14
ESTA ESTIMACION	$ 3,145,390.33
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	$ 32,910,879.47
POR EJERCER	$ 0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	$ 7,898,198.75
ACUMULADO ANTERIOR	$ 7,898,198.75
ESTA ESTIMACION	$ -
ACUMULADO ACTUAL	$ 7,898,198.75
POR AMORTIZAR	$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	$ 51,319.82	$ 51,319.82
ESTA ESTIMACION	$ 5,423.09	$ 5,423.09
ACUMULADO ACTUAL	$ **56,742.91**	$ **56,742.91**

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA-980529MW0

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH

No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	OBRA EXCEDENTE	$ (419,160.25)
	OBRA EXTRAORDINARIA	$ 3,130,703.64

SUBTOTAL	2,711,543.39
I.V.A.	433,846.94
TOTAL	3,145,390.33

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO UNIDAD	PROYECTO VOLUMEN	VOLUMENES ACUM. TOTAL	VOLUMENES ACUM. ANTERIOR	VOLUMENES VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	OBRA EXCEDENTE							
	I.- OBRA CIVIL							$ (419,160.25)
	COMANDANCIA NORTE							$ (419,160.25)
6	**CENTRO DE MONITOREO**							$ (419,160.25)
6.10	**LIMPIEZAS**							$ (3,112.15)
6.10.1	Limpieza gruesa en todo el transcurso de la obra. Incluye el retiro de escombro producto de la misma y llevarlo fuera de la obra.	m2	0.00	0.00	74.40	-74.40	$ 41.83	$ (3,112.15) $ (3,112.15)
7	**COMEDOR**							
7.3	**ESTRUCTURA DE CONCRETO**							$ 47,524.36
7.3.2	Losa de aligerada con caseton de 50 x 60 x 15 cm con un peralte de 20 cms, concreto premezclado f´c= 200 kg/cm2, armada con 2 varillas, #3, en cada nervadura en ambos sentidos + bastones de 2.50 m. al centro del claro, con 1 varilla 4 y 1 # 3, y 1 # 3 de 1.50 m. perimetralmente , Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, silletas, traslapes, desperdicios, maniobras locales, andamios, elevacion de los materiales, acarreos, vaciado, extendido, colado, bombeado, vibrado, curado de concreto con curacreto, andamios, maniobras locales, elevación de los materiales, limpieza del lugar, retiro de material sobrante fuera de la obra, a nivel de obra terminada y todo lo	m2	25.91	63.24	61.20	2.04	$ 995.04	$ 2,029.88 $ 2,029.88
7.4	**FONTANERIA**							$ 9,593.50
7.4.2	Suministro y colocación de tarja , marca CyC mod.UB109, de acero inoxidable, acabado satinado . llave mezcladora para cocina marca Glacier Bay acabado cromo mod.HD67551-0301 , Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	$ 4,615.30	$ 4,615.30
7.4.6	Conexion de tanque de gas estacionario, incluye valvula de llenado, valvula de globo y valvula de seguridad	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	$ 4,978.20	$ 4,978.20
7.9	**CARPINTERIA Y CUBIERTAS**							$ 11,974.36
7.9.2	Suministro y colocación de cubierta de granito en cocineta de comedor. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	3.08	0.00	3.08	$ 3,887.78	$ 11,974.36
7.12	**ACABADOS DE PINTURA**							$ 13,721.40

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
7.12.1	Pintura vinílica en muros, color Grape Beginnings, código CW045W, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	173.23	0.00	173.23	$ 58.88	$ 10,199.78
7.12.2	Pintura vinílica en plafón, color Blanco de linea, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	44.87	0.00	44.87	$ 58.88	$ 2,641.95
7.12.3	Pintura vinílica en cajillo, color Grape Beginnings, código CW045W, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	14.94	0.00	14.94	$ 58.88	$ 879.67
7.13	**AMBIENTACION**							**$ 10,205.22**
7.13.1	Suministro y colocación de follaje artificial para muro verde, en muro , Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	8.62	0.00	8.62	$ 1,183.90	$ 10,205.22
8	**SALA DE JUNTAS Y AREA 911**							**$ (463,572.46)**
8.7	**VENTANERIA DE ALUMINIO**							**$ 13,287.95**
8.7.6	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 mts de ancho x 2.30 mts de altura, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera de 1 m, material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación en acceso a baños por sala de juntas	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	$ 13,287.95	$ 13,287.95
8.9	**CARPINTERIA**							**$ (504,397.35)**
8.9.1	Fabricación e instalación de cocineta en área de café, según diseño. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	0.00	3.50	-3.50	$ 12,423.10	$ (43,480.85)

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
8.9.6	Fabricacion e instalacion de mesa en sala de juntas, fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintaran con poliuretano según lo indique el cliente y despues se aplicara recina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte extrerior se enchapara con laminado plastico color aluminio, se hara la preparacion y se instalacran canaletas de aluminio para instalacion de luz led, (no incluye sistema de iluminacion ni instalacion del mismo, tampoco incluye instalaciones electricas y de equipo de computo)	pza	1.00	0.00	1.00	-1.00	$ 460,916.50	$ (460,916.50)
8.13	**AMBIENTACION**							$ 29,573.82
8.13.2	Suministro y colocación de follaje artificial para muro verde, en muro de 911, 30% en muro en vestibulo de acceso y area de descanso, Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	24.98	0.00	24.98	$ 1,183.90	$ 29,573.82
8.14	**LIMPIEZAS**							$ (2,036.88)
8.14.1	Limpieza gruesa en todo el transcurso de la obra. Incluye el retiro de escombro producto de la misma y llevarlo fuera de la obra.	m2	0.00	0.00	173.81	-173.81	$ 41.83	$ (7,270.47)
8.14.2	Limpieza fina de la obra. Incluye limpieza de pisos, muros, ventanas, muebles y todo lo necesario para que el edificio quede perfectamente limpio.	m2	0.00	161.28	0.00	161.28	$ 32.45	$ 5,233.59
	OBRA EXTRAORDINARIA							$ 3,130,703.64
Ext-25	Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	0.00	213.28	0.00	213.28	$ 105.08	$ 22,411.46
EXT-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE ENETRGIA ELECTRICA PARA ARCOS POR CAMELLON SIN DEMOLICION. INCLUYE: MATERIALES (CABLE DE ALUMINIO1/0, MISELANIOS, POLIDUCTO DE 2" DE DIAMETRO), EXCAVACIONDE ZANJA CON SECCION DE 0.30 X 0.50 M RELLENO DE LA MISMA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 85% DE SU PVSM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Ml.	0.00	785.90	0.00	785.90	183.69	$ 144,361.97

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA ARCOS AEREO CAL 1/0, INCLUYE : MATERIALES (CABLE DE ALUMINIO 2+1, MISELANEOS) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ml.	0.00	173.00	0.00	173.00	141.90	$ 24,548.70
EXT-34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA POR BANQUETA SIN DEMOLICION, INCLUYE: MATERIALES (CABLE XLP 1+1 CAL.4, POLIDUCTO, MISELANEOS), MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ml.	0.00	938.15	0.00	938.15	106.16	$ 99,594.00
EXT-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION DE 40X40X40	pza	0.00	15.00	0.00	15.00	2,535.32	$ 38,029.80
EXT-36	Reubicación de instalaciones eléctricas existentes en ciber operadores, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	5,687.99	$ 5,687.99
EXT-37	Reubicación de UPS dentro del site, incluye banco de baterías, desmantelamiento de alimentador eléctrico y reubicación de tablero de 42 circuitos. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	18,877.18	$ 18,877.18
EXT-38	Suministro e instalación de 4 nodos en mesas adicionales en ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	11,889.21	$ 23,778.42
EXT-39	Reubicación de instalaciones de voz y datos en área de mesas de ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	24,221.83	$ 24,221.83
EXT-40	Fabricación e instalación de zoclo fabricado con MDF de 1/2" de espesor x 4" de altura, pintado con poliuretano color gris acabado semimate. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	39.27	0.00	39.27	249.42	$ 9,794.72
EXT-41	Closet de 3.16 x 2.20 para ocultar tableros eléctricos, fabricado con melamina, bisagras ocultas de la marca Blum y jaladeras tubulares. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	39,491.98	$ 39,491.98
EXT-42	Suministro y colocación de Porta papel marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	4.00	0.00	4.00	1,703.00	$ 6,812.00

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-43	Suministro y colocación de dispensador de jabón marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	1,302.53 $	2,605.06
EXT-44	Suministro y colocación de Porta toallas marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	1,682.23 $	3,364.46
EXT-45	Refuerzo en losa de sala de juntas-pasillo-área 911 a base de armadura de PER de 3" x 3" de 6.76 x 0.60 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	43,884.23 $	43,884.23
EXT-46	Demolición de escalera de concreto de 1.40 x 1.10 mts., en área de ciberoperadores, sin recuperación de material, por medios manuales. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	1,495.36 $	1,495.36
EXT-47	Demolición de lambrin de cerámica en acceso principal (trabajando con gente de oficinas de la comandancia norte) en parte superior de cancel existente en ambas caras. Incluye retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	12.34	0.00	12.34	212.81 $	2,626.08
EXT-48	Demolición dado de concreto en tejaban de 0.27 x 0.30 x 1.12 m. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	191.47 $	382.94
EXT-49	Fabricación, suministro e instalación de tapas de alocubon de 0.10 x 0.30 m para monitores en mesa de sala de juntas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	13.00	0.00	13.00	249.40 $	3,242.20
EXT-50	Suministro e instalación de división de cristal sanitobo de 6 mm templado con película arena en escritorios supervisoras de 911 de 1.70 m x 0.55 m. Incluye mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	2,986.15 $	2,986.15
EXT-51	Suministro y colocación de ventana en comedor, de 1.50 de ancho x 0.96 mts de altura, a base de vidrio sencillo de 6 mm, marco de aluminio G2, acabado anodizado natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	3,710.90 $	11,132.70
EXT-52	Suministro e instalación de vinil blanco en cancel de sala de juntas de 10.00m x 2.10 m., incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	13,712.06 $	13,712.06

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-53	Suministro e instalación de vinil en cancel curvo de sala de juntas a cuatro colores de 3.15 x 2.10 m. y logo de plataforma escudo chihuahua, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	10,741.13	$ 10,741.13
EXT-54	Suministro e instalación de letras de vinil para texto y logos 3D en muro 911, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	5,935.12	$ 5,935.12
EXT-55	Suministro e instalación en arenado y vinil en cancel de acceso a pasillo de distribución de 2.80 x 2.30 incluye materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	6,178.68	$ 6,178.68
EXT-56	Suministro y colocación de vinil y logos en puertas de cristal para accesos de video Wall, cocina y baños de sala de juntas y cancel costado de 911, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	4.00	0.00	4.00	2,148.25	$ 8,593.00
EXT-57	Suministro e instalación de letras de aluminio de BIENVENIDOS y texto del nombre en dos dimensiones y logos en 3D en muro de acceso principal, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	25,675.80	$ 25,675.80
EXT-58	Suministro y colocación de franja doble de vinil con acabado esmerilado de 30 y 5 cms en cancel 911, 18.50 ml. incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	4,142.91	$ 4,142.91
EXT-59	Reparación de plancha de concreto existentes en área de lavabos, incluye retiro de placa de granito existente, materiales, retiro de desperdicios fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	354.79	$ 709.58
EXT-60	Construcción de banqueta de concreto f'c=150kg/cm2. Acabado rayado de 10 cms de espesor en comedor, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	29.14	0.00	29.14	351.29	$ 10,236.59
EXT-61	Aplanado fino en muros interiores a base de basecoat Protekto Plus en área de cocineta, bodega, distribuidor baños y vestíbulo antes de acceso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	80.79	0.00	80.79	194.48	$ 15,712.04
EXT-62	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización con malla reforzada y dos capas de acrílico color blanco, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	76.87	0.00	76.87	179.98	$ 13,835.06

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-63	Suministro e instalación de cerámica Línea Metalic color aluminum para reparación de piso por demolición de sardinel existente en planta alta, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	7.79	0.00	7.79	179.42	$ 1,397.68
EXT-64	Suministro e instalación de cerámica en peraltes de escalones de 0.17 a 0.20 m de altura corte 45 o ángulo de aluminio de 1", con porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	24.76	0.00	24.76	247.48	$ 6,127.60
EXT-65	Construcción de cajillo de tablaroca de 5 caras en cancel de acceso principal de (0.08+0.49+0.26+0.49+0.08 m.), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	6.17	0.00	6.17	687.54	$ 4,242.12
EXT-66	Suministro e instalación de chapa de tablaroca sobre muros y columnas existentes e sala de juntas, área de 911 y descanso, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	122.80	0.00	122.80	232.80	$ 28,587.84
EXT-67	Construcción de cajillo "U" de Tablaroca curvo en cancel de 911, de 0.10 x 0.10 x 0.10 m., incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	14.25	0.00	14.25	623.56	$ 8,885.73
EXT-68	Reparación de muro de tablaroca (por desmantelamiento de zoclo de cerámica) en armería y vestíbulo, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	7.62	0.00	7.62	110.58	$ 842.62
EXT-69	Suministro e instalación de muro curvo touch de 5.20 x 2.45 m, fabricado en muro doble de Tablaroca, estructura metálica para pantalla a base de PTR de 2", incluye: pantalla touch de 80" marca Sharp, dispositivo inalámbrico que se comunica a través de bluetooth para proyectar a los monitores de la mesa de juntas, fotos, videos, etc. que transmiten diferentes dispositivos como computadoras o Smart phone, tabletas, etc. (Black box), tendido de línea con cable HDMI a cada monitor, revestimiento frontal con duela color nogal y escritorio de trabajo curvo de nogal en la parte posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	672,629.24	$ 672,629.24

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-70	Detalle de yeso en ciber operadores de 2.50 ml. por altura variable de o.60 a 1.10 m., incluye preparación de la superficie consistente en rebajar protuberancias existentes, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	1,078.00 $	1,078.00
EXT-71	Bajada de agua pluvial de PVC de 4" de 4.00 m. en comedor, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	1,386.86 $	2,773.72
EXT-72	Reparación de fuga en dren de mini Split existente. Incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	625.00 $	625.00
EXT-73	Mantenimiento y revisión de UPS y revisión de banco de baterías de 60 KVA, incluye solo mano de obra, herramienta (no incluye reparación y cambio de baterías) y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	9,355.33 $	9,355.33
EXT-74	Suministro e Instalación de tablero de distribución de 42 circuitos., interruptor termomagnético 3Px200Ax240V y alimentadores para el área de voltaje normal de la remodelación por espacio insuficiente existente para alumbrado (contactos y climas). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	84,684.11 $	84,684.11
EXT-75	Reubicación de Rack de voz y datos en interior de Site por llegada de equipo nuevo, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	8,916.86 $	8,916.86
EXT-76	Suministro e instalación de 7 nodos adicionales (del SITE a parte posterior de pantallas de video Wall), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	20,806.33 $	20,806.33
EXT-77	Suministro e instalación de bomba de condensados para mini Split en área de descanso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	3,957.70 $	3,957.70
EXT-78	Suministro de control universal para unidad mini Split. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	1,663.51 $	4,990.53
EXT-79	Construcción de peralte a base de tablaroca de 23 cm de altura en cambio de nivel de plafón cerrado curvo de sala de juntas: incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	8.30	0.00	8.30	277.15 $	2,300.35
EXT-80	Suministro e instalación de gas refrigerante R-410A en mini Split de SITE provisional, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	0.00	4.00	0.00	4.00	219.80 $	879.20

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-81	Reposición de rejillas de inyección y retorno en planta alta y planta baja dimensiones variables (por encontrarse en mal estado) incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	7.00	0.00	7.00	1,291.95	$ 9,043.65
EXT-82	Suministro y aplicación de pintura automotriz de PER de 3"X3" existentes en acceso principal, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	609.69	$ 1,219.38
EXT-83	Suministro y aplicación de textura en muros existentes, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	2.16	0.00	2.16	265.00	$ 572.40
EXT-84	Suministro y colocación de piedra decorativa naranja y crema en área posterior del estacionamiento. Incluye preparación de la superficie consistente en rebajar terreno y suministro e instalación de hule negro, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	125.33	0.00	125.33	192.33	$ 24,104.72
EXT-85	Suministro y colocación de yuca, incluye suministro de yuca, sembrado, herramienta, mano de obra, materiales, riego por treinta días y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	466.80	$ 933.60
EXT-86	Suministro y colocación de peces y alimento. Incluye: selección de peces, alimento necesario por 30 días, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	620.00	$ 620.00
EXT-87	Suministro e instalación de señal SR-15 (altura libre 6.00 mts) de 86 cm x 86 cm acabado reflejante, grado ingeniería alta intensidad, con soportes para fijación en travesaño. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y maquinaria y todo para su correcta ejecución.	pza	0.00	8.00	0.00	8.00	4,127.98	$ 33,023.84
EXT-88	Cajillo en "U" área de cancel mesa sala de juntas de 0.20 m x 0.10m x 0.19-0.37 m, a base de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 3 5/8", poste metálico 3 5/8", calibre 26 a cada 0.60 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	0.00	10.17	0.00	10.17	547.34	$ 5,566.45
EXT-89	Nichos en muro de tablaroca de pecera de 25cm x 33cm x 33 cm. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	942.25	$ 2,826.75
EXT-90	Hueco con "T" esmaltada para colocación de lámpara de 0.61 m x 0.61m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	6.00	0.00	6.00	399.64	$ 2,397.84

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-91	Suministro de alfombra modular modelo Cosmos marca Terza mohawk. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	1.00	0.00	1.00	764.83	$ 764.83
EXT-92	Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm, marca Interceramic, en muro de soporte de barra de comedor de 2.00 m. de largo x 1.03 m de altura x 0.15m de espesor, adhesivo porcelánico, Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	4,431.46	$ 4,431.46
EXT-93	Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige, marca Interceramic entre gabinetes de cocina de comedor de 0.54 m de separación, adhesivo porcelánico. Incluye cortes a 45° en área de ventana, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	2,185.33	$ 2,185.33
EXT-94	Pasamanos de acero inoxidable a base de tubular modelo 160, circular de 2", incluye material y mano de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	8.84	0.00	8.84	3,524.33	$ 31,155.08
EXT-95	Suministro y colocación de cancel con desarrollo de 2.83 m., incluye: 2 puertas abatibles de 1.00 m de ancho x 2.30 m de altura y 2 fijos de 0.415mts de ancho x 2.30 mts de altura, en pasillo de distribución, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera, material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	28,655.79	$ 28,655.79
EXT-96	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 m de ancho x 2.20 m de altura, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera , mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución en acceso a baños por sala de juntas	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	13,287.97	$ 13,287.97
EXT-97	Suministro y colocación de cancel, en acceso principal de cristal solite claro de 9.5 mm. templado, con herrajes de acero inoxidable compuesto por fijos y 2 puertas, de 6.17 m de desarrollo x 2.25 m de altura, incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	52,196.13	$ 52,196.13

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-98	Suministro y colocación de canceles laterales en área 911, de 5.17 m de desarrollo x 2.20 m de altura, y 1.45 m de desarrollo x 2.20 m, de altura, más 1 puerta abatible de 0.90 x 2.20 a base de cristal templado de 9 mm de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	78,623.27 $	78,623.27
EXT-99	Reinstalación de cancel de aluminio existente en planta alta de 2.72m x 2.30 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	3,062.78 $	3,062.78
EXT-100	Suministro e instalación de junta fría en pisos de cerámica por indicaciones del proveedor a base de cola de rata y sello con sika 1ª. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	195.75	0.00	195.75	117.80 $	23,059.35
EXT-101	Suministro e instalación de manguera tipo led de 9w, 120v colocada en plafón de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	65.00	0.00	65.00	134.81 $	8,762.65
EXT-102	Reacomodo de antenas de radios en azotea. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	12,341.83 $	12,341.83
EXT-103	Suministro e instalación de termostato digital programable marca Honeywell en el sitio indicado por la Supervisión en el área de ciber operadores. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	3,928.78 $	3,928.78
EXT-104	Suministro e instalación de desconectador electromecánico de 3Px100Ax240V en gabinete nema 3R para unidad de refrigeración de 15 Toneladas de Refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	6,961.87 $	6,961.87
EXT-105	Suministro e instalación de cable armoflex cal. 3x12 en caja FS., para conexión de mesas de control en video Wall. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	5.00	0.00	5.00	261.64 $	1,308.20
EXT-106	Suministro e instalación de alimentación eléctrica a la torre de antenas ubicada en la azotea. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	20.00	0.00	20.00	123.56 $	2,471.20

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-107	Suministro e instalación de manguera tipo LED 5050, 120V, atenuable en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	46.06	0.00	46.06	210.47 $	9,694.25
EXT-108	Suministro e Instalación de alimentación eléctrica desde UPS a mesas de ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	6,191.90 $	6,191.90
EXT-109	Suministro e instalación de contacto doble polarizado 120 v., 15 amps, con eliminador de 120 a 5 v. salida USB en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	13.00	0.00	13.00	1,233.13 $	16,030.69
EXT-110	Suministro e instalación de apagador doble. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	4.00	0.00	4.00	600.12 $	2,400.48
EXT-111	Desinstalación de luminaria en video Wall, retiro y acarreo a donde lo indique la supervisión de la Dependencia. Incluye: mano de obra, traslados, almacenamientos temporales, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	10.00	0.00	10.00	220.77 $	2,207.70
EXT-112	Suministro e instalación de contacto cuádruple en mesa de 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	13.00	0.00	13.00	1,010.08 $	13,131.04
EXT-113	Suministro e instalación de registro metálico de 30x30x20cm con tapa en site y 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	733.64 $	2,200.92
EXT-114	Suministro e instalación de alimentador eléctrico formado por 2C-THWLS-6(F) + 1C-THWLS-10(T) en 1T-PGG-27mm, para unidades de refrigeración de 5 toneladas en site. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	38.00	0.00	38.00	276.11 $	10,492.18
EXT-115	Suministro e instalación de luminario LED colgante de 122x10cm, 120V, 1x18w, marca Lithonia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	1,338.27 $	1,338.27
EXT-116	Alimentación eléctrica a comedor desde cuarto de sistema contra incendios (adosada a barda perimetral). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	50,757.35 $	50,757.35

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-117	Suministro, instalación, conexión, automatización, sincronización y puesta en marcha de mecanismos de elevación para monitores de 21.5". Incluye: monitor de 21.5" en mesa de juntas, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	13.00	0.00	13.00	27,729.12 $	360,478.56
EXT-118	Suministro e instalación de tanque de gas de 300 litros. Incluye: regulador, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	10,204.71 $	10,204.71
EXT-119	Fabricación de cajillo "U" recto de Tablaroca de 10 x 10 x 10 cms, para cancel área 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	8.62	0.00	8.62	482.33 $	4,157.68
EXT-120	Suministro y colocación de cubierta de granito en barra de comedor de 2.80 x 0.80 m. con faldón de 20 cms. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	2.87	0.00	2.87	7,303.82 $	20,961.96
EXT-121	Salida sanitaria para unidades de refrigeración a base de tubo de PVC de 1". Incluye coples, codos, tees, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	589.26 $	1,767.78
EXT-122	Suministro e instalación de follaje artificial en muro de vestíbulo principal. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8.00	0.00	8.00	1,644.30 $	13,154.40
EXT-123	Instalación de placa conmemorativa curva de 1.65 x 0.70 m, (proporcionada por la DSPM), con refuerzo de madera de 1" x 2". Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	1,816.55 $	1,816.55
EXT-124	Suministro e instalación de tope de piso para puerta. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8.00	0.00	8.00	363.31 $	2,906.48
EXT-125	Desmontaje y reubicación de mini Split de anterior site a site temporal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	14,981.90 $	29,963.80
EXT-126	Fabricación de Cajillo en "U" a base de Durock de 12 x 20 x 12 cms, para ocultar bajadas de agua pluvial. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	7.31	0.00	7.31	744.12 $	5,439.52

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-127	Reparación de grietas en sala de juntas de dirección y oficinas anexas. Incluye: preparación de la superficie consistente en abrir hueco, colocación de malla de refuerzo y aplanado a base de protecto plus, aplicación de textura, pintura, limpieza general y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza	0.00	1.00	0.00	1.00	21,307.94 $	21,307.94
EXT-128	Suministro de los materiales en MDF y fabricación de cocineta con gabinete en la parte superior de 60 cms. de alto, considerando espacio libre para refrigerador, en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	0.00	3.67	0.00	3.67	17,294.93 $	63,472.39
EXT-129	Remate de pretil rellenando todas las celdas y perfil de cara superior. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	31.42	0.00	31.42	229.22 $	7,202.09
EXT-130	Preparación de gas para tanque estacionario con tubo de cobre tipo "L" de 13mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	5,167.37 $	5,167.37
EXT-131	Suministro e instalación de cinta de protección antiderrapante al bajar peraltes en acceso a monitoreo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	4.74	0.00	4.74	150.34 $	712.61
EXT-132	Suministro de los materiales en MDF y fabricación de Cocineta con gabinete en la parte de arriba de 60 cms. de alto, fabricada en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	0.00	3.53	0.00	3.53	17,294.93 $	61,051.10
EXT-133	Muro a una cara pegado a muro de block para generar jardín vertical, con tapas laterales, a base de una capa de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 2 1/2", poste metálico de 2 1/2", calibre 26 a cada 0.60m. Incluye: material, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	0.00	8.62	0.00	8.62	380.99 $	3,284.13

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: 176/2017

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 11 (Convenio) (Ultima)

PERIODO: 27 al 31 de Marzo Del 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-134	Fabricación e instalación de mesa en sala de juntas de 10.70 m. x (1.30-2.48-1.30), fabricada con estructura de madera de pino y , forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta se pintara con poliuretano según lo indique el cliente y después se aplicara resina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte exterior se enchapara con laminado plástico color aluminio, se hará la preparación y se instalaran canaletas de aluminio para instalación de luz led, (no incluye sistema de iluminación ni instalación del mismo, tampoco incluye instalaciones eléctricas y de equipo de cómputo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	511,142.40 $	511,142.40
EXT-135	Construcción de Cajillo en "L" área de pasillo principal de 0.10 cm de peralte por ancho variable de 0.10 a 0.80 m., a base de tablero de yeso de 1/2". Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00	32.65	0.00	32.65	482.75 $	15,761.79
EXT-136	Desmontaje de mini Split de instalado en área del site temporal (sala de descanso actual). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	1,169.64 $	1,169.64
EXT-137	Reubicación de salida sanitaria para mingitorios a base de tubo PVC de 2", incluye: demolición sobre muro existente, materiales, conexión a la red sanitaria, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	4,508.27 $	4,508.27
EXT-138	Recubrimiento de escalera para bajar de vestíbulo con porcelanato Absolute beige de 60 cm x60 cm, consta de 3 huellas de 2.00 m x 0.30 m y 4 peraltes de 2.00m x0.17.Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	4,968.08 $	4,968.08
EXT-139	Suministro y colocación de puerta abatible, de 0.97 mts de ancho x 2.30 mts de altura, area de site, abatible, a base de vidrio de 6mm, aluminio G2, acabado anodizando natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	4,273.30 $	4,273.30

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

21 De febrero Del 2018

ASUNTO: CONTINUIDAD DE TRABAJOS POR TIEMPO INDETERMINADO.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.-

Con relación a la Obra: **"OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH."** Que ampara el **CONTRATO No. 176/2017,** al respecto por este conducto le informo que debido a la las necesidades y tiempos de entrega del proyecto, **continuaremos ejerciendo los trabajos relacionados con la obra por nuestra cuenta**, sabiendo que tendremos que utilizar dobles turnos y horas extras por el tiempo de entrega, así como materiales necesarios para la obra los cuales corren también por cuenta nuestra durante el tiempo necesario.

Todos estos volúmenes de trabajos y extras que se presenten los conciliaremos con los residentes encargados que representan su dependencia, por lo cual cobraremos estos cuando esté disponible el recurso del convenio modificatorio, dependiendo del lapso del tiempo en que se tenga que cobrar este, presentaremos estimaciones de acuerdo al tiempo de ejecución que tenga el convenio.

Sin otro particular quedo de Ud.

RECIBÍ:
21/FEB/2018

ATENTAMENTE

I.C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CHIHUAHUA Juntos, una mejor ciudad 2016 2018 21 FEB 2018 10:30 RECIBIDO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Ing. Leninn A.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 21 FEB 2018 RECIBIDO DIRECCIÓN

C.c.p. Arq. Carlos Aguilar Garcia- Subdirector de Infraestructura de Obras Públicas DOMP
C.c.p. Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala- Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana DOMP
C.c.p. Ing. Guillermo Campos- Lider de proyectos DOMP
C.c.p. Arq. Jorge Palacios Ceballos – Residente de Obra DOMP
C.c.p. Ing. Leninn Jesús Ayala Chávez – Residente de Obra DOMP

CHIHUAHUA Juntos, una mejor ciudad 2016 2018 RECIBIDO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, acordado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua por un periodo de 5 años.

Ribiana Rgz. 21-Feb-2018 11:48

PROGRESO 102-1 e-mail mr@cmarro.com TELS. Y FAX (614)410-95-50 y (614)410-91-51 CHIHUAHUA, CHIH.

OFICIO No. D-801/2018

27 de marzo de 2018

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años

ING. MARIO RODRIGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 09 de marzo del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.,"**, que al amparo del contrato No. **176/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-32	Suministro e instalación de acometida de energía eléctrica para arcos por camellón sin demolición. Incluye: materiales (cable de aluminio 1/0, misceláneos, poliducto de 2" de diámetro), excavación de zanja con sección de 0.30x0.50 m relleno de la misma con material producto de la excavación compactado al 85% de su PVSM, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	850	m	$183.69
EXT-33	Suministro e instalación de acometida de energía eléctrica para arcos aéreo cal 1/0. Incluye: materiales (cable de aluminio 2+1, misceláneos,), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	250	m	$141.90
EXT-34	Suministro e instalación de acometida de energía eléctrica por banqueta, sin demolición. Incluye: materiales (cable XLP 1+1 cal 4, poliducto, misceláneos,), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,050	m	$106.16
EXT-35	Suministro e instalación de registro de concreto hidráulico prefabricado para baja tensión de 40 x 40 x 40	15	pza	$2,535.32

Recibi original
marso 27
Guadalupe Rascon. MARRO

OFICIO No. D-801/2018

cm. Incluye materiales, mano de obra, excavación, nivelación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO $341,109.30 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefa del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p.-Ing. Lenin Ayala Chávez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcm*

OFICIO No. D-0817/2018

27 de marzo de 2018

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años

ING. MARIO RODRIGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a sus Escritos S/N de fechas 27 de marzo del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.,"**, que al amparo del contrato No. **176/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-36	Reubicación de instalaciones eléctricas existentes en ciber operadores, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$5,687.99
EXT-37	Reubicación de UPS dentro del site, incluye banco de baterías, desmantelamiento de alimentador eléctrico y reubicación de tablero de 42 circuitos. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$18,877.18
EXT-38	Suministro e instalación de 4 nodos en mesas adicionales en ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	pza	$11,889.21
EXT-39	Reubicación de instalaciones de voz y datos en área de mesas de ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$24,221.83
EXT-40	Fabricación e instalación de zoclo fabricado con MDF de 1/2" de espesor x 4" de altura, pintado con poliuretano color gris acabado semimate. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	46.82	m	$249.42
EXT-41	Closet de 3.16 x 2.20 para ocultar tableros eléctricos, fabricado con melamina, bisagras ocultas de la marca Blum y	1.00	pza	$39,491.98

	jaladeras tubulares. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
EXT-42	Suministro y colocación de Porta papel marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.00	pza	$1,703.00
EXT-43	Suministro y colocación de dispensador de jabón marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	2.00	pza	$1,302.53
EXT-44	Suministro y colocación de Porta toallas marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	pza	$1,682.23
EXT-45	Refuerzo en losa de sala de juntas-pasillo-área 911 a base de armadura de PER de 3" x 3" de 6.76 x 0.60 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$43,884.23
EXT-46	Demolición de escalera de concreto de 1.40 x 1.10 mts., en área de ciberoperadores, sin recuperación de material, por medios manuales. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$1,495.36
EXT-47	Demolición de lambrin de cerámica en acceso principal (trabajando con gente de oficinas de la comandancia norte) en parte superior de cancel existente en ambas caras. Incluye retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.34	m	$212.81
EXT-48	Demolición dado de concreto en tejaban de 0.27 x 0.30 x 1.12 m. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	pza	$191.47
EXT-49	Fabricación, suministro e instalación de tapas de alocubon de 0.10 x 0.30 m para monitores en mesa de sala de juntas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13.00	pza	$249.40
EXT-50	Suministro e instalación de división de cristal sanitobo de 6 mm templado con película arena en escritorios supervisoras de 911 de 1.70 m x 0.55 m. Incluye mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	2,986.15
EXT-51	Suministro y colocación de ventana en comedor, de 1.50 de ancho x 0.96 mts de altura, a base de vidrio sencillo de 6 mm,	3.00	pza	3,710.90

	marco de aluminio G2, acabado anodizado natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.			
EXT-52	Suministro e instalación de vinil blanco en cancel de sala de juntas de 10.00m x 2.10 m., incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	13,712.06
EXT-53	Suministro e instalación de vinil en cancel curvo de sala de juntas a cuatro colores de 3.15 x 2.10 m. y logo de plataforma escudo chihuahua, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$10,741.13
EXT-54	Suministro e instalación de letras de vinil para texto y logos 3D en muro 911, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$5,935.12
EXT-55	Suministro e instalación en arenado y vinil en cancel de acceso a pasillo de distribución de 2.80 x 2.30 incluye materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$6,178.68
EXT-56	Suministro y colocación de vinil y logos en puertas de cristal para accesos de video Wall, cocina y baños de sala de juntas y cancel costado de 911, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.00	pza	$2,148.25
EXT-57	Suministro e instalación de letras de aluminio de BIENVENIDOS y texto del nombre en dos dimensiones y logos en 3D en muro de acceso principal, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$25,675.80
EXT-58	Suministro y colocación de franja doble de vinil con acabado esmerilado de 30 y 5 cms en cancel 911, 18.50 ml. incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$4,142.91
EXT-59	Reparación de plancha de concreto existentes en área de lavabos, incluye retiro de placa de granito existente, materiales, retiro de desperdicios fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	pza	$354.79
EXT-60	Construcción de banqueta de concreto f'c=150kg/cm2. Acabado rayado de 10 cms de espesor en comedor, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	29.62	m2	$351.29

EXT-61	Aplanado fino en muros interiores a base de basecoat Protekto Plus en área de cocineta, bodega, distribuidor baños y vestíbulo antes de acceso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	92.00	m2	$194.48
EXT-62	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización con malla reforzada y dos capas de acrílico color blanco, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	72.44	m2	$179.98
EXT-63	Suministro e instalación de cerámica Línea Metalic color aluminum para reparación de piso por demolición de sardinel existente en planta alta, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7.78	m	$179.42
EXT-64	Suministro e instalación de cerámica en peraltes de escalones de 0.17 a 0.20 m de altura corte 45 o ángulo de aluminio de 1", con porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	16.20	m	$247.48
EXT-65	Construcción de cajillo de tablaroca de 5 caras en cancel de acceso principal de (0.08+0.49+0.26+0.49+0.08 m.), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.23	m	$687.54
EXT-66	Suministro e instalación de chapa de tablaroca sobre muros y columnas existentes e sala de juntas, área de 911 y descanso, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	118.22	m2	$232.80
EXT-67	Construcción de cajillo "U" de Tablaroca curvo en cancel de 911, de 0.10 x 0.10 x 0.10 m., incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	14.20	m	$623.56
EXT-68	Reparación de muro de tablaroca (por desmantelamiento de zoclo de cerámica) en armería y vestíbulo, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8.00	m	$110.58
EXT-69	Suministro e instalación de muro curvo touch de 5.20 x 2.45 m, fabricado en muro doble de Tablaroca, estructura metálica para pantalla a base de PTR de 2", incluye: pantalla touch de 80" marca Sharp, dispositivo inalámbrico que se comunica a través de bluetooth para proyectar a los monitores de la mesa de juntas, fotos, videos, etc. que transmiten diferentes dispositivos como computadoras o Smart phone, tabletas, etc.	1.00	pza	$672,629.24

	(Black box), tendido de línea con cable HDMI a cada monitor, revestimiento frontal con duela color nogal y escritorio de trabajo curvo de nogal en la parte posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
EXT-70	Detalle de yeso en ciber operadores de 2.50 ml. por altura variable de o.60 a 1.10 m., incluye preparación de la superficie consistente en rebajar protuberancias existentes, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$1,078.00
EXT-71	Bajada de agua pluvial de PVC de 4" de 4.00 m. en comedor, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	pza	$1,386.86
EXT-72	Reparación de fuga en dren de mini Split existente. Incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$625.00
EXT-73	Mantenimiento y revisión de UPS y revisión de banco de baterías de 60 KVA, incluye solo mano de obra, herramienta (no incluye reparación y cambio de baterías) y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$9,355.33
EXT-74	Suministro e Instalación de tablero de distribución de 42 circuitos., interruptor termomagnético 3Px200Ax240V y alimentadores para el área de voltaje normal de la remodelación por espacio insuficiente existente para alumbrado (contactos y climas). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$84,684.11
EXT-75	Reubicación de Rack de voz y datos en interior de Site por llegada de equipo nuevo, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$8,916.86
EXT-76	Suministro e instalación de 7 nodos adicionales (del SITE a parte posterior de pantallas de video Wall), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$20,806.33
EXT-77	Suministro e instalación de bomba de condensados para mini Split en área de descanso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$3,957.70
EXT-78	Suministro de control universal para unidad mini Split. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.00	pza	$1,663.51
EXT-79	Construcción de peralte a base de tablaroca de 23 cm de altura en cambio de nivel de plafón cerrado curvo de sala de	8.45	m	$277.15

	juntas: incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
EXT-80	Suministro e instalación de gas refrigerante R-410A en mini Split de SITE provisional, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.00	kg	$219.80
EXT-81	Reposición de rejillas de inyección y retorno en planta alta y planta baja, dimensiones variables (por encontrarse en mal estado), incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7.00	pza	$1,291.95
EXT-82	Suministro y aplicación de pintura automotriz de PER de 3"X3" existentes en acceso principal, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	pza	$609.69
EXT-83	Suministro y aplicación de textura en muros existentes, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19.86	m2	$265.00
EXT-84	Suministro y colocación de piedra decorativa naranja y crema en área posterior del estacionamiento. Incluye preparación de la superficie consistente en rebajar terreno y suministro e instalación de hule negro, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	115.00	m2	$192.33
EXT-85	Suministro y colocación de yuca, incluye suministro de yuca, sembrado, herramienta, mano de obra, materiales, riego por treinta días y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	pza	$466.80
EXT-86	Suministro y colocación de peces y alimento. Incluye: selección de peces, alimento necesario por 30 días, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$620.00
EXT-87	Suministro e instalación de señal SR-15 (altura libre 6.00 mts) de 86 cm x 86 cm acabado reflejante, grado ingeniería alta intensidad, con soportes para fijación en travesaño. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y maquinaria y todo para su correcta ejecución.	8.00	pza	$4,127.98
EXT-88	Cajillo en "U" área de cancel mesa sala de juntas de 0.20 m x 0.10m x 0.19-0.37 m, a base de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 3 5/8", poste metálico 3 5/8", calibre 26 a cada 0.60 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	10.00	m	$547.34
EXT-89	Nichos en muro de tablaroca de pecera de 25cm x 33cm x 33 cm. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo,	3.00	pza	$942.25

	cm. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
EXT-90	Hueco con "T" esmaltada para colocación de lámpara de 0.61 m x 0.61m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	pza	$399.64
EXT-91	Suministro de alfombra modular modelo Cosmos marca Terza mohawk. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	m2	$764.83
EXT-92	Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm, marca Interceramic, en muro de soporte de barra de comedor de 2.00 m. de largo x 1.03 m de altura x 0.15m de espesor, adhesivo porcelánico, Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$4,431.46
EXT-93	Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige, marca Interceramic entre gabinetes de cocina de comedor de 0.54 m de separación, adhesivo porcelánico. Incluye cortes a 45° en área de ventana, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$2,185.33
EXT-94	Pasamanos de acero inoxidable a base de tubular modelo 160, circular de 2", incluye material y mano de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8.84	m	$3,524.33
EXT-95	Suministro y colocación de cancel con desarrollo de 2.83 m., incluye: 2 puertas abatibles de 1.00 m de ancho x 2.30 m de altura y 2 fijos de 0.415mts de ancho x 2.30 mts de altura, en pasillo de distribución, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera, material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$28,655.79
EXT-96	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 m de ancho x 2.20 m de altura, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera , mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución en acceso a baños por sala de juntas	1.00	pza	$13,287.97

OFICIO No. D-0817/2018

EXT-97	Suministro y colocación de cancel, en acceso principal de cristal solite claro de 9.5 mm. templado, con herrajes de acero inoxidable compuesto por fijos y 2 puertas, de 6.17 m de desarrollo x 2.25 m de altura, incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$52,196.13
EXT-98	Suministro y colocación de canceles laterales en área 911, de 5.17 m de desarrollo x 2.20 m de altura, y 1.45 m de desarrollo x 2.20 m, de altura, más 1 puerta abatible de 0.90 x 2.20 a base de cristal templado de 9 mm de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$78,623.27
EXT-99	Reinstalación de cancel de aluminio existente en planta alta de 2.72m x 2.30 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$3,062.78
EXT-100	Suministro e instalación de junta fría en pisos de cerámica por indicaciones del proveedor a base de cola de rata y sello con sika 1ª. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	168.40	m	$117.80

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO $1'498,059.98 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Lenin Ayala Chávez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo

CHCG/CAG/ELDS/gon*

OFICIO No. D-0839/2018

28 de marzo de 2018

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años

ING. MARIO RODRIGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 27 de marzo del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.,"**, que al amparo del contrato No. **176/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-101	Suministro e instalación de manguera tipo led de 9w, 120v colocada en plafón de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	80.00	m	$ 134.81
EXT-102	Reacomodo de antenas de radios en azotea. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$ 12,341.83
EXT-103	Suministro e instalación de termostato digital programable marca Honeywell en el sitio indicado por la Supervisión en el área de ciber operadores. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$ 3,928.78
EXT-104	Suministro e instalación de desconectador electromecánico de 3Px100Ax240V en gabinete nema 3R para unidad de refrigeración de 15 Toneladas de Refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$ 6,961.87
EXT-105	Suministro e instalación de cable armoflex cal. 3x12 en caja FS., para conexión de mesas de control en video Wall. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5.00	pza	$ 261.64
EXT-106	Suministro e instalación de alimentación eléctrica a la	20.00	m	$ 123.56

	torre de antenas ubicada en la azotea. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
EXT-107	Suministro e instalación de manguera tipo LED 5050, 120V, atenuable en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	75.00	m	$	210.47
EXT-108	Suministro e Instalación de alimentación eléctrica desde UPS a mesas de ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$	6,191.90
EXT-109	Suministro e instalación de contacto doble polarizado 120 v., 15 amps, con eliminador de 120 a 5 v. salida USB en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13.00	pza	$	1,233.13
EXT-110	Suministro e instalación de apagador doble. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	pza	$	600.12
EXT-111	Desinstalación de luminaria en video Wall, retiro y acarreo a donde lo indique la supervisión de la Dependencia. Incluye: mano de obra, traslados, almacenamientos temporales, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	pza	$	220.77
EXT-112	Suministro e instalación de contacto cuádruple en mesa de 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13.00	pza	$	1,010.08
EXT-113	Suministro e instalación de registro metálico de 30x30x20cm con tapa en site y 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	pza	$	733.64
EXT-114	Suministro e instalación de alimentador eléctrico formado por 2C-THWLS-6(F) + 1C-THWLS-10(T) en 1T-PGG-27mm, para unidades de refrigeración de 5 toneladas en site. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	38.00	m	$	276.11
EXT-115	Suministro e instalación de luminario LED colgante de 122x10cm, 120V, 1x18w, marca Lithonia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$	1,338.27

EXT-116	Alimentación eléctrica a comedor desde cuarto de sistema contra incendios (adosada a barda perimetral). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$ 50,757.35
EXT-117	Suministro, instalación, conexión, automatización, sincronización y puesta en marcha de mecanismos de elevación para monitores de 21.5". Incluye: monitor de 21.5" en mesa de juntas, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13.00	pza	$ 27,729.12
EXT-118	Suministro e instalación de tanque de gas de 300 litros. Incluye: regulador, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$ 10,204.71
EXT-119	Fabricación de cajillo "U" recto de Tablaroca de 10 x 10 x 10 cms, para cancel área 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7.50	m	$ 482.33
EXT-120	Suministro y colocación de cubierta de granito en barra de comedor de 2.80 x 0.80 m. con faldón de 20 cms. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.80	m	$ 7,303.82
EXT-121	Salida sanitaria para unidades de refrigeración a base de tubo de PVC de 1". Incluye coples, codos, tees, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	pza	$ 589.26
EXT-122	Suministro e instalación de follaje artificial en muro de vestíbulo principal. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8.00	pza	$ 1,644.30
EXT-123	Instalación de placa conmemorativa curva de 1.65 x 0.70 m, (proporcionada por la DSPM), con refuerzo de madera de 1" x 2". Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$ 1,816.55
EXT-124	Suministro e instalación de tope de piso para puerta. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.00	pza	$ 363.31
EXT-125	Desmontaje y reubicación de mini Split de anterior site a site temporal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo	2.00	pza	$ 14,981.90

OFICIO No. D-0839/2018

	necesario para su correcta ejecución.			
EXT-126	Fabricación de Cajillo en "U" a base de Durock de 12 x 20 x 12 cms, para ocultar bajadas de agua pluvial. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.40	m	$ 744.12
EXT-127	Reparación de grietas en sala de juntas de dirección y oficinas anexas. Incluye: preparación de la superficie consistente en abrir hueco, colocación de malla de refuerzo y aplanado a base de protecto plus, aplicación de textura, pintura, limpieza general y todo lo necesario para su correcta ejecución	1.00	Pza	$ 21,307.94
EXT-128	Suministro de los materiales en MDF y fabricación de cocineta con gabinete en la parte superior de 60 cms. de alto, considerando espacio libre para refrigerador, en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.65	m	$ 17,294.93
EXT-129	Remate de pretil rellenando todas las celdas y perfil de cara superior. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	32.00	m	$ 229.22
EXT-130	Preparación de gas para tanque estacionario con tubo de cobre tipo "L" de 13mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$ 5,167.37
EXT-131	Suministro e instalación de cinta de protección antiderrapante al bajar peraltes en acceso a monitoreo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5.00	m	$ 150.34
EXT-132	Suministro de los materiales en MDF y fabricación de Cocineta con gabinete en la parte de arriba de 60 cms. de alto, fabricada en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.85	m	$ 17,294.93

EXT-133	Muro a una cara pegado a muro de block para generar jardín vertical, con tapas laterales, a base de una capa de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 2 1/2", poste metálico de 2 1/2", calibre 26 a cada 0.60m. Incluye: material, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8.90	M2	$	380.99
EXT-134	Fabricación e instalación de mesa en sala de juntas de 10.70 m. x (1.30-2.48-1.30), fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta se pintara con poliuretano según lo indique el cliente y después se aplicara resina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte exterior se enchapara con laminado plástico color aluminio, se hará la preparación y se instalaran canaletas de aluminio para instalación de luz led, (no incluye sistema de iluminación ni instalación del mismo, tampoco incluye instalaciones eléctricas y de equipo de cómputo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$	511,142.40
EXT-135	Construcción de Cajillo en "L" área de pasillo principal de 0.10 cm de peralte por ancho variable de 0.10 a 0.80 m., a base de tablero de yeso de 1/2". Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	76.96	m	$	482.75
EXT-136	Desmontaje de mini Split de instalado en área del site temporal (sala de descanso actual). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza	$	1,169.64
EXT-137	Reubicación de salida sanitaria para mingitorios a base de tubo PVC de 2", incluye: demolición sobre muro existente, materiales, conexión a la red sanitaria, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	pza		$ 4,508.27
EXT-138	Recubrimiento de escalera para bajar de vestíbulo con porcelanato Absolute beige de 60 cm x60 cm, consta de 3 huellas de 2.00 m x 0.30 m y 4 peraltes de 2.00m x0.17.Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	$	4,968.08

OFICIO No. D-0839/2018

EXT-139	Suministro y colocación de puerta abatible, de 0.97 mts de ancho x 2.30 mts de altura, área de site, abatible, a base de vidrio de 6mm, aluminio G2, acabado anodizando natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	1	pza	$	4,273.30

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO $1'336,552.05 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala -Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Lenin Ayala Chávez -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.
CHCG/CAG/ELDS/gcr

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
6.10.1					
	Largo	**Ancho**	**Total**		
Limpieza gruesa en todo el transcurso de la obra. Incluye el retiro de escombro producto de la misma y llevarlo fuera de la obra.	1.84	-1.36	-2.50		
	1.50	-0.70	-1.05		
	2.00	-0.70	-1.40		
	4.40	-2.00	-8.80		
	4.00	-1.50	-6.00		
		TOTAL	**-19.75**		**-19.75**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.3.2						
Losa de aligerada con caseton de 50 x 60 x 15 cm con un peralte de 20 cms, concreto premezclado f´c= 200 kg/cm2, armada con 2 varillas, #3, en cada nervadura en ambos sentidos + bastones de 2.50 m. al centro del claro, con 1 varilla 4 y 1 # 3, y 1 # 3 de 1.50 m. perimetralmente , Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, silletas, traslapes, desperdicios, maniobras locales, andamios, elevacion de los materiales, acarreos, vaciado, extendido, colado, bombeado, vibrado, curado de concreto con curacreto, andamios, maniobras locales, elevación de los materiales, limpieza del lugar, retiro de material sobrante fuera de la obra, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Ancho**	**Total**			**2.04**
	10 20	0.20	2.04			
		TOTAL	**2.04**			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

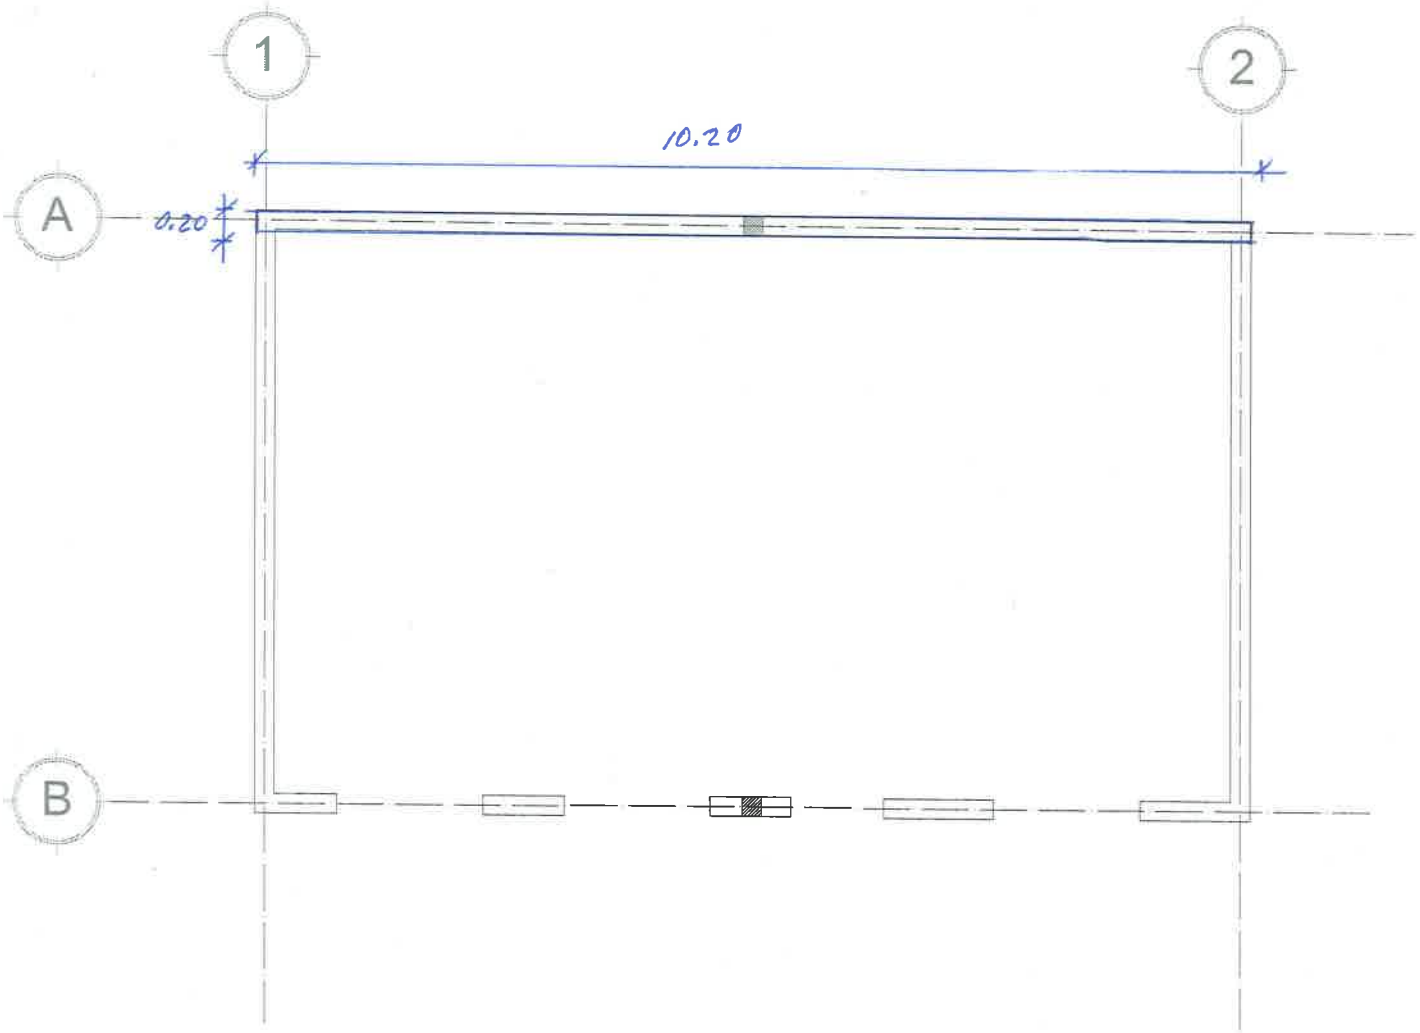

7.3.2 - Losa aligerada con casetón ...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.





7.3.2. Losa de aligerada con caseton de 50 x 60 x 15 cm con un peralte de 20 cms, concreto premezclado f´c= 200 kg/cm2, armada con 2 varillas, #3, en cada nervadura en ambos sentidos + bastones de 2.50 m. al centro del claro, con 1 varilla 4 y 1 # 3, y 1 # 3 de 1.50 m. perimetralmente , Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, silletas, traslapes, desperdicios, maniobras locales, andamios, elevacion de los materiales, acarreos, vaciado, extendido, colado, bombeado, vibrado, curado de concreto con curacreto, andamios, maniobras locales, elevación de los materiales, limpieza del lugar, retiro de material sobrante fuera de la obra, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.9.6					
		Largo	**Total**		
Fabricacion e instalacion de mesa en sala de juntas, fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintaran con poliuretano según lo indique el cliente y despues se aplicara recina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte extrerior se enchapara con laminado plastico color aluminio, se hara la preparacion y se instalacran canaletas de aluminio para instalacion de luz led, (no incluye sistema de iluminacion ni instalacion del mismo, tampoco incluye instalaciones electricas y de equipo de computo)					
		-1.00	-1.00		
		TOTAL	**-1.00**		**-1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

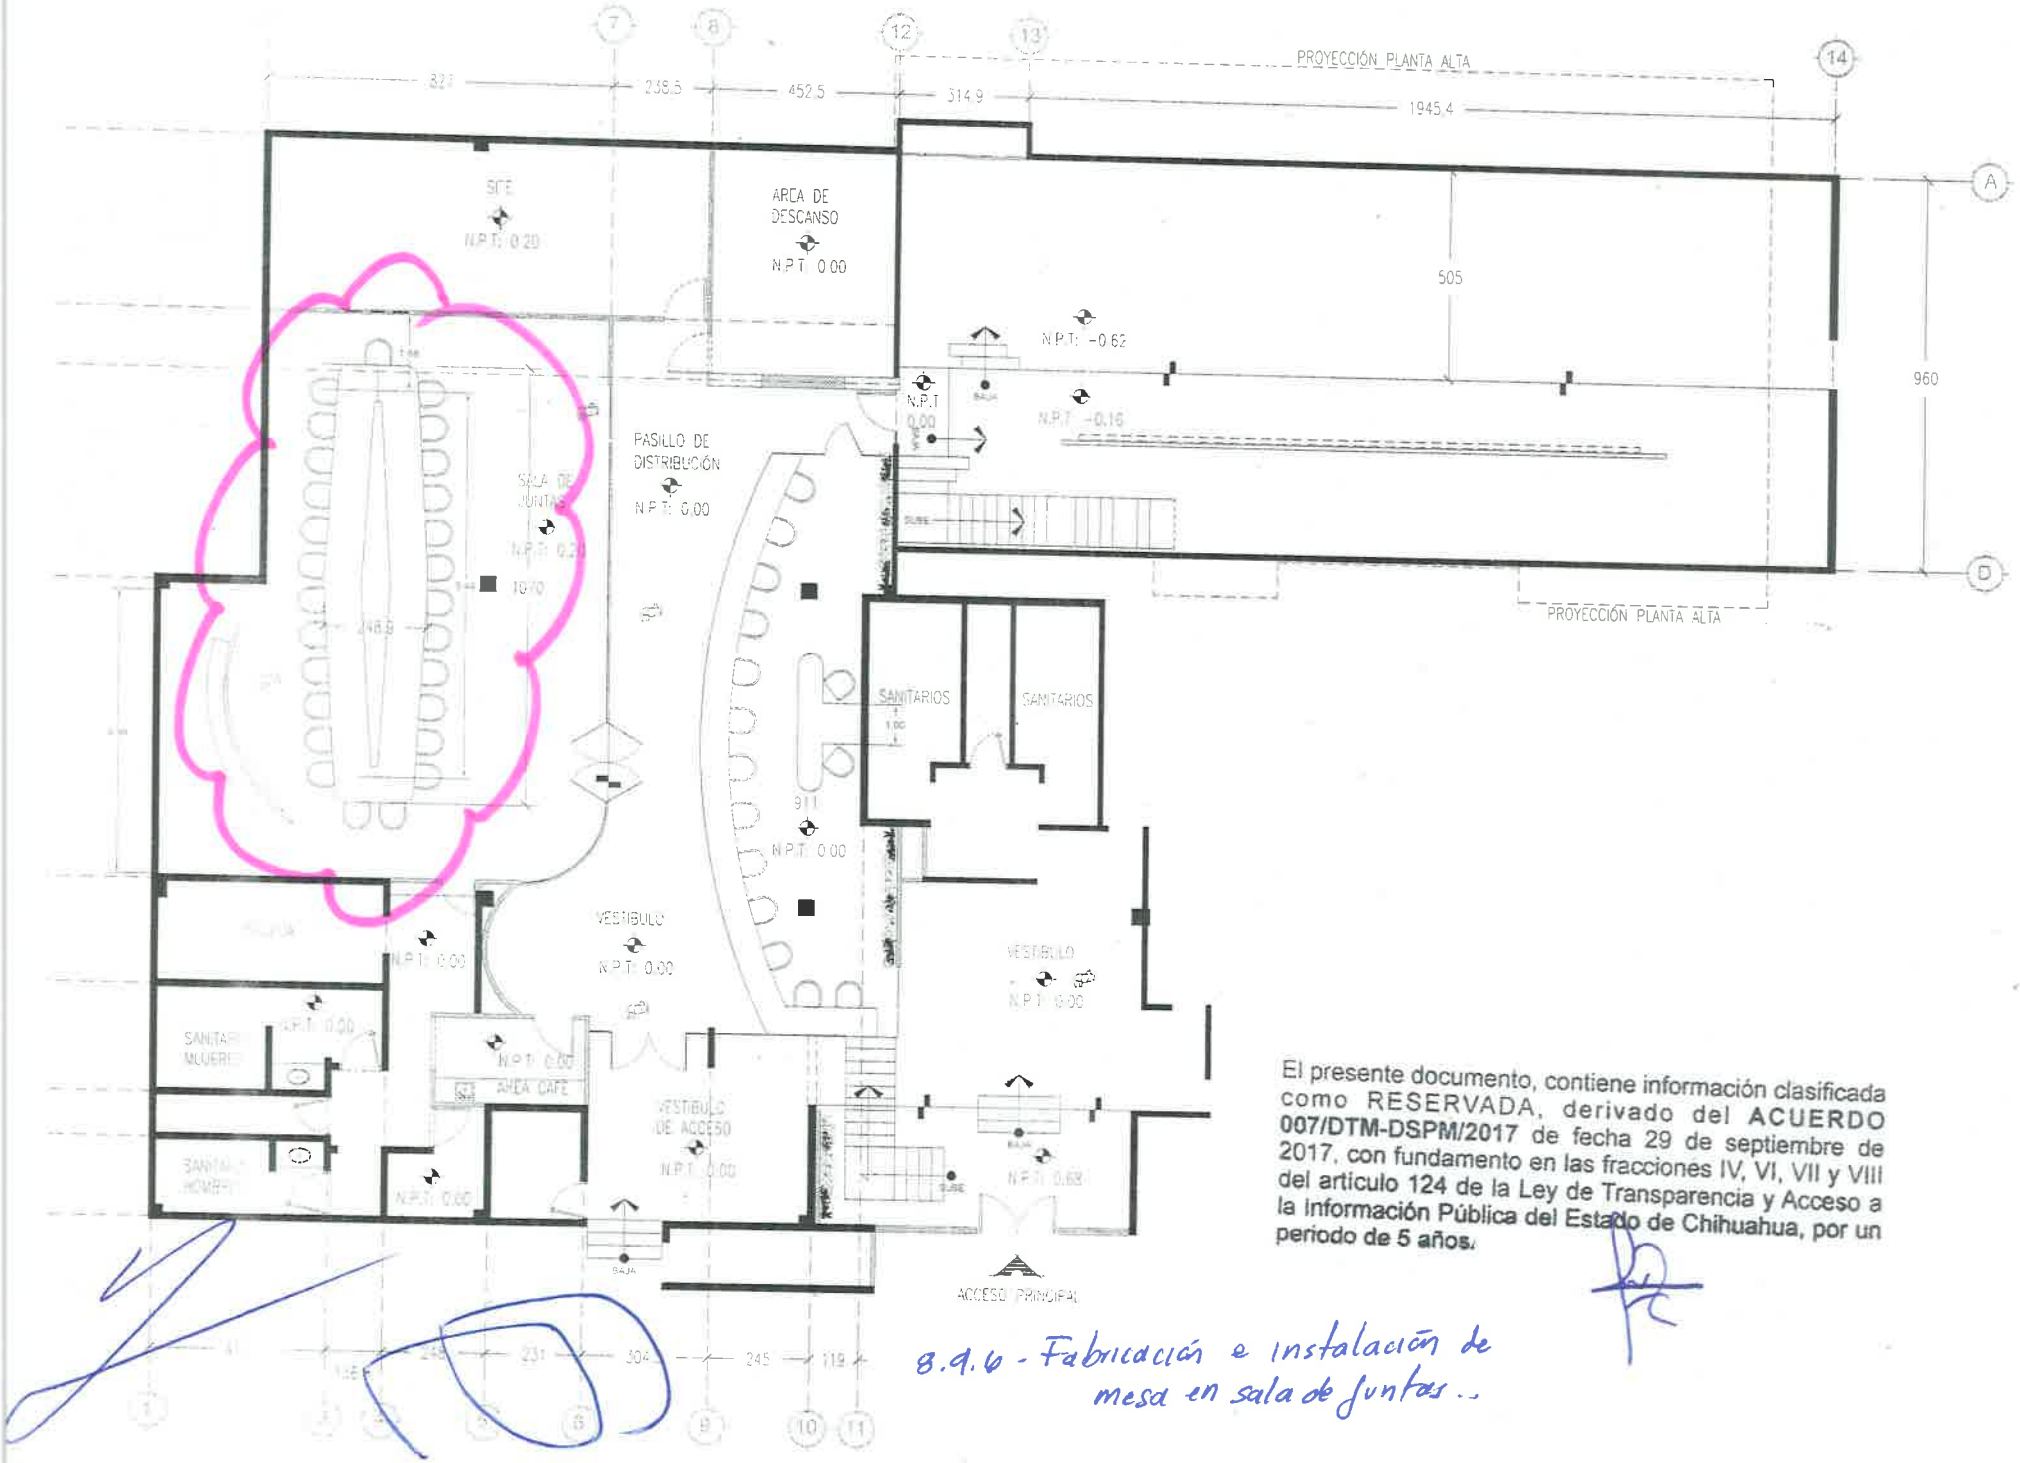

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

8.9.6 - Fabricación e instalación de mesa en sala de juntas..





8.9.6. Fabricacion e instalacion de mesa en sala de juntas, fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta y la parte interna se pintaran con poliuretano según lo indique el cliente y despues se aplicara recina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte extrerior se enchapara con laminado plastico color aluminio, se hara la preparacion y se instalacran canaletas de aluminio para instalacion de luz led, (no incluye sistema de iluminacion ni instalacion del mismo, tampoco incluye instalaciones electricas y de equipo de computo)

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.14.1						
	No	**No pzas**	**Total**			
		SITE				
Limpieza gruesa en todo el transcurso de la obra. Incluye el retiro de escombro producto de la misma y llevarlo fuera de la obra.						
	10.59	-4.00	-42.36			
		SALA DE JUNTAS				
	13.79	-8.23	-113.49			
	7.10	-2.53	-17.96			
		TOTAL	**-173.81**			**-173.81**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.14.2						
Limpieza fina de la obra. Incluye limpieza de pisos, muros, ventanas, muebles y todo lo necesario para que el edificio quede perfectamente limpio.	**Largo**	**Ancho**	**Total**			
	SITE					
	10.59	4.00	42.36			
	SALA DE JUNTAS					
	8.26	6.85	56.58			
	10.75	7.07	76.00			
	PASILLO					
	4.45	1.87	8.32			
	1.60	0.10	0.16			
	0.90	0.16	0.14			
	17.15	2.30	39.45			
	4.40	1.30	2.86	Triangulo 1		
	4.82	1.66	4.00	Triangulo 2		
	0.22	-0.18	-0.04	D.muro		
	VESTIBULO					
	5.30	4.80	25.44			
	1.03	-0.20	-0.21	D.muro		
	2.30	1.85	4.26			**328.75**
	VESTIBULO ACC. A BAÑOS					
	7.40	2.45	18.13			
	5.83	2.95	17.20			
	5.83	1.30	7.58			
	3.35	-0.19	-0.64	D.muro		
	2.50	1.50	3.75			
	ENTRADA					
	7.65	3.06	23.41			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.14.2						
	Largo	**Ancho**	**Total**			
	AREA DE DESCANSO					
Limpieza fina de la obra. Incluye limpieza de pisos, muros, ventanas, muebles y todo lo necesario para que el edificio quede perfectamente limpio.	5.70	4.28	24.40			
	PASILLO A BAÑOS					
	5.20	5.10	26.52			
	2.60	1.10	2.86			
	1.30	1.72	2.24			
	1.00	1.00	1.00			
	911					
			56.79	Área		
	BAÑO H					
	4.02	1.77	7.12			
	0.18	-0.19	-0.03	D.columna		
	0.60	-0.24	-0.14	D.muro		
	1.01	0.25	0.25			
	1.10	1.49	1.64			
	0.95	0.20	0.19			
	BAÑO M					
	2.55	2.36	6.02			**134.50**
	0.82	0.22	0.18			
	2.37	1.20	2.84			
	1.62	0.29	0.47			
	1.75	1.12	1.96			
	0.94	0.20	0.19			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.14.2						
	Largo	**Ancho**	**Total**			
Limpieza fina de la obra. Incluye limpieza de pisos, muros, ventanas, muebles y todo lo necesario para que el edificio quede perfectamente limpio.		**ARMERIA**				
	6.15	4.17	25.65			
	1.80	0.70	1.26	D.escalones		
	1.28	0.49	0.63	D.ventilacion		
	2.60	0.85	2.21			
	0.18	0.40	0.07	D.columna		
	1.87	0.12	0.22			
		LOCKERS				
	4.00	0.90	3.60			
		TOTAL H1	328.75			
		TOTAL H2	134.50			
		TOTAL H3	33.64			
		TOTAL	**496.89**			
					COBRADO EN ESTA ESTIMACION **161.28**	**33.64**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

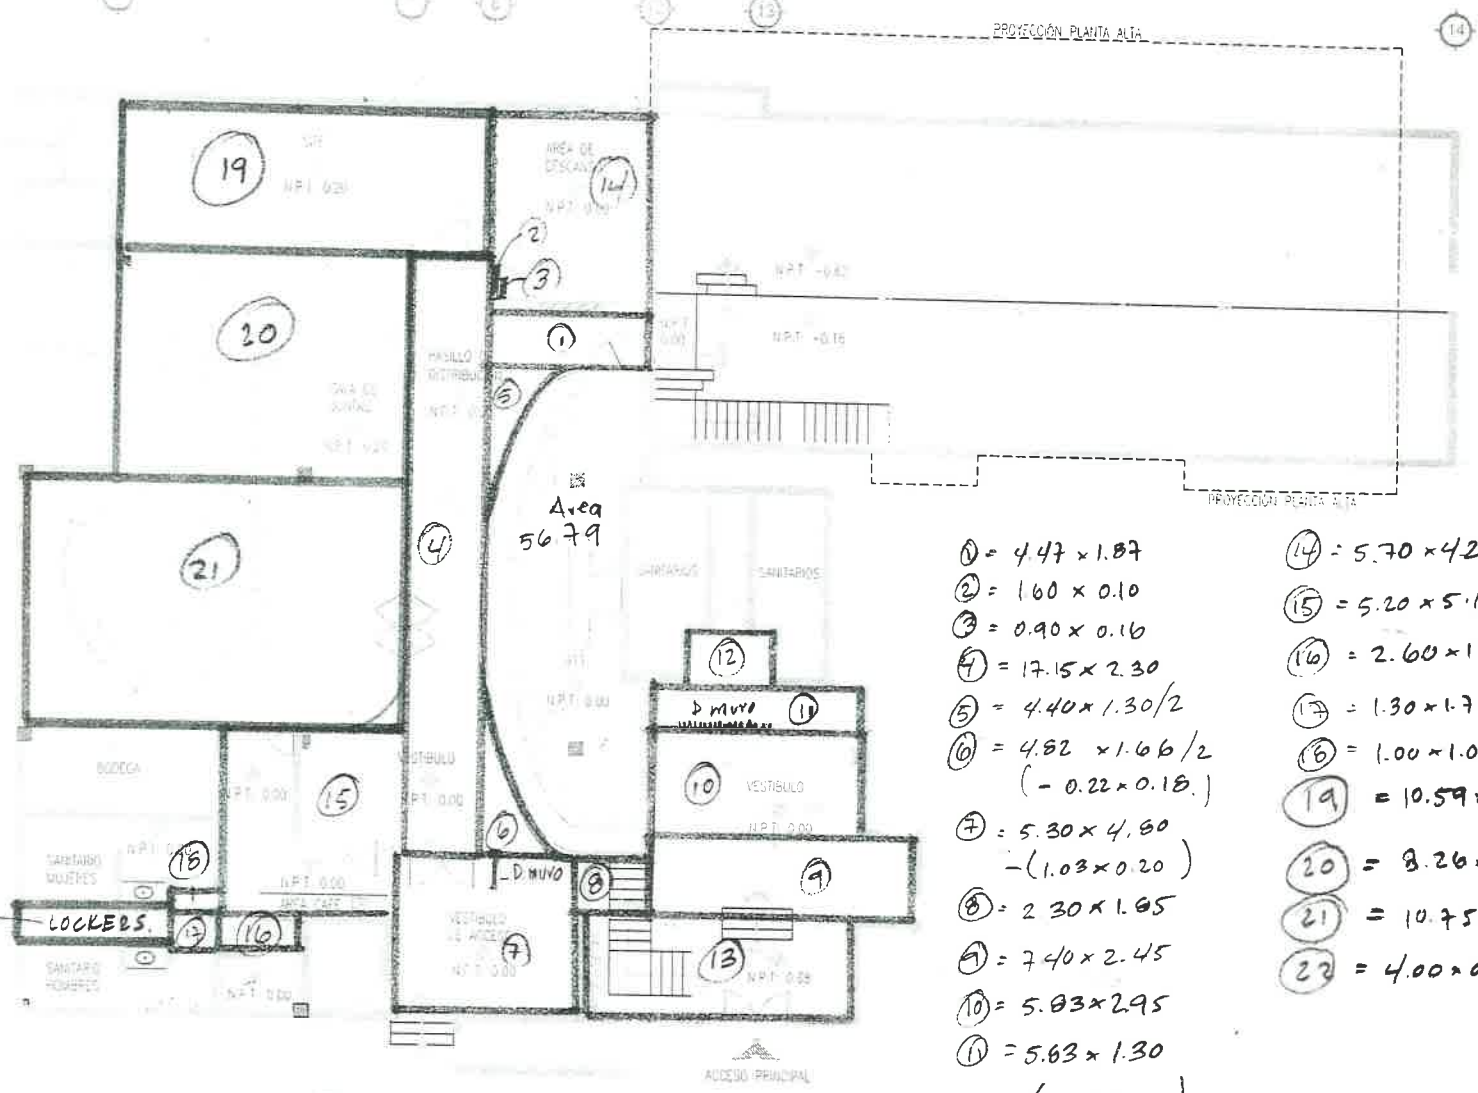

① = 4.47 × 1.87
② = 1.60 × 0.10
③ = 0.90 × 0.16
④ = 17.15 × 2.30
⑤ = 4.40 × 1.30/2
⑥ = 4.82 × 1.66/2 (− 0.22 × 0.18)
⑦ = 5.30 × 4.60 −(1.03 × 0.20)
⑧ = 2.30 × 1.65
⑨ = 7.40 × 2.45
⑩ = 5.83 × 2.95
⑪ = 5.63 × 1.30 −(3.35 × 0.19)
⑫ = 2.50 × 1.50
⑬ = 2.65 × 3.06
⑭ = 5.70 × 4.25
⑮ = 5.20 × 5.10
⑯ = 2.60 × 1.10
⑰ = 1.30 × 1.72
⑱ = 1.00 × 1.00
⑲ = 10.59 × 4.00
⑳ = 8.26 × 6.85
㉑ = 10.75 × 7.07
㉒ = 4.00 × 0.90

8 14.2 Limpieza fina de la obra...


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un

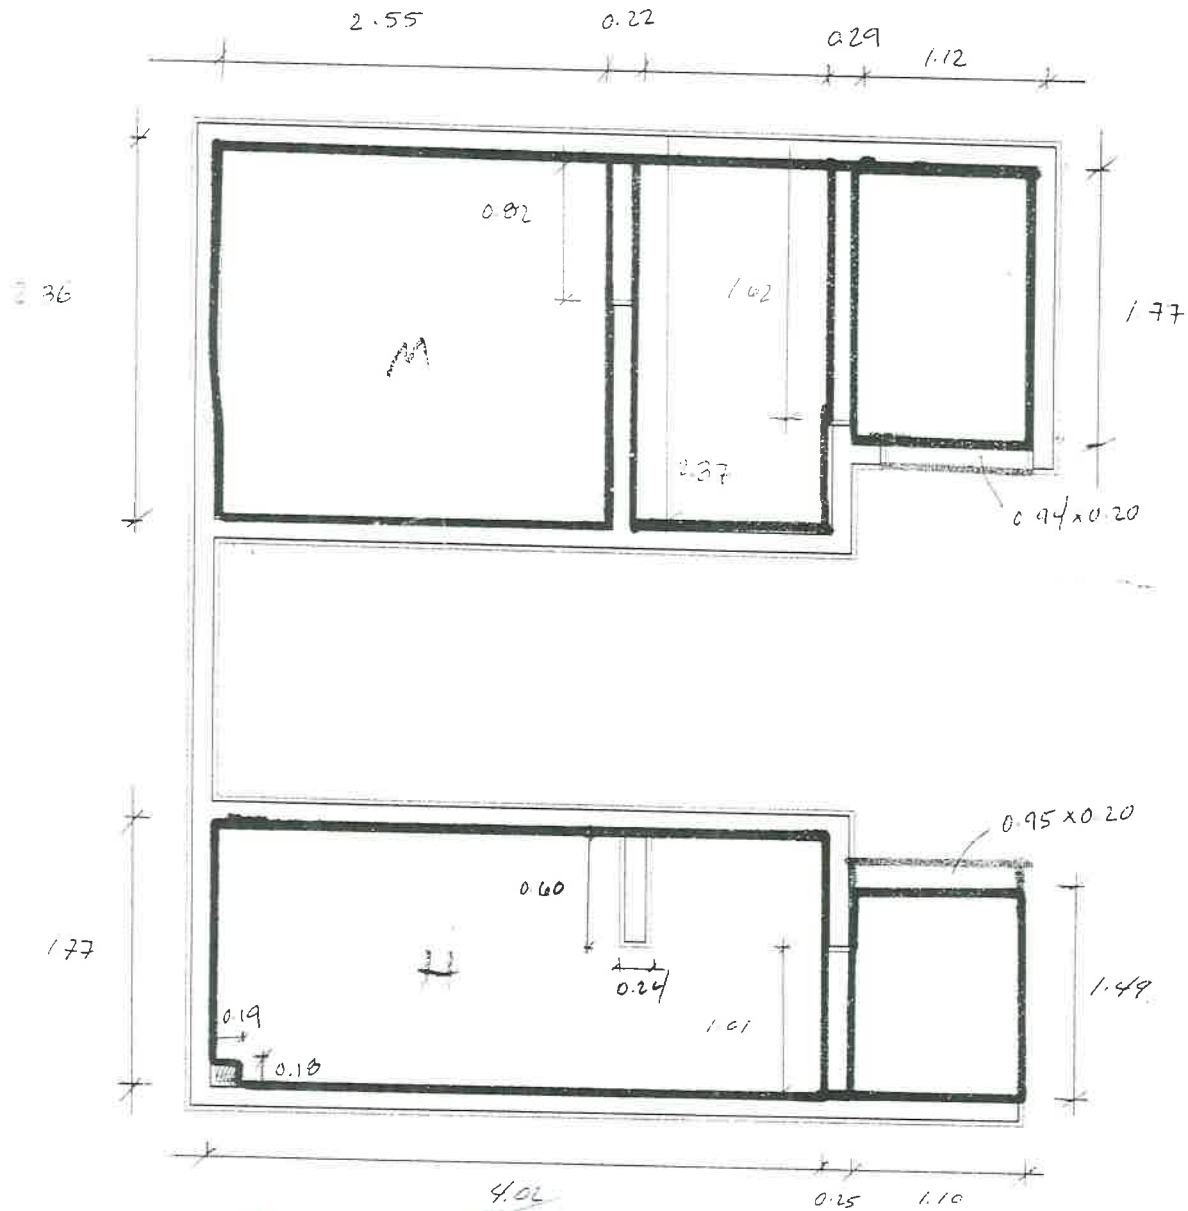

B14.2 Limpieza fina de obra.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ARMERIA

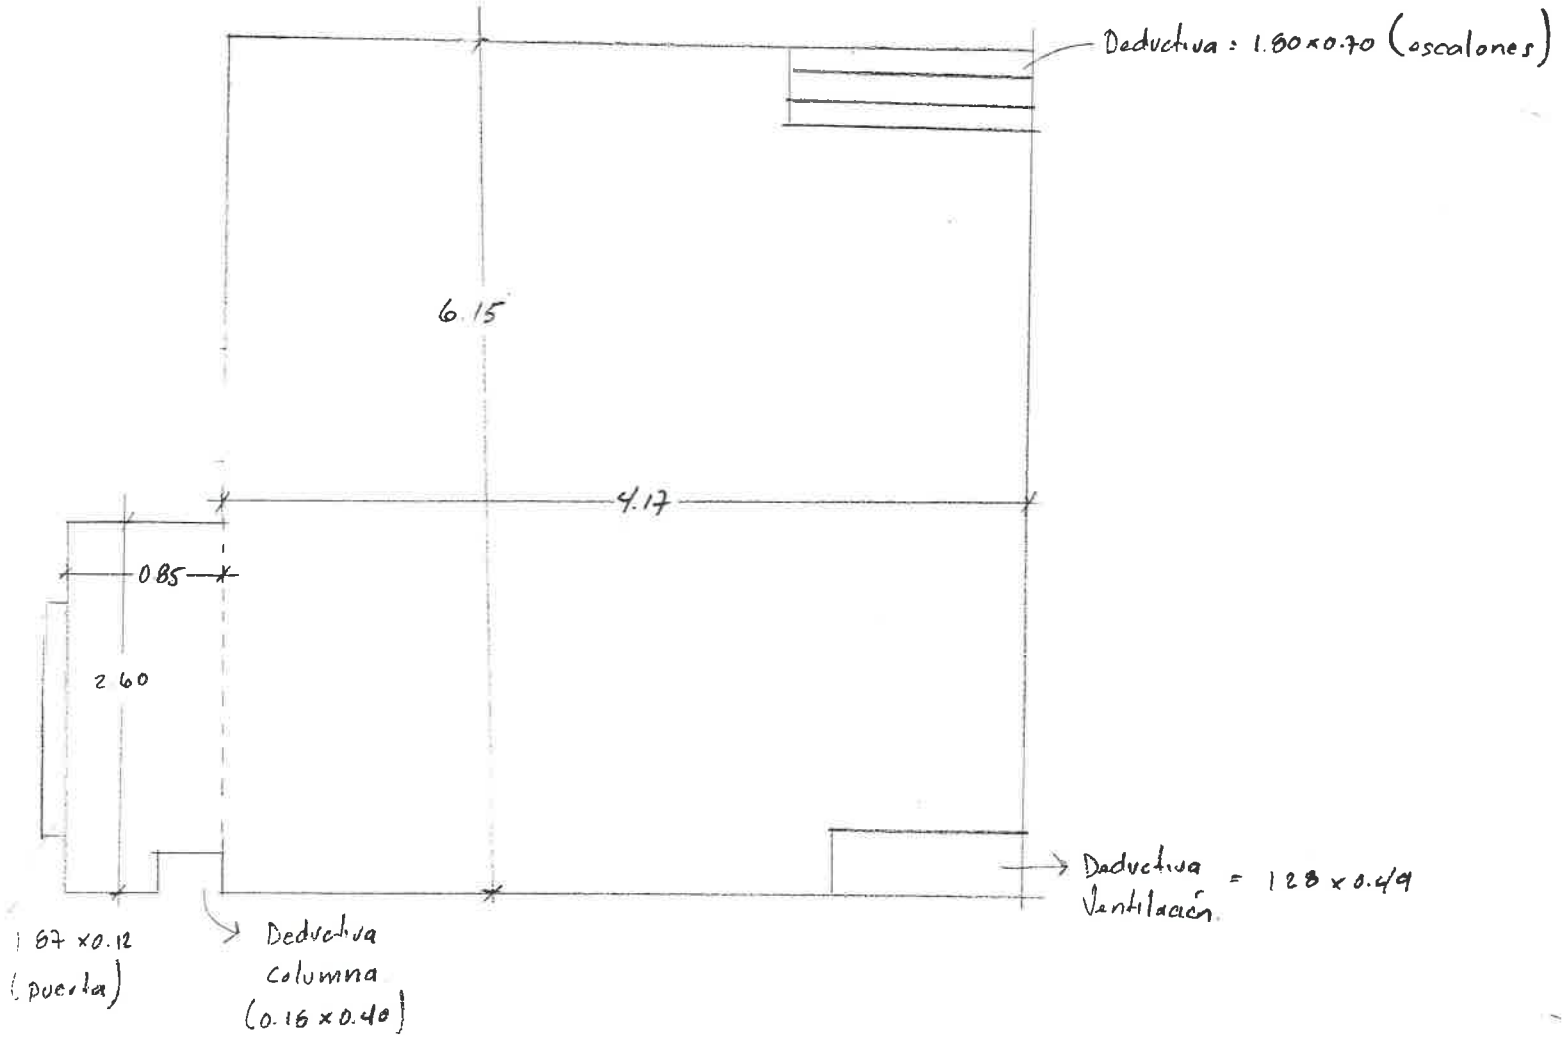

8.14.2 Limpieza fina de obra...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



8.14.2. Limpieza fina de la obra. Incluye limpieza de pisos, muros, ventanas, muebles y todo lo necesario para que el edificio quede perfectamente limpio.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO **007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO			OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-25							
Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.				**Largo**	**Total**		
			SALA DE JUNTAS				
				0.12	0.12		
				1.55	1.55		
				8.10	8.10		
				6.73	6.73		
				2.53	2.53		
				7.05	7.05		
				6.63	6.63		
				1.17	1.17		
				0.46	0.46		
				0.46	0.46		
				0.47	0.47		
				0.47	0.47		
			AREAS VARIAS				
				1.07	1.07	pasillo a baños	
				4.72	4.72		
				-0.98	-0.98		
				0.18	0.18		
				0.15	0.15		
				0.55	0.55		
				0.16	0.16		
				0.14	0.14		
				1.17	1.17		
				0.81	0.81		
				0.12	0.12		
				1.02	1.02		
							44.85

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-25							
Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.			**Largo**	**Total**			
			3.57	3.57			
			1.10	1.10	bodega		
			2.45	2.45			
			0.24	0.24			
			0.20	0.20			
			2.03	2.03			
			1.50	1.50			
			1.13	1.13			
			0.18	0.18			
			0.14	0.14	area de café		
			0.18	0.18			
			2.47	2.47			
			1.25	1.25			
			0.11	0.11			
			0.37	0.37	muro curvo		
			0.23	0.23			
			3.14	3.14			
			0.09	0.09			
			0.10	0.10			
			0.16	0.16	vestibulo pasillo		
			3.95	3.95			
			0.07	0.07			
			0.06	0.06			
			0.03	0.03			
			3.29	3.29			
			0.20	0.20			**28.24**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-25						
Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		0.19	0.19			
		2.73	2.73			
		0.22	0.22	muro		
		0.17	0.17			
		0.19	0.19			
		1.05	1.05			
		1.03	1.03			
		0.20	0.20			
		0.32	0.32	escalera armeria		
		0.06	0.06			
		0.40	0.40			
		0.08	0.08			
		0.40	0.40			
		0.32	0.32			
		0.06	0.06			
		0.40	0.40			
		0.08	0.08			
		0.40	0.40			
		2.30	2.30	armeria		
		2.15	2.15			
		0.07	0.07			
		0.07	0.07			
		0.48	0.48			
		0.86	0.86			
		0.48	0.48			
		0.10	0.10			
						14.81

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS						CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-25								
Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.				**Largo**	**Total**			
				0.09	0.09			
				0.23	0.23			
				0.41	0.41			
				0.19	0.19			
				0.41	0.41			
				0.19	0.19			
				2.90	2.90			
				0.49	0.49			
				1.28	1.28			
				2.65	2.65			
				0.10	0.10			
				0.08	0.08			
				0.38	0.38			
				0.06	0.06			
				0.42	0.42			
				4.80	4.80	video wall		
				0.73	0.73			
				0.10	0.10			
				0.92	0.92			
				0.55	0.55	escalon		
				0.10	0.10			
				0.60	0.60			
				9.40	9.40			
				3.88	3.88			
				0.05	0.05	vestibulo de acceso		
				2.97	2.97			**33.98**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-25					
Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
		3.35	3.35		
		0.19	0.19		
		3.37	3.37		
		1.15	1.15		
		0.65	0.65		
		0.18	0.18		
		0.08	0.08		
		0.08	0.08		
		0.37	0.37		
		0.82	0.82		
		0.03	0.03		
		0.03	0.03		
		0.80	0.80		
		0.33	0.33		
		0.04	0.04		
		0.09	0.09		
		0.18	0.18		
		1.75	1.75		
		0.05	0.05		
		1.88	1.88		
		0.26	0.26		
		0.42	0.42		
		0.26	0.26		
		2.06	2.06		
		0.56	0.56		
		1.42	1.42		**20.40**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO			OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-25							
Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.				**Largo**	**Total**		
				0.10	0.10		
				3.20	3.20		
				0.36	0.36		
				0.40	0.40		
				4.50	4.50		
				1.44	1.44		
				0.11	0.11		
				3.14	3.14		
				0.60	0.60	muro curvo sala juntas	
				0.41	0.41		
				0.15	0.15		
				0.41	0.41		
				0.88	0.88		
				0.41	0.41		
				0.15	0.15		
				0.41	0.41		
				1.24	1.24		
				0.41	0.41		**21.34**
				0.15	0.15		
				0.41	0.41		
				0.89	0.89		
				0.41	0.41		
				0.15	0.15		
				0.41	0.41		
				0.60	0.60		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-25							
Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.				**Largo**	**Total**		
				1.44	1.44	area de descanso	
				0.10	0.10		
				0.37	0.37		
				0.35	0.35		
				4.70	4.70		
				0.59	0.59		
				4.27	4.27		
				5.14	5.14		
				4.40	4.40		
				2.07	2.07		
				0.68	0.68	lateral col x 4	
				0.40	0.40		
				1.57	1.57		
				5.10	5.10	comedor	
				5.80	5.80		
				9.83	9.83		
				1.43	1.43		
				1.42	1.42		
				TOTAL H1	44.85		
				TOTAL H2	28.24		
				TOTAL H3	14.81		
				TOTAL H4	33.98		
				TOTAL H5	20.40		
				TOTAL H6	21.34		
				TOTAL H7	49.66		
				TOTAL	**213.28**		**49.66**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

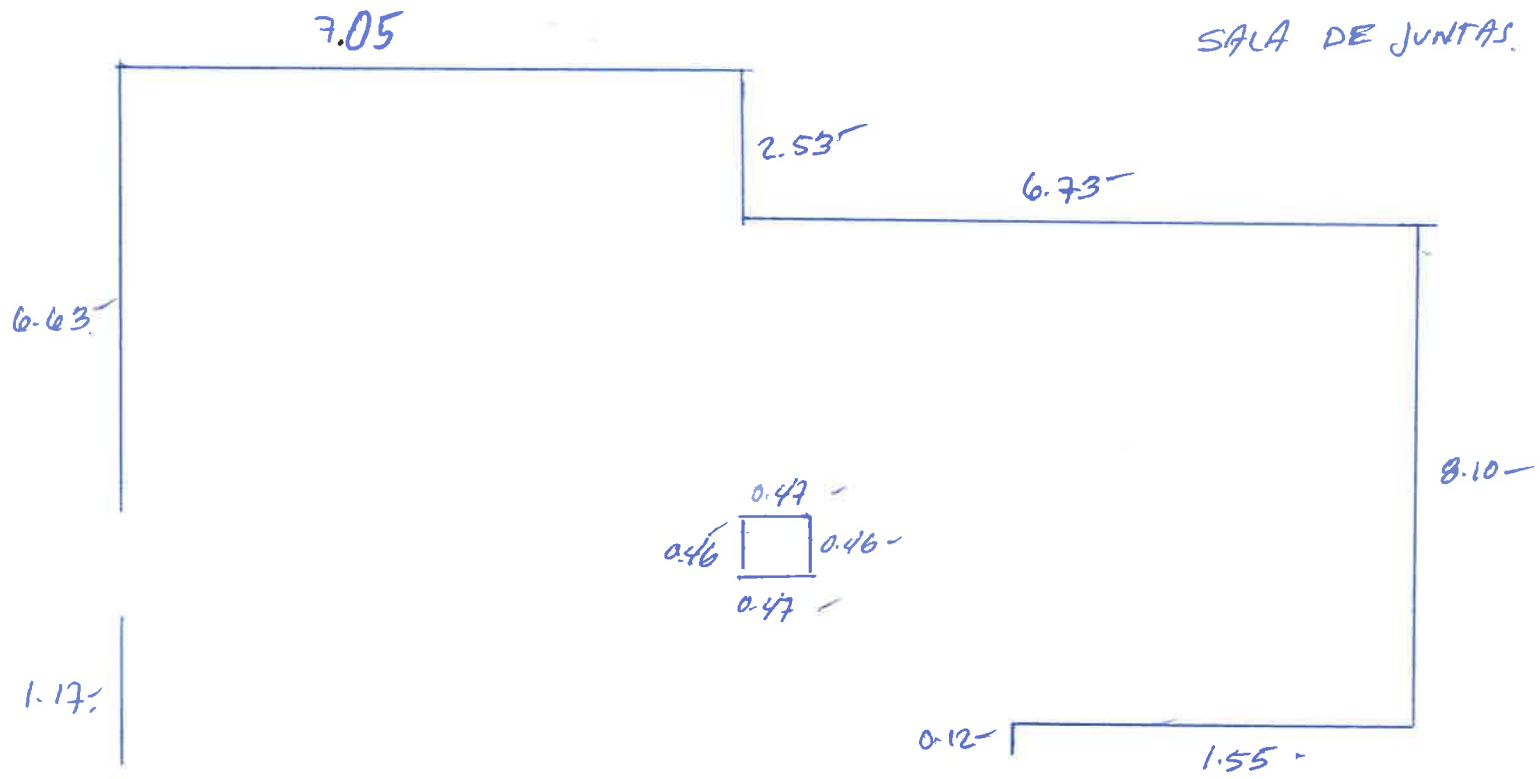

EXT-25- Suministro y colocación de zoclo de -10 mts.


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, **por un periodo de 5 años.**

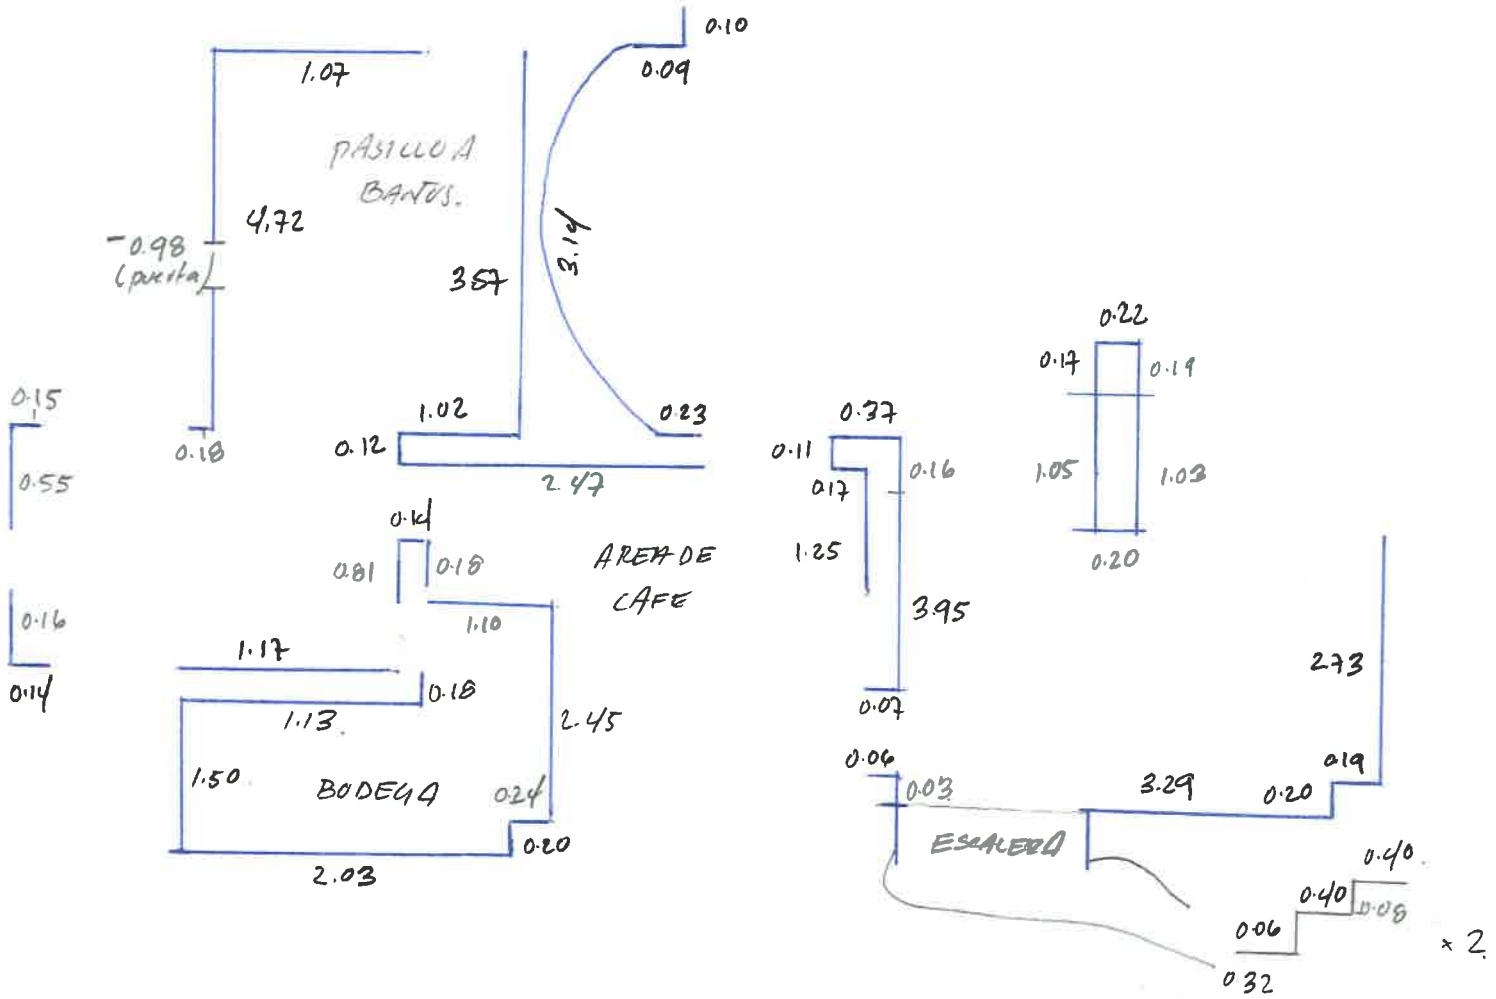

EXT-25 - Suministro y colocación de codo de 0.10mts.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ARMERIA.

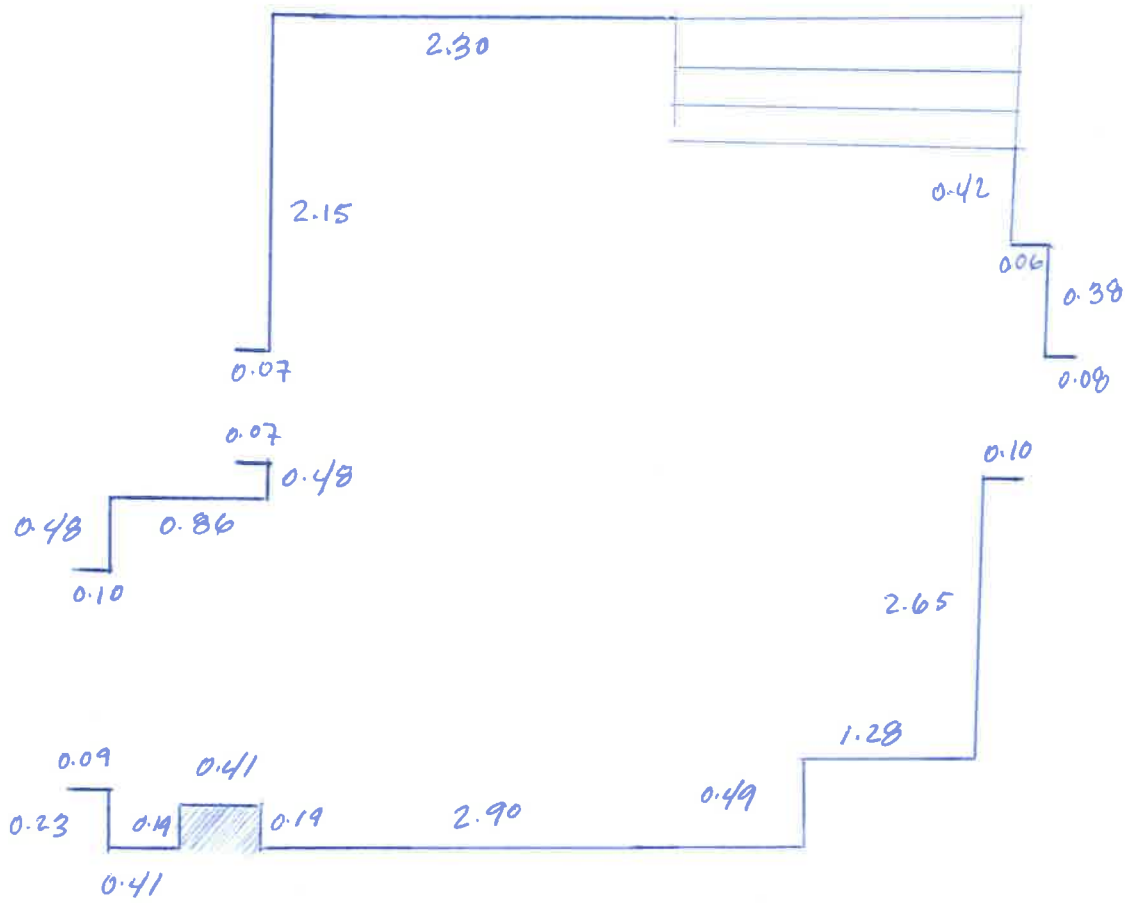


EXT-25 - Suministro y colocación de zoclo de 0.10mts.


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

VIDEO WALL.

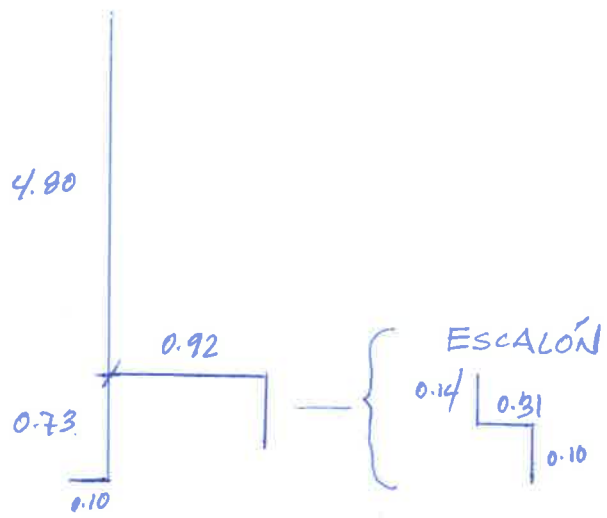









9.40


EAT-25- Suministro y colocación de 2ado de 0.10mts.


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


VESTIBULO DE ACCESO.




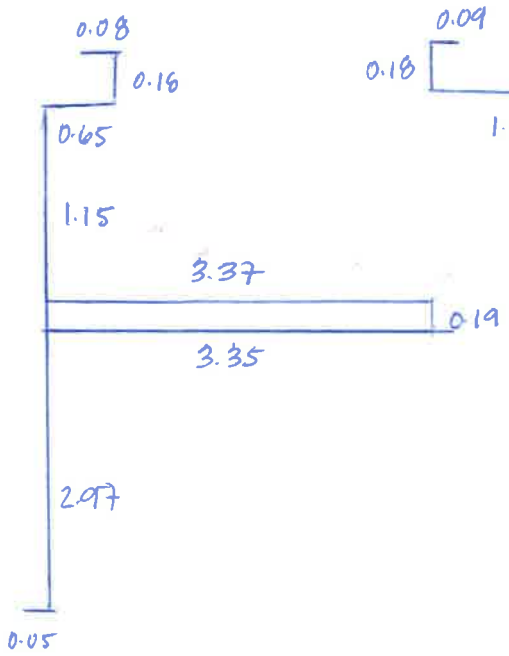





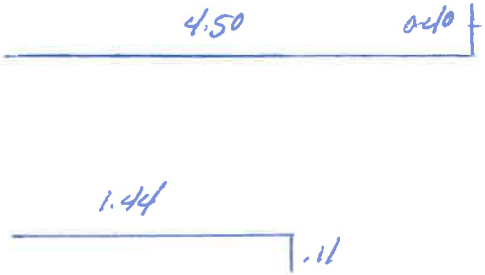


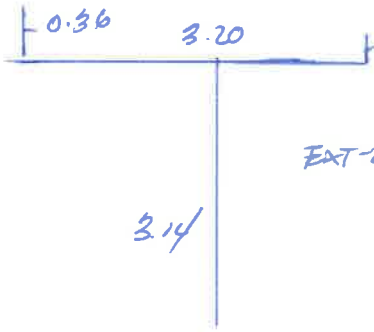

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-25 - Suministro y colocación de zoclo de .10 mts.


MURO CURVO SACA DE JUNTAS.

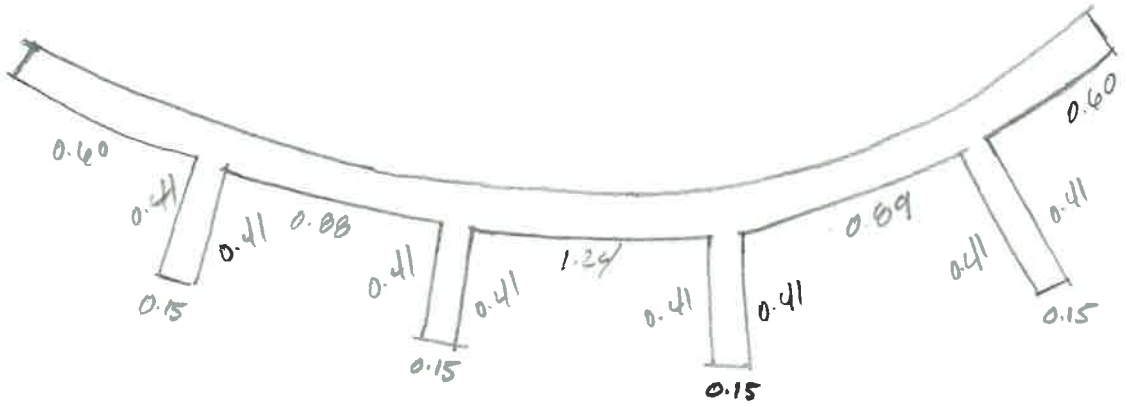

EXT-25 - Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts..

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


AREA DE DESCANSO.

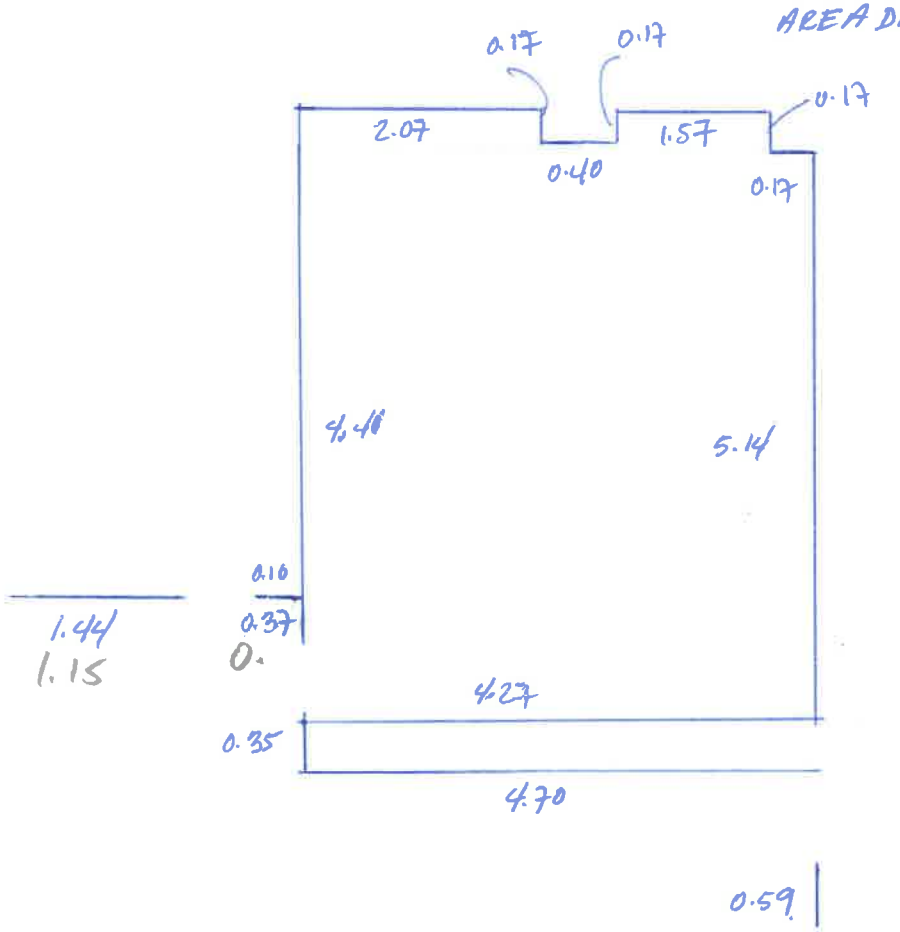

EXT-25 - Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII **del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.**

COMEDOR.

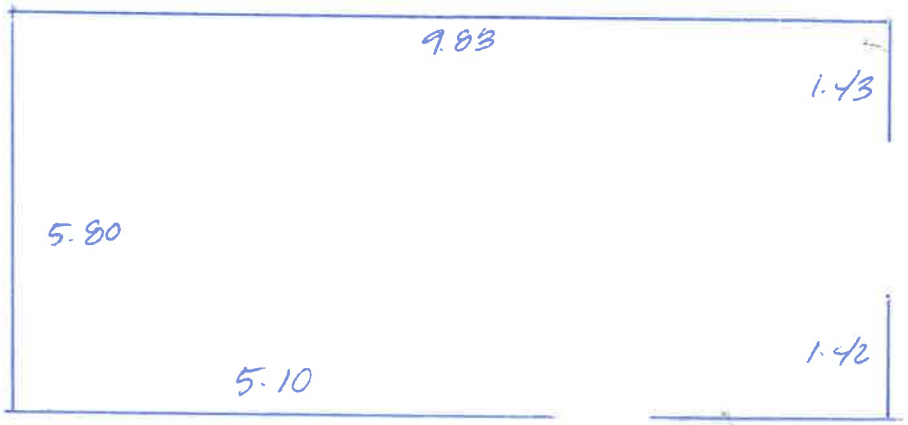

EXT-25 Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT-25. Suministro y colocación de zoclo de 0.10 mts de altura a base de cerámica Absolute beige, dimensiones de 60x60 cms, acabado pulido, marca Intercerámic, adhesivo porcelanico. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-61						
Aplanado fino en muros interiores a base de basecoat Protekto Plus en área de cocineta, bodega, distribuidor baños y vestíbulo antes de acceso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Alto**	**Total**			
	5.15	2.42	12.46	A. descanso		
	4.64	2.52	11.69	Pasillo a baños.		
	0.82	-2.04	-1.67	d.puerta		
	0.35	-0.20	-0.07	d.escalon		
	2.07	2.52	5.22	café		
	3.54	0.70	2.48	café		
	1.35	2.52	3.40	v. baños		
	0.88	-2.01	-1.77	d.puerta		
	1.76	2.52	4.44	v. baños		
	0.78	-2.00	-1.56	d.puerta		
	2.34	2.52	5.90	v. baños		
	0.88	-2.01	-1.77	d.puerta		
	2.26	2.41	5.45	bodega		
	1.14	-2.05	-2.34	d.vano		
	1.14	0.19	0.22	perfil vano		
	2.05	0.19	0.39	perfil vano		
	0.35	1.14	0.40	trabe		**66.29**
	2.43	2.42	5.88			
	0.19	-0.36	-0.07	d.trabe		
	2.26	2.41	5.45			
	0.18	2.41	0.43	columna		
	1.50	2.41	3.62			
	5.55	1.05	5.83	letrero bienvenidos		
	5.55	0.41	2.28			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-61						
Aplanado fino en muros interiores a base de basecoat Protekto Plus en área de cocineta, bodega, distribuidor baños y vestíbulo antes de acceso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Alto**	**Total**			
	2.43	1.04	2.53	muro vestibulo		
	2.58	3.13	8.08			
	0.50	0.37	0.19	escalera vestibulo		
	0.19	-0.30	-0.06			
	4.50	0.73	3.29	desnivel escalera		
	0.24	1.53	0.37	vano puerta		
	0.41	0.36	0.15	escalon		
	0.30	-0.18	-0.05	d.escalon		
		TOTAL H1	66.29			
		TOTAL H2	14.50			
		TOTAL	**80.79**			**14.50**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

BODEGA.

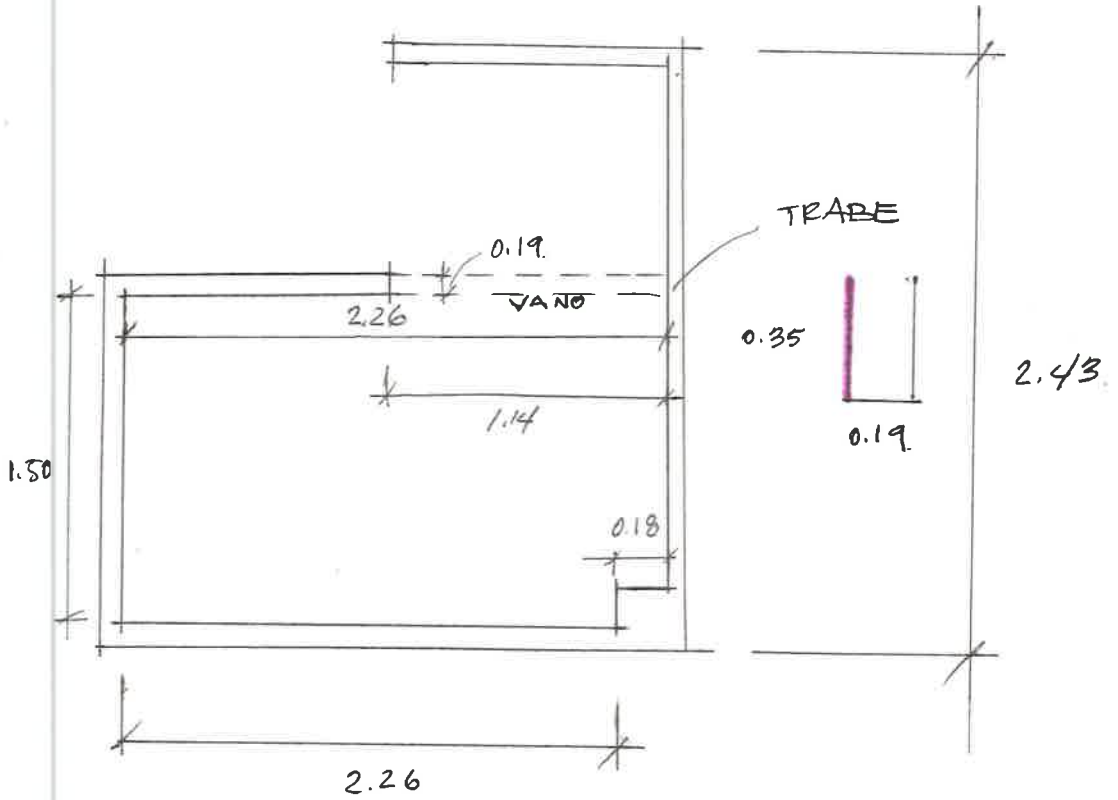


LETRERO BIENVENIDOS

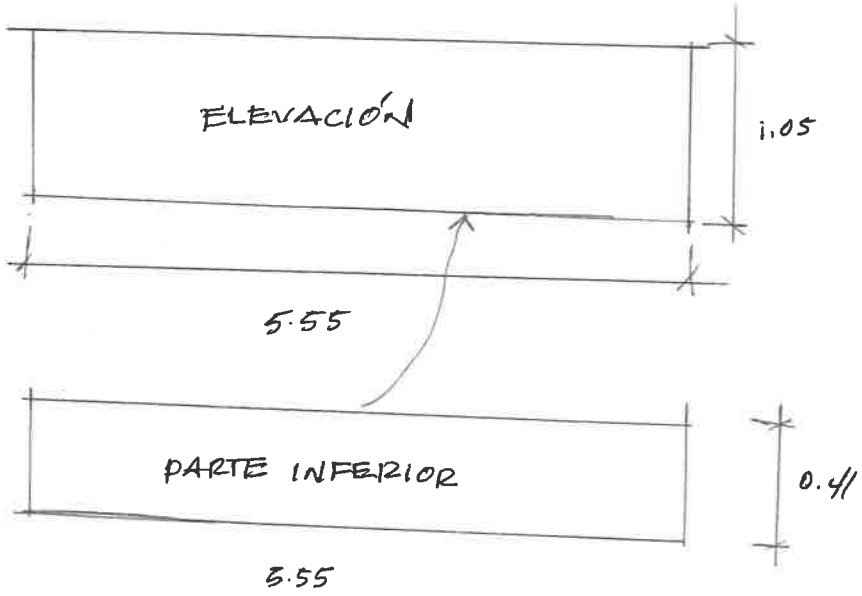

EXT-61- Aplanado fino en muros interiores a base de basecoat. . .


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

MURO VESTIBULO.

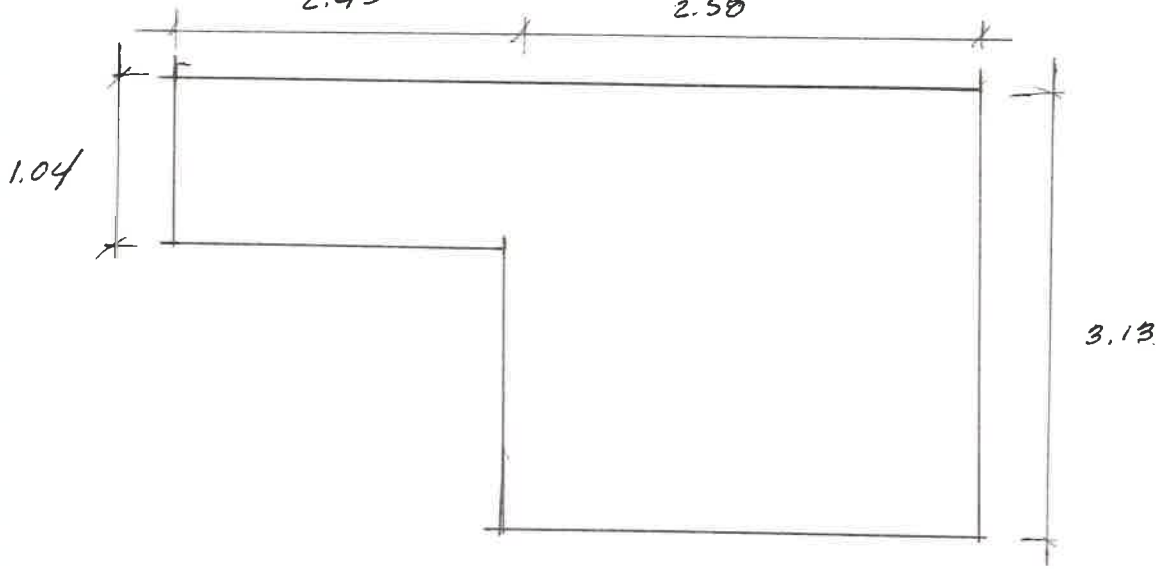

ELEVACIÓN

ESCALERA VESTIBULO.



Deductiva escalón. (0.30x0.19)


DESNIVEL ESCALERA



VANO PUERTA (0.24x1.53)

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ESCALÓN

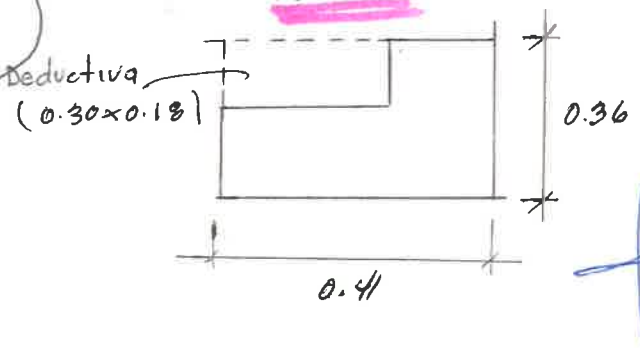

EXT-61- Aplanado fino en muros interiores a base de basecoat..





EXT- 61 Aplanado fino en muros interiores a base de basecoat Protekto Plus en área de cocineta, bodega, distribuidor baños y vestíbulo antes de acceso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-66						
Suministro e instalación de chapa de tablaroca sobre muros y columnas existentes e sala de juntas, área de 911 y descanso, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Alto**	**Total**			
	911					
	0.53	2.44	1.29			
	5.70	2.44	13.91			
	1.00	2.44	2.44			
	0.43	2.44	1.05	columna		
	0.43	2.44	1.05	columna		
	0.43	2.44	1.05	columna		
	0.43	2.44	1.05	columna		
	0.43	2.44	1.05	columna		
	0.43	2.44	1.05	columna		
	0.43	2.44	1.05	columna		
	0.43	2.44	1.05	columna		
	SALA DE JUNTAS					
	6.73	3.69	24.83			
	2.53	3.79	9.59			
	7.05	3.79	26.72			
	5.45	3.79	20.66			
	0.43	2.57	1.11			
	0.43	2.57	1.11			
	0.43	2.57	1.11			
	0.43	2.57	1.11			
	ESCALERA VESTIULO					
	2.09	1.05	2.19			
	1.33	-0.29	-0.39			
	1.07	1.22	1.31			
	0.46	0.85	0.39	vano puerta		**115.78**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-66						
Suministro e instalación de chapa de tablaroca sobre muros y columnas existentes e sala de juntas, área de 911 y descanso, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Alto**	**Total**			
	MURO 911 PASILLO					
	1.22	2.44	2.98			
	1.22	2.44	2.98			
	0.22	2.40	0.53			
	0.22	2.40	0.53			
		TOTAL H1	115.78			
		TOTAL H2	7.02			
		TOTAL	**122.80**			**7.02**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

911

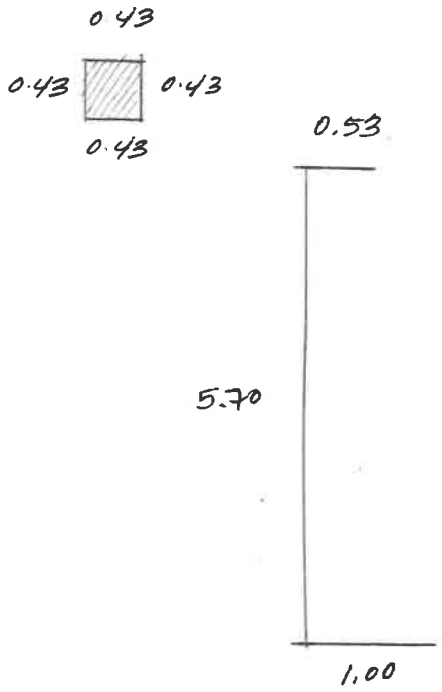

SALA DE JUNTAS

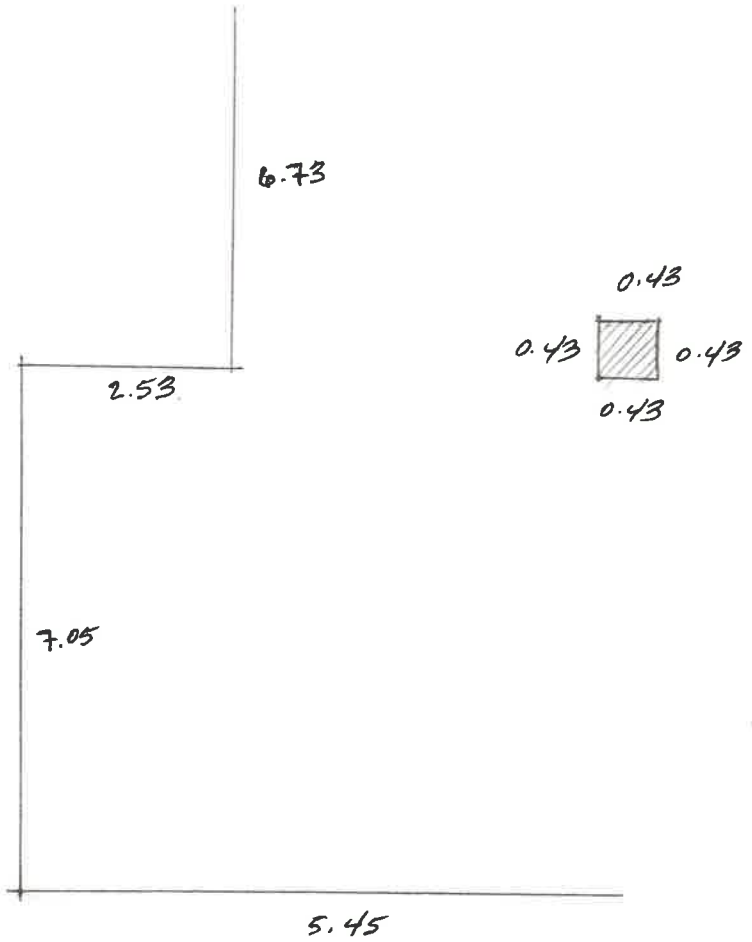





EXT-66 - Suministro e instalación de chapa de tablaroca...


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ESCALERA VESTIBULO

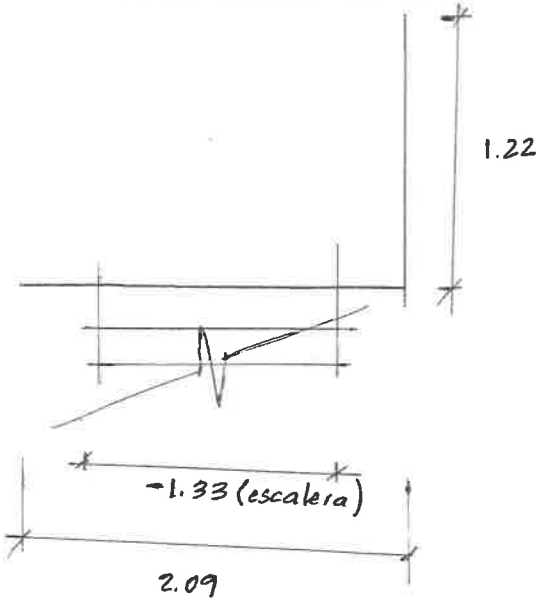

MURO 911 PASILLO.

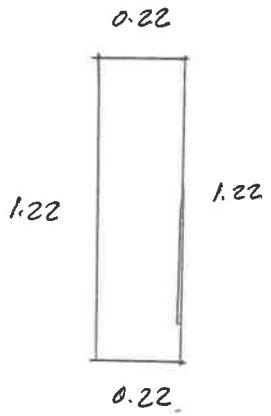



VANO PUERTA

EXT-66 - Suministro e instalación de chapa de tablaroca..

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 66

Suministro e instalación de chapa de tablaroca sobre muros y columnas existentes e sala de juntas, área de 911 y descanso, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-84						
Suministro y colocación de piedra decorativa naranja y crema en área posterior del estacionamiento. Incluye preparación de la superficie consistente en rebajar terreno y suministro e instalación de hule negro, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	Total			
		98.75	98.75	**jardin 1**		
	3.80	-0.60	-2.28	deductiva banqueta		
	2.65	-0.60	-1.59	deductiva banqueta		
	1.05	-1.15	-1.21	deductiva registro		
		-0.38	-0.38	deductiva fosa 70cm		
		-0.38	-0.38	deductiva fosa 70cm		
		-0.07	-0.07	deductiva fosa 30cm		
		-0.09	-0.09	deductiva fosa 35cm		
		33.90	33.90	**jardin 2**		
	1.00	-1.05	-1.05	dedcutiva registro		
	0.30	-0.42	-0.13	dedcutiva registro		
	0.30	-0.42	-0.13	dedcutiva registro		
		-0.003	-0.003	deductiva fosa 20cm		
		-0.003	-0.003	deductiva fosa 20cm		
		TOTAL	**125.33**			**125.33**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

JARDÍN 1

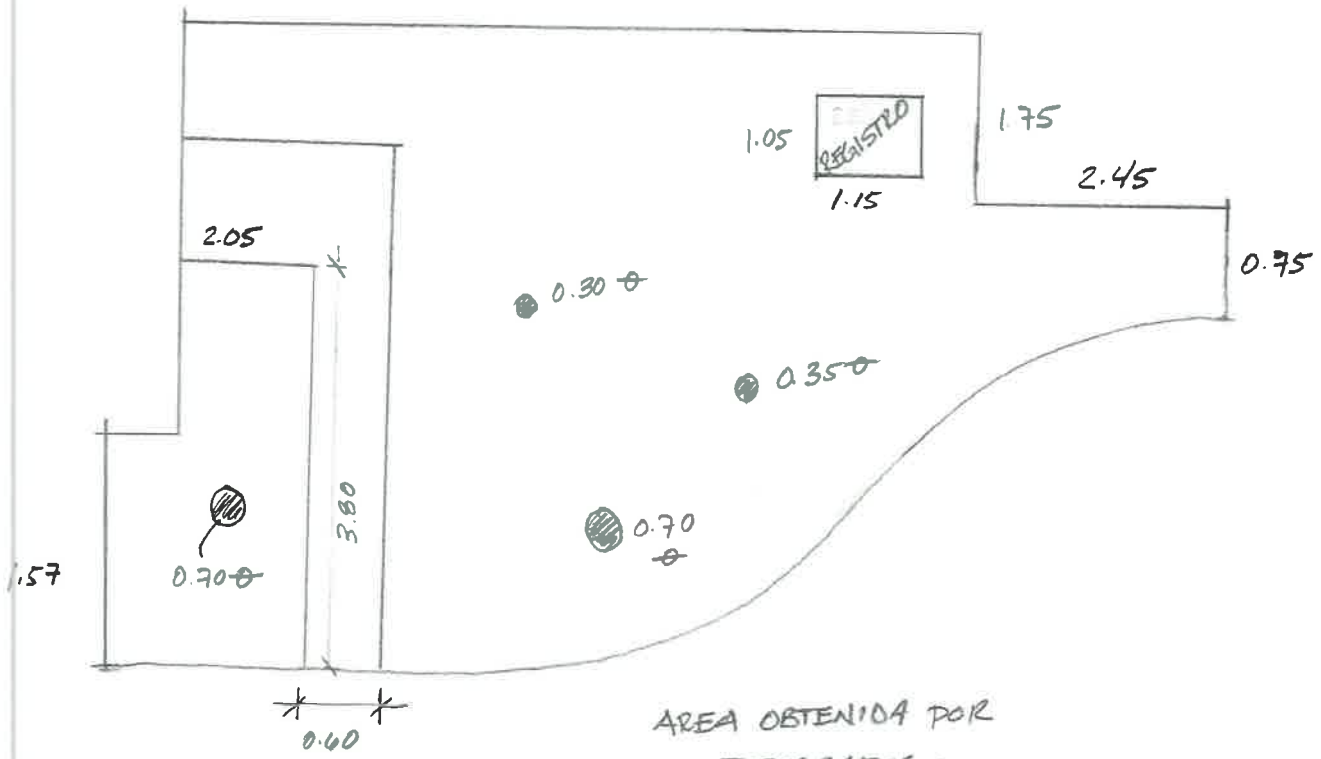


AREA OBTENIDA POR TOPOGRAFOS :

98.75m²

EXT-64-Suministro y colocación de piedra decorativa naranja..

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

JARDIN 2

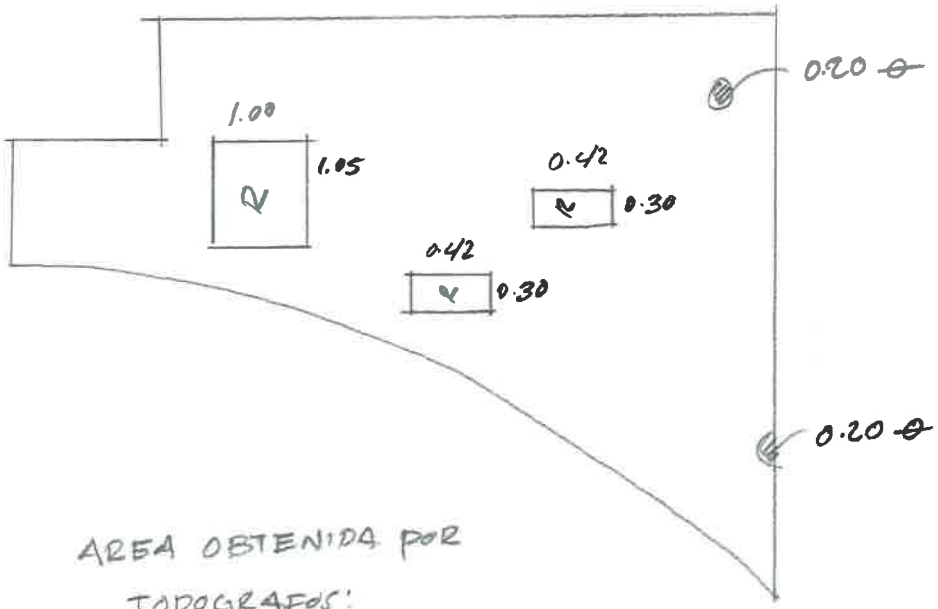

AREA OBTENIDA POR TOPOGRAFOS:

33.90 m²

EXT-84 - Suministro y colocación de piedra decorativa naranja.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, **por un** periodo de 5 años.



EXT- 84

Suministro y colocación de piedra decorativa naranja y crema en área posterior del estacionamiento. Incluye preparación de la superficie consistente en rebajar terreno y suministro e instalación de hule negro, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-87					
Suministro e instalación de señal SR-15 (altura libre 6.00 mts) de 86 cm x 86 cm acabado reflejante, grado ingeniería alta intensidad, con soportes para fijación en travesaño. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y maquinaria y todo para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		**8.00**
		8.00	8.00		
		TOTAL	**8.00**		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMA 12 PERIODO:

CROQUIS









RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-100							
Suministro e instalación de junta fría en pisos de cerámica por indicaciones del proveedor a base de cola de rata y sello con sika 1ª. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.			**Largo**	**Total**			**155.96**
			SALA DE JUNTAS				
			10.32	10.32			
			10.70	10.70			
			10.70	10.70			
			8.17	8.17			
			7.05	7.05			
			13.78	13.78			
			13.78	13.78			
			PASILLO				
			2.90	2.90			
			2.46	2.46			
			2.75	2.75			
			7.10	7.10			
			29.00	29.00			
			AREA DE DESCANSO				
			5.17	5.17			
			0.36	0.36			
			1.97	1.97			
			CAFÉ Y BAÑOS				
			5.42	5.42			
			2.40	2.40			
			5.50	5.50			
			7.80	7.80			
			8.63	8.63			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-100					
Suministro e instalación de junta fría en pisos de cerámica por indicaciones del proveedor a base de cola de rata y sello con sika 1ª. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
	ARMERIA				
		4.25	4.25		
	VESTIBULO				
		5.76	5.76		
		10.00	10.00		
		1.94	1.94		
	VESTIBULO ENTRADA				
		5.59	5.59		
		2.94	2.94		
		5.08	5.08		
		0.19	0.19		
		0.31	0.31		
		0.18	0.18		
		0.30	0.30		
		0.19	0.19		
		0.31	0.31		
		0.19	0.19		
		2.56	2.56		**39.79**
	TOTAL H1		155.96		
	TOTAL H2		39.79		
	TOTAL		**195.75**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA


SALA DE JUNTAS.



EXT-100 - Suministro e instalación de junta fría en pisos..

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


PASILLO

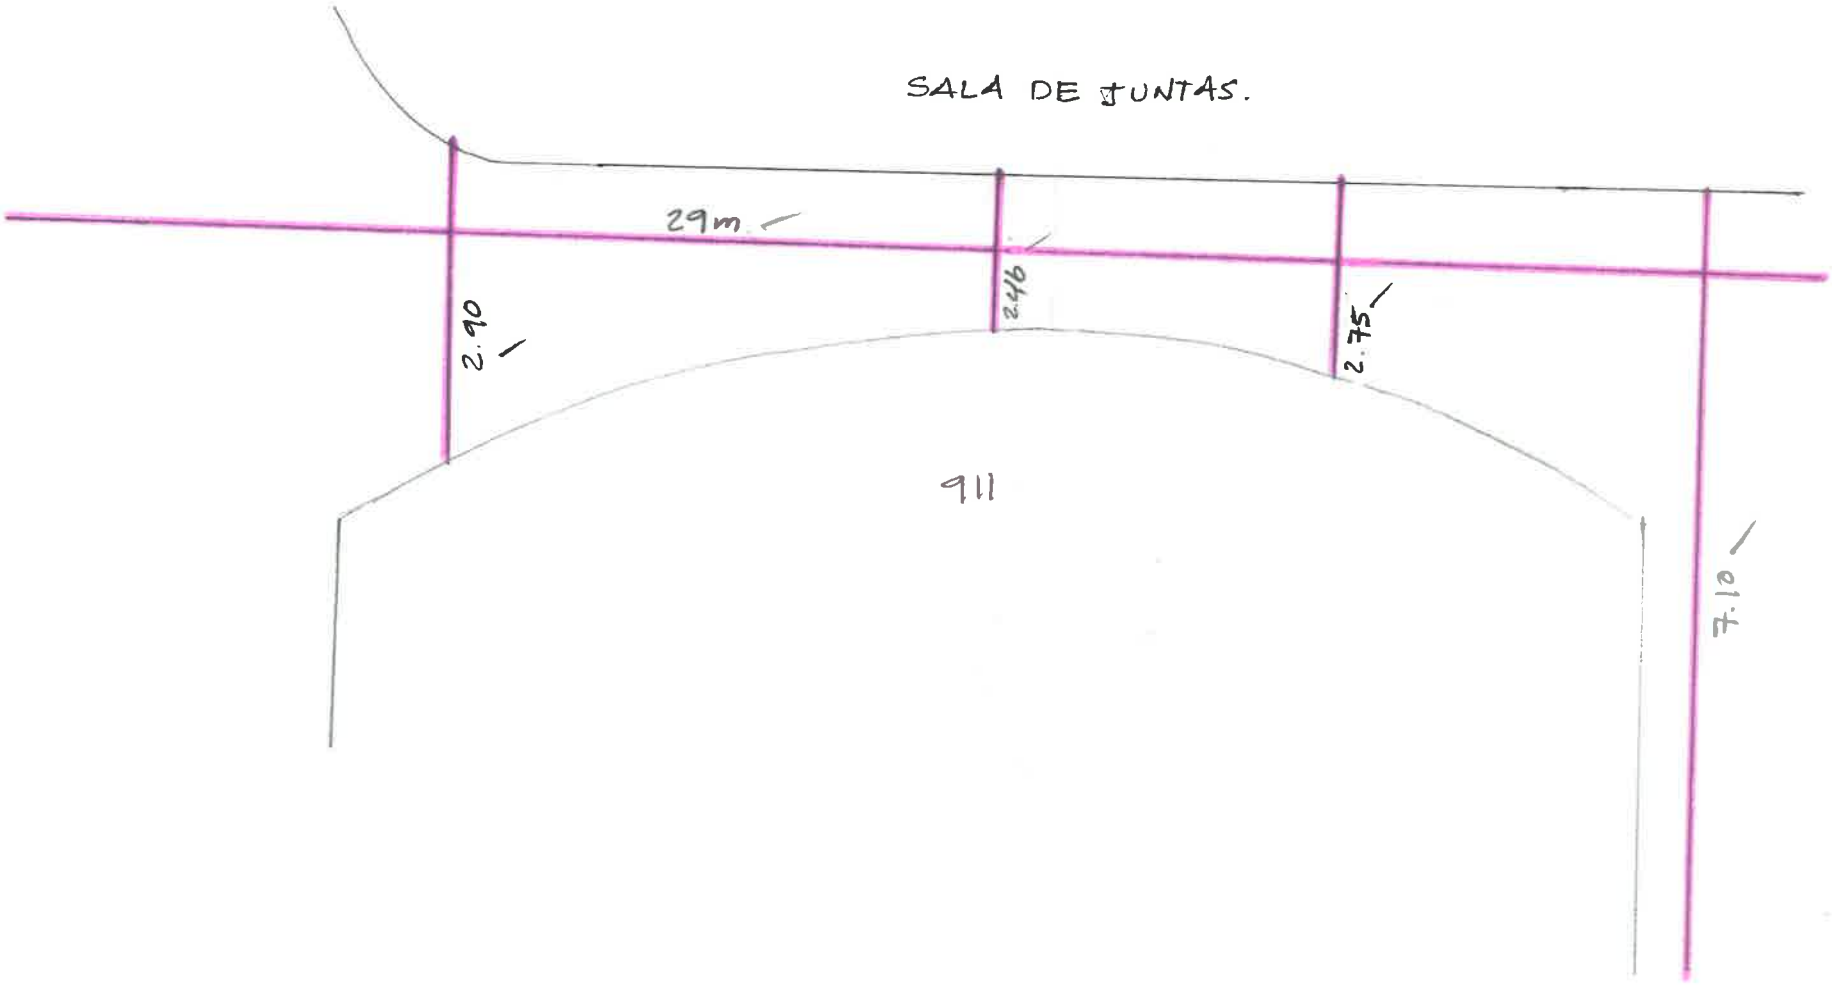

EXT-100 - Suministro e instalación de Junta fría en pisos...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


AREA DE DESCANSO.

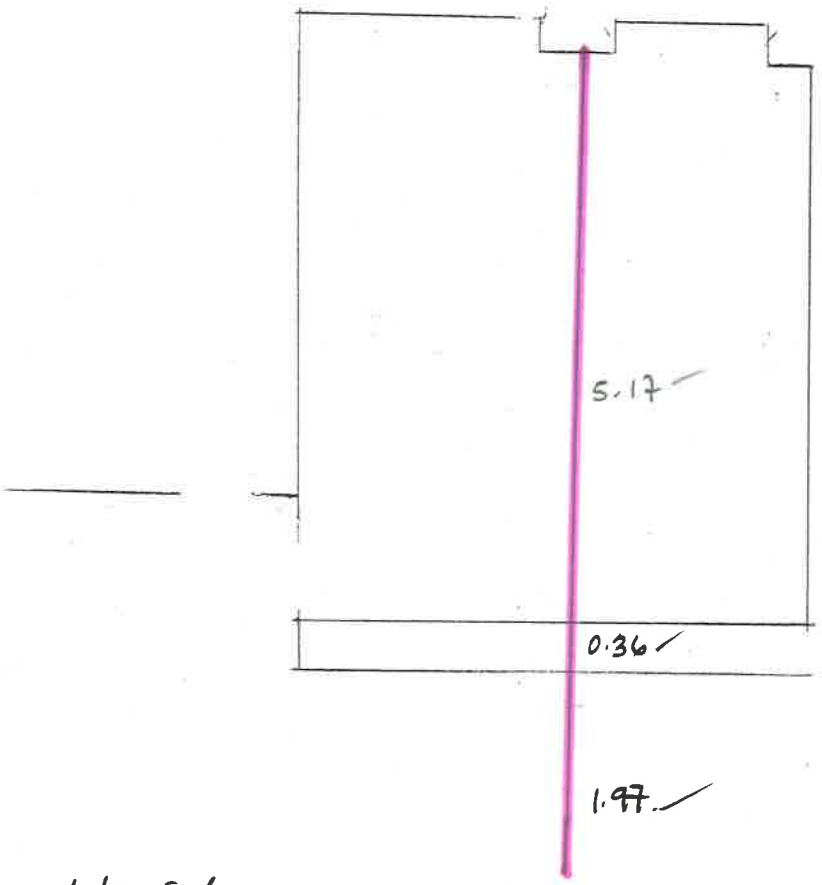

EXT-100 - Suministro e instalación de junta fría...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CAFÉ Y BAÑOS

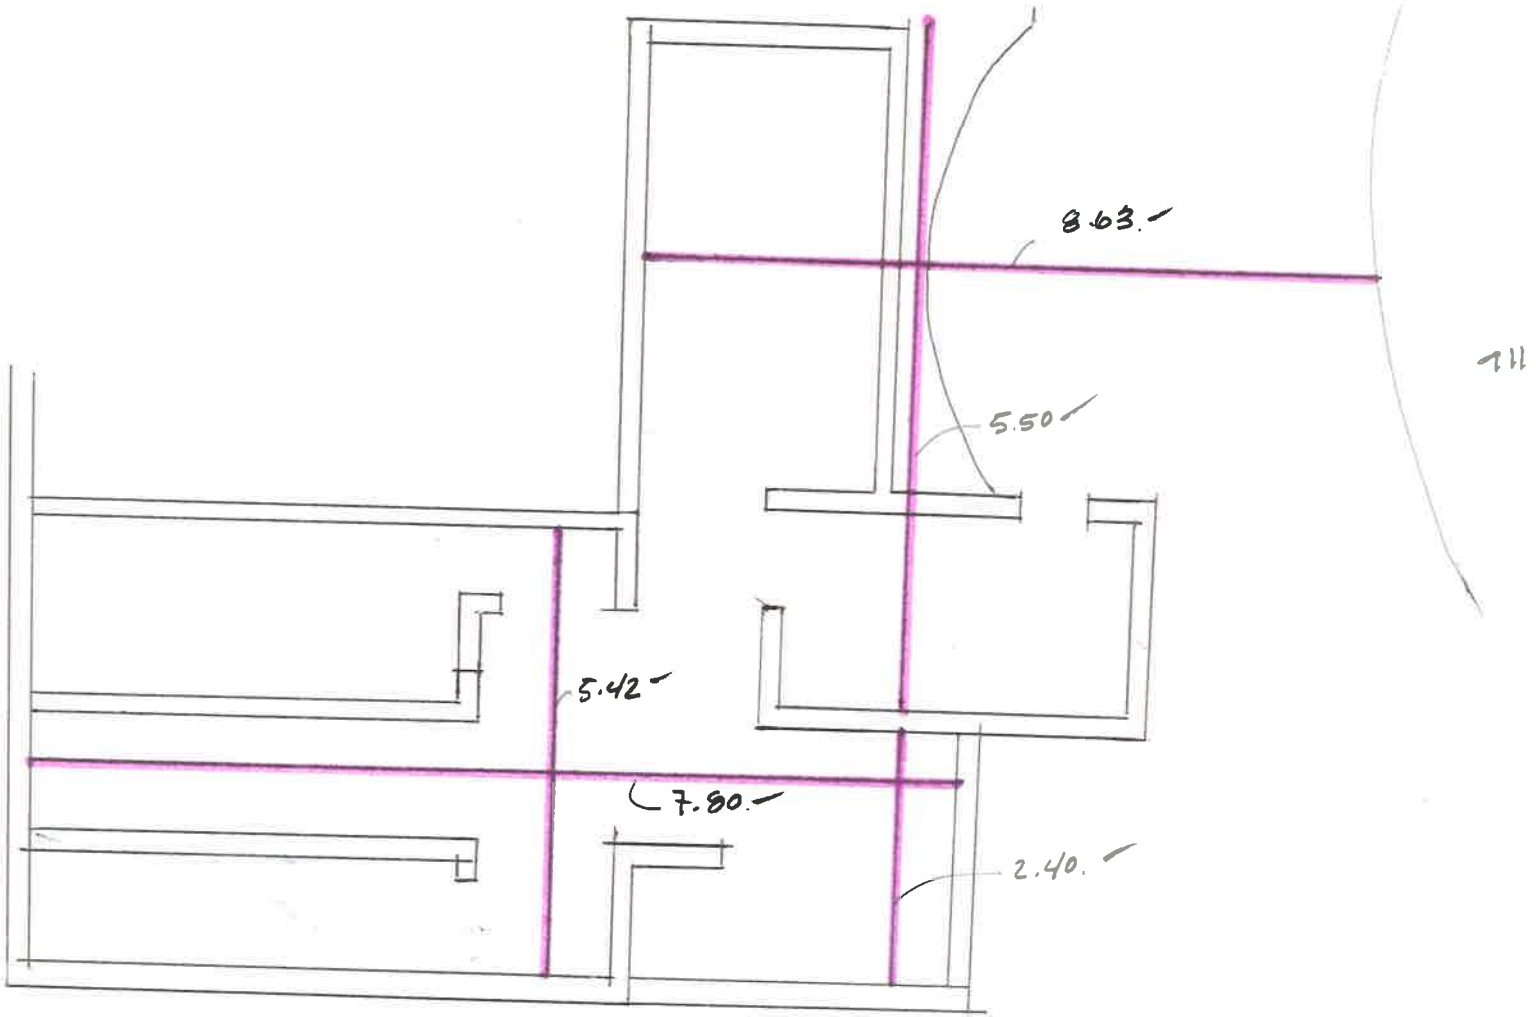

EXT-100 - Suministro e instalación de Junta fría ..


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un **periodo de 5 años.**

ARMERIA.



EXT-100 - Suministro e instalación de Sonta fría en pisos..


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017, de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

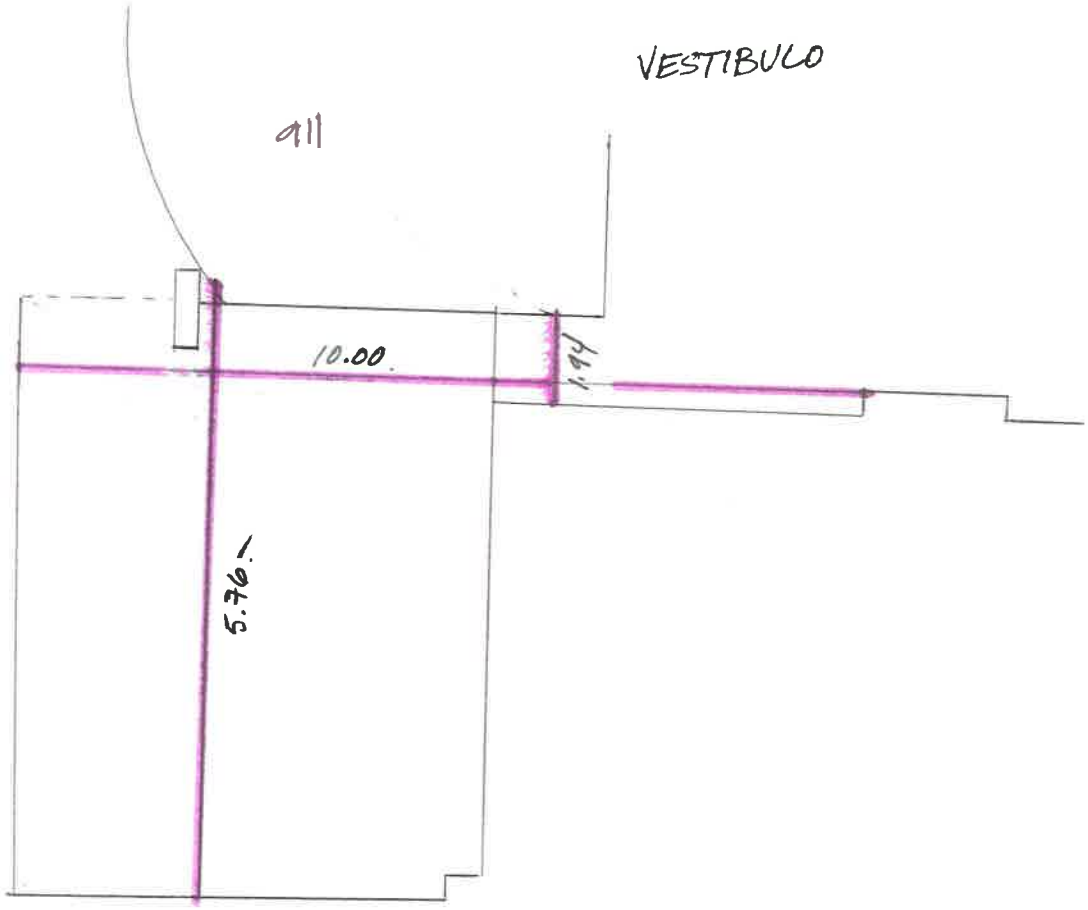

EXT-100 - Suministro e instalación de Sunta fría en pisos..


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

VESTIBULO DE ACCESO.

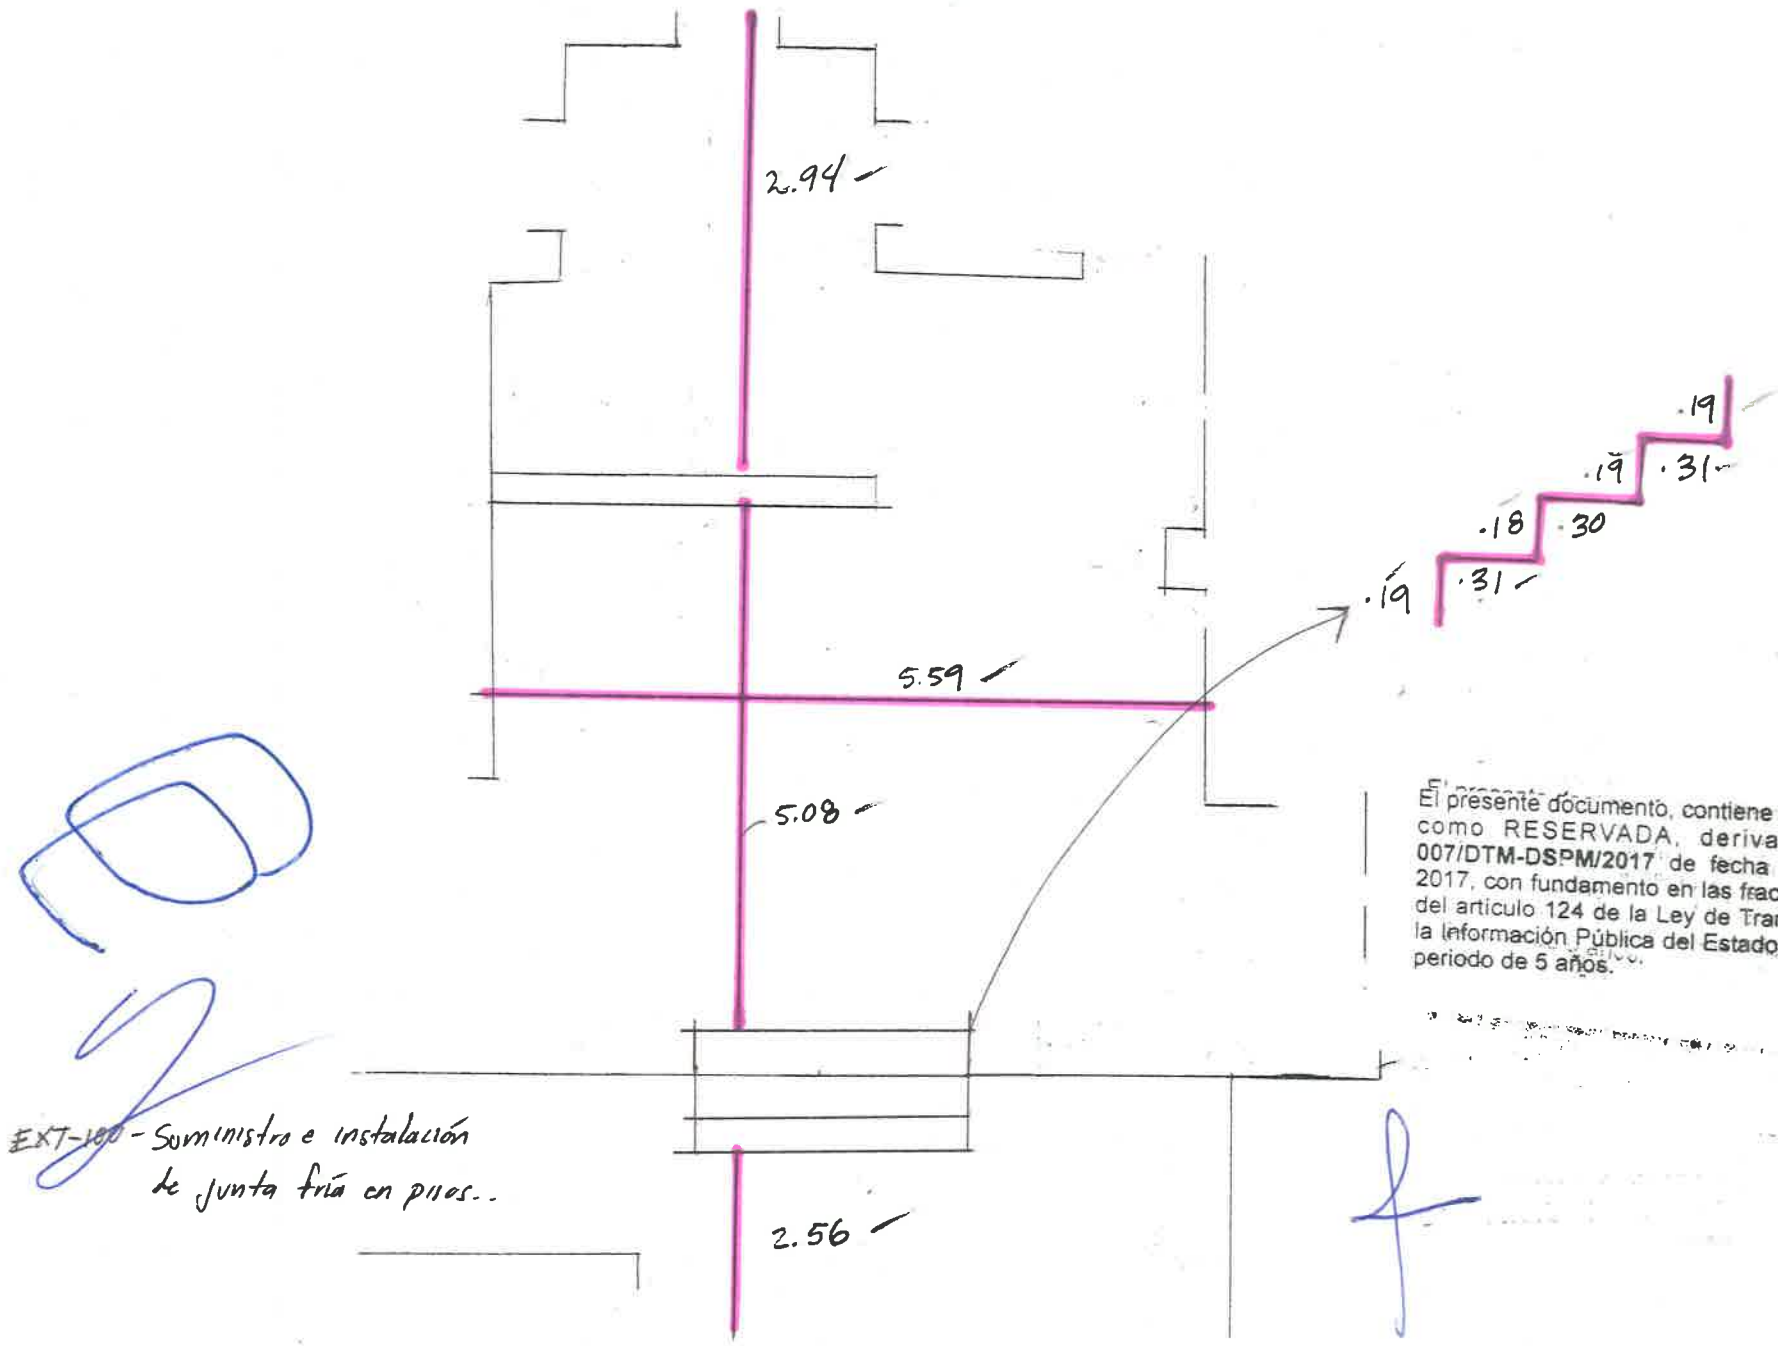

El presente documento, contiene información clasifica
como RESERVADA, derivado del ACUERD
007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre
2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y V
del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
la Información Pública del Estado de Chihuahua, por
periodo de 5 años.

EXT-100 - Suministro e instalación de junta fría en pisos..

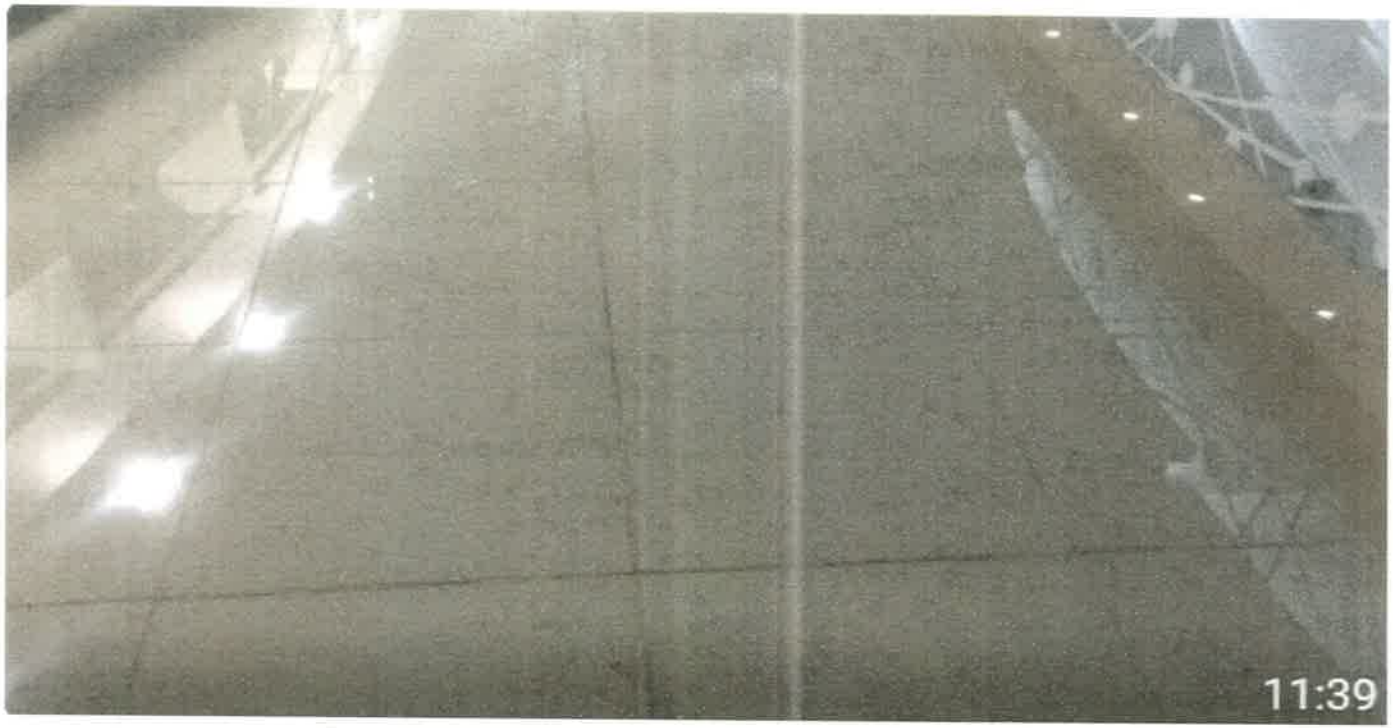

EXT- 100 Suministro e instalación de junta fría en pisos de cerámica por indicaciones del proveedor a base de cola de rata y sello con sika 1ª. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-101						
Suministro e instalación de manguera tipo led de 9w, 120v colocada en plafón de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		65.00	65.00			
		TOTAL	**65.00**			**65.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

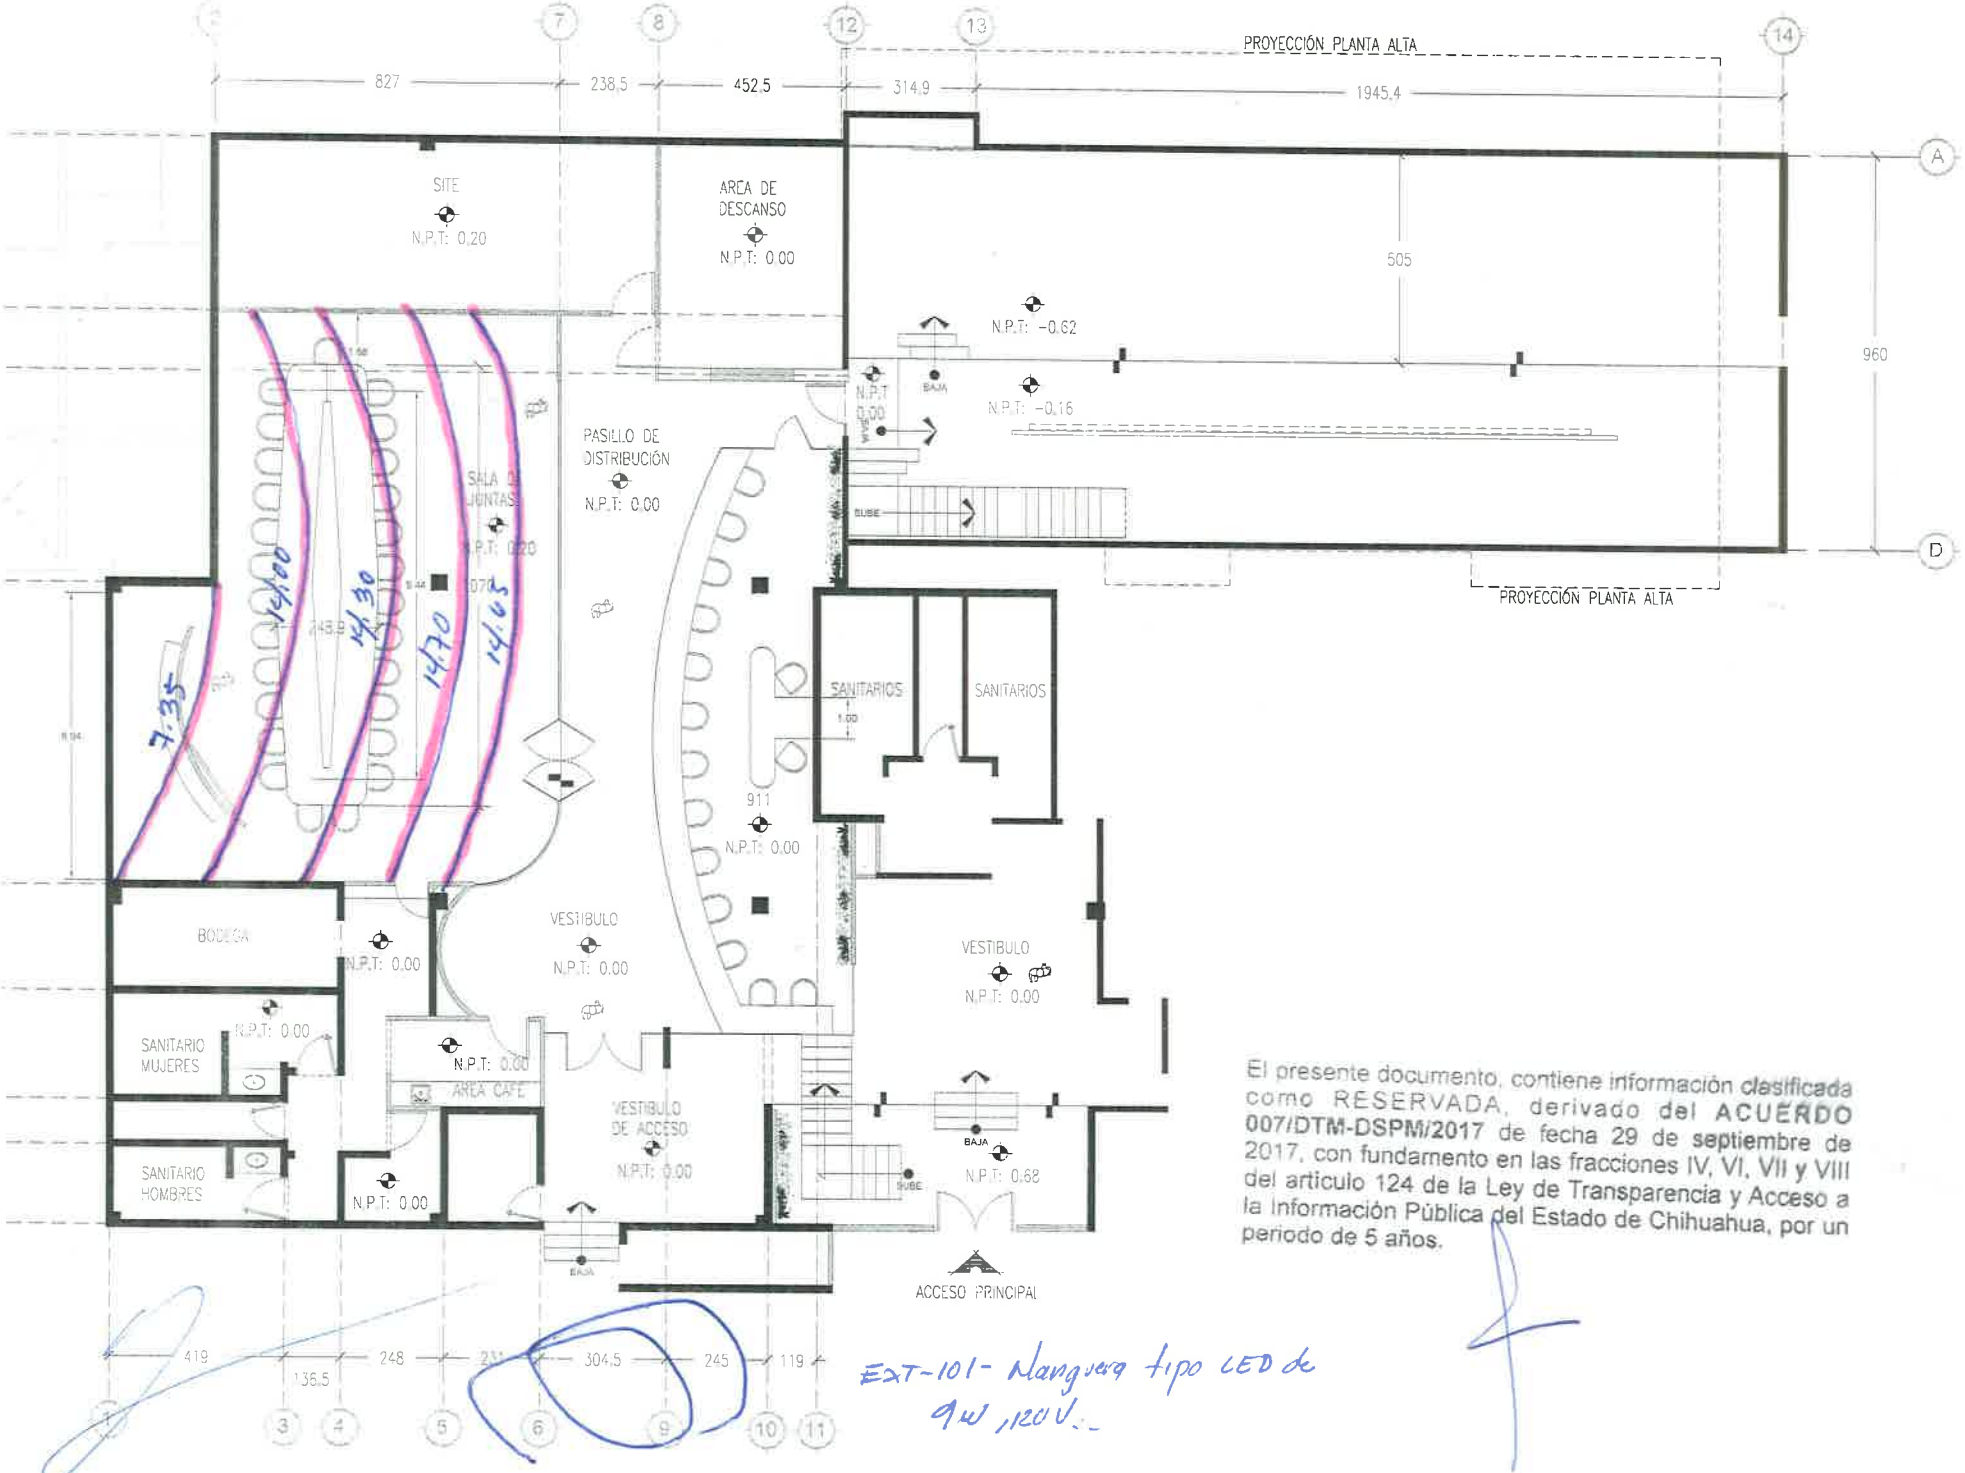

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-101- Luminaria tipo LED de 9W, 120V.



EXT- 101 Suministro e instalación de manguera tipo led de 9w, 120v colocada en plafón de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-103					
Suministro e instalación de termostato digital programable marca Honeywell en el sitio indicado por la Supervisión en el área de ciber operadores. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		**1.00**
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

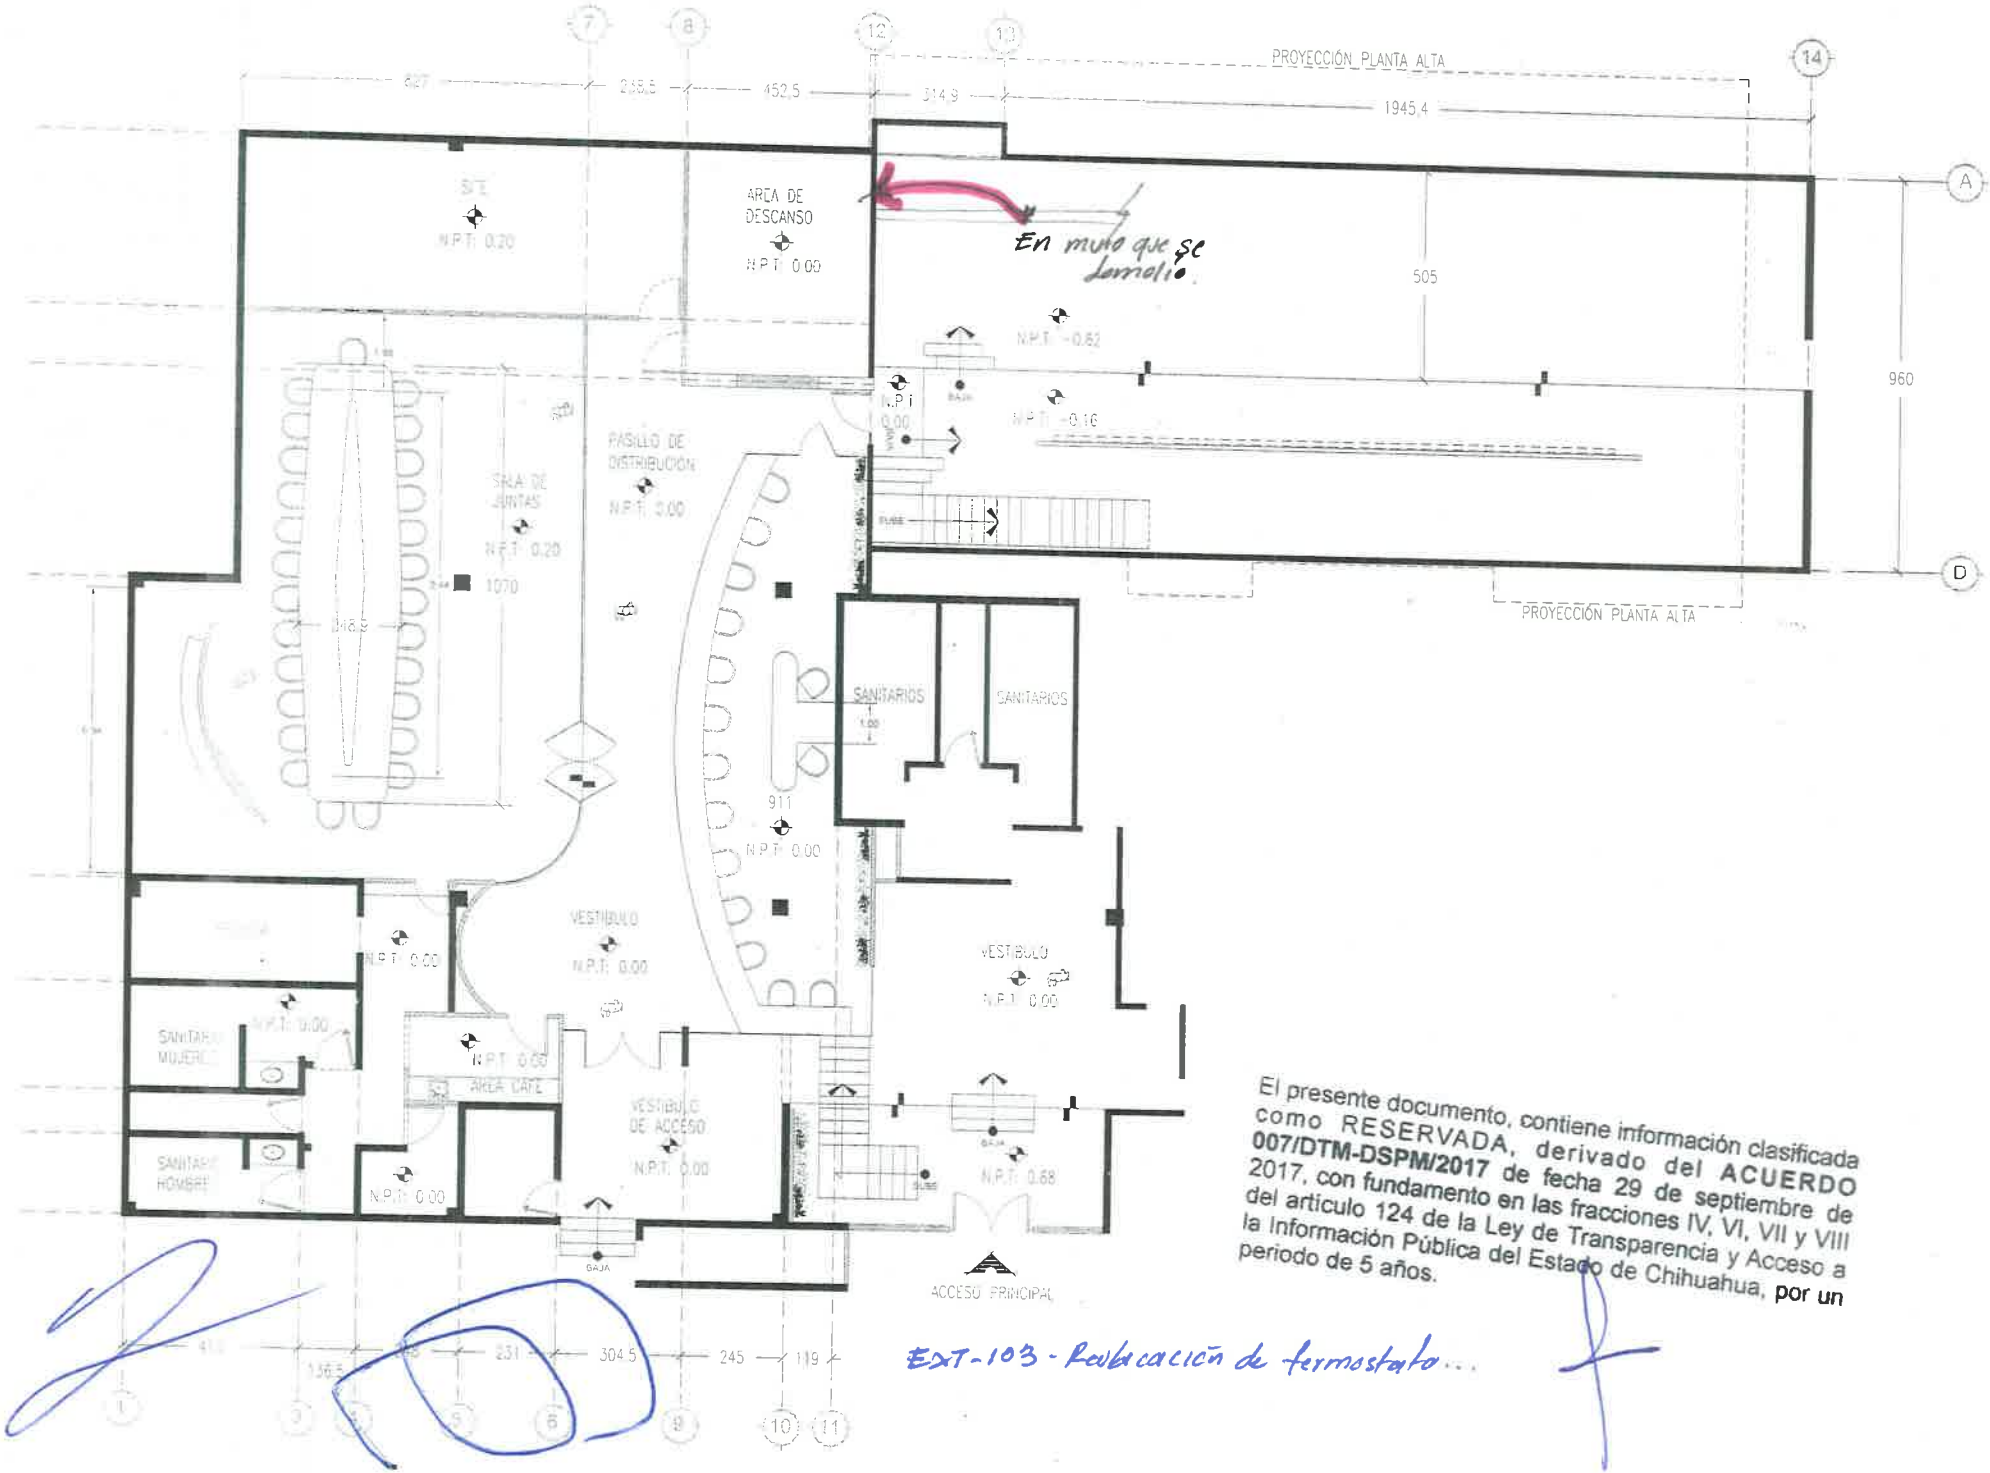

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-103 - Reubicación de termostato...

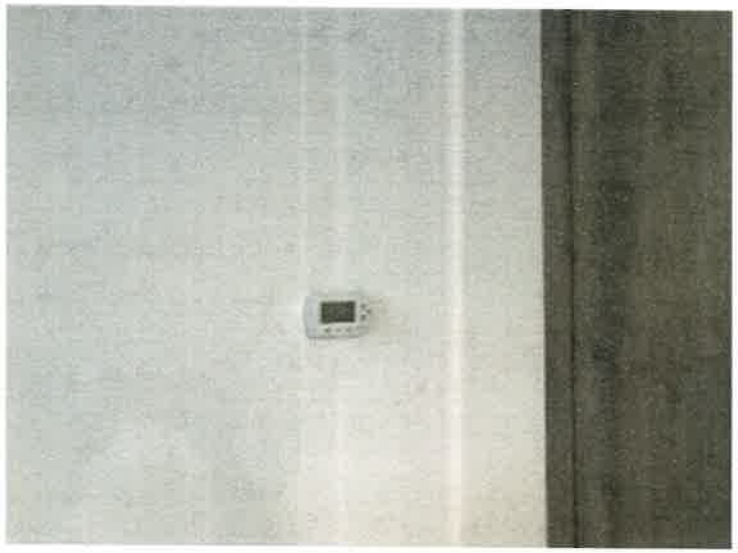

EXT- 103

Suministro e instalación de termostato digital programable marca Honeywell en el sitio indicado por la Supervisión en el área de ciber operadores. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-105					
		Pieza	Total		
Suministro e instalación de cable armoflex cal. 3x12 en caja FS., para conexión de mesas de control en video Wall. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		5.00	5.00		5.00
		TOTAL	5.00		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

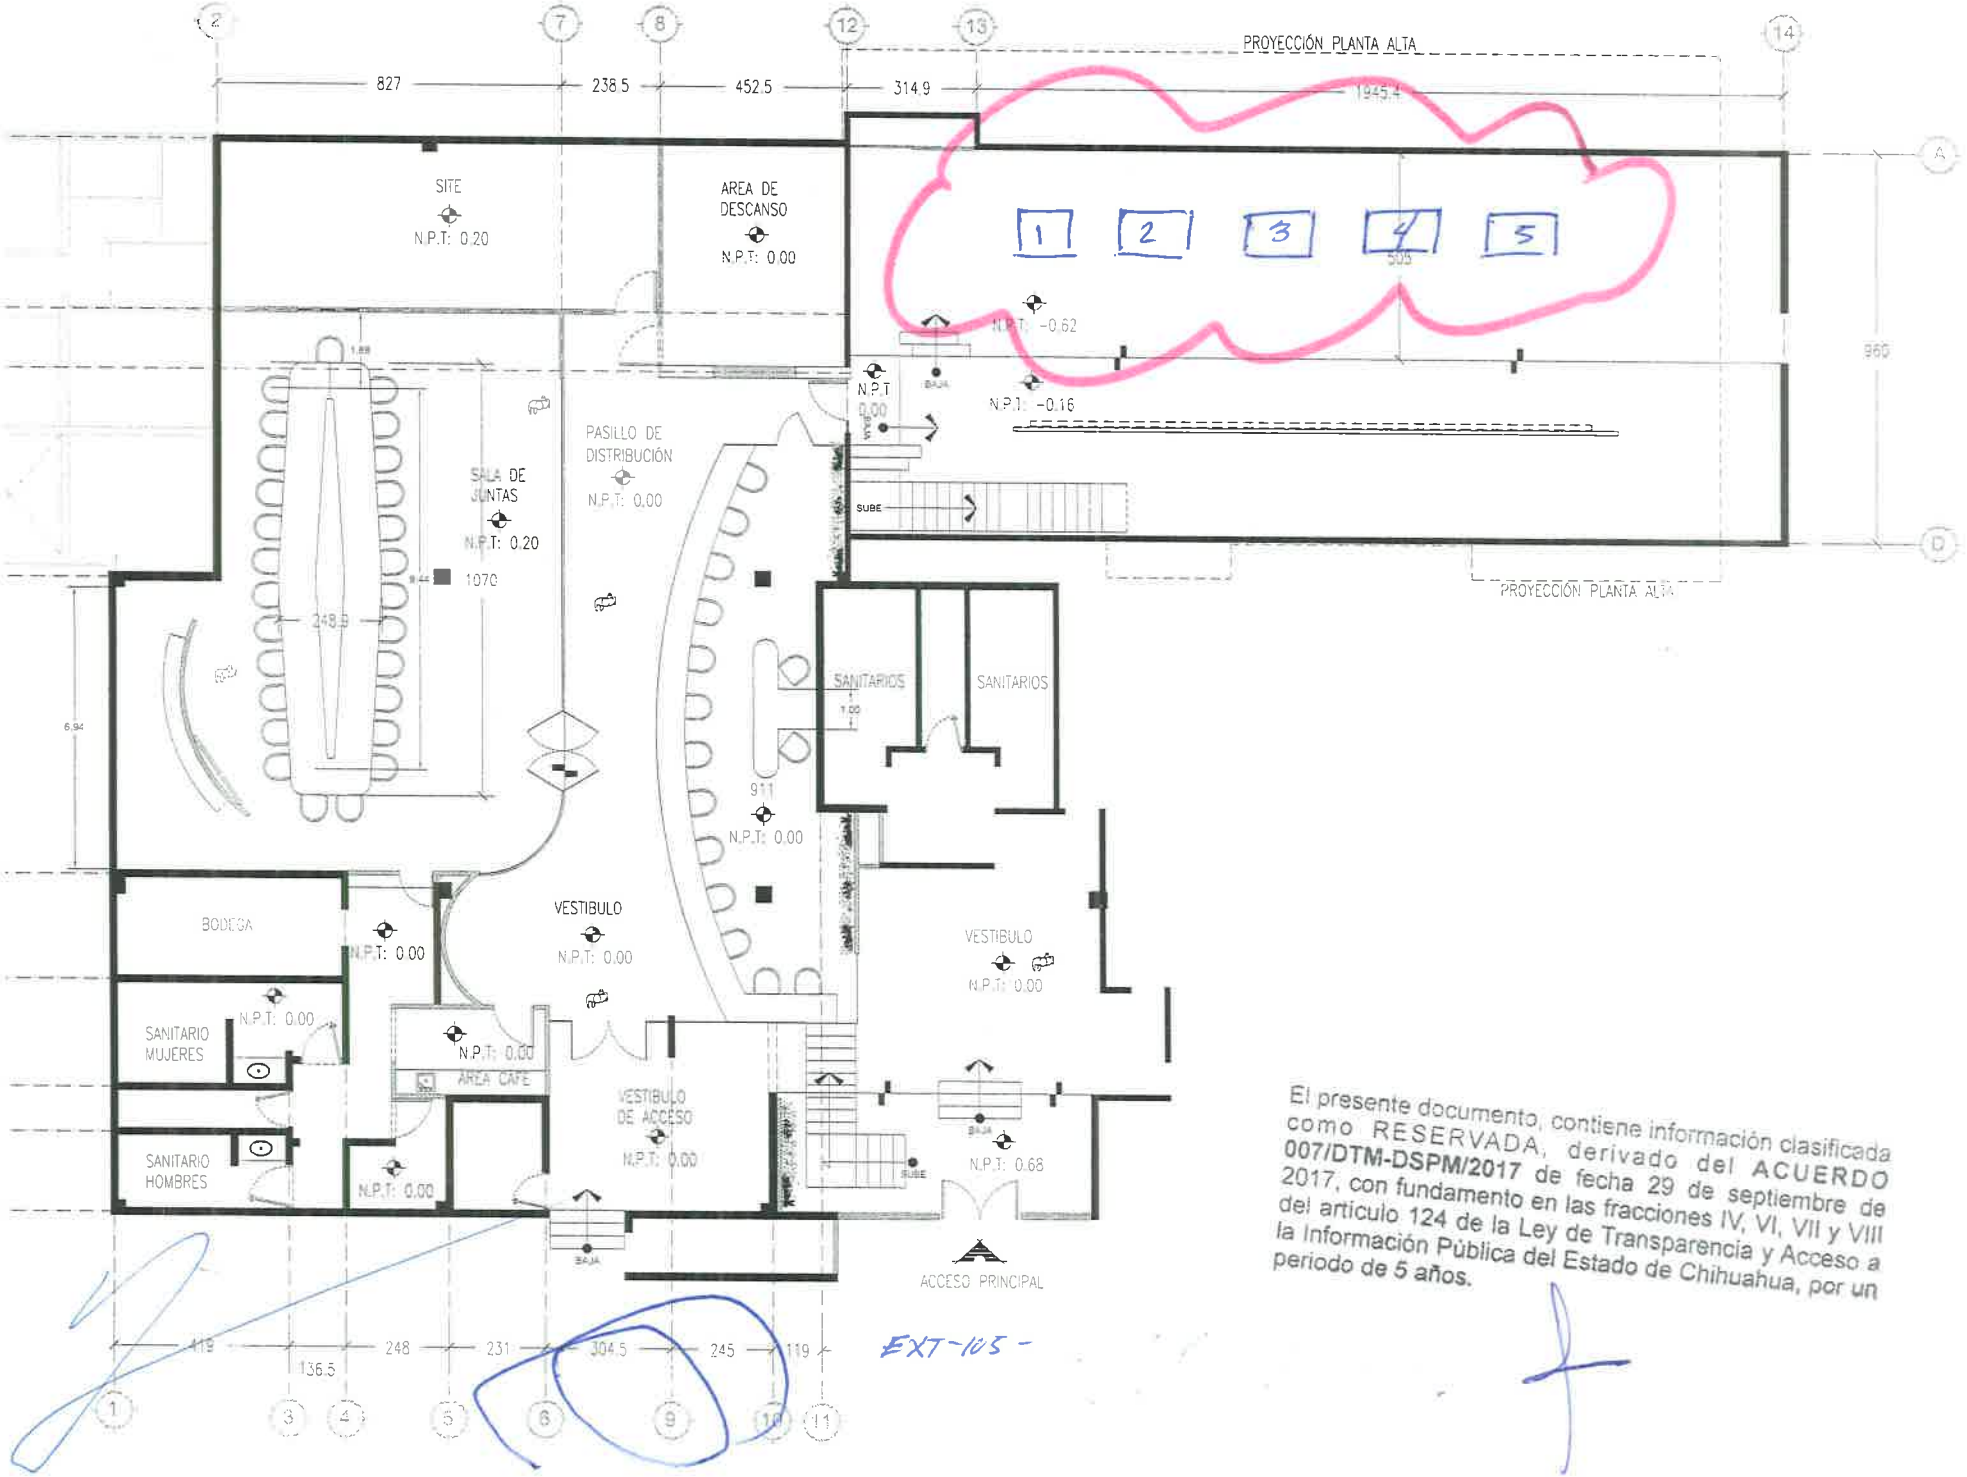

EXT-105-

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 105

Suministro e instalación de cable armoflex cal. 3x12 en caja FS., para conexión de mesas de control en video Wall. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-106		Largo	Total			
Suministro e instalación de alimentación eléctrica a la torre de antenas ubicada en la azotea. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		20.00	20.00			20.00
		TOTAL	20.00			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

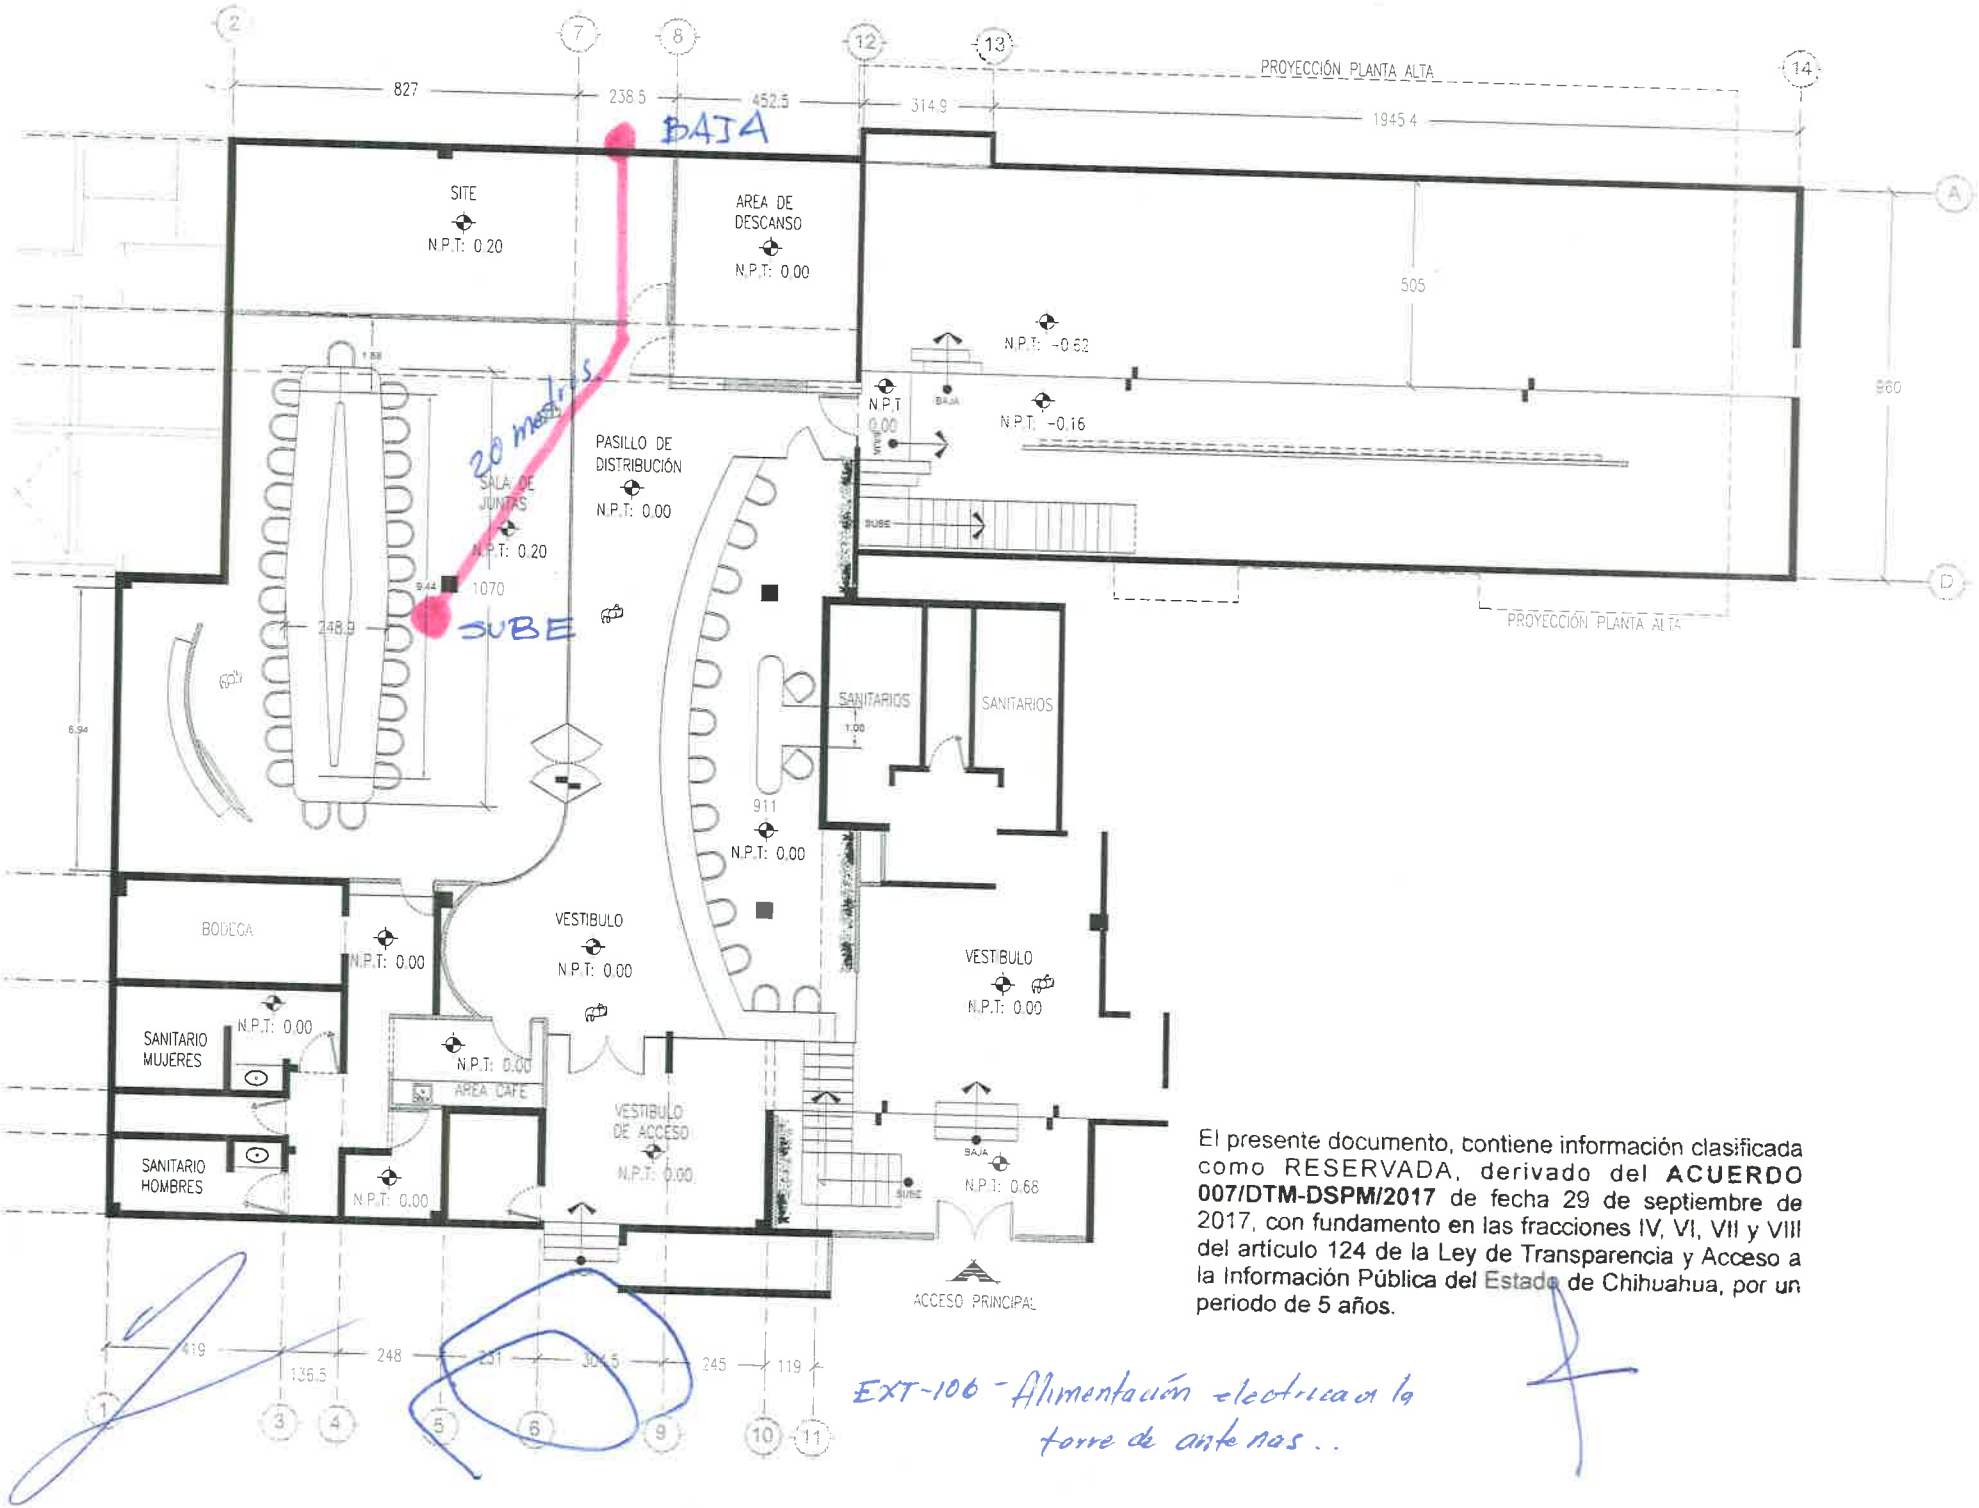

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-106 - Alimentación electrica a la torre de antenas..



EXT- 106

Suministro e instalación de alimentación eléctrica a la torre de antenas ubicada en la azotea. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-108					
Suministro e Instalación de alimentación eléctrica desde UPS a mesas de ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		**1.00**
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

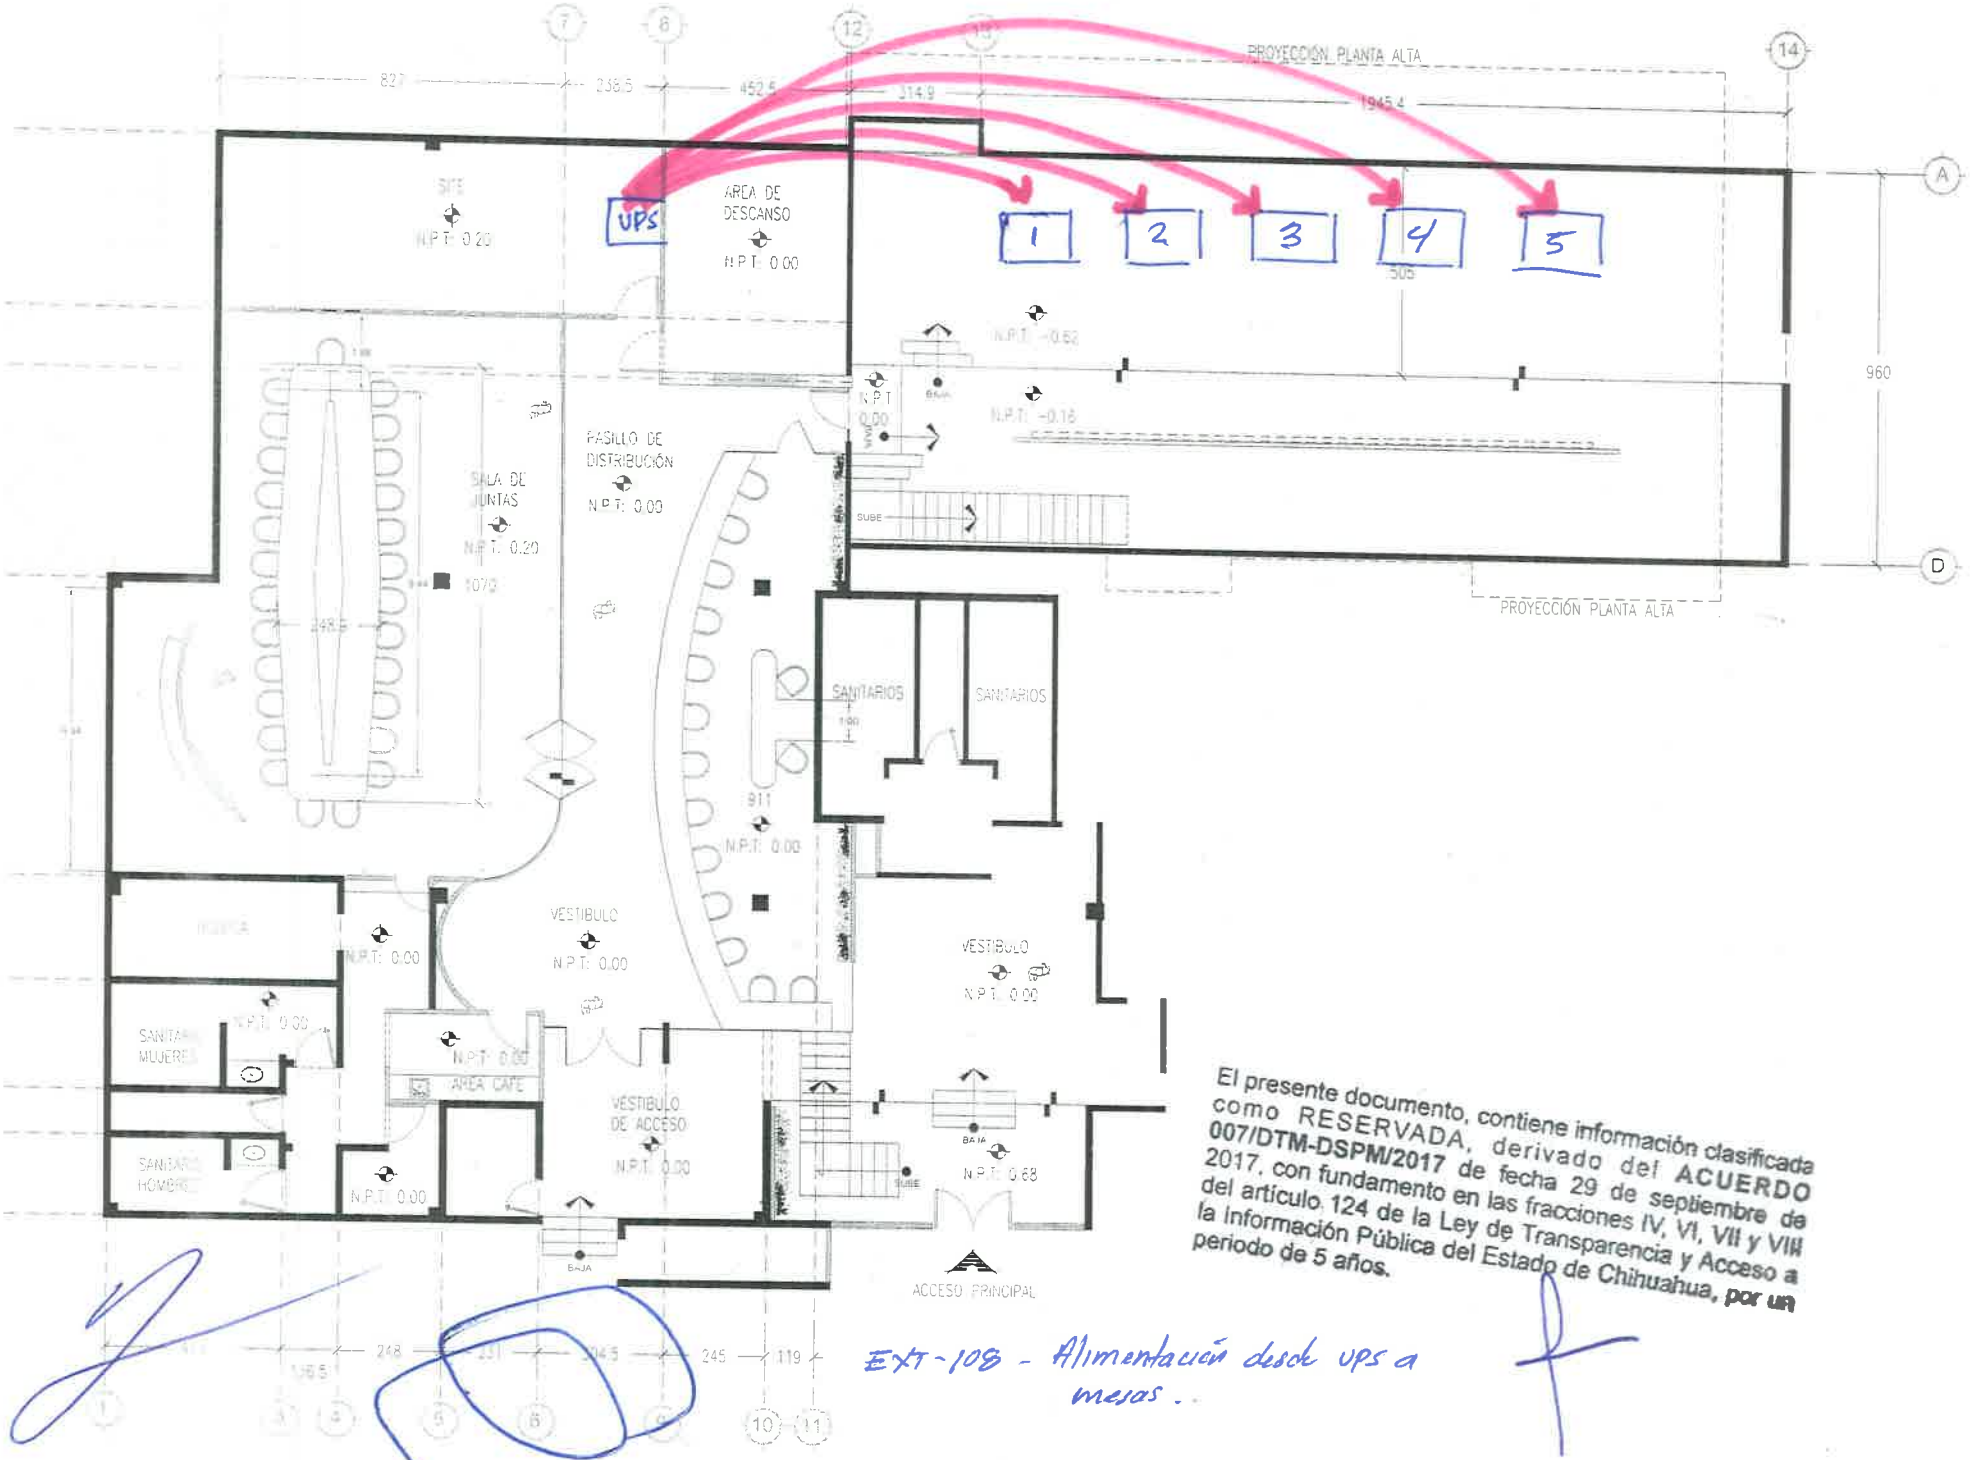

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, **por un periodo de 5 años.**

EXT-108 - Alimentación desde ups a mesas..

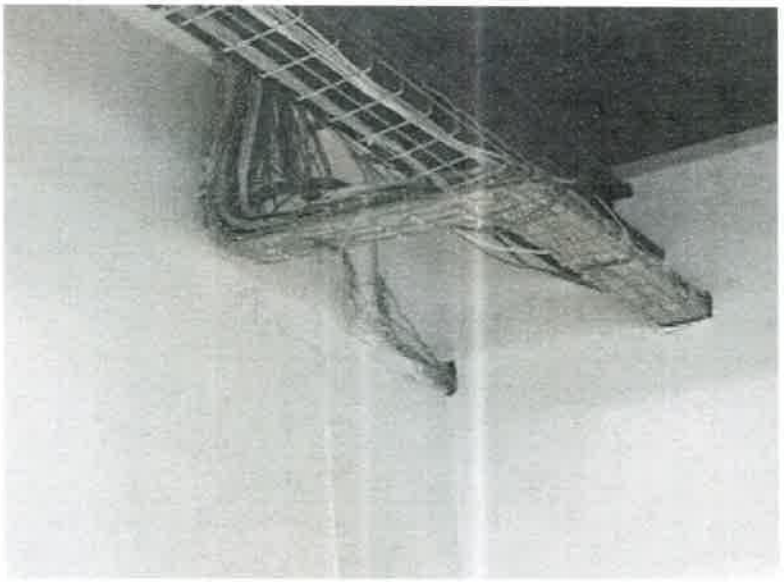

EXT- 108

Suministro e Instalación de alimentación eléctrica desde UPS a mesas de ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-110					
Suministro e instalación de apagador doble. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		4.00	4.00		
		TOTAL	**4.00**		**4.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

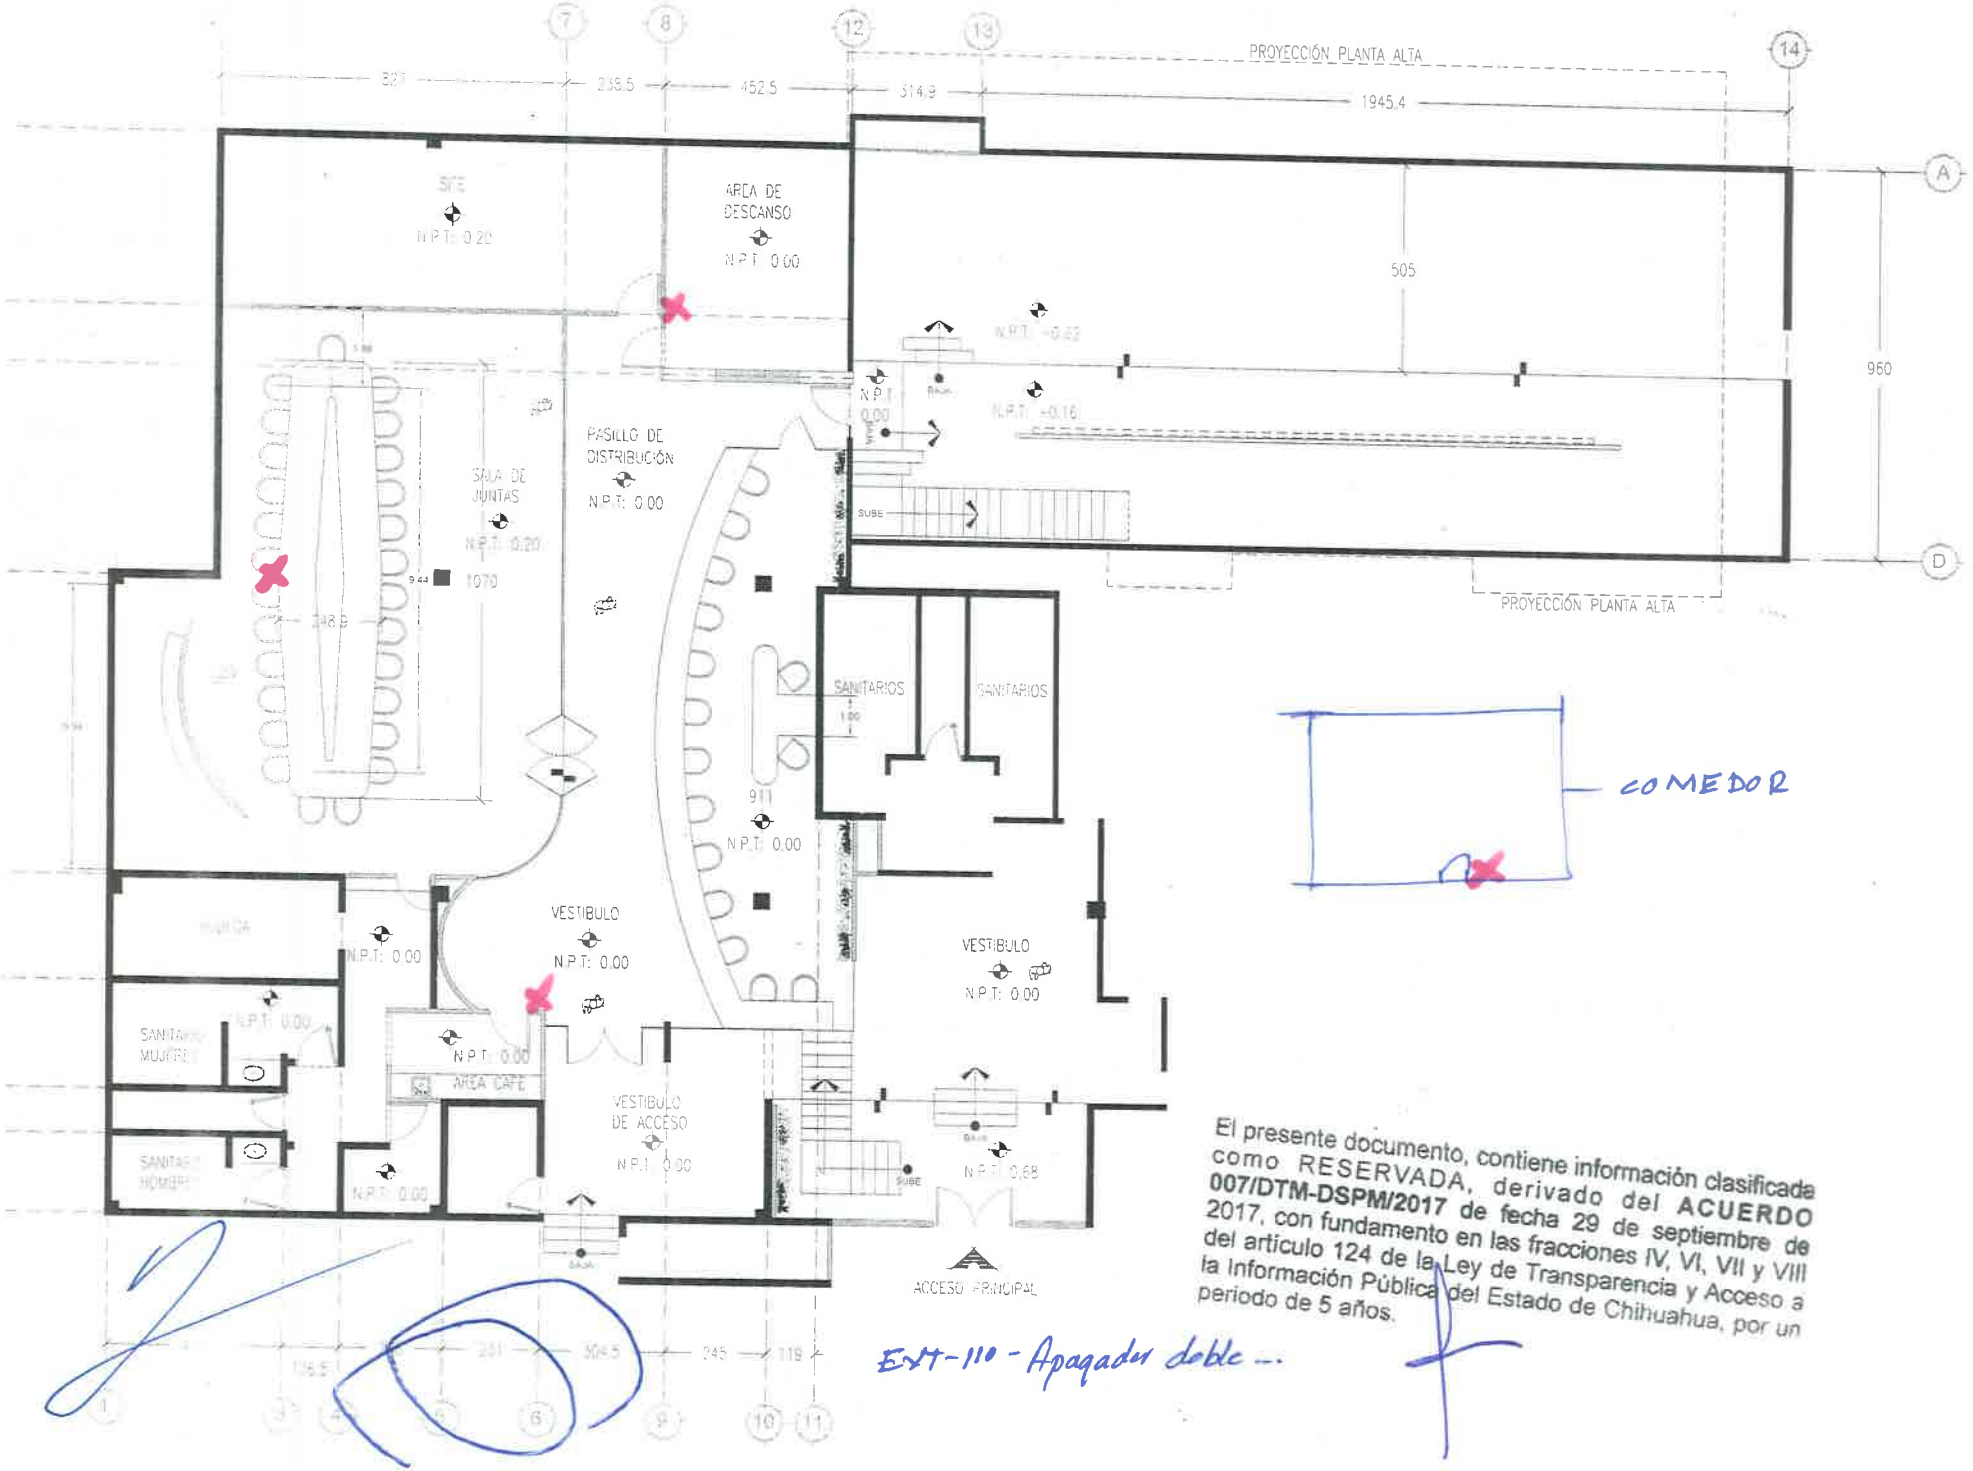

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ext-110 - Apagador doble ...

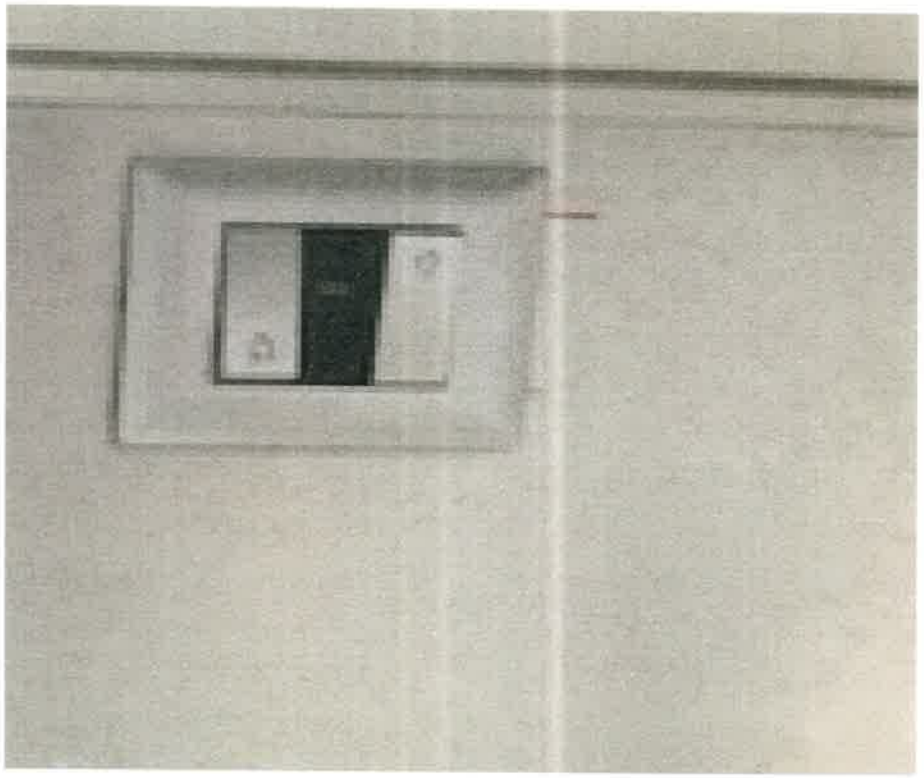

EXT- 110 Suministro e instalación de apagador doble. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente **documento, contiene información clasificada como** RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de **5** años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-111					
Desinstalación de luminaria en video Wall, retiro y acarreo a donde lo indique la supervisión de la Dependencia. Incluye: mano de obra, traslados, almacenamientos temporales, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		10.00	10.00		
		TOTAL	**10.00**		**10.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

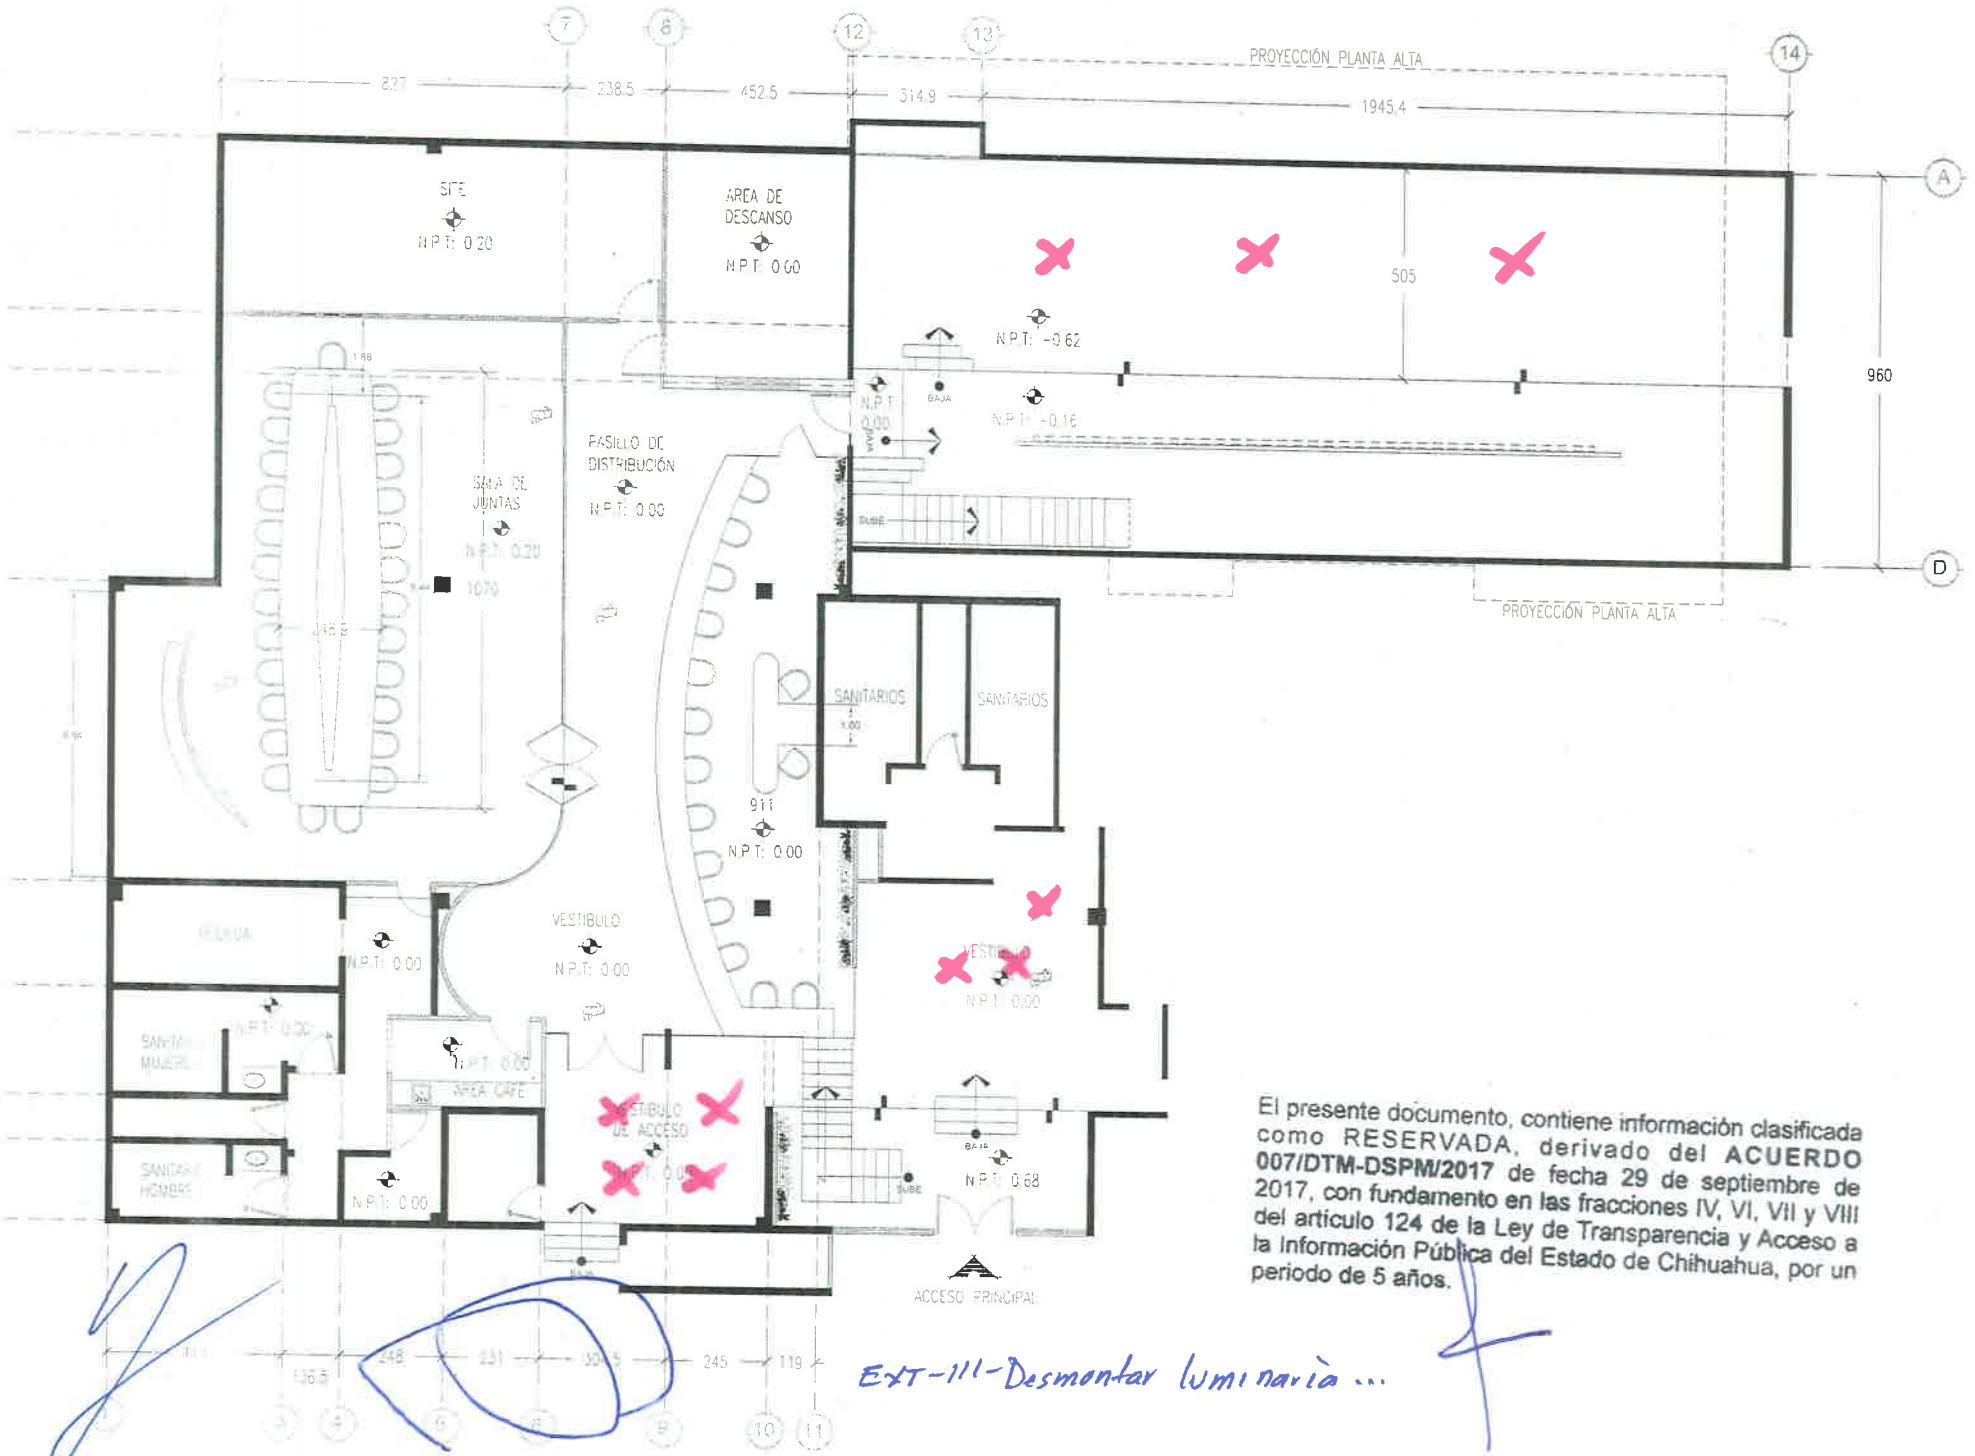

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-III-Desmontar luminaria ...



EXT- 111

Desinstalación de luminaria en video Wall, retiro y acarreo a donde lo indique la supervisión de la Dependencia. Incluye: mano de obra, traslados, almacenamientos temporales, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-114					
Suministro e instalación de alimentador eléctrico formado por 2C-THWLS-6(F) + 1C-THWLS-10(T) en 1T-PGG-27mm, para unidades de refrigeración de 5 toneladas en site. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
		38.00	38.00		
		TOTAL	**38.00**		**38.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

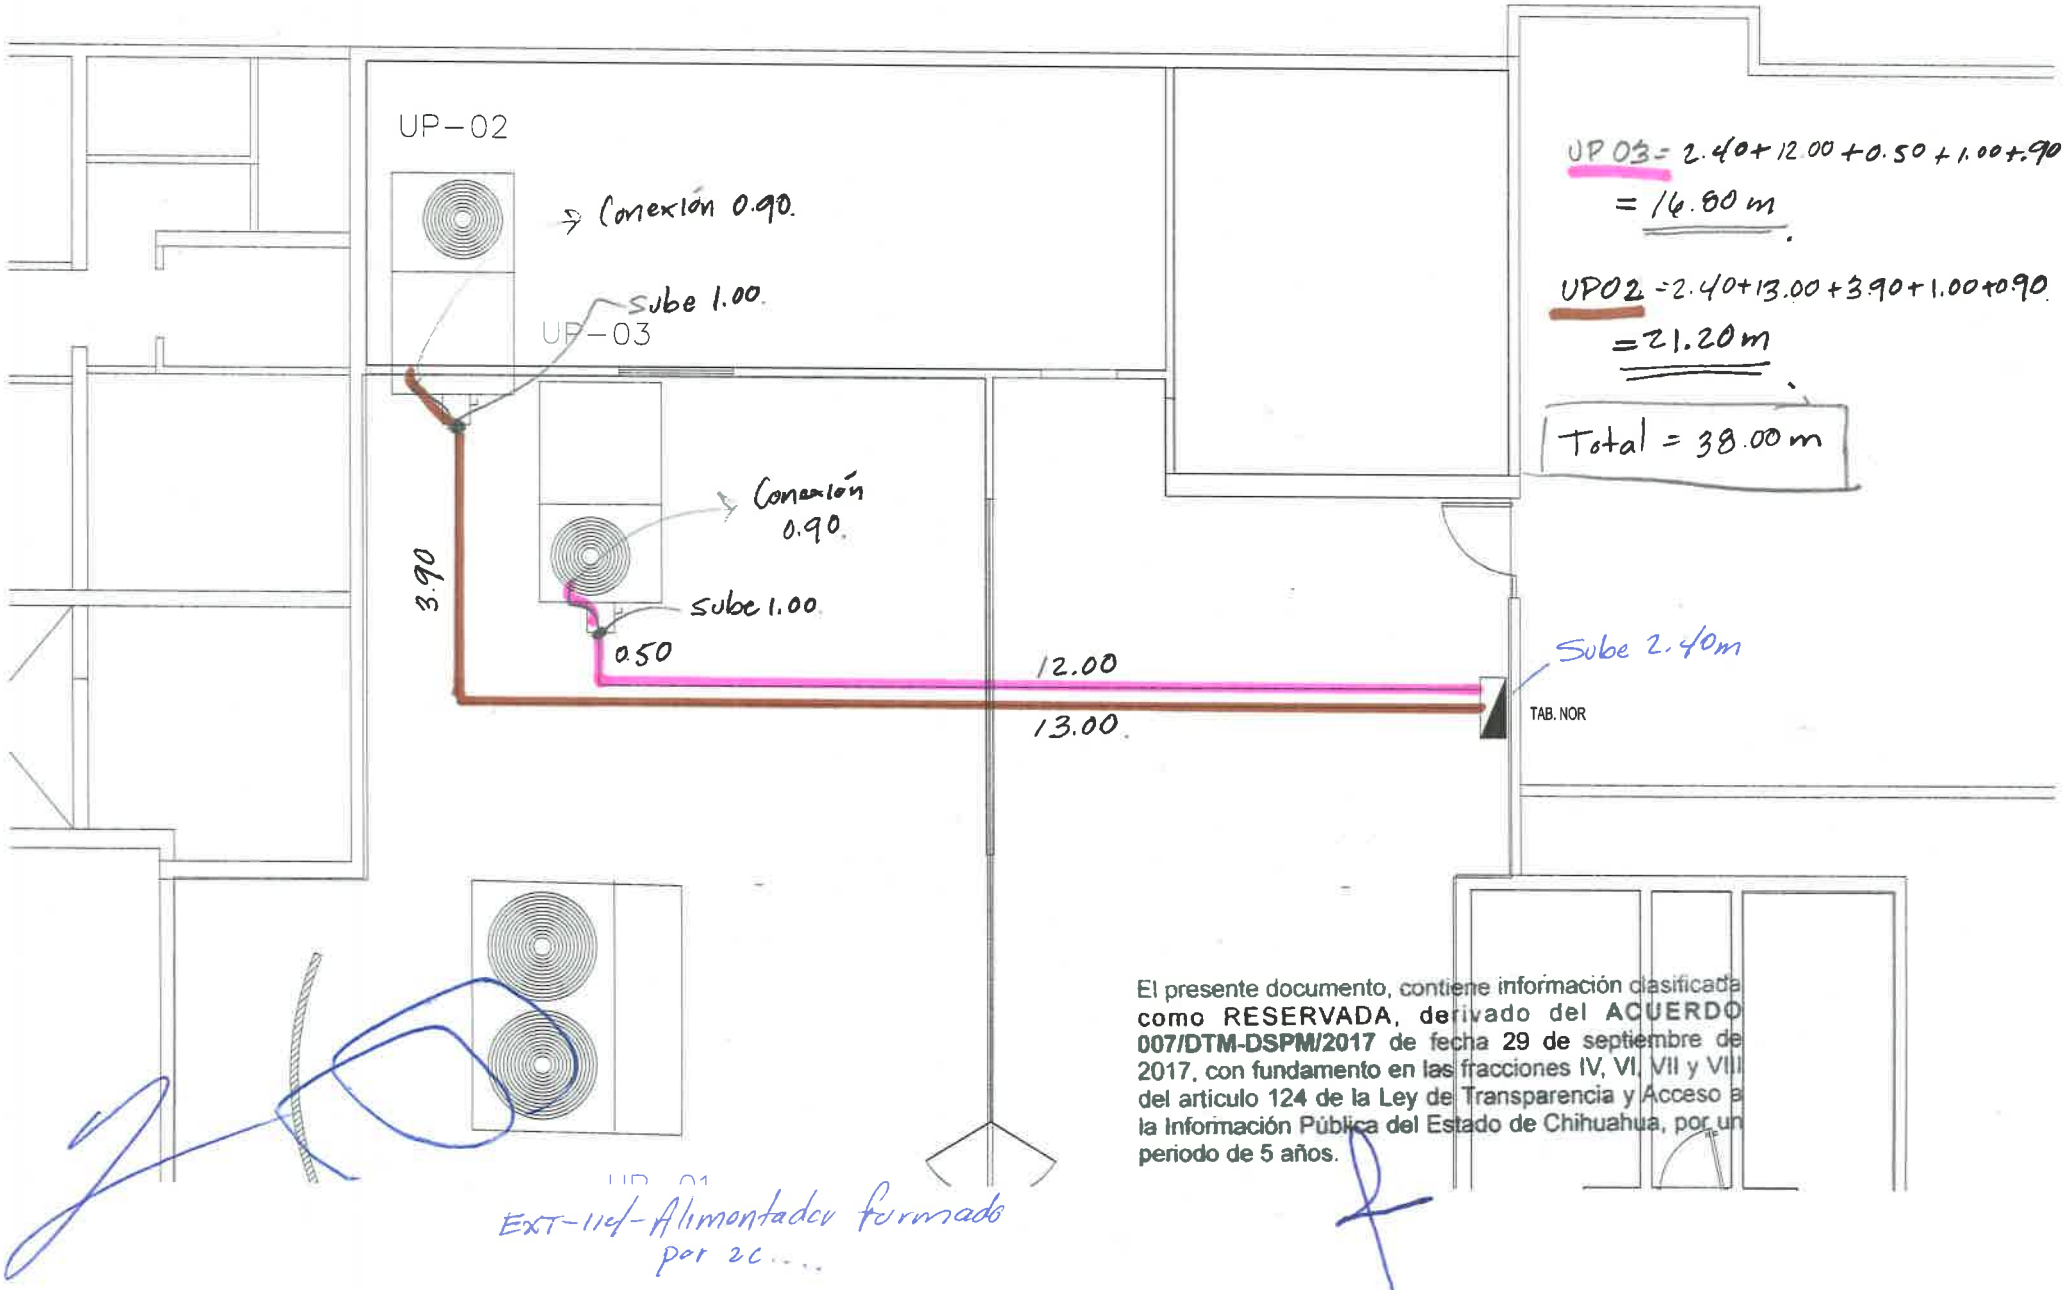

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 114 Suministro e instalación de alimentador eléctrico formado por 2C-THWLS-6(F) + 1C-THWLS-10(T) en 1T-PGG-27mm, para unidades de refrigeración de 5 toneladas en site. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-115						
Suministro e instalación de luminario LED colgante de 122x10cm, 120V, 1x18w, marca Lithonia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**1.00**
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

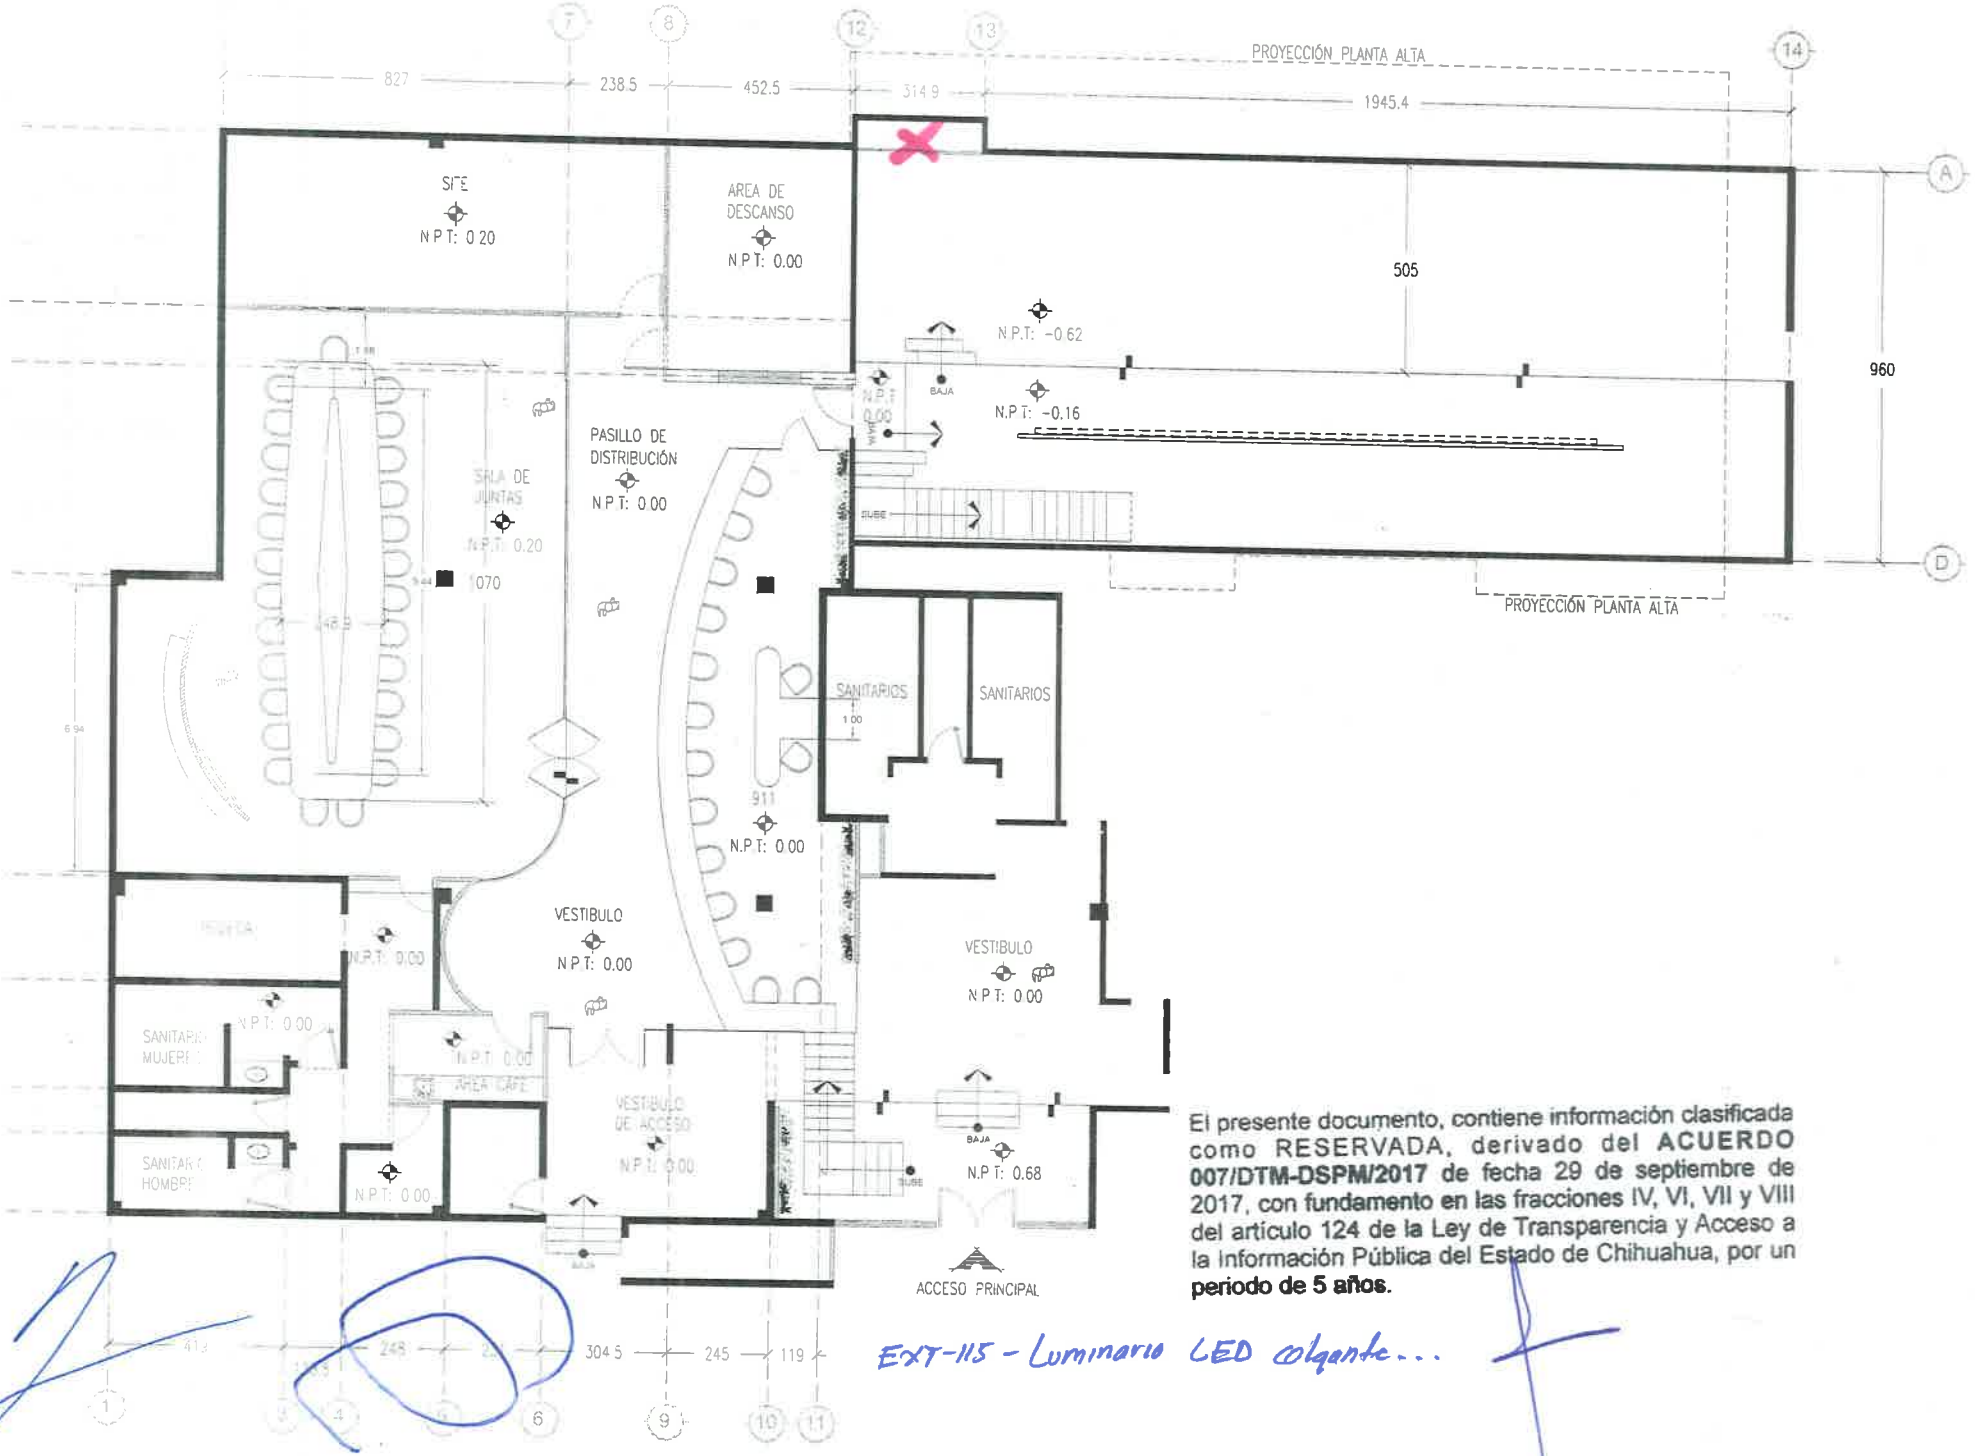

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un **periodo de 5 años.**

EXT-115 - Luminario LED colgante...

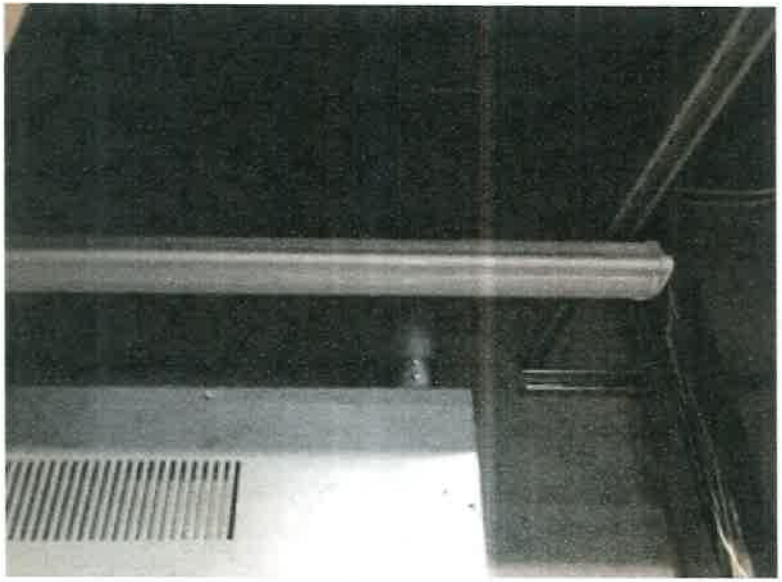

EXT- 115

Suministro e instalación de luminario LED colgante de 122x10cm, 120V, 1x18w, marca Lithonia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-119						
Fabricación de cajillo "U" recto de Tablaroca de 10 x 10 x 10 cms, para cancel área 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		3.39	3.39			
		4.55	4.55			
		0.68	0.68			
		TOTAL	**8.62**			**8.62**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

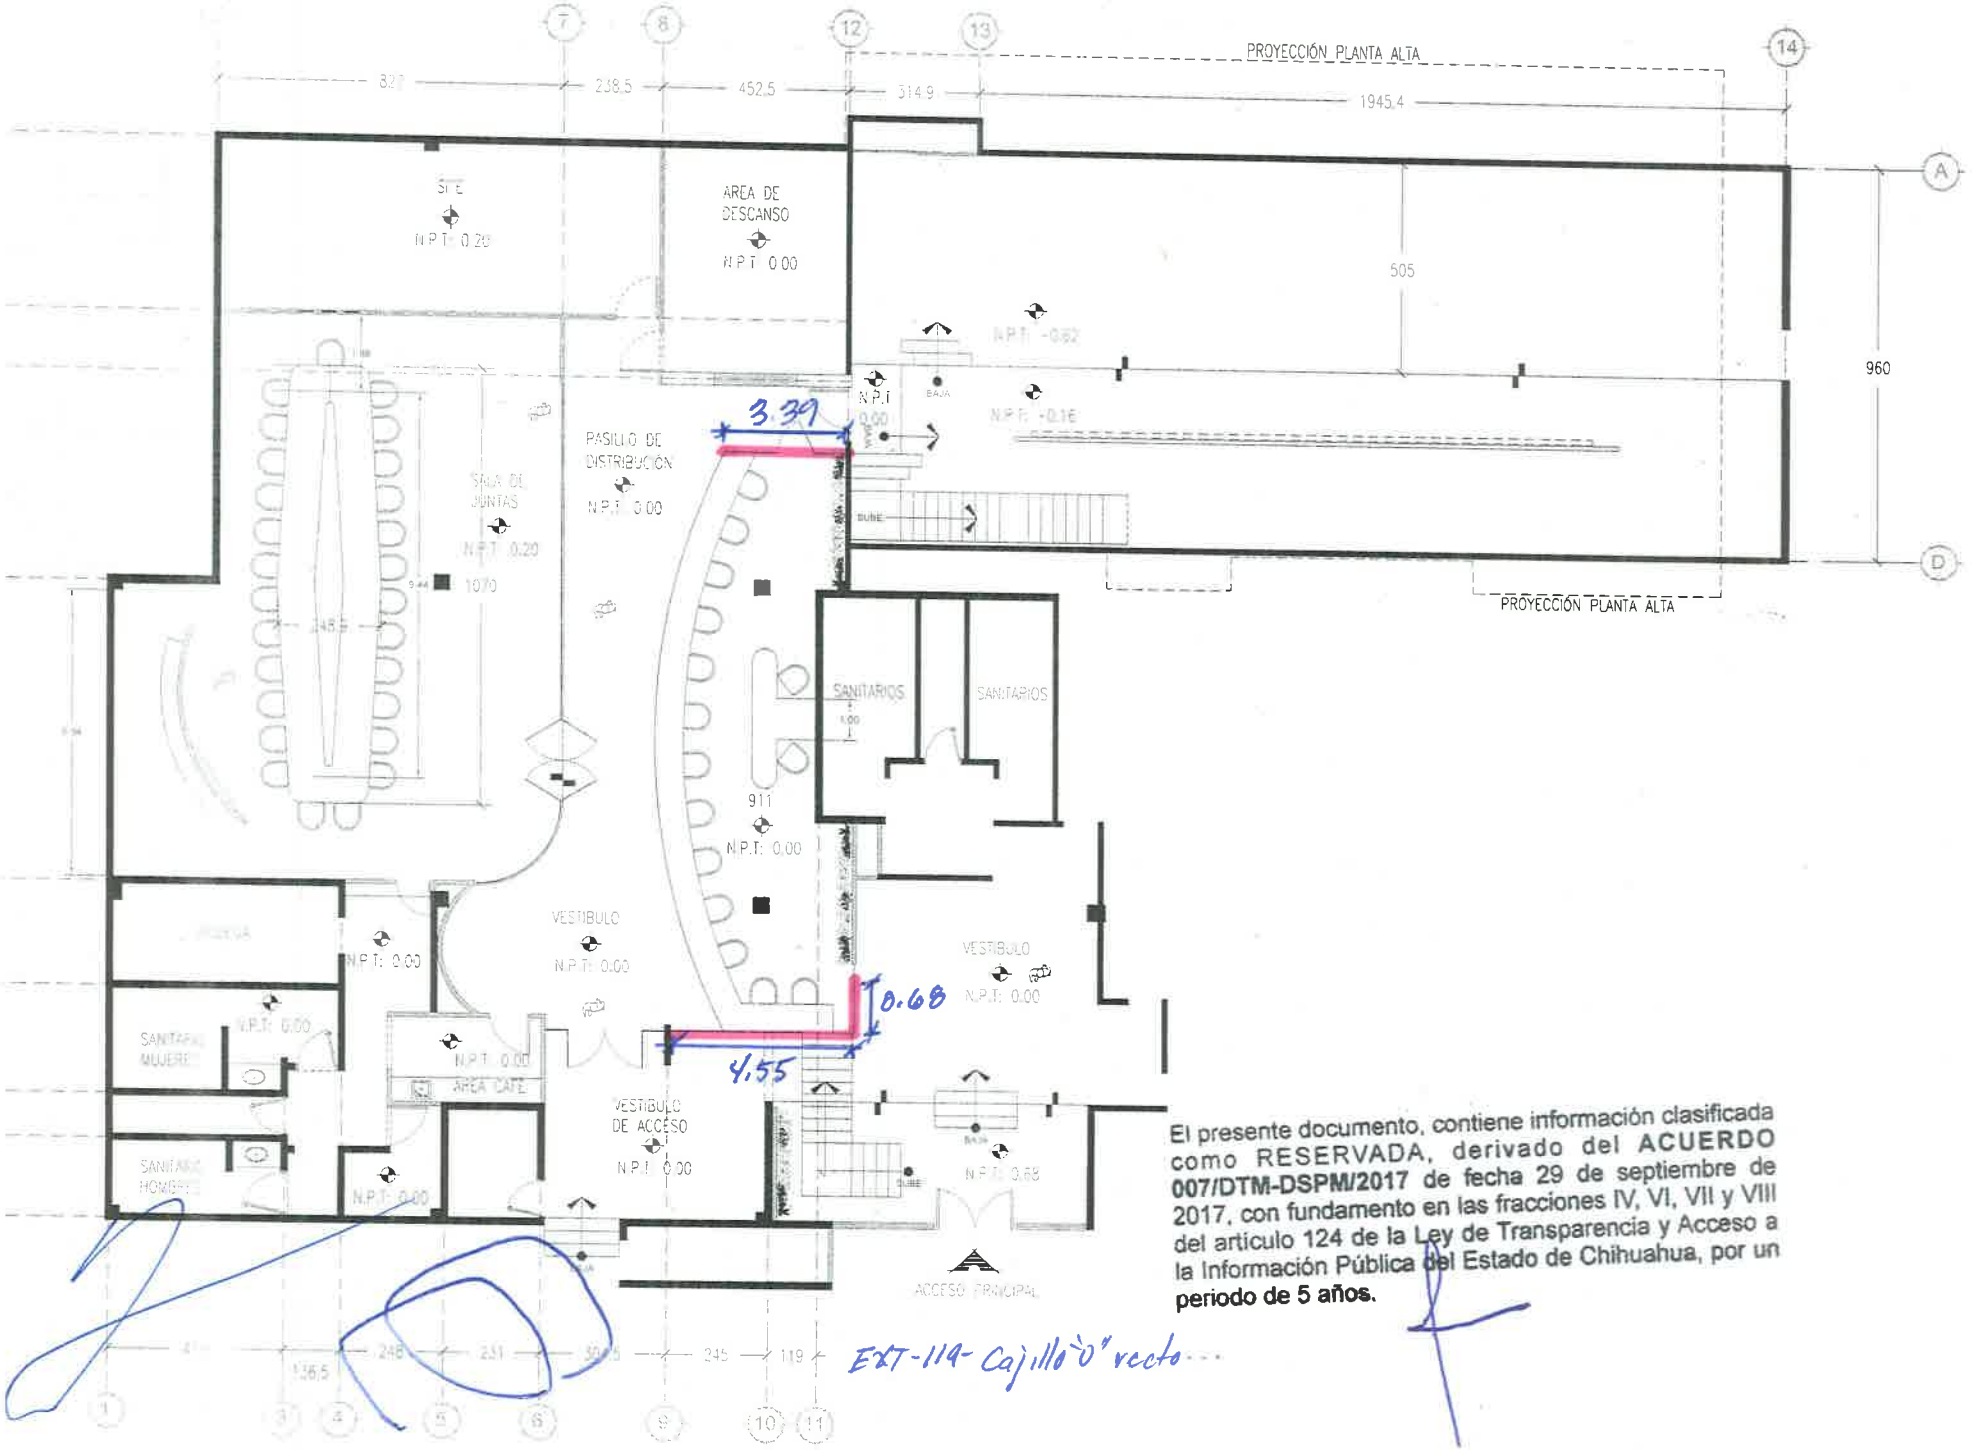

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un **periodo de 5 años.**

EXT-119- Cajillo "O" recto...

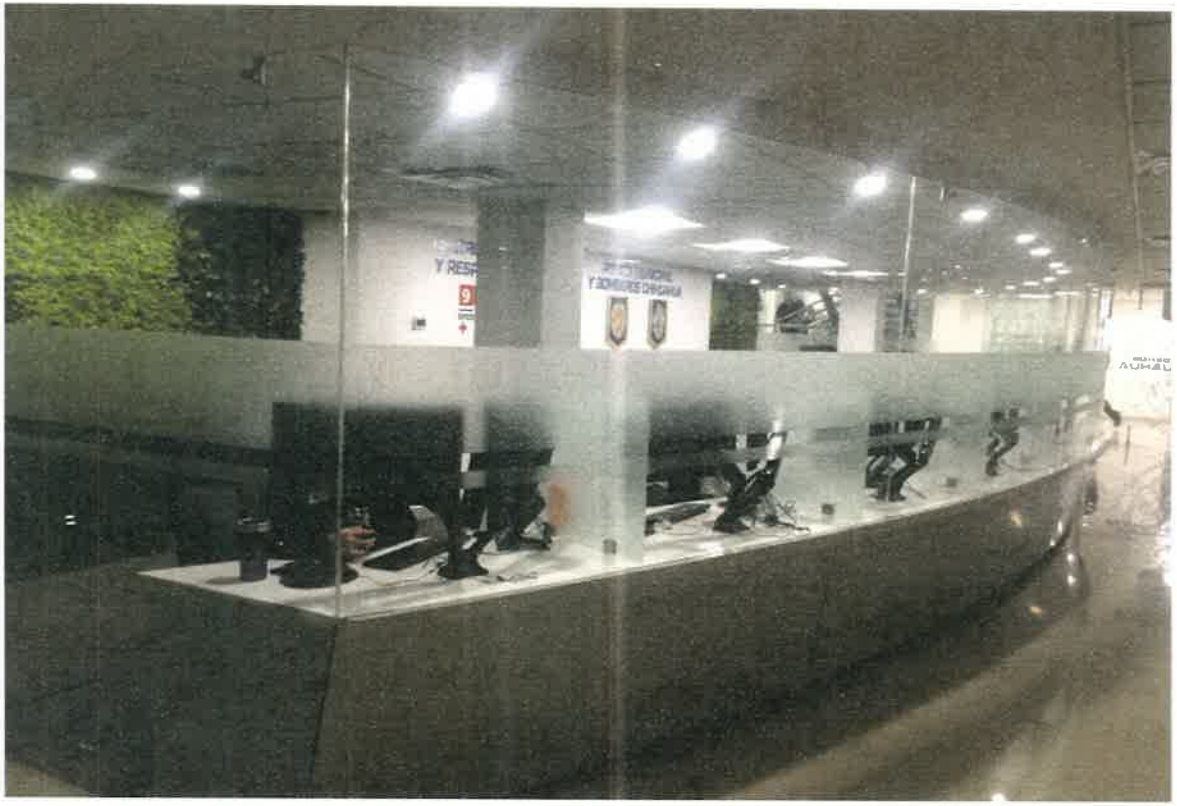

EXT- 119 Fabricación de cajillo "U" recto de Tablaroca de 10 x 10 x 10 cms, para cancel área 911. Incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-125						
Desmontaje y reubicación de mini Split de anterior site a site temporal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**2.00**
		2.00	2.00			
		TOTAL	**2.00**			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

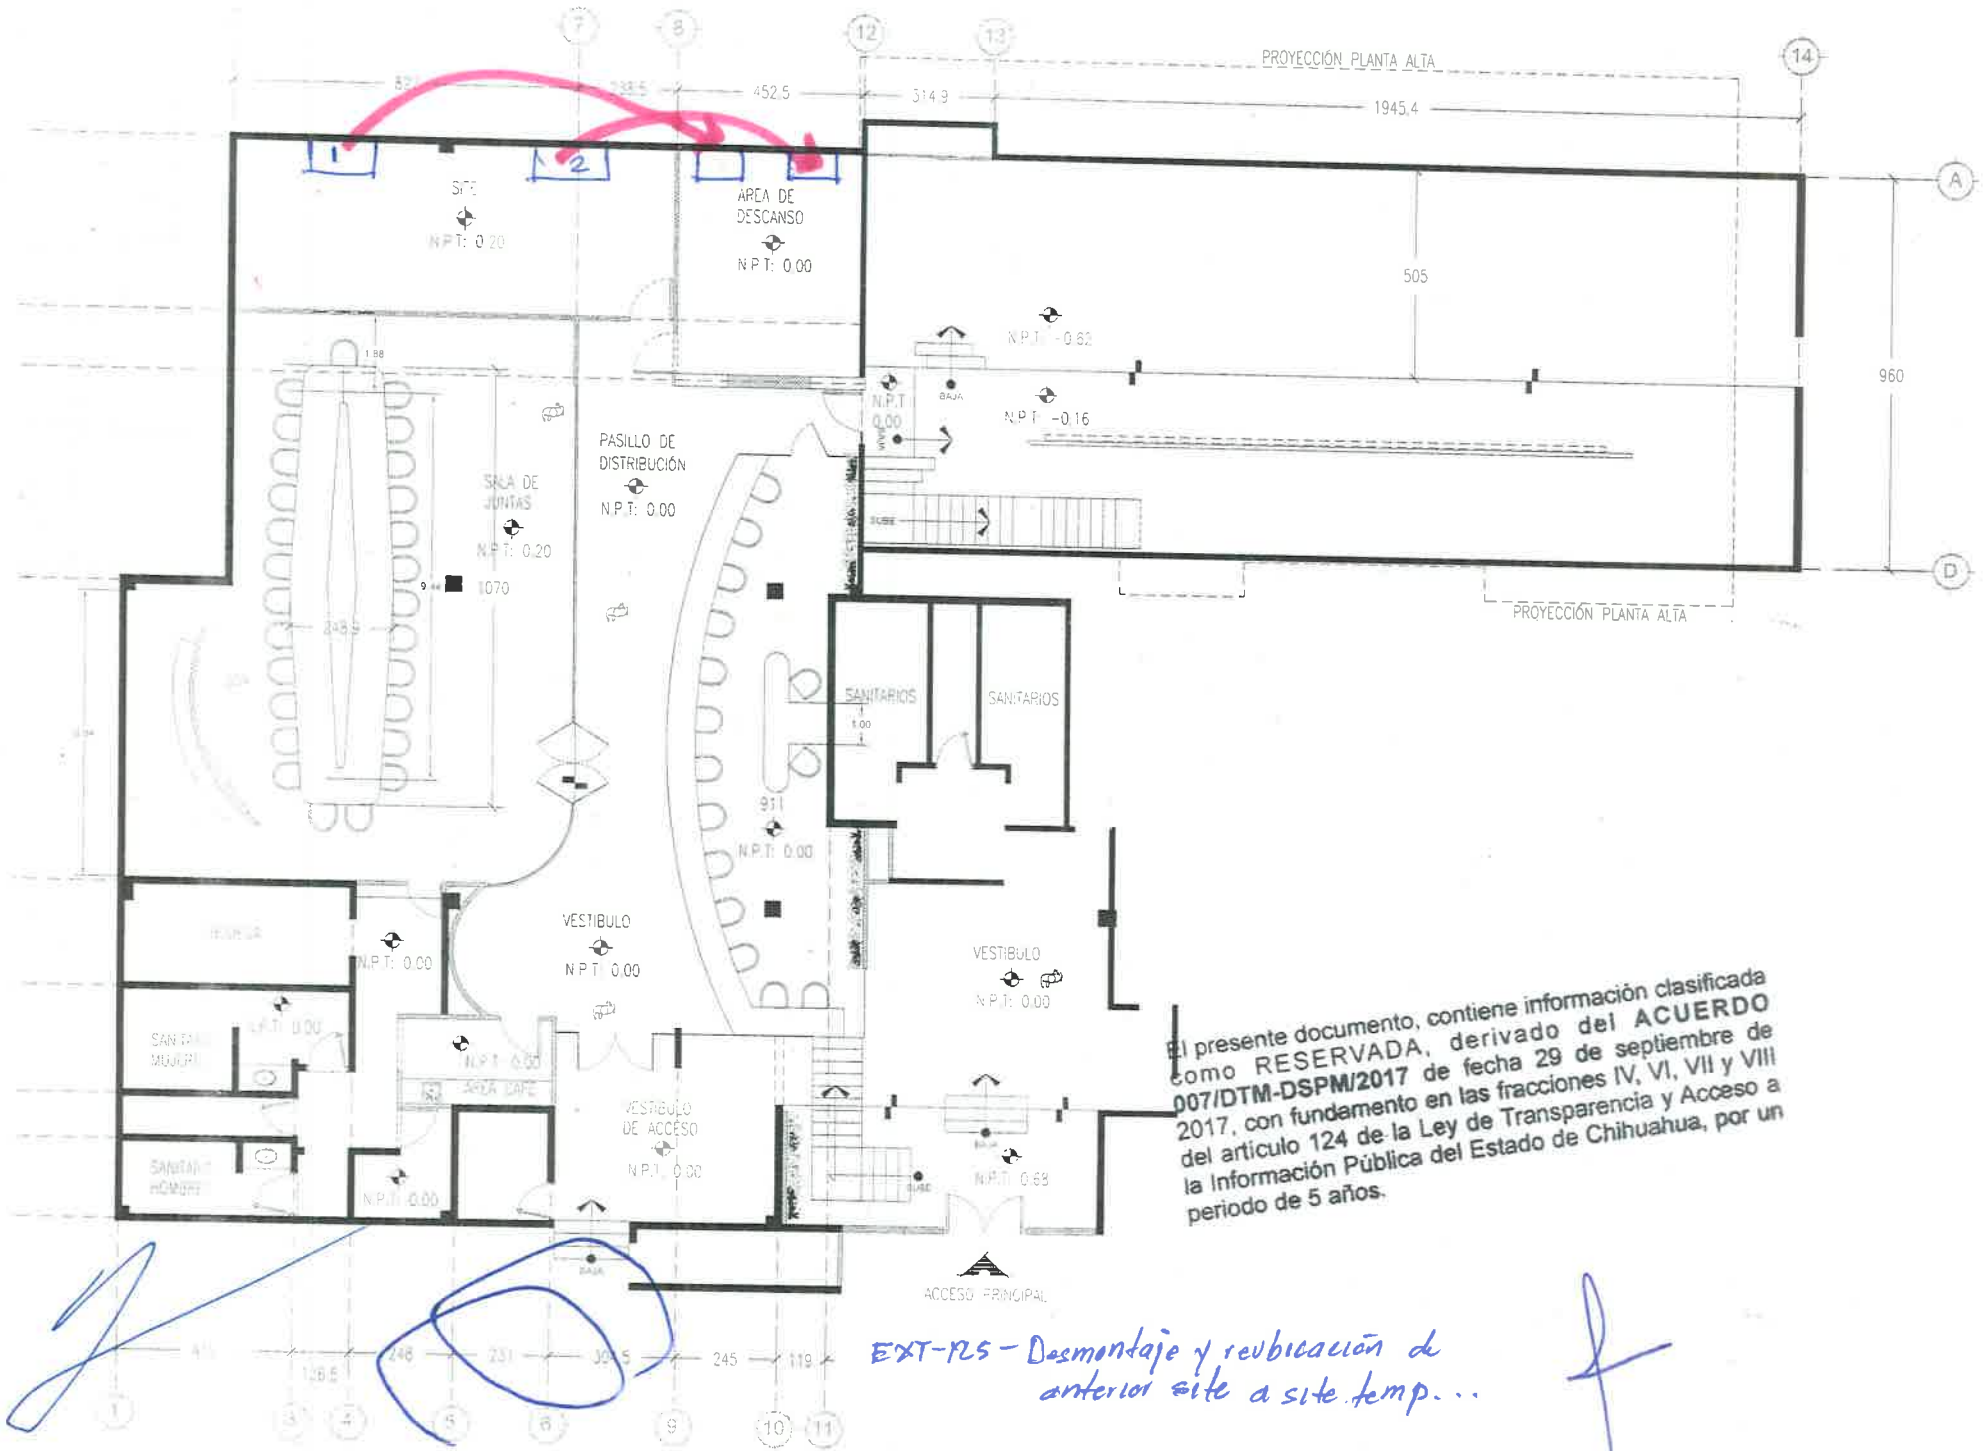

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-125 – Desmontaje y reubicación de anterior site a site temp...



EXT- 125

Desmontaje y reubicación de mini Split de anterior site a site temporal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-129						
Remate de pretil rellenando todas las celdas y perfil de cara superior. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		6.22	6.22			
		4.80	4.80			
		4.80	4.80			
		4.69	4.69			
		4.69	4.69			
		6.22	6.22			
		TOTAL	**31.42**			**31.42**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

COMEDOR.

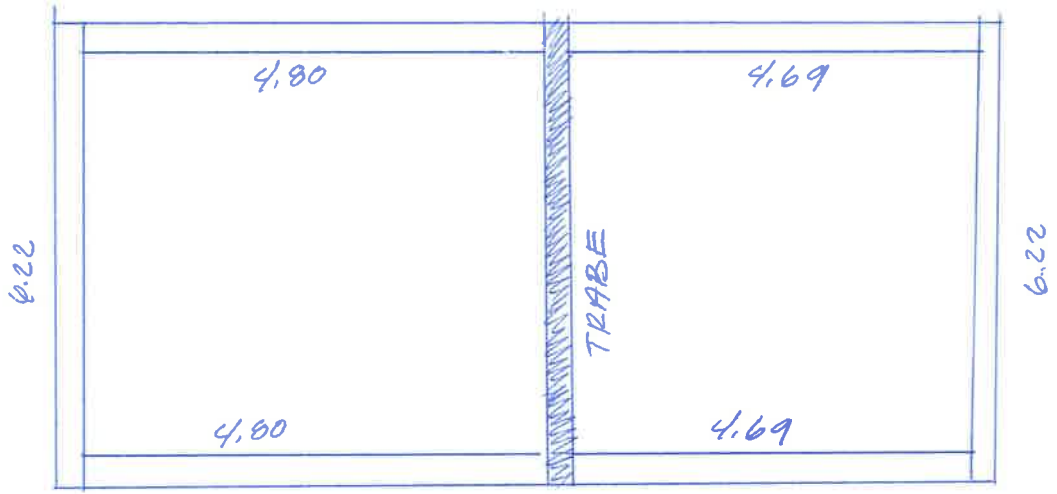

EST-129- Remate de pretil Rellenando todas las celdas..

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 129 Remate de pretil rellenando todas las celdas y perfil de cara superior. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-131						
Suministro e instalación de cinta de protección antiderrapante al bajar peraltes en acceso a monitoreo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		1.38	1.38			
		1.34	1.34			
		2.02	2.02			
		TOTAL	**4.74**			
						4.74

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

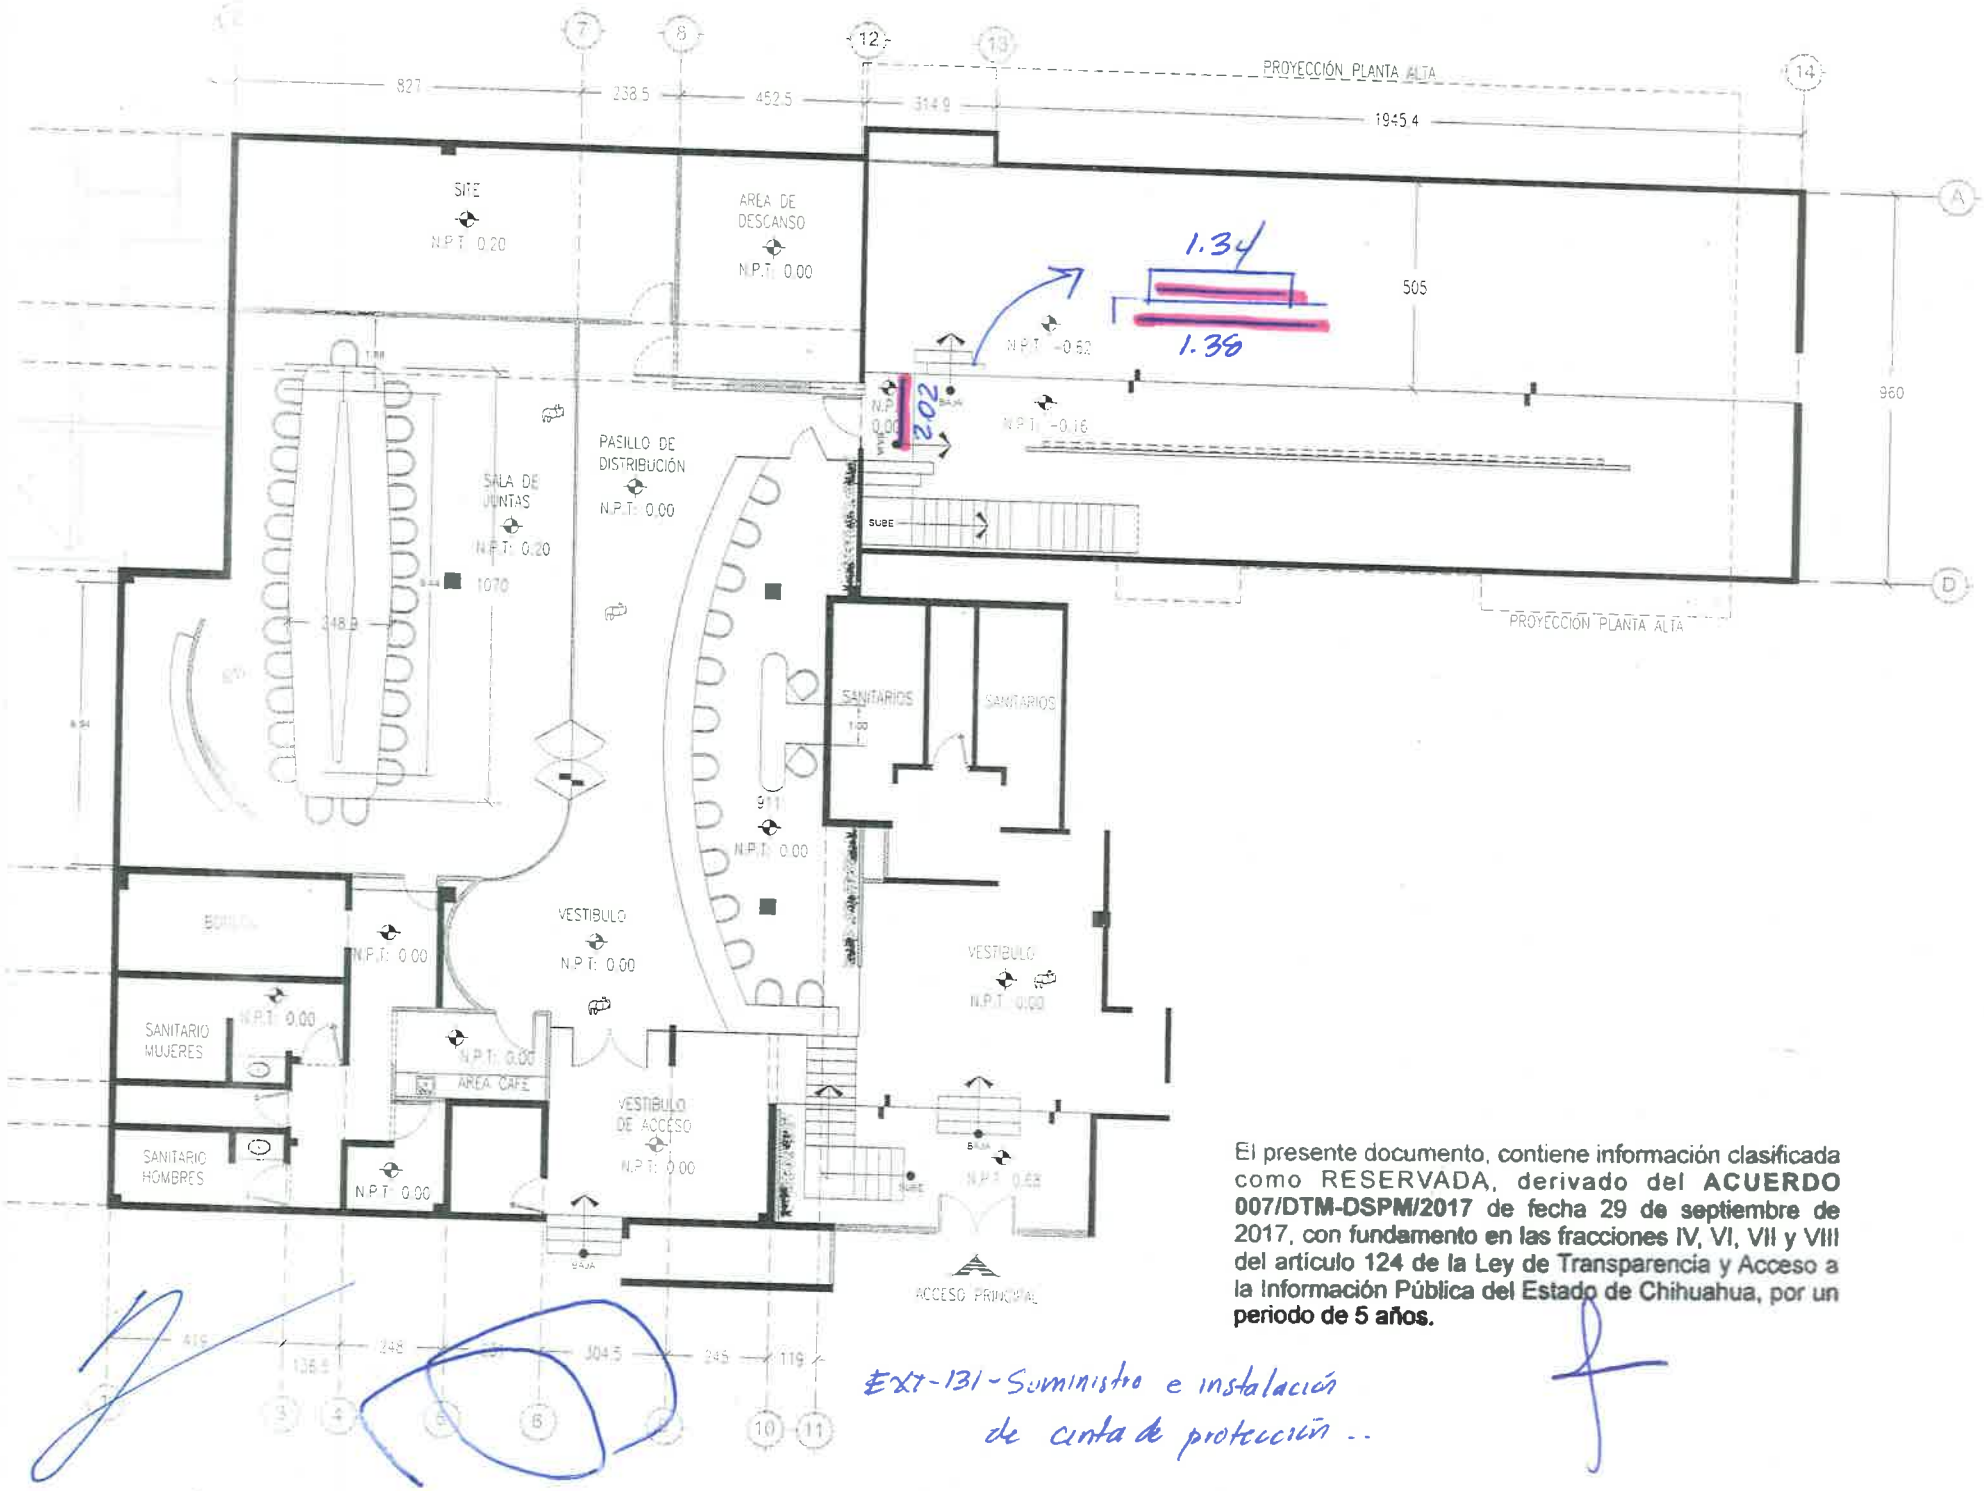

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un **periodo de 5 años.**

EXT-131 - Suministro e instalación de cinta de protección ..

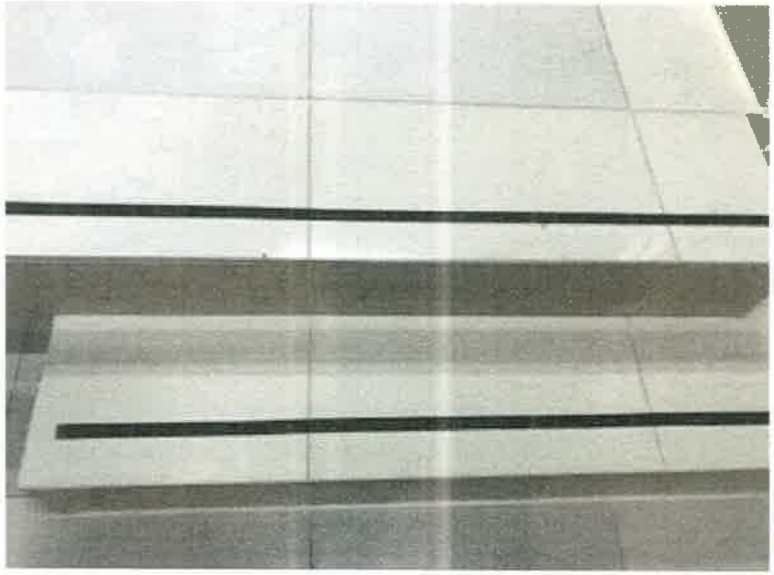

EXT- 131

Suministro e instalación de cinta de protección antiderrapante al bajar peraltes en acceso a monitoreo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-134					
		Pieza	**Total**		
Fabricación e instalación de mesa en sala de juntas de 10.70 m. x (1.30-2.48-1.30), fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta se pintara con poliuretano según lo indique el cliente y después se aplicara resina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte exterior se enchapara con laminado plástico color aluminio, se hará la preparación y se instalaran canaletas de aluminio para instalación de luz led, (no incluye sistema de iluminación ni instalación del mismo, tampoco incluye instalaciones eléctricas y de equipo de cómputo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	1.00		**1.00**
		TOTAL	**1.00**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

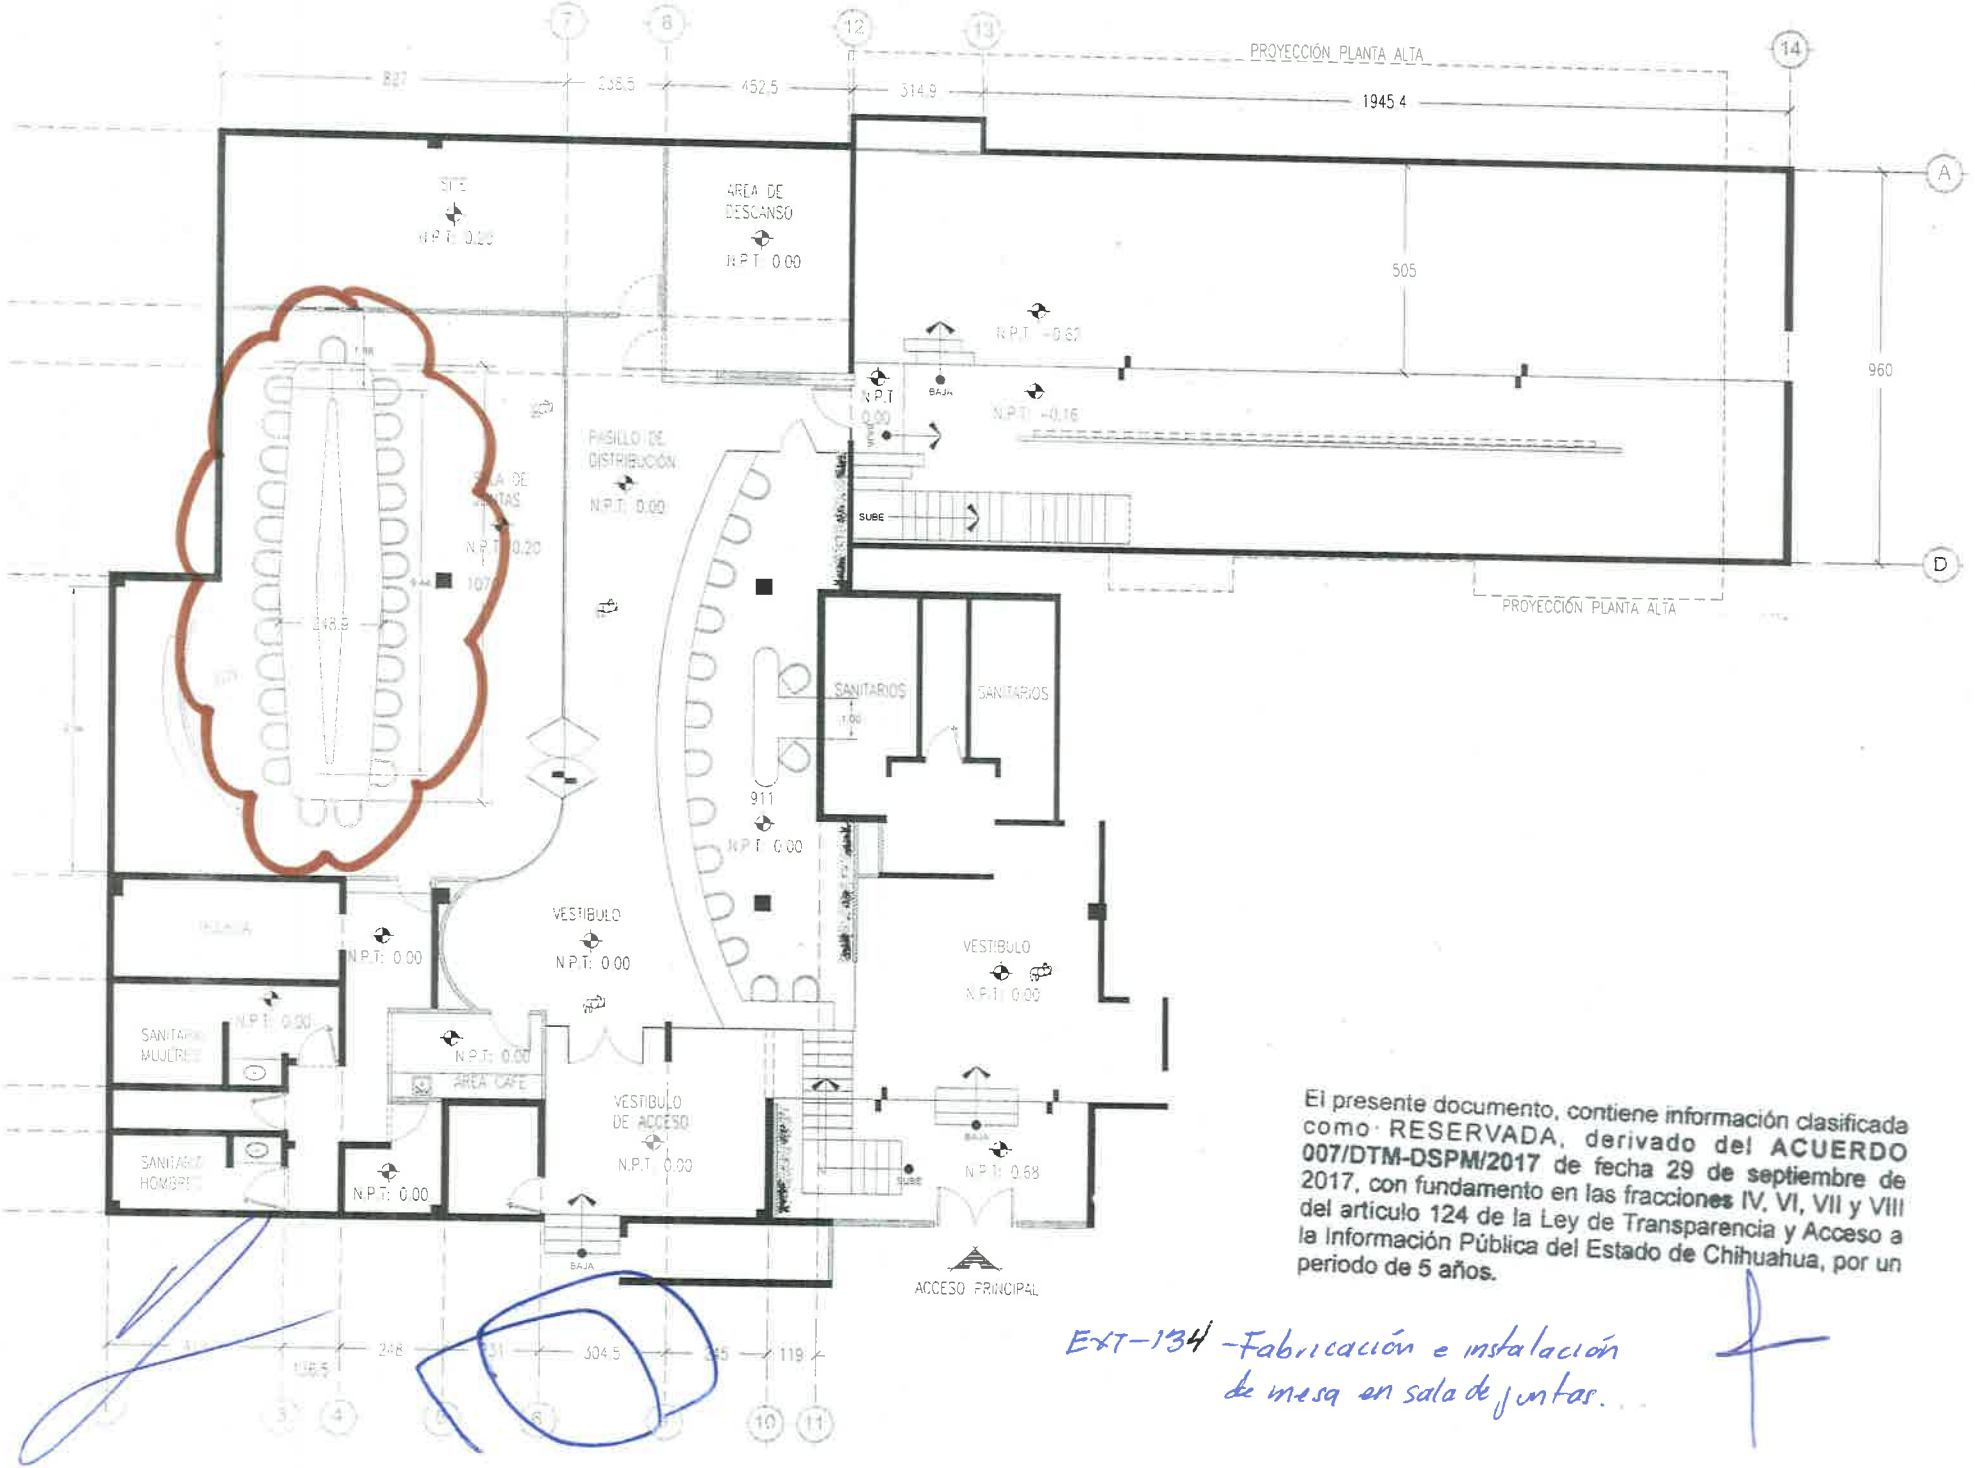

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-134 -Fabricación e instalación de mesa en sala de juntas.

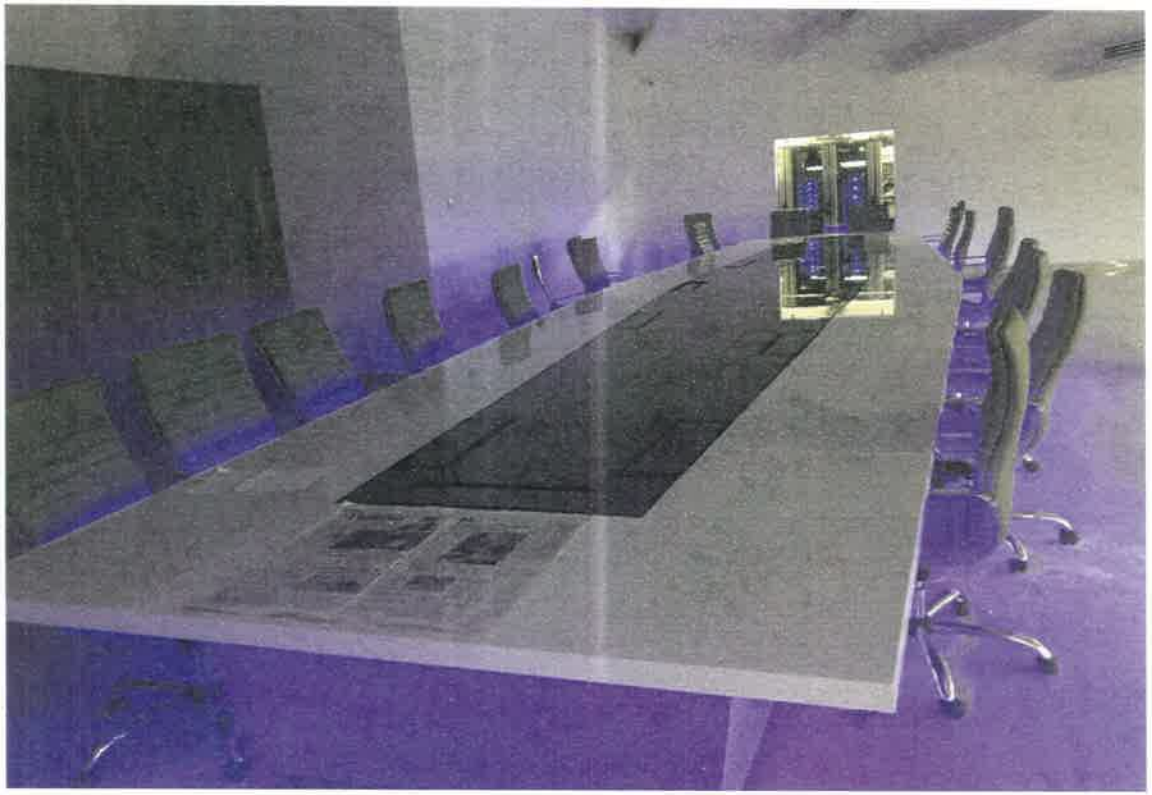

EXT- 134

Fabricación e instalación de mesa en sala de juntas de 10.70 m. x (1.30-2.48-1.30), fabricada con estructura de madera de pino y forrada con MDF de 1/2" de espesor, la cubierta se pintara con poliuretano según lo indique el cliente y después se aplicara resina para darle mayor cuerpo a la cubierta, por la parte exterior se enchapara con laminado plástico color aluminio, se hará la preparación y se instalaran canaletas de aluminio para instalación de luz led, (no incluye sistema de iluminación ni instalación del mismo, tampoco incluye instalaciones eléctricas y de equipo de cómputo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-135					
Construcción de Cajillo en "L" área de pasillo principal de 0.10 cm de peralte por ancho variable de 0.10 a 0.80 m., a base de tablero de yeso de 1/2". Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
	4.53	4.53			
	1.86	1.86			
	13.46	13.46			
	4.85	4.85			
	1.24	1.24			
	4.85	4.85			
	1.86	1.86			
	TOTAL	**32.65**			**32.65**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

PLAFÓN RETICULAR EN PASILLO

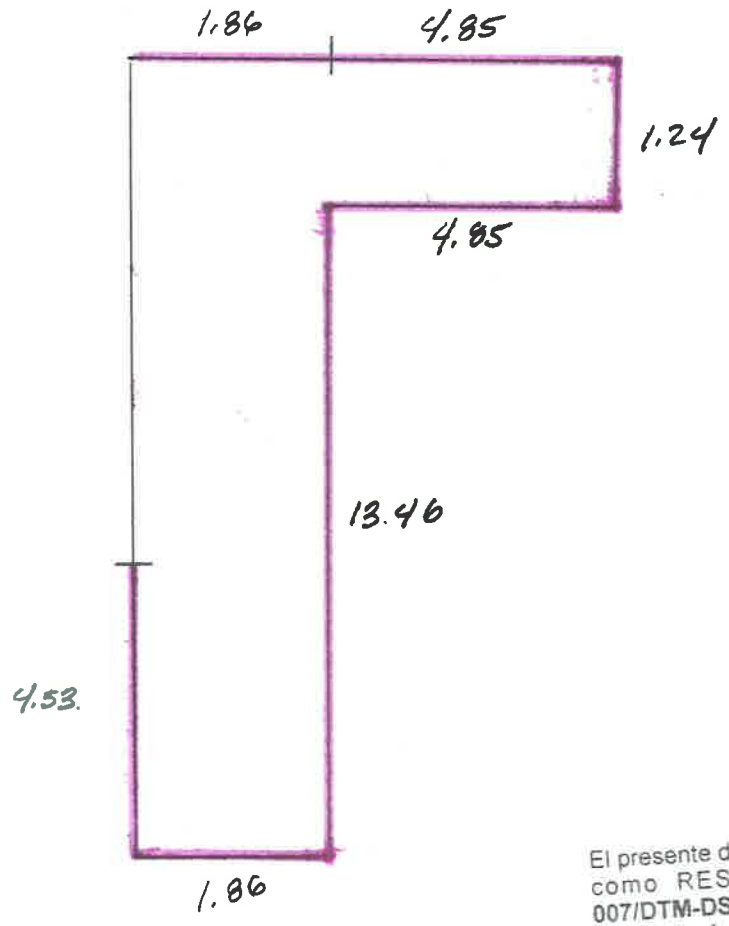

EXT-135- Cajillo "L" área de pasillo principal.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 135 Construcción de Cajillo en "L" área de pasillo principal de 0.10 cm de peralte por ancho variable de 0.10 a 0.80 m., a base de tablero de yeso de 1/2". Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-136					
Desmontaje de mini Split de instalado en área del site temporal (sala de descanso actual). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

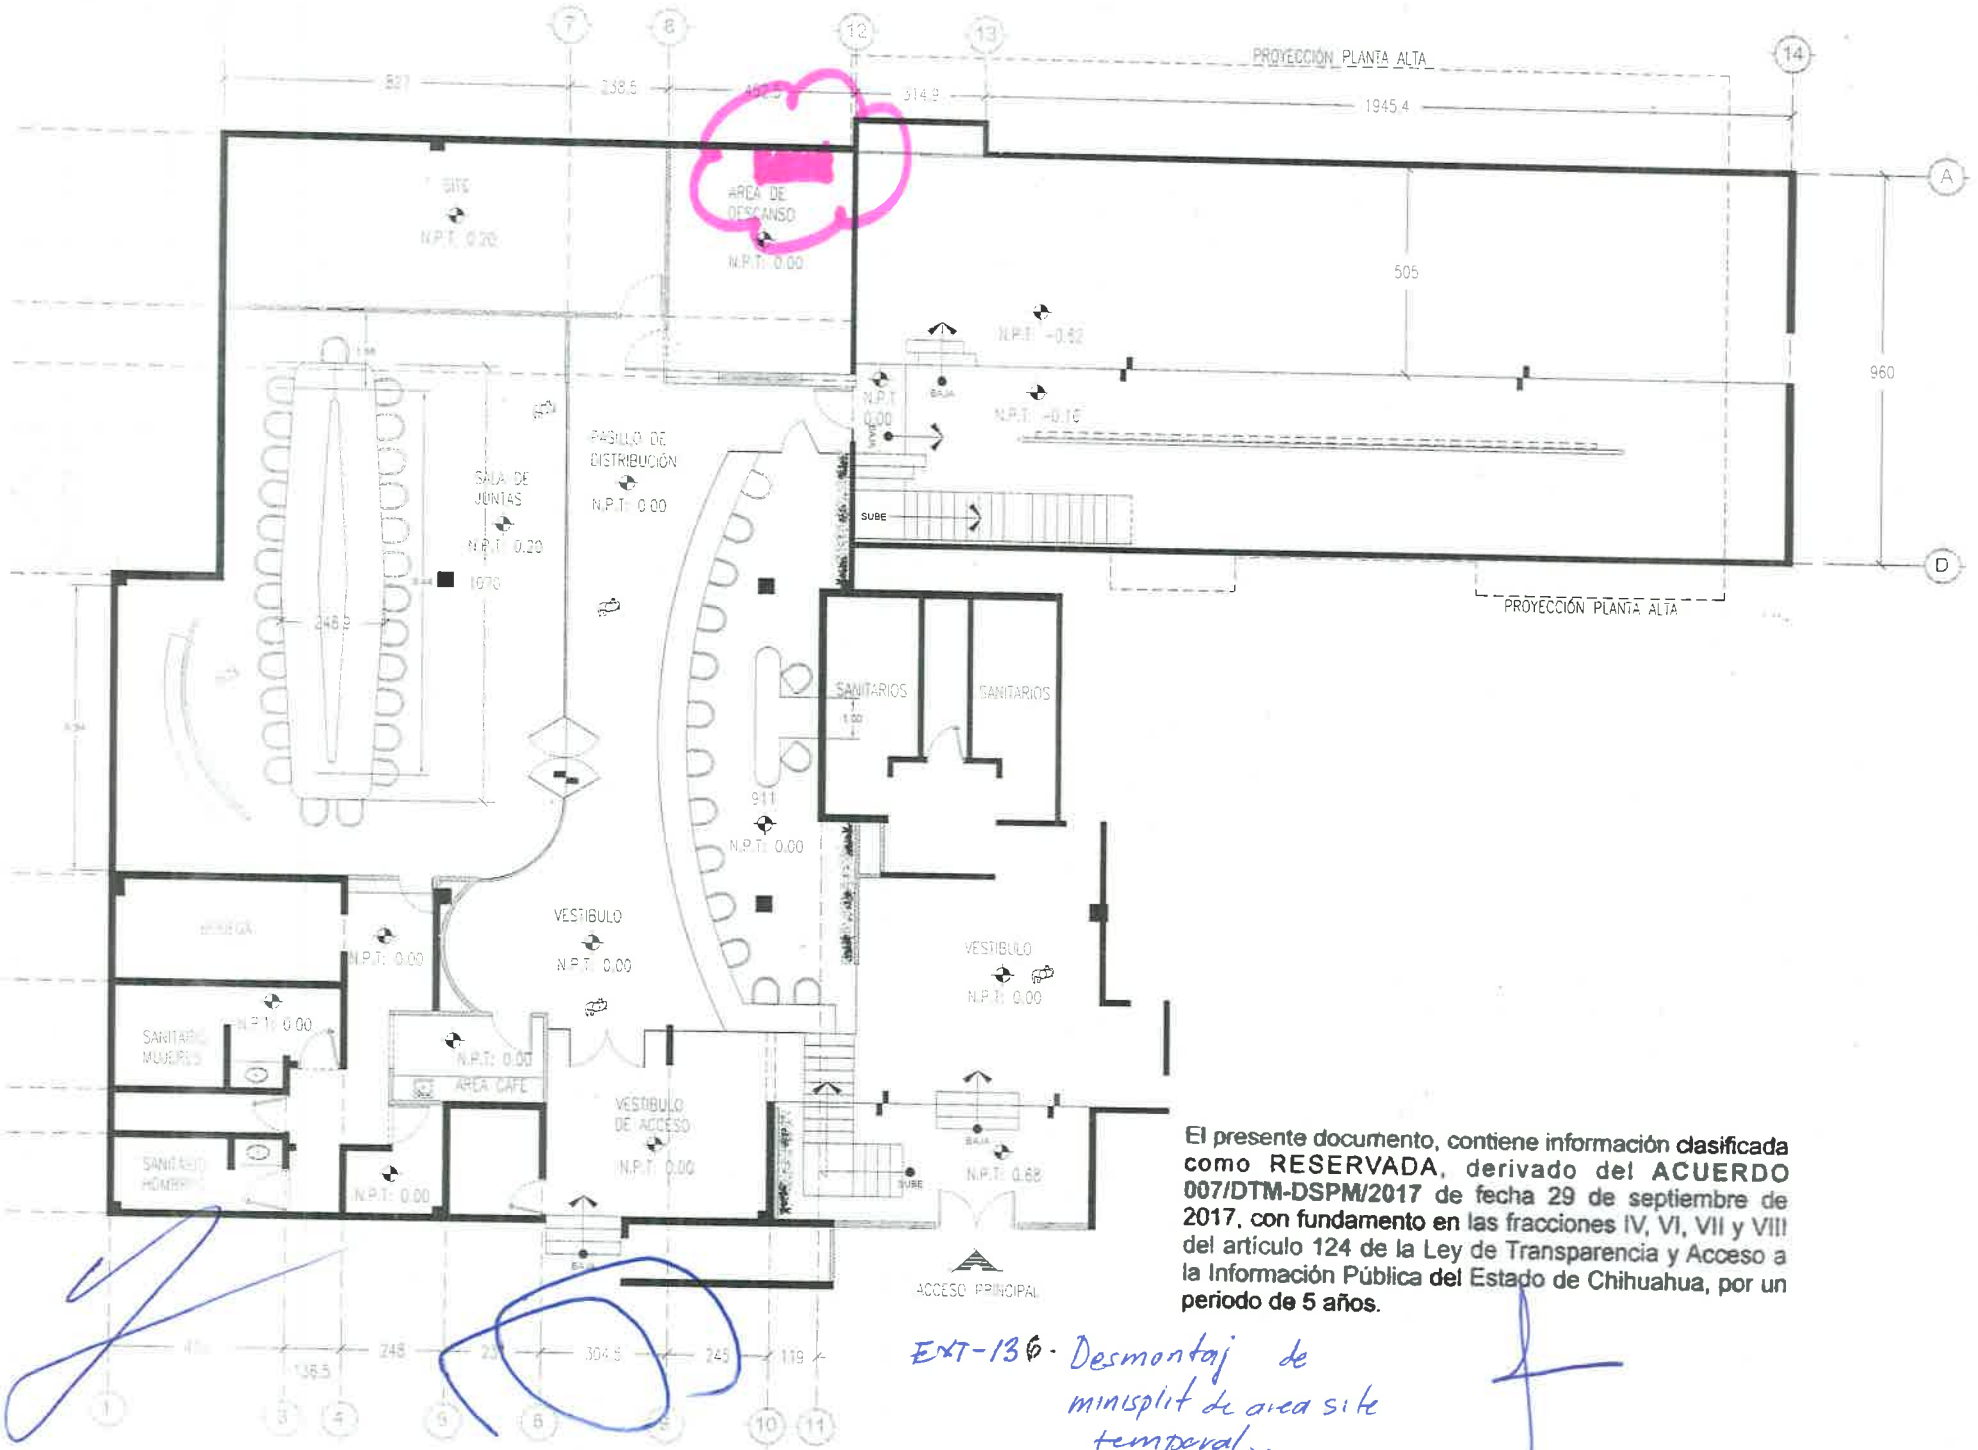

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-136. Desmontaj de minisplit de area site temporal..



EXT- 136 Desmontaje de mini Split de instalado en área del site temporal (sala de descanso actual). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-137					
Reubicación de salida sanitaria para mingitorios a base de tubo PVC de 2", incluye: demolición sobre muro existente, materiales, conexión a la red sanitaria, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

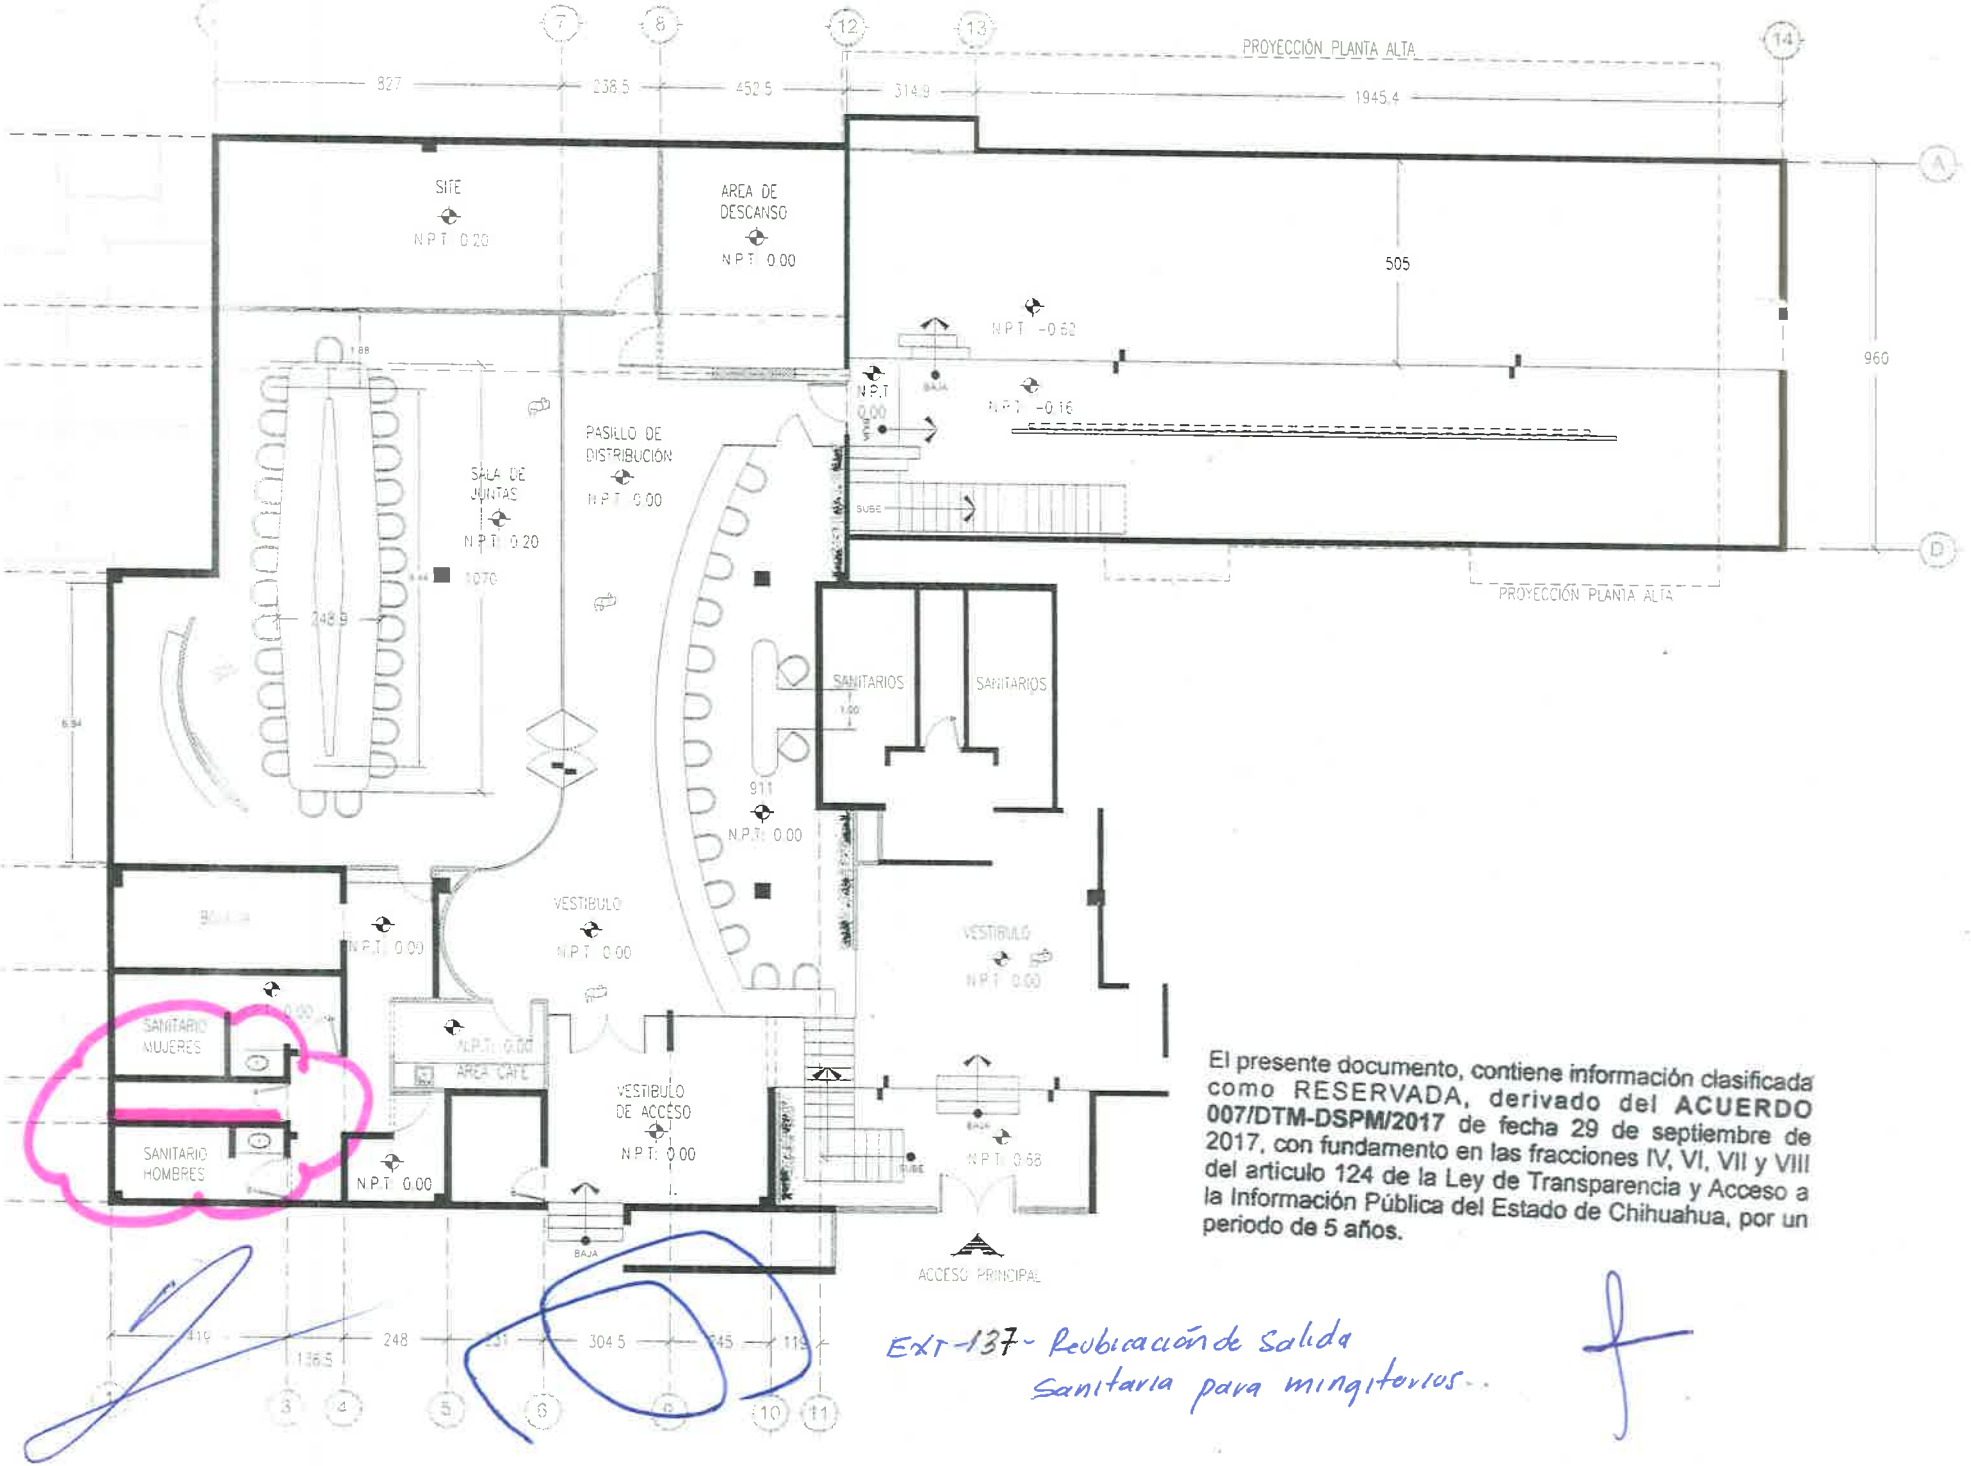

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ext-137 - Reubicación de Salida Sanitaria para mingitorios.



EXT- 137

Reubicación de salida sanitaria para mingitorios a base de tubo PVC de 2", incluye: demolición sobre muro existente, materiales, conexión a la red sanitaria, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-138					
Recubrimiento de escalera para bajar de vestíbulo con porcelanato Absolute beige de 60 cm x60 cm, consta de 3 huellas de 2.00 m x 0.30 m y 4 peraltes de 2.00m x0.17.Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

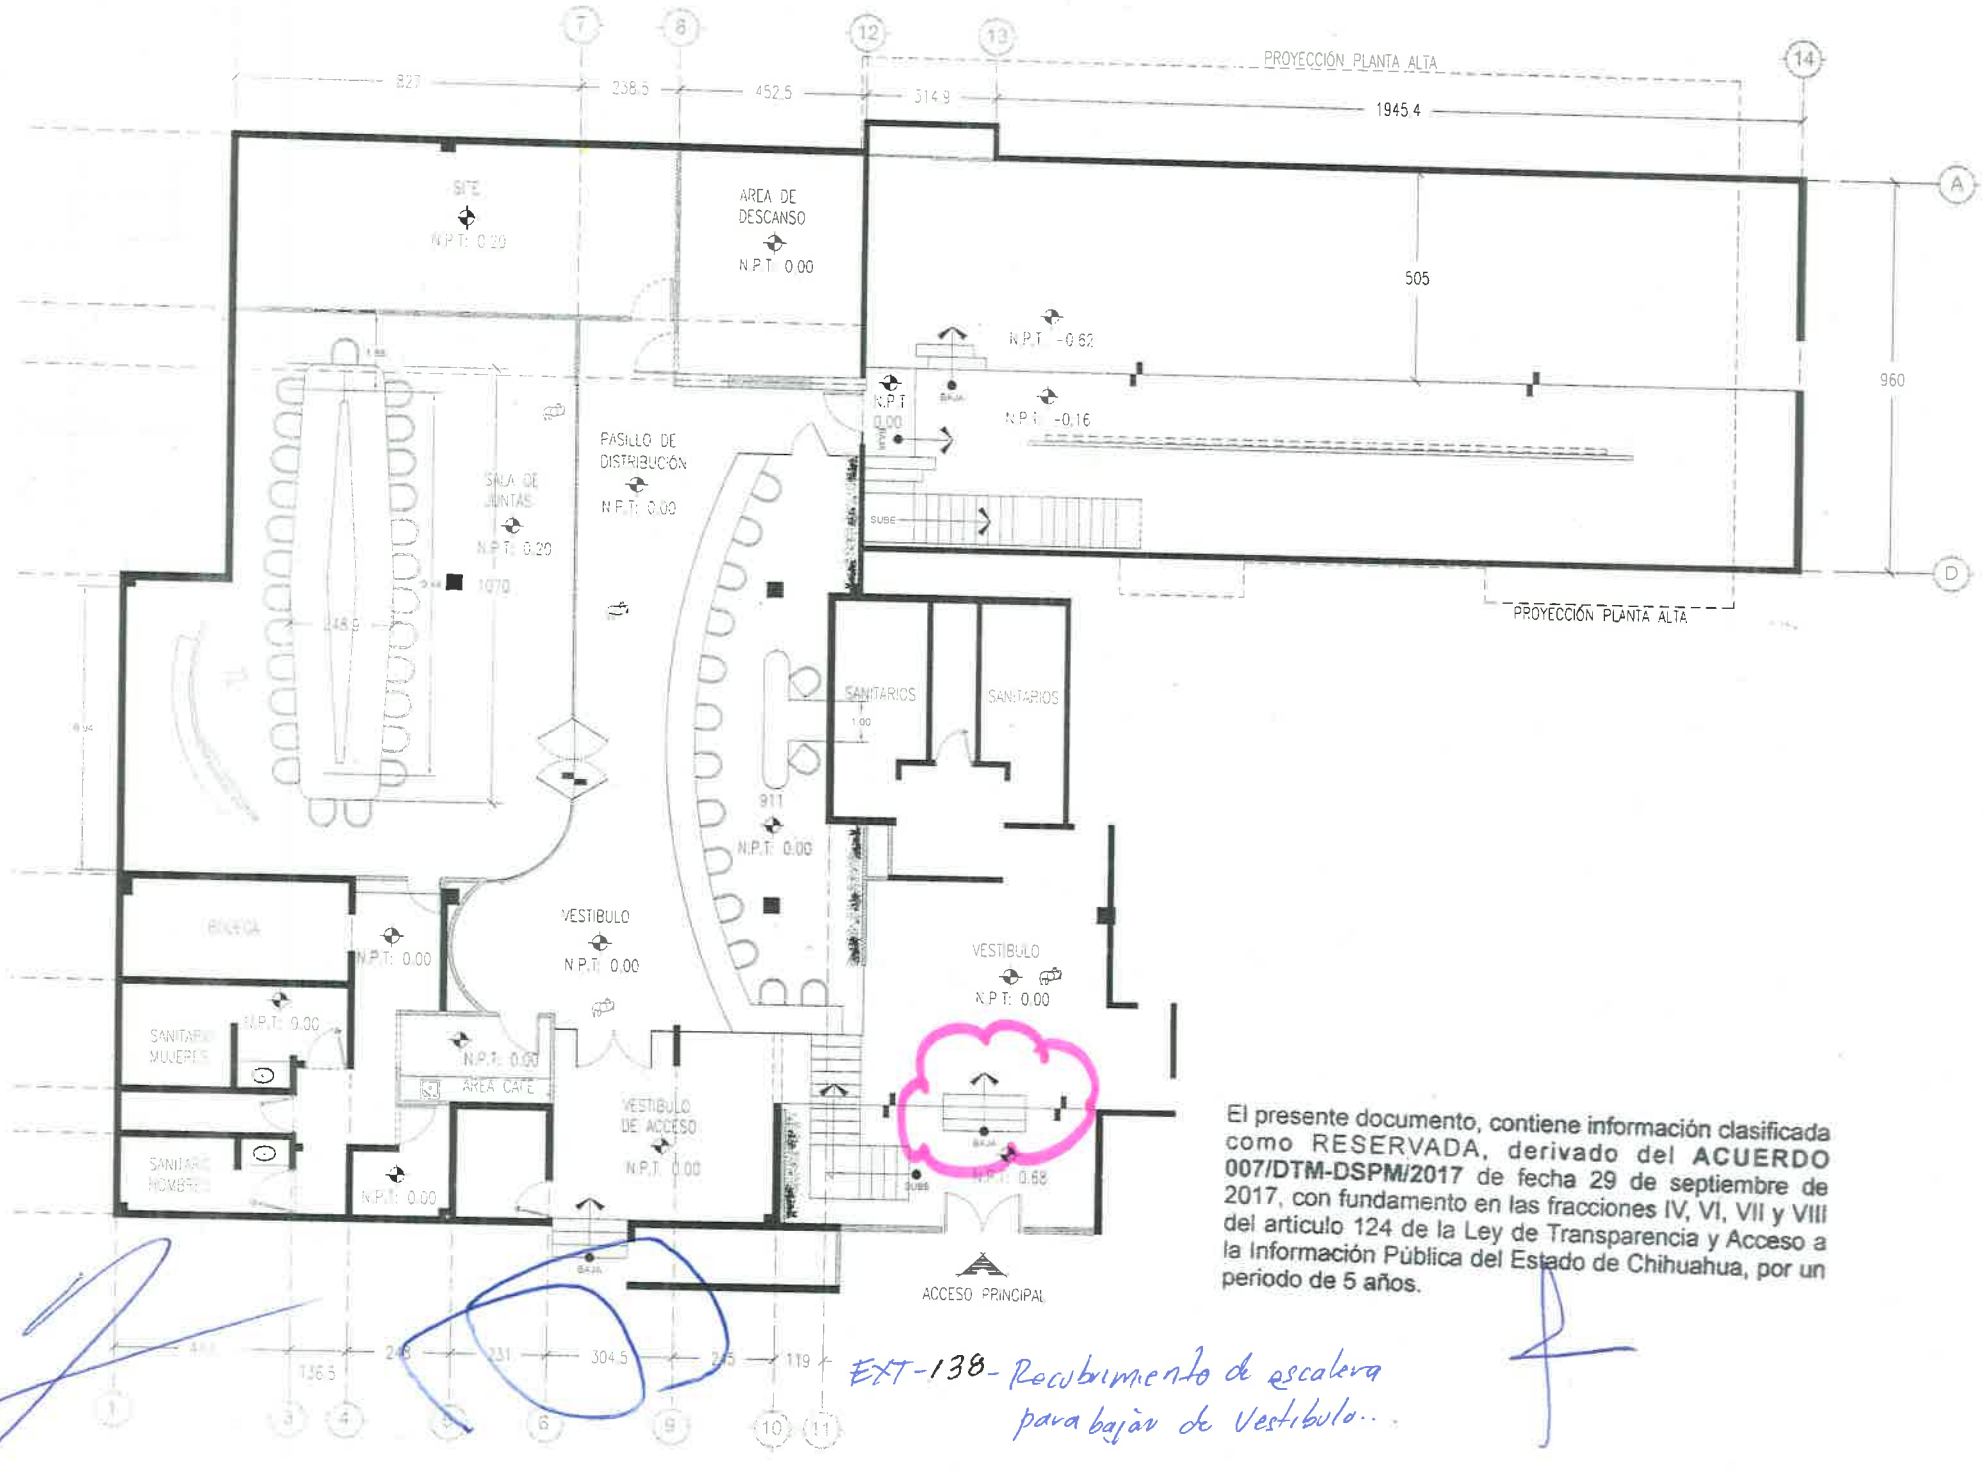

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-138- Recubrimiento de escalera para bajar de Vestibulo..



EXT- 138 Recubrimiento de escalera para bajar de vestíbulo con porcelanato Absolute beige de 60 cm x60 cm, consta de 3 huellas de 2.00 m x 0.30 m y 4 peraltes de 2.00m x0.17.Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.4.2					
		Pieza	**Total**		
Suministro y colocación de tarja , marca CyC mod.UB109, de acero inoxidable, acabado satinado . llave mezcladora para cocina marca Glacier Bay acabado cromo mod.HD67551-0301 , Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

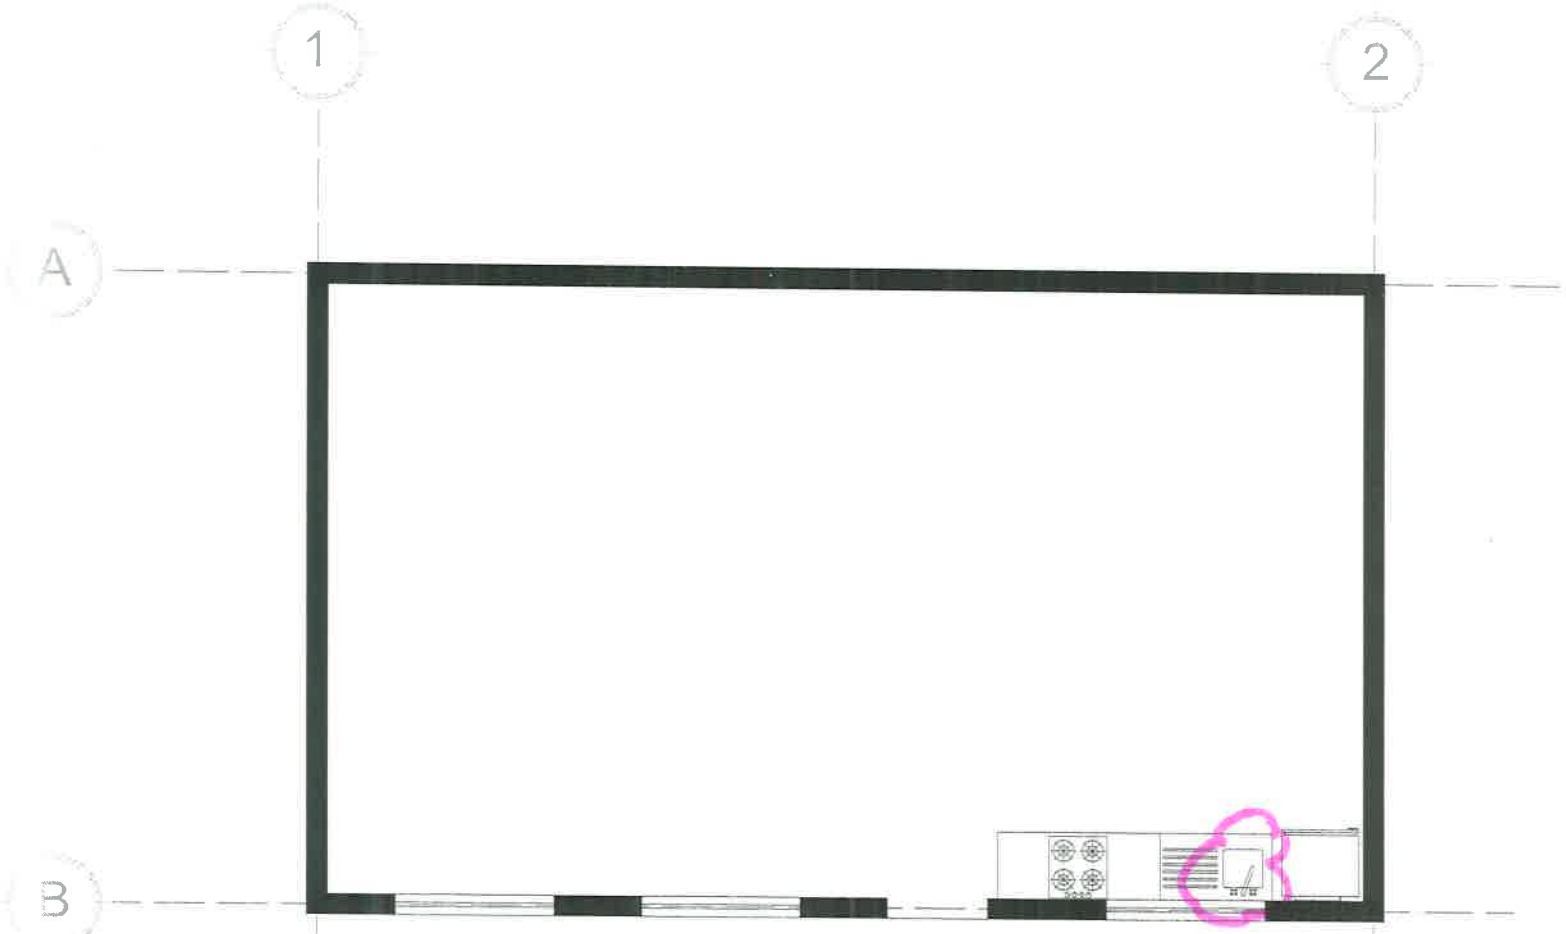

7.4.2 Suministro y colocación de tarja marca cyc...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



7.4.2. Suministro y colocación de tarja , marca CyC mod.UB109, de acero inoxidable, acabado satinado . llave mezcladora para cocina marca Glacier Bay acabado cromo mod.HD67551-0301 , Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.4.6					
		Pieza	**Total**		
Conexion de tanque de gas estacionario, incluye valvula de llenado, valvula de globo y valvula de seguridad.		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

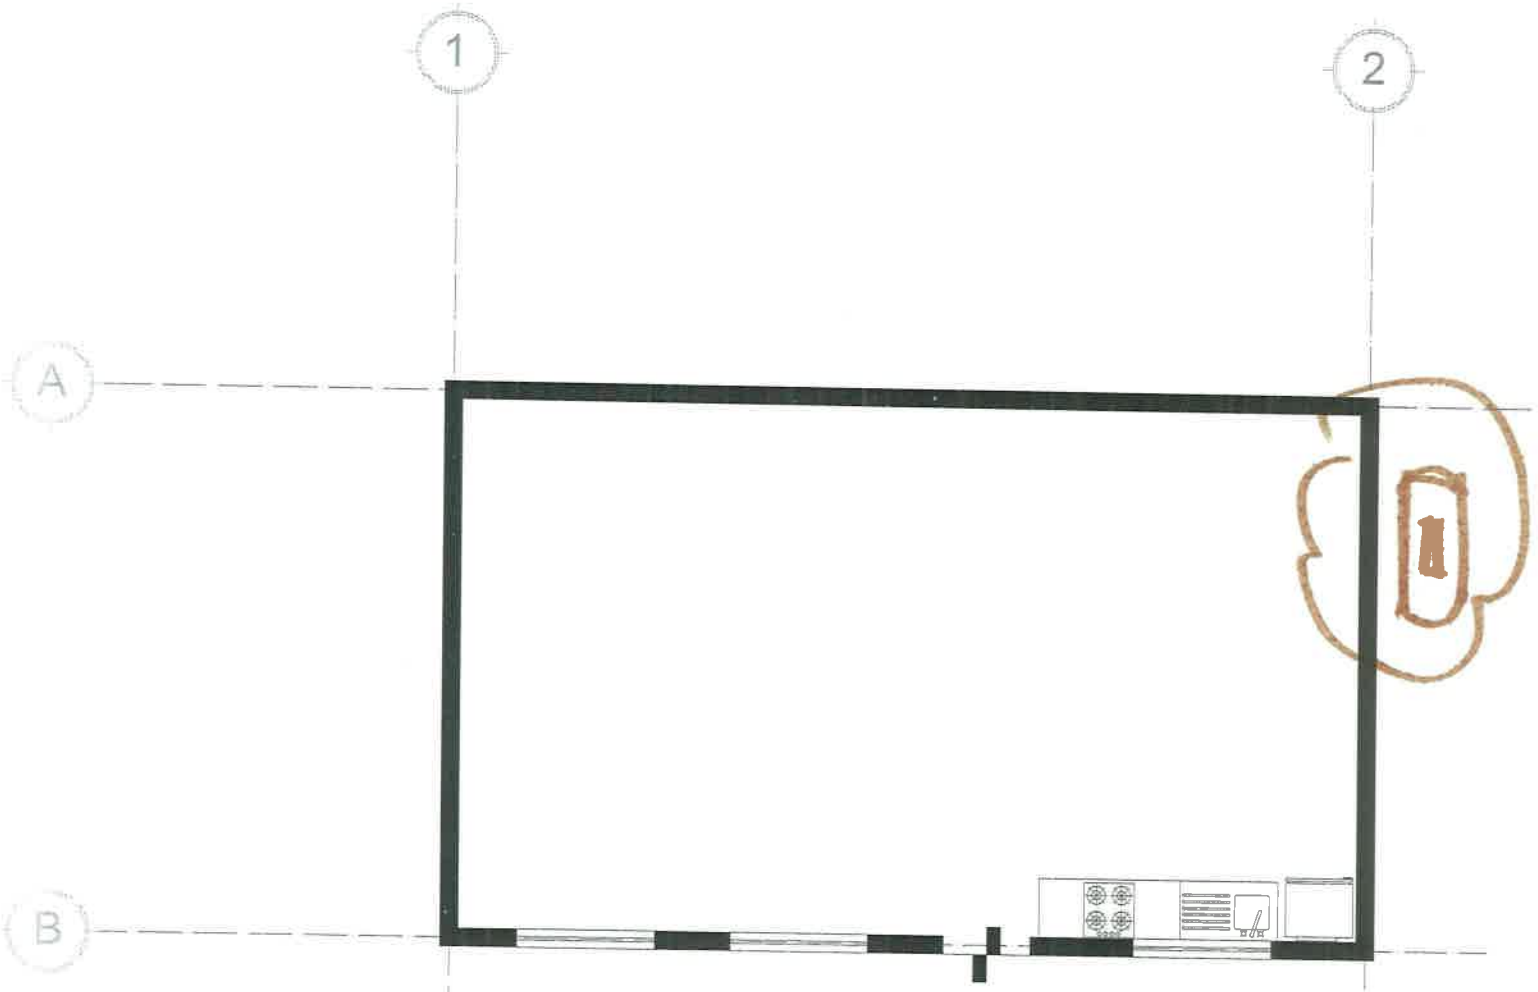

7.4.6. Conexión de tanque de gas estacionario...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



7.4.6. Conexion de tanque de gas estacionario, incluye valvula de llenado, valvula de globo y valvula de seguridad.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.9.2					
		Largo	**Total**		
Suministro y colocación de cubierta de granito en cocineta de comedor. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		3.08	3.08		
	TOTAL		**3.08**		**3.08**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

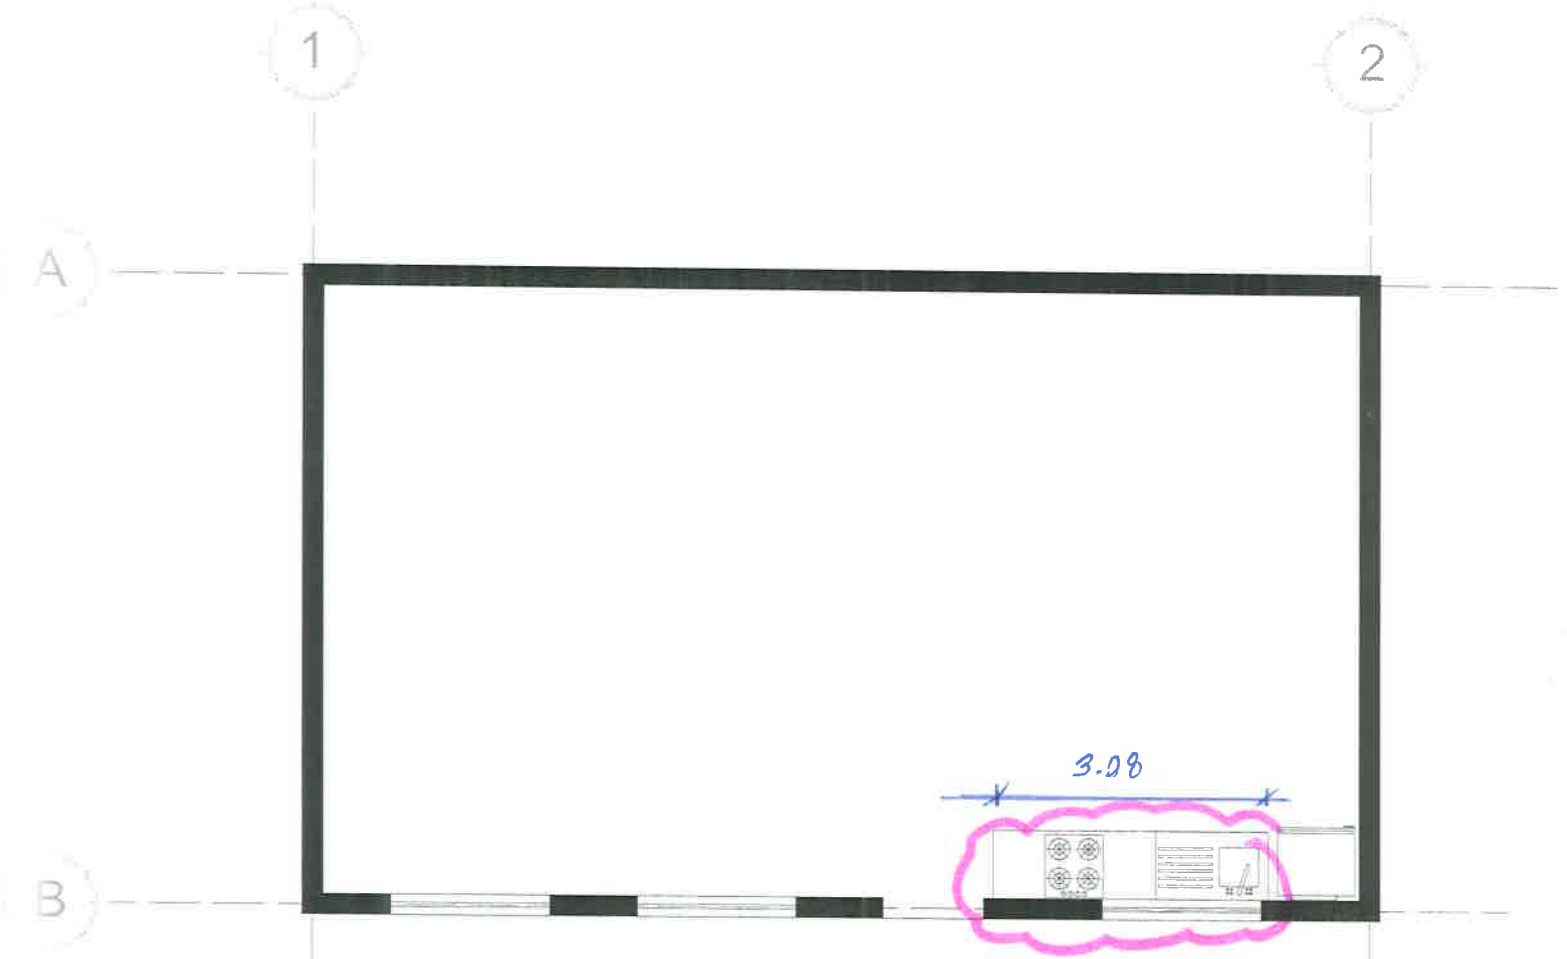

7.92 Suministro y colocación de cubierta de granito...

Jenias...





El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



7.9.2. Suministro y colocación de cubierta de granito en cocineta de comedor. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.12.1						
	Largo	**Alto**	**Total**			
Pintura vinílica en muros, color Grape Beginnings, código CW045W, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5.80	2.64	15.31			
	9.83	2.64	25.95			
	5.80	2.64	15.31			
	2.95	-2.64	-7.79	D.MURO TR.		
	0.96	-0.34	-0.33	D.MINI SPLIT		
	0.96	-0.34	-0.33	D.MINI SPLIT		
	9.83	2.64	25.95			
	1.50	-0.97	-1.46	D.VENTANA		
	1.50	-0.97	-1.46	D.VENTANA		
	1.50	-0.97	-1.46	D.VENTANA		
	0.97	2.07	2.01	D.PUERTA		
	MURO VERDE					
	3.10	2.74	8.49			
	MUROS EXTERIORES					
	0.20	1.24	0.25			
	6.02	3.57	21.49			
	10.19	3.65	37.19			
	6.02	3.62	21.79			
	0.20	1.24	0.25			
	1.50	-0.97	-1.46	D.VENTANA		
	1.50	-0.97	-1.46	D.VENTANA		
	1.50	-0.97	-1.46	D.VENTANA		
	0.97	-2.07	-2.01	D.PUERTA		
	0.15	3.57	0.54	CARA L CAJILLO		
	0.15	3.57	0.54	CARA L CAJILLO		

155.85

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.12.1						
	Largo	**Alto**	**Total**			
Pintura vinílica en muros, color Grape Beginnings, código CW045W, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0.15	3.68	0.55	CARA L CAJILLO		
	0.15	3.64	0.54	CARA L CAJILLO		
		BARDA				
	3.30	2.30	7.59			
	3.61	2.41	8.70			
		TOTAL H1	155.85			
		TOTAL H2	17.38			
		TOTAL	**173.23**			
						17.38


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

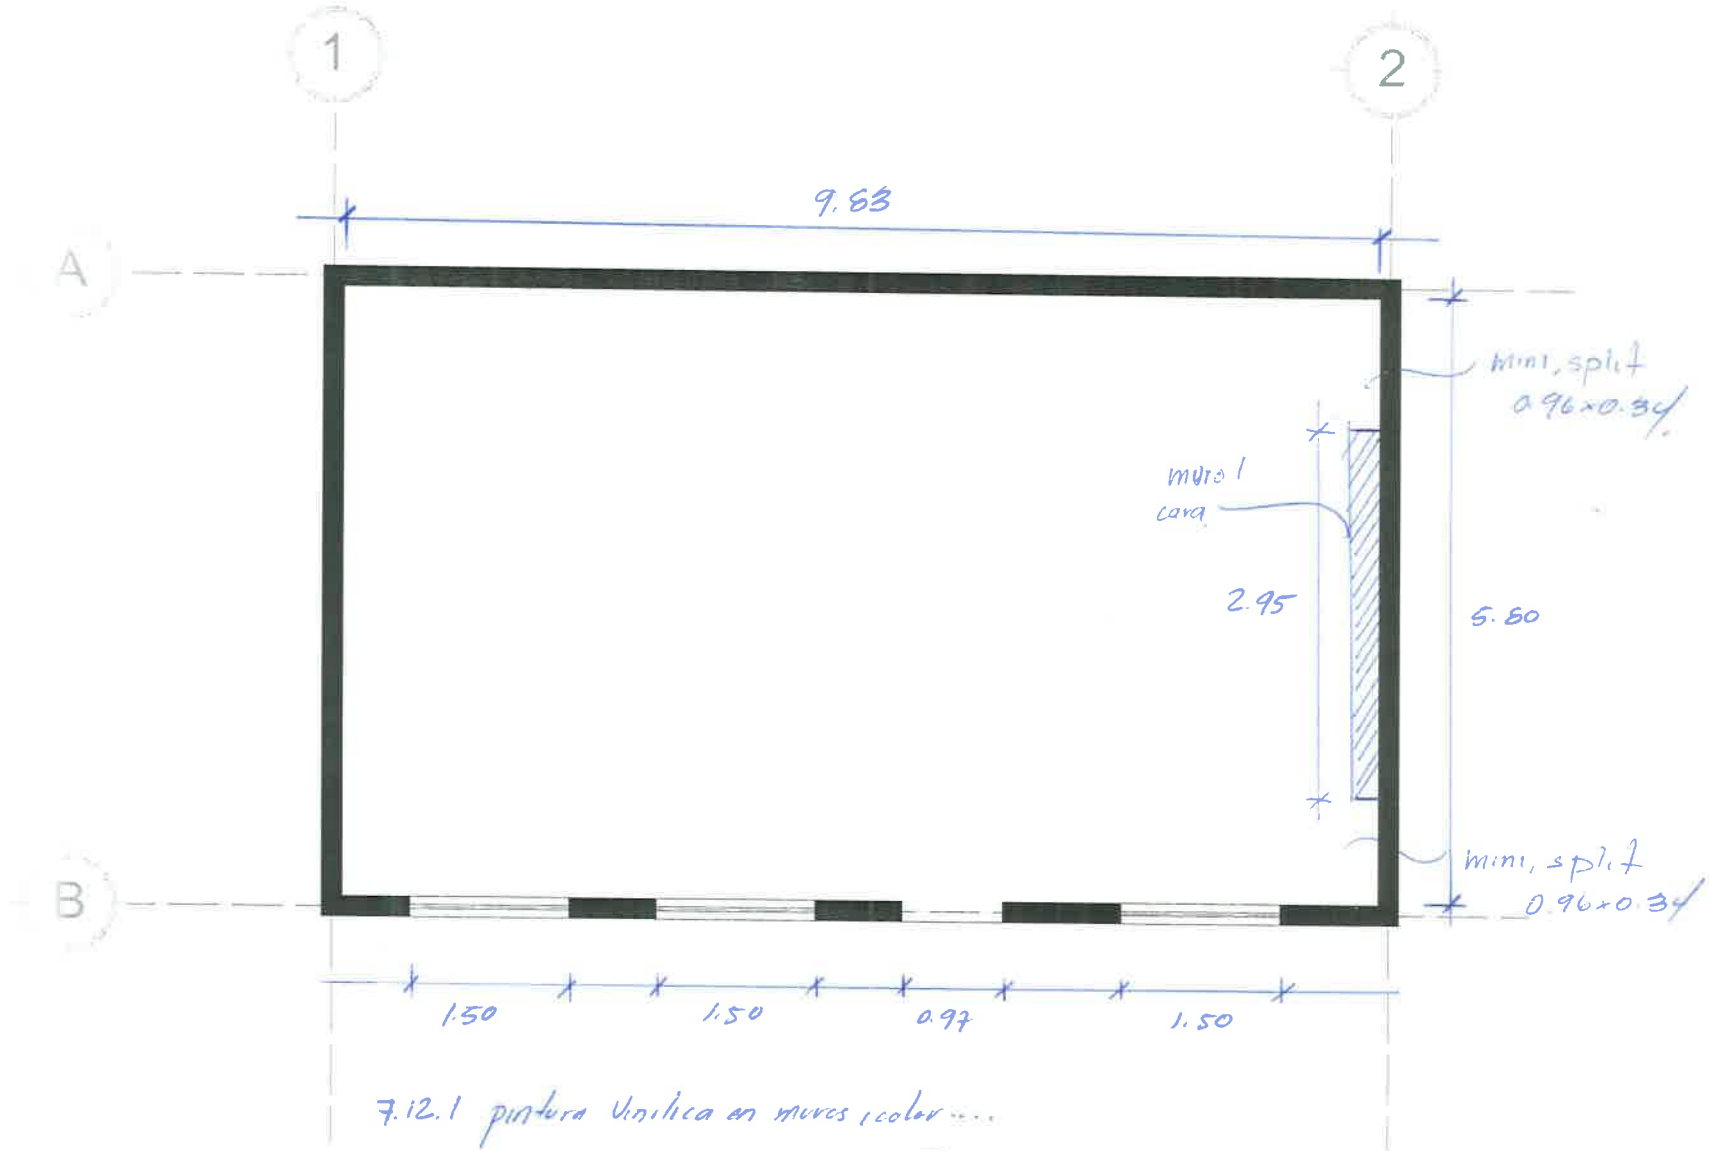

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

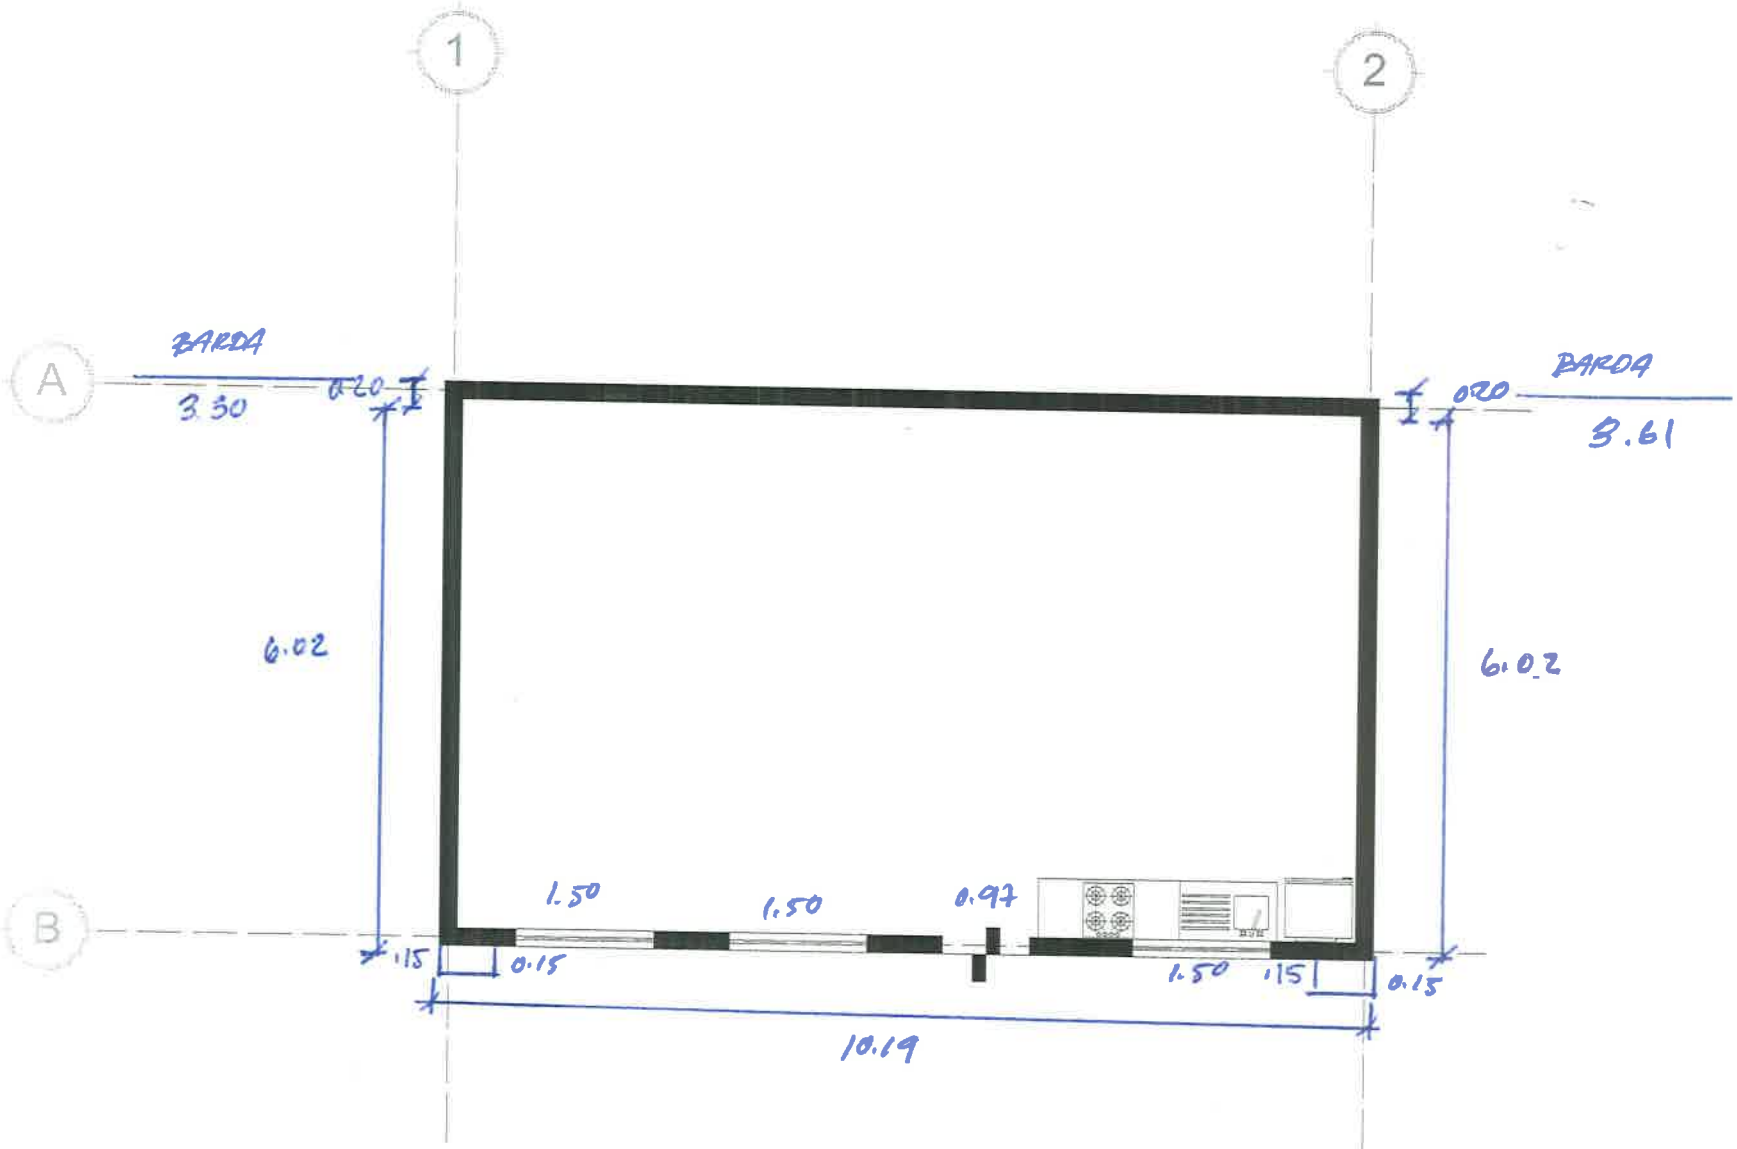

7.12.1 pintura vinilica en muros...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.





7.12.1. Pintura vinílica en muros, color Grape Beginnings, código CW045W, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.12.2						
	Largo	**Ancho**	**Total**			
Pintura vinílica en plafón, color Blanco de linea, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.01	4.98	44.87			
		TOTAL	**44.87**			**44.87**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

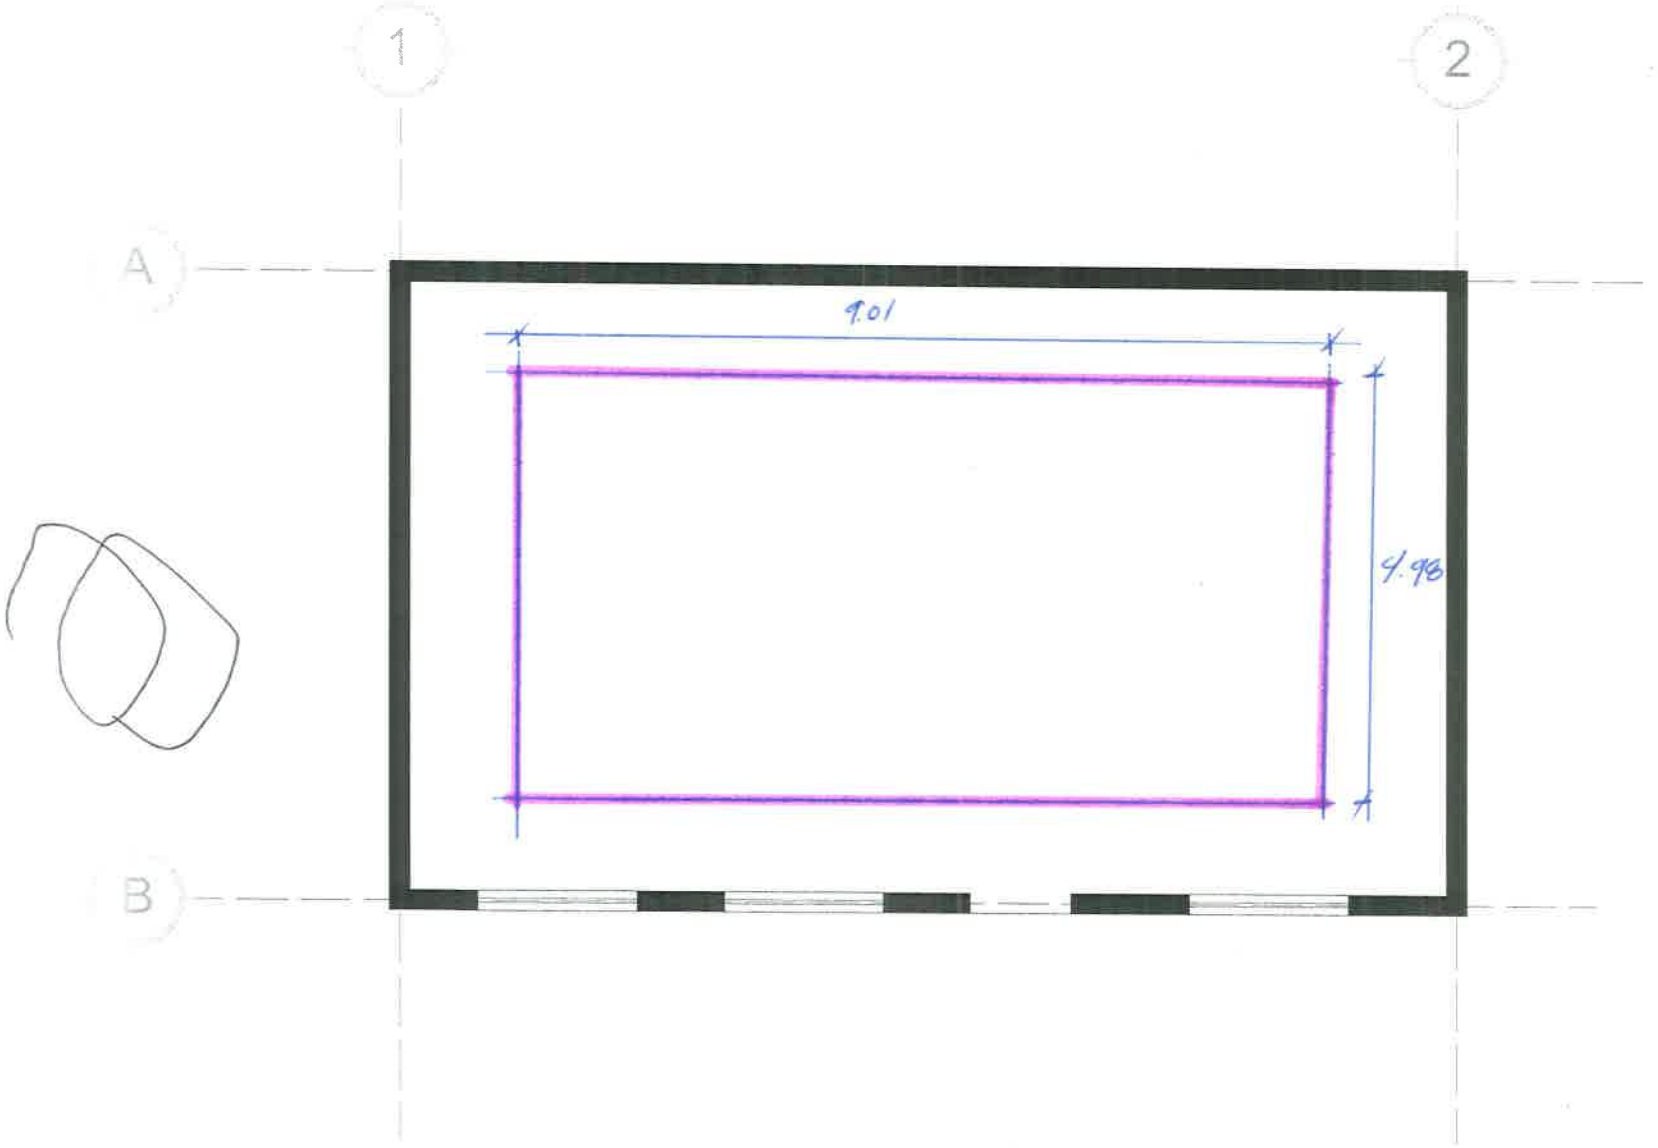

7.12.2 pintura Unilica en plafón...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



7.12.2. Pintura vinílica en plafón, color Blanco de linea, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.12.3					
	Largo	**Ancho**	**Total**		
Pintura vinílica en cajillo, color Grape Beginnings, código CW045W, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.83	0.41	4.03		
	9.83	0.41	4.03		
	4.98	0.41	2.04		
	4.98	0.41	2.04		
	9.01	0.10	0.90		
	9.01	0.10	0.90		
	4.98	0.10	0.50		
	4.98	0.10	0.50		
		TOTAL	**14.94**		**14.94**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

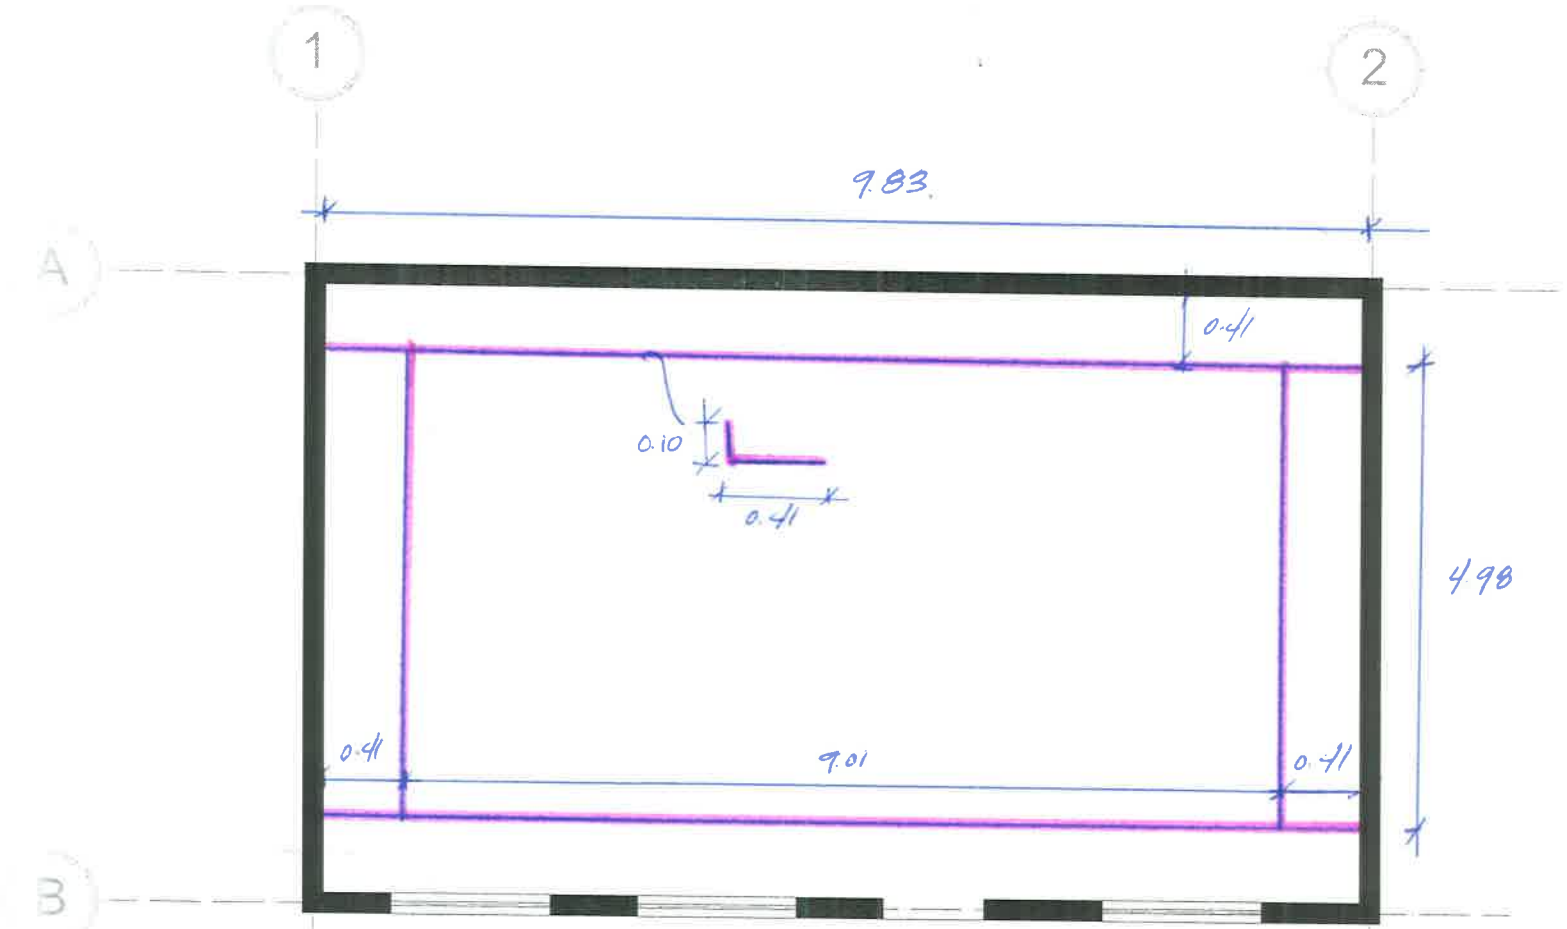

7.12.3 pintura Vinilica en cajillo...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y [illegible] del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

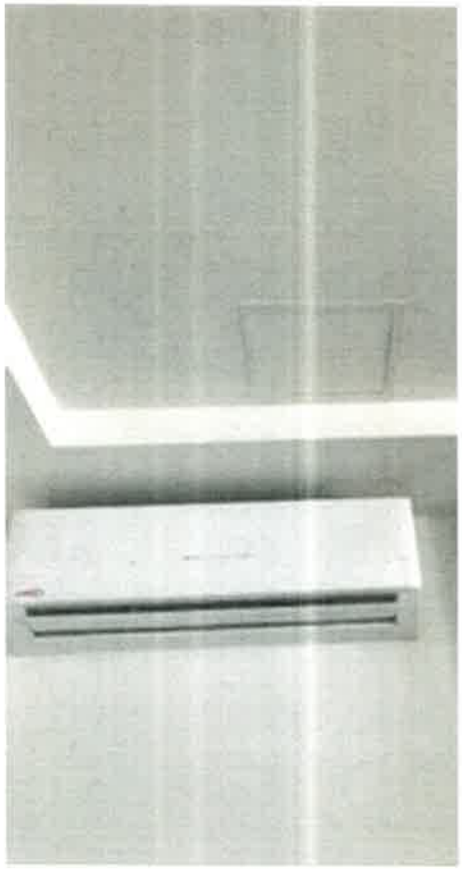

7.12.3. Pintura vinílica en cajillo, color Grape Beginnings, código CW045W, marca Berelinte o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
7.13.1						
	Largo	**Alto**	**Total**			
Suministro y colocación de follaje artificial para muro verde, en muro , Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.95	2.74	8.08			
	0.10	2.74	0.27			
	0.10	2.74	0.27			
		TOTAL	**8.62**			
						8.62

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

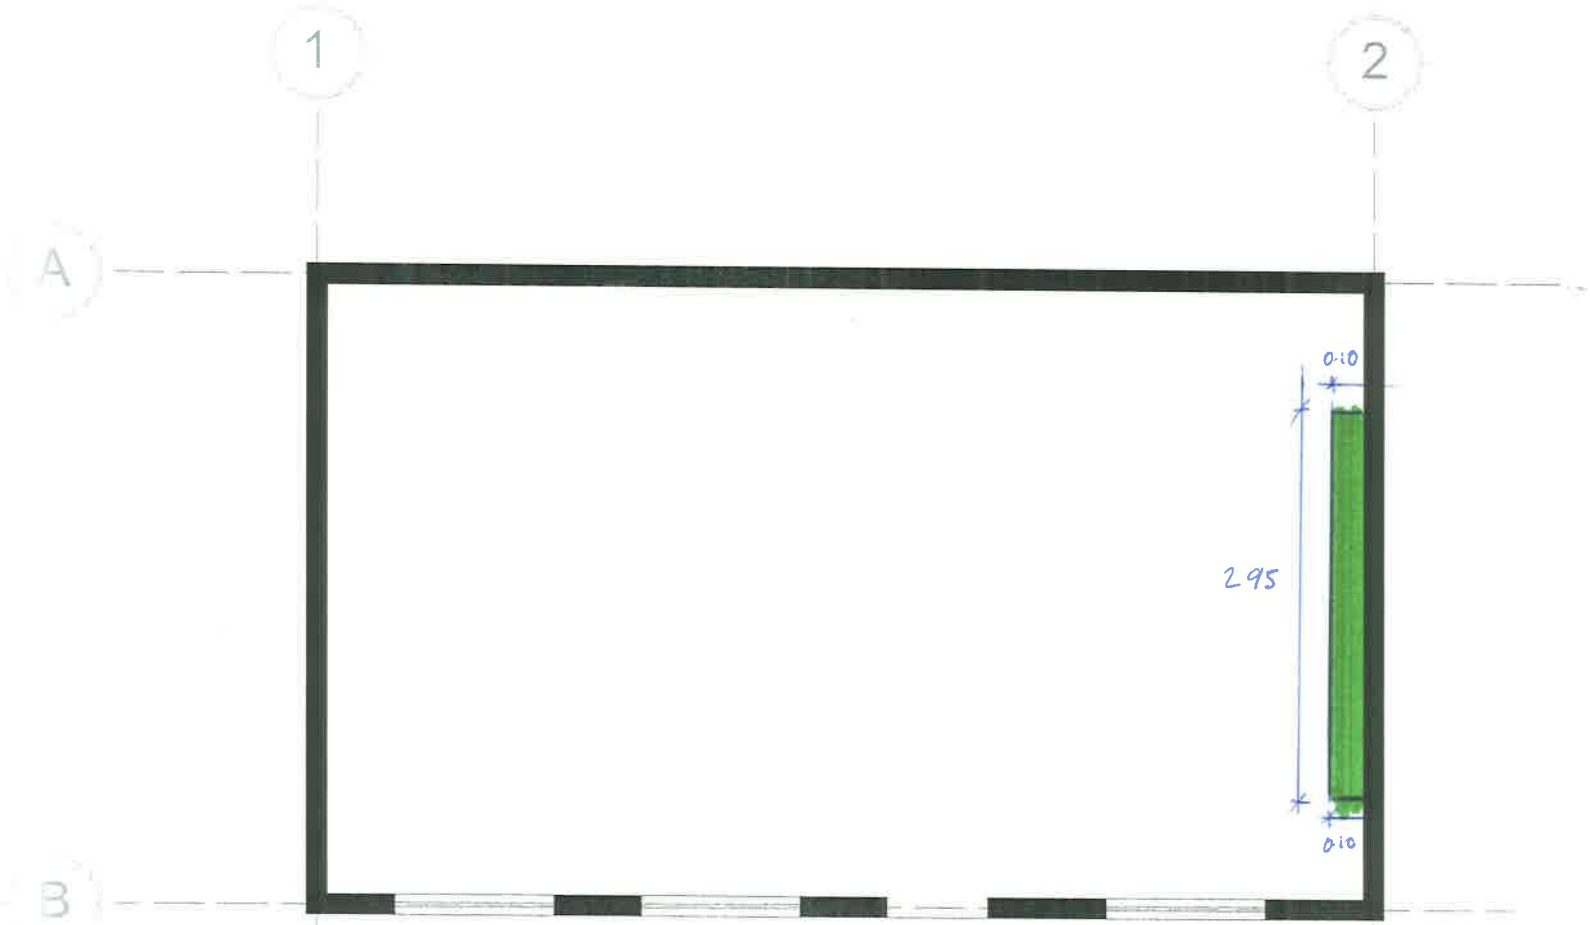

7.13.1 Suministro y colocación de follaje artificial...







El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



7.13.1. Suministro y colocación de follaje artificial para muro verde, en muro , Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.7.6					
Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 mts de ancho x 2.30 mts de altura, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera de 1 m, material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación en acceso a baños por sala de juntas.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

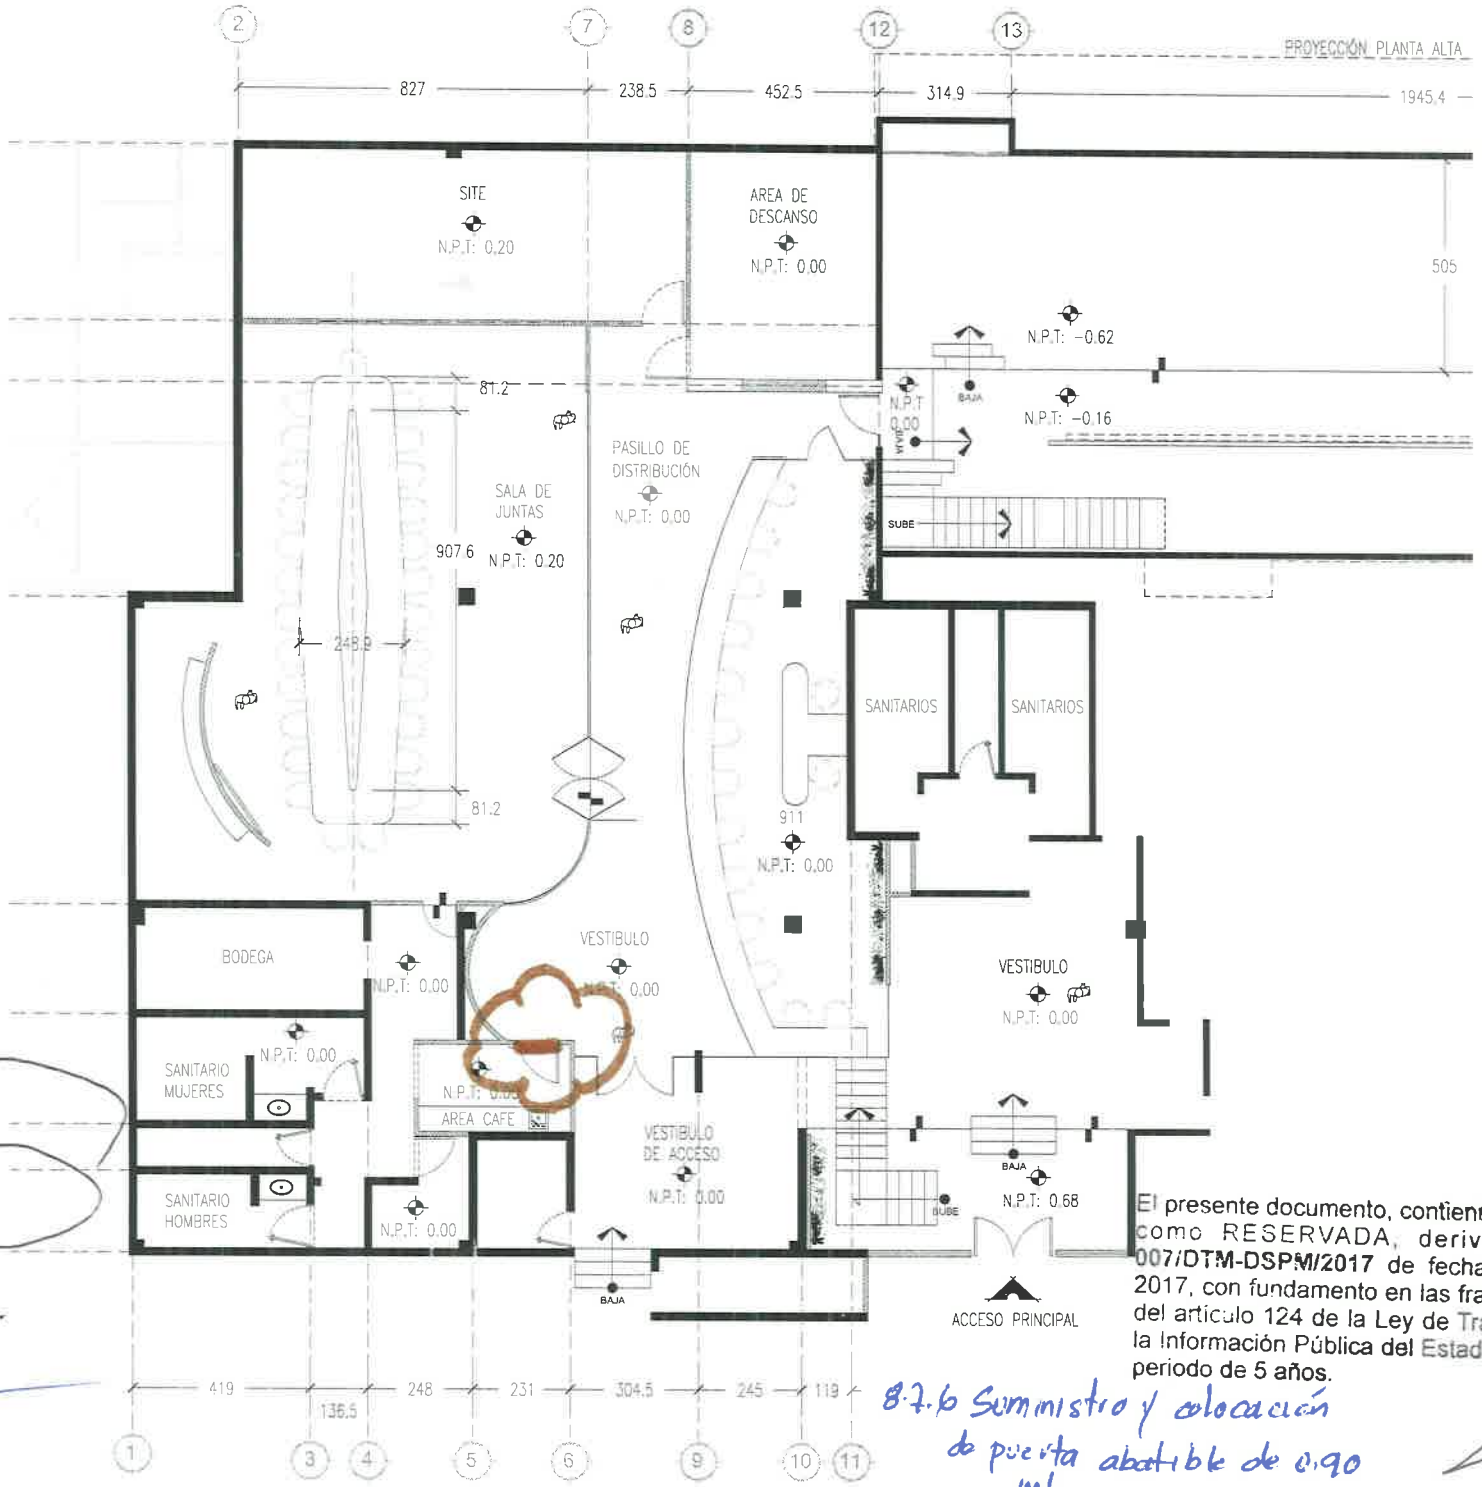

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

8.7.6 Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 mts..



8.7.6. Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 mts de ancho x 2.30 mts de altura, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera de 1 m, material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación en acceso a baños por sala de juntas

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.9.1					
Fabricación e instalación de cocineta en área de café, según diseño. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
		-3.50	-3.50		
	TOTAL		**-3.50**		**-3.50**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

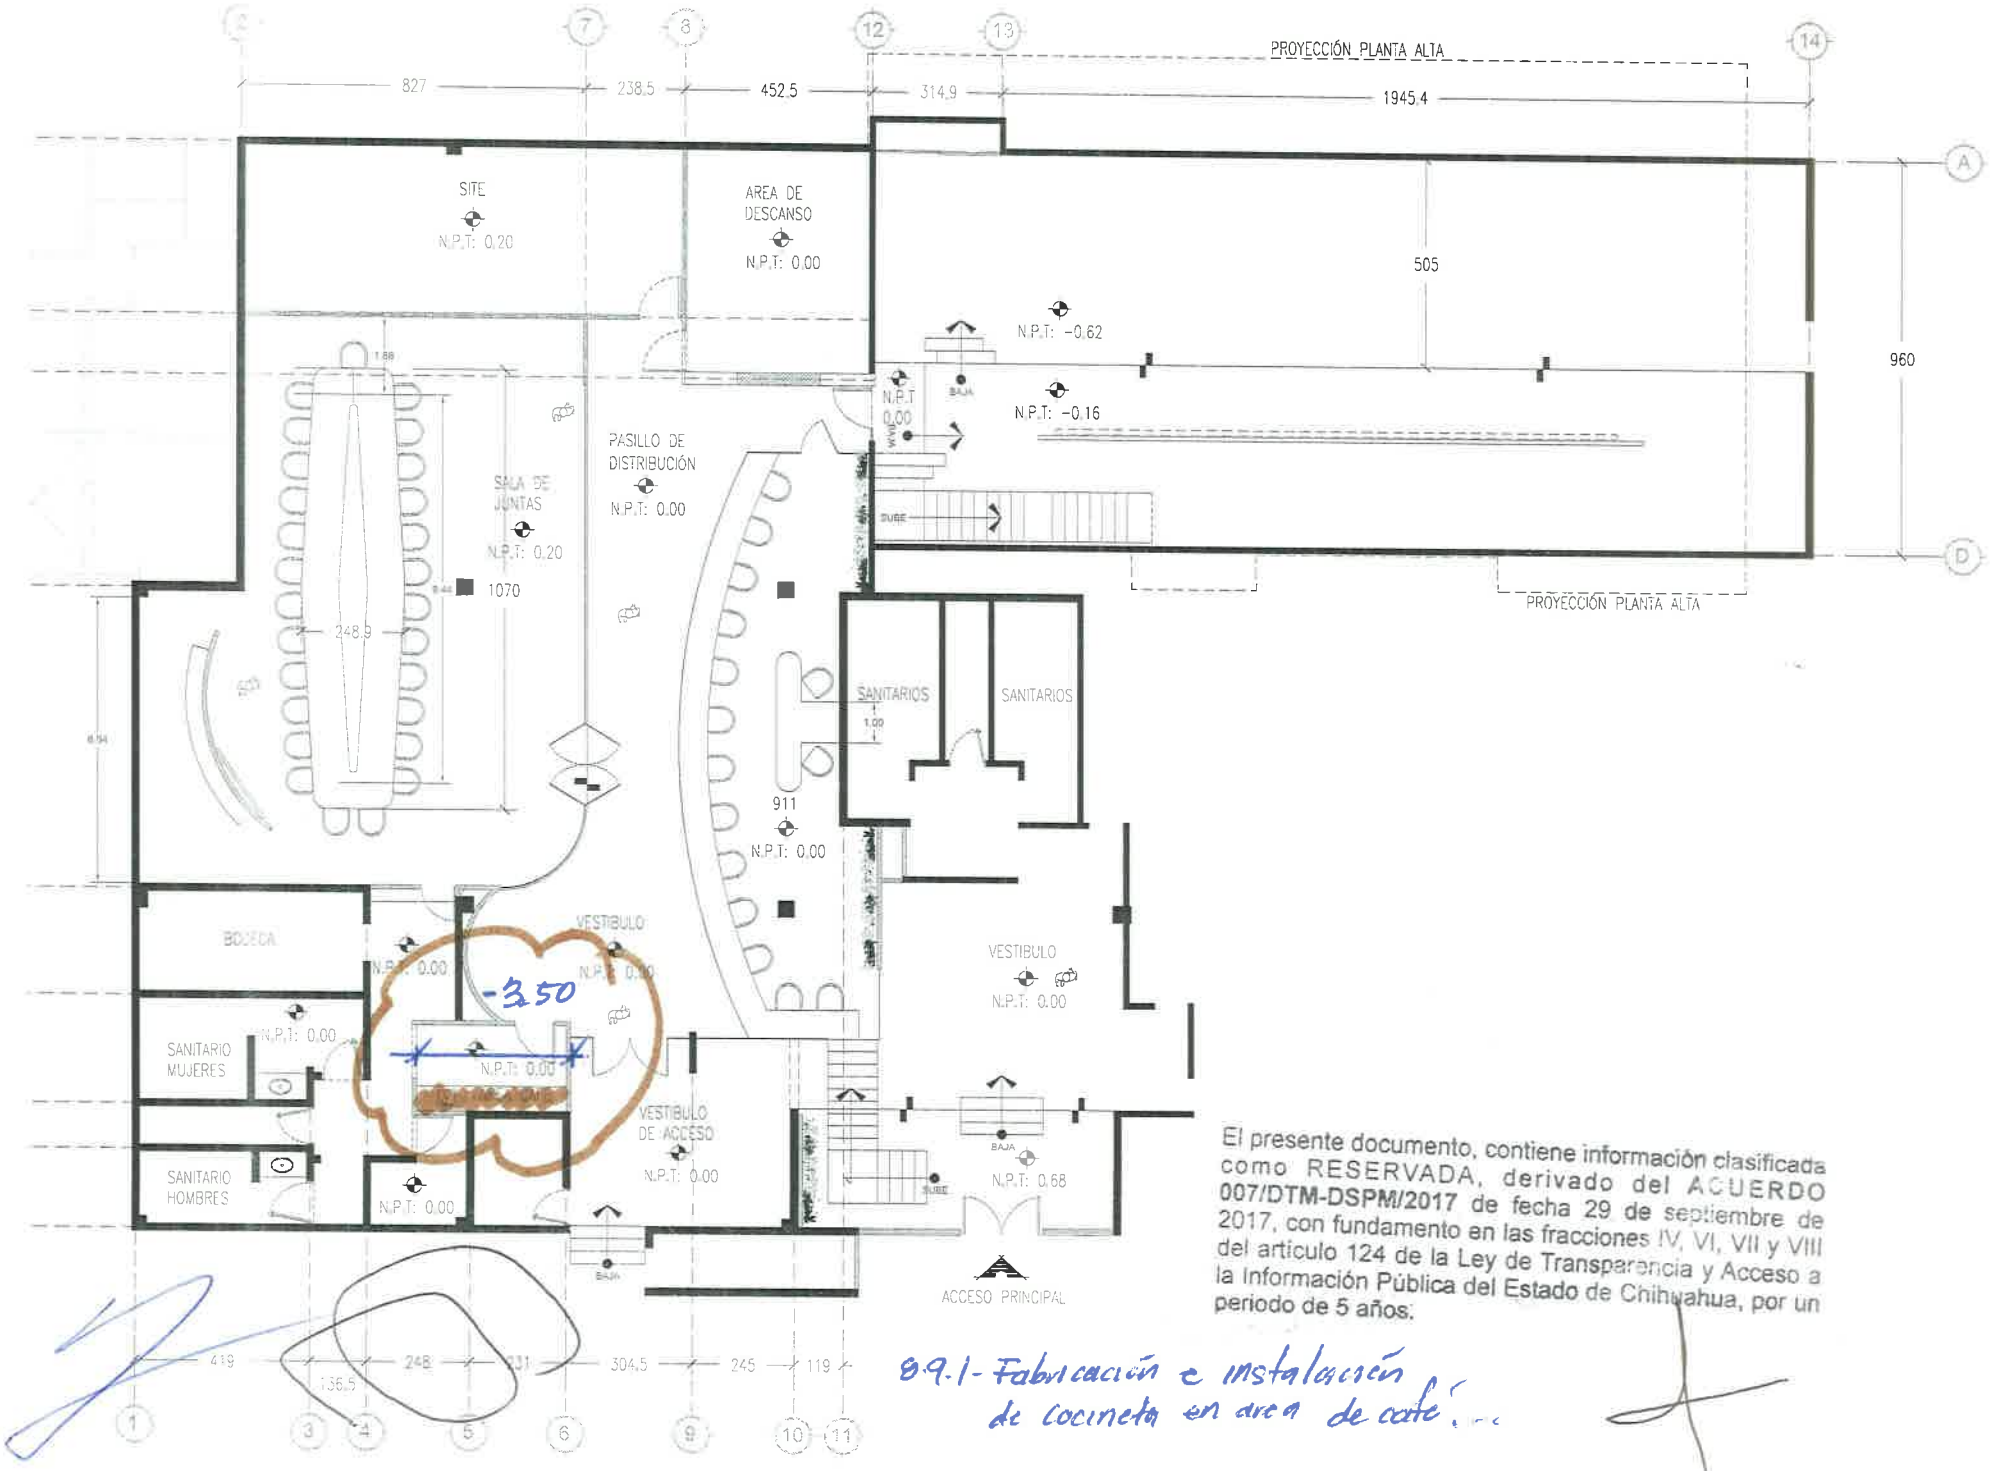

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

09.1- Fabricación e instalación de cocineta en area de cafe...



8.9.1. Fabricación e instalación de cocineta en área de café, a base de madera de encino, acabado natural. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
8.13.2						
Suministro y colocación de follaje artificial para muro verde, en muro de 911, 30% en muro en vestibulo de acceso y area de descanso, Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Alto**	**Total**			
	AREA DE DESCANSO					
	2.10	2.20	4.62			
	1.60	2.20	3.52			
	911					
	2.77	2.23	6.18			
	0.18	2.23	0.40			
	0.25	2.23	0.56			
	4.35	2.23	9.70			
		TOTAL	**24.98**			**24.98**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

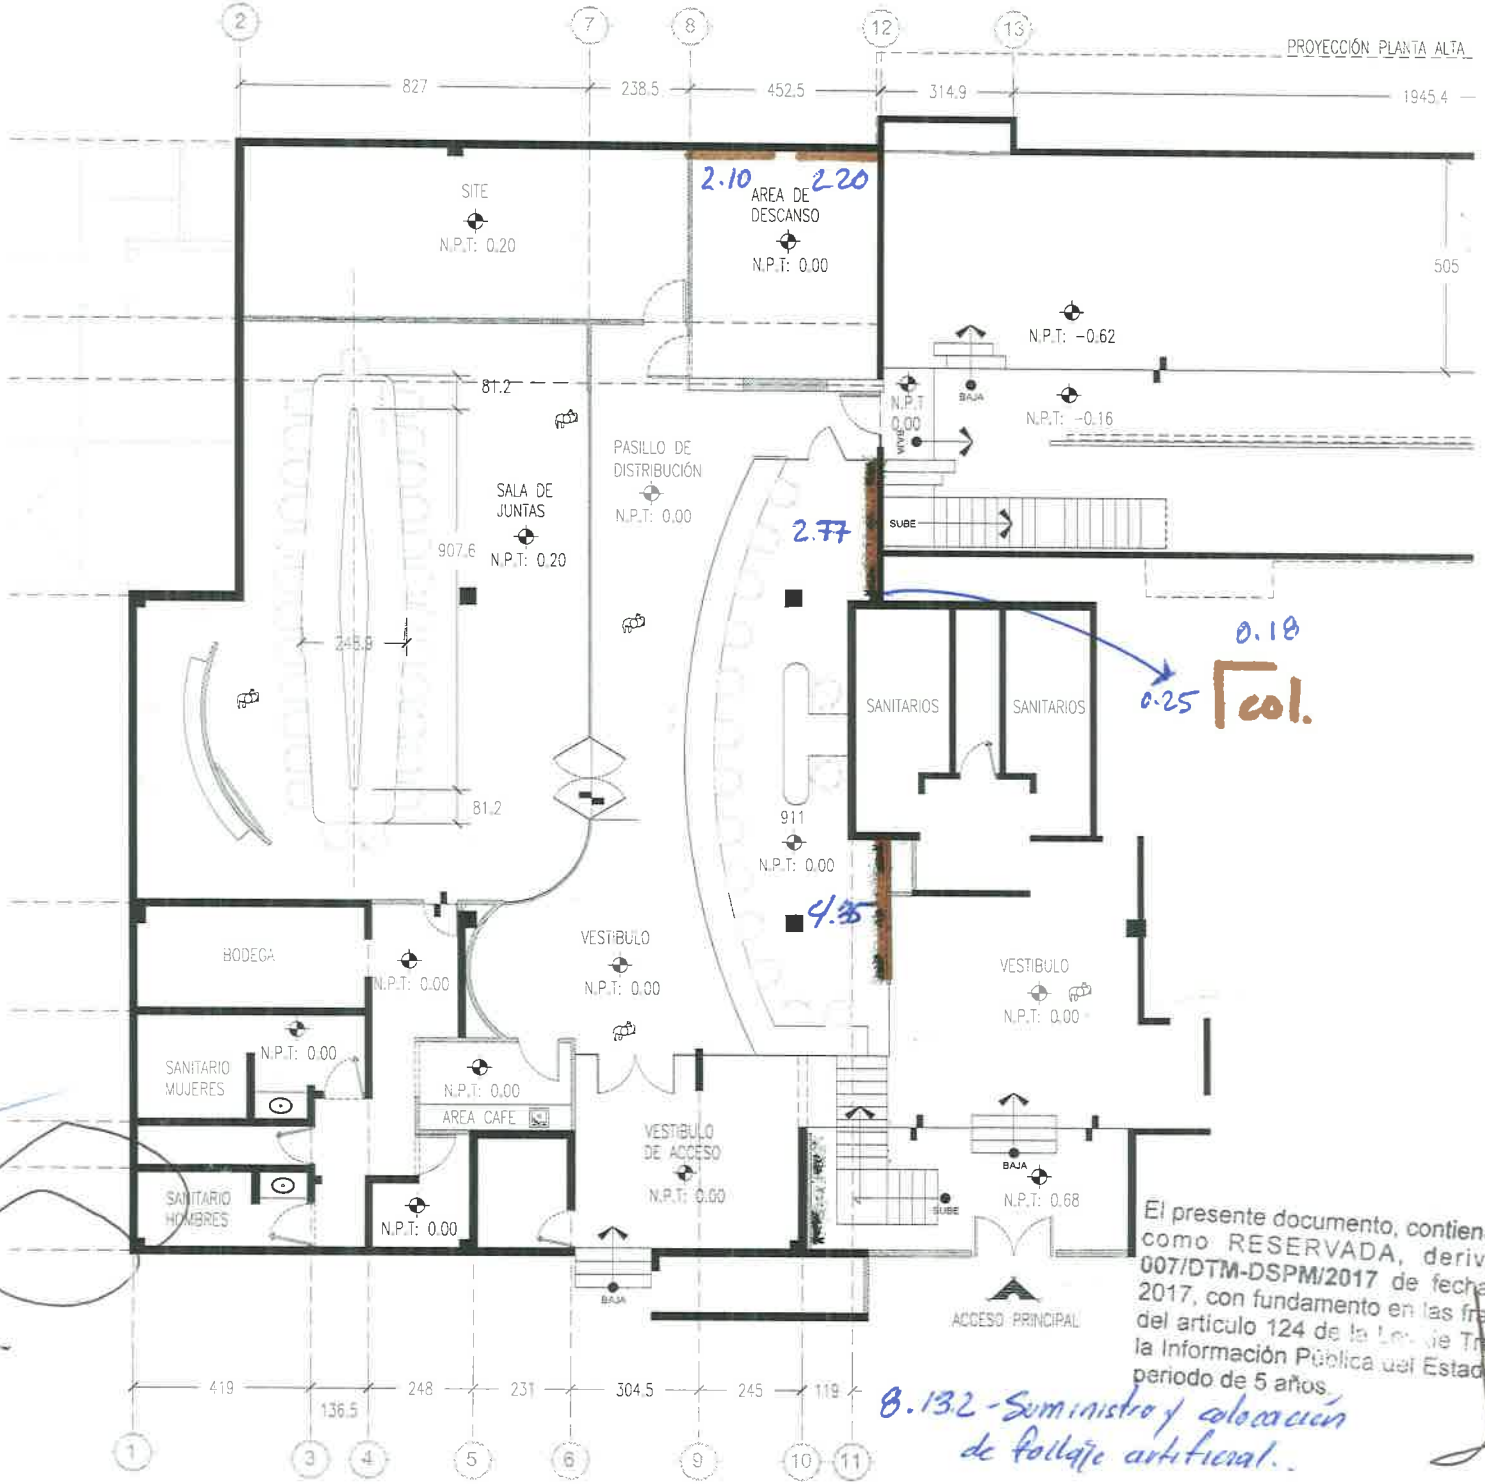

8.13.2 - Suministro y colocación de follaje artificial.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.





8.13.2. Suministro y colocación de follaje artificial para muro verde, en muro de 911, 30% en muro en vestibulo de acceso y area de descanso, Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHU/CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: Del 27 al 31 de Marzo 2018

CROQUIS

FOTOGRAFÍAS

EXT-32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE ENETRGIA ELECTRICA PARA ARCOS POR CAMELLON SIN DEMOLICION. INCLUYE: MATERIALES (CABLE DE ALUMINIO1/0, MISELANIOS, POLIDUCTO DE 2" DE DIAMETRO), EXCAVACIONDE ZANJA CON SECCION DE 0.30 X 0.50 M RELLENO DE LA MISMA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 85% DE SU PVSM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EXT-33 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA ARCOS AEREO CAL 1/0, INCLUYE : MATERIALES (CABLE DE ALUMINIO 2+1, MISELANEOS) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXT-34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA POR BANQUETA SIN DEMOLICION, INCLUYE: MATERIALES (CABLE XLP 1+1 CAL.4, POLIDUCTO, MISELANEOS), MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXT-35 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION DE 40X40X40

I.D.	ML	EXT-32	EXT-33	EXT-34	EXT-35
199		350.00	-	201.00	5.00
200		-	-	428.10	4.00
ARCO JUAREZ		400.00	67.00	309.05	6.00
ARCO DELICIAS		-	-	-	-
ARCO CUAUHTEMOC		**22.45**	**-**	**-**	**-**
ARCO ALDAMA		13.45	106.00	-	-
		785.90	**173.00**	**938.15**	**15.00**
TOTAL EXT-32		**785.90**			
TOTAL EXT-33		**173.00**			
TOTAL EXT-34		**938.15**			
TOTAL EXT-35		**15.00**			

RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIM/ 11 PERIODO: Del 27 al 31 de Marzo 2018

CROQUIS









RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

CONTRATO: 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIM/ 11 PERIODO: Del 27 al 31 de Marzo 2018

CROQUIS





RESIDENTE DOPM
Ing. Leninn Jesus Ayala Chavez y/o
Ing. Andres Escarcega Gutierrez

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. Mario Rodriguez García

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-36						
Reubicación de instalaciones eléctricas existentes en ciber operadores, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Lote**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

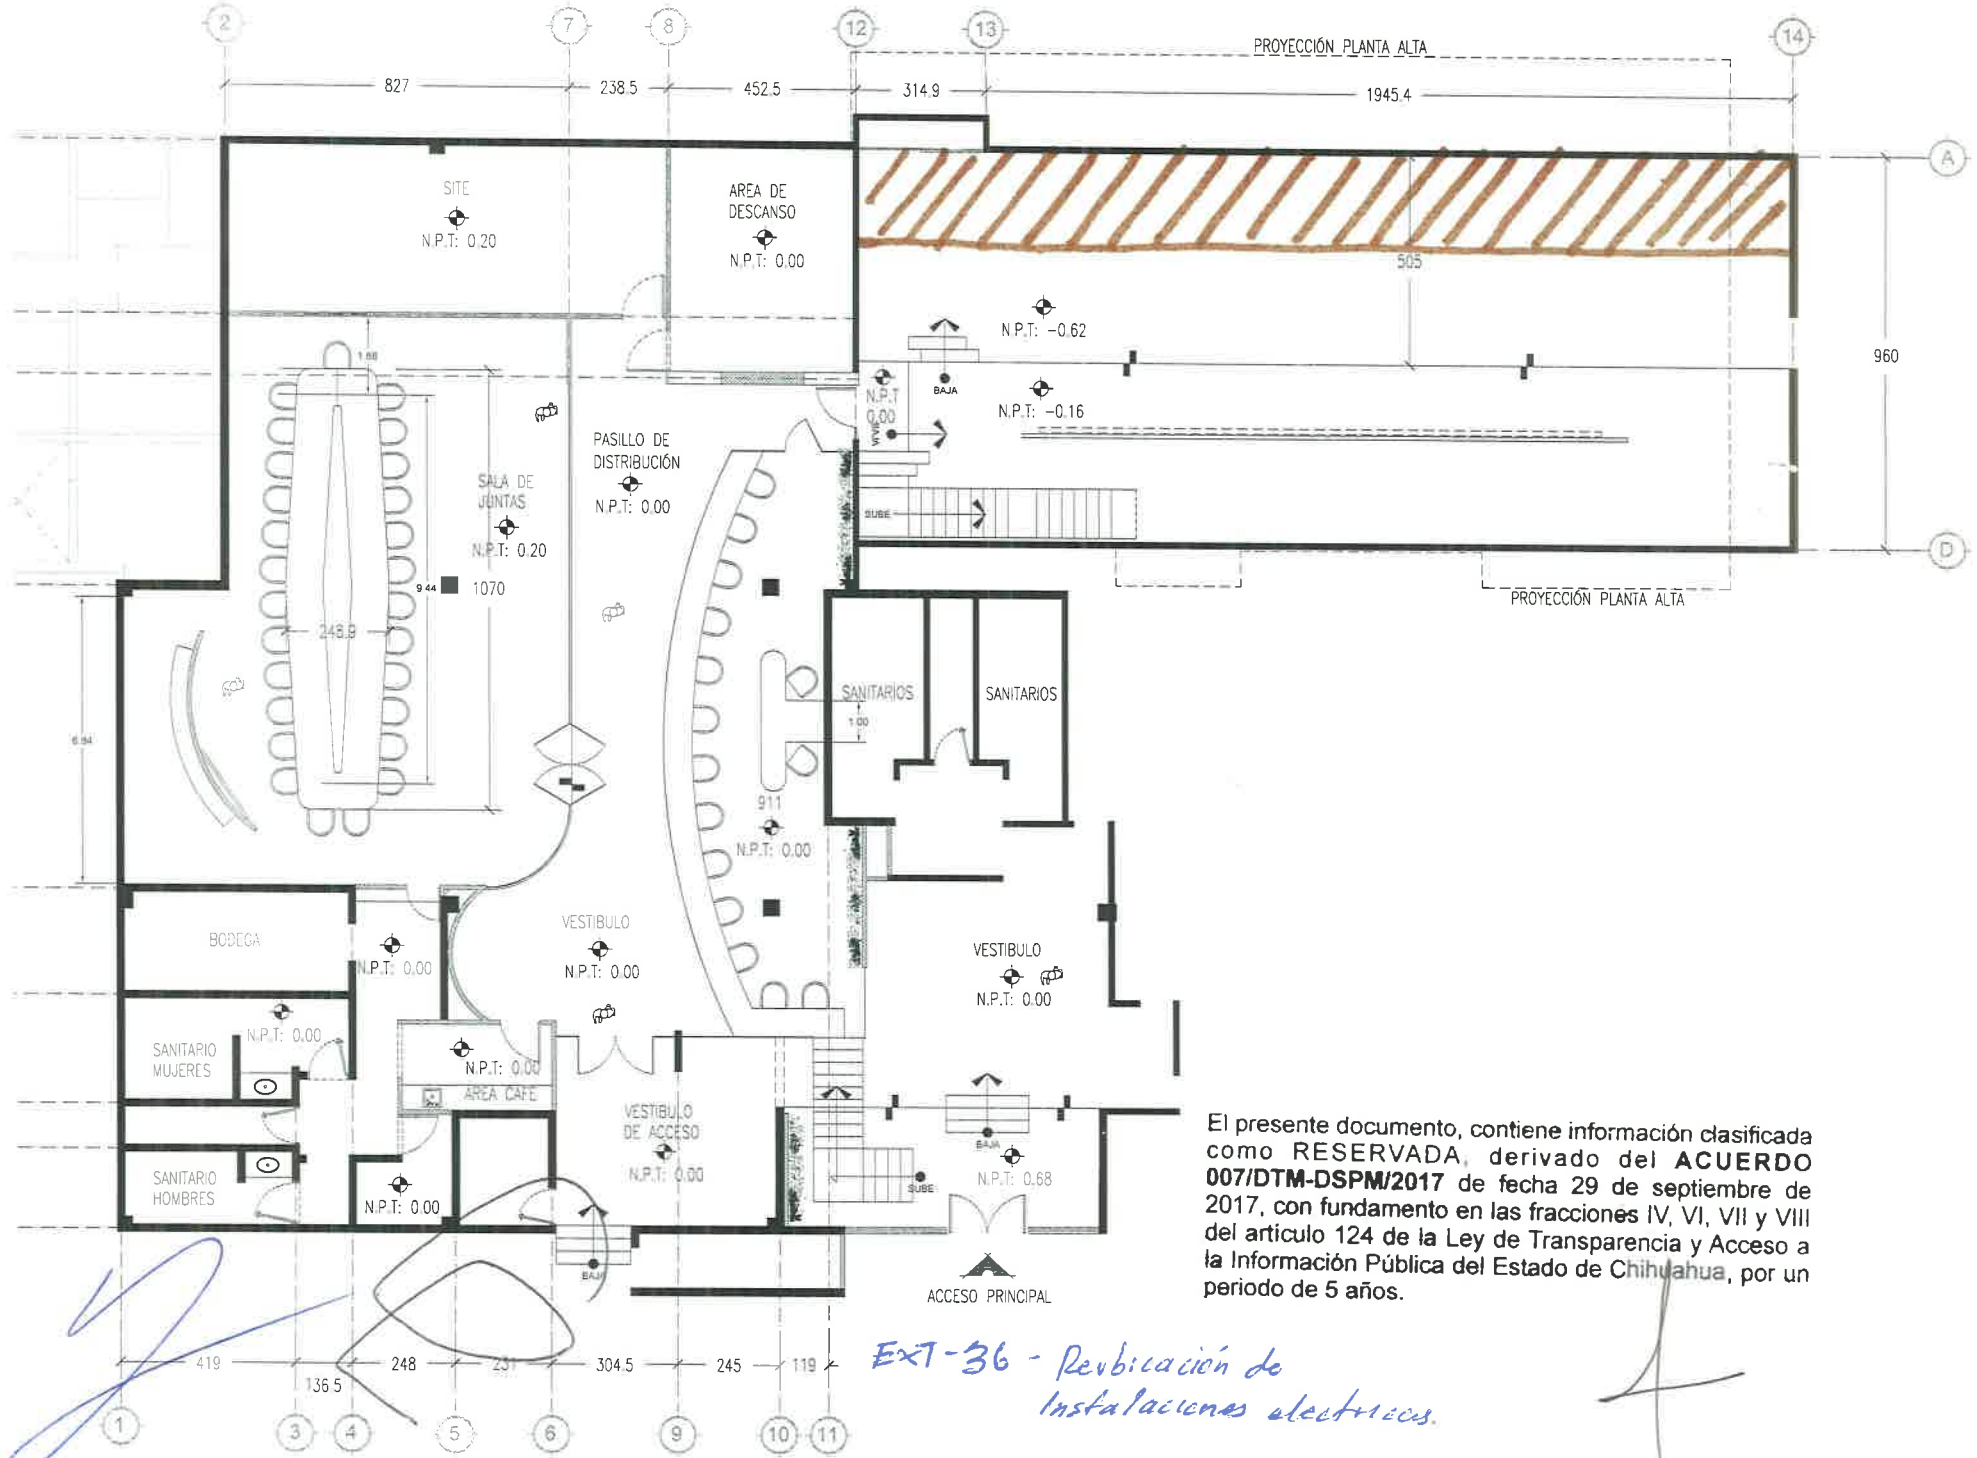

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-36 - Revbicación de Instalaciones electricas.





EXT-36 Reubicación de instalaciones eléctricas existentes en ciber operadores, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-37					
Reubicación de UPS dentro del site, incluye banco de baterías, desmantelamiento de alimentador eléctrico y reubicación de tablero de 42 circuitos. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

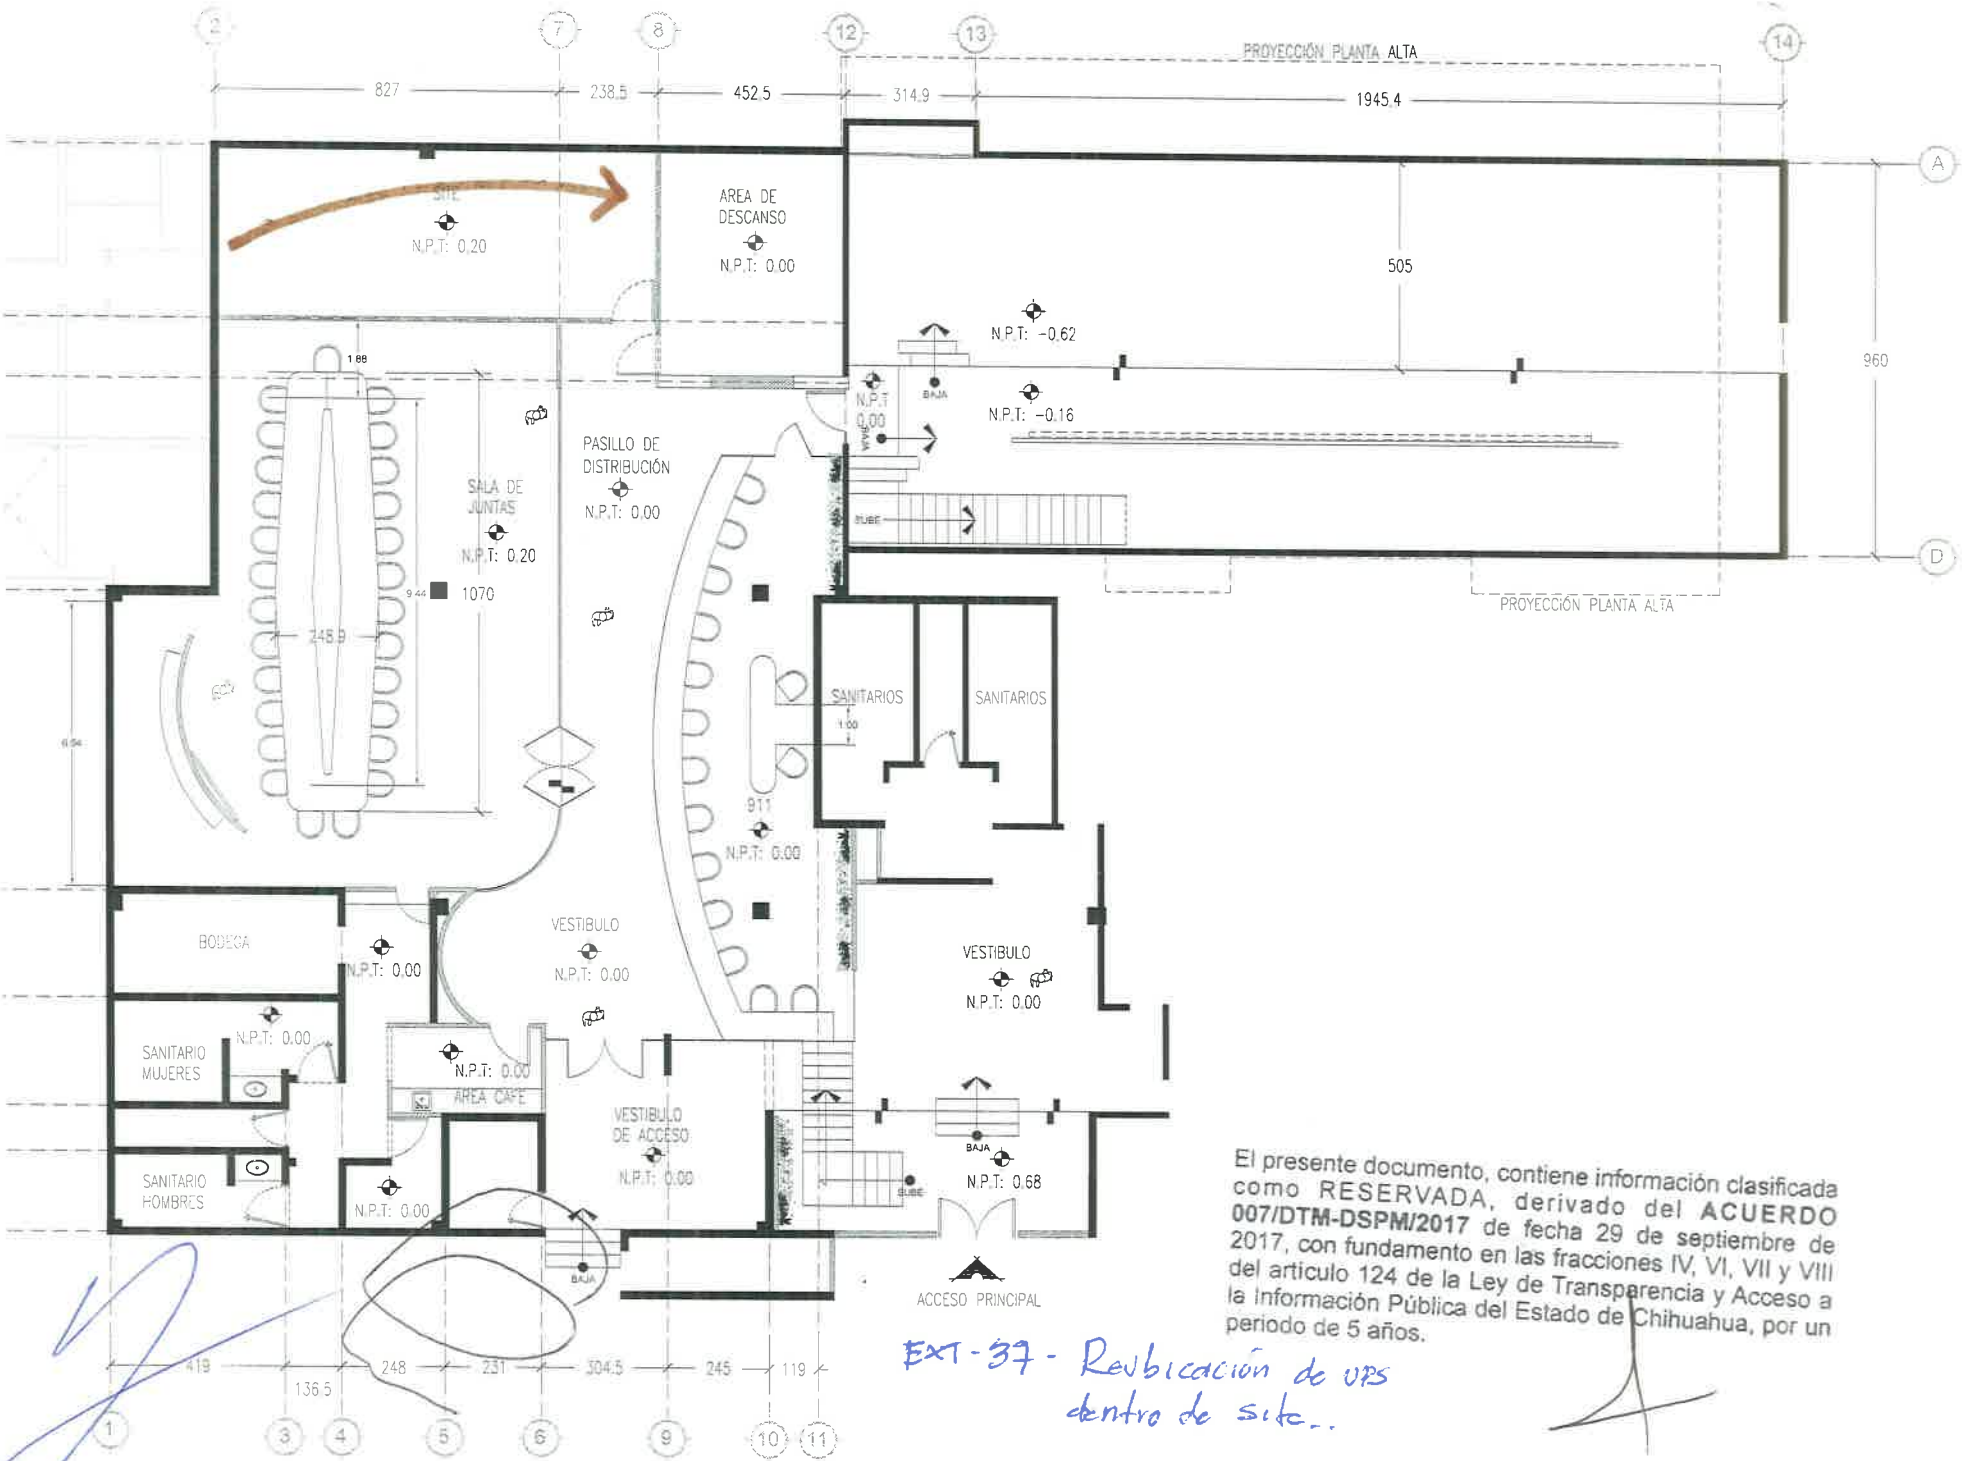

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-37 - Reubicación de UPS dentro de sitio..



EXT- 37

Reubicación de UPS dentro del site, incluye banco de baterías, desmantelamiento de alimentador eléctrico y reubicación de tablero de 42 circuitos. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-38					
Suministro e instalación de 4 nodos en mesas adicionales en ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		2.00	2.00		
		TOTAL	**2.00**		**2.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

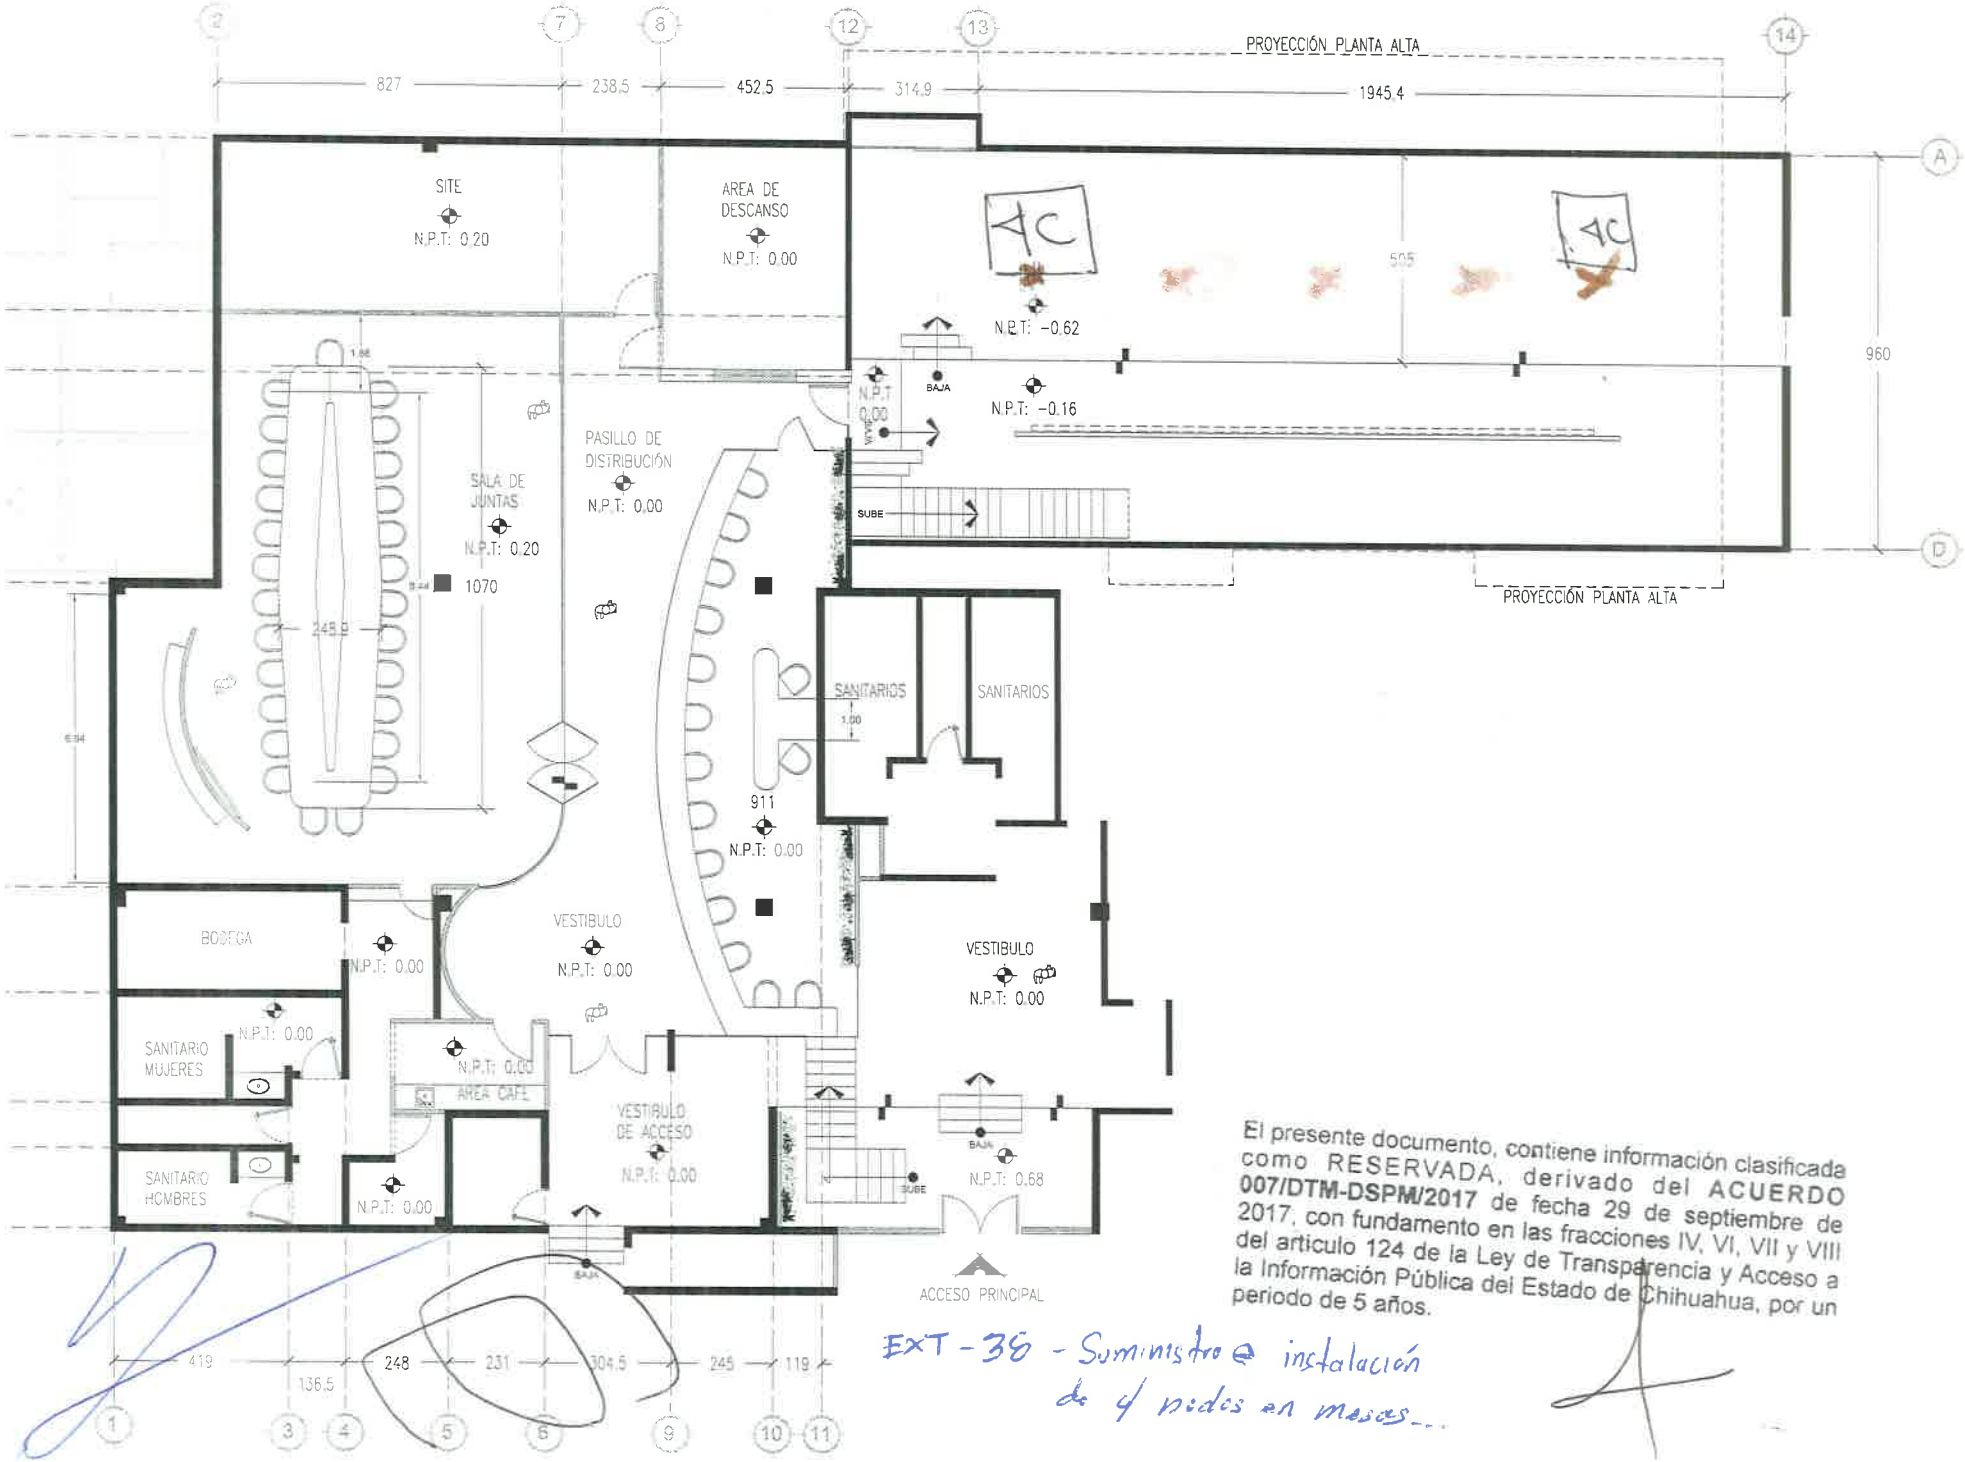

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT - 38 - Suministro e instalación de 4 pedos en mesas...

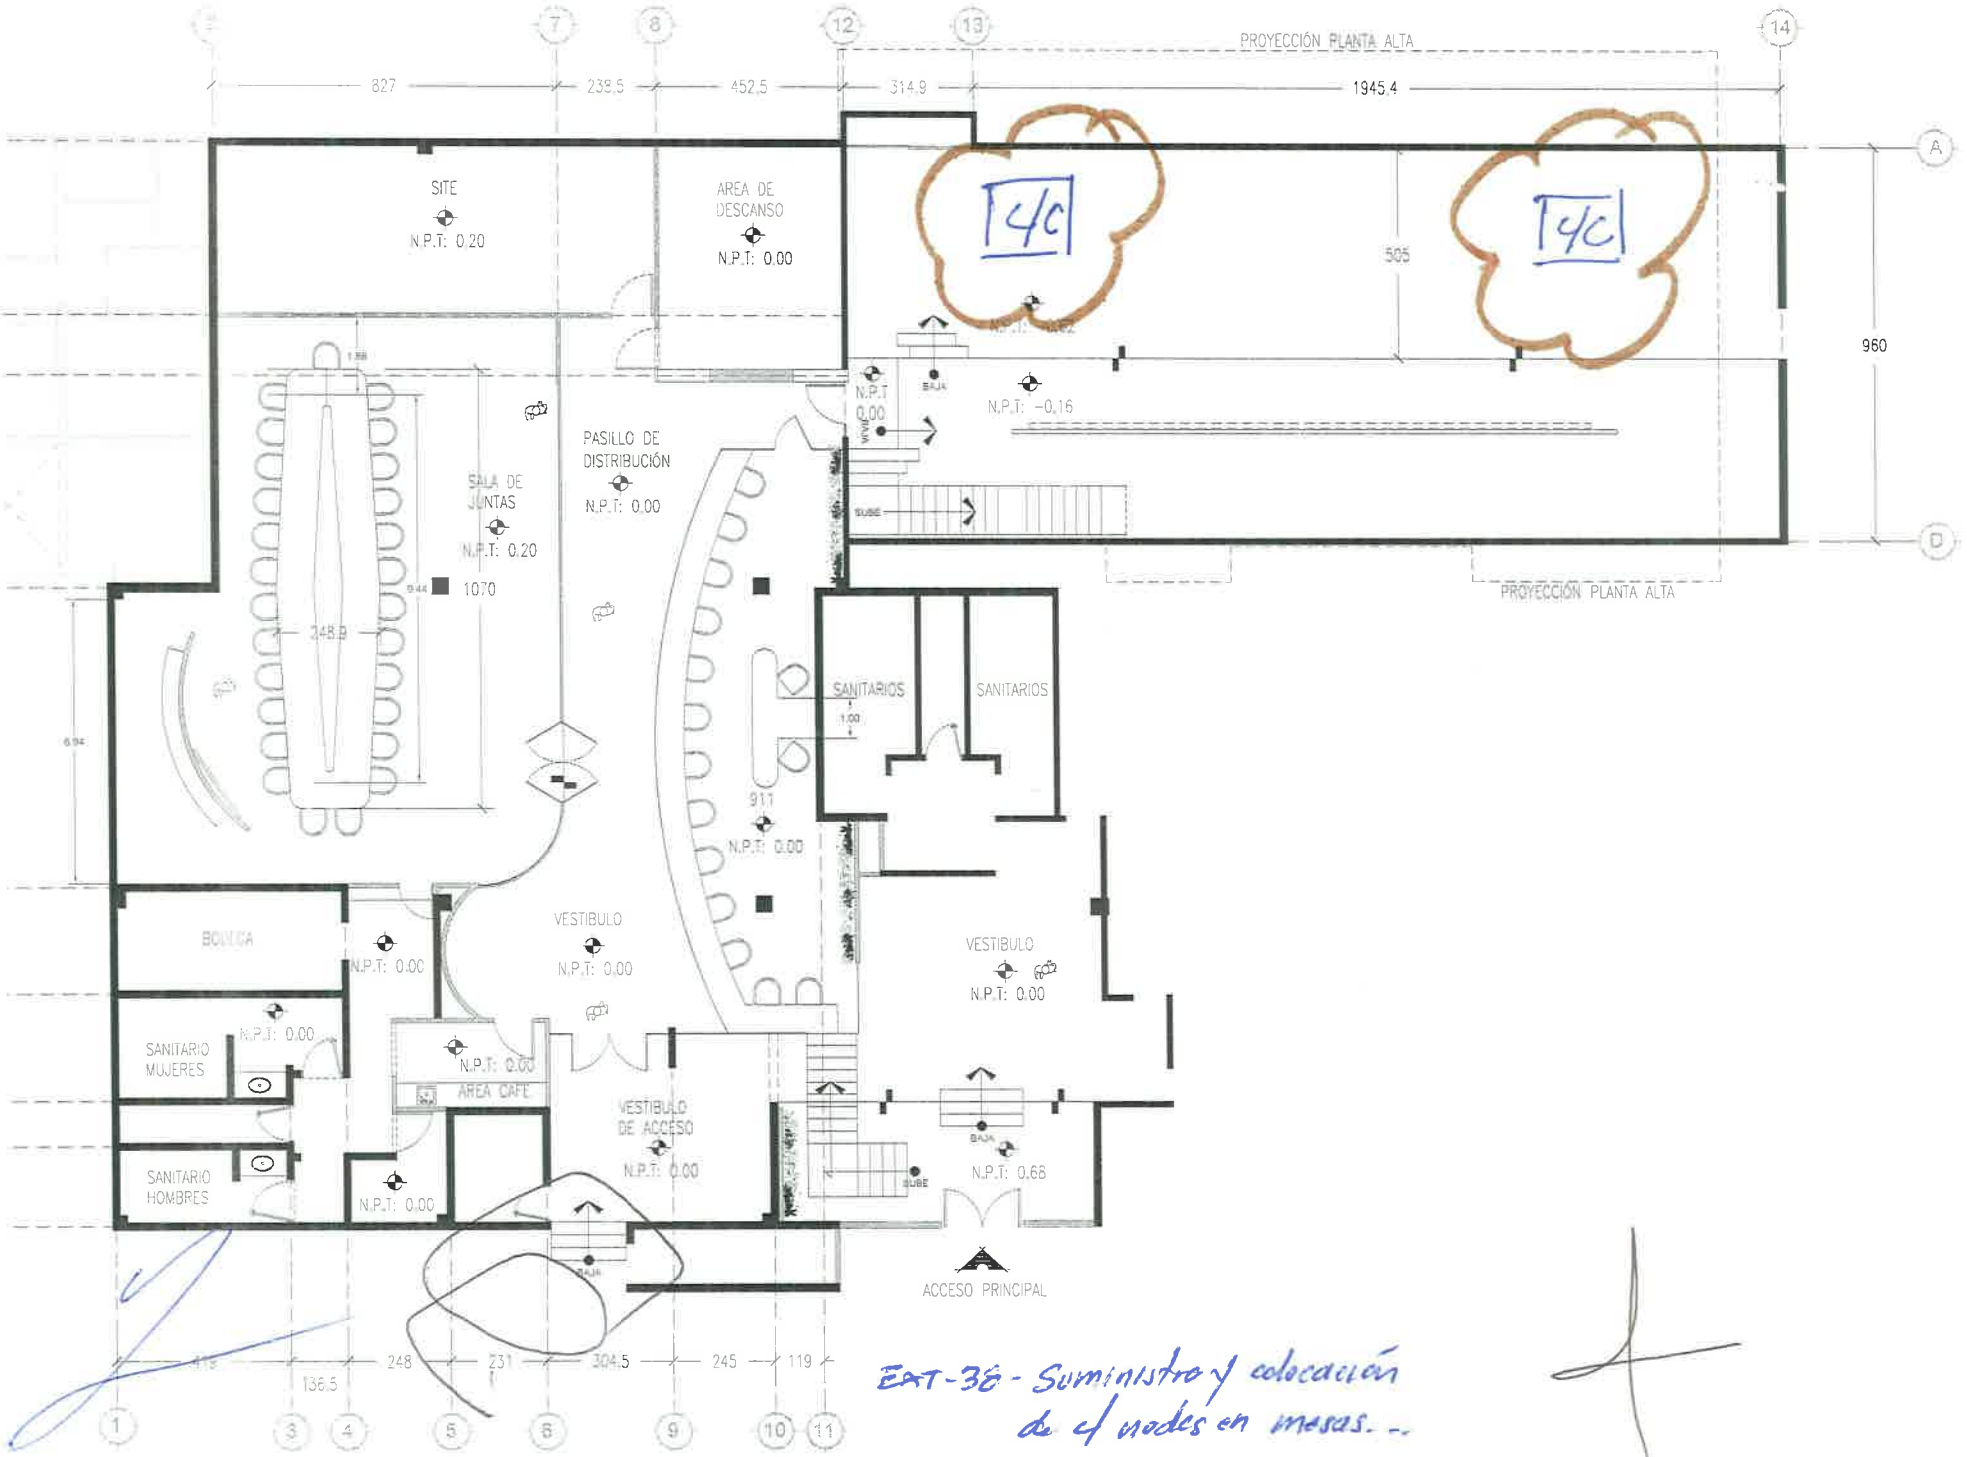

EAT-38 - Suministro y colocación de 4 nodes en mesas...





EXT- 38 Suministro e instalación de 4 nodos en mesas adicionales en ciber operadores. Incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-39						
Reubicación de instalaciones de voz y datos en área de mesas de ciber operadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Lote**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

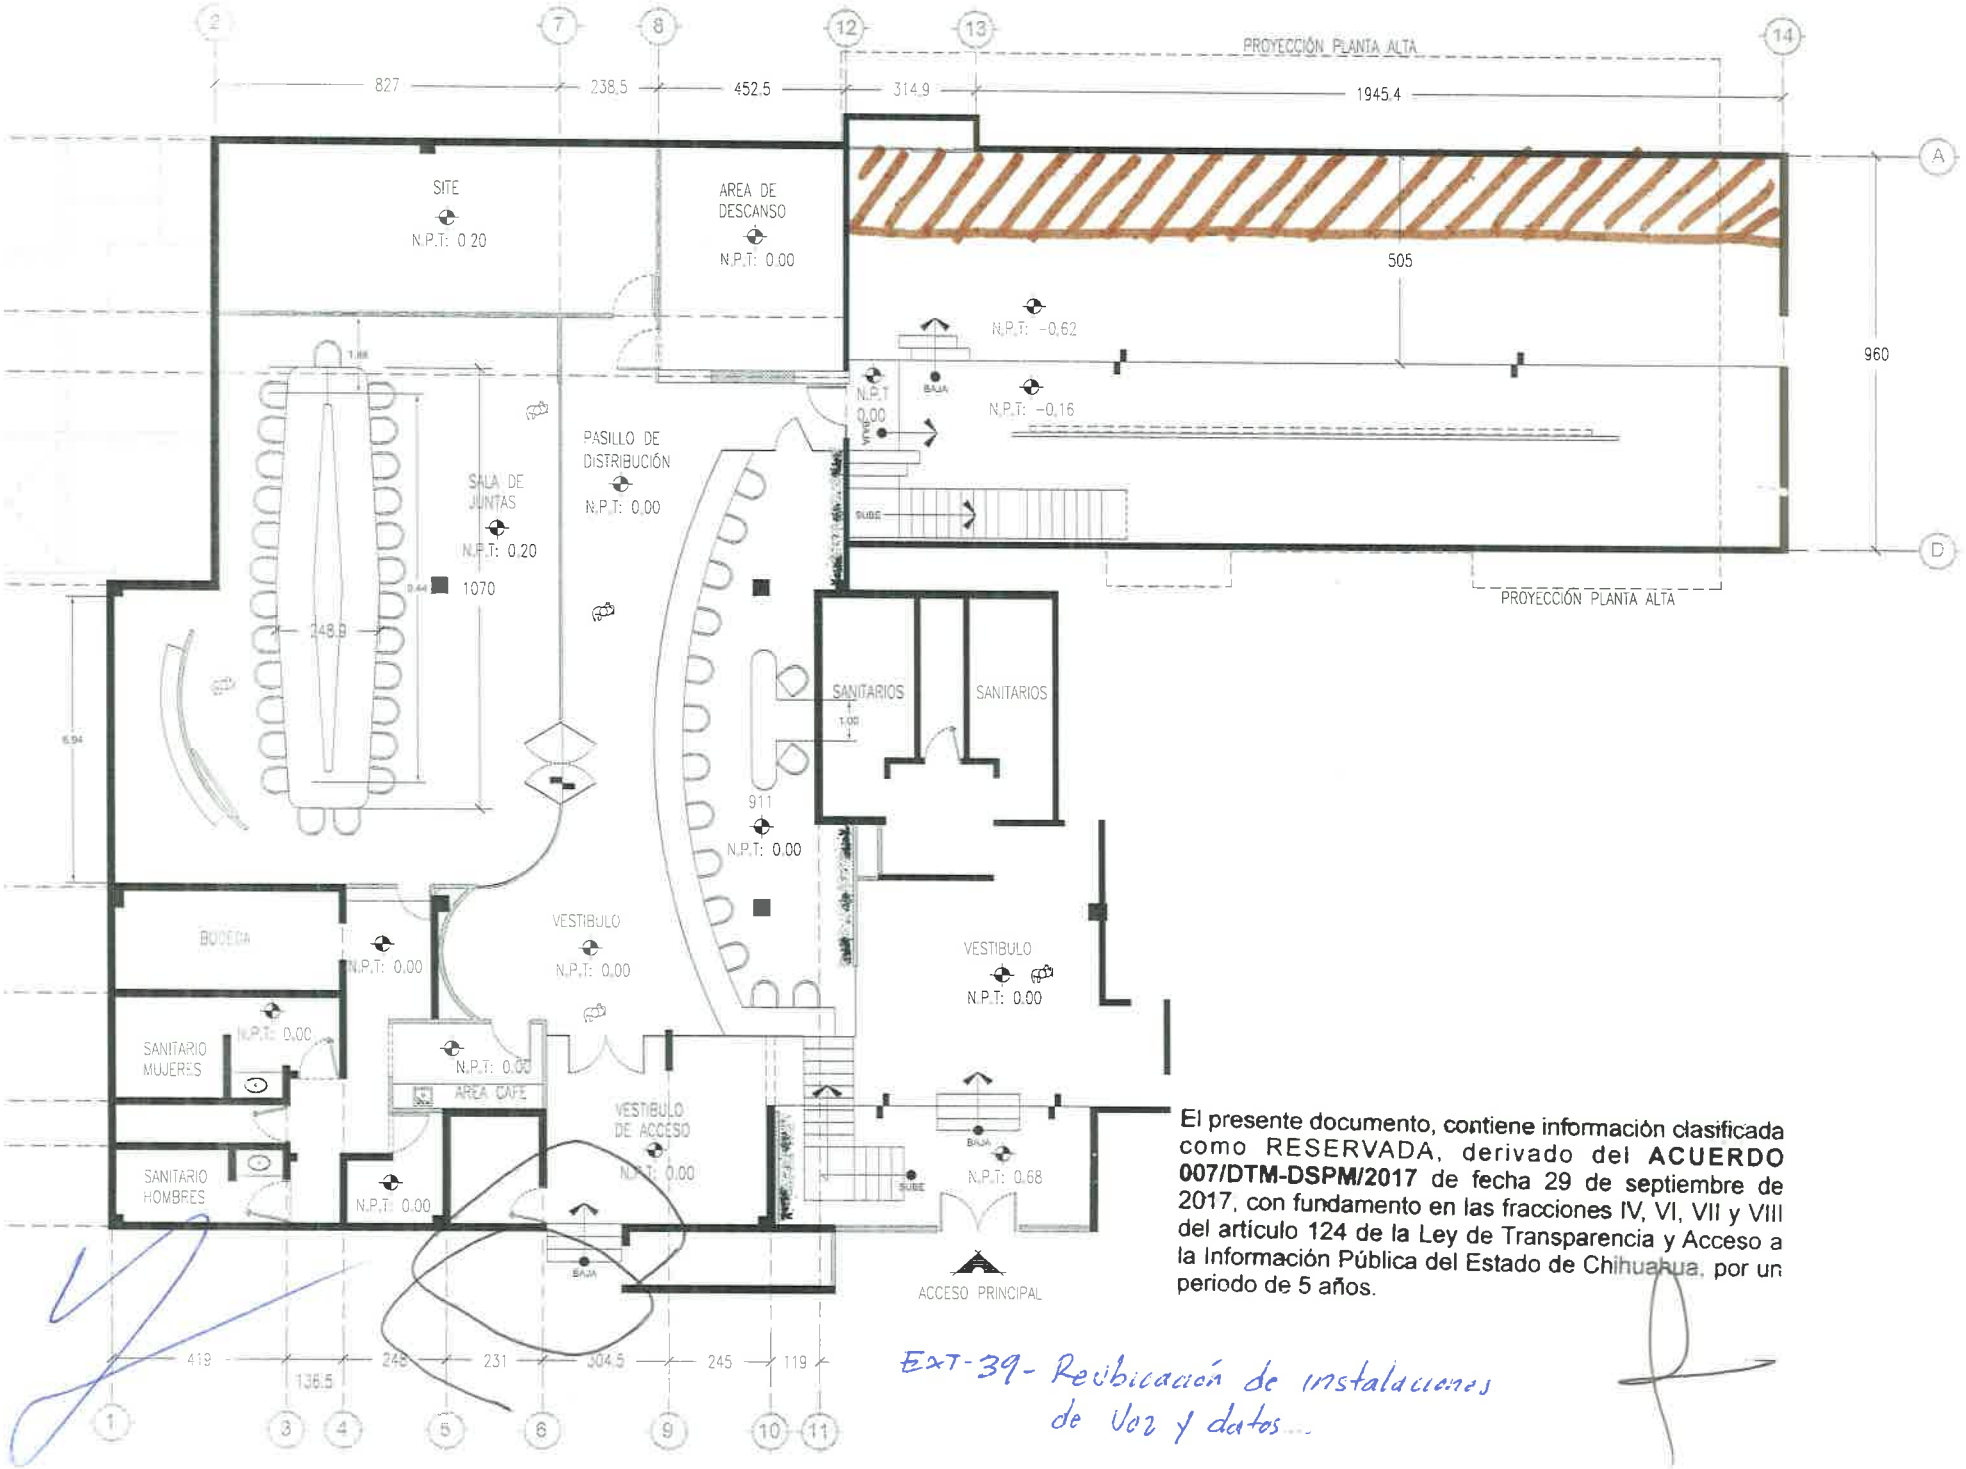

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-39- Reubicación de instalaciones de Voz y datos...





EXT- 39 Reubicación de instalaciones de voz y datos en área de mesas de ciber operadores. Incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS								CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-40										
Fabricación e instalación de zoclo fabricado con MDF de 1/2" de espesor x 4" de altura, pintado con poliuretano color gris acabado semimate. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				**Largo**	**Total**					
				SITE						
				9.68	9.68					
				3.95	3.95					
				5.06	5.06					
				0.18	0.18					
				0.40	0.40					
				0.18	0.18					
				5.14	5.14					
				3.95	3.95					
				911						
				0.54	0.54					
				5.75	5.75					
				1.00	1.00					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				0.43	0.43					
				TOTAL	**39.27**					**39.27**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

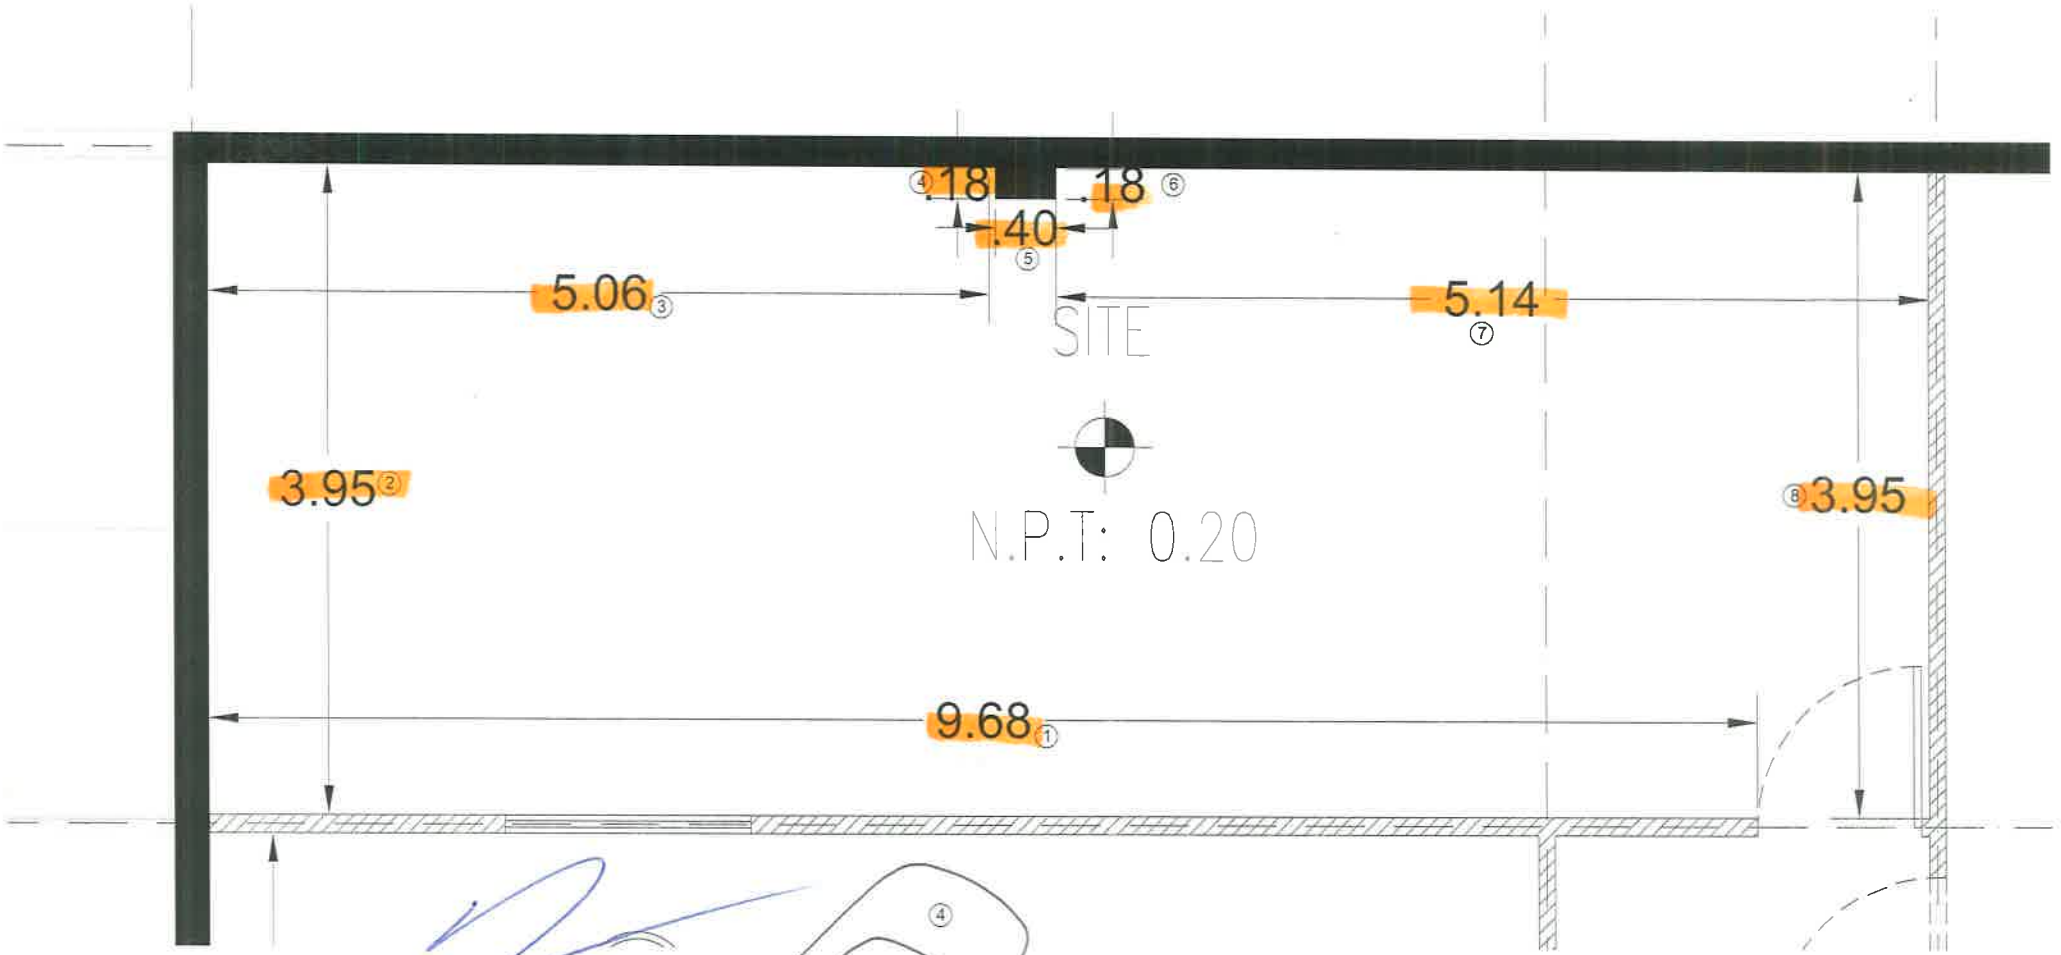



EXT-40. Fabricación e instalación de zoclo fabricado con MDF.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

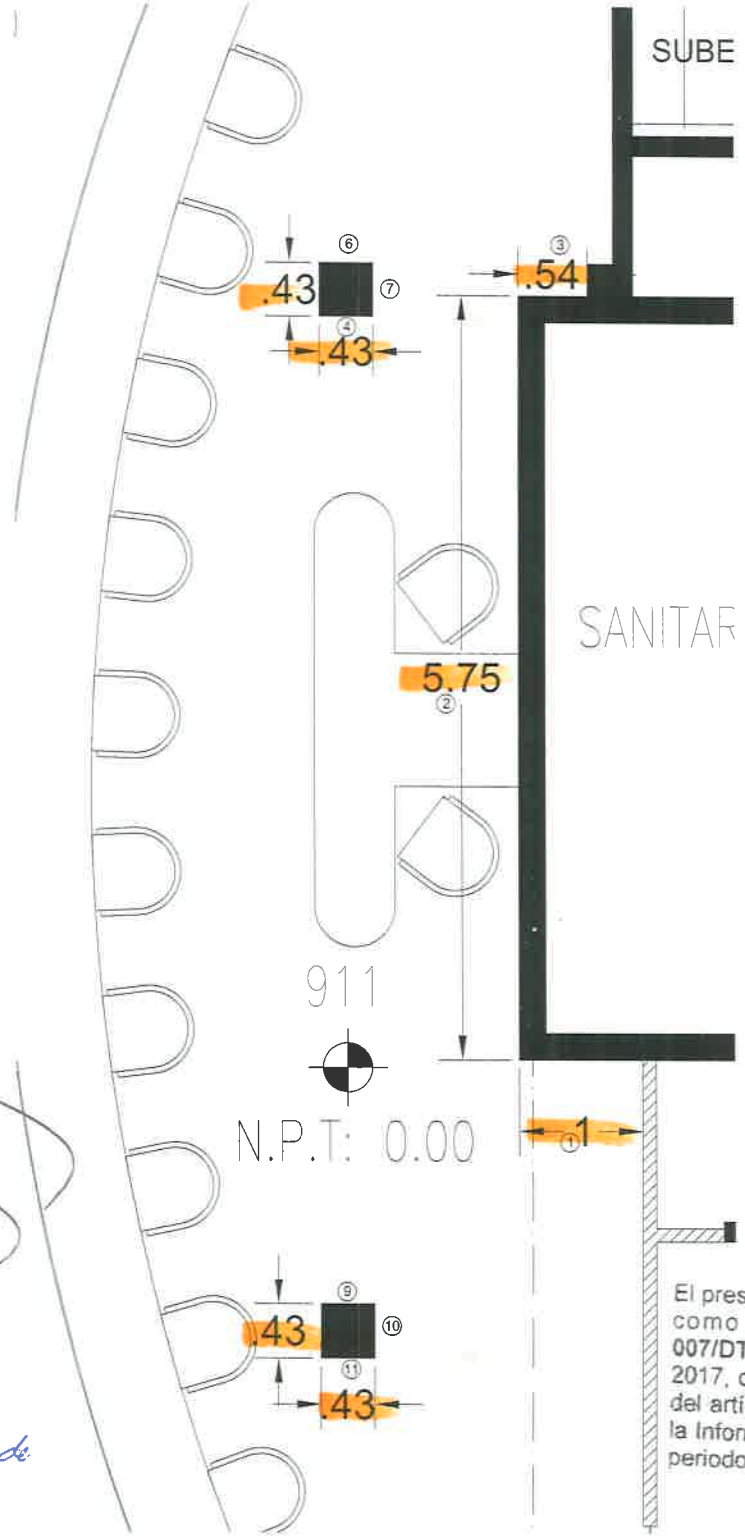

EXT-40. Fabricación e instalación de zoclo fabricado con MDF.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.





EXT- 40 Fabricación e instalación de zoclo fabricado con MDF de 1/2" de espesor x 4" de altura, pintado con poliuretano color gris acabado semimate. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-41						
Closet de 3.16 x 2.20 para ocultar tableros eléctricos, fabricado con melamina, bisagras ocultas de la marca Blum y jaladeras tubulares. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Pieza	Total			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			
						1.00

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

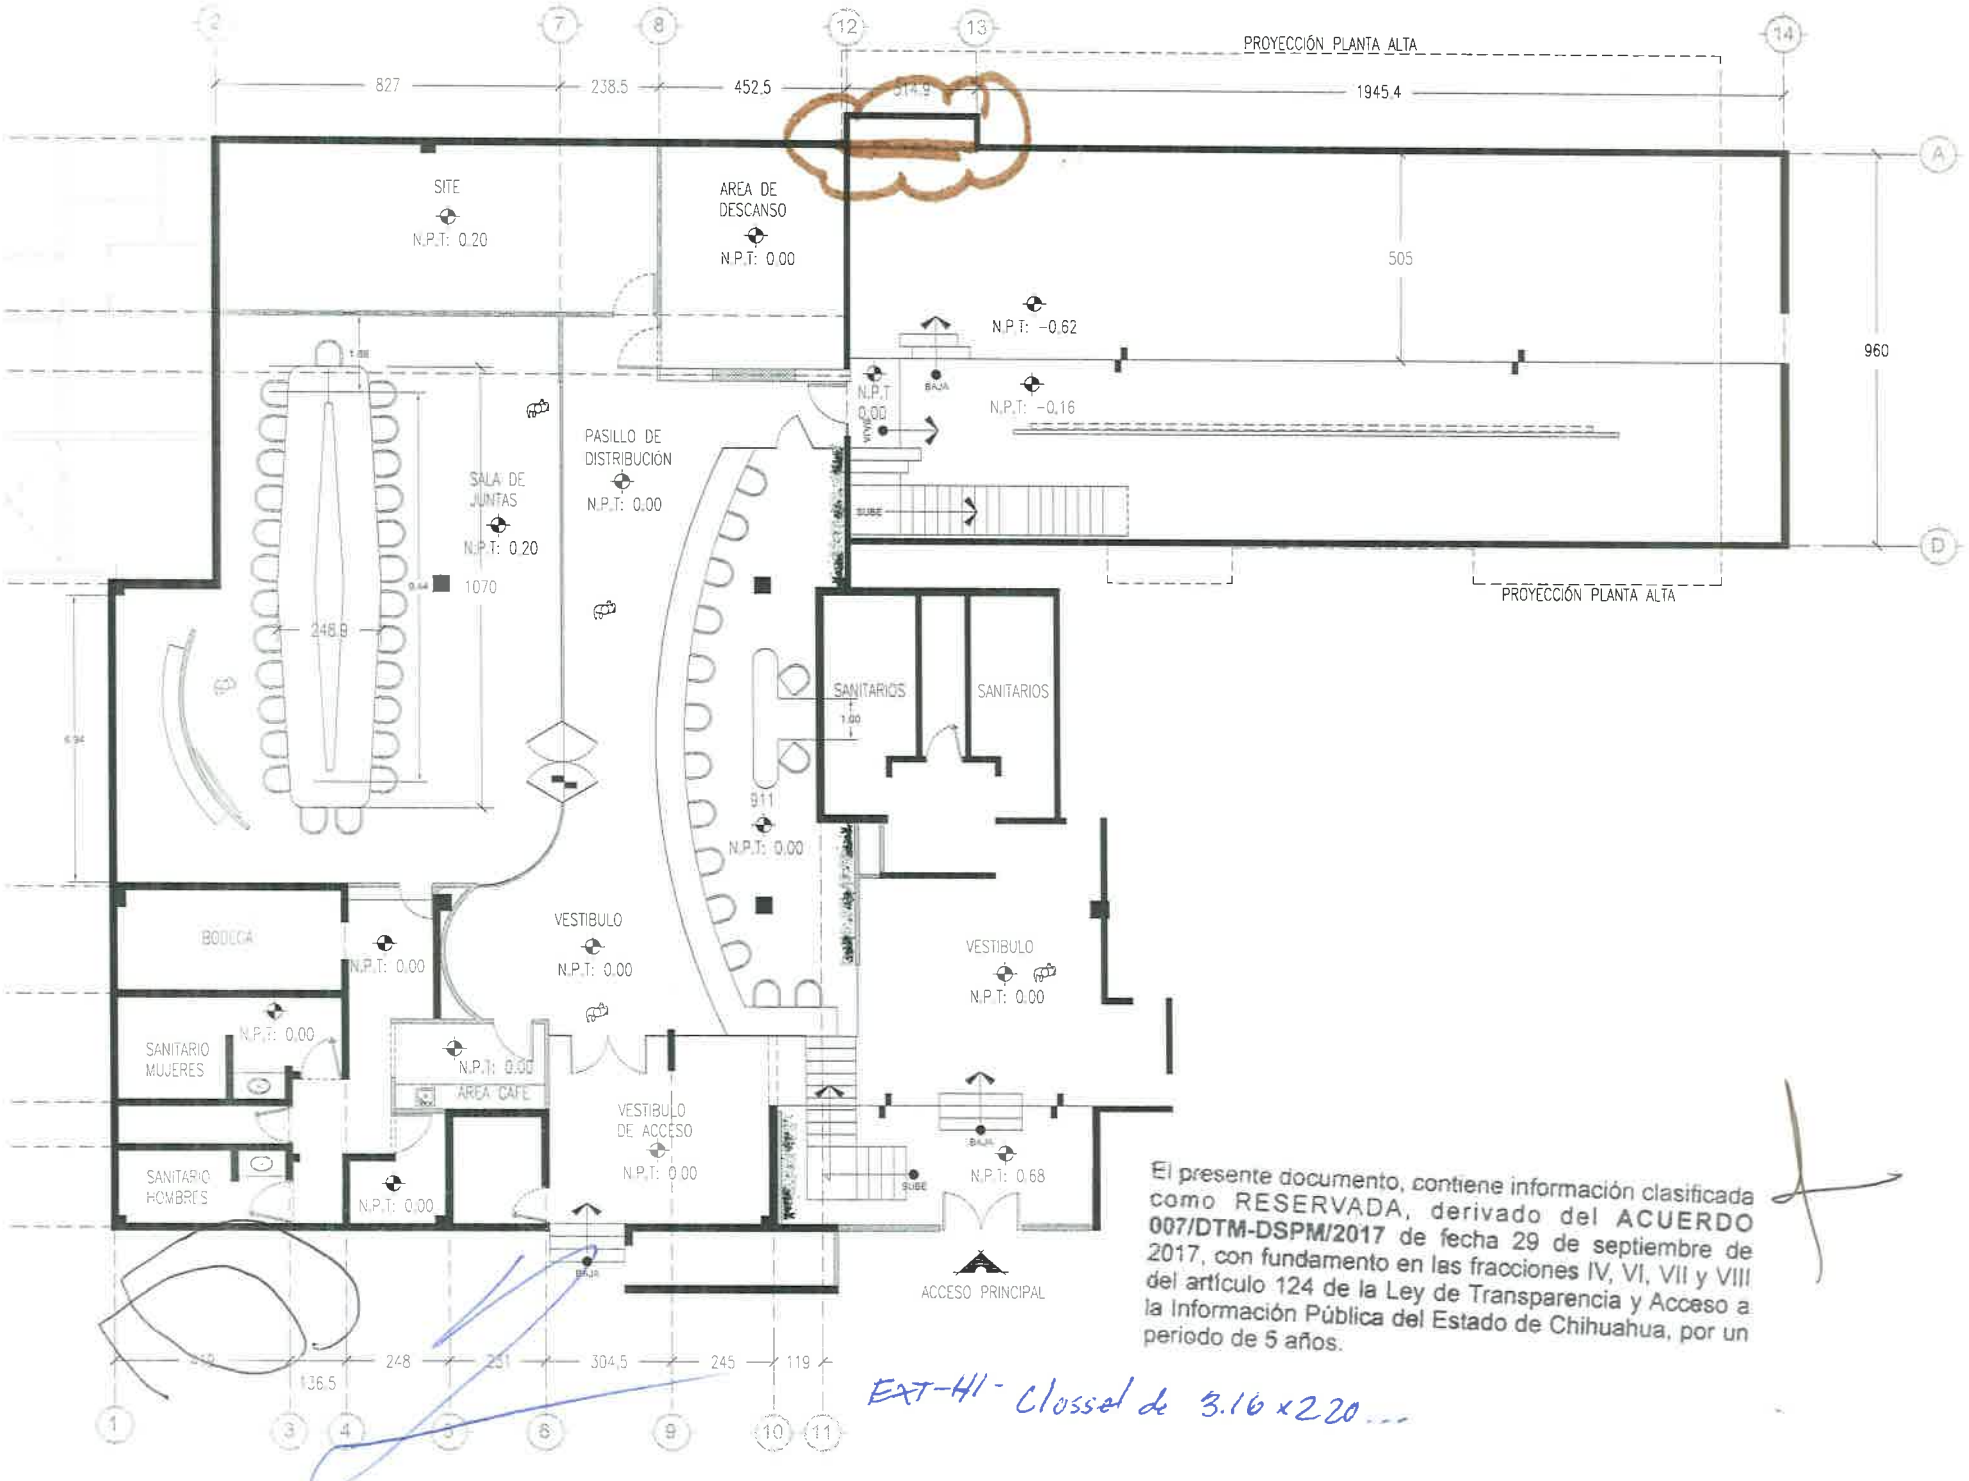

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO **007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-H1 - Closet de 3.16 x 2.20 ...

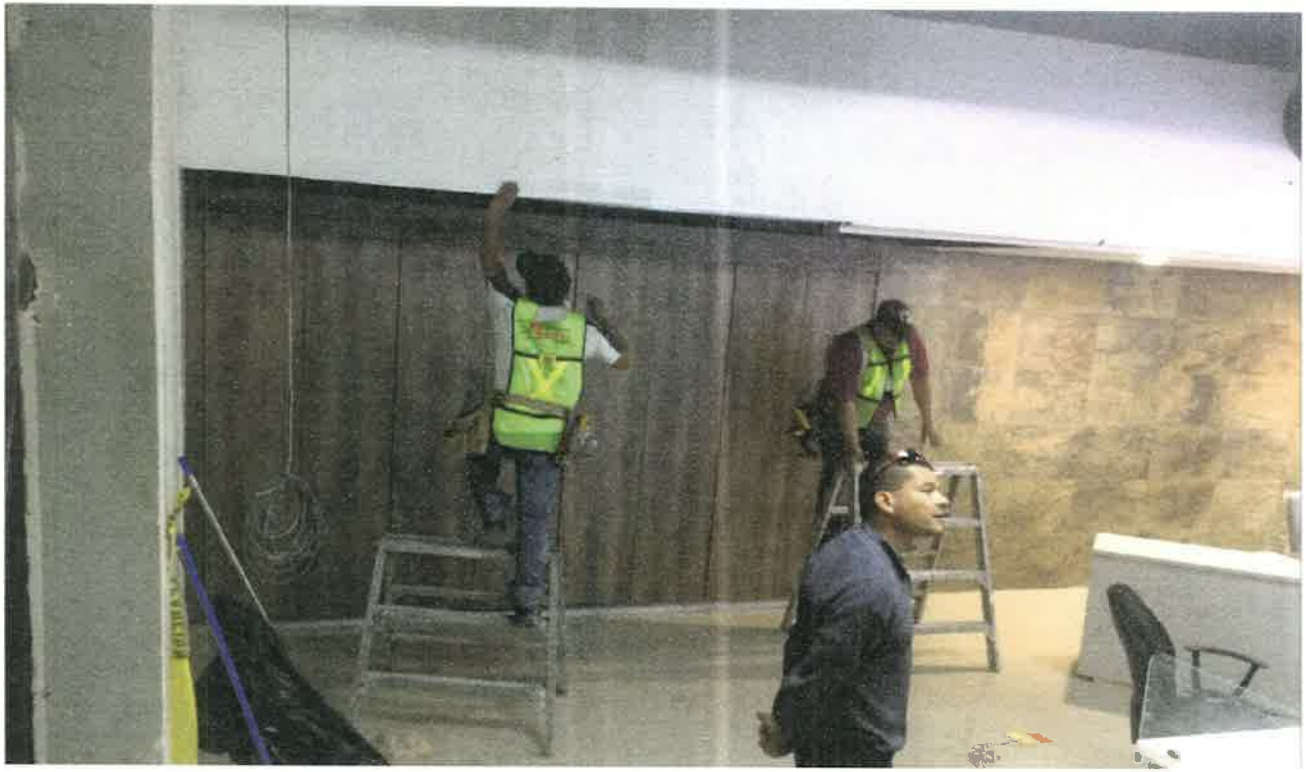

EXT- 41

Closet de 3.16 x 2.20 para ocultar tableros eléctricos, fabricado con melamina, bisagras ocultas de la marca Blum y jaladeras tubulares. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-42					
Suministro y colocación de Porta papel marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		4.00	4.00		
		TOTAL	**4.00**		**4.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

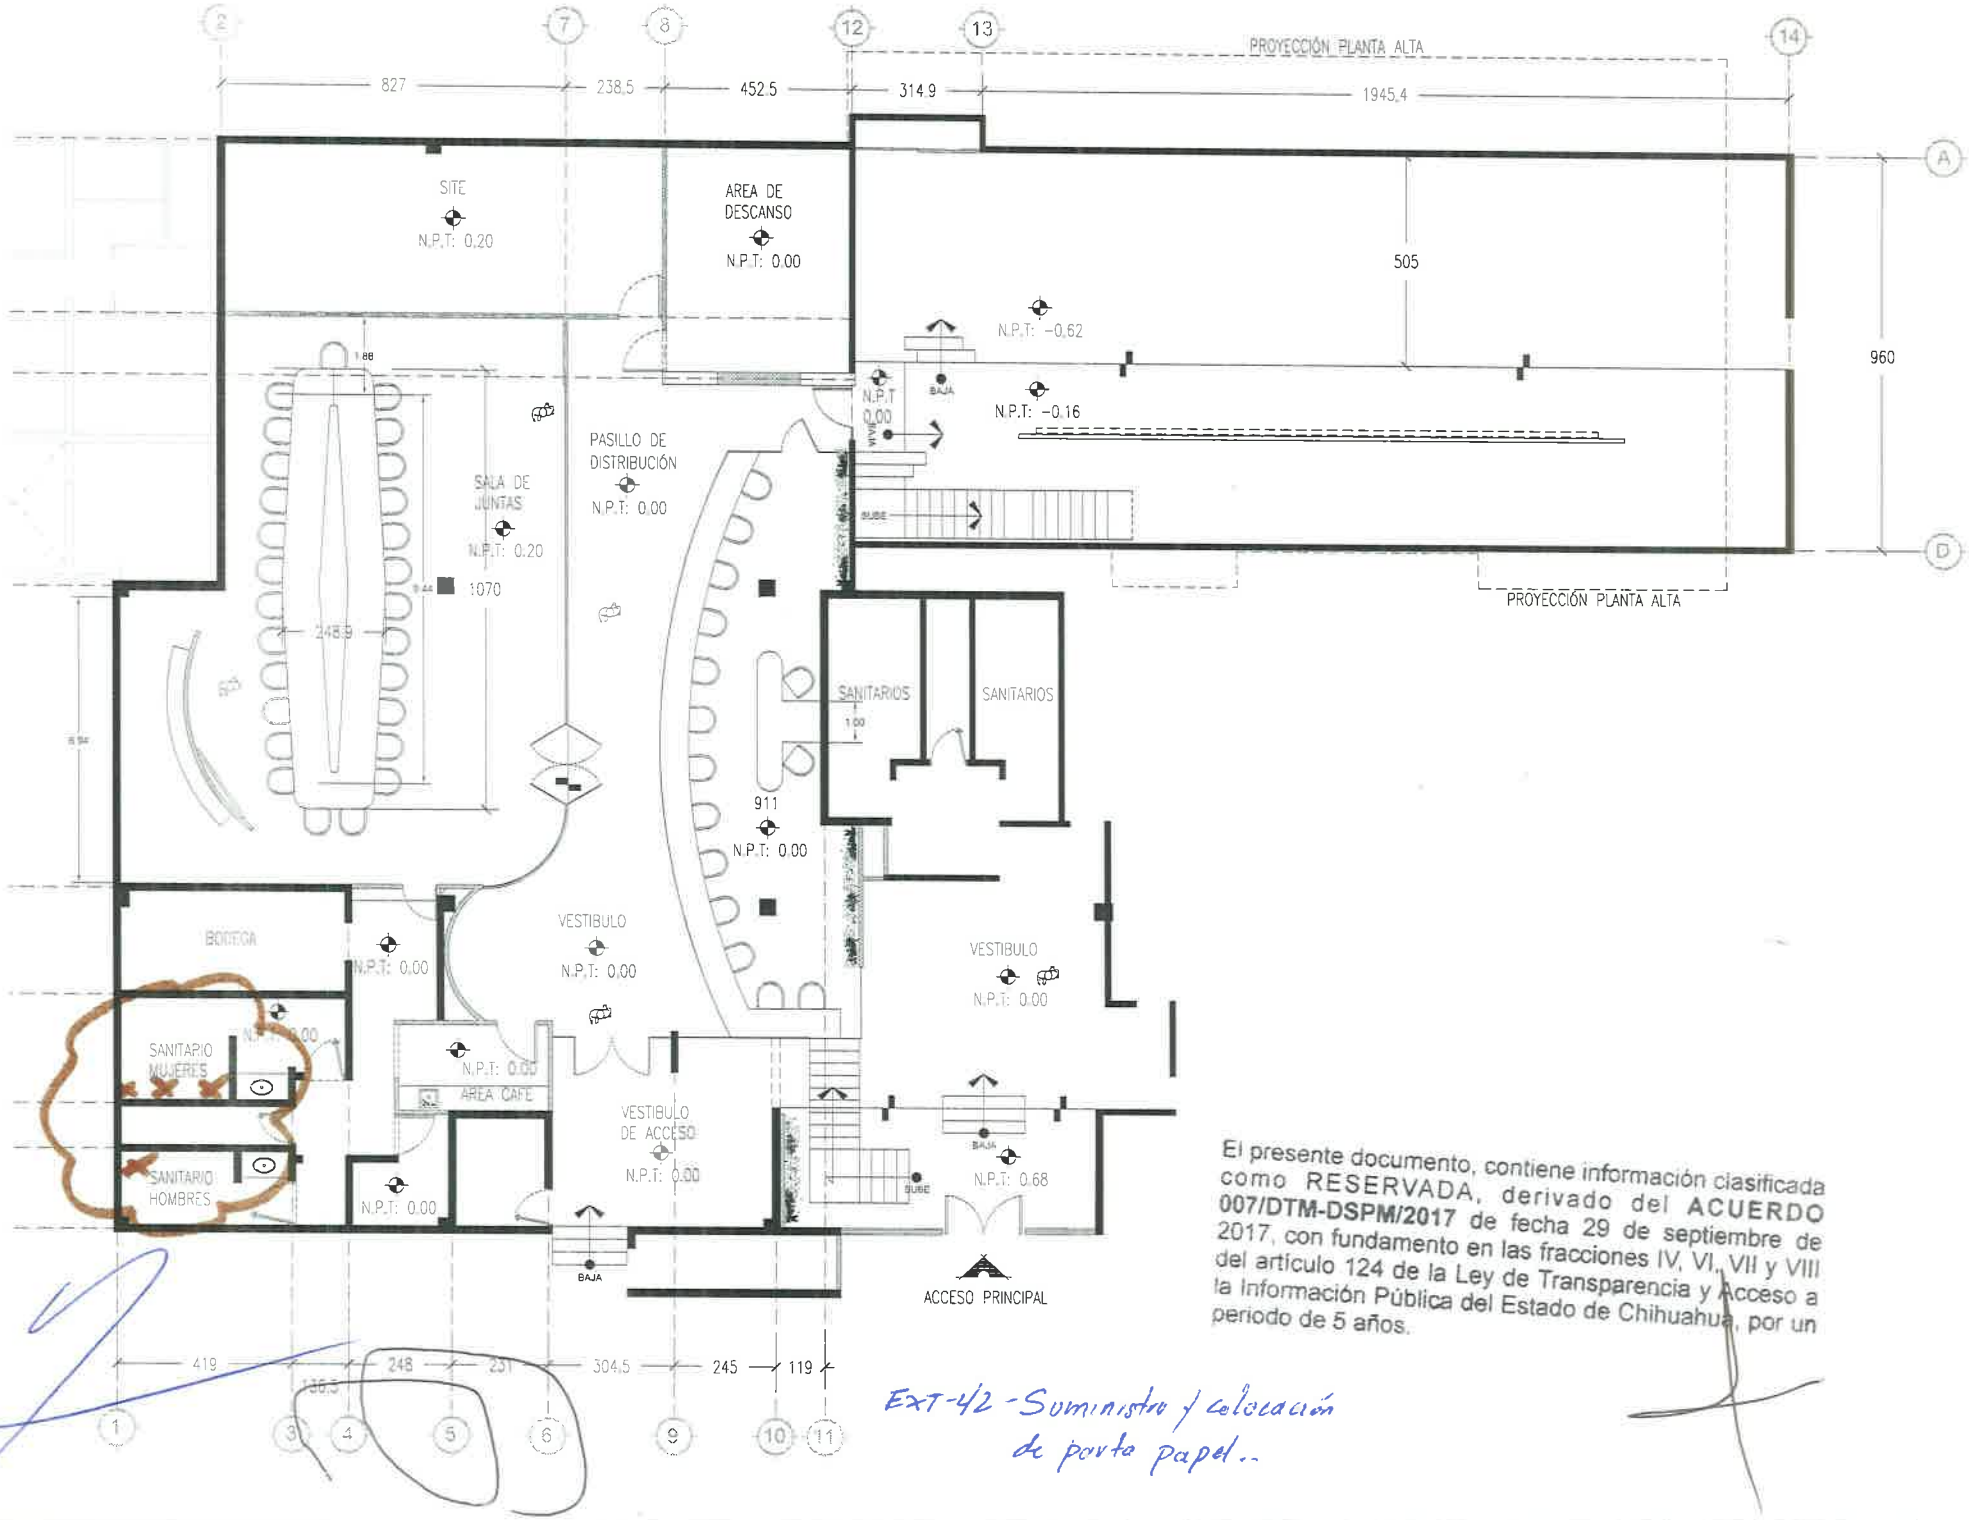

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-42 - Suministro y colocación de porta papel..



EXT- 42 Suministro y colocación de Porta papel marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-43						
Suministro y colocación de dispensador de jabón marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución		**Pieza**	**Total**			**2.00**
		2.00	2.00			
		TOTAL	**2.00**			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

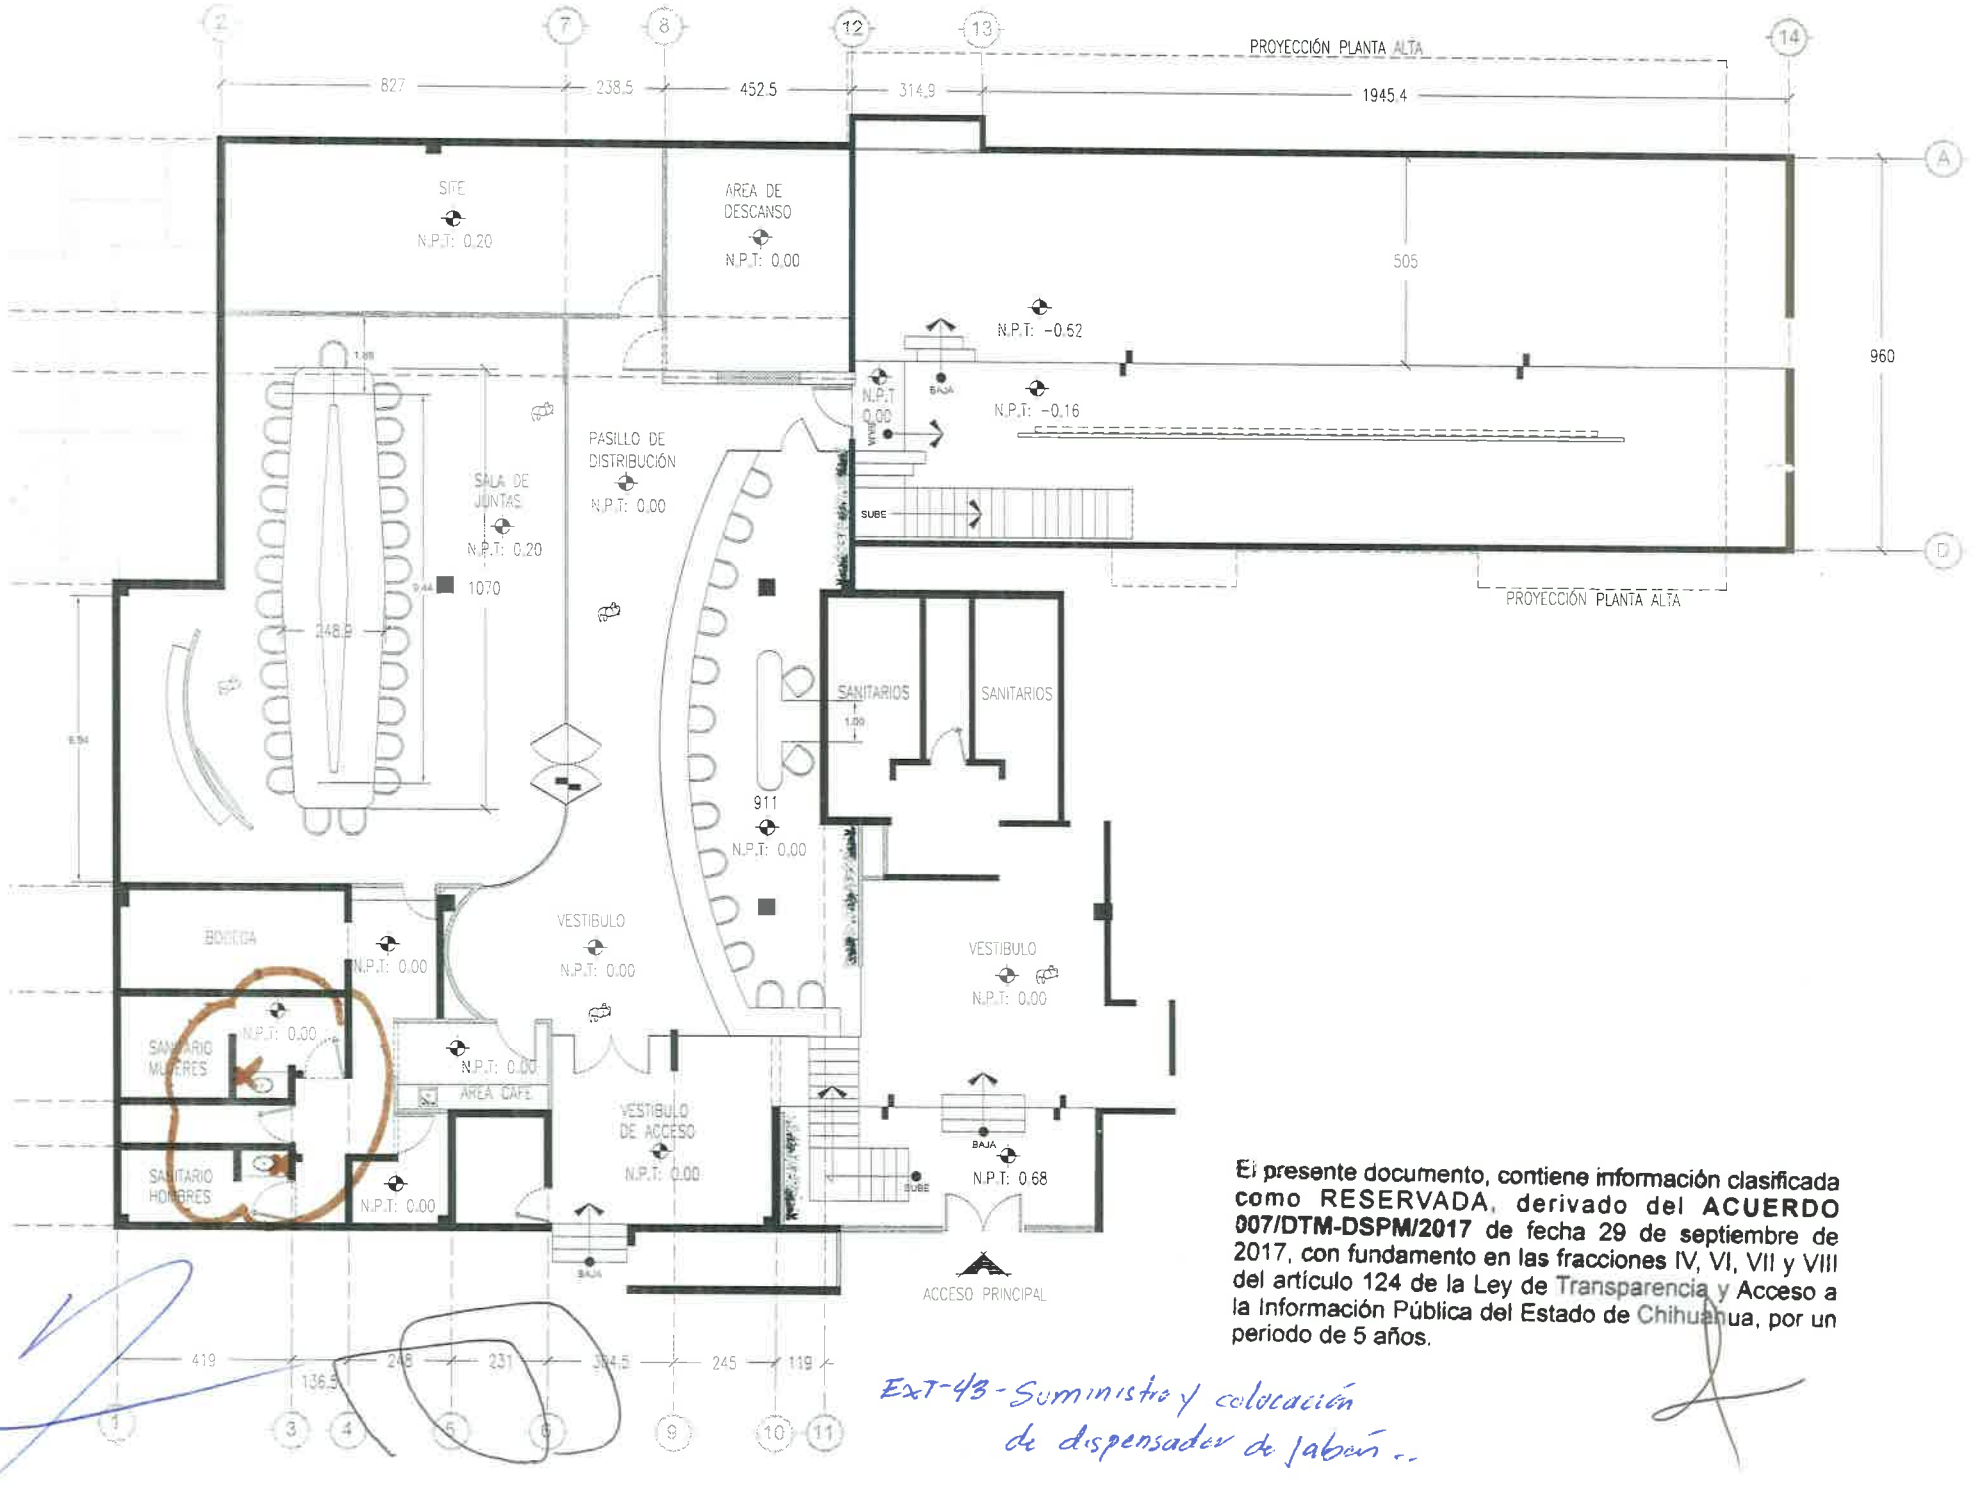

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ext-43 - Suministro y colocación de dispensador de jabón..

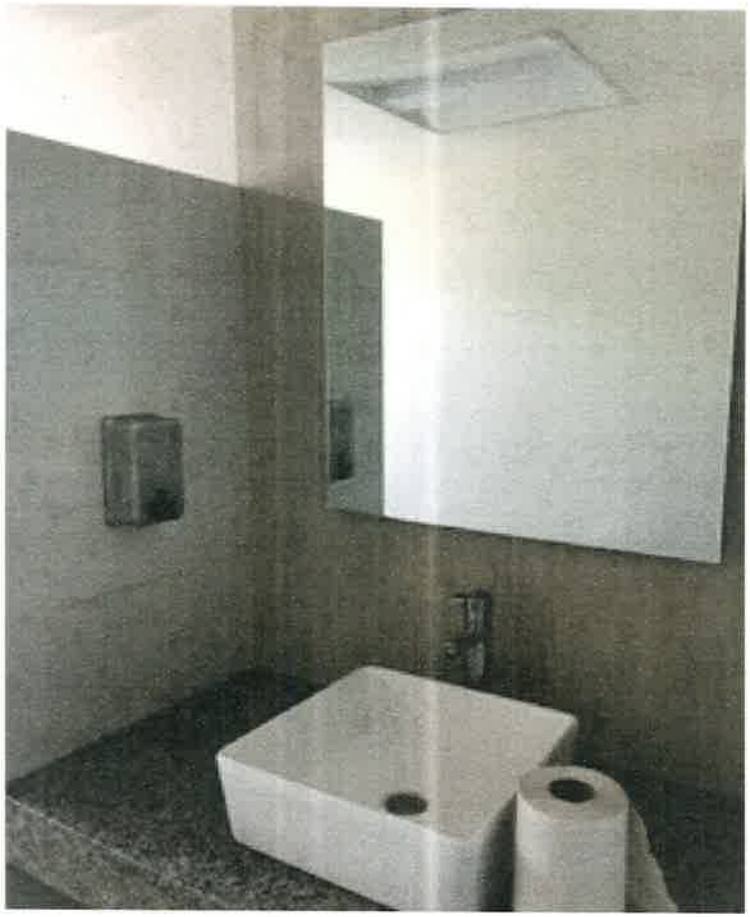

EXT- 43 Suministro y colocación de dispensador de jabón marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-44						
Suministro y colocación de Porta toallas marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		2.00	2.00			
		TOTAL	**2.00**			**2.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

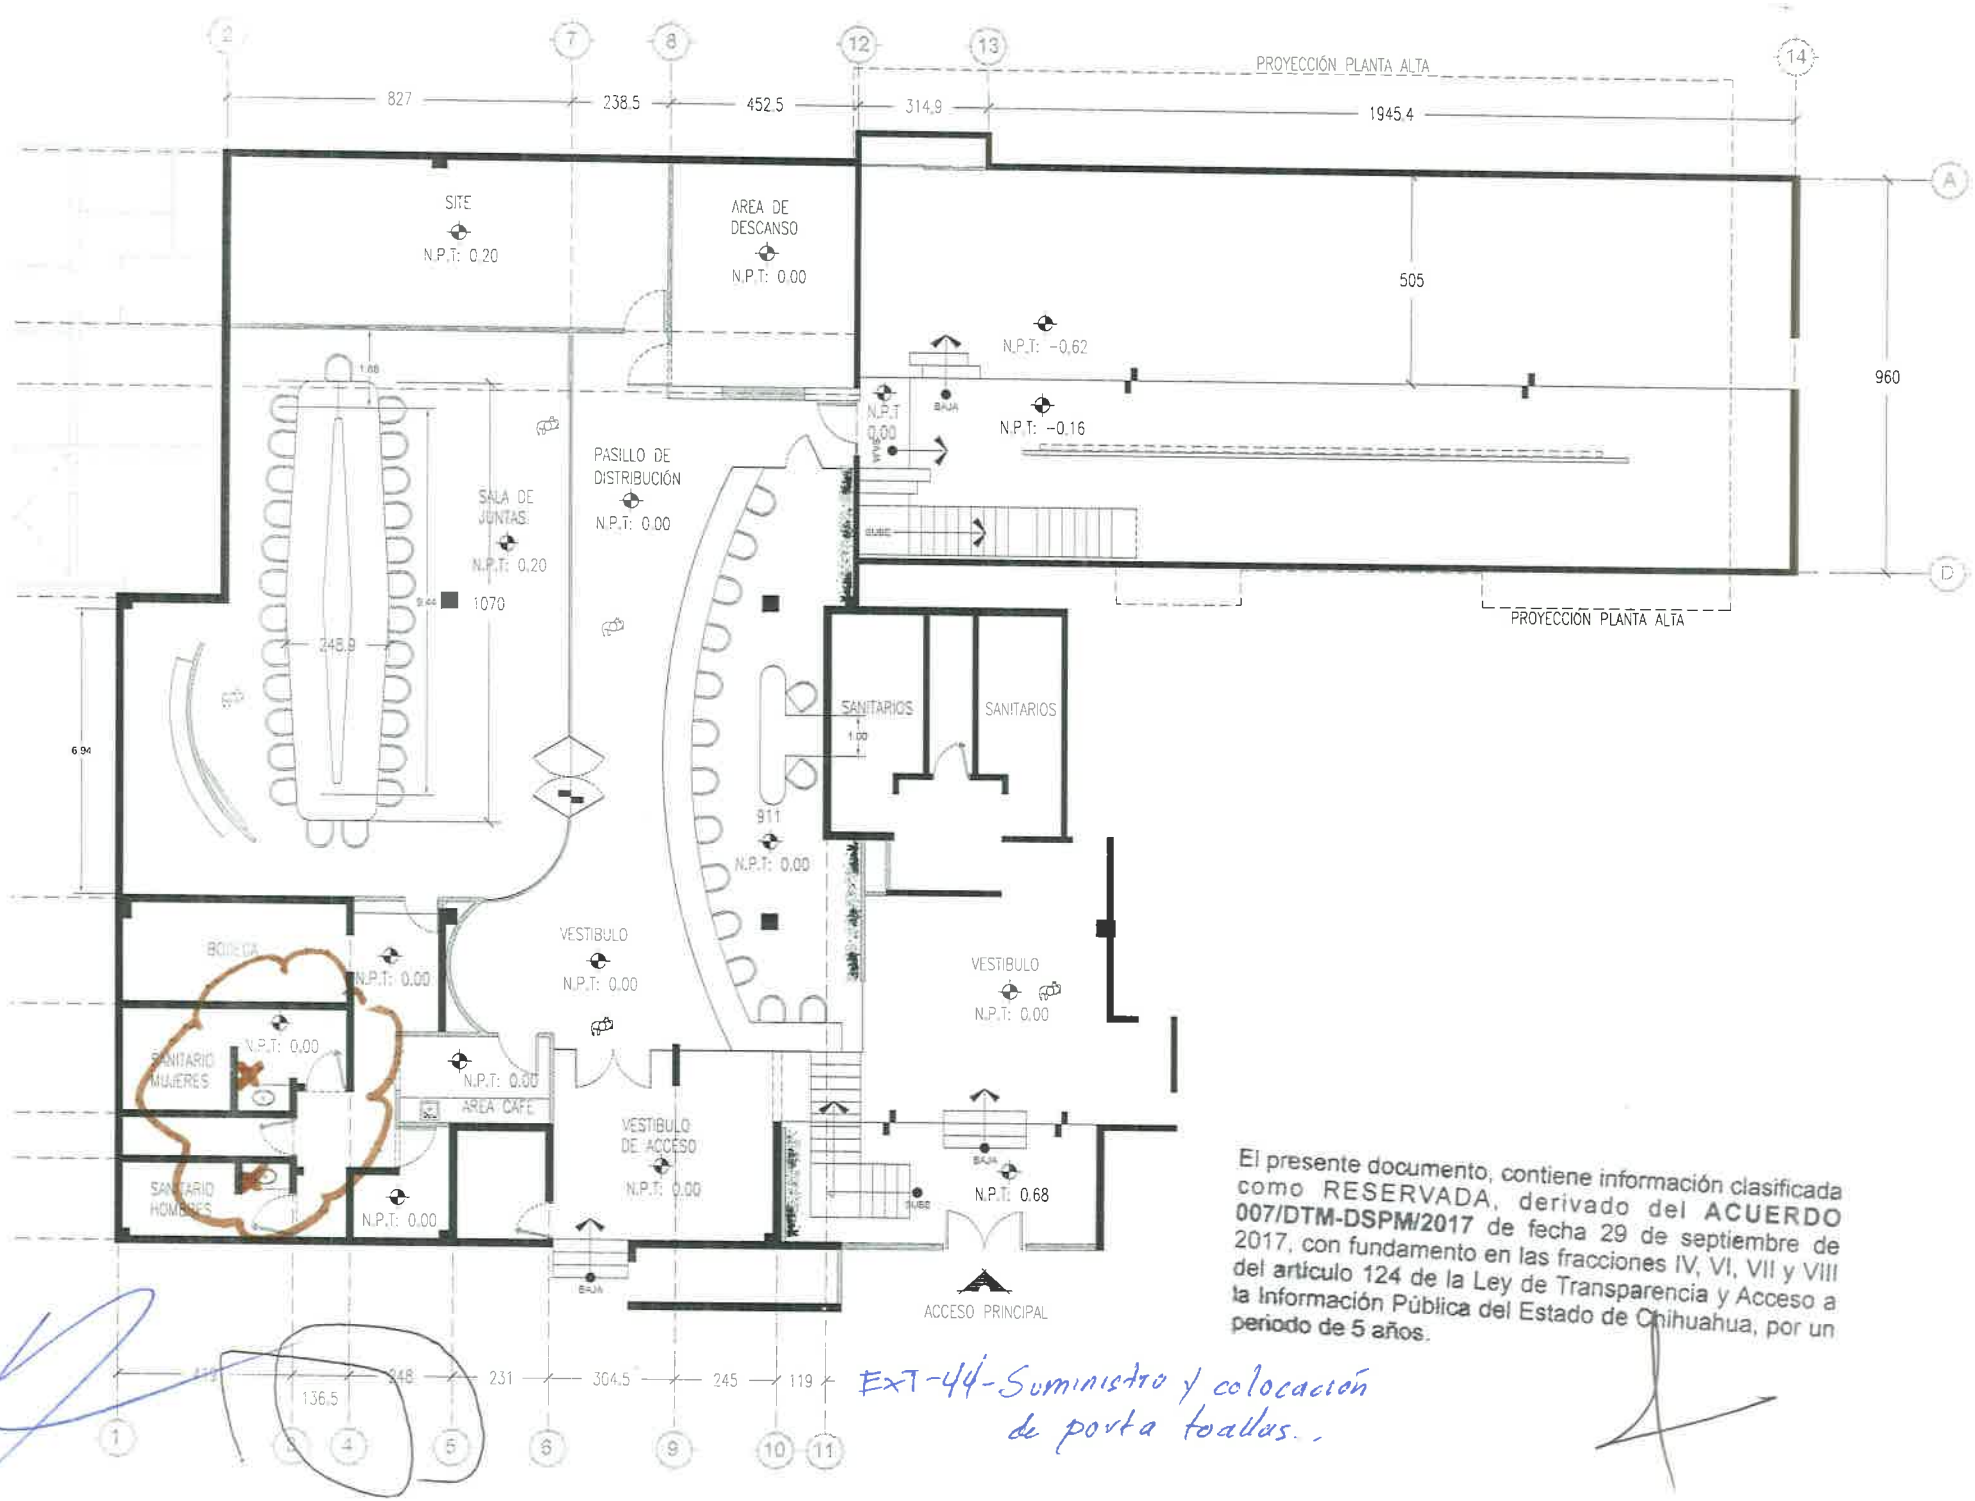

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un **periodo de 5 años.**

Ext-44-Suministro y colocación de porta toallas.



EXT- 44 Suministro y colocación de Porta toallas marca Andara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-45					
Refuerzo en losa de sala de juntas-pasillo-área 911 a base de armadura de PER de 3" x 3" de 6.76 x 0.60 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
	TOTAL		**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

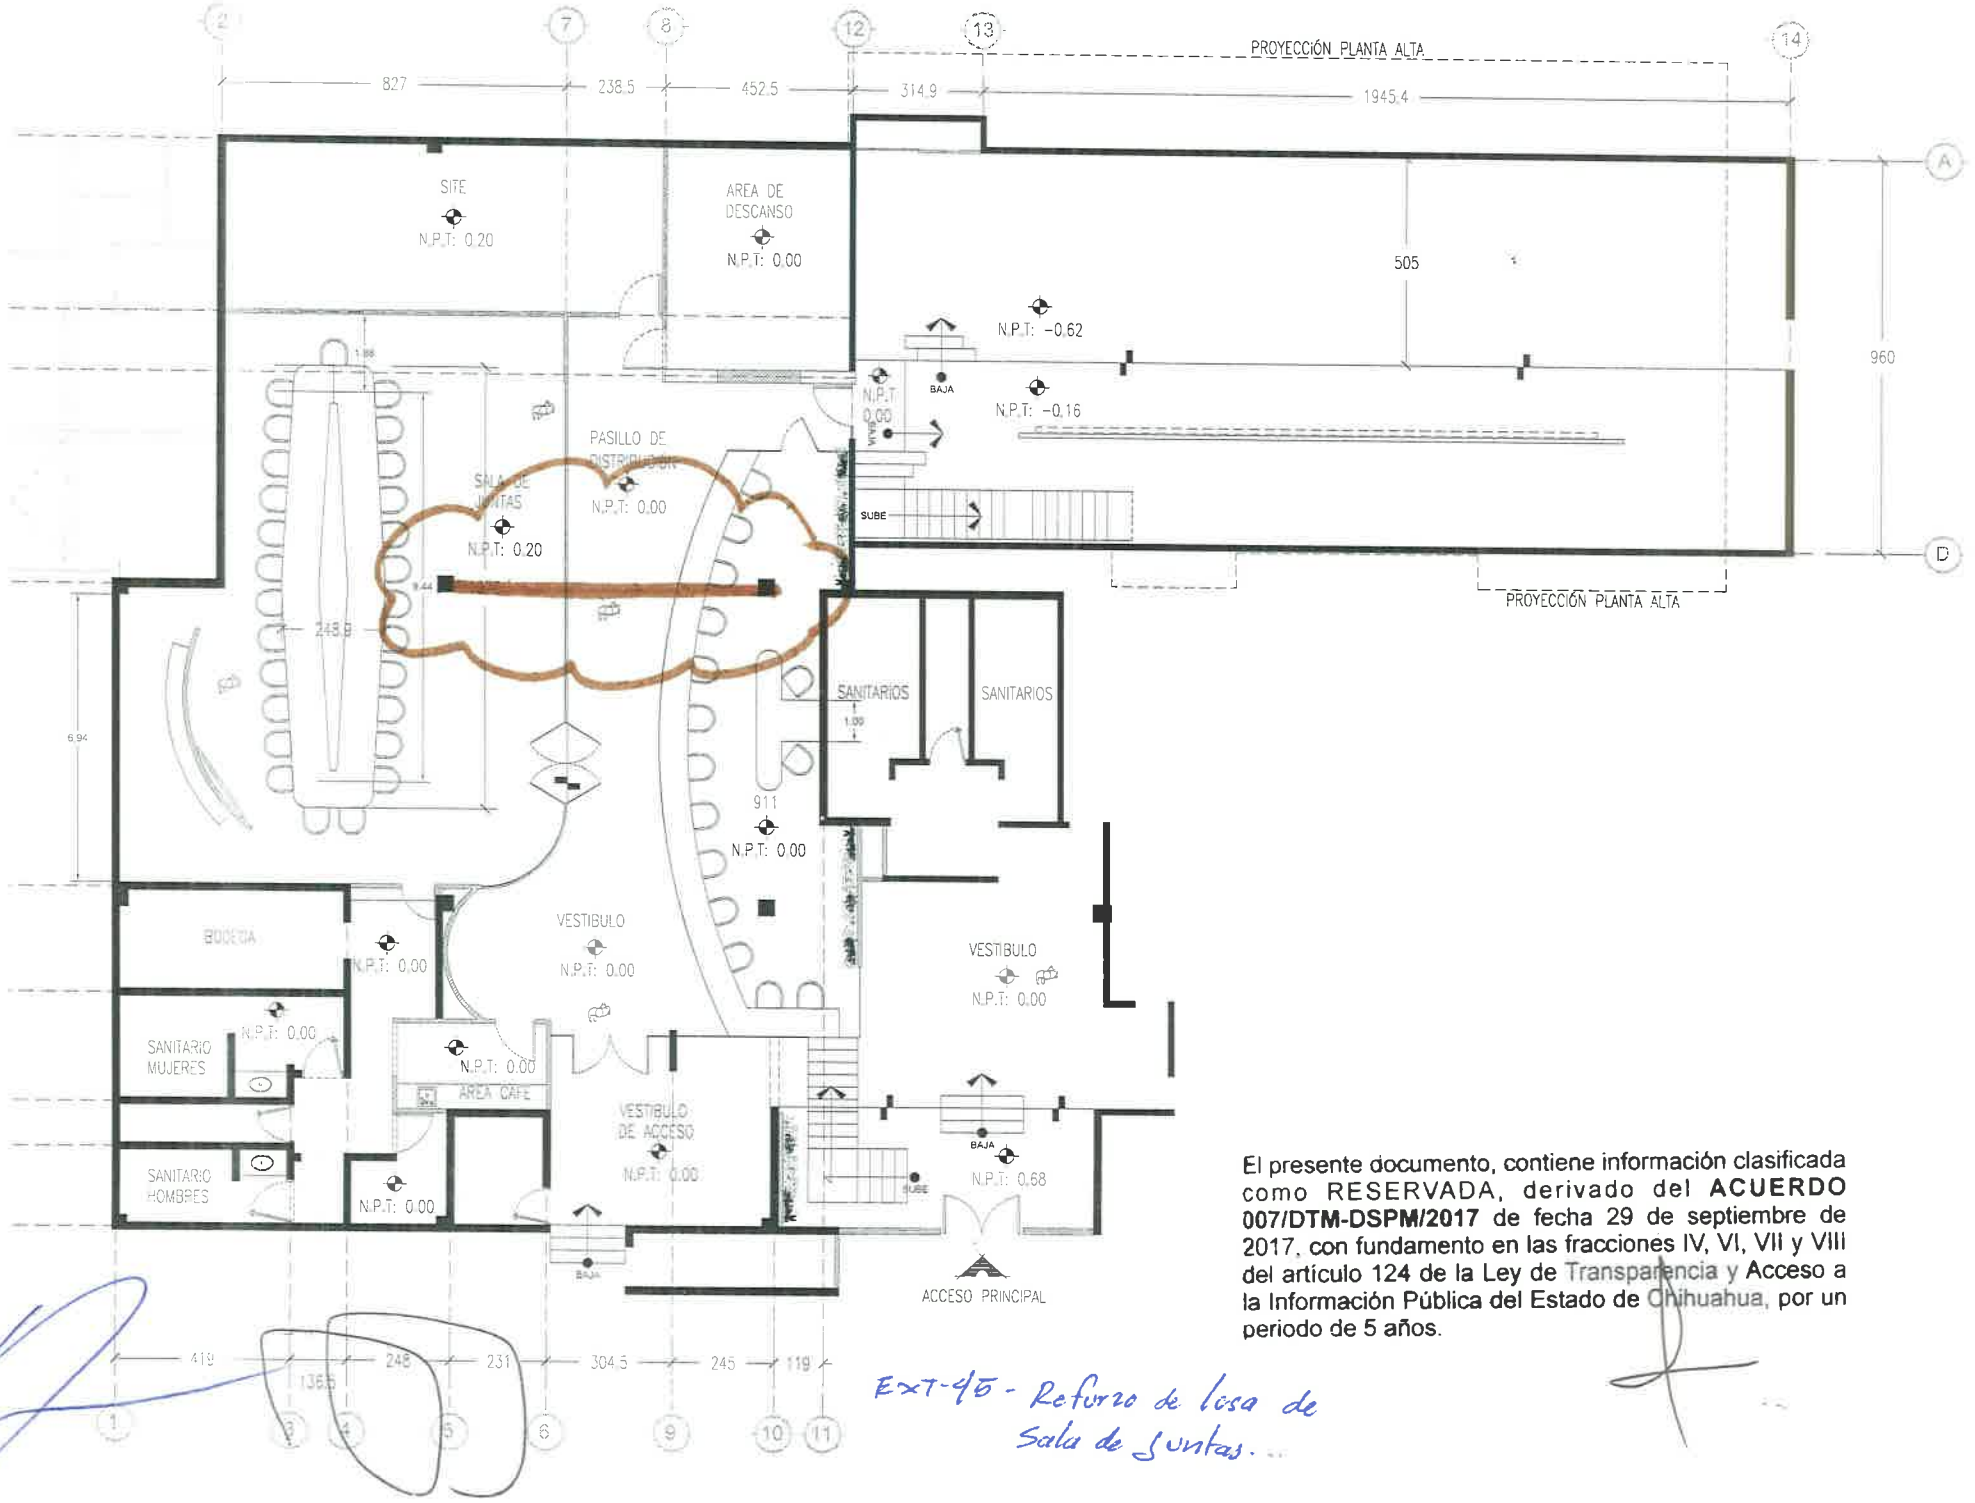

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ext-45 - Refuerzo de losa de Sala de Juntas...

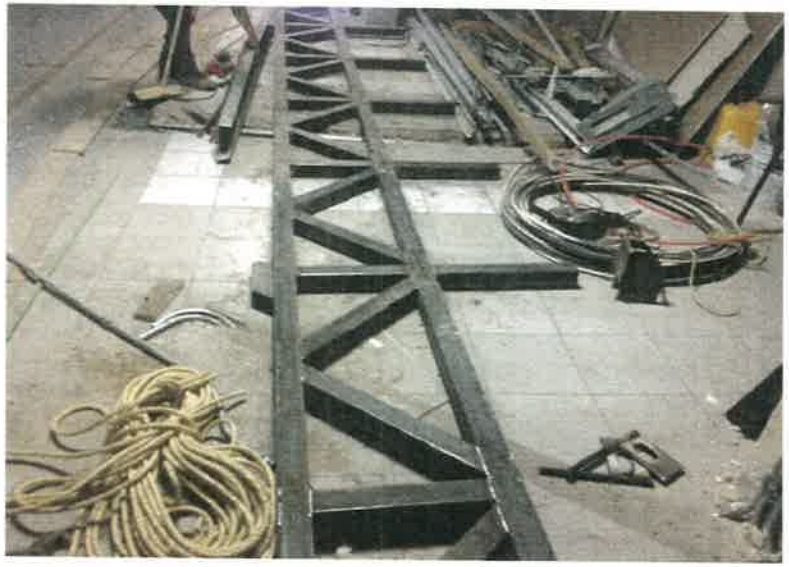



EXT- 45

Refuerzo en losa de sala de juntas-pasillo-área 911 a base de armadura de PER de 3" x 3" de 6.76 x 0.60 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-46					
Demolición de escalera de concreto de 1.40 x 1.10 mts., en área de ciberoperadores, sin recuperación de material, por medios manuales. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		**1.00**
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

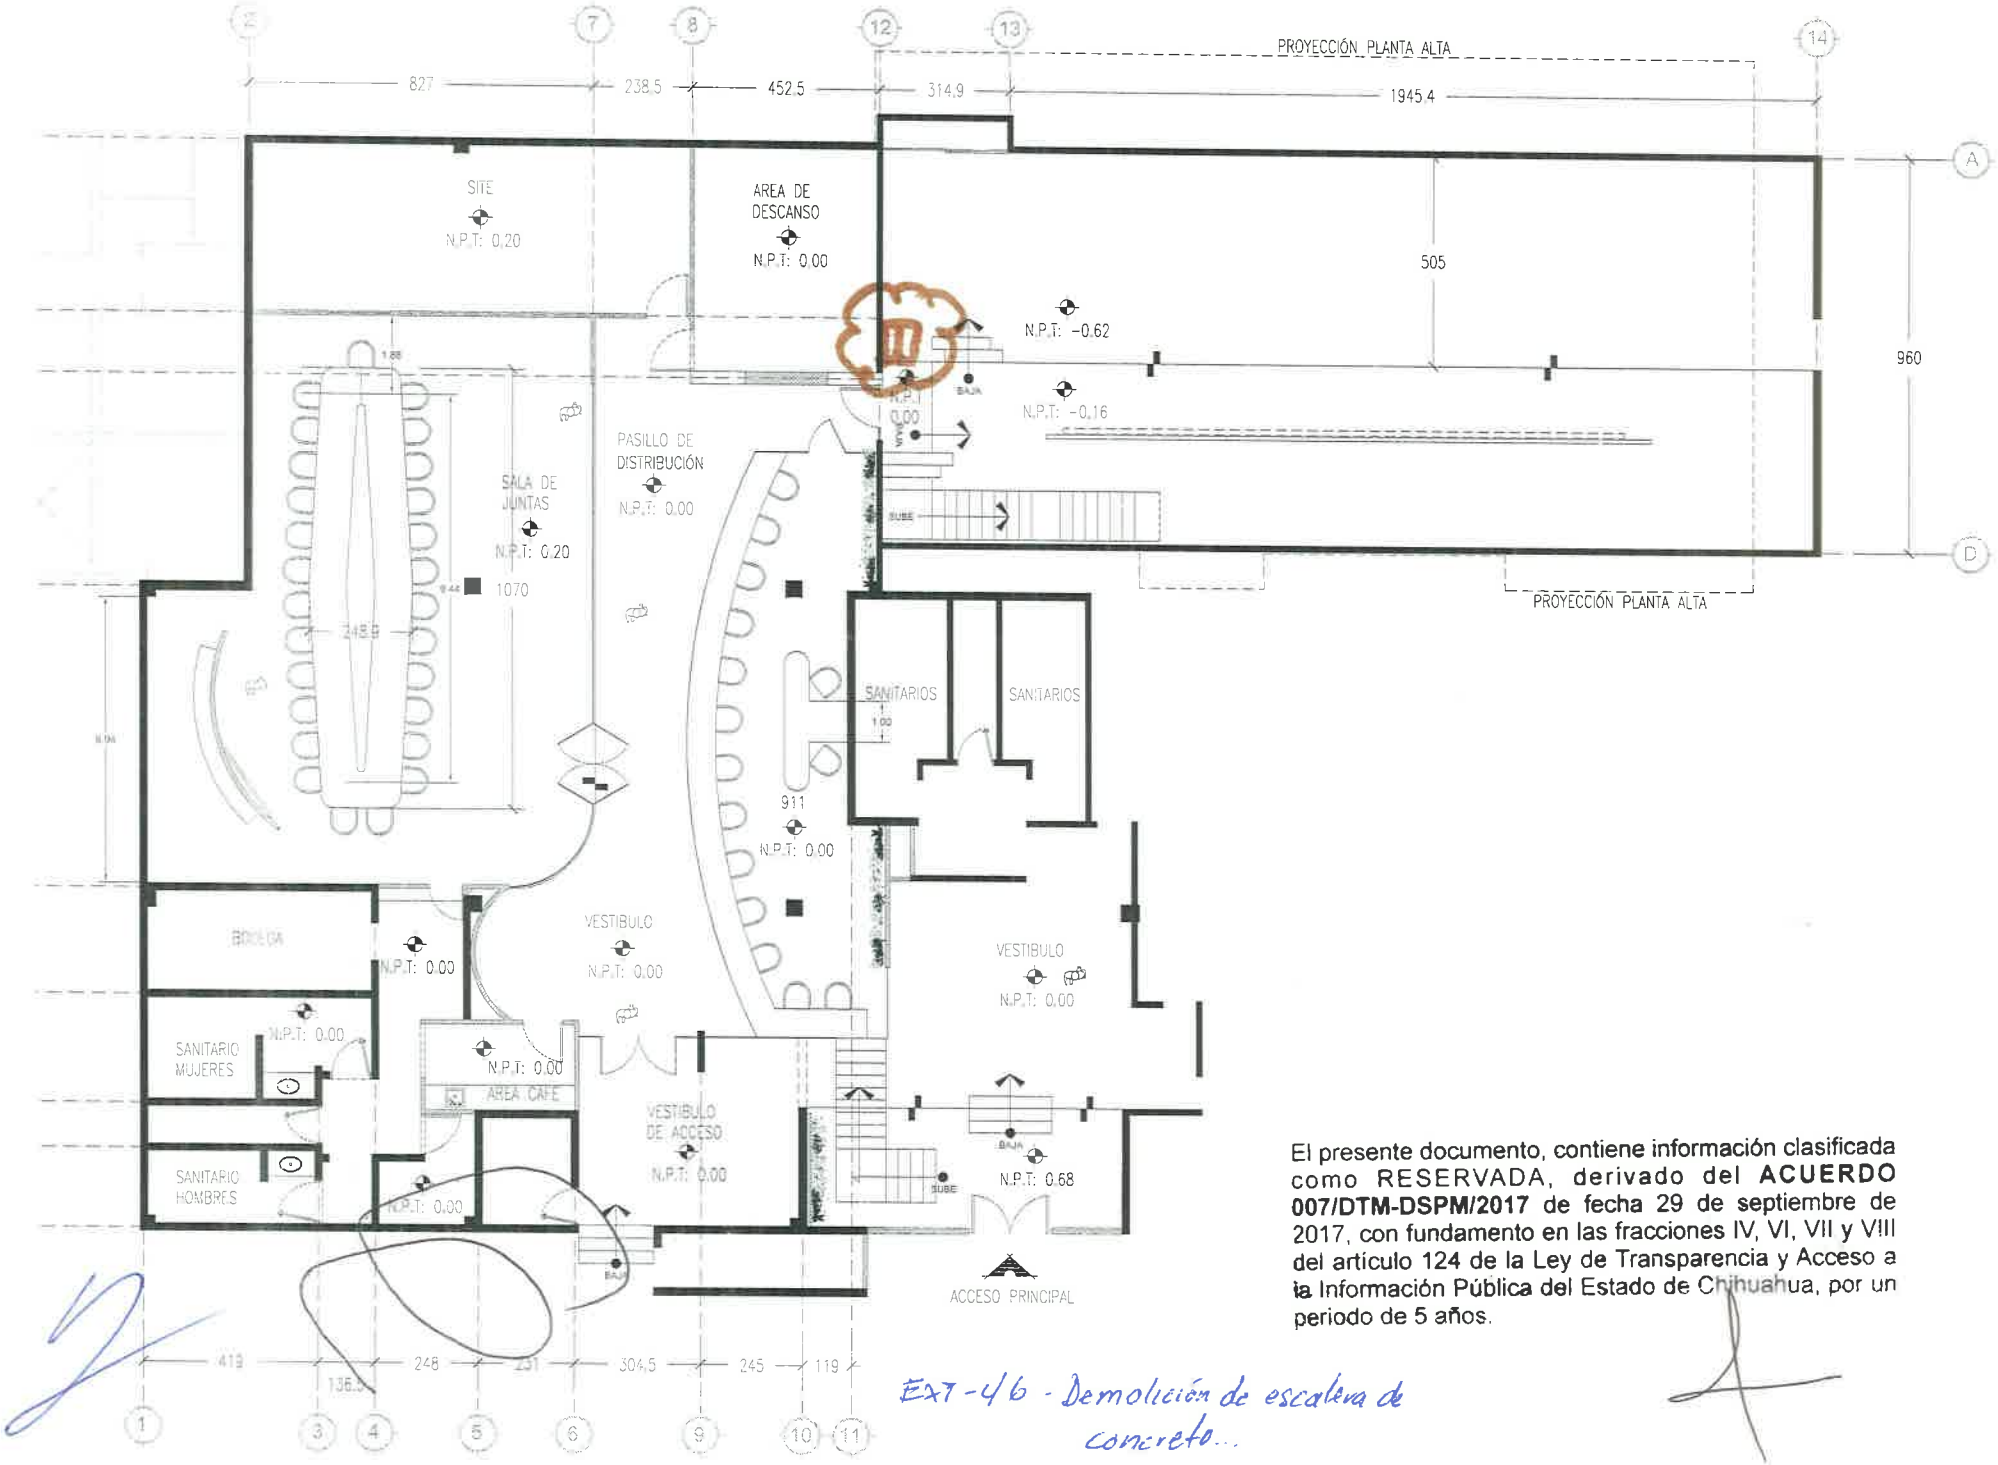

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-46 - Demolición de escalera de concreto...



EXT- 46

Demolición de escalera de concreto de 1.40 x 1.10 mts., en área de ciberoperadores, sin recuperación de material, por medios manuales. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-47						
Demolición de lambrin de cerámica en acceso principal (trabajando con gente de oficinas de la comandancia norte) en parte superior de cancel existente en ambas caras. Incluye retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		6.17	6.17			
		6.17	6.17			
		TOTAL	**12.34**			
						12.34

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

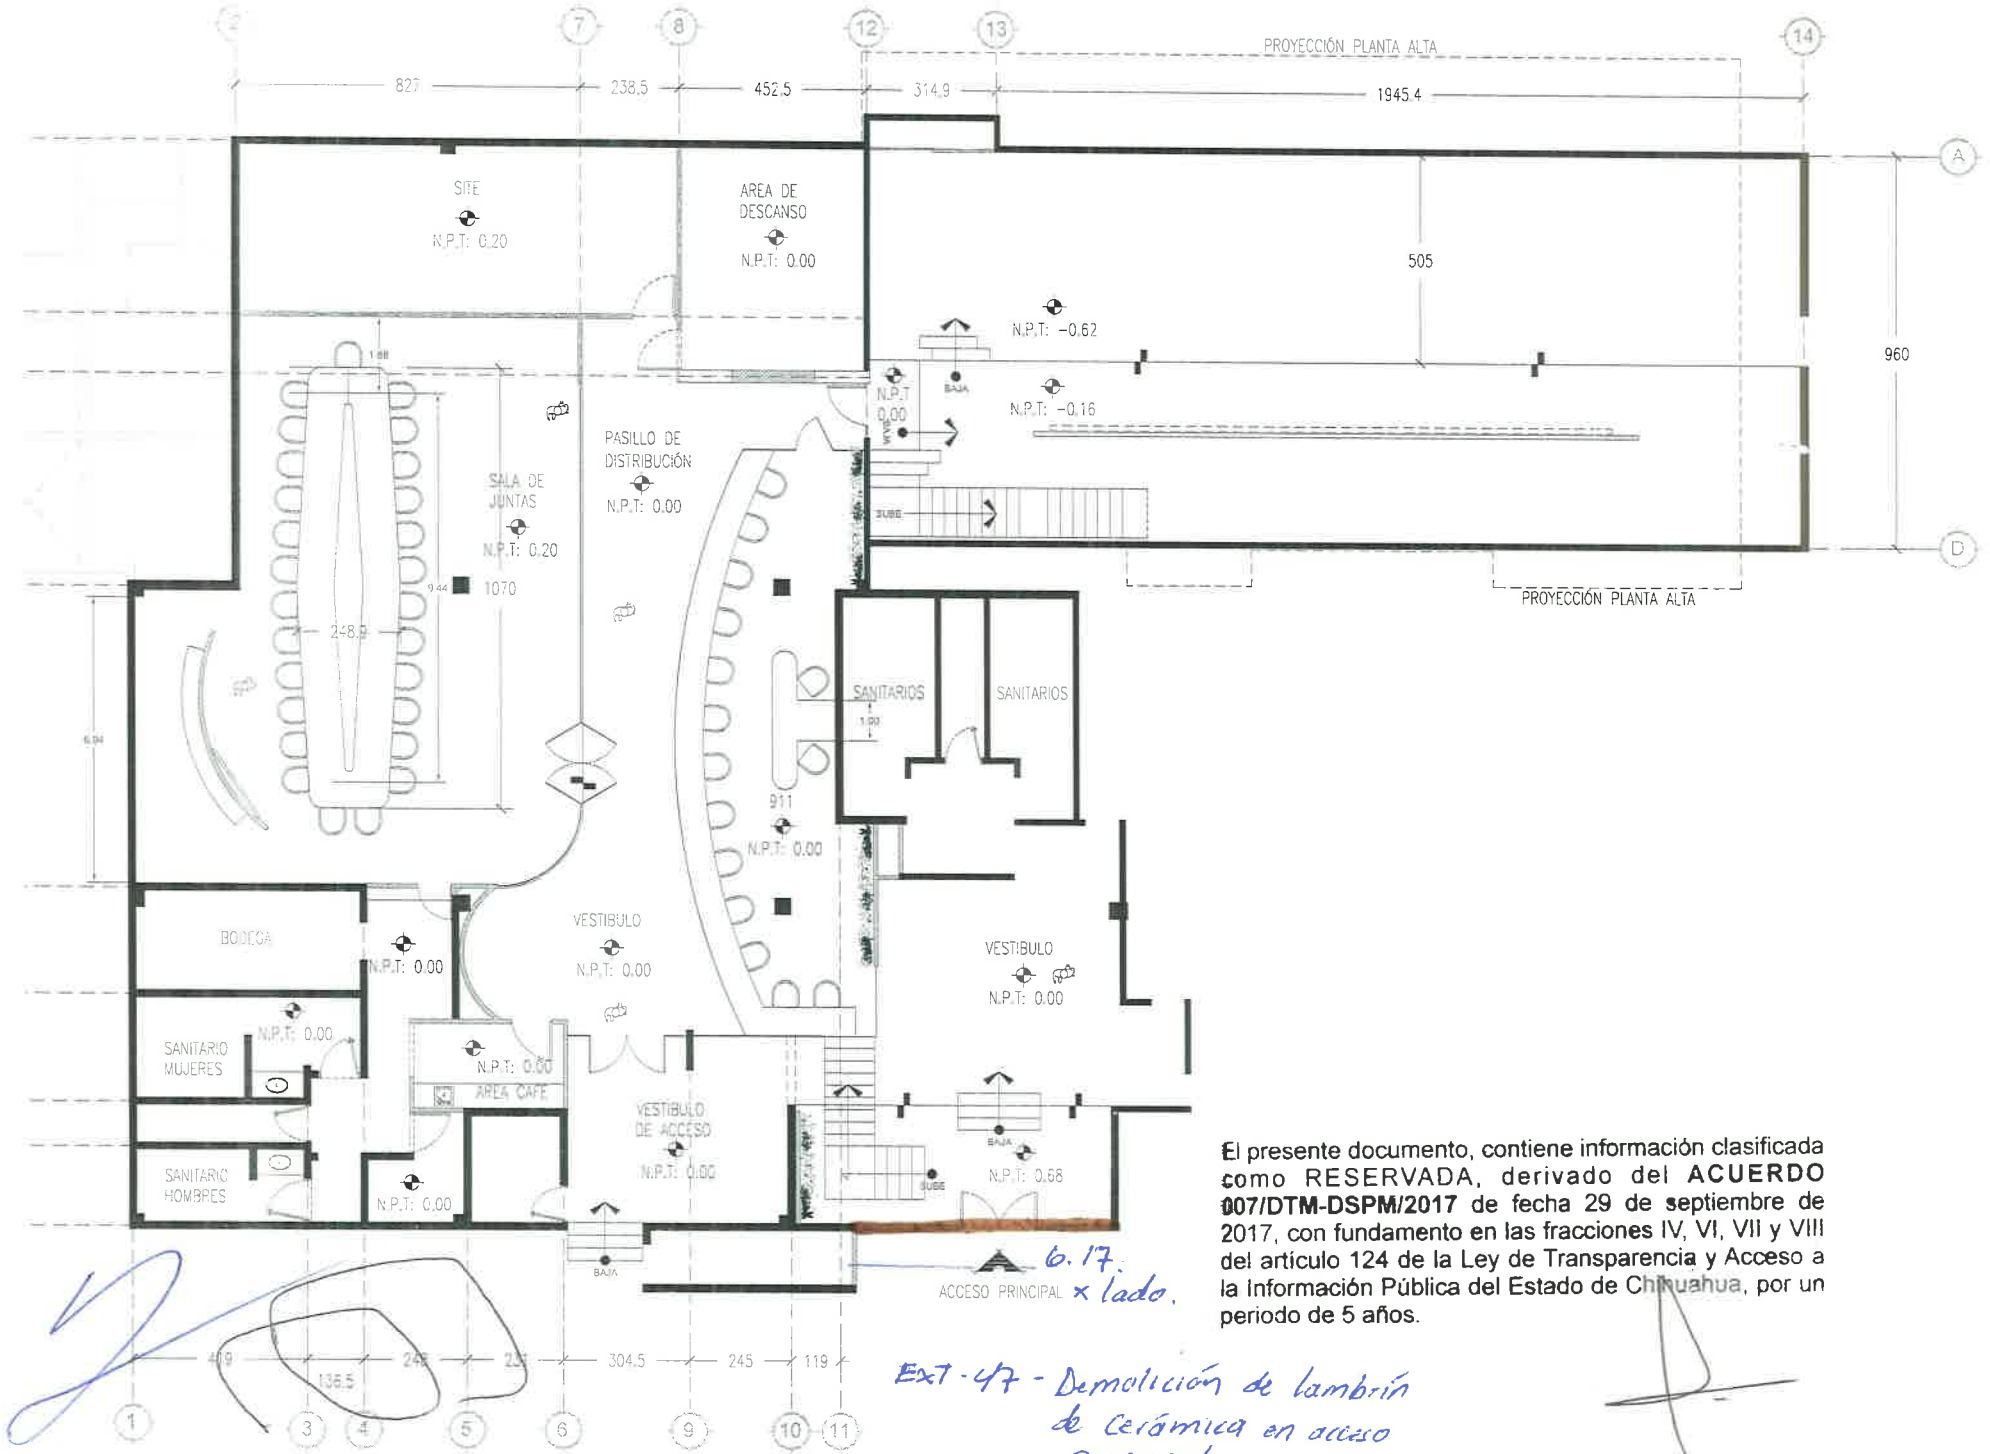

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

6.17. x lado.

EXT-47 - Demolición de lambrín de cerámica en acceso principal...





EXT- 47

Demolición de lambrin de cerámica en acceso principal (trabajando con gente de oficinas de la comandancia norte) en parte superior de cancel existente en ambas caras. Incluye retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-48						
Demolición dado de concreto en tejaban de 0.27 x 0.30 x 1.12 m. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**2.00**
			2.00			
		TOTAL	**2.00**			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

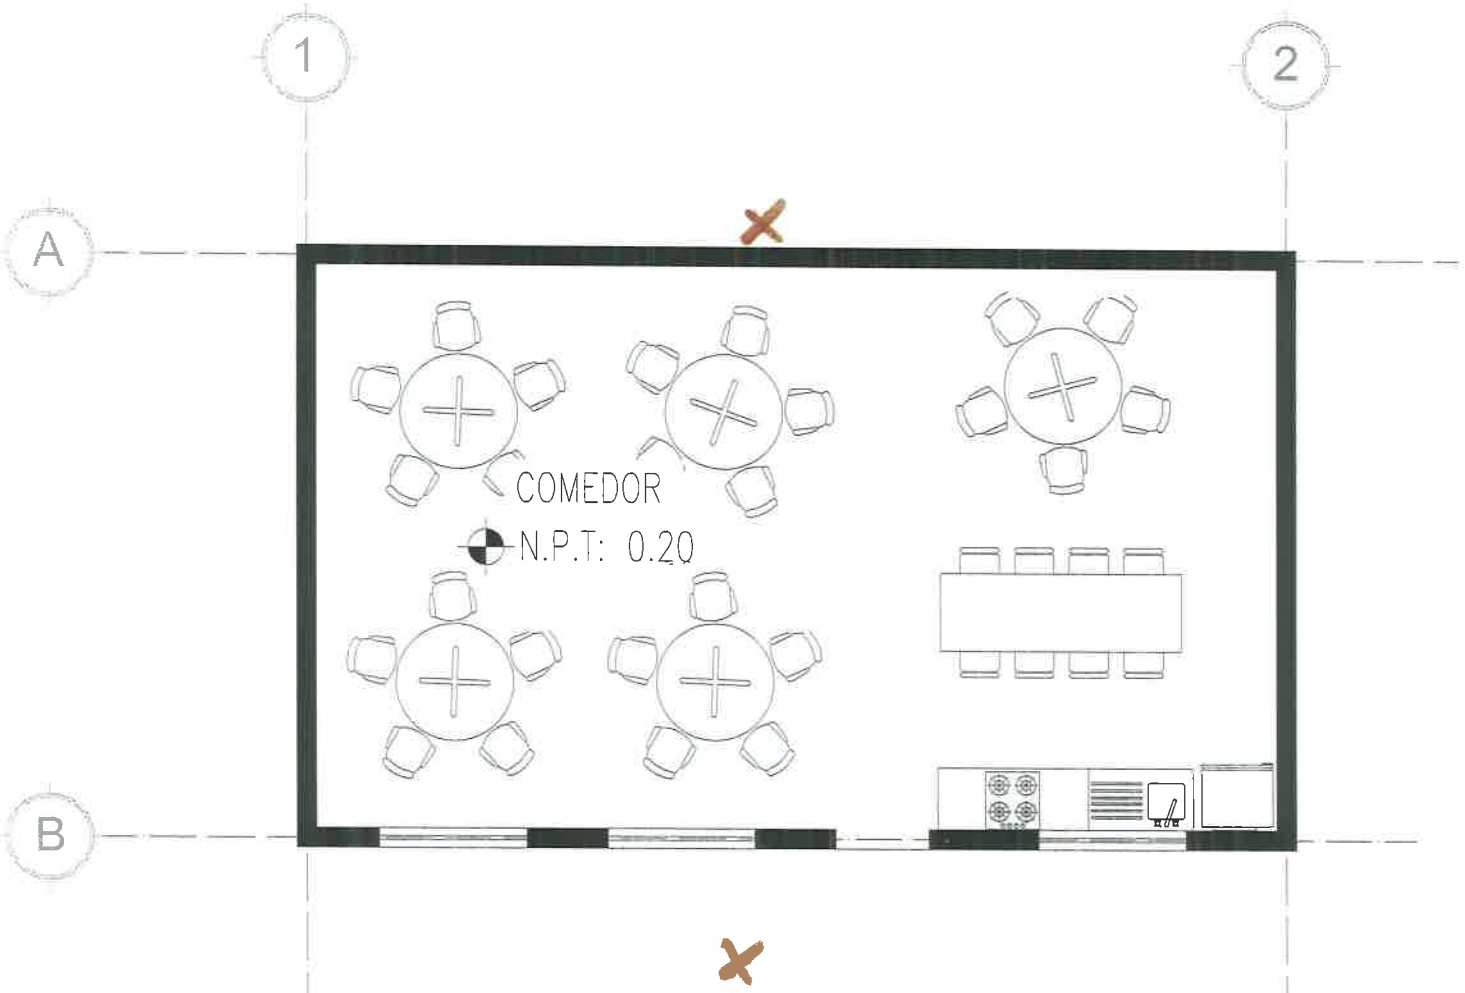

EXT-4/8 - Demolición dado de concreto en tejaban...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

4

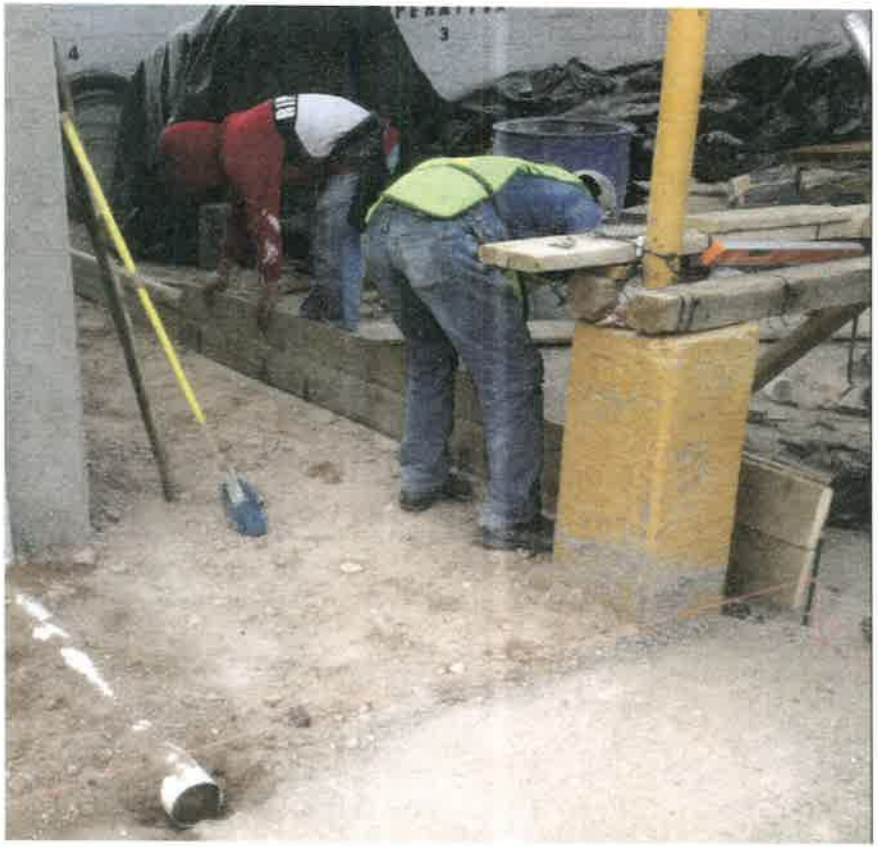

EXT- 48 Demolición dado de concreto en tejaban de 0.27 x 0.30 x 1.12 m. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-49					
Fabricación, suministro e instalación de tapas de alocubon de 0.10 x 0.30 m para monitores en mesa de sala de juntas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		13.00	13.00		
		TOTAL	**13.00**		**13.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

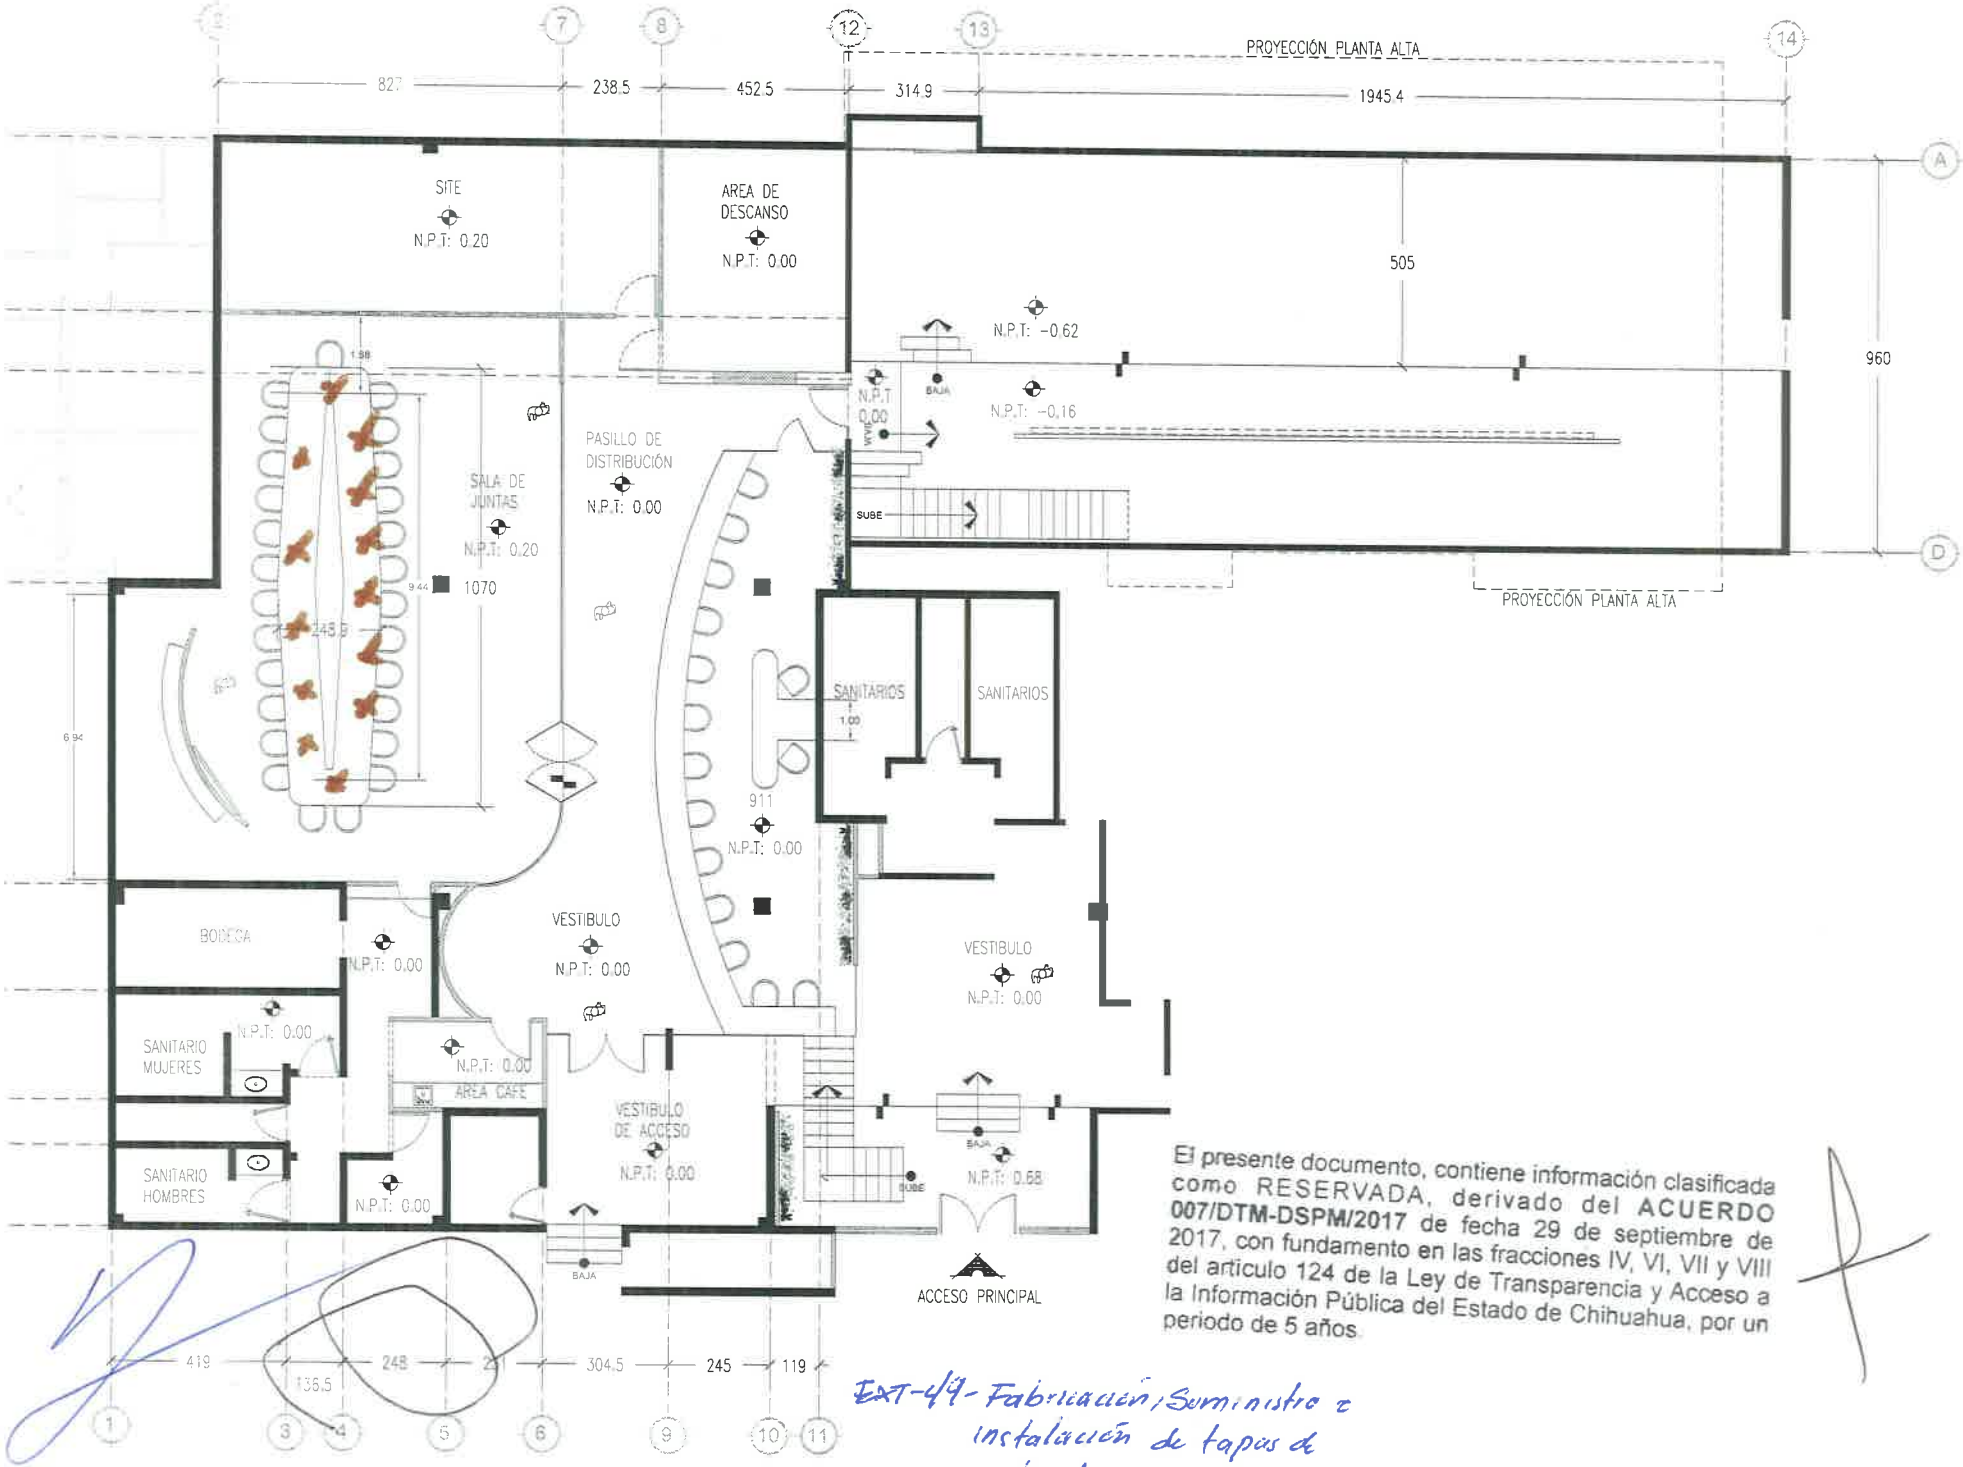

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-4/9- Fabricación, Suministro e instalación de tapas de alucobon..

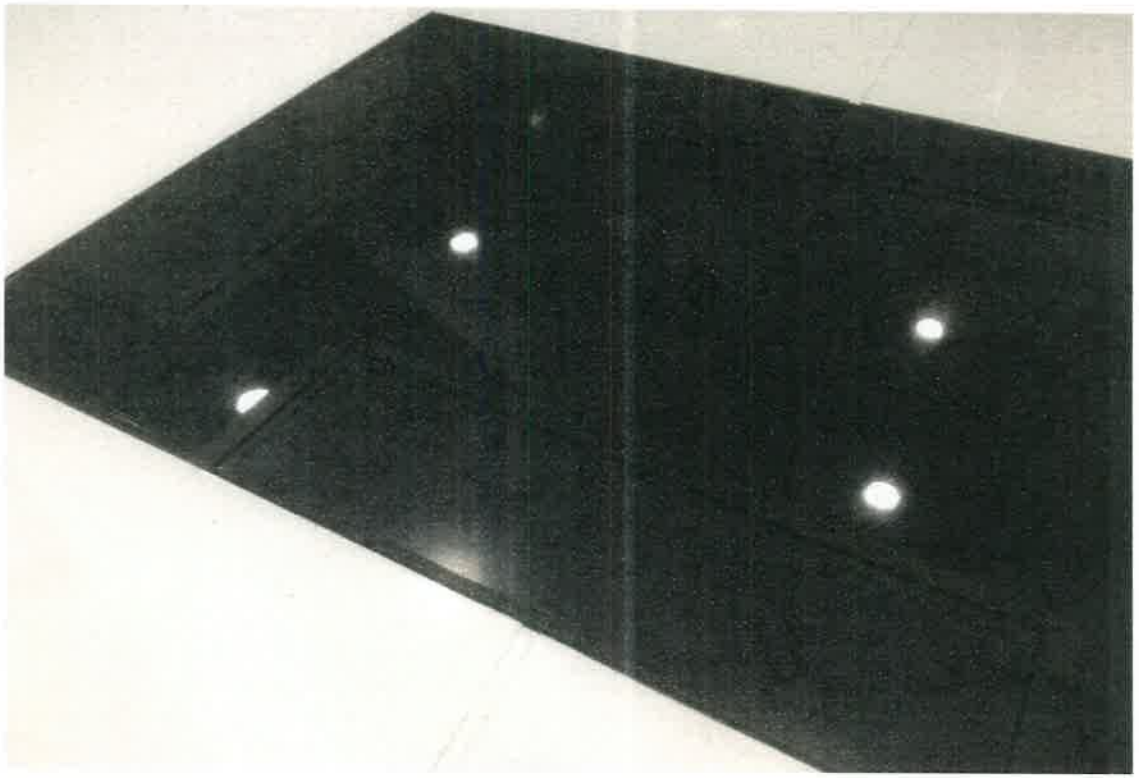

EXT- 49

Fabricación, suministro e instalación de tapas de alocubon de 0.10 x 0.30 m para monitores en mesa de sala de juntas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-50						
Suministro e instalación de división de cristal sanitobo de 6 mm templado con película arena en escritorios supervisoras de 911 de 1.70 m x 0.55 m. Incluye mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			
						1.00

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

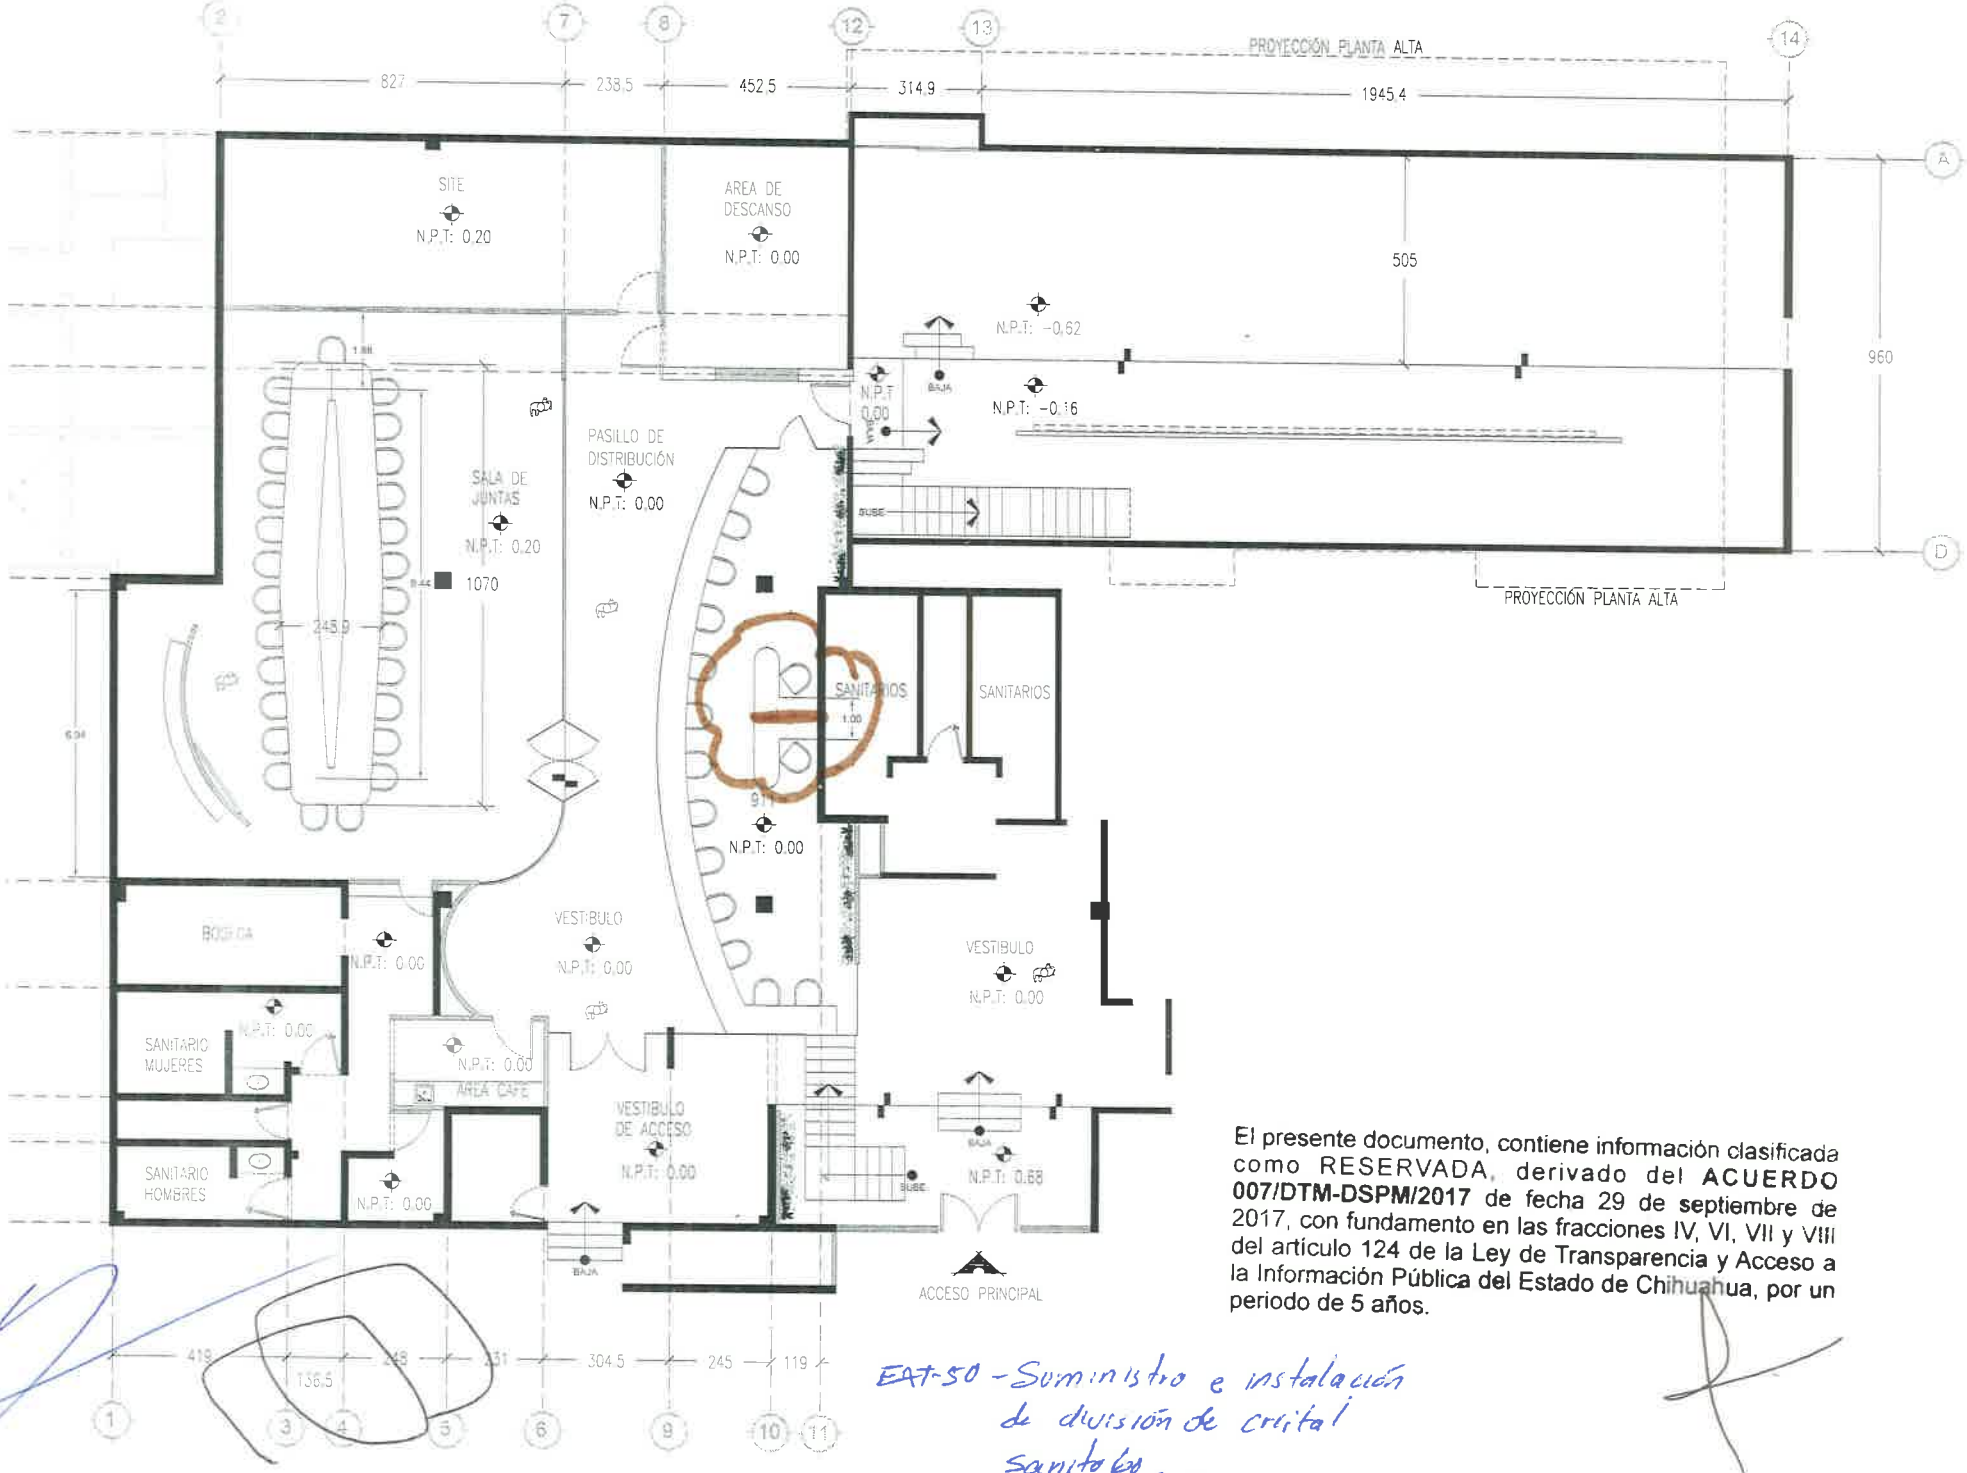

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EAT-50 - Suministro e instalación de división de cristal sanitarios...

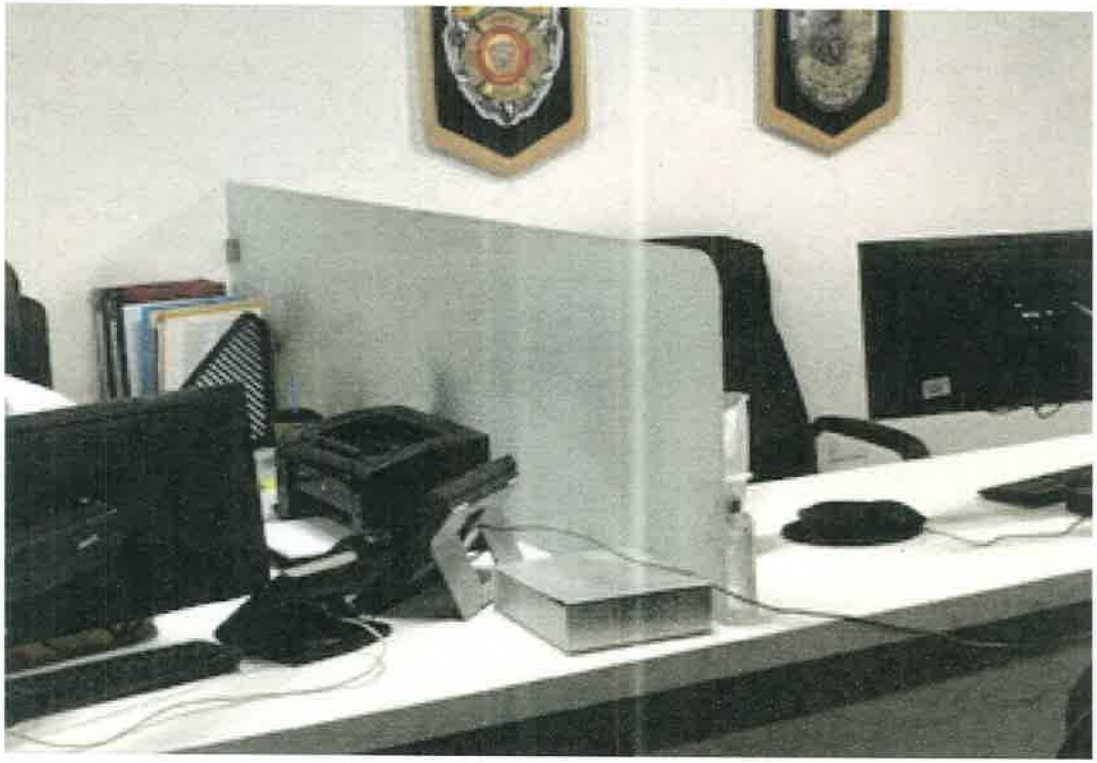

EXT- 50

Suministro e instalación de división de cristal sanitobo de 6 mm templado con película arena en escritorios supervisoras de 911 de 1.70 m x 0.55 m. Incluye mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-51					
Suministro y colocación de ventana en comedor, de 1.50 de ancho x 0.96 mts de altura, a base de vidrio sencillo de 6 mm, marco de aluminio G2, acabado anodizado natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		**Pieza**	**Total**		
		3.00	3.00		
		TOTAL	**3.00**		**3.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

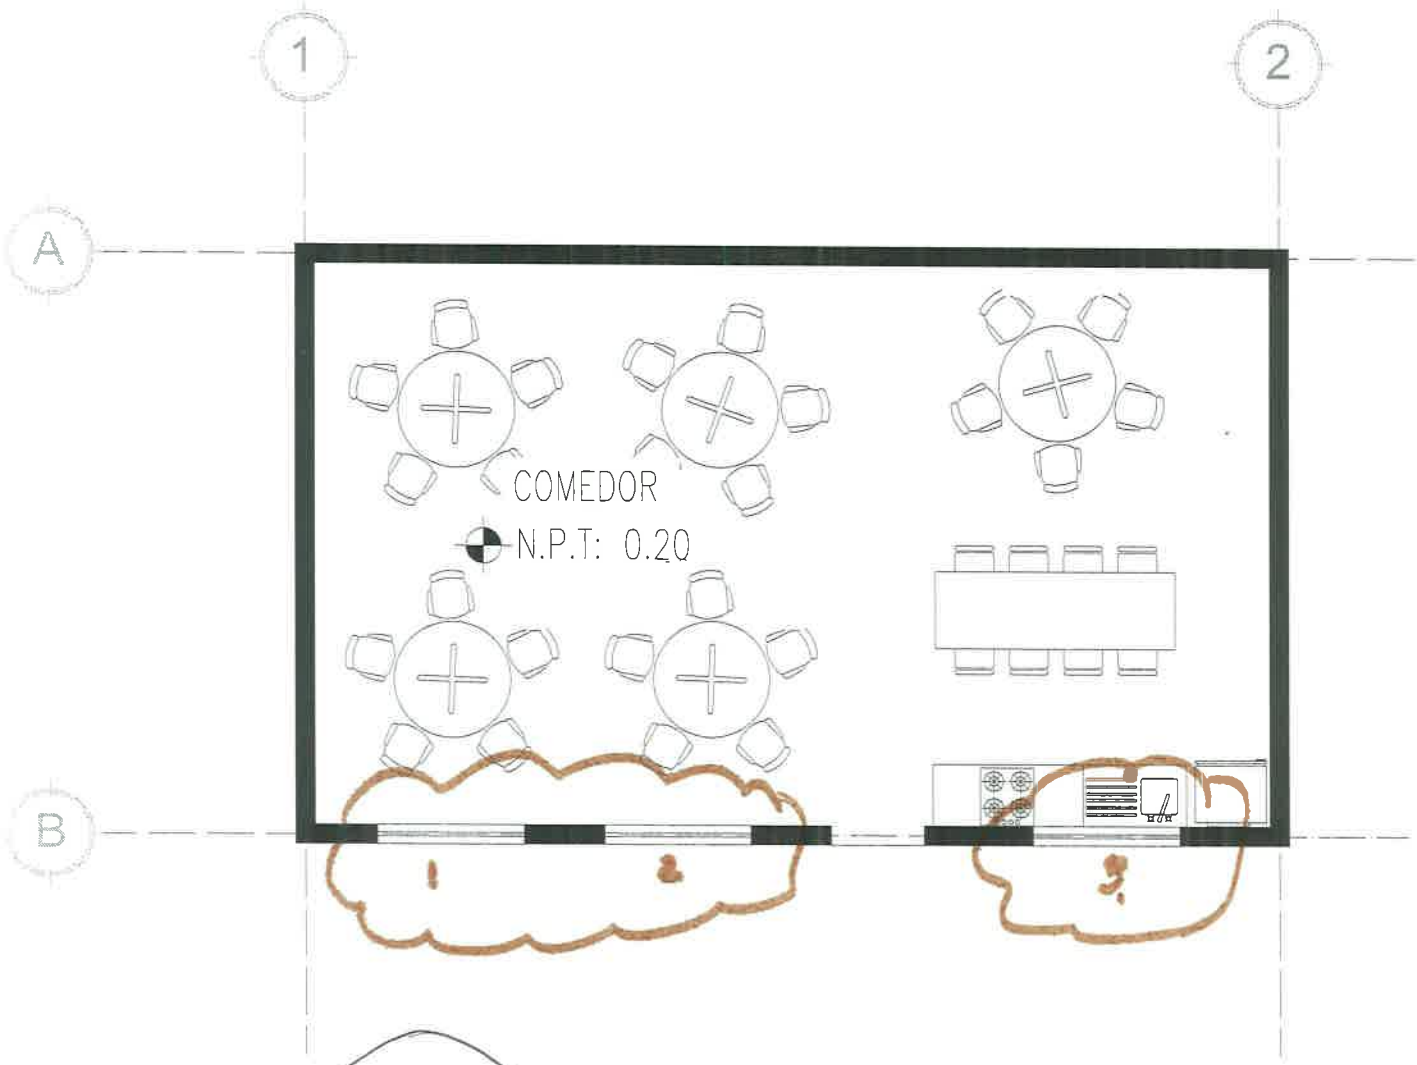

EXT-51 - Suministro y colocación de Ventana en comedor...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 51

Suministro y colocación de ventana en comedor, de 1.50 de ancho x 0.96 mts de altura, a base de vidrio sencillo de 6 mm, marco de aluminio G2, acabado anodizado natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-52						
Suministro e instalación de vinil blanco en cancel de sala de juntas de 10.00m x 2.10 m., incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**1.00**
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

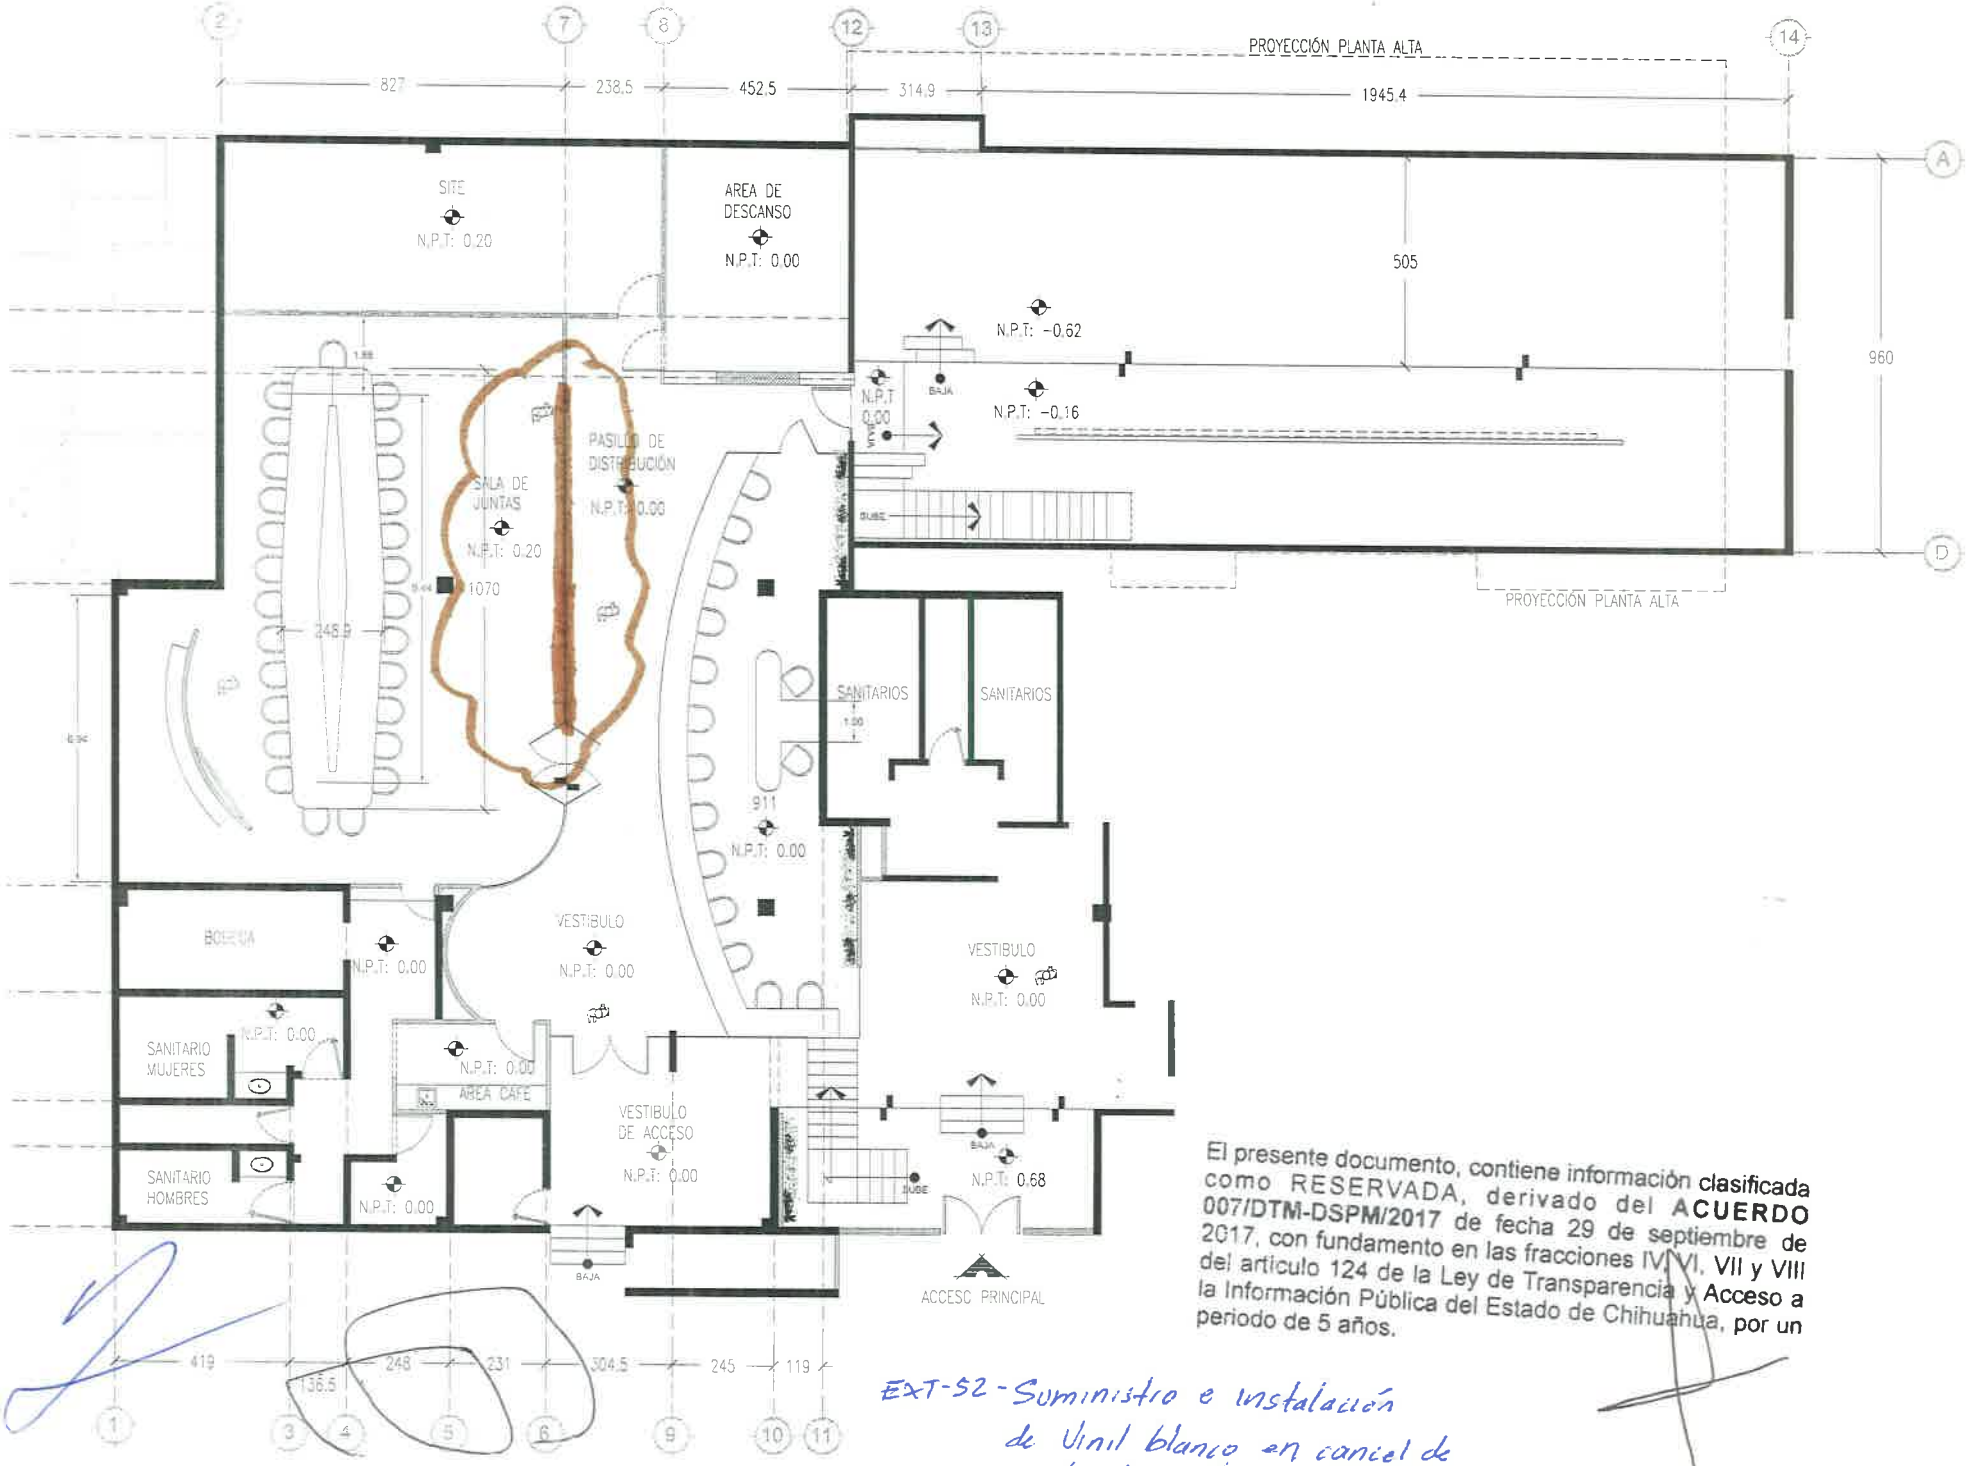

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-52 - Suministro e instalación de Vinil blanco en canicel de sala de juntas



EXT- 52 Suministro e instalación de vinil blanco en cancel de sala de juntas de 10.00m x 2.10 m., incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-53					
Suministro e. instalación de vinil en cancel curvo de sala de juntas a cuatro colores de 3.15 x 2.10 m. y logo de plataforma escudo chihuahua, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

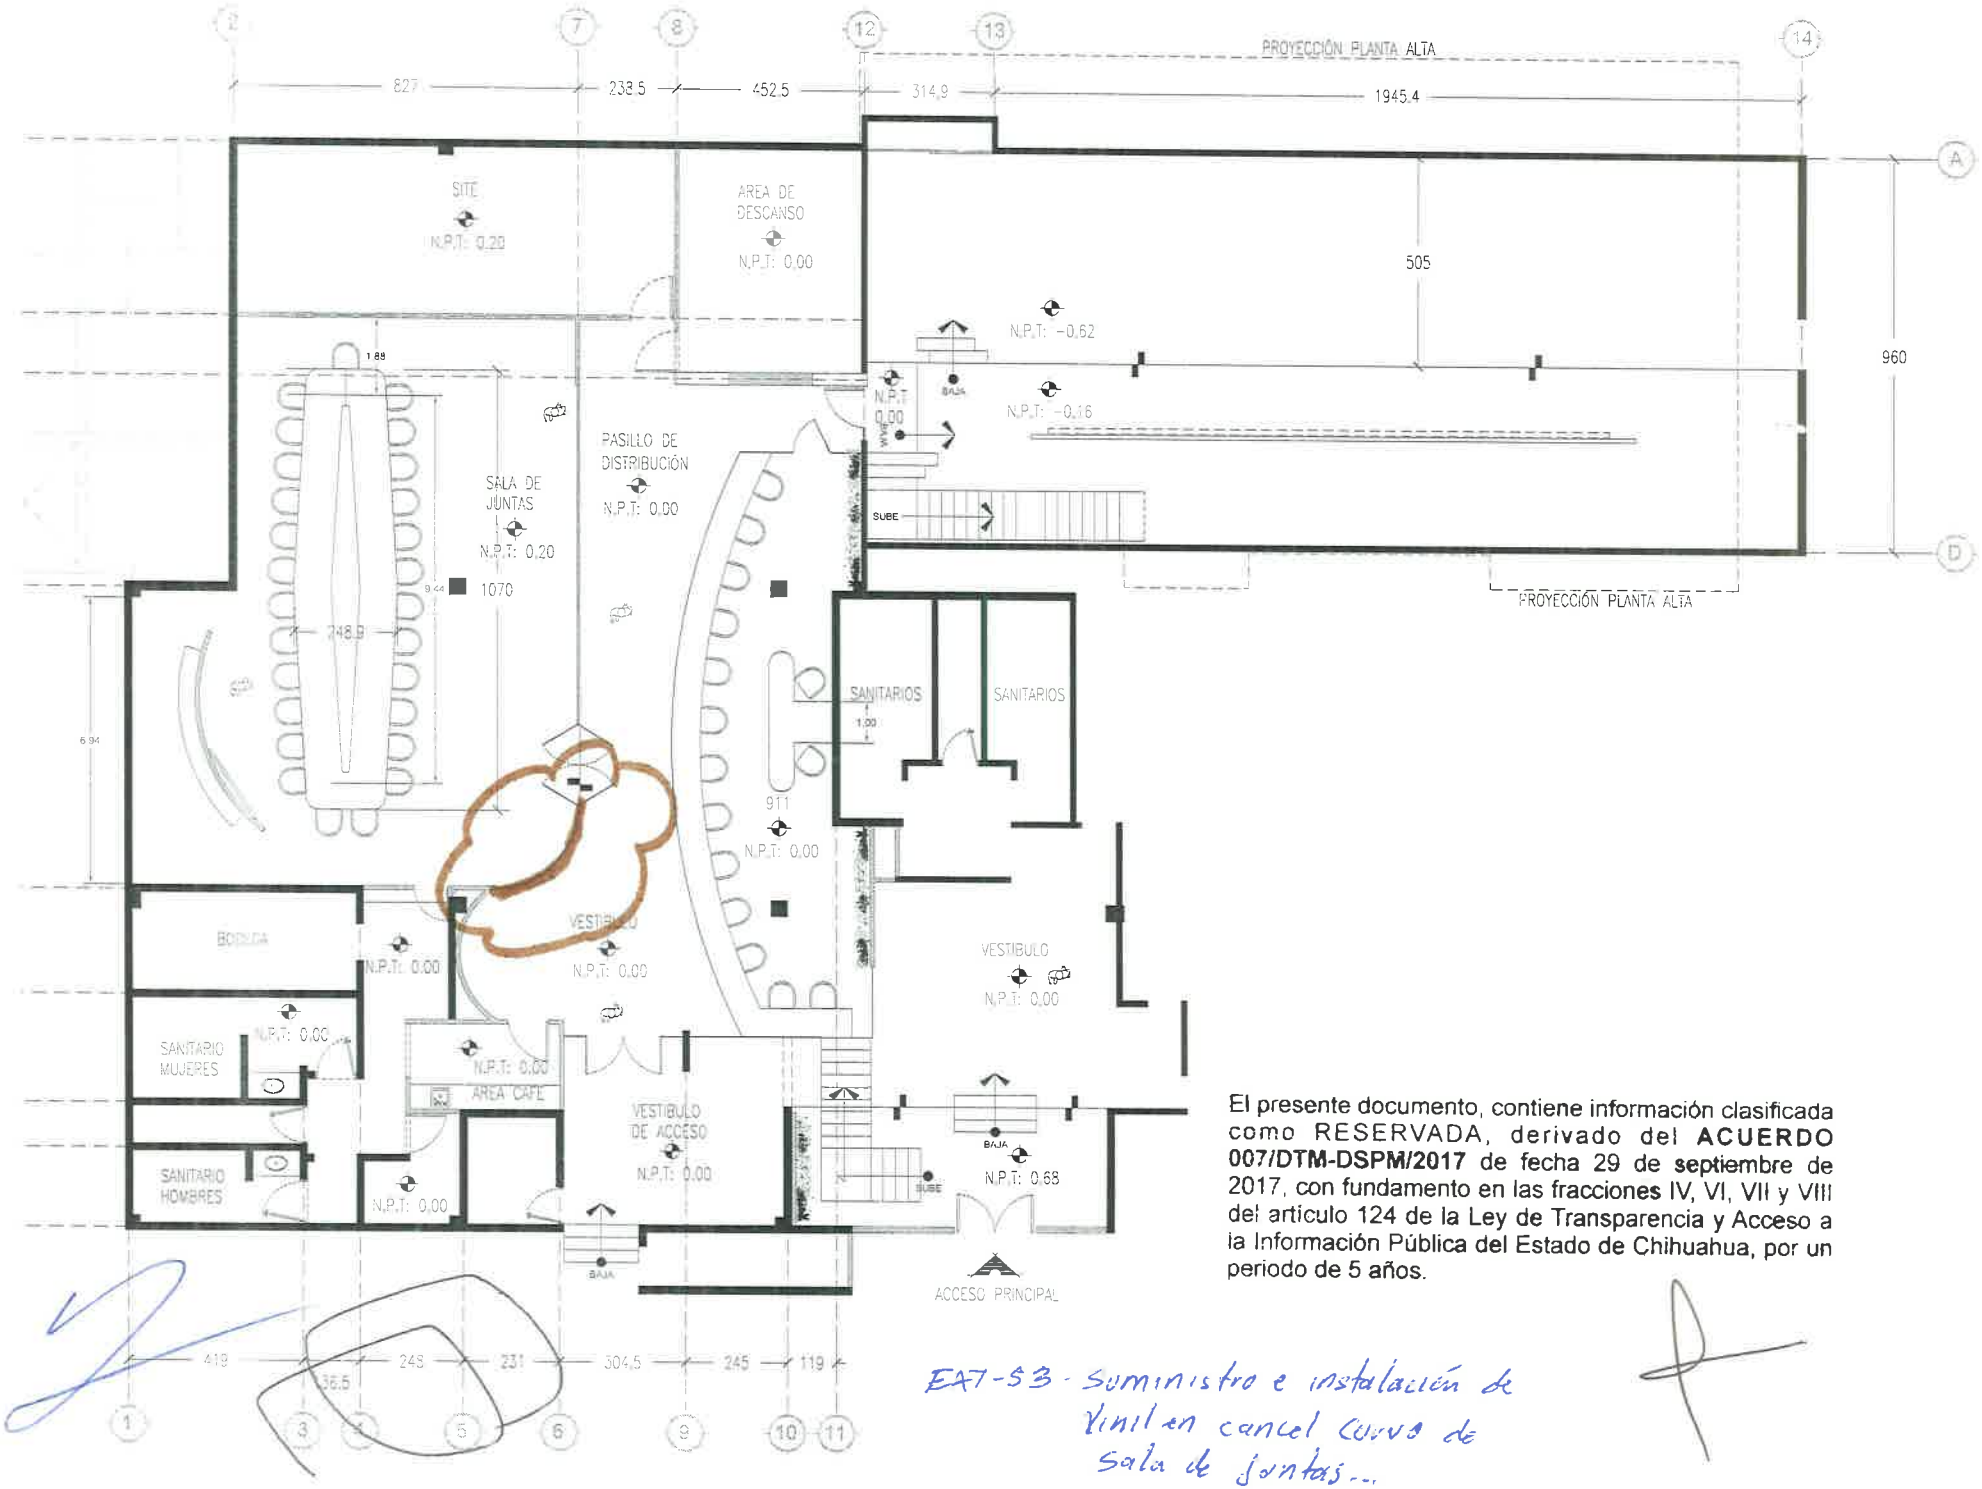

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EA7-53 - Suministro e instalación de Vinil en cancel curvo de Sala de juntas...



EXT- 53 Suministro e instalación de vinil en cancel curvo de sala de juntas a cuatro colores de 3.15 x 2.10 m. y logo de plataforma escudo chihuahua, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-54					
		Pieza	**Total**		
Suministro e instalación de letras de vinil para texto y logos 3D en muro 911, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

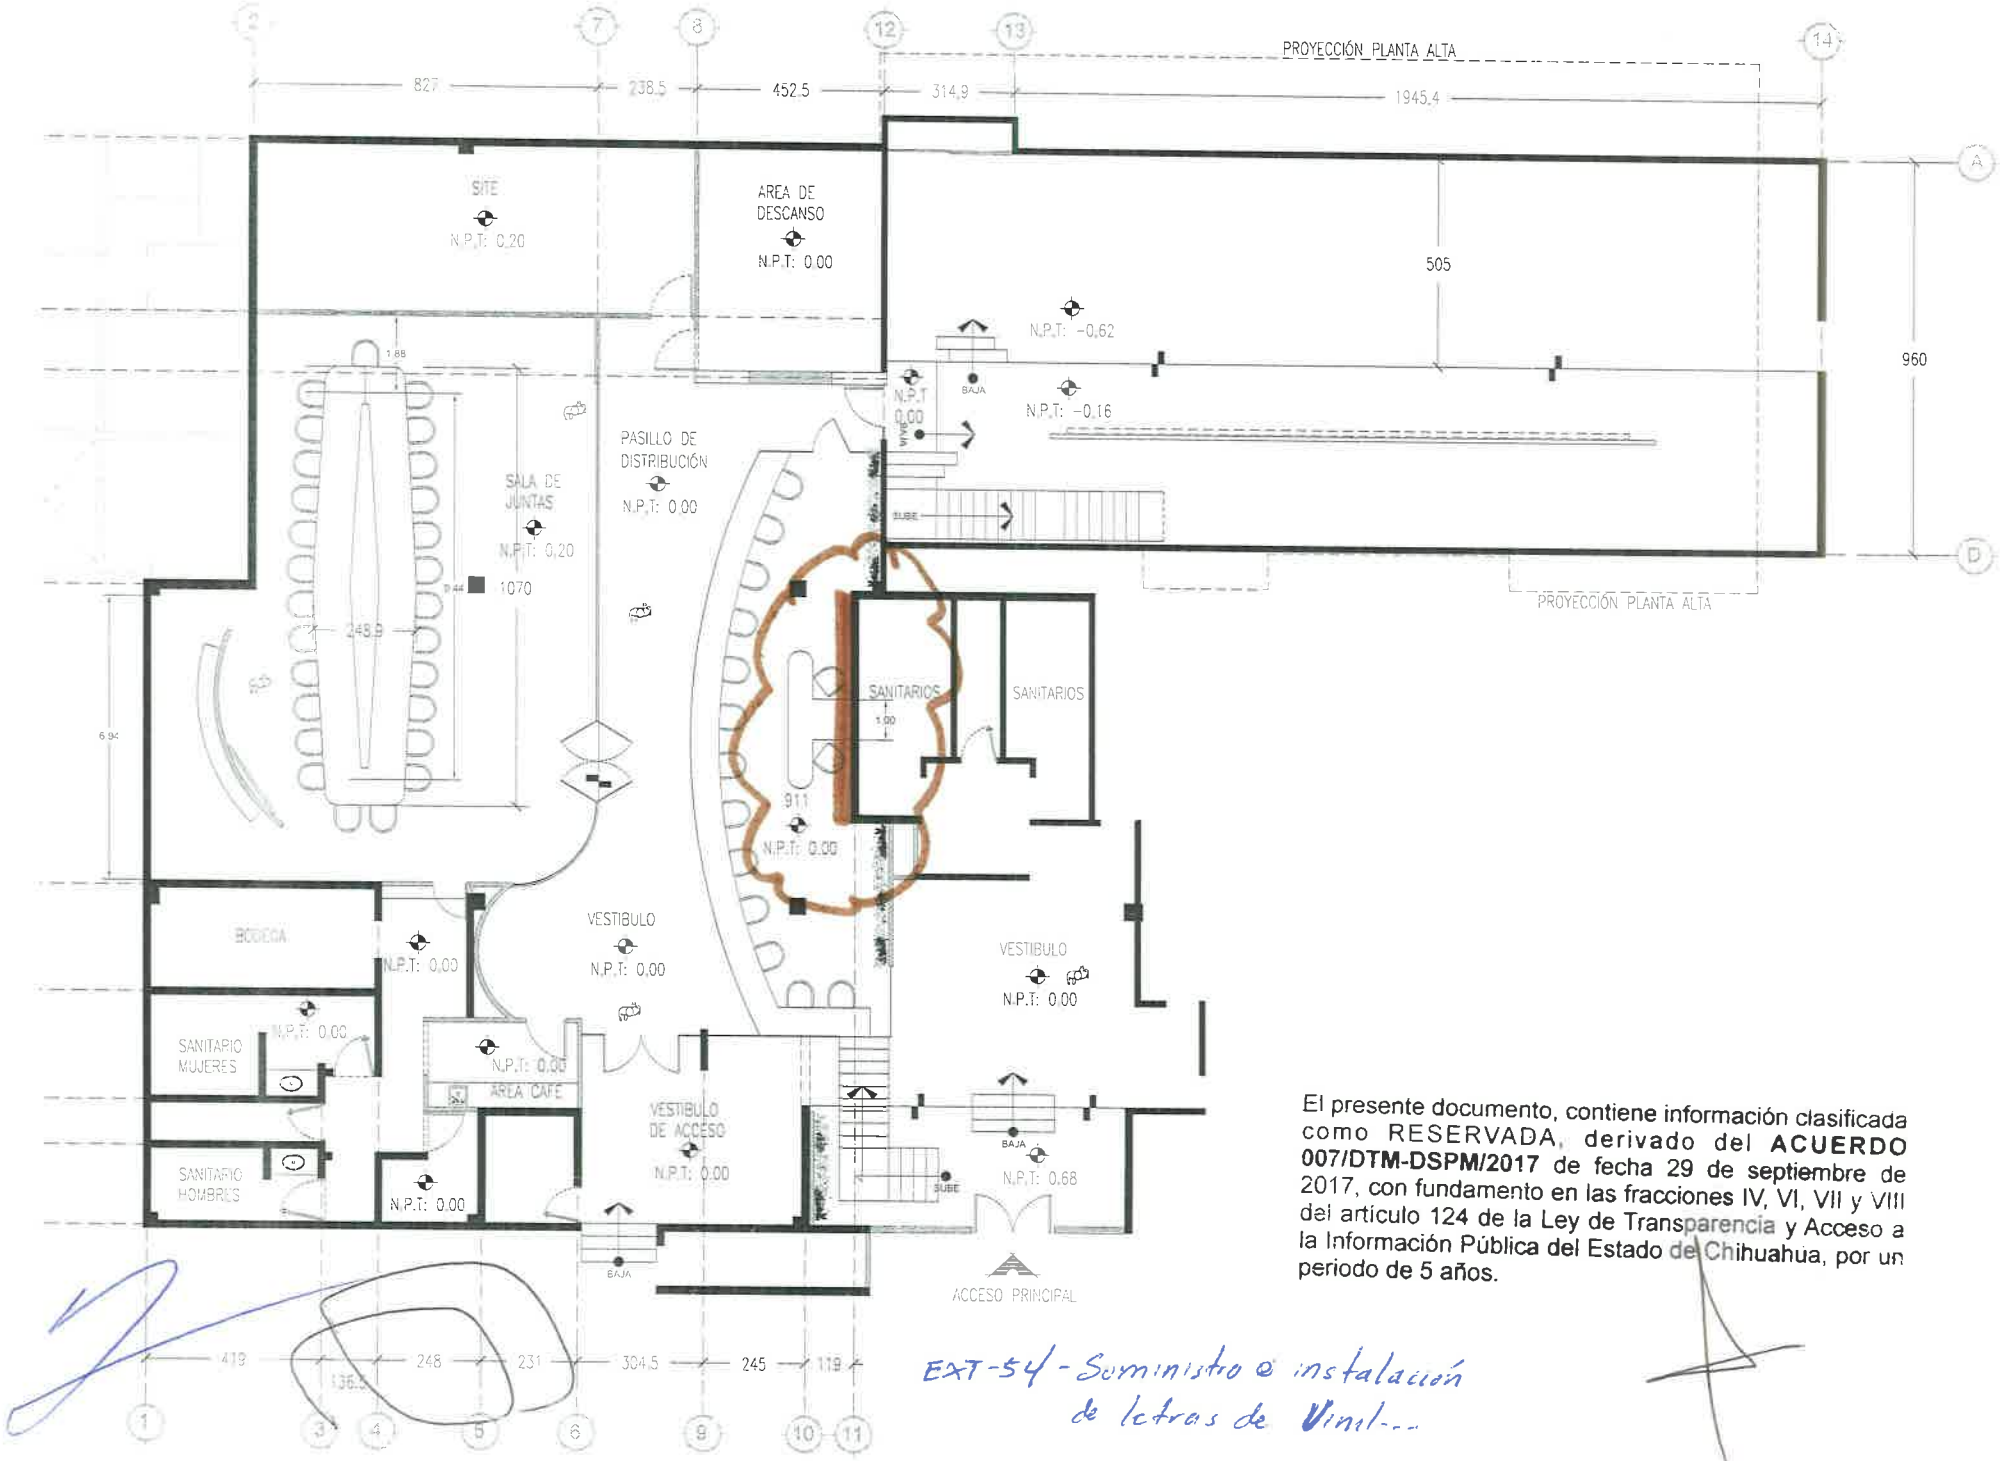

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-54 - Suministro e instalación de letras de Vinil...



EXT- 54 Suministro e instalación de letras de vinil para texto y logos 3D en muro 911, incluye material, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-55						
		Pieza	**Total**			
Suministro e instalación en arenado y vinil en cancel de acceso a pasillo de distribución de 2.80 x 2.30 incluye materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			
						1.00

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

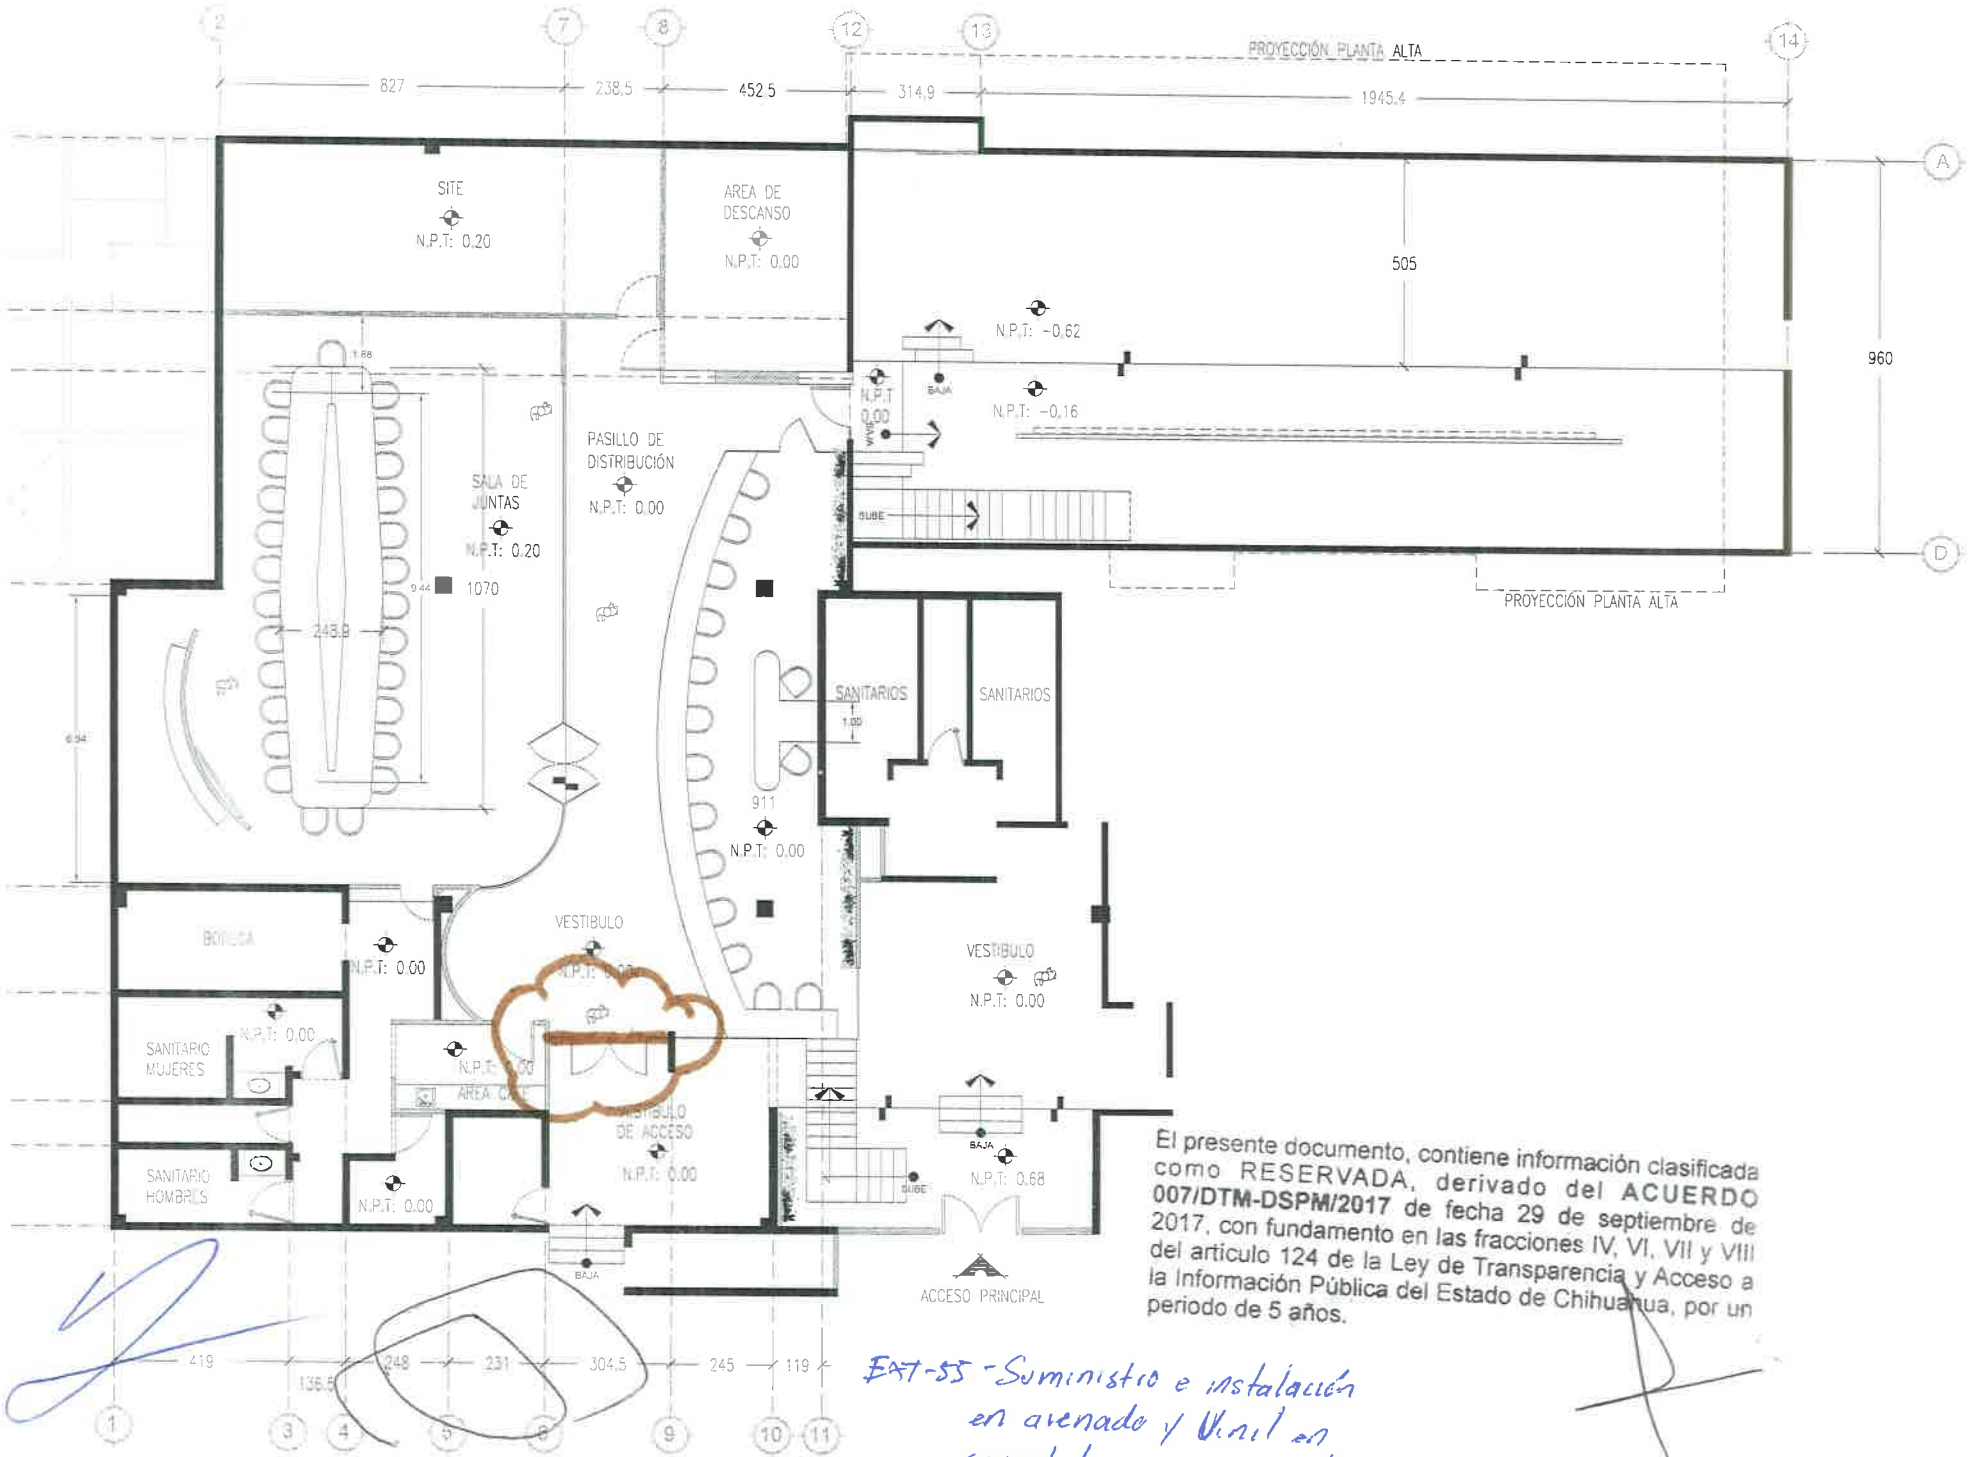

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO **007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EAT-55 - Suministro e instalación en arenado y Vinil en cancel de acceso a pasillo...



EXT- 55 Suministro e instalación en arenado y vinil en cancel de acceso a pasillo de distribución de 2.80 x 2.30 incluye materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-56					
Suministro y colocación de vinil y logos en puertas de cristal para accesos de video Wall, cocina y baños de sala de juntas y cancel costado de 911, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		4.00	4.00		
		TOTAL	**4.00**		
					4.00

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

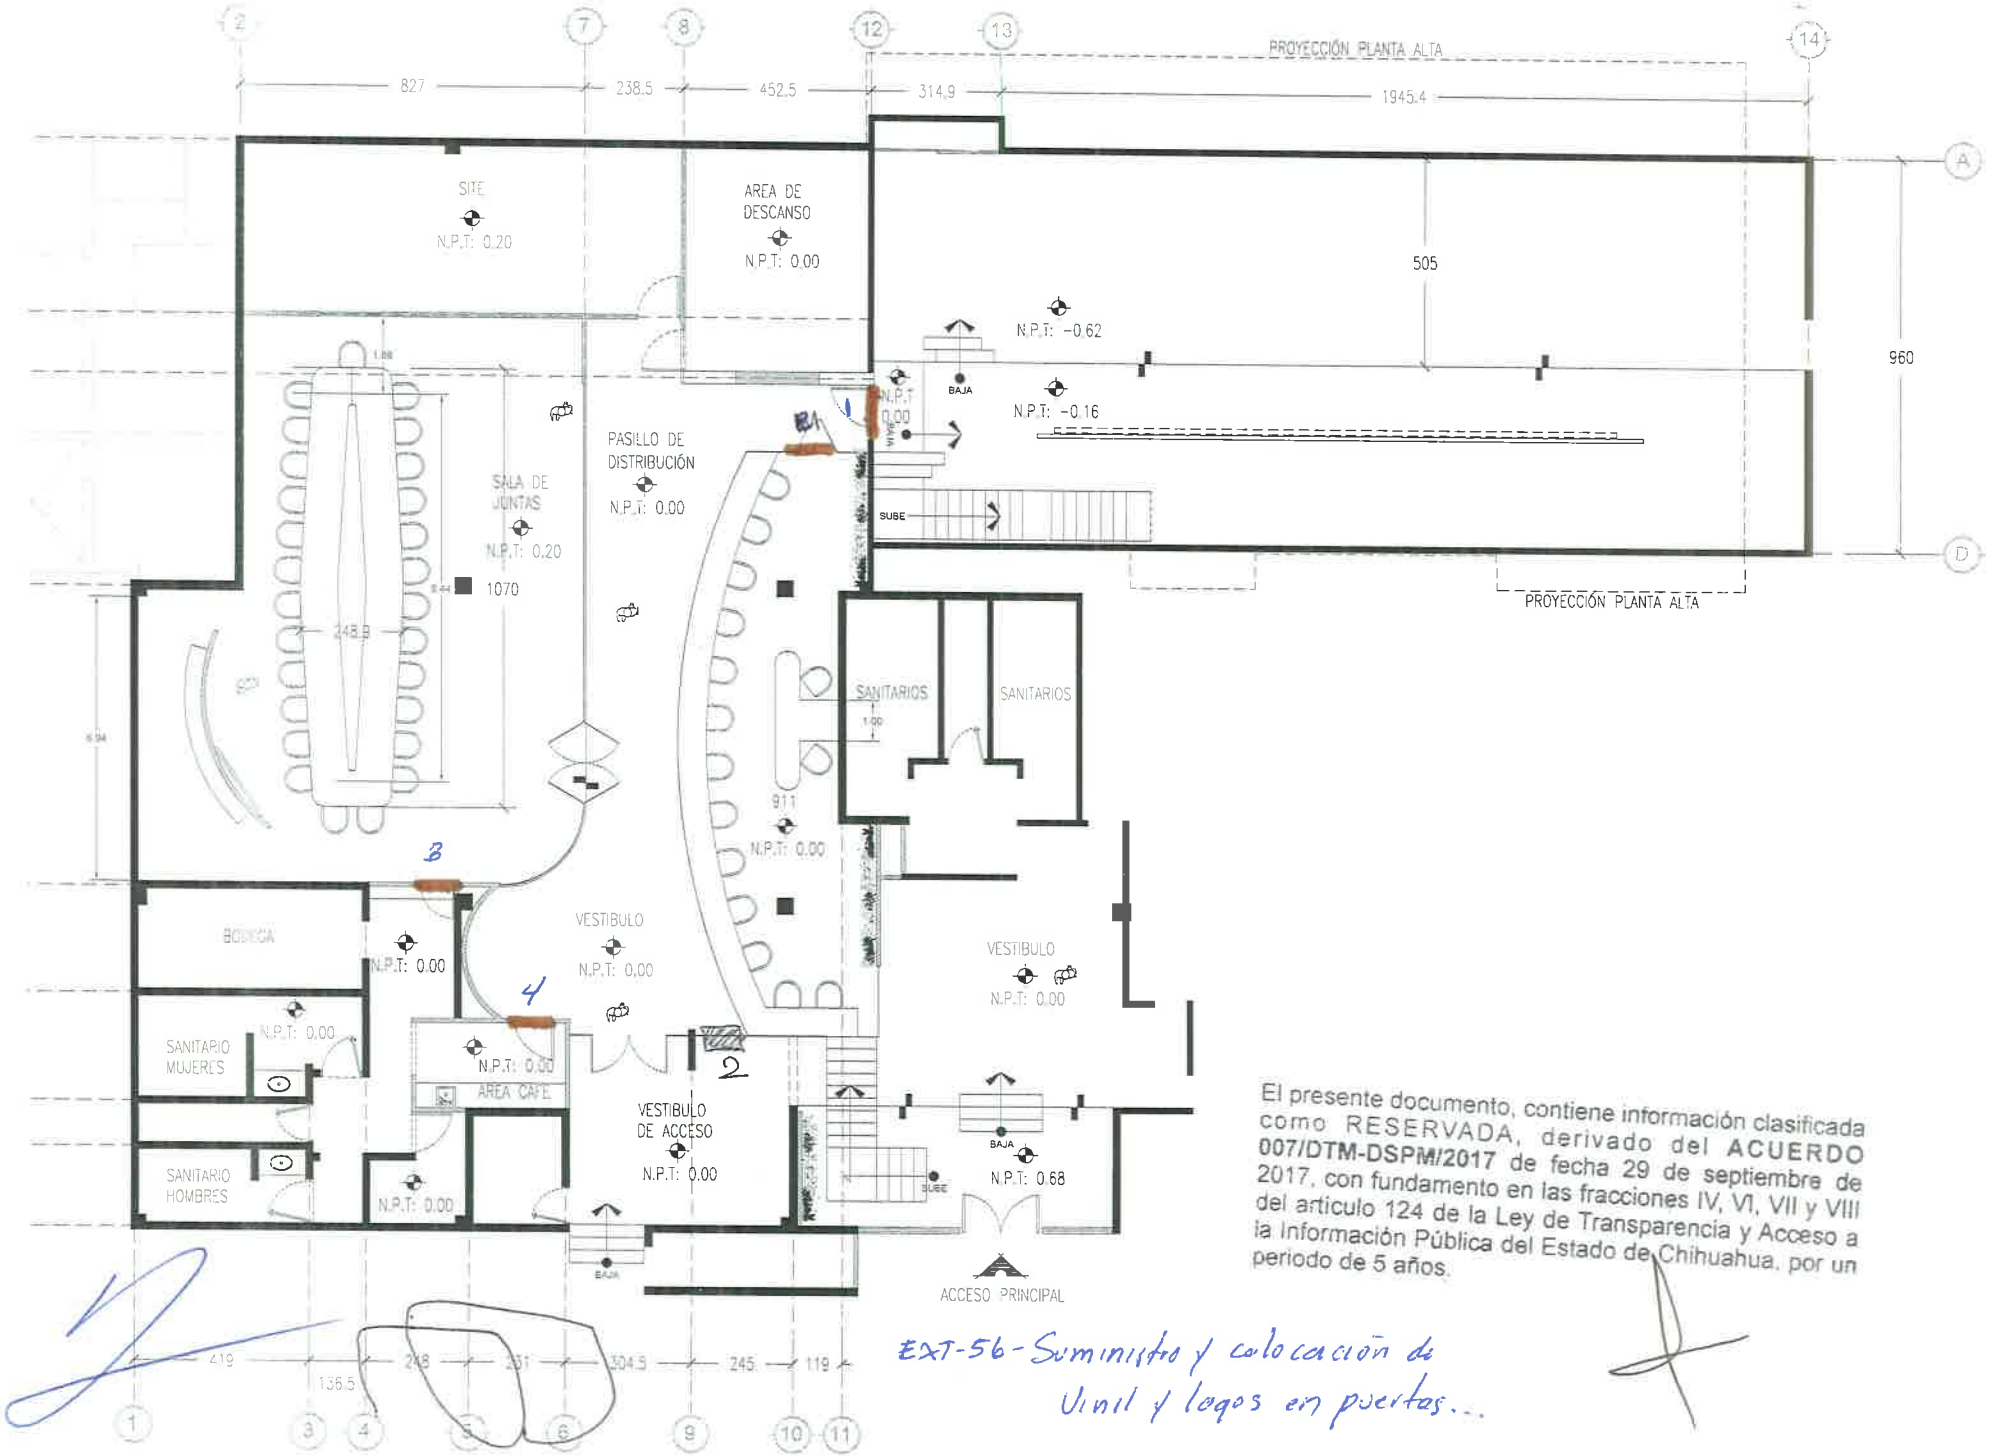

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-56 - Suministro y colocación de Vinil y logos en puertas...









EXT- 56 Suministro y colocación de vinil y logos en puertas de cristal para accesos de video Wall, cocina y baños de sala de juntas y cancel costado de 911, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-57						
Suministro e instalación de letras de aluminio de BIENVENIDOS y texto del nombre en dos dimensiones y logos en 3D en muro de acceso principal, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

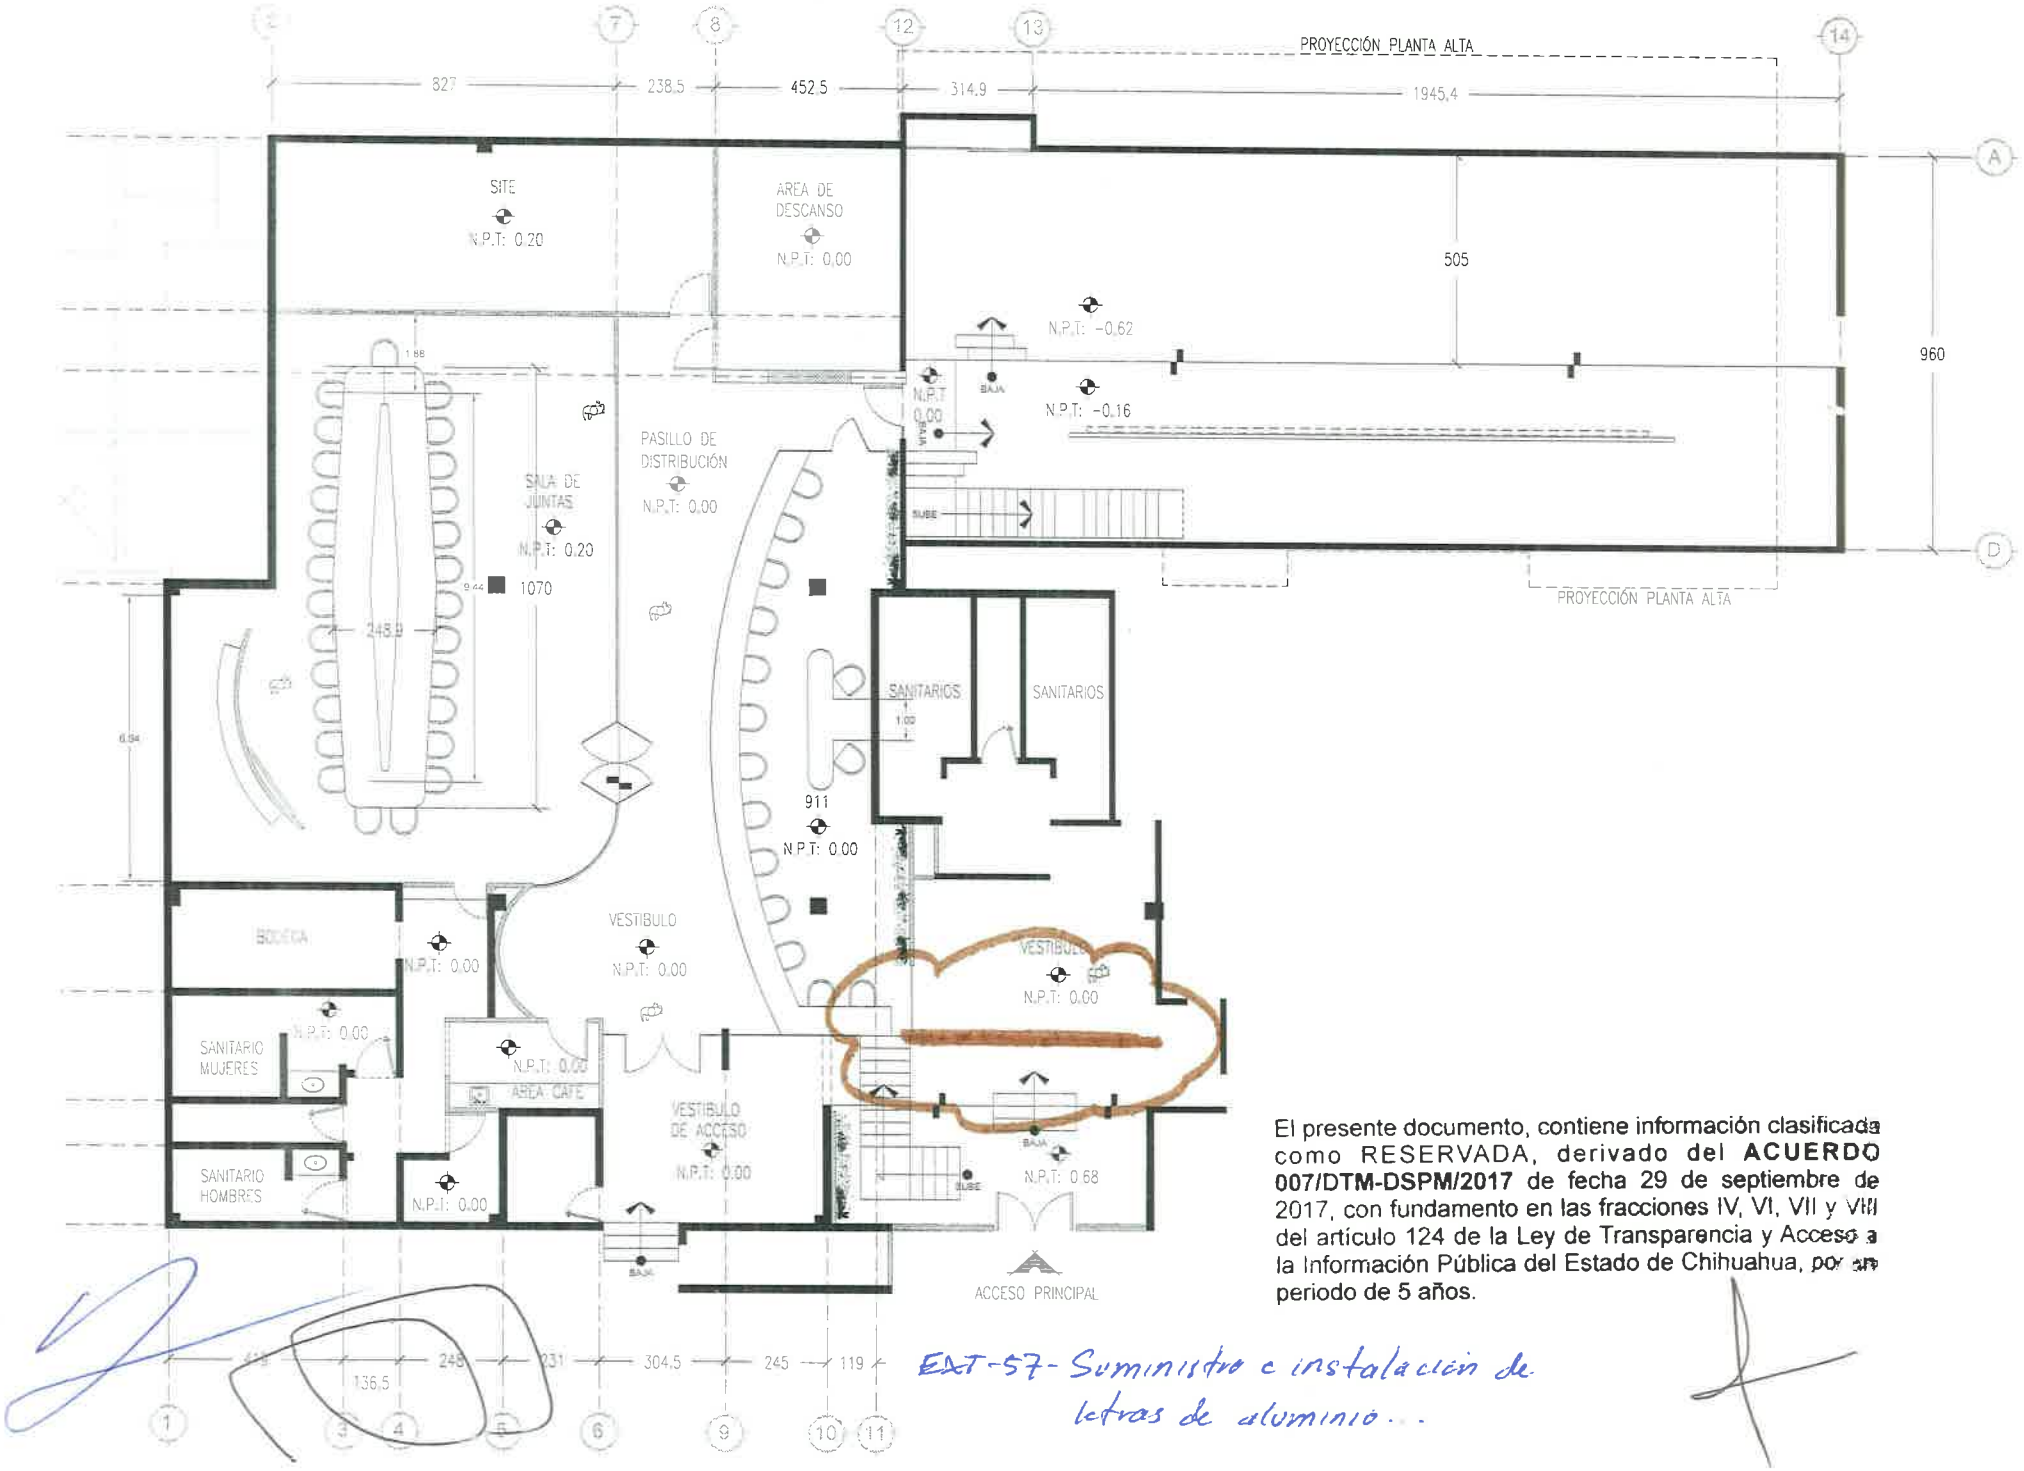

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-57- Suministro e instalación de letras de aluminio...



EXT- 57 Suministro e instalación de letras de aluminio de BIENVENIDOS y texto del nombre en dos dimensiones y logos en 3D en muro de acceso principal, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-58						
Suministro y colocación de franja doble de vinil con acabado esmerilado de 30 y 5 cms en cancel 911, 18.50 ml. incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

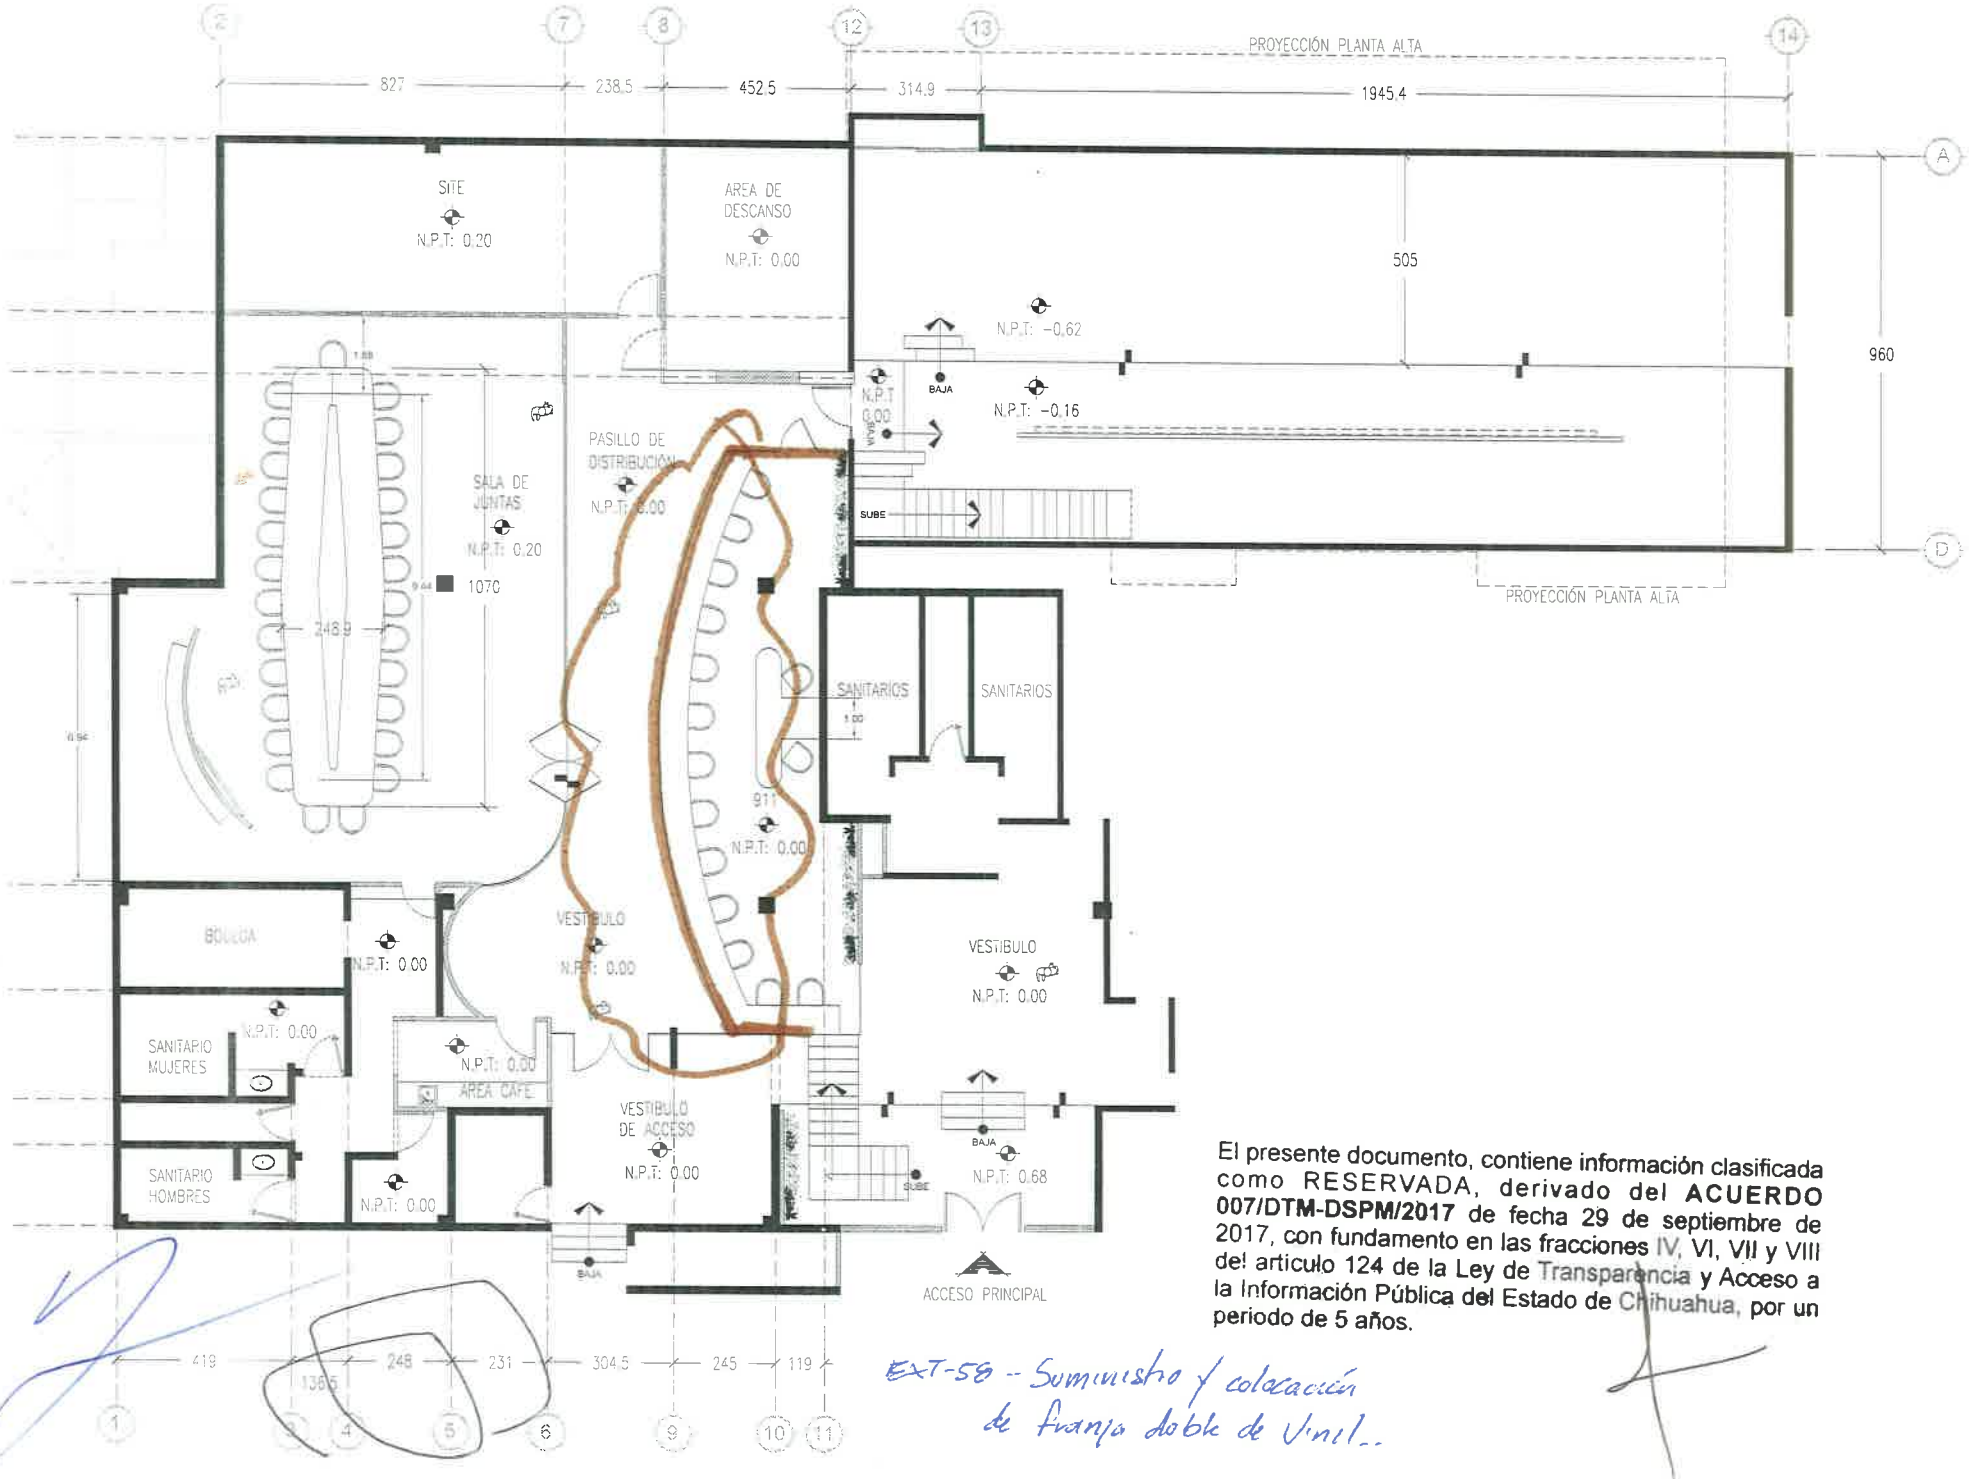

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-58 - Suministro y colocación de franja doble de Vinil..



EXT- 58 Suministro y colocación de franja doble de vinil con acabado esmerilado de 30 y 5 cms en cancel 911, 18.50 ml. incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-59					
Reparación de plancha de concreto existentes en área de lavabos, incluye retiro de placa de granito existente, materiales, retiro de desperdicios fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		2.00	2.00		
		TOTAL	**2.00**		**2.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

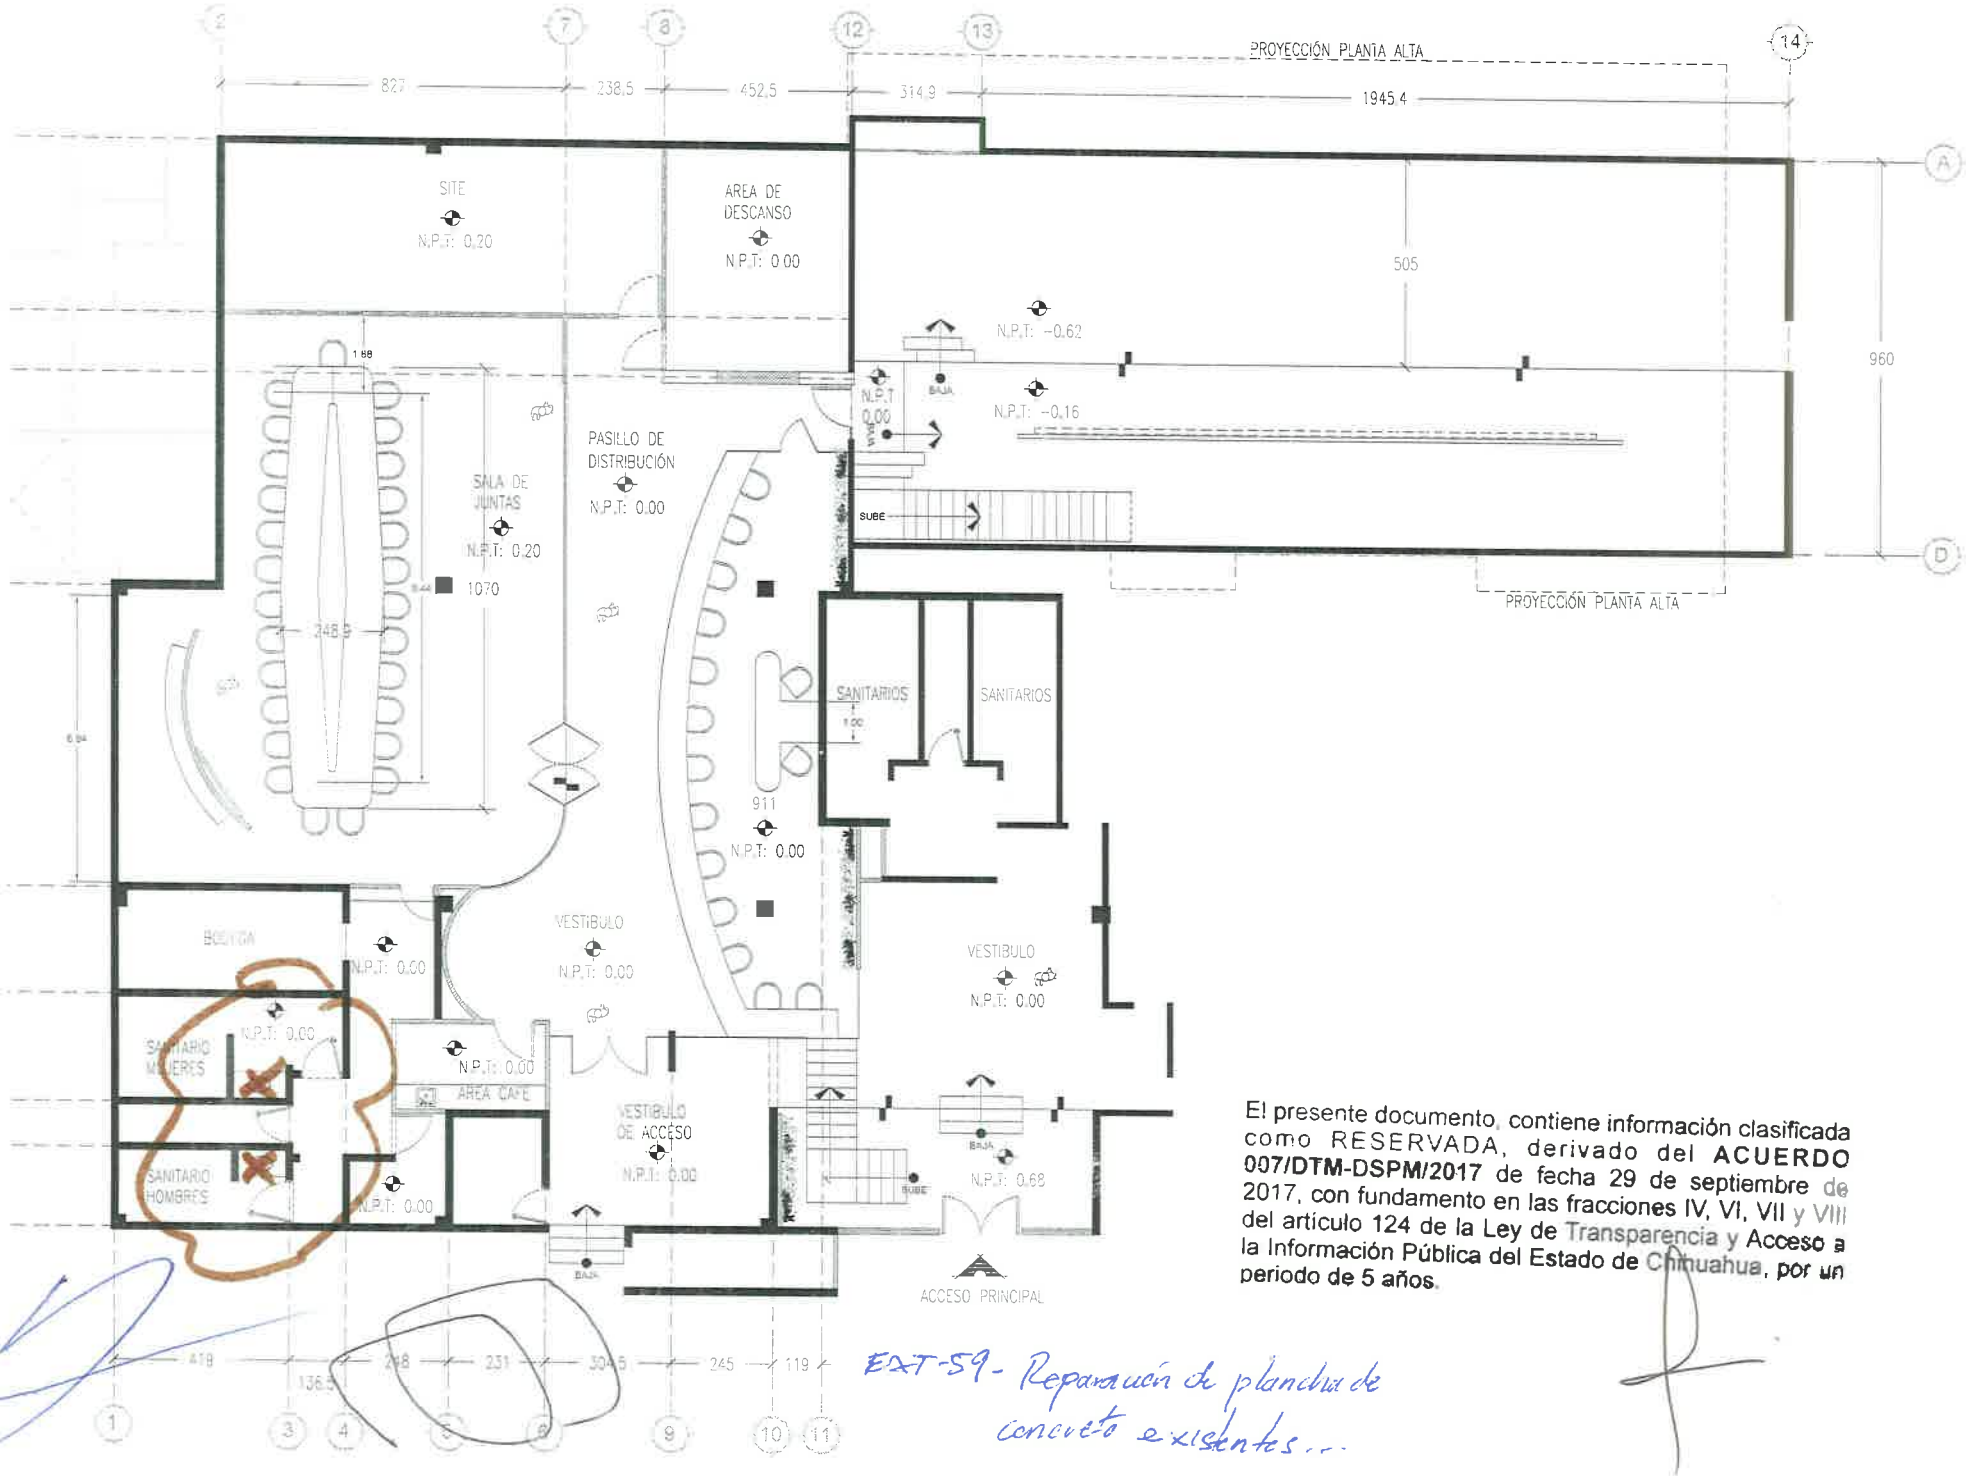

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-59- Reparación de plancha de concreto existentes...

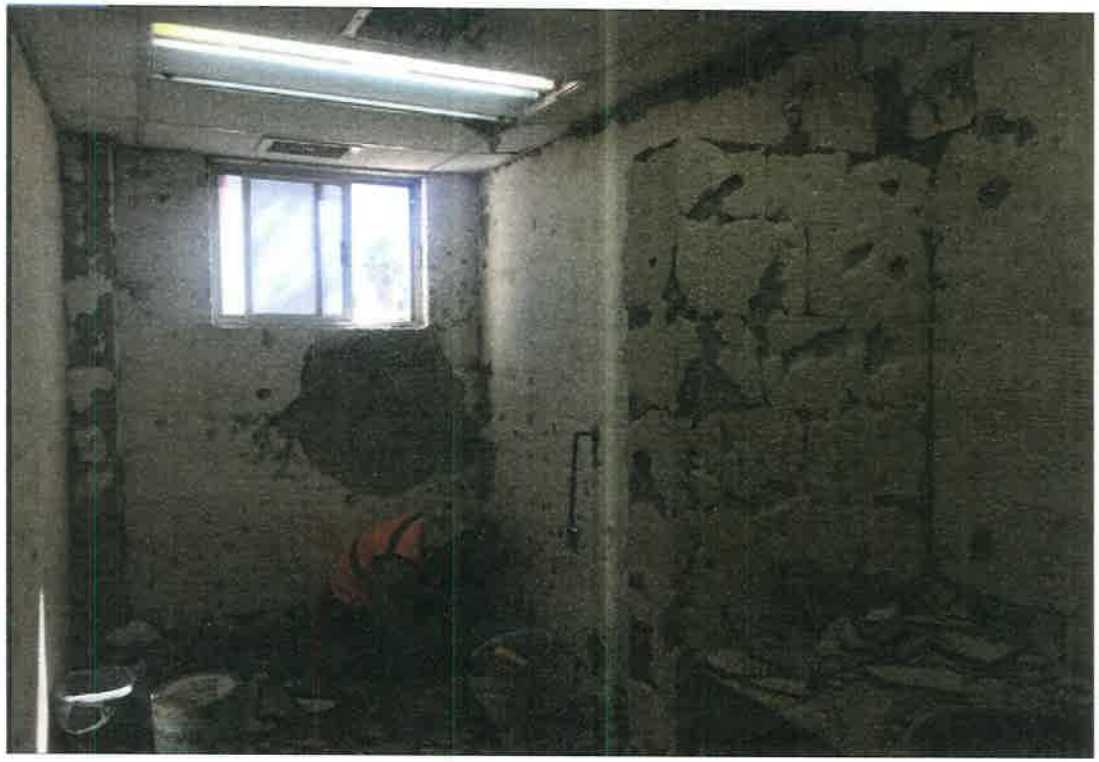

EXT- 59

Reparación de plancha de concreto existentes en área de lavabos, incluye retiro de placa de granito existente, materiales, retiro de desperdicios fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
EXT-60				
	Largo	**Ancho**	**Total**	
Construcción de banqueta de concreto f'c=150kg/cm2. Acabado rayado de 10 cms de espesor en comedor, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
	6.01	1.19	7.15	
	0.26	-0.30	-0.08	D.DADO
	12.60	1.19	14.99	
	0.26	-0.30	-0.08	D.DADO
	0.26	-0.30	-0.08	D.DADO
	0.97	0.14	0.14	
	6.03	1.19	7.18	
	0.26	-0.30	-0.08	D.DADO
		TOTAL	**29.14**	

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	29.14

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

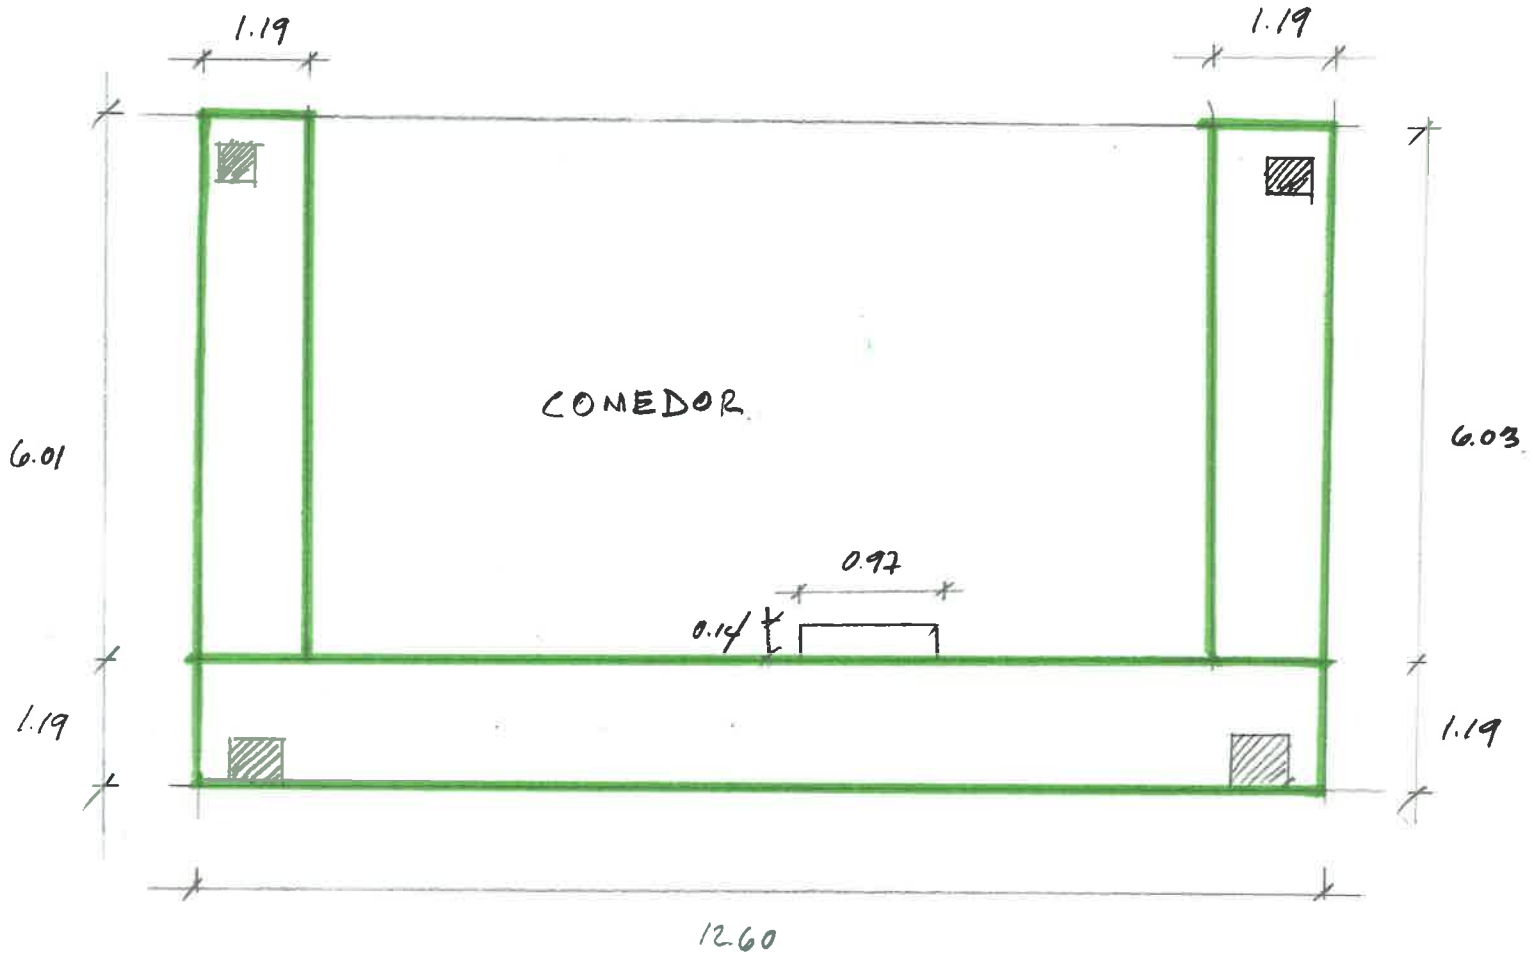

- Dado de Concreto
(0.26x0.30.)
4 PIEZAS.

EXT-60 – Construcción de banqueta de Concreto...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

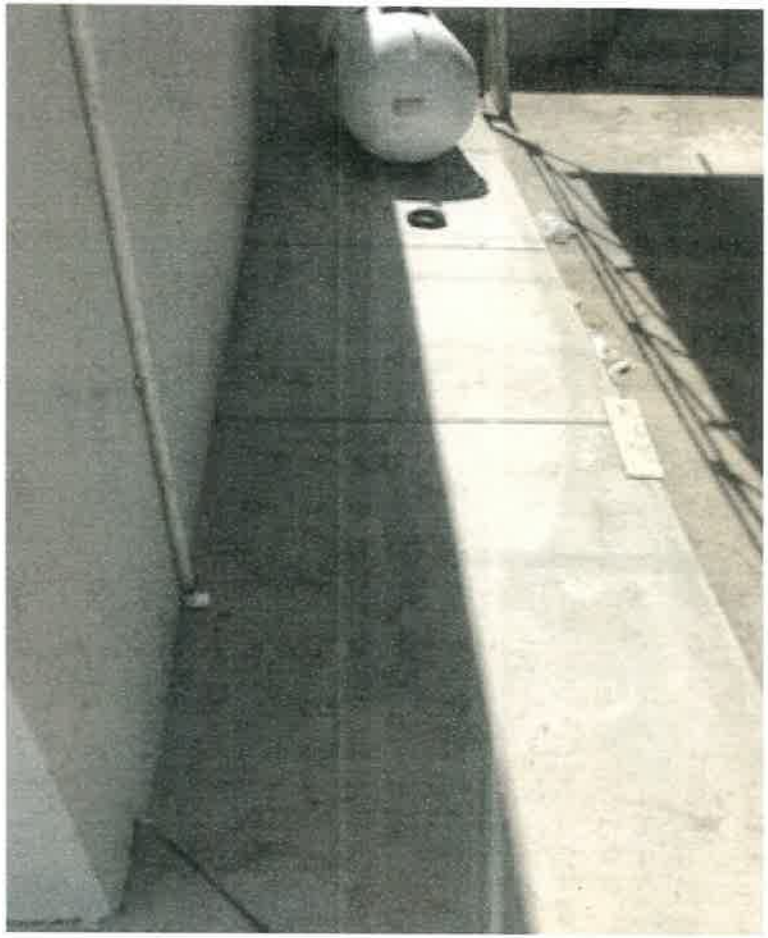

EXT- 60

Construcción de banqueta de concreto f'c=150kg/cm2. Acabado rayado de 10 cms de espesor en comedor, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-62						
	Largo	**Ancho**	**Total**			
Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización con malla reforzada y dos capas de acrílico color blanco, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
	4.80	5.75	27.60			
	4.69	5.75	26.97			
	4.69	0.55	2.58			
	4.80	0.55	2.64			
	5.75	0.57	3.28			
	5.75	0.57	3.28			
	5.96	0.20	1.19			
	5.96	0.42	2.50			
	5.96	0.42	2.50			
	4.80	0.45	2.16			
	0.20	0.20	0.04			
	4.69	0.42	1.97			
	0.20	0.20	0.04			
	0.20	0.20	0.04			
	0.20	0.20	0.04			
	0.20	0.20	0.04			
						76.87
		TOTAL	**76.87**			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

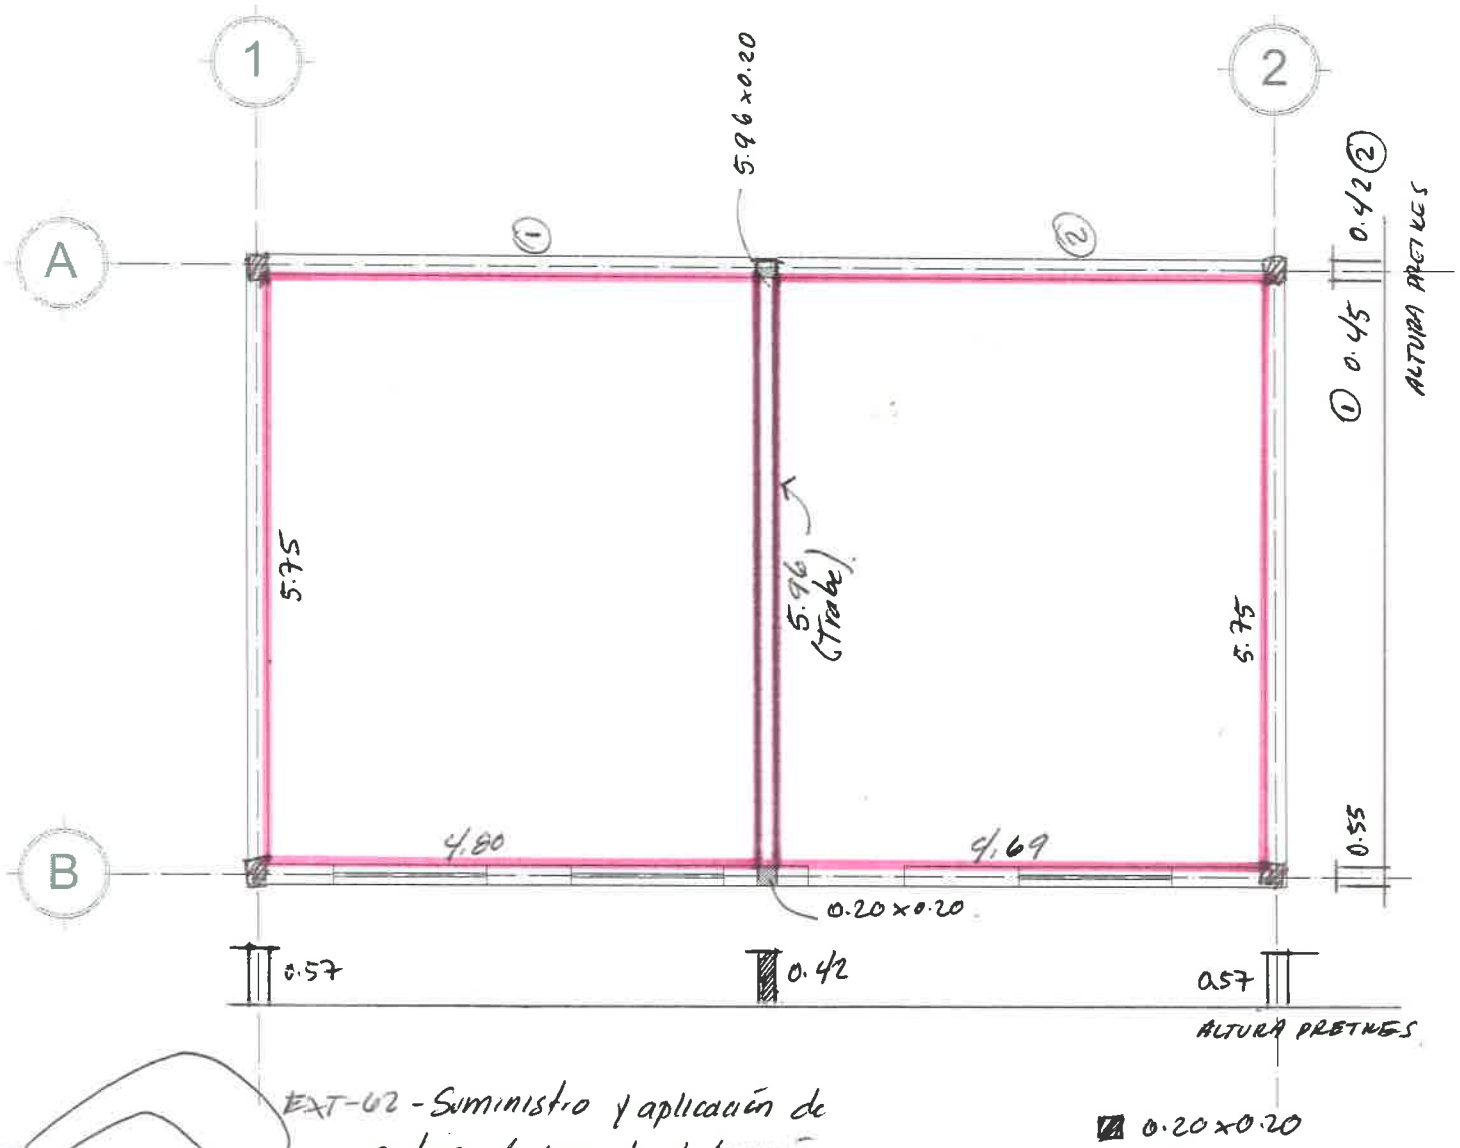

EXT-02 - Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO **007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un **periodo de 5 años.**

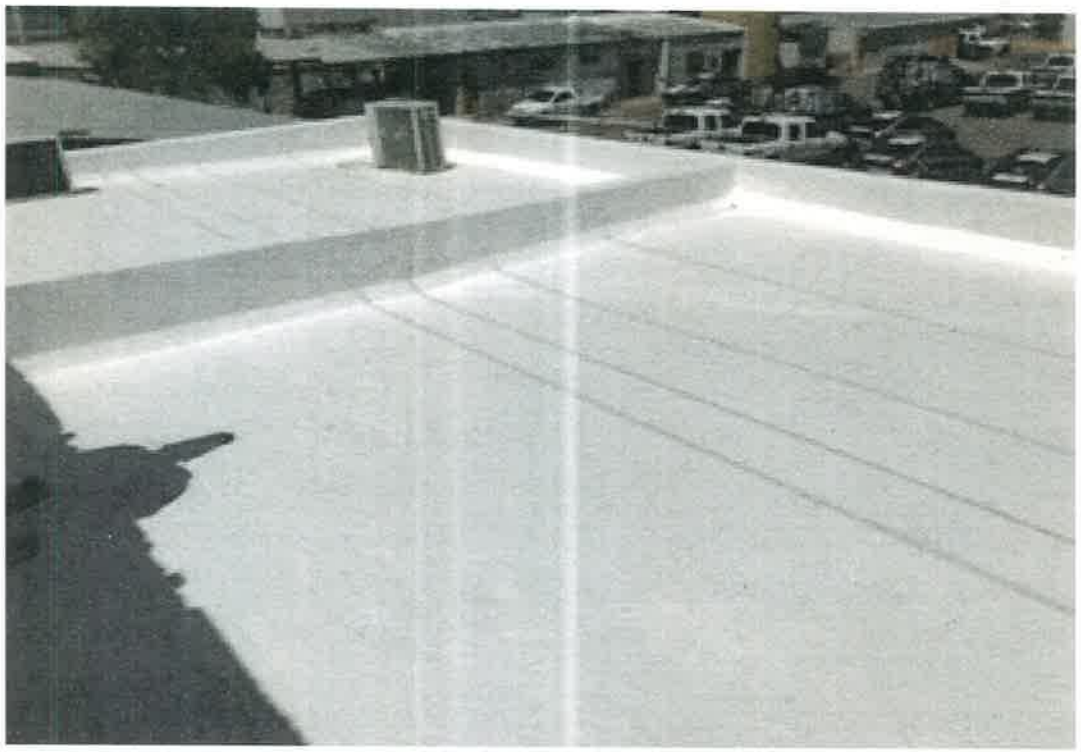

EXT- 62

Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización con malla reforzada y dos capas de acrílico color blanco, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-63						
Suministro e instalación de cerámica Línea Metalic color aluminum para reparación de piso por demolición de sardinel existente en planta alta, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		2.06	2.06			
		5.73	5.73			
		TOTAL	**7.79**			**7.79**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

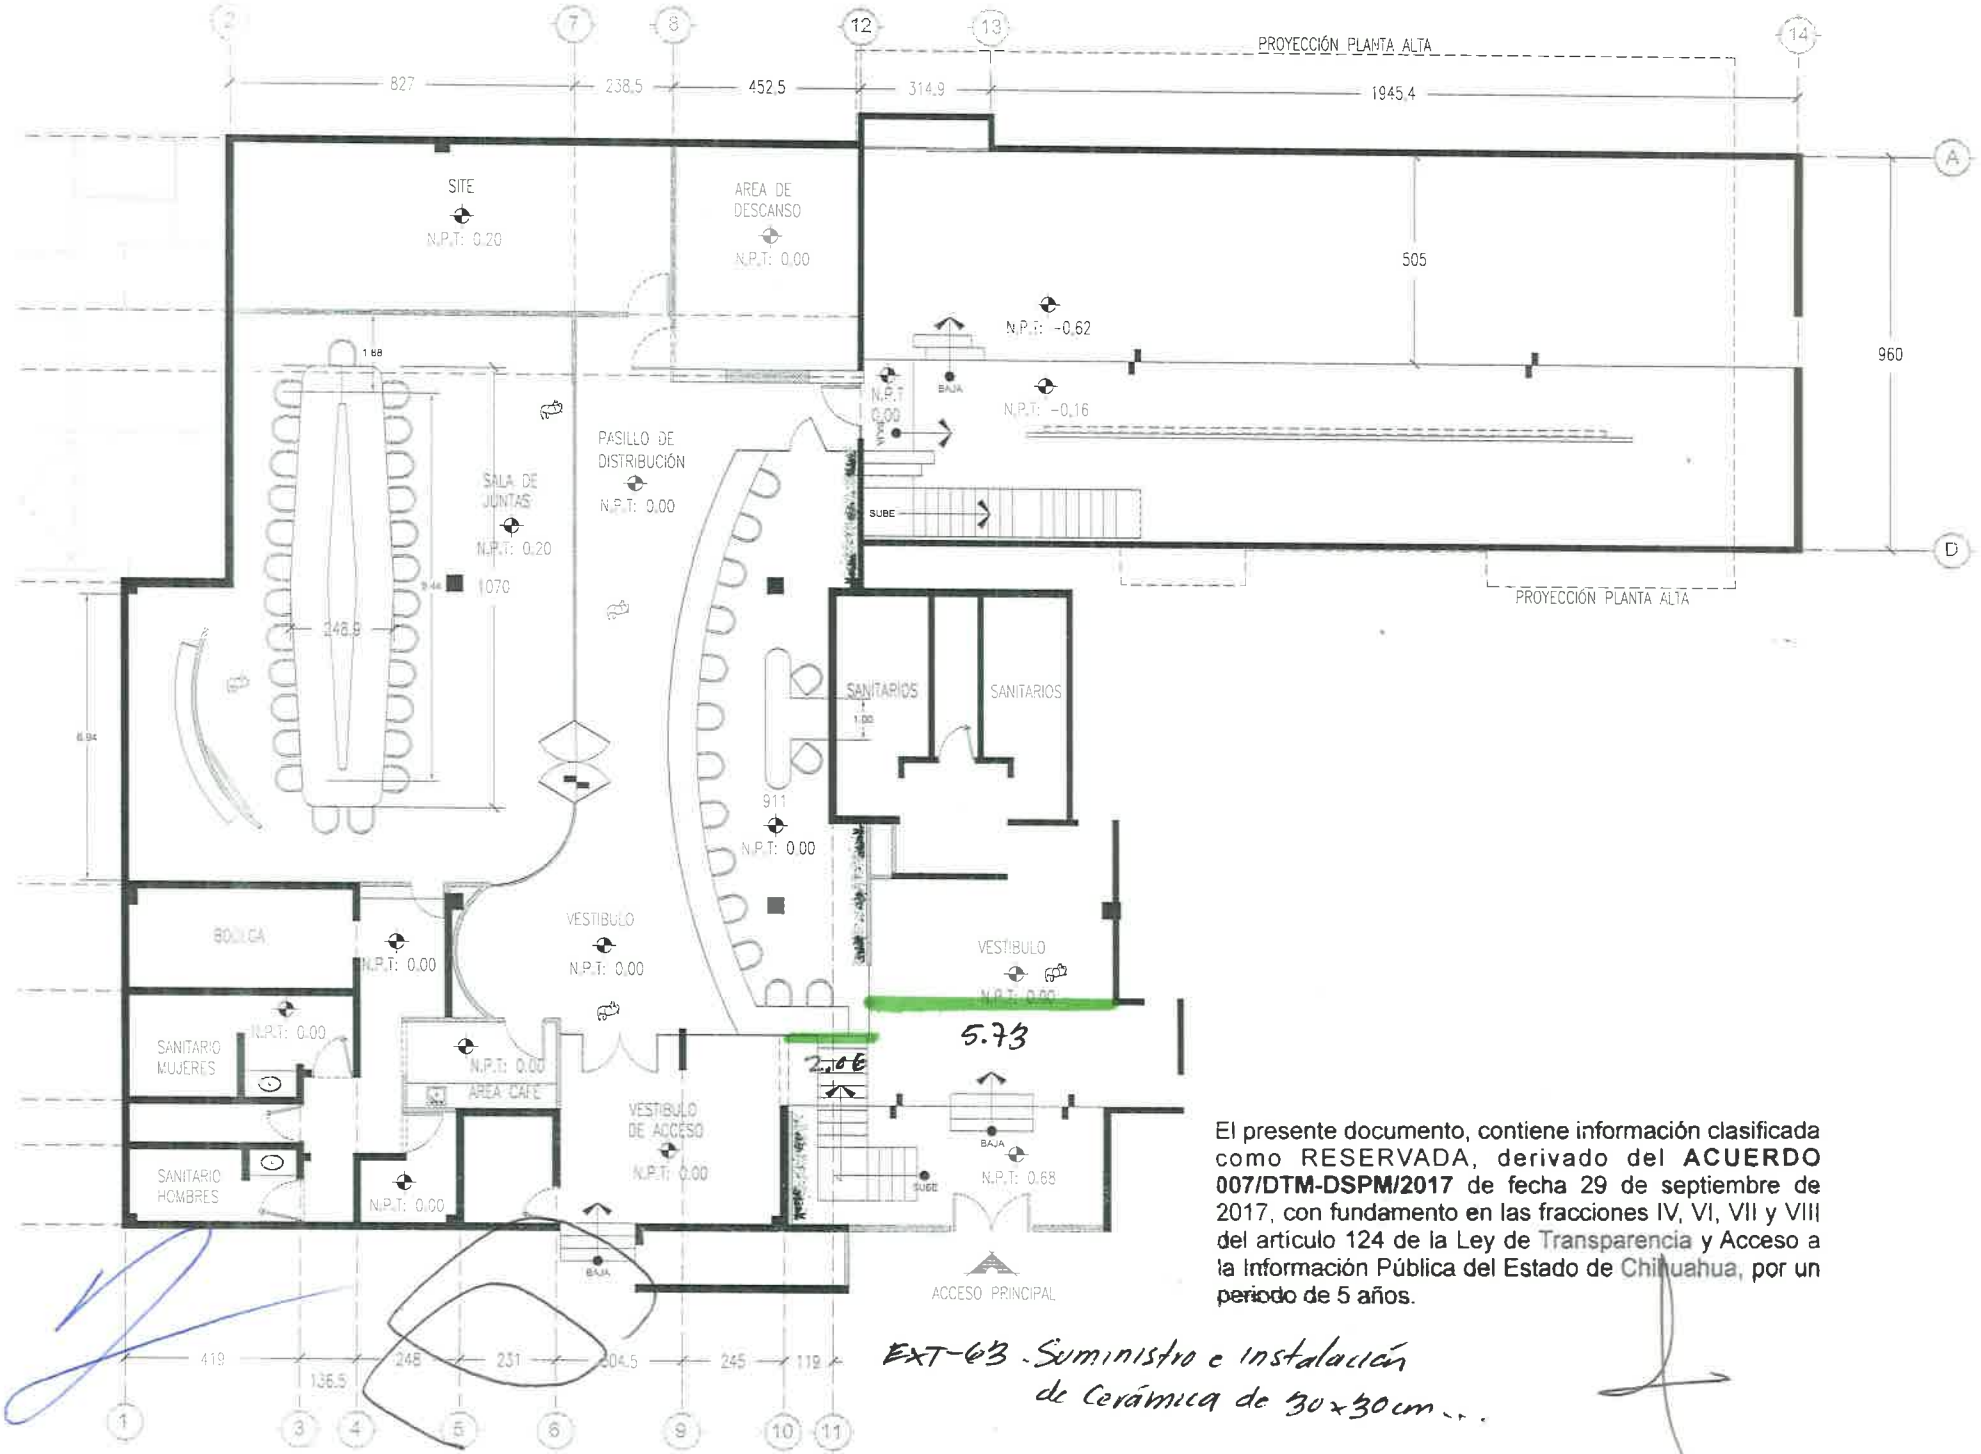

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-63. Suministro e instalación de Cerámica de 30x30cm...



EXT- 63

Suministro e instalación de cerámica Línea Metalic color aluminum para reparación de piso por demolición de sardinel existente en planta alta, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-64							
Suministro e instalación de cerámica en peraltes de escalones de 0.17 a 0.20 m de altura corte 45 o ángulo de aluminio de 1", con porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.			**Largo**	**Total**			
			1.98	1.98			
			13.39	13.39			
			2.59	2.59			
			0.53	0.53			
			1.39	1.39			
			0.34	0.34			
			0.34	0.34			
			1.44	1.44			
			0.64	0.64			
			1.48	1.48			
			0.64	0.64			
			TOTAL	**24.76**			**24.76**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

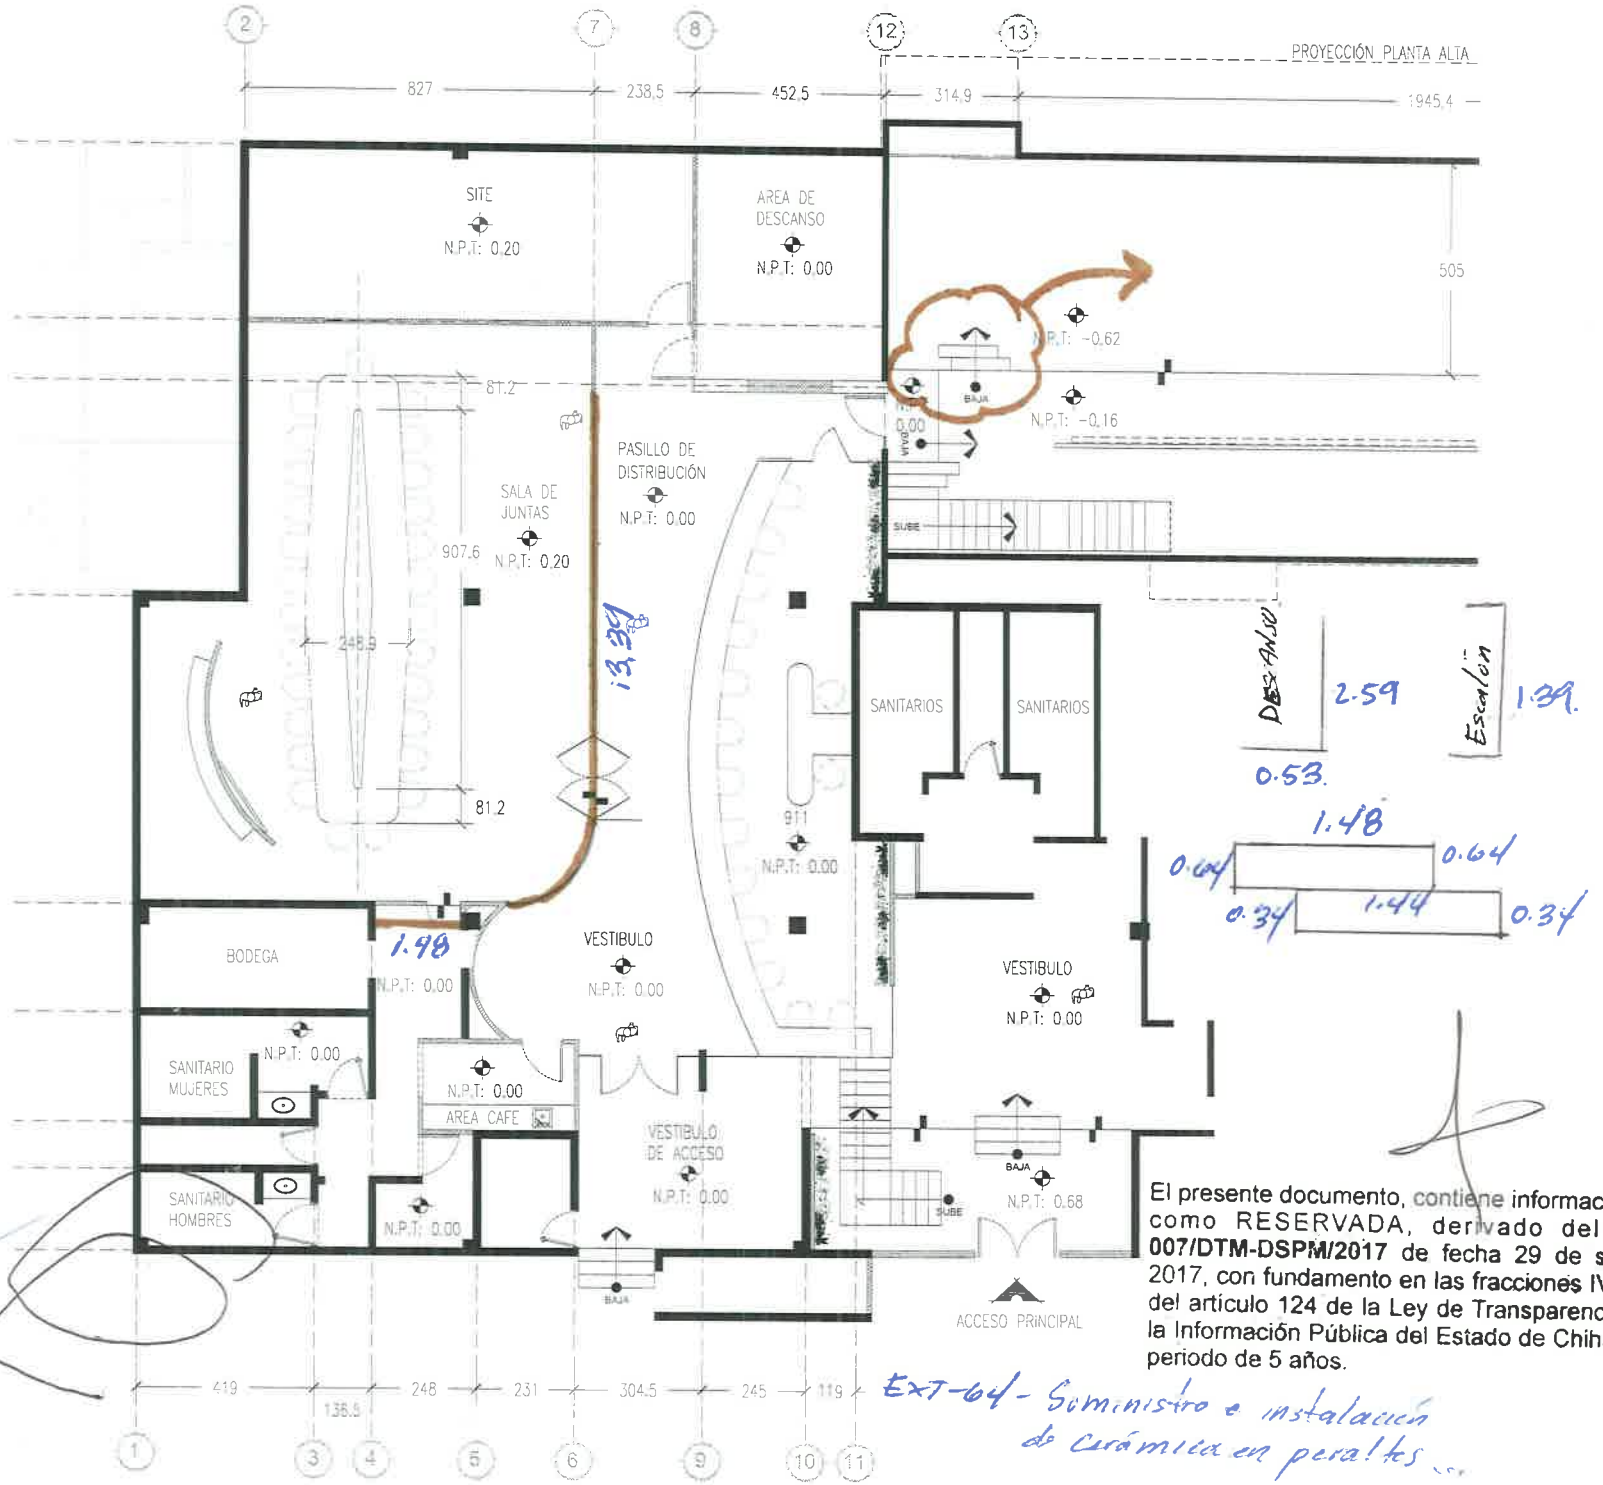

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-64 - Suministro e instalación de cerámica en peraltes ...





EXT- 64

Suministro e instalación de cerámica en peraltes de escalones de 0.17 a 0.20 m de altura corte 45 o ángulo de aluminio de 1", con porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-65						
Construcción de cajillo de tablaroca de 5 caras en cancel de acceso principal de (0.08+0.49+0.26+0.49+0.08 m.), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		6.17	6.17			
		TOTAL	**6.17**			**6.17**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

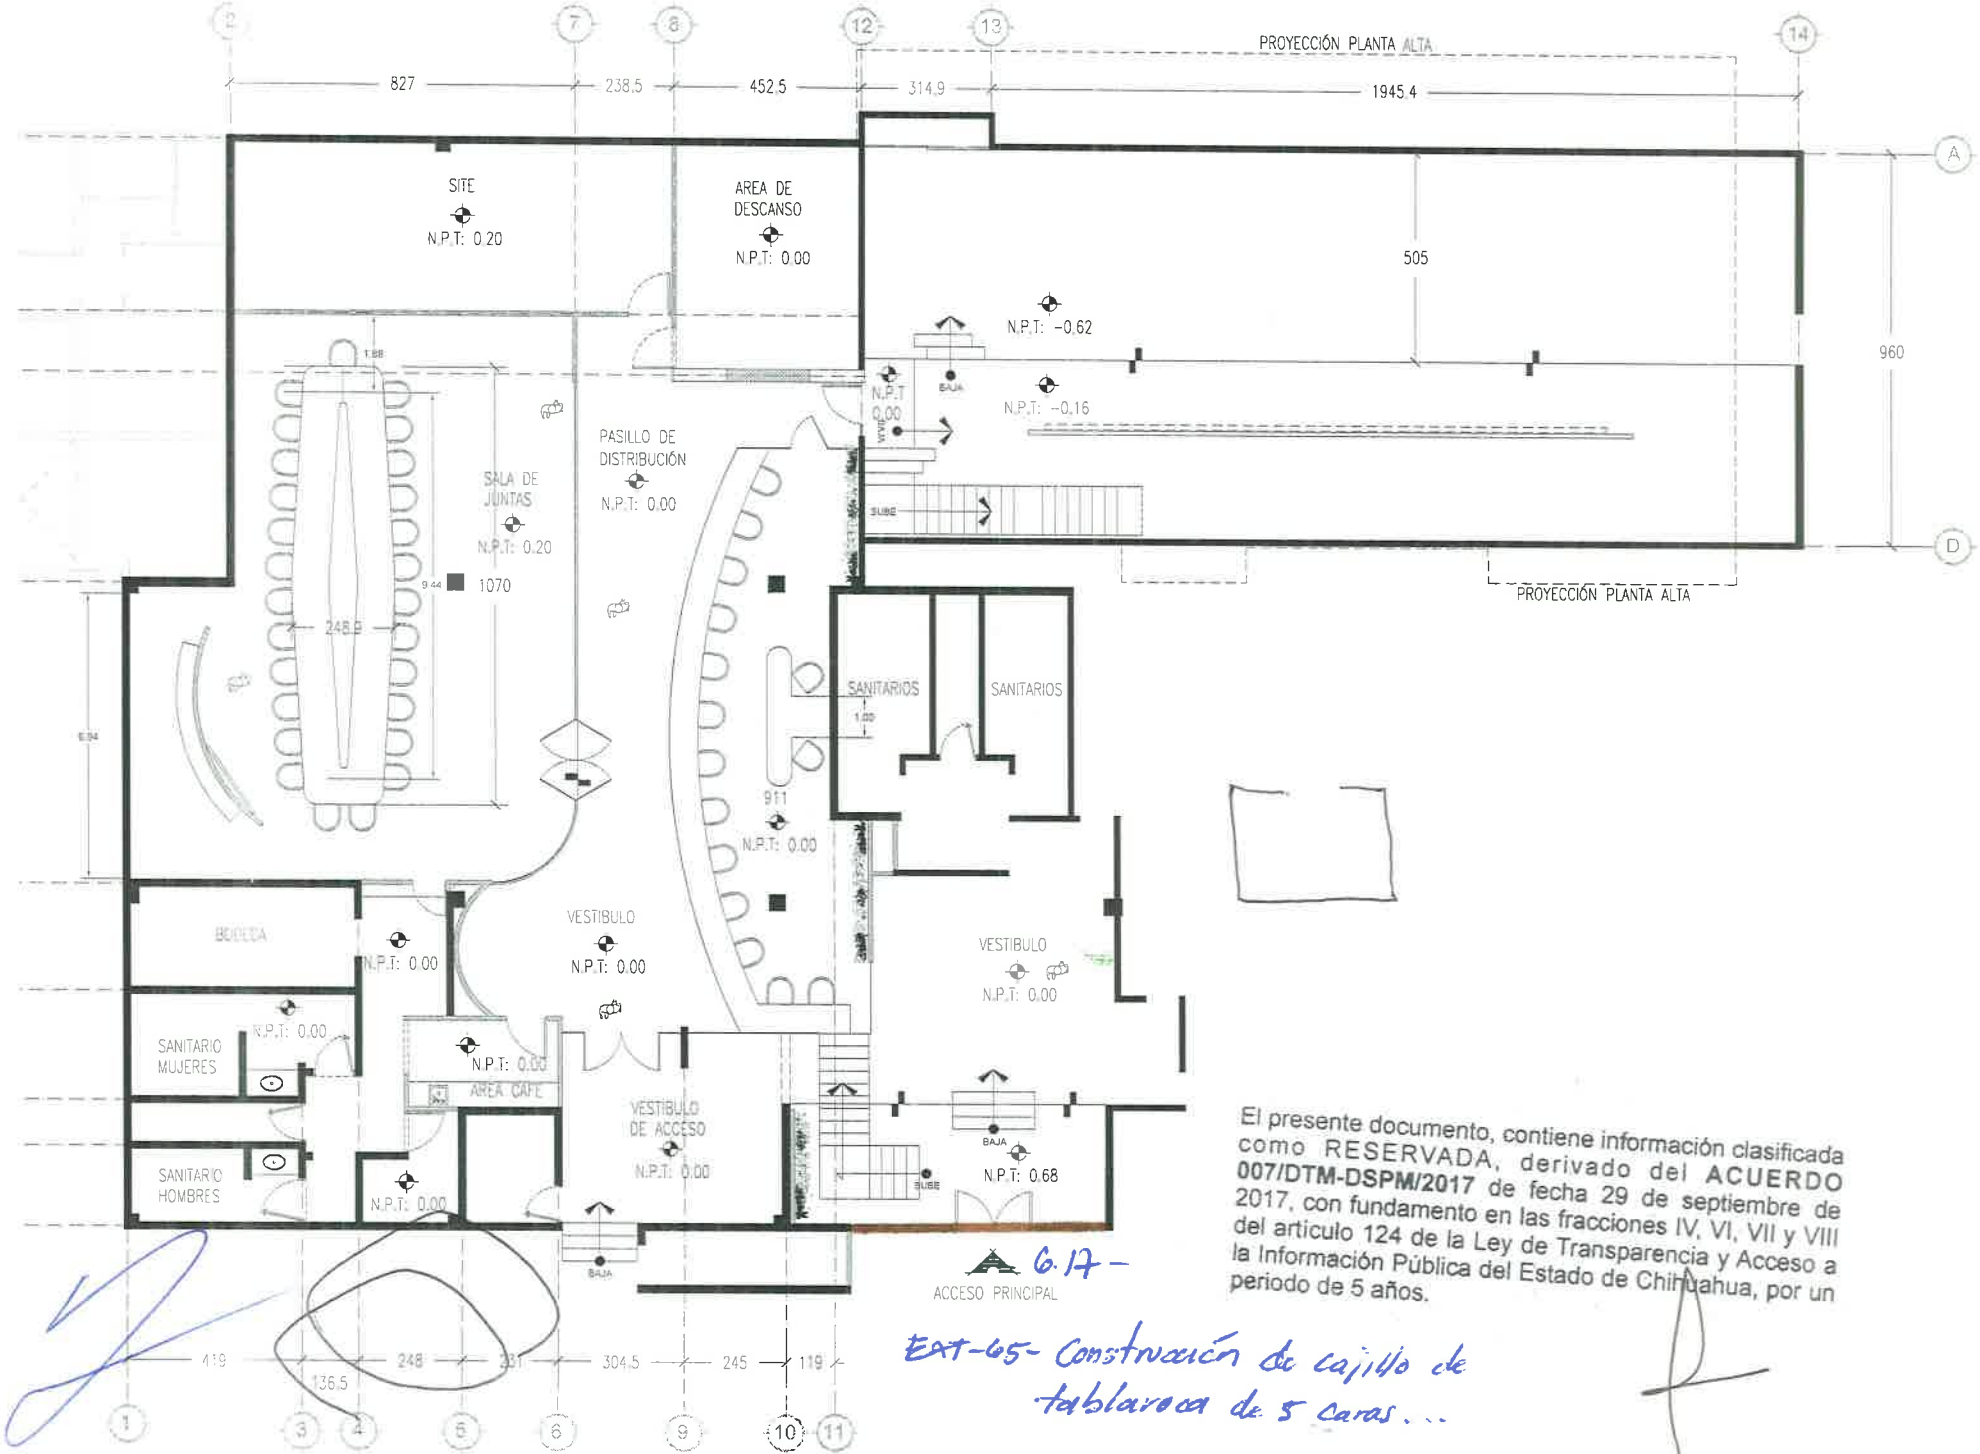

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-65- Construcción de cajillo de tablaroca de 5 caras...

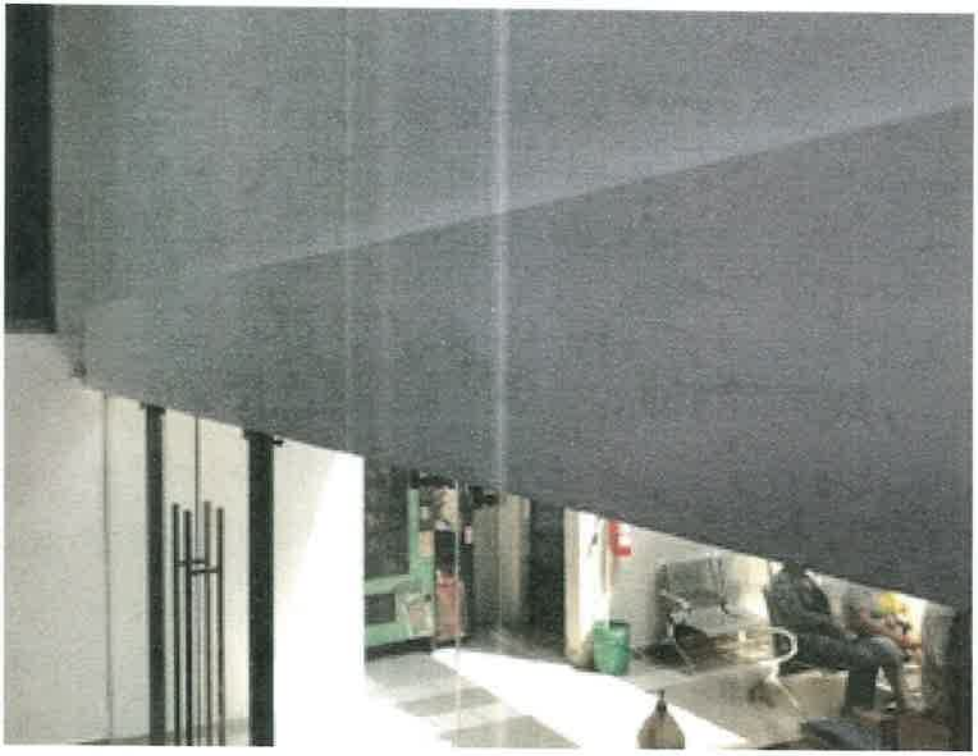

EXT- 65

Construcción de cajillo de tablaroca de 5 caras en cancel de acceso principal de (0.08+0.49+0.26+0.49+0.08 m.), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-67						
		Largo	**Total**			
Construcción de cajillo "U" de Tablaroca curvo en cancel de 911, de 0.10 x 0.10 x 0.10 m., incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		14.25	14.25			
		TOTAL	**14.25**			**14.25**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

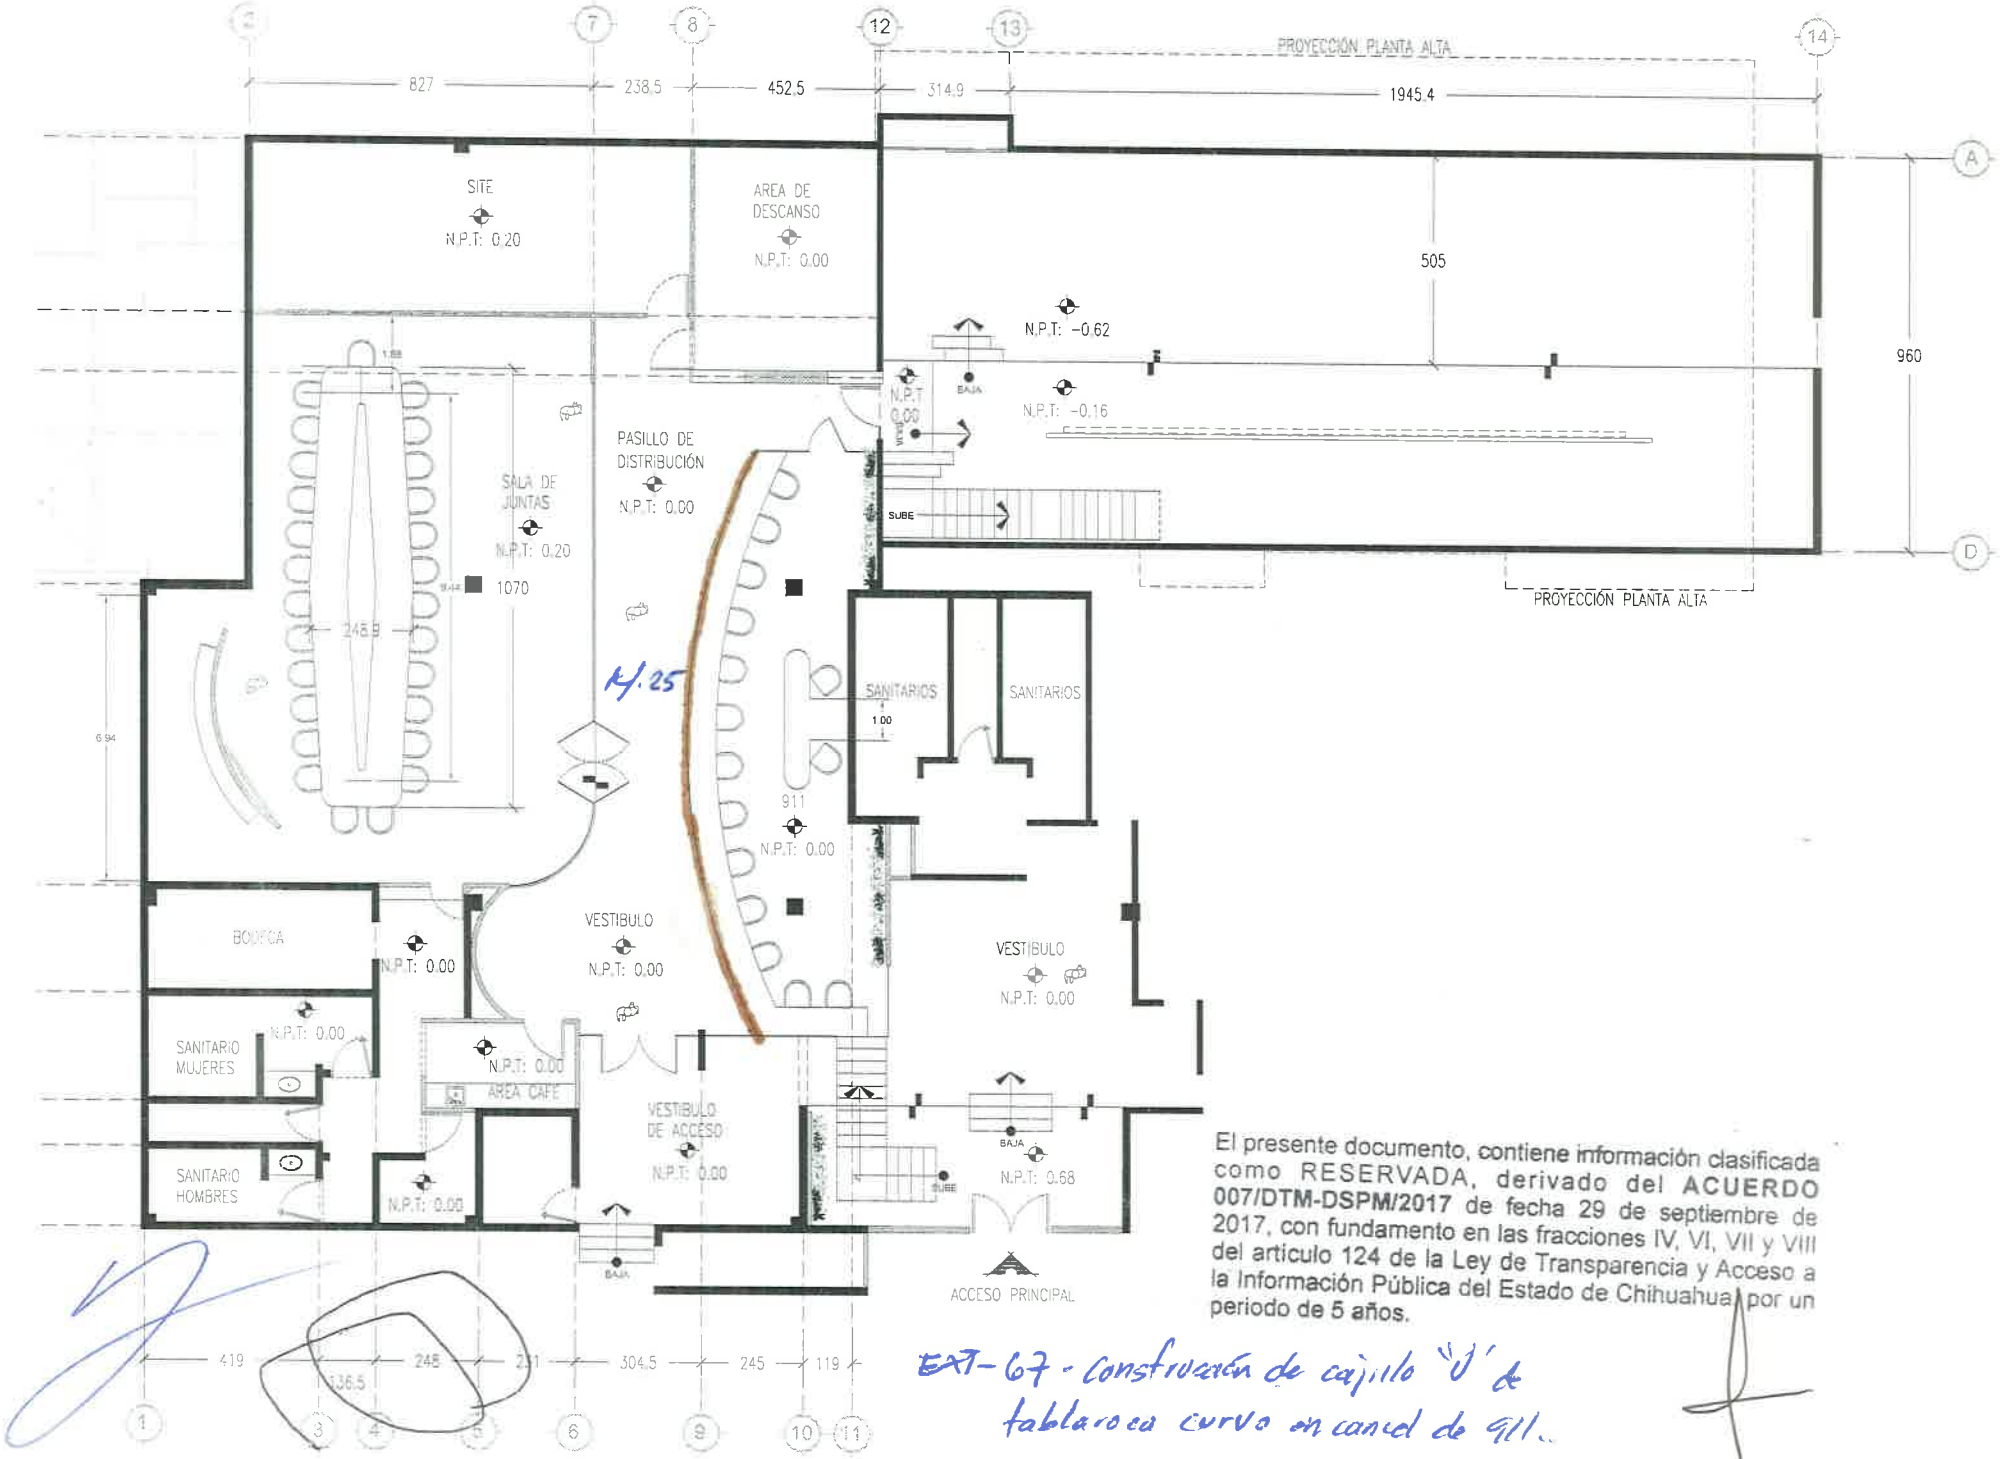

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua por un periodo de 5 años.

EXT-67 - Construcción de cajillo "J" de tablaroca curvo en canal de 911..



EXT- 67

Construcción de cajillo "U" de Tablaroca curvo en cancel de 911, de 0.10 x 0.10 x 0.10 m., incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-68					
Reparación de muro de tablaroca (por desmantelamiento de zoclo de cerámica) en armería y vestíbulo, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
	ARMERIA				
		1.28	1.28		
		0.49	0.49		
	VESTIBULO BAÑOS ENTRADA				
		1.90	1.90		
		2.06	2.06		
		0.57	0.57		
		1.42	1.42		
		TOTAL	**7.72**		**7.72**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

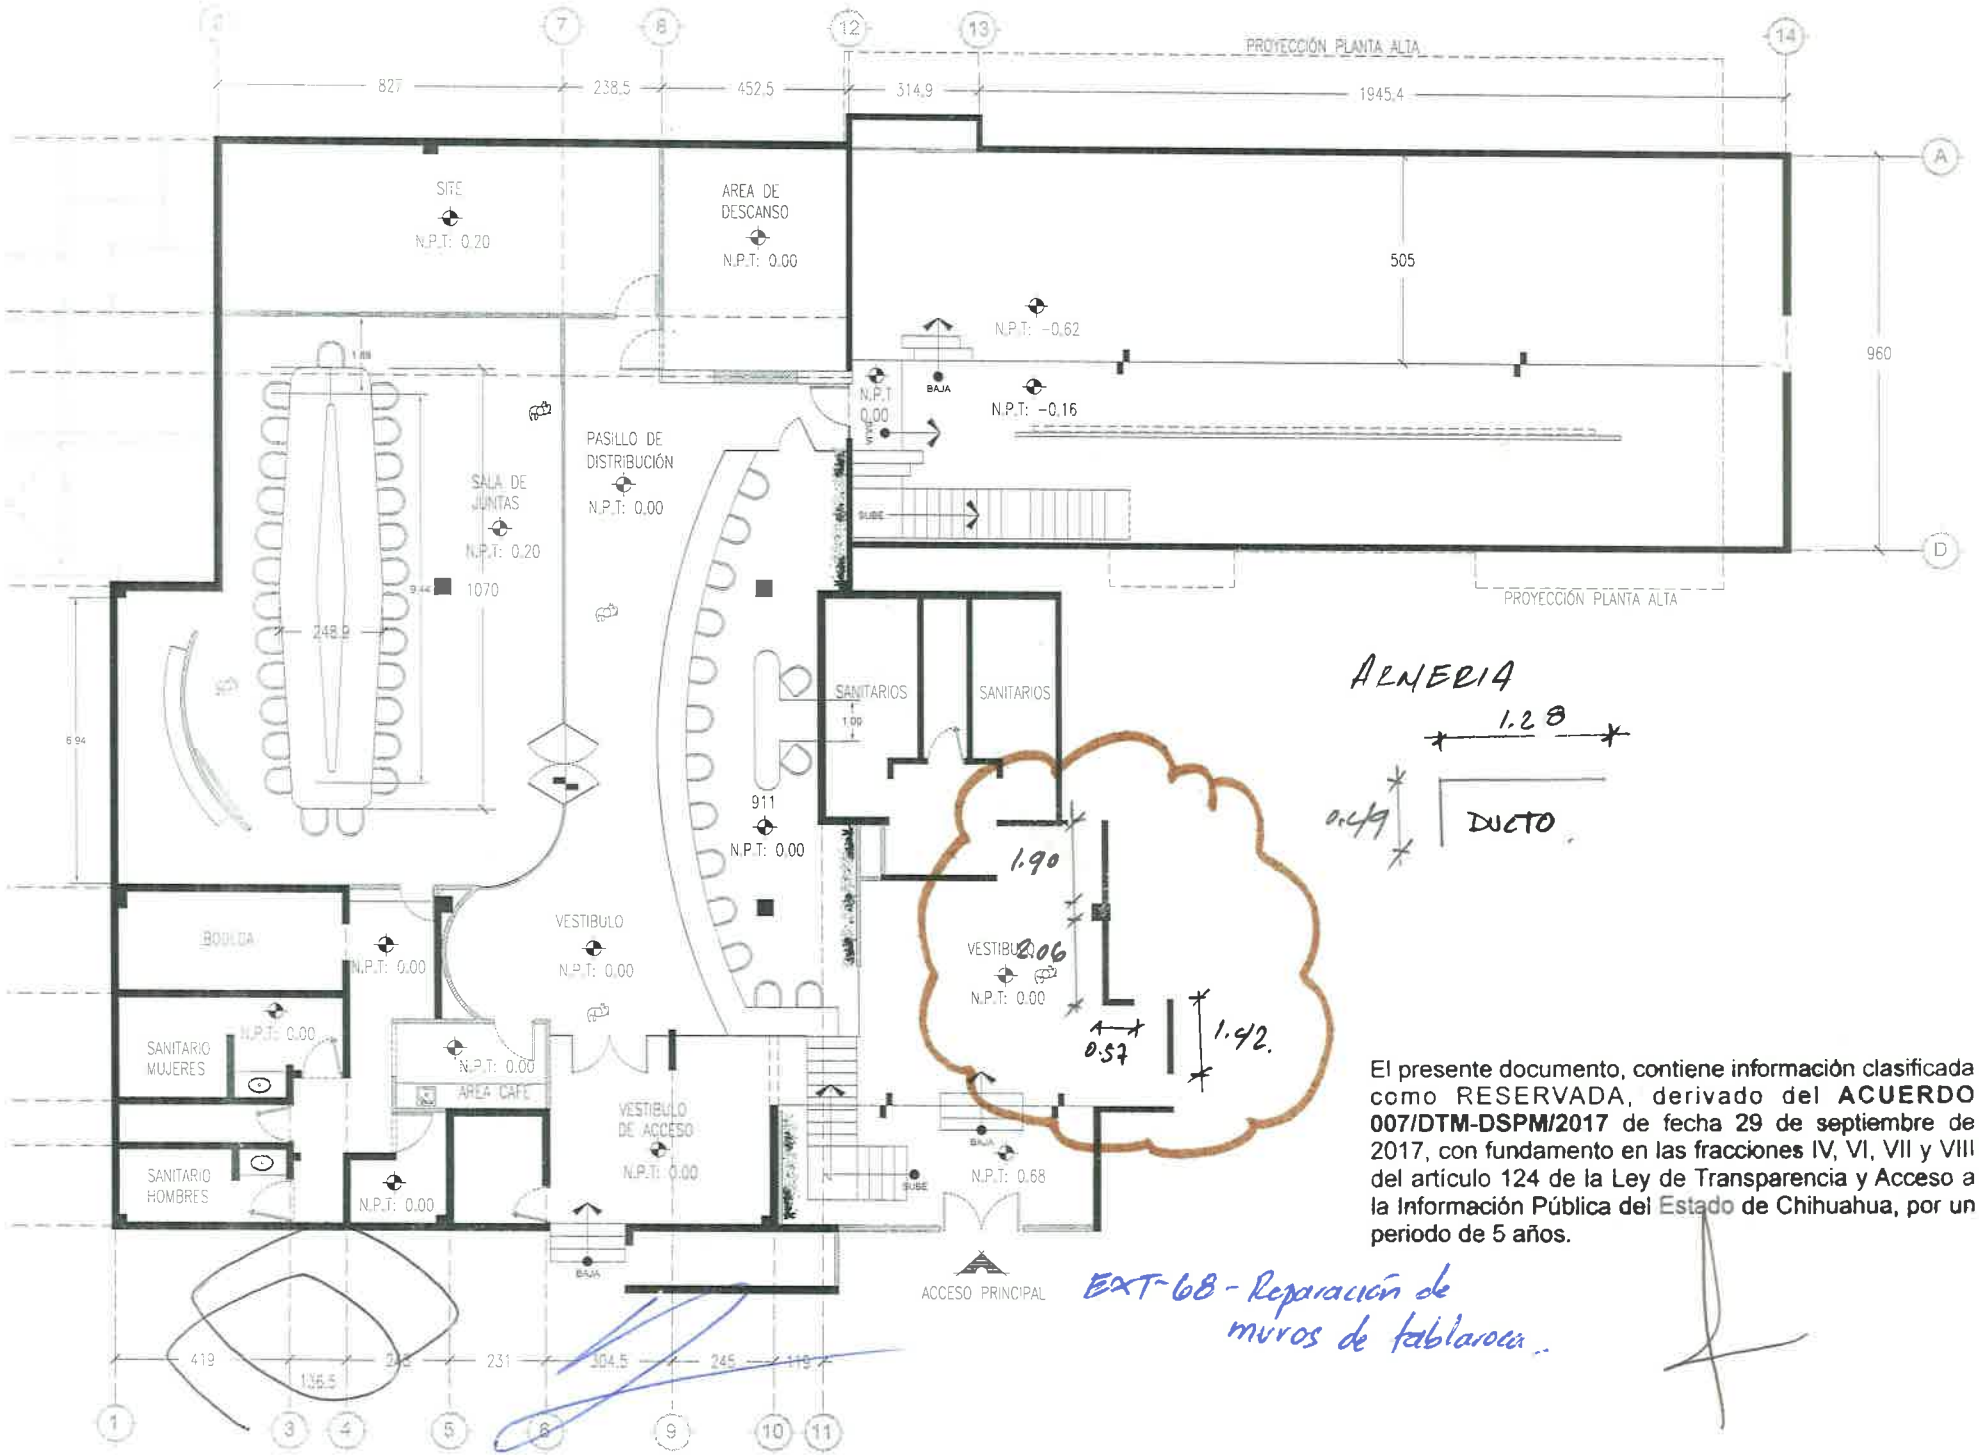

ALMERIA

1.20

0.49

DUCTO

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-68 - Reparación de muros de tablaroca..



EXT- 68

Reparación de muro de tablaroca (por desmantelamiento de zoclo de cerámica) en armería y vestíbulo, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-69					
		Pieza	**Total**		
Suministro e instalación de muro curvo touch de 5.20 x 2.45 m, fabricado en muro doble de Tablaroca, estructura metálica para pantalla a base de PTR de 2", incluye: pantalla touch de 80" marca Sharp, dispositivo inalámbrico que se comunica a través de bluetooth para proyectar a los monitores de la mesa de juntas, fotos, videos, etc. que transmiten diferentes dispositivos como computadoras o Smart phone, tabletas, etc. (Black box), tendido de línea con cable HDMI a cada monitor, revestimiento frontal con duela color nogal y escritorio de trabajo curvo de nogal en la parte posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	1.00		**1.00**
		TOTAL	**1.00**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

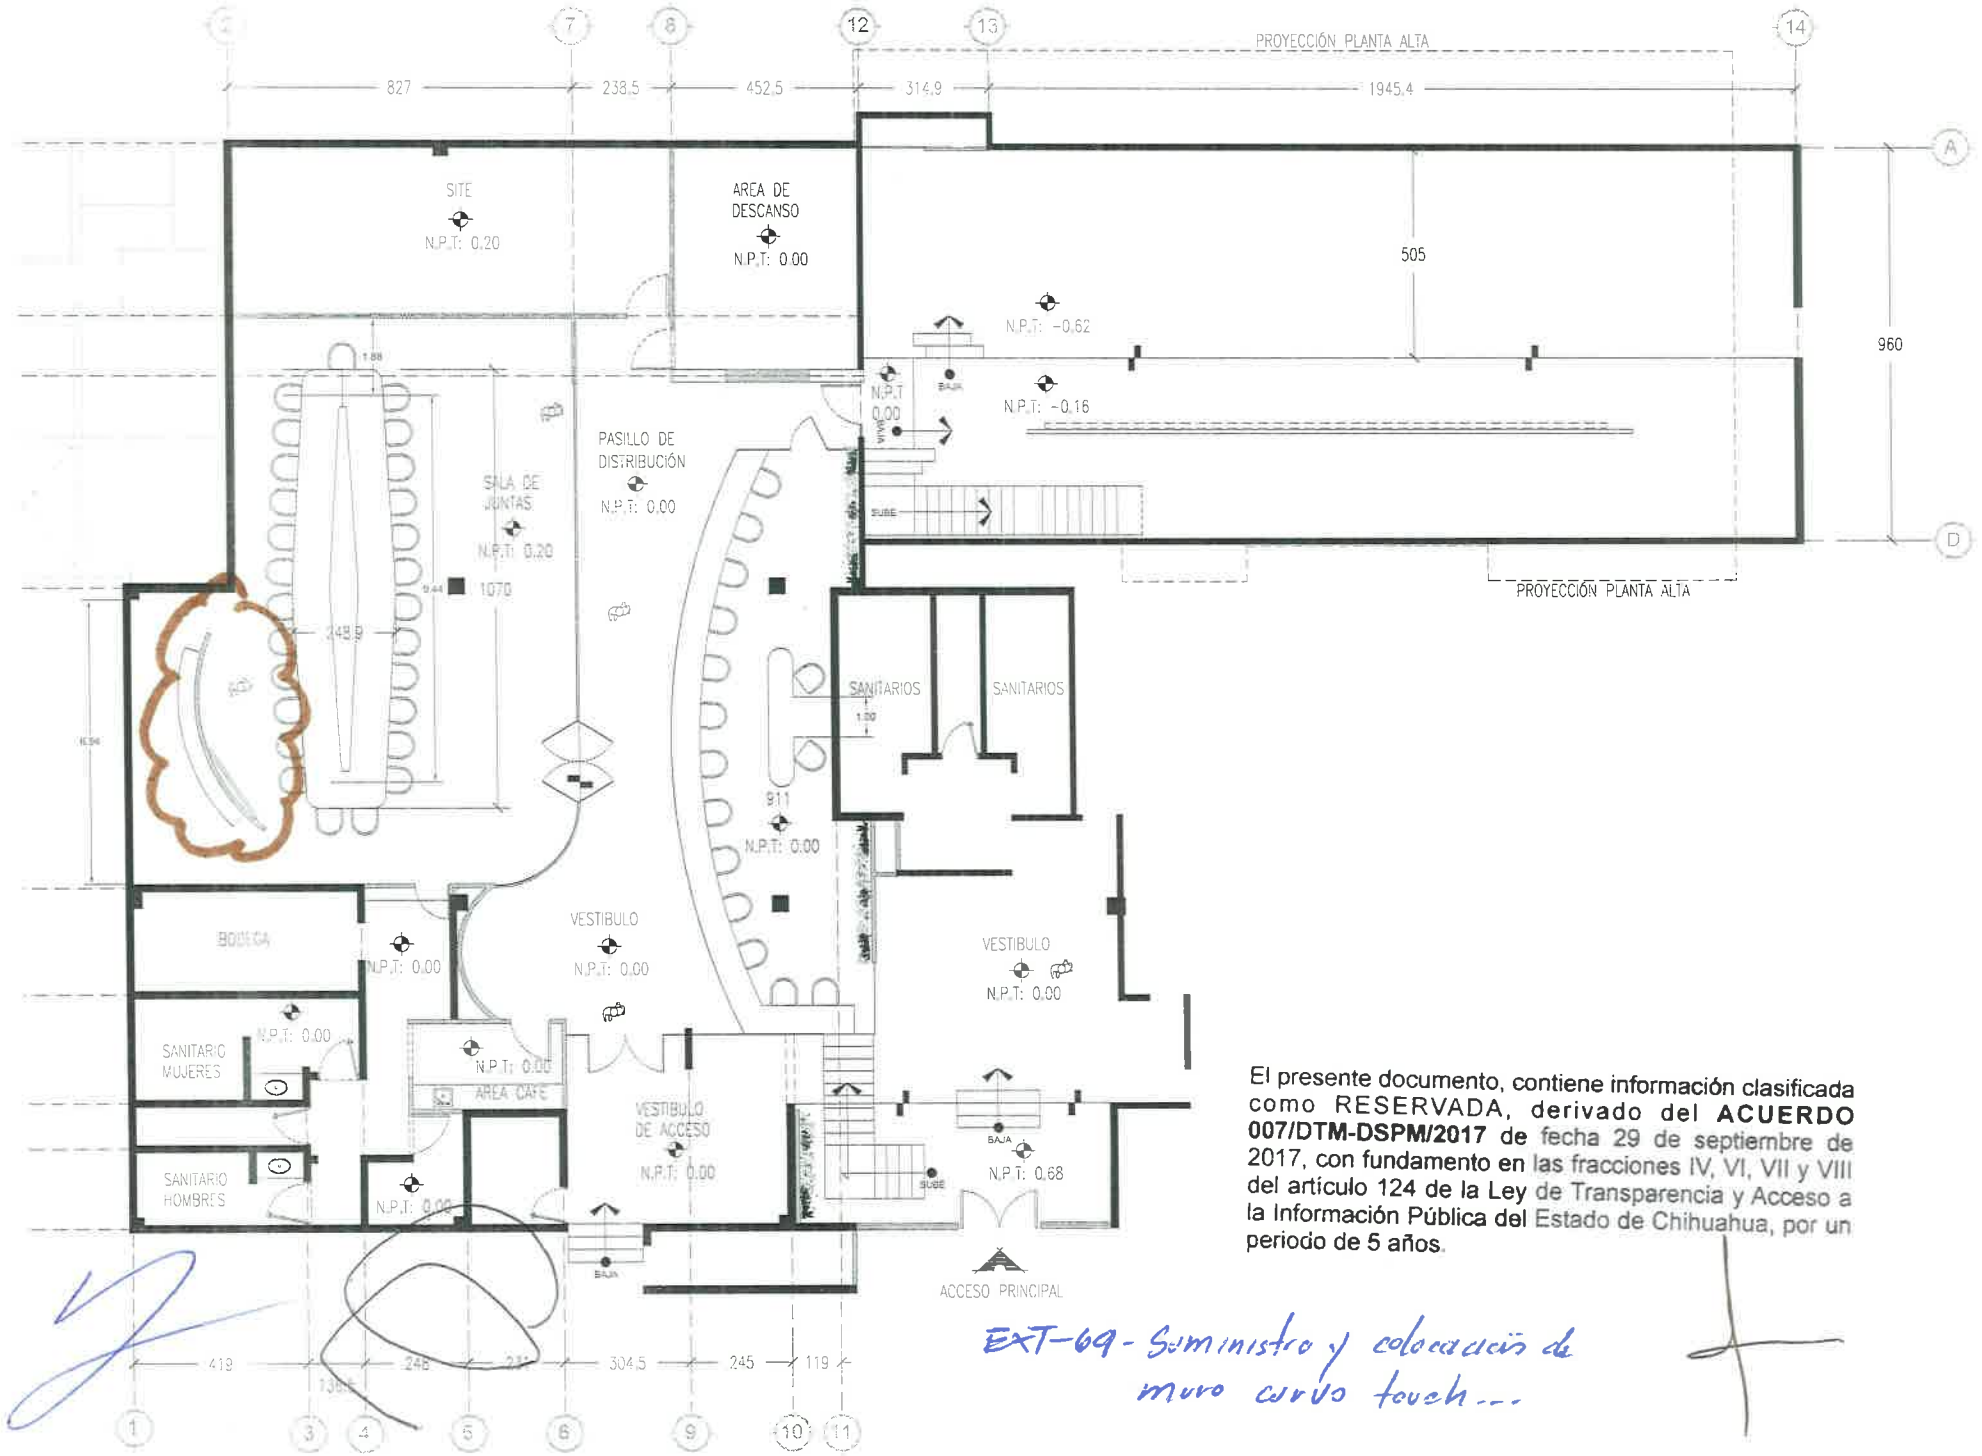

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-69 - Suministro y colocación de muro curvo tovch...



EXT- 69

Suministro e instalación de muro curvo touch de 5.20 x 2.45 m, fabricado en muro doble de Tablaroca, estructura metálica para pantalla a base de PTR de 2", incluye: pantalla touch de 80" marca Sharp, dispositivo inalámbrico que se comunica a través de bluetooth para proyectar a los monitores de la mesa de juntas, fotos, videos, etc. que transmiten diferentes dispositivos como

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-70						
Detalle de yeso en ciber operadores de 2.50 ml. por altura variable de o.60 a 1.10 m., incluye preparación de la superficie consistente en rebajar protuberancias existentes, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

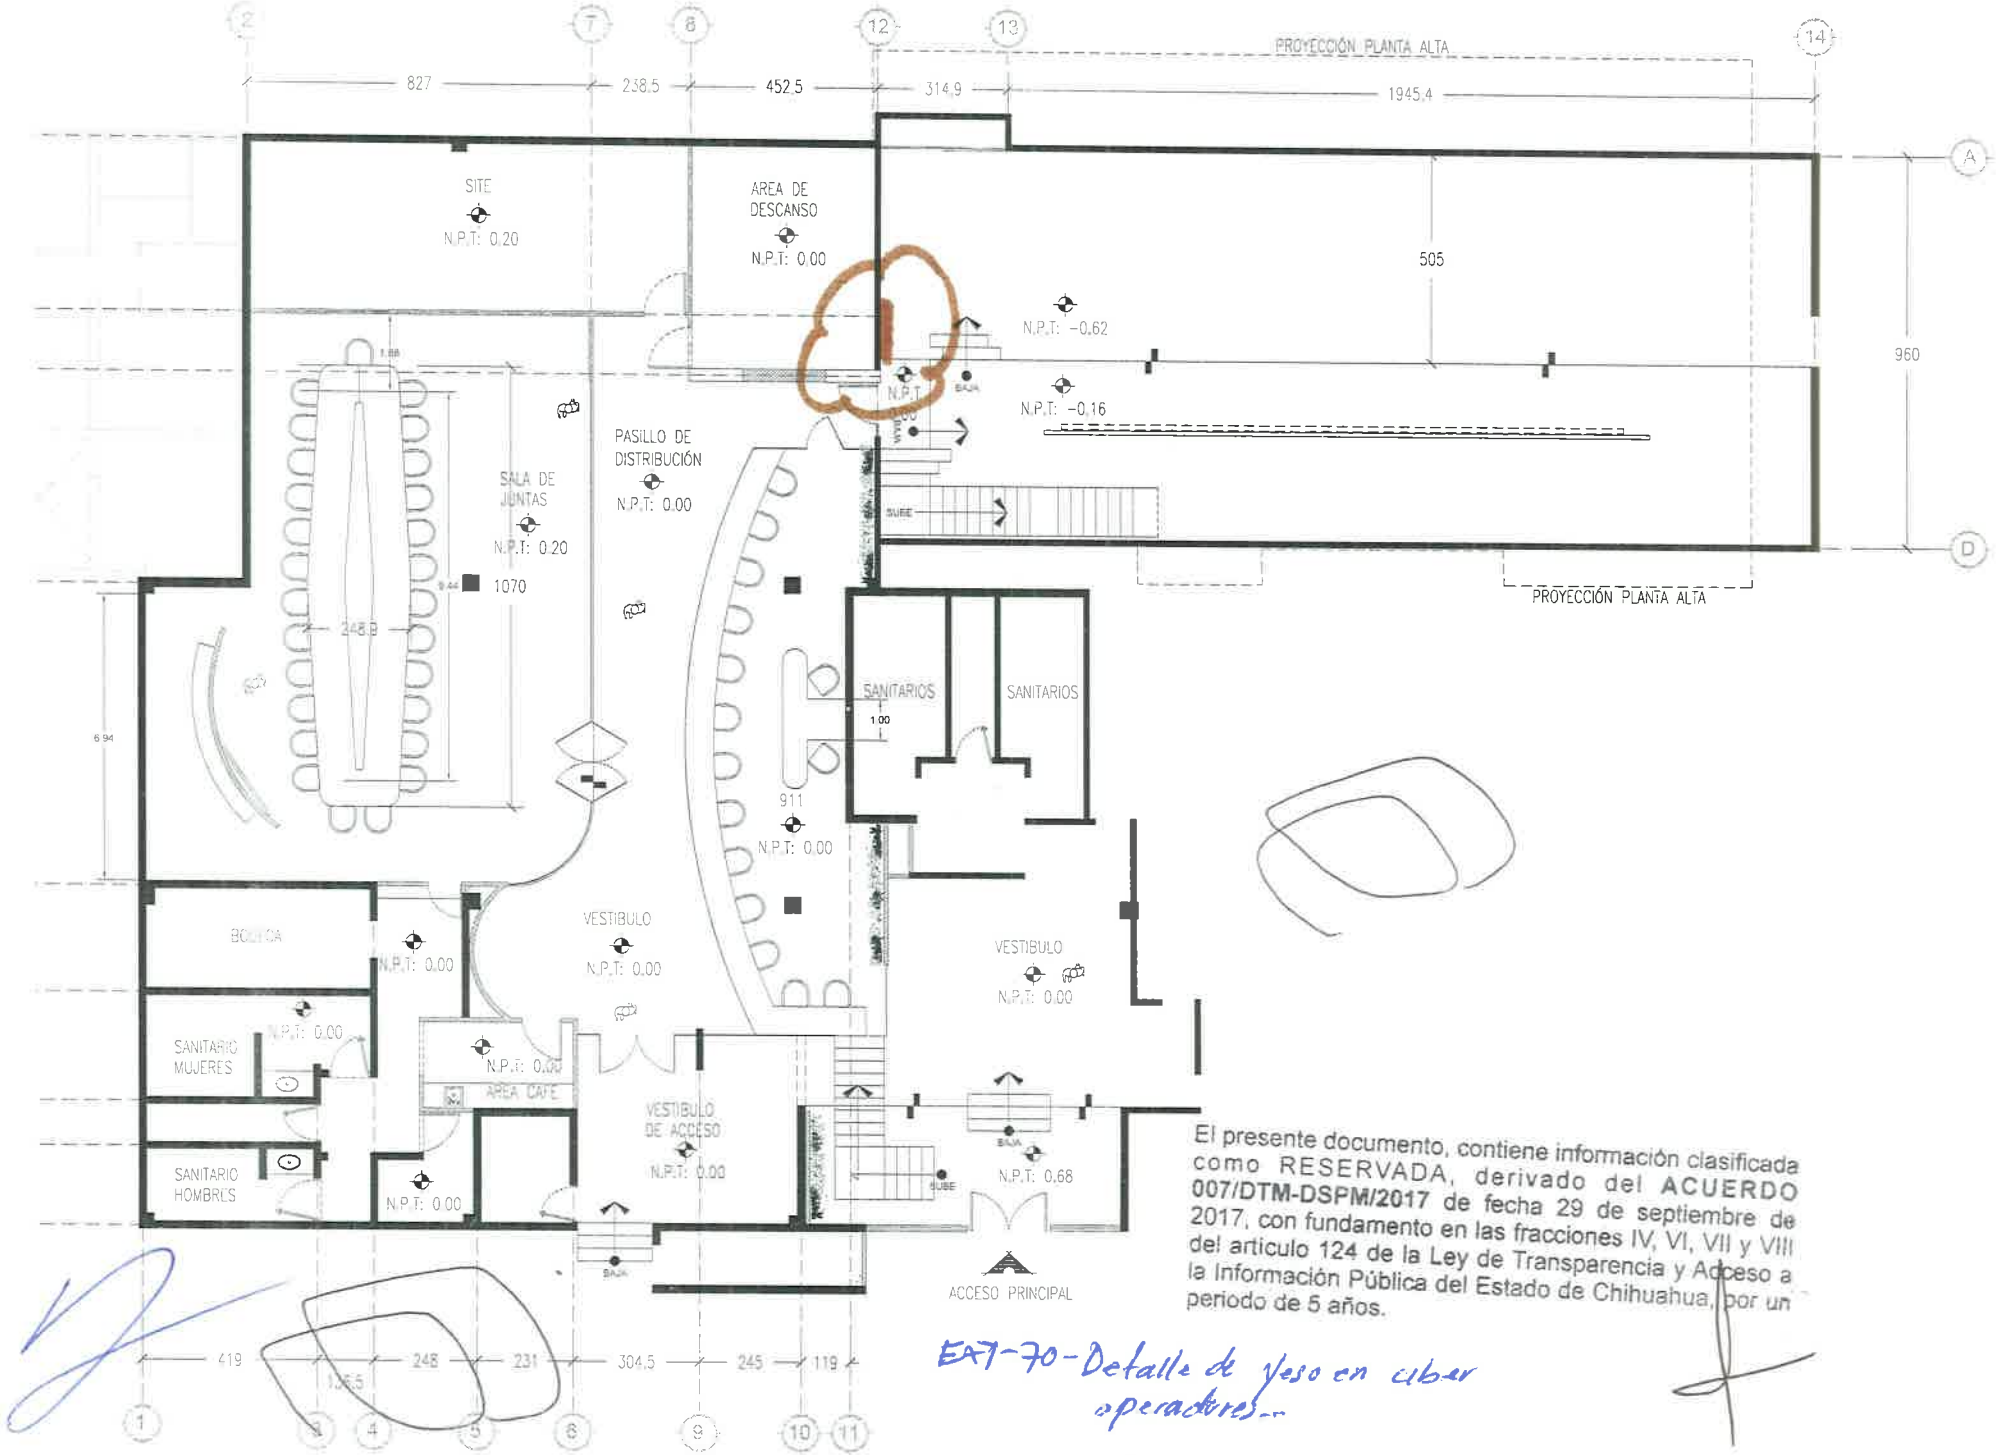

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EA7-70-Detalle de yeso en cubo operadores...



EXT- 70

Detalle de yeso en ciber operadores de 2.50 ml. por altura variable de o.60 a 1.10 m., incluye preparación de la superficie consistente en rebajar protuberancias existentes, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-71					
Bajada de agua pluvial de PVC de 4" de 4.00 m. en comedor, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		2.00	2.00		
		TOTAL	**2.00**		**2.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

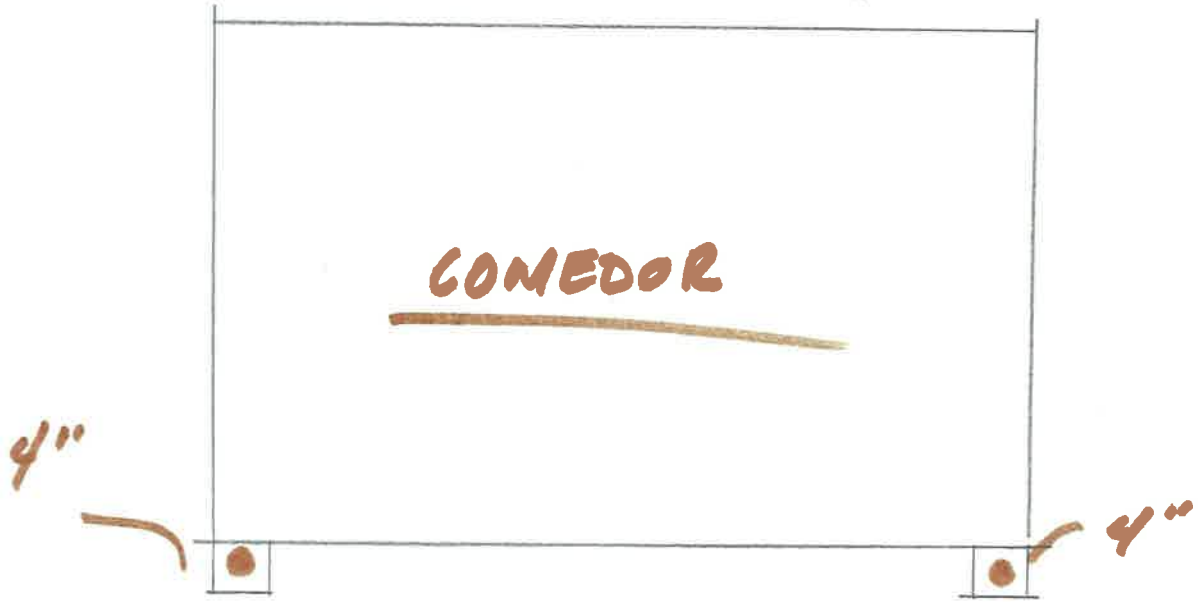

EXT -71 - Bajada pluvial de PVC..

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 71 Bajada de agua pluvial de PVC de 4" de 4.00 m. en comedor, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-72					
		Pieza	**Total**		
Reparación de fuga en dren de mini Split existente. Incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

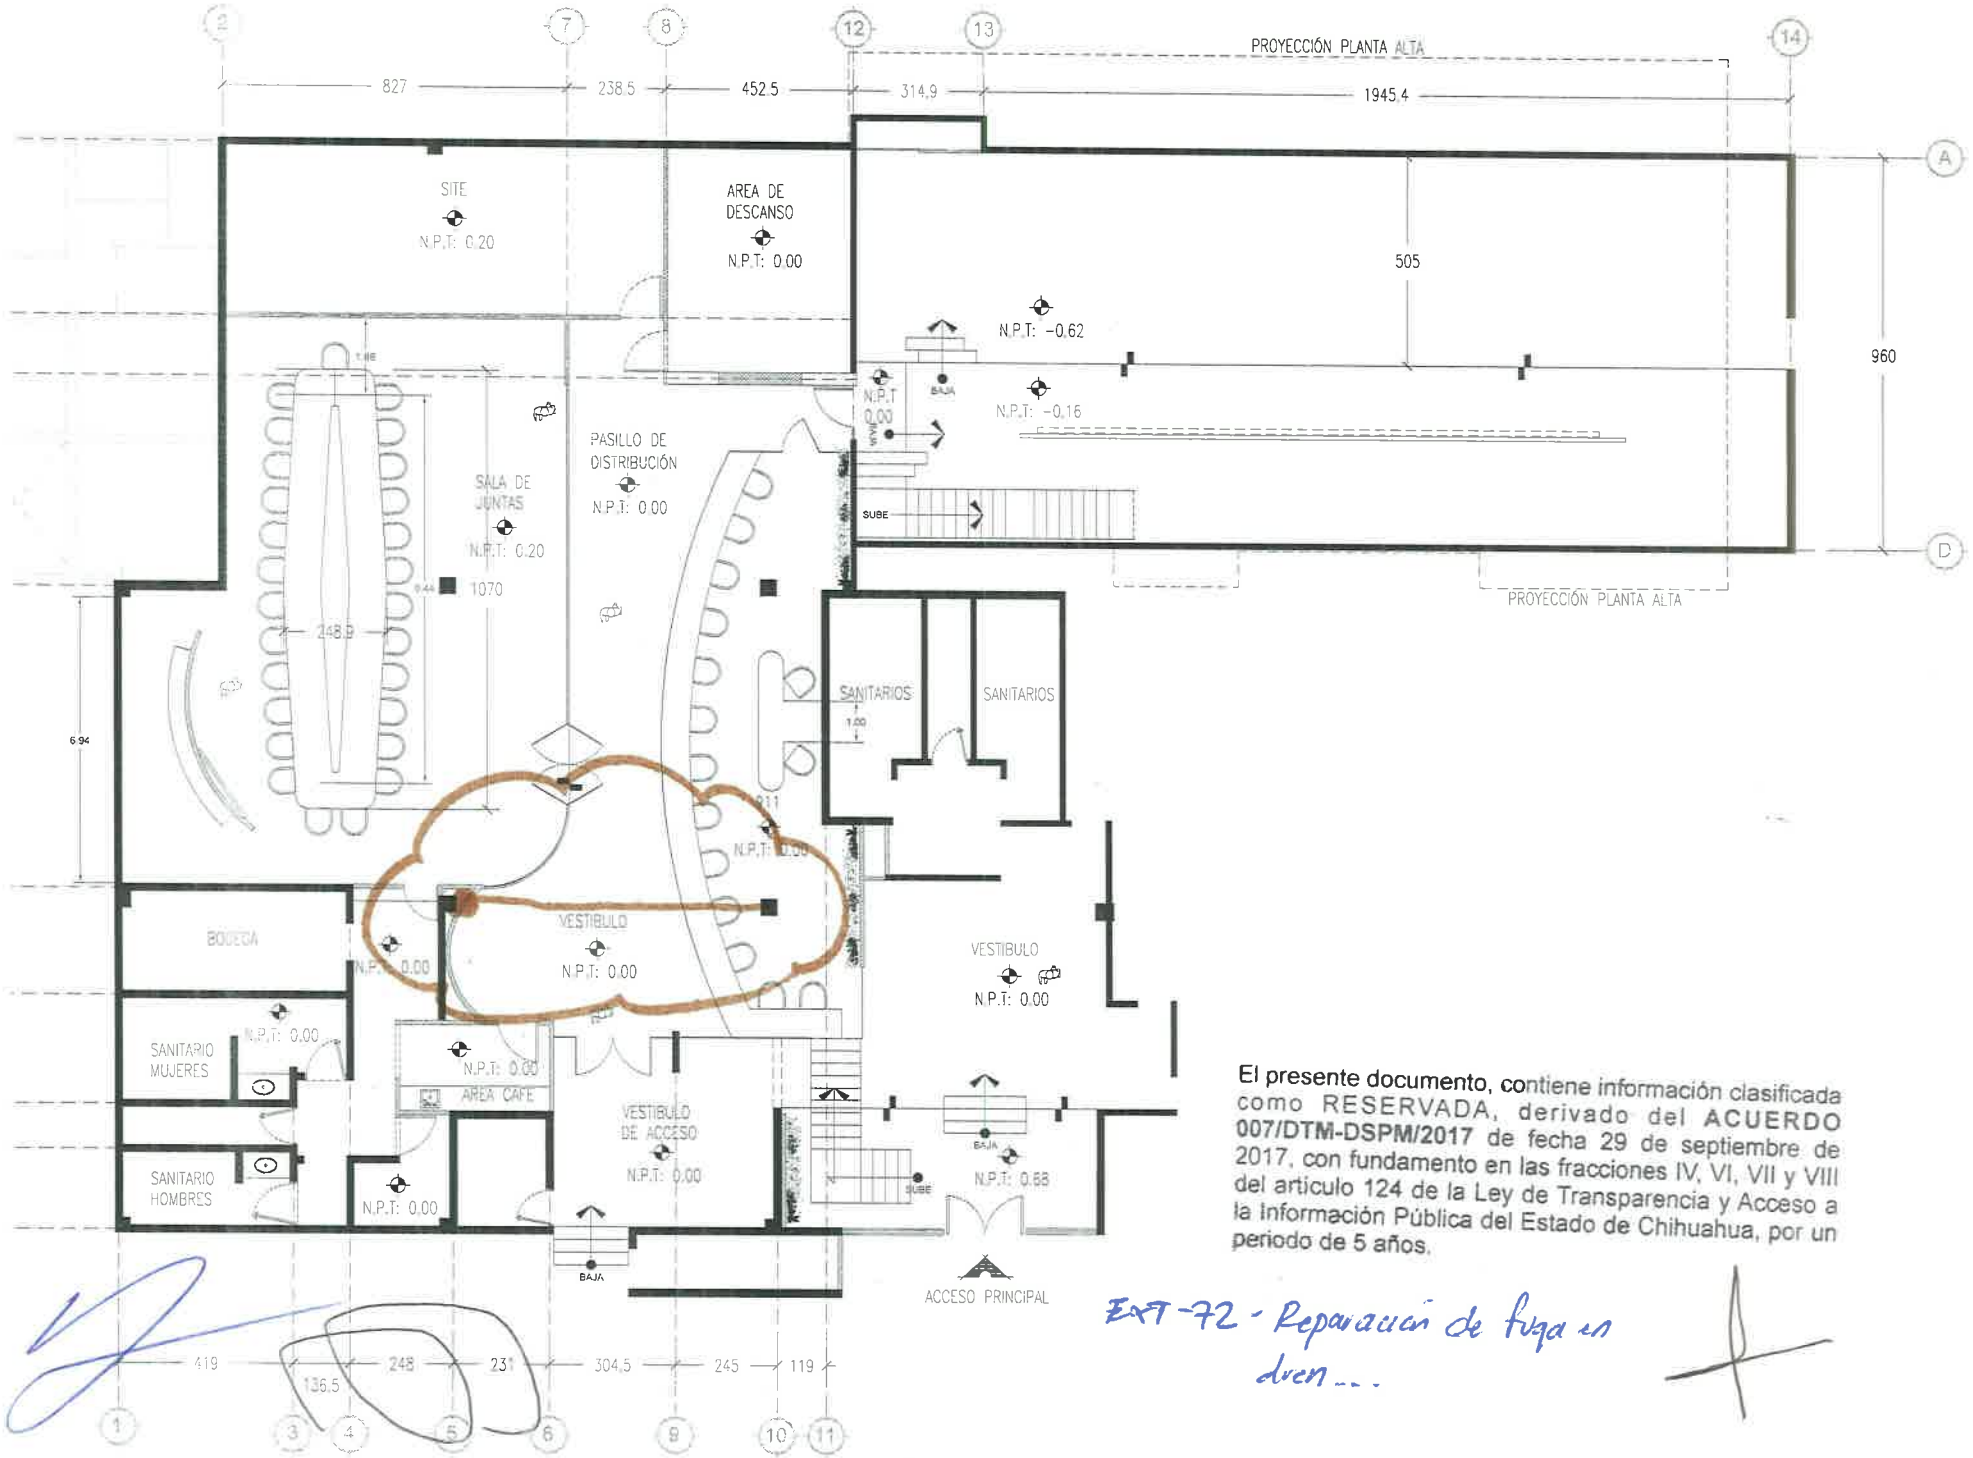

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-72 - Reparación de fuga en dren...



EXT- 72 Reparación de fuga en dren de mini Split existente. Incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-73					
		Pieza	**Total**		
Mantenimiento y revisión de UPS y revisión de banco de baterías de 60 KVA, incluye solo mano de obra, herramienta (no incluye reparación y cambio de baterías) y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

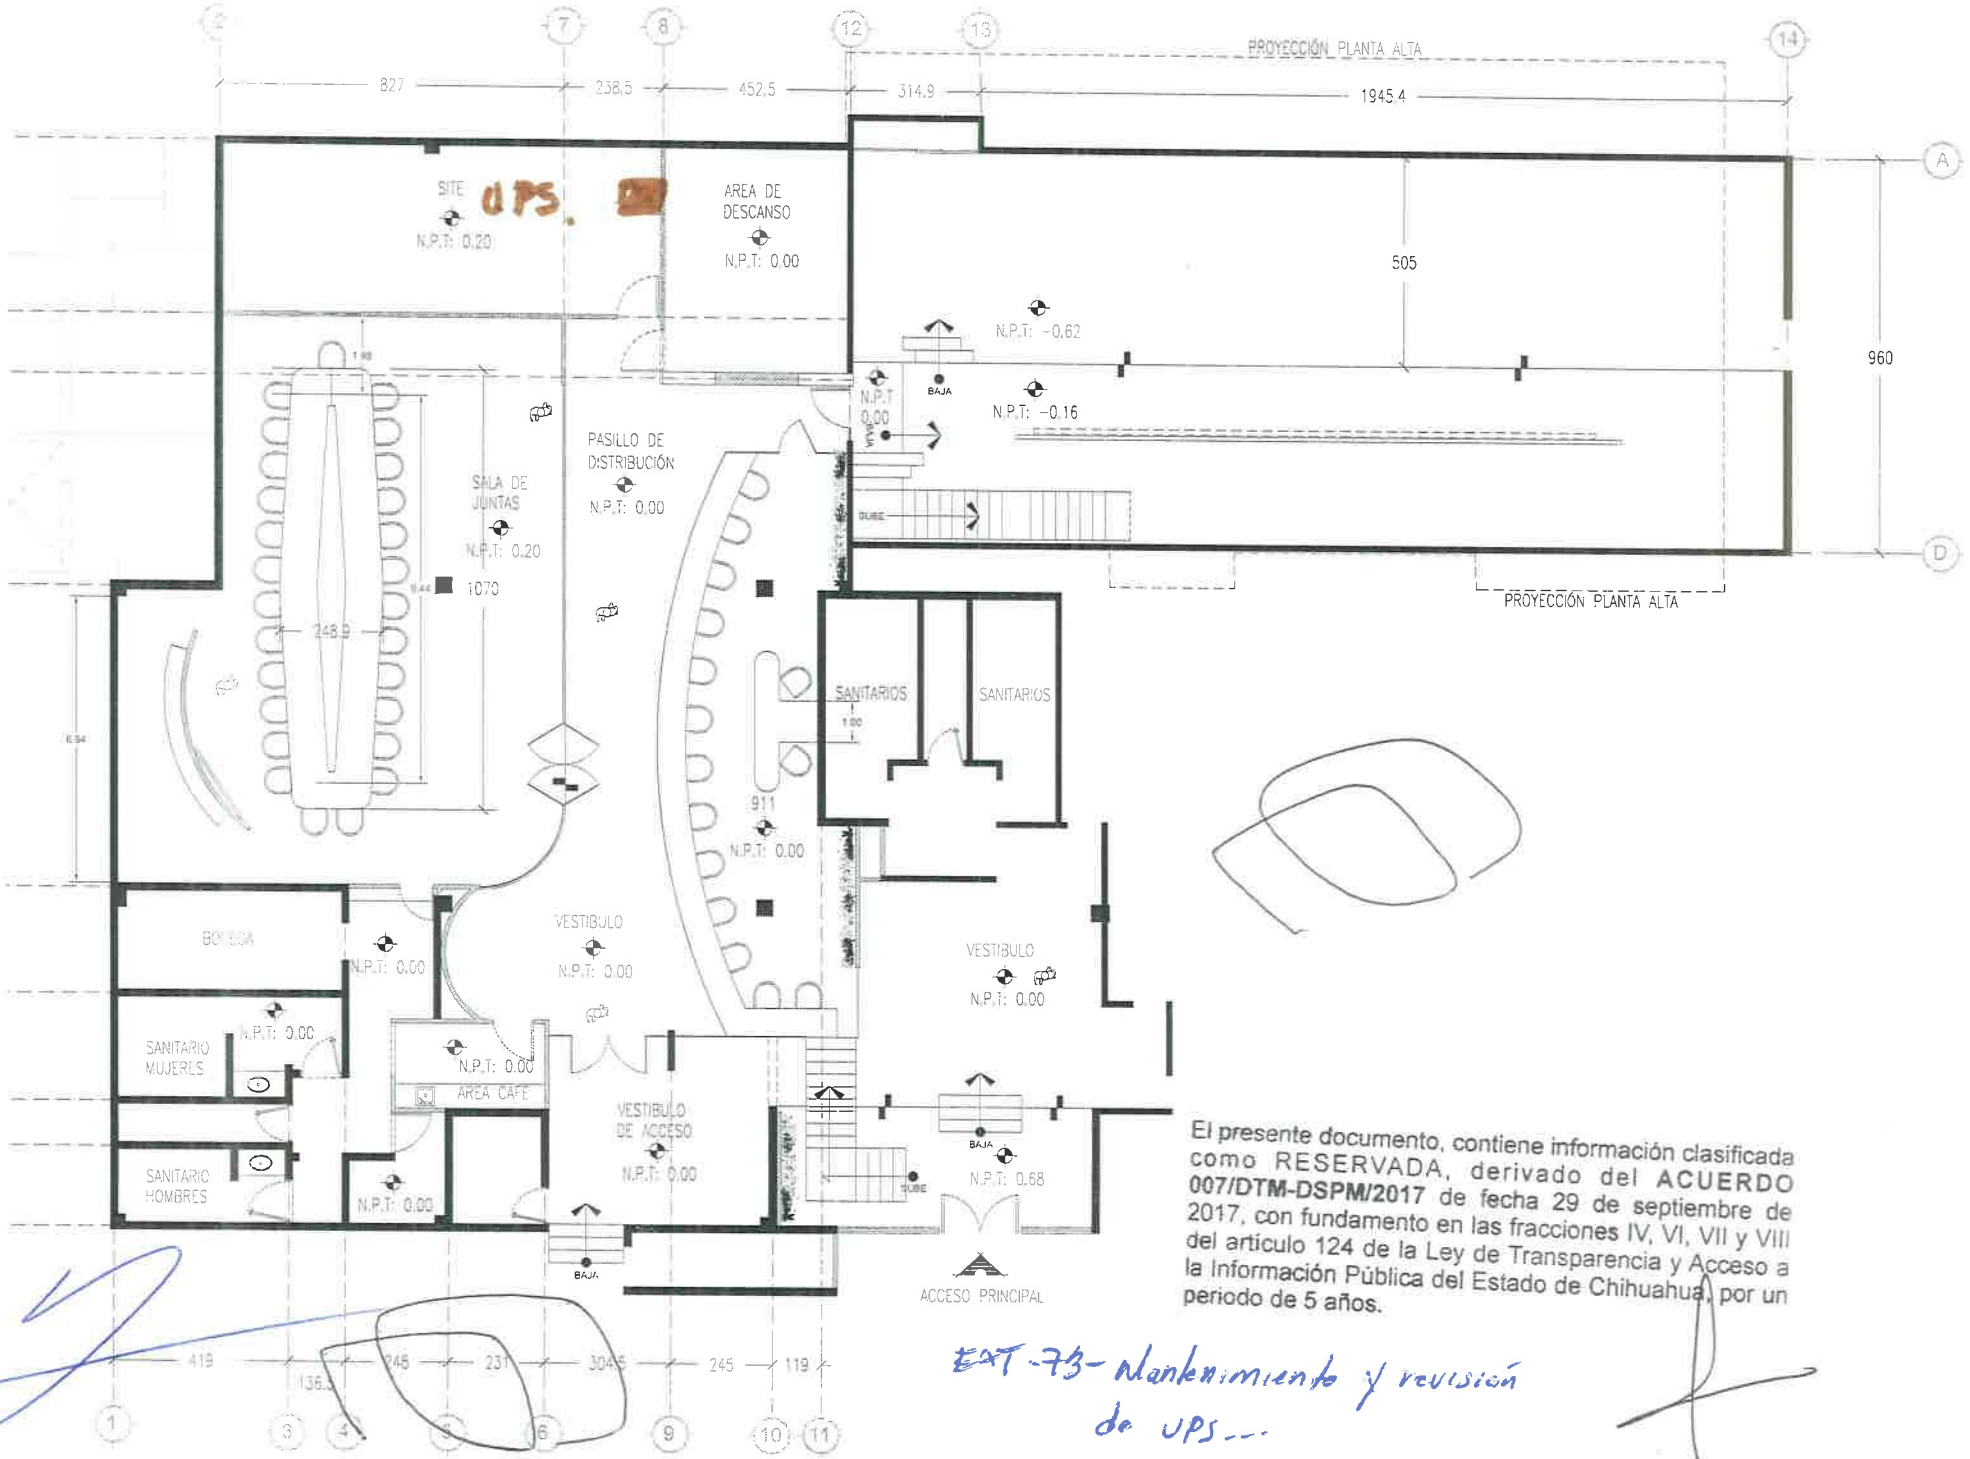

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-73- Mantenimiento y revisión de UPS...

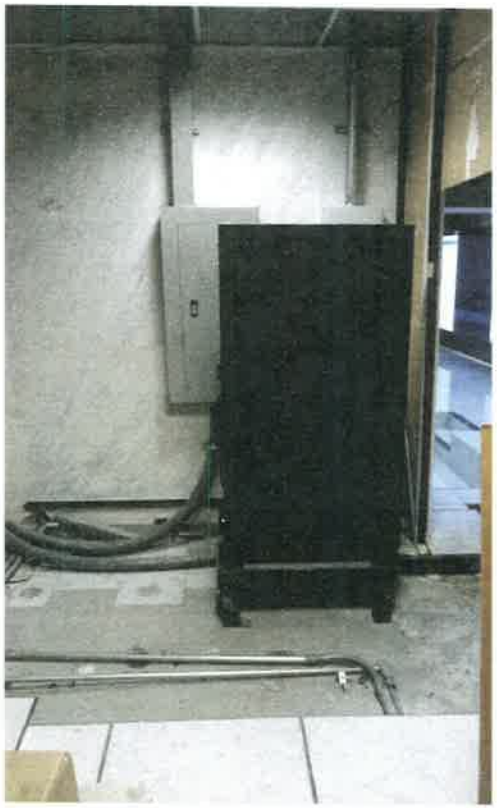



EXT- 73 Mantenimiento y revisión de UPS y revisión de banco de baterías de 60 KVA, incluye solo mano de obra, herramienta (no incluye reparación y cambio de baterías) y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-74					
Suministro e Instalación de tablero de distribución de 42 circuitos., interruptor termomagnético 3Px200Ax240V y alimentadores para el área de voltaje normal de la remodelación por espacio insuficiente existente para alumbrado (contactos y climas). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		**1.00**
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

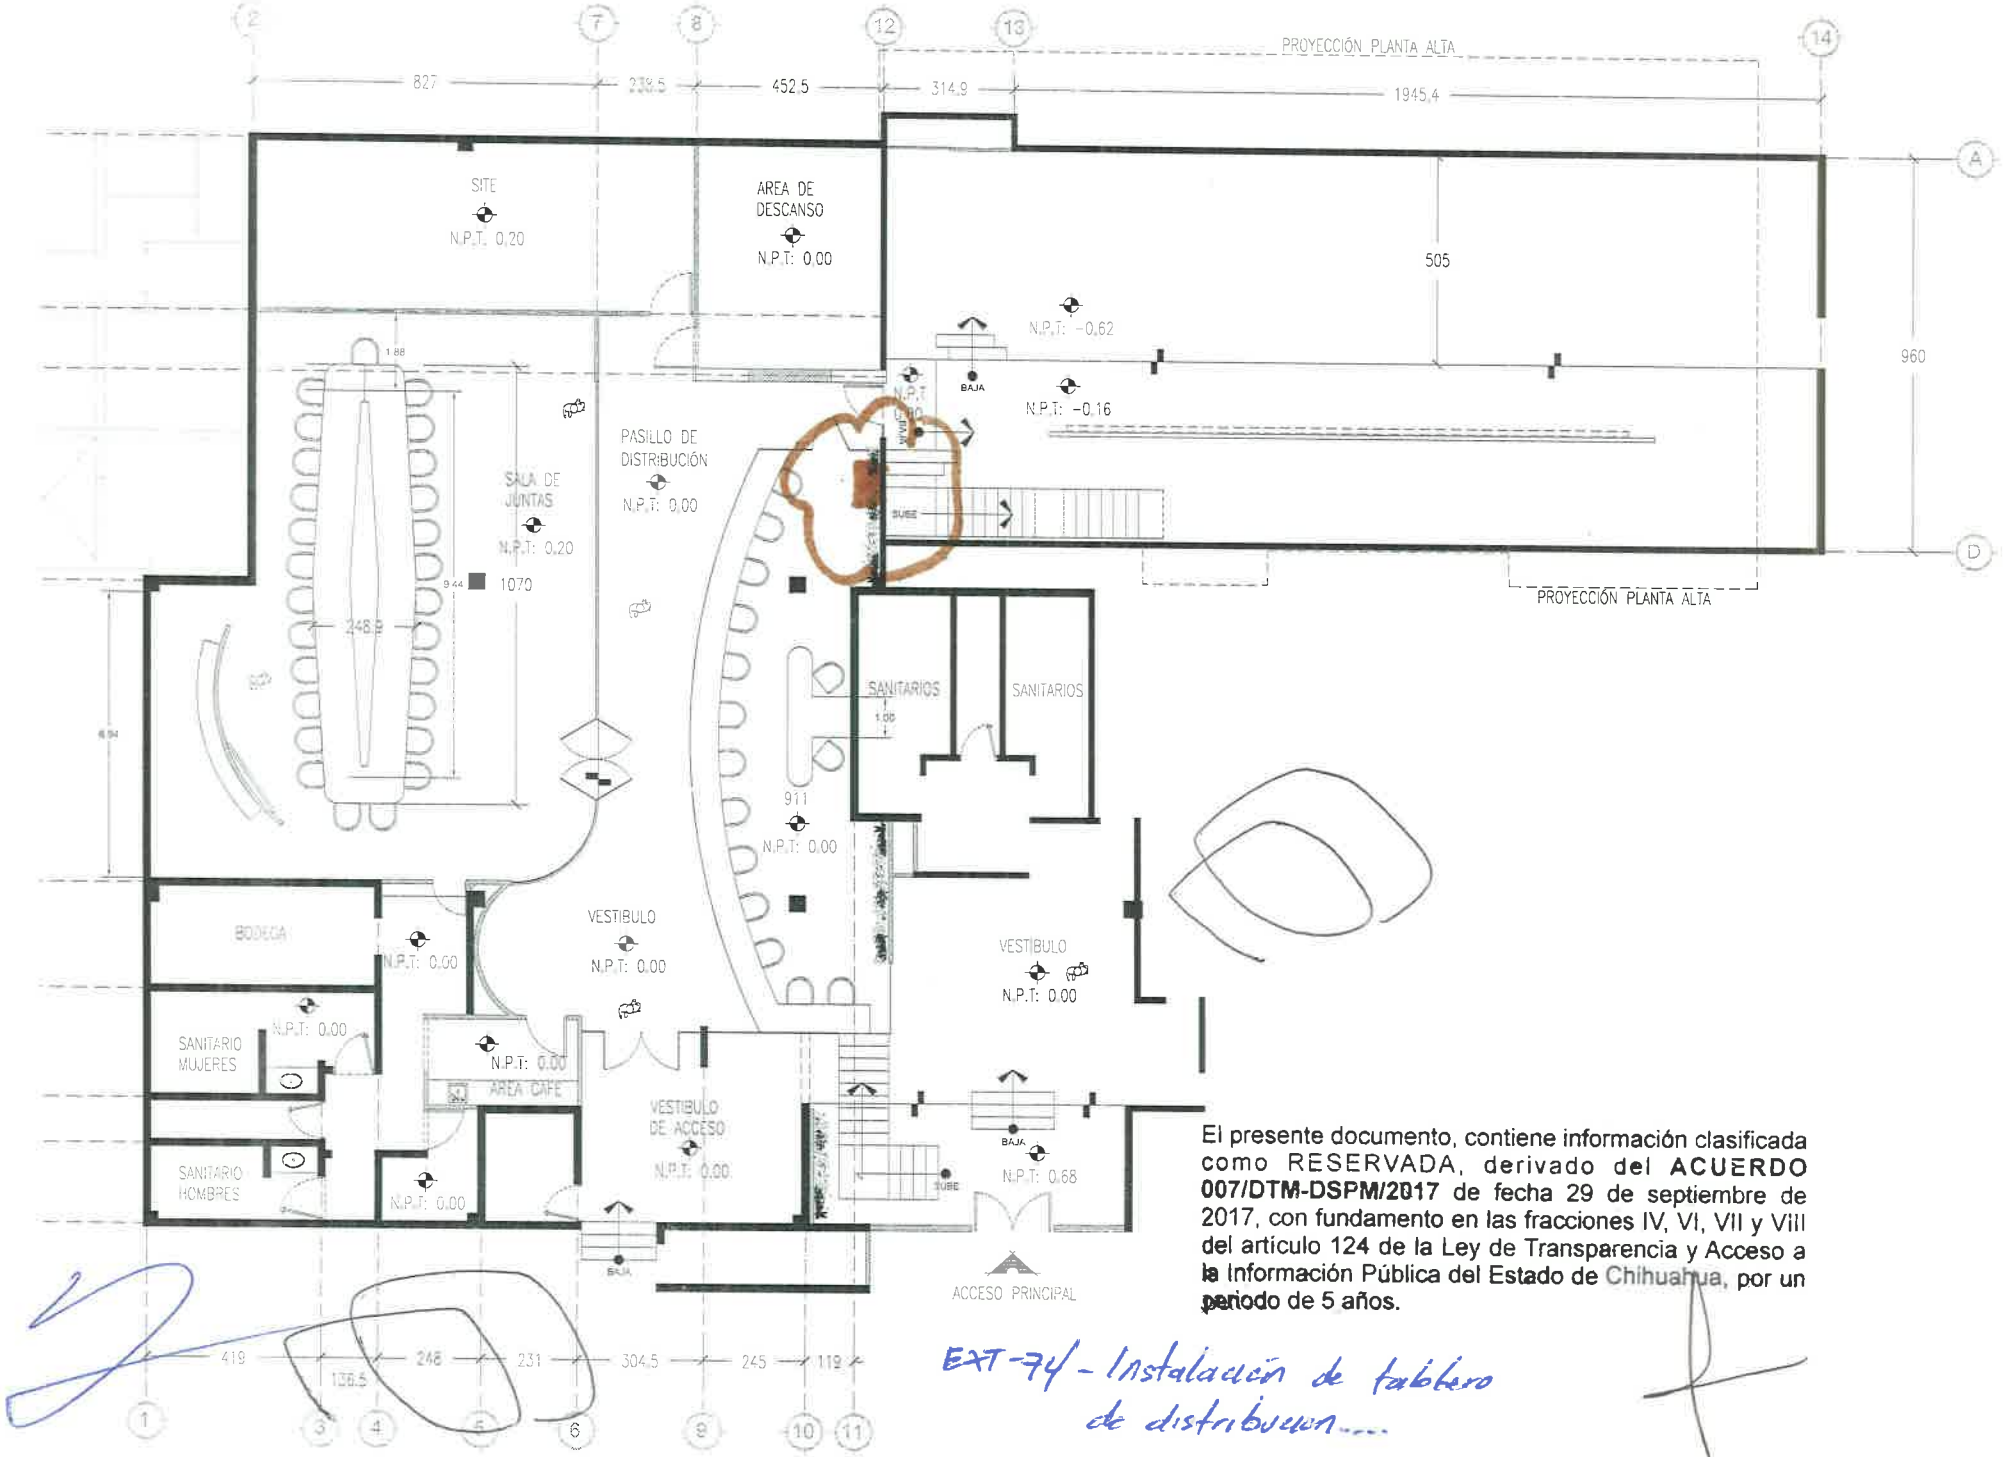

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-74 - Instalación de tablero de distribución....

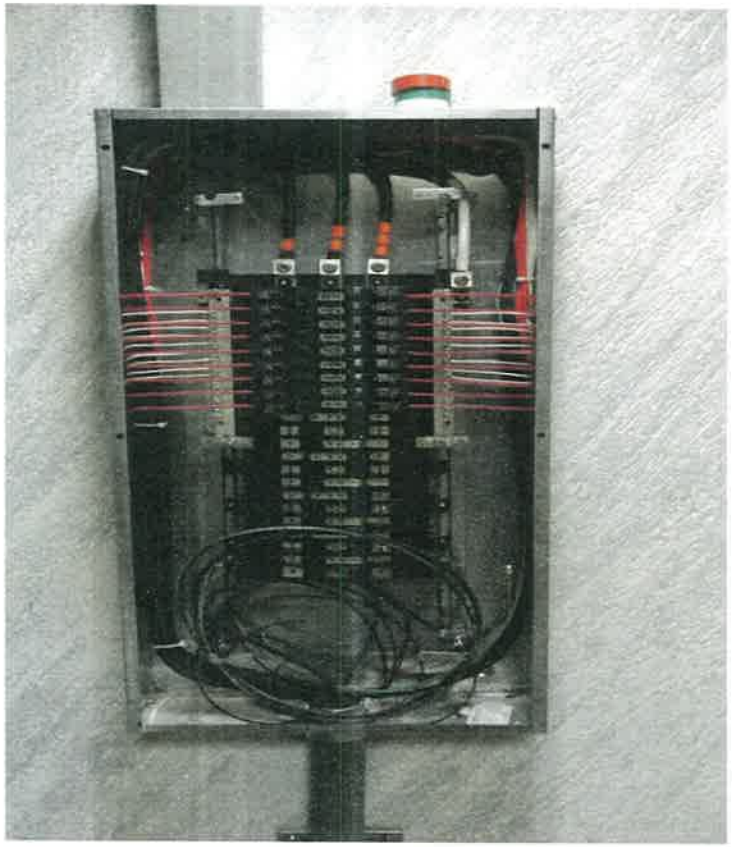

EXT- 74

Suministro e Instalación de tablero de distribución de 42 circuitos., interruptor termomagnético 3Px200Ax240V y alimentadores para el área de voltaje normal de la remodelación por espacio insuficiente existente para alumbrado (contactos y climas). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-75					
Reubicación de Rack de voz y datos en interior de Site por llegada de equipo nuevo, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
	1.00		1.00		
	TOTAL		**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

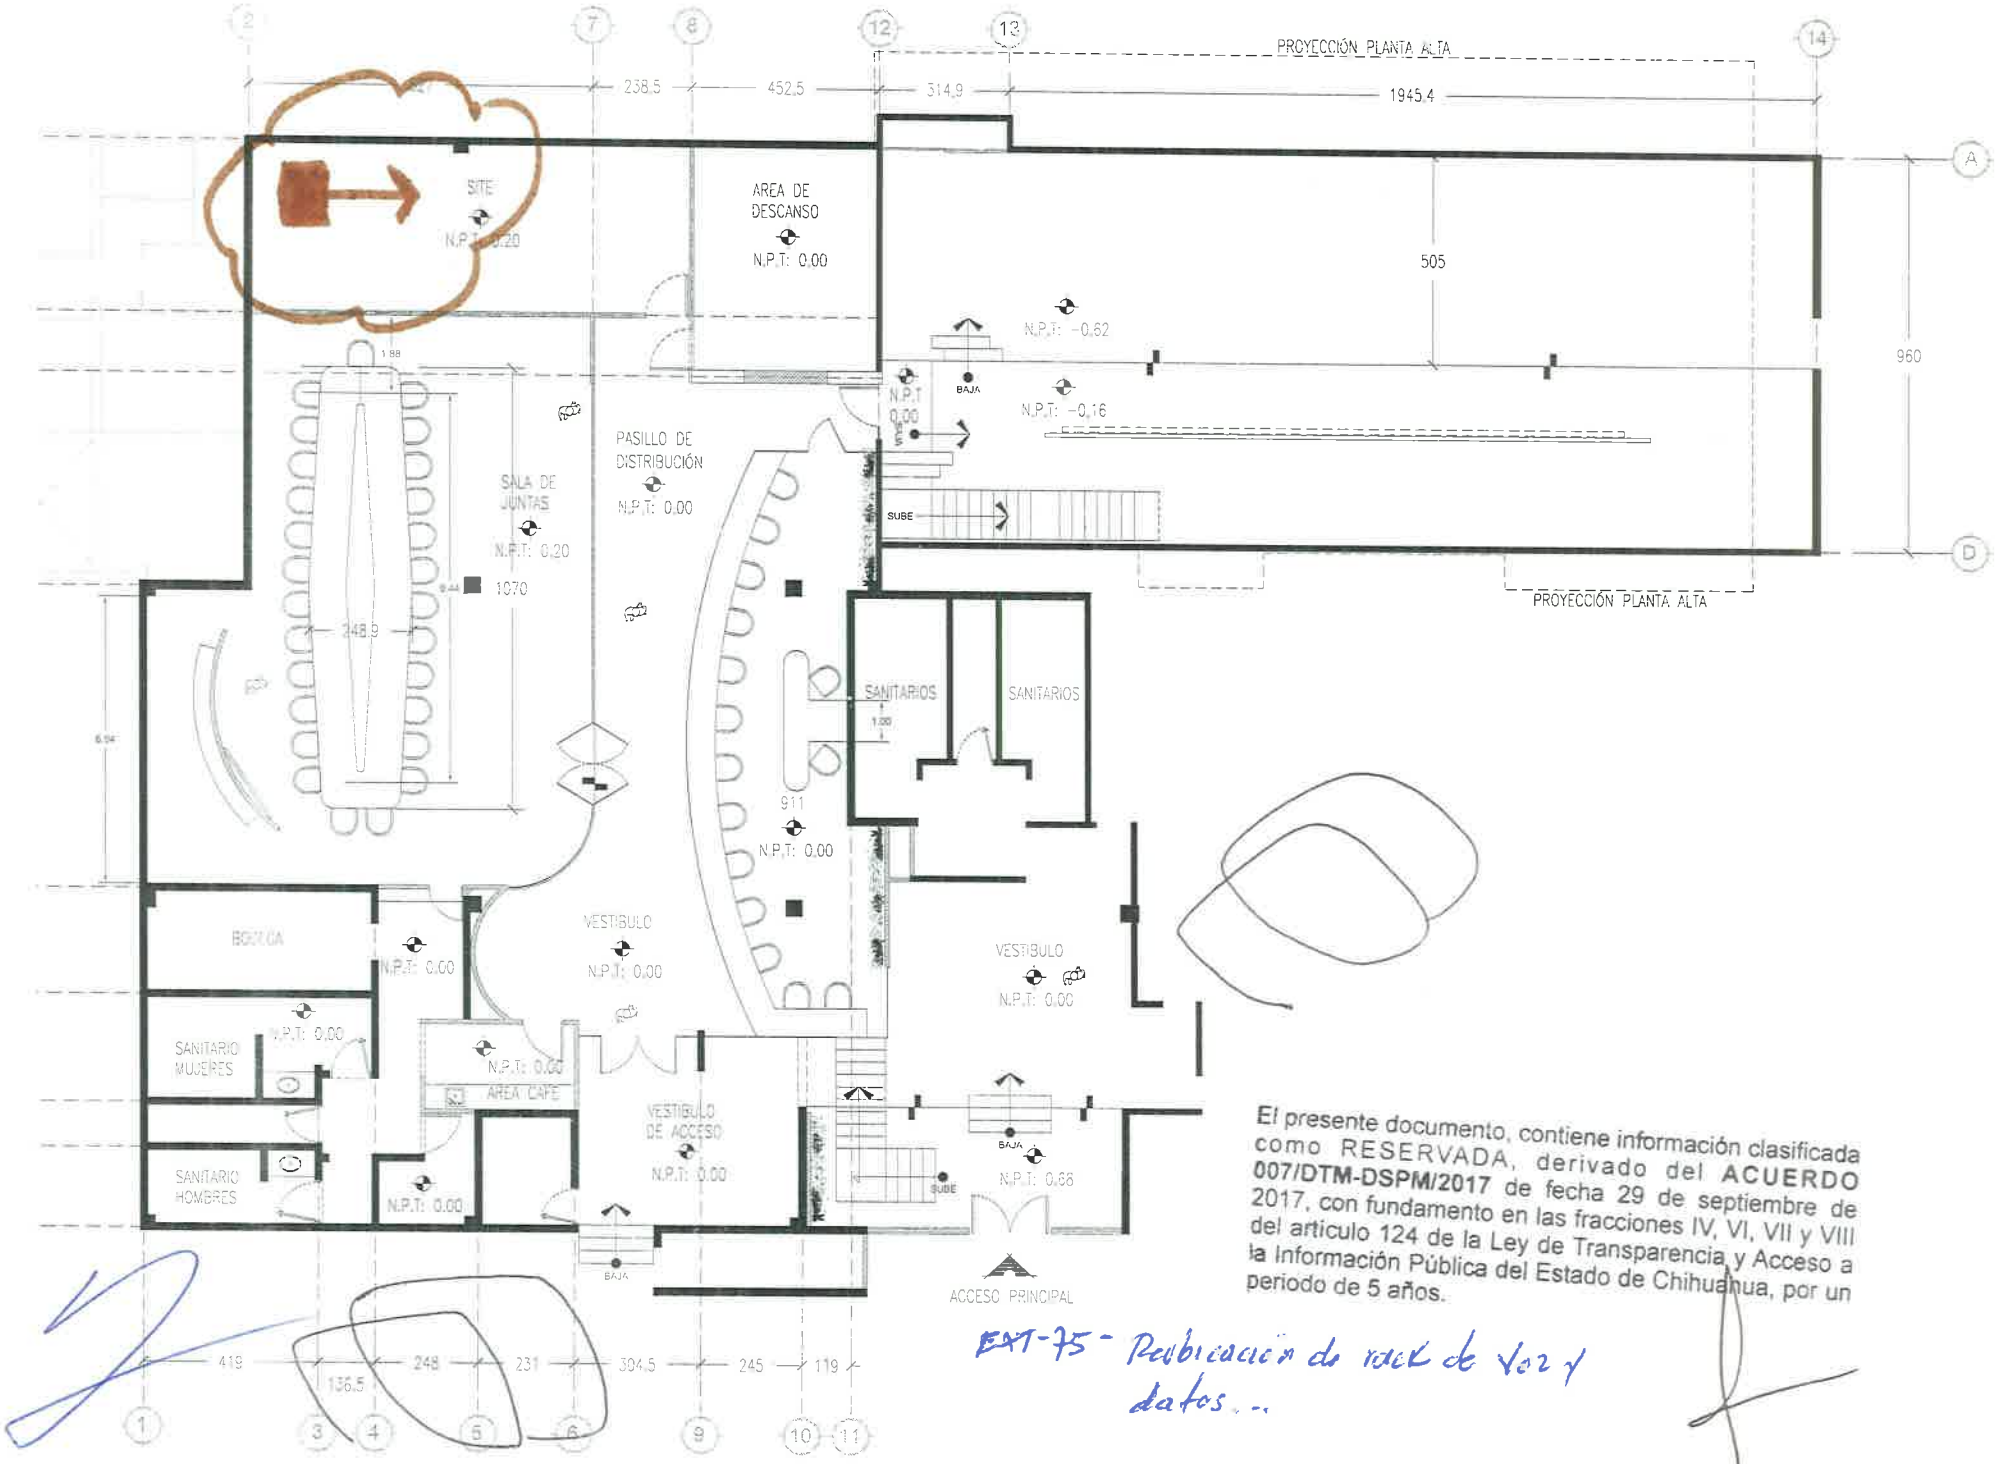

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-75 - Reubicación de rack de voz y datos...



EXT- 75 Reubicación de Rack de voz y datos en interior de Site por llegada de equipo nuevo, incluye:

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-76						
Suministro e instalación de 7 nodos adicionales (del SITE a parte posterior de pantallas de video Wall), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Modulo**	**Total**			**1.00**
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

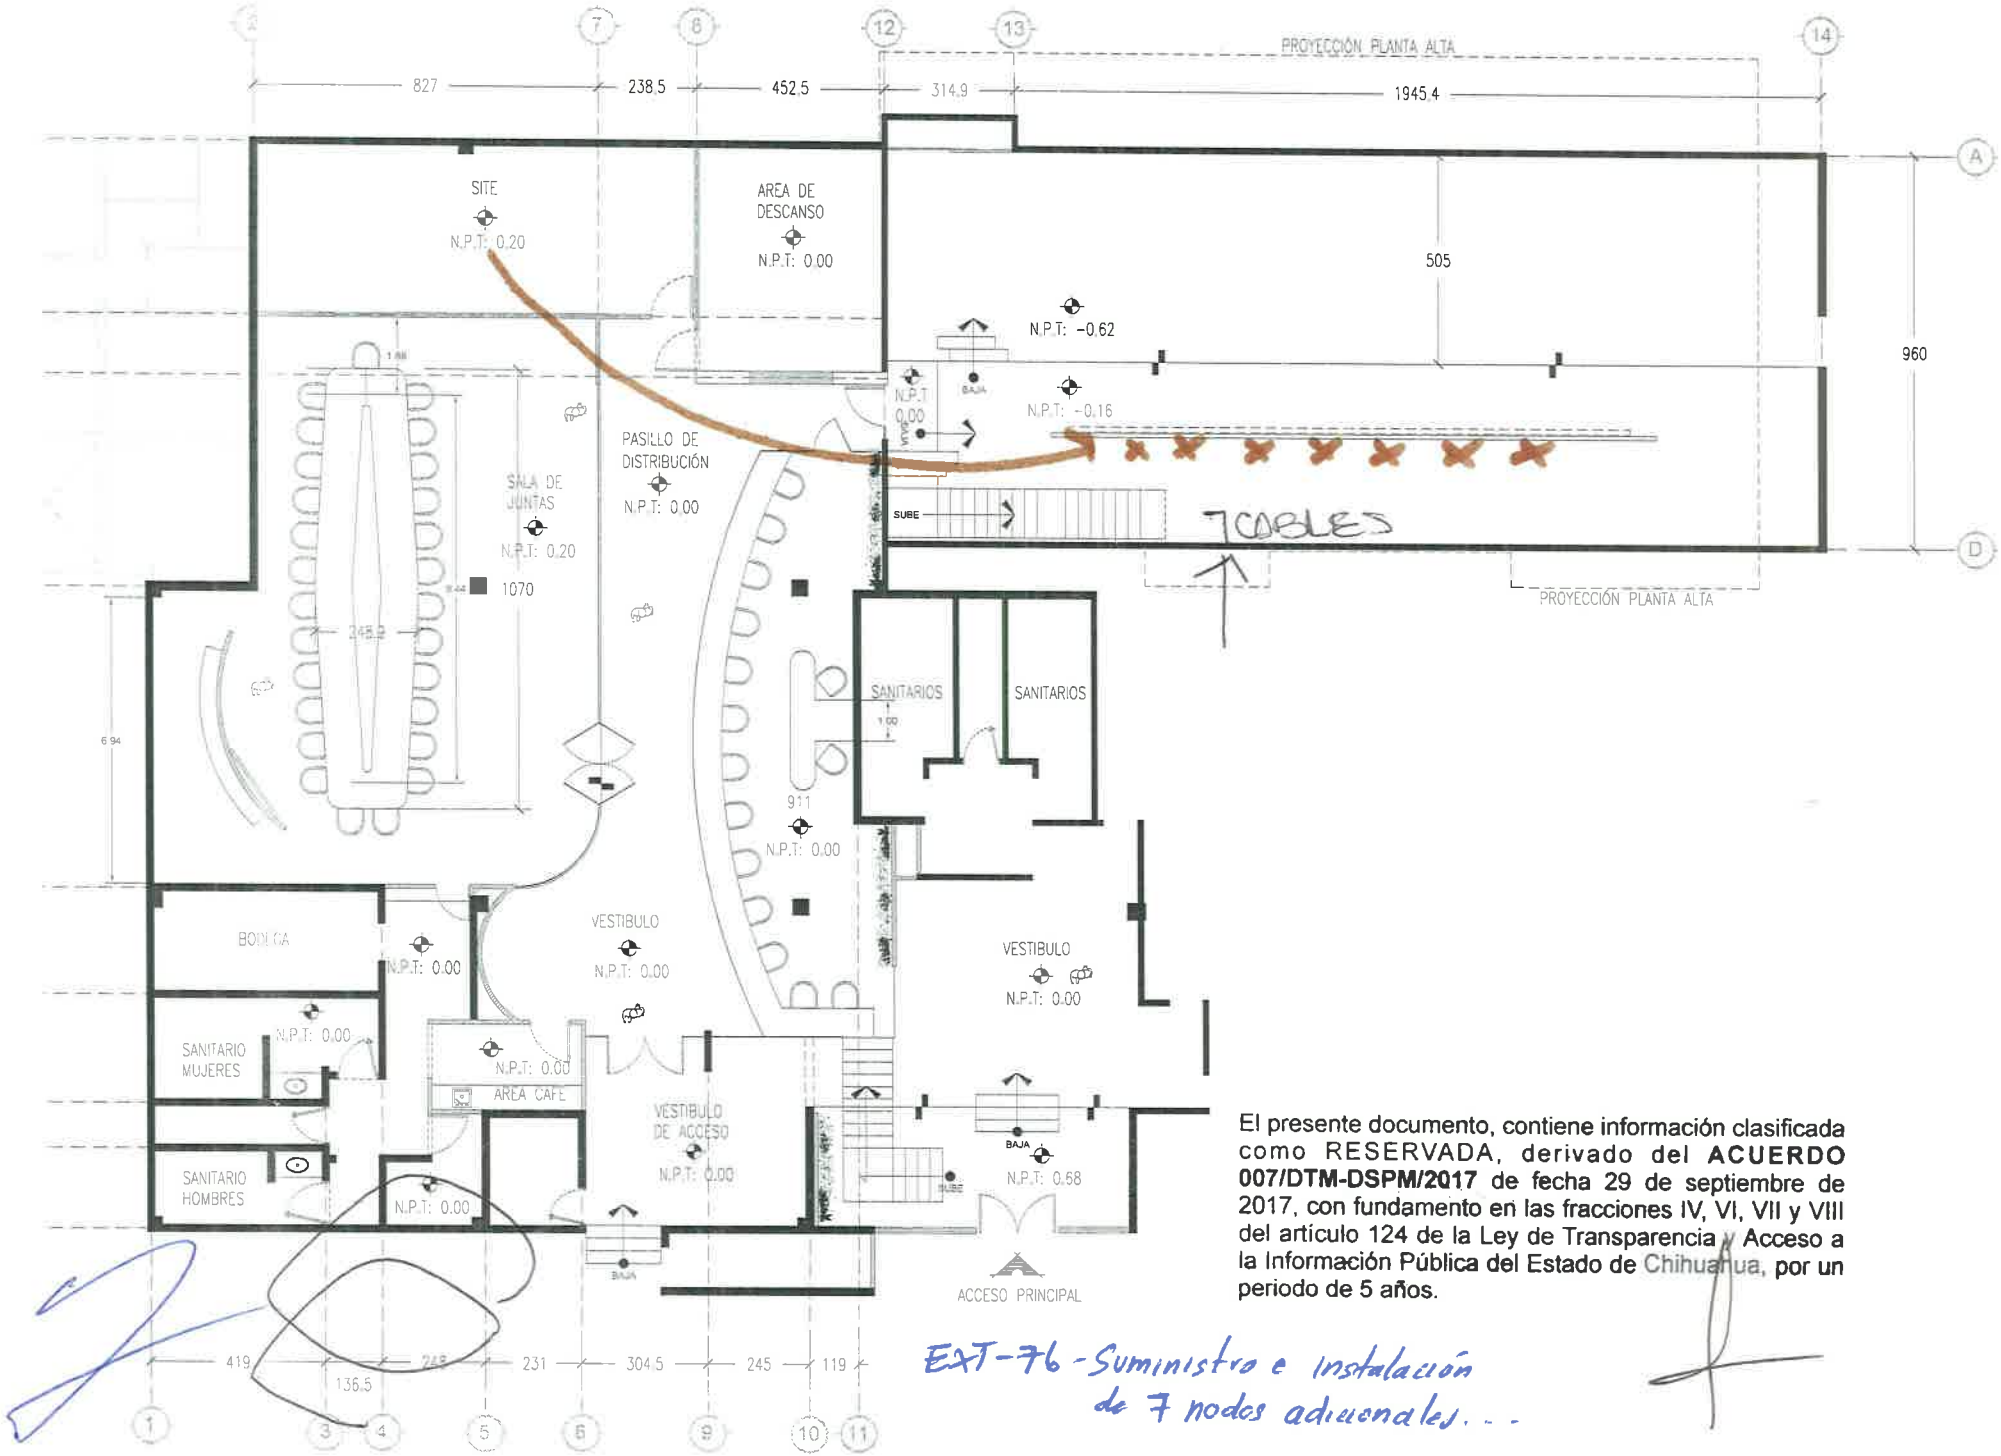

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-76 - Suministro e instalación de 7 nodos adicionales...

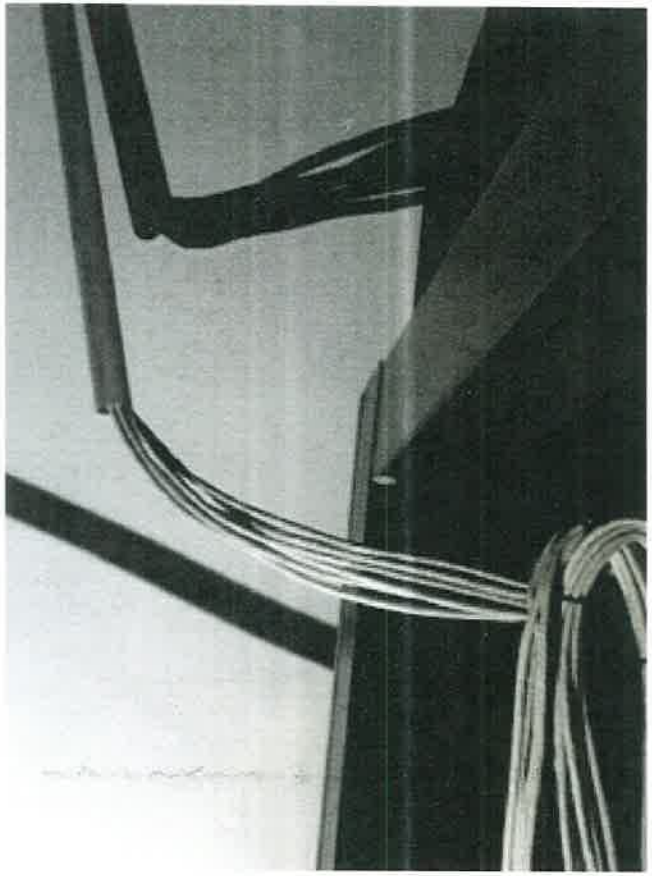

EXT- 76 Suministro e instalación de 7 nodos adicionales (del SITE a parte posterior de pantallas de video Wall), incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-77					
Suministro e instalación de bomba de condensados para mini Split en área de descanso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

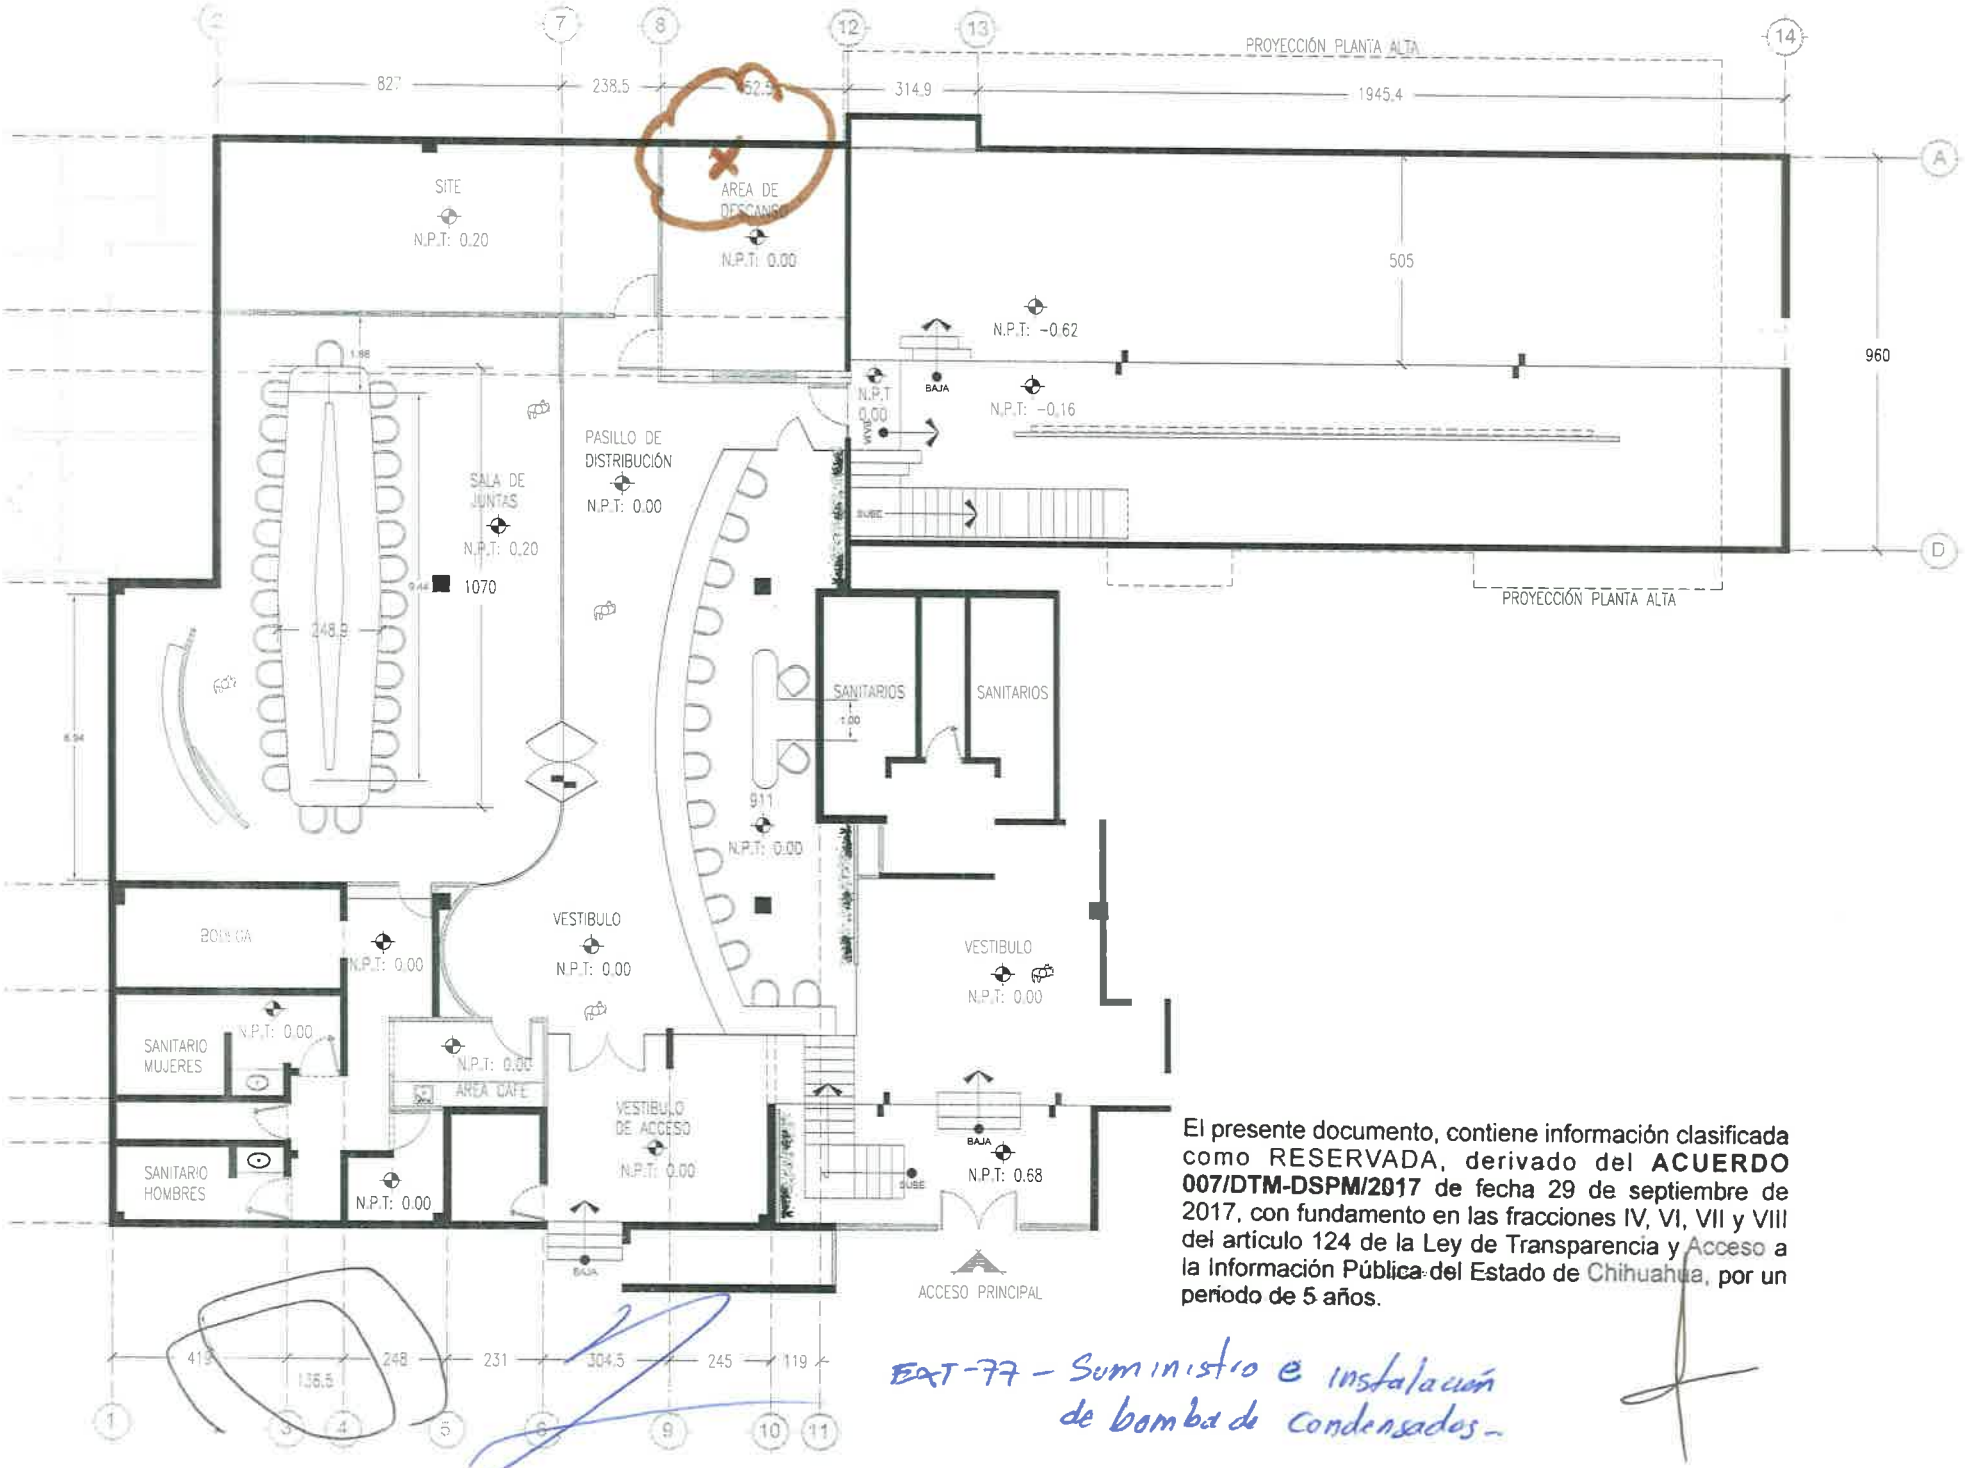

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-77 - Suministro e instalación de bomba de condensados.



EXT- 77

Suministro e instalación de bomba de condensados para mini Split en área de descanso, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-78						
		Pieza	**Total**			
Suministro de control universal para unidad mini Split. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		3.00	3.00			
		TOTAL	**3.00**			**3.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONSTRUCCIONES
MARRO
S.A. DE C.V.

23 de Mayo -2018

ING. LUIS RICARDO GARCIA FIERRO
Jefe de tecnologías e información de la dirección
de Seguridad Pública Municipal

Por medio de la presente le hago entrega de 3.00 pza. de control universal para minisplit (2.oo pza. para comedor y 1.00 pza. para sala de descanso)

Sin mas por el momento quedo de Ud.


ENTREGA

Arq. Graciela Rodríguez García

RECIBE


Pol.3ro. José Hernández Camargo

PROGRESO 102-1 e-mail mr@cmarro.com TELS. Y FAX (614)410-95-50 y (614)410-91-51 CHIHUAHUA, CHIH.

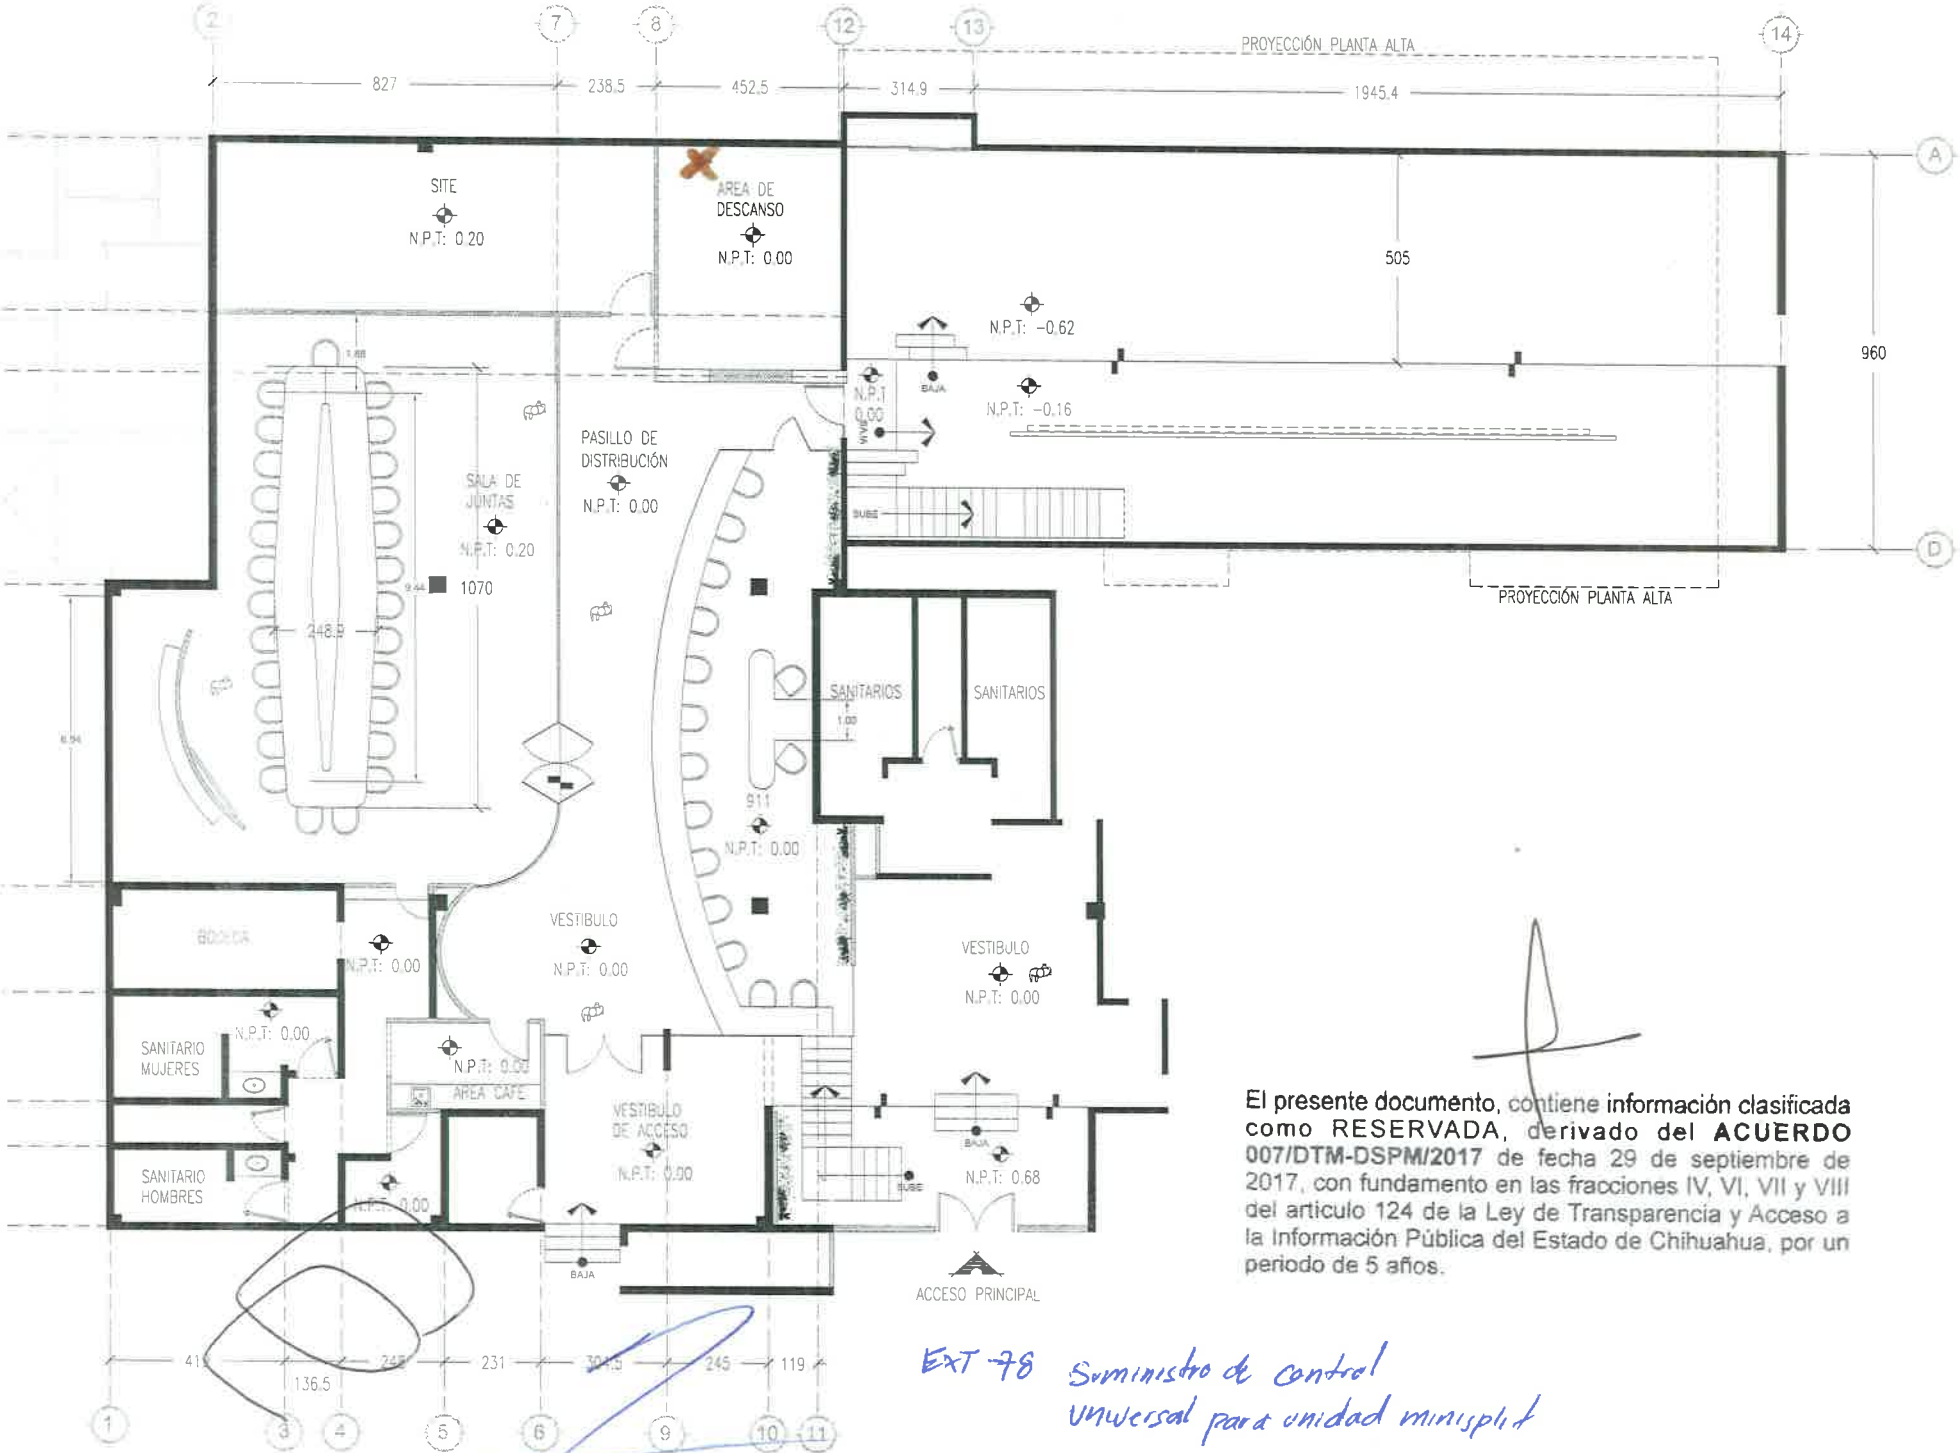

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT 78 Suministro de control universal para unidad minisplit

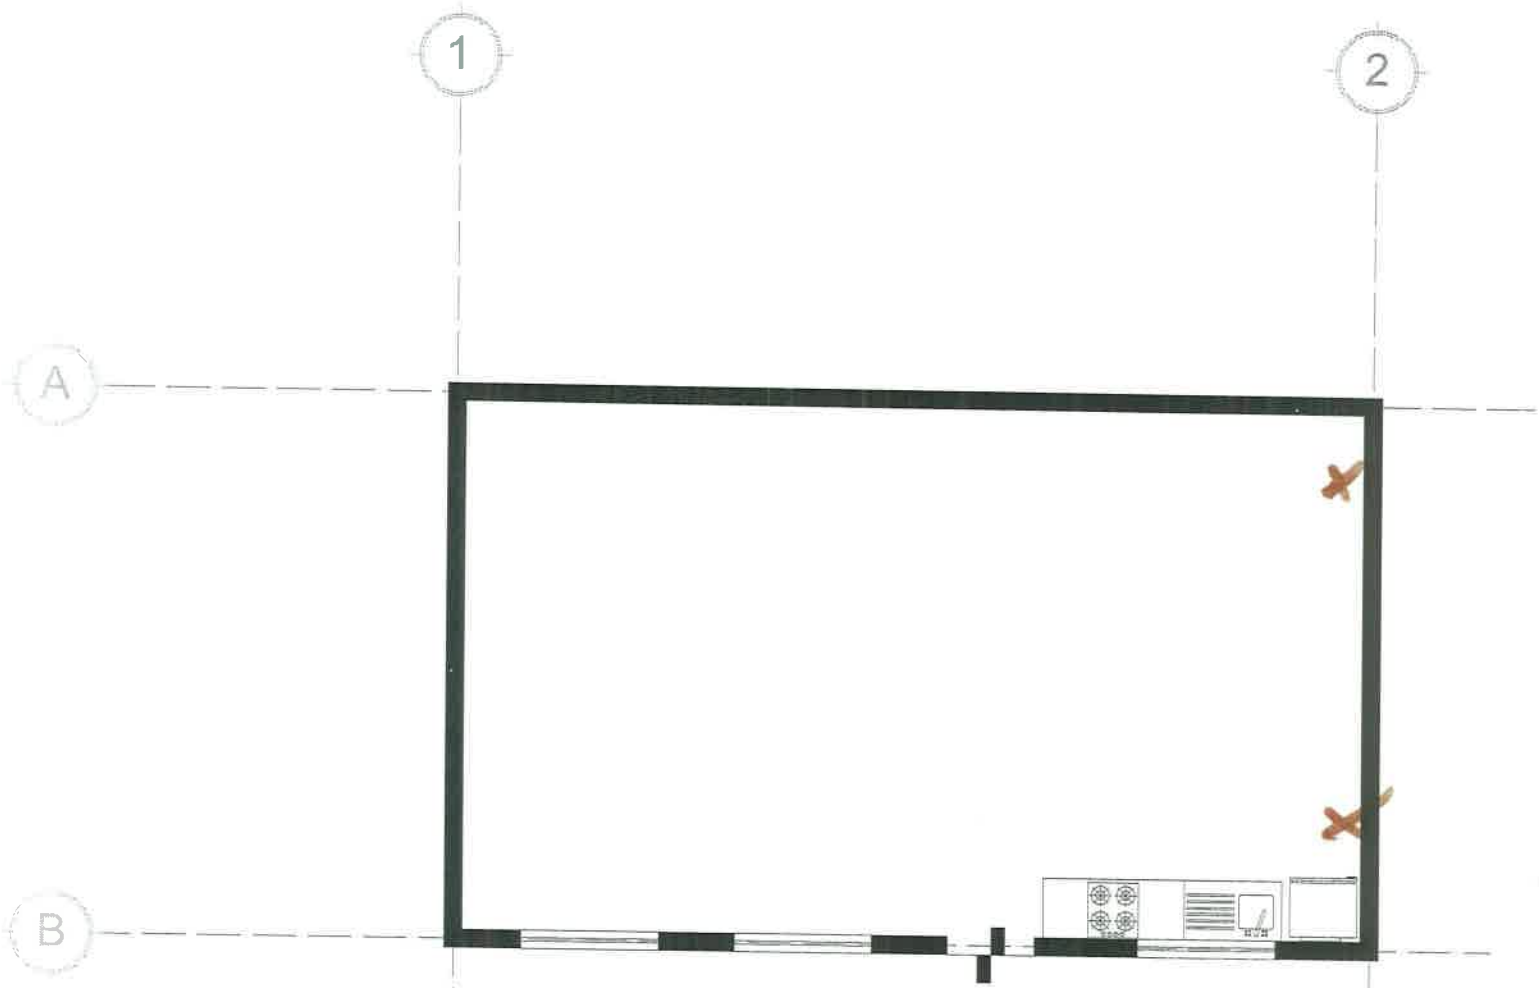

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-78 - Suministro de control universal para unidad minisplit



EXT- 78 Suministro de control universal para unidad mini Split. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-79					
Construcción de peralte a base de tablaroca de 23 cm de altura en cambio de nivel de plafón cerrado curvo de sala de juntas: incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
		8.30	8.30		
	TOTAL		**8.30**		**8.30**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

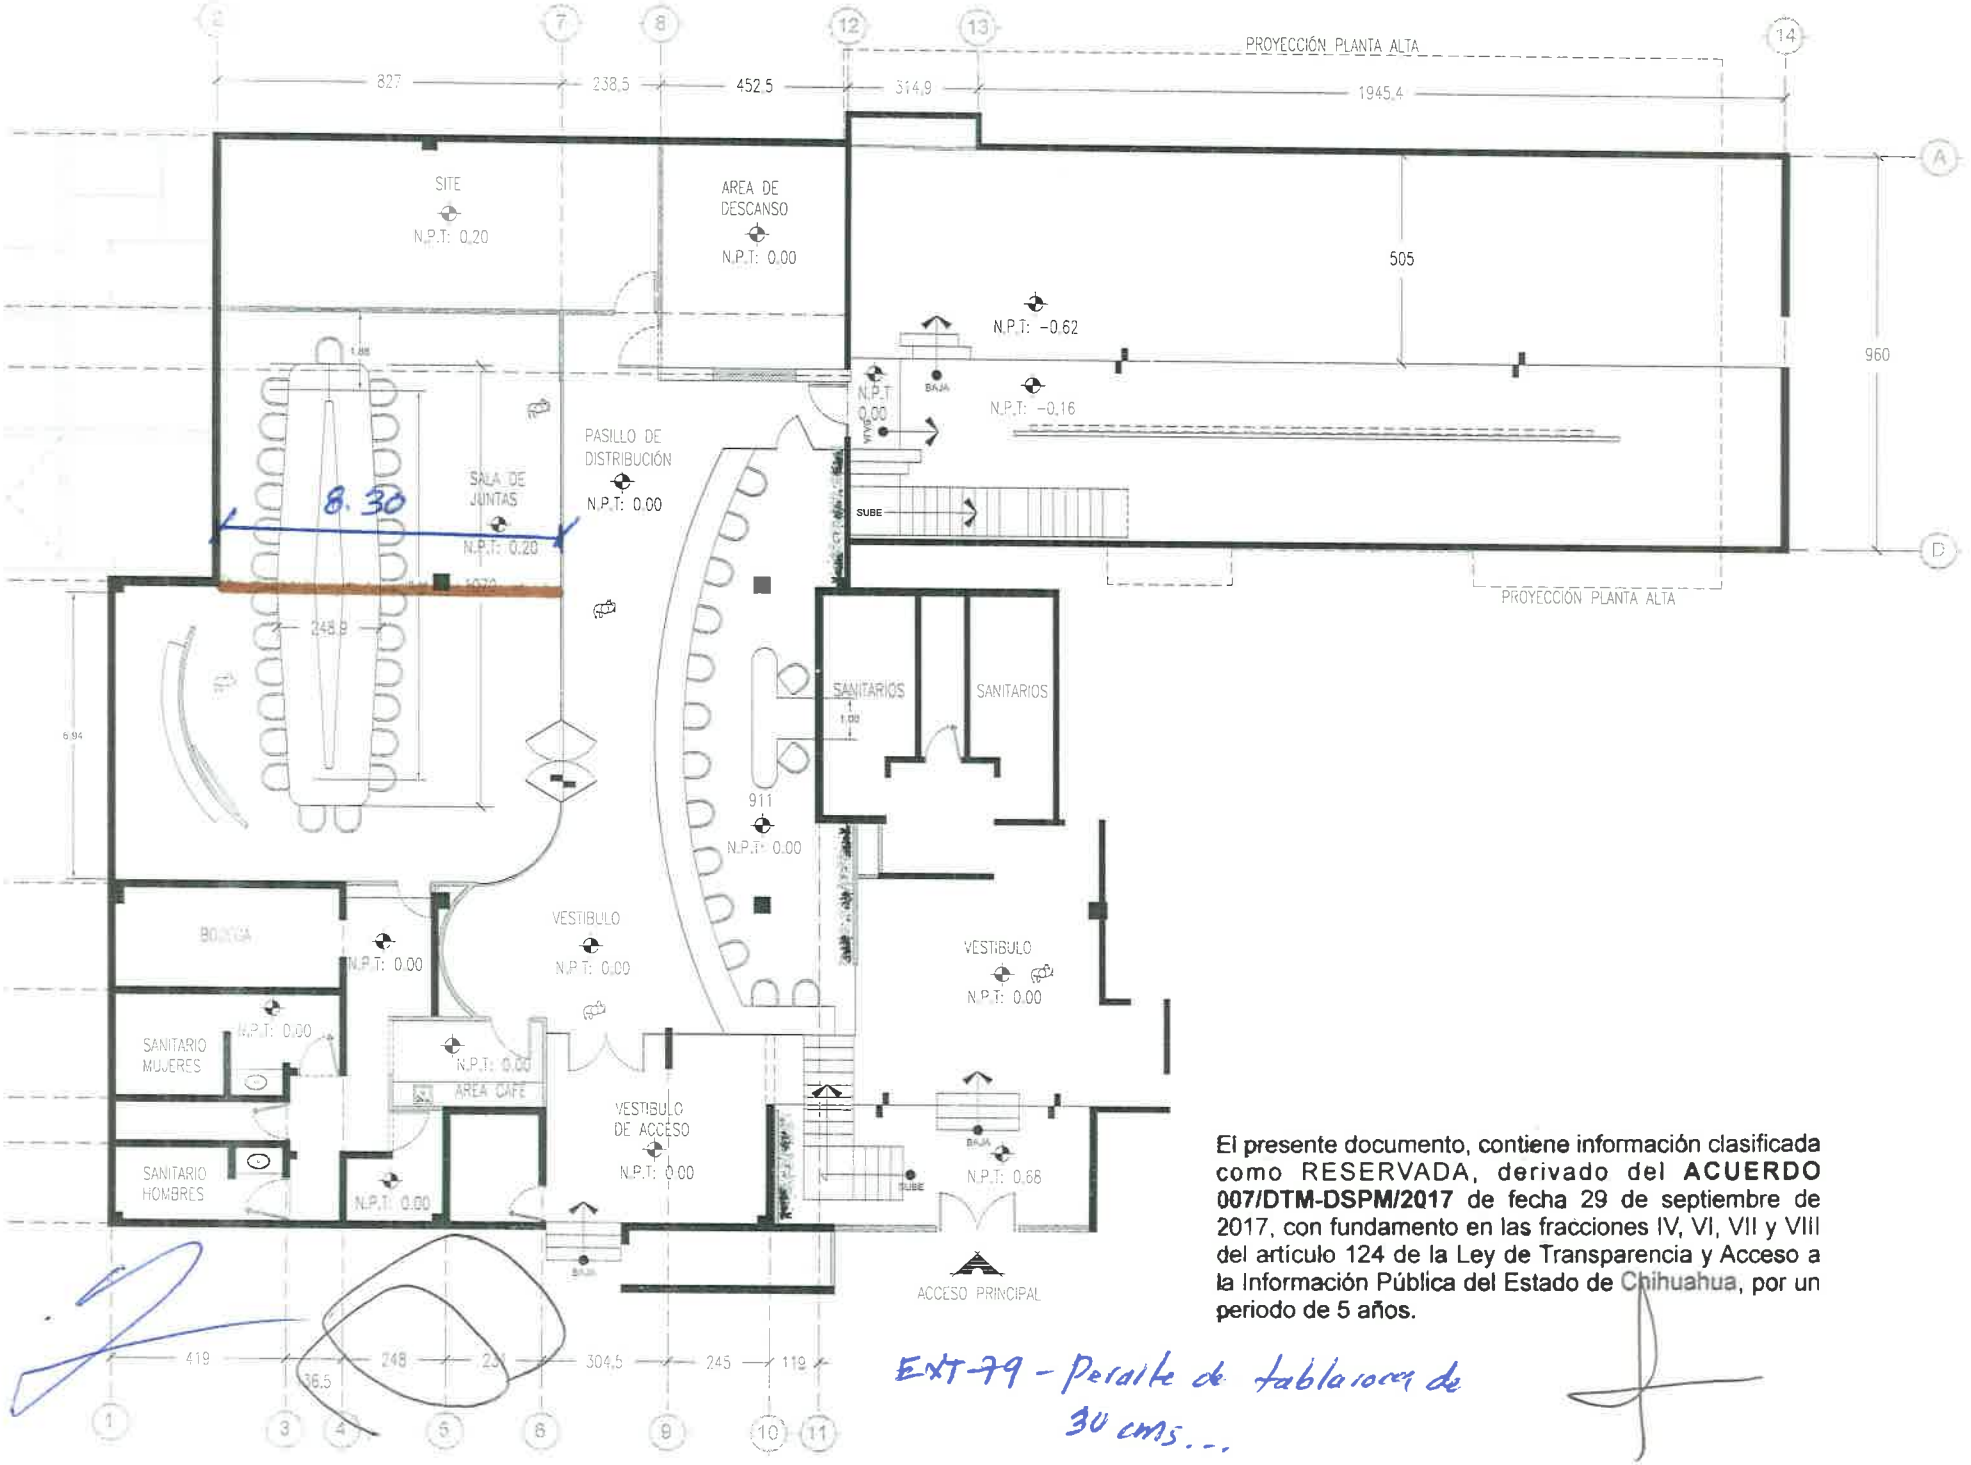

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-79 - Peralte de tablaroca de 30 cms...

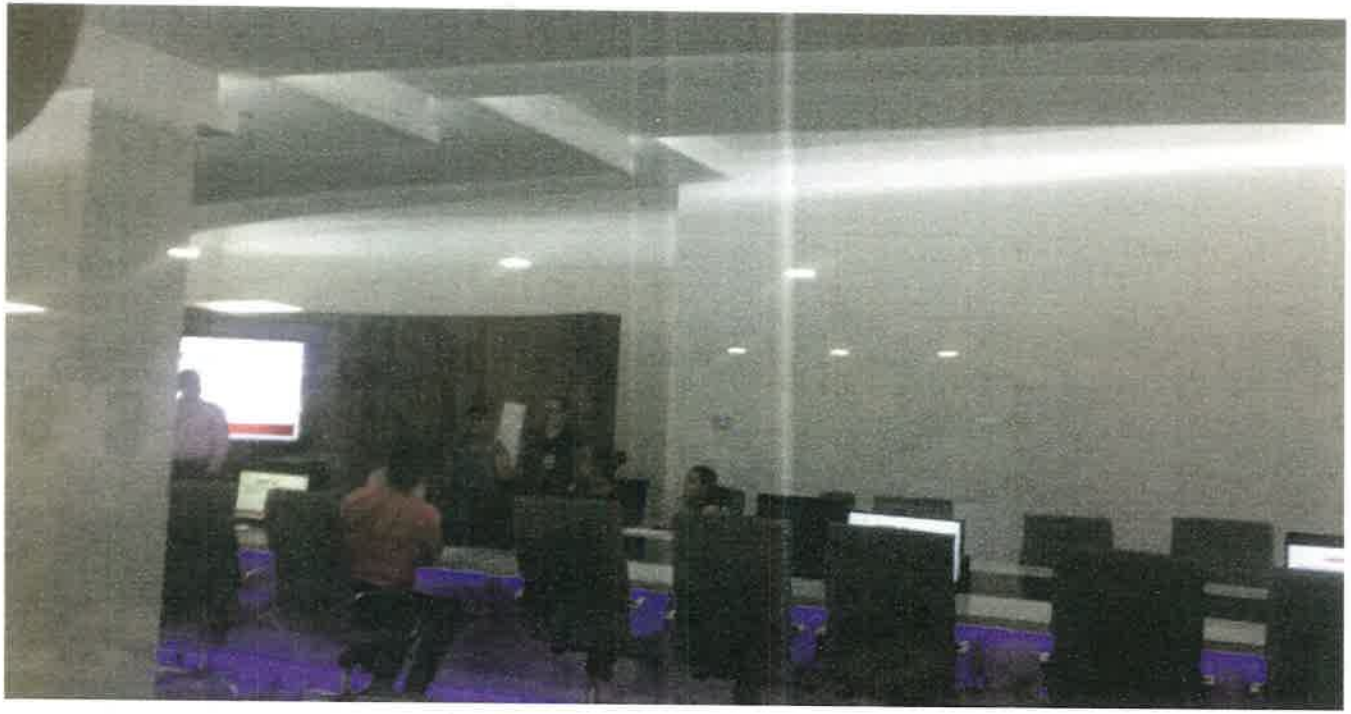

EXT- 79

Construcción de peralte a base de tablaroca de 23 cm de altura en cambio de nivel de plafón cerrado curvo de sala de juntas: incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-80					
Suministro e instalación de gas refrigerante R-410A en mini Split de SITE provisional, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Kg**	**Total**		
		4.00	4.00		
		TOTAL	**4.00**		**4.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

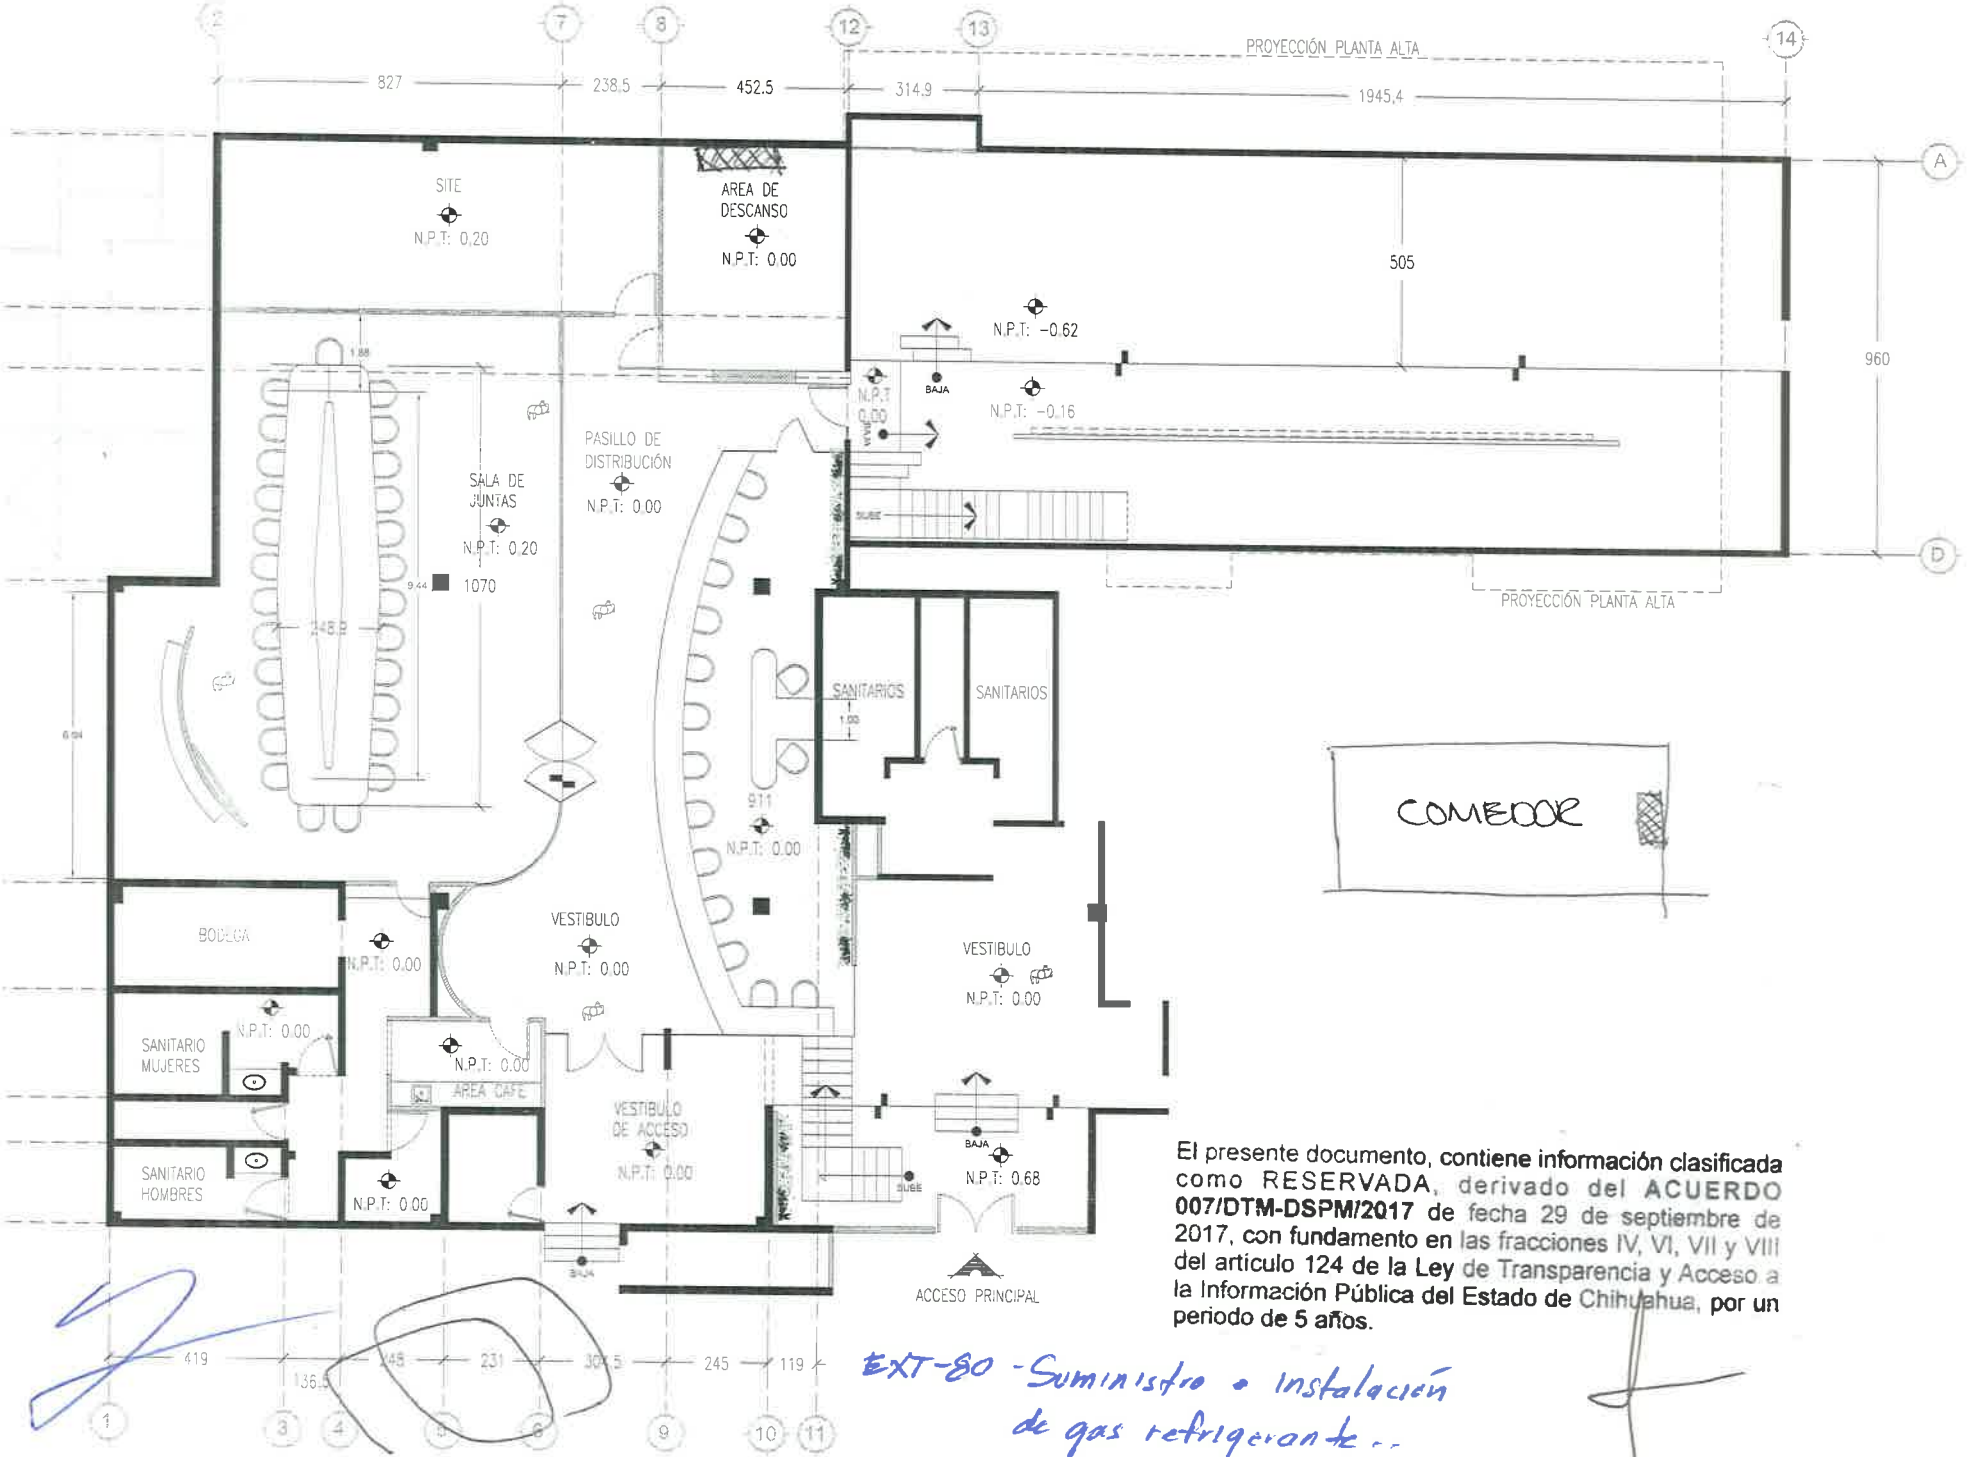

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-80 - Suministro e instalación de gas refrigerante..



EXT- 80 Suministro e instalación de gas refrigerante R-410A en mini Split de SITE provisional, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-81					
Reposición de rejillas de inyección y retorno en planta alta y planta baja dimensiones variables (por encontrarse en mal estado) incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		7.00	7.00		
		TOTAL	**7.00**		**7.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

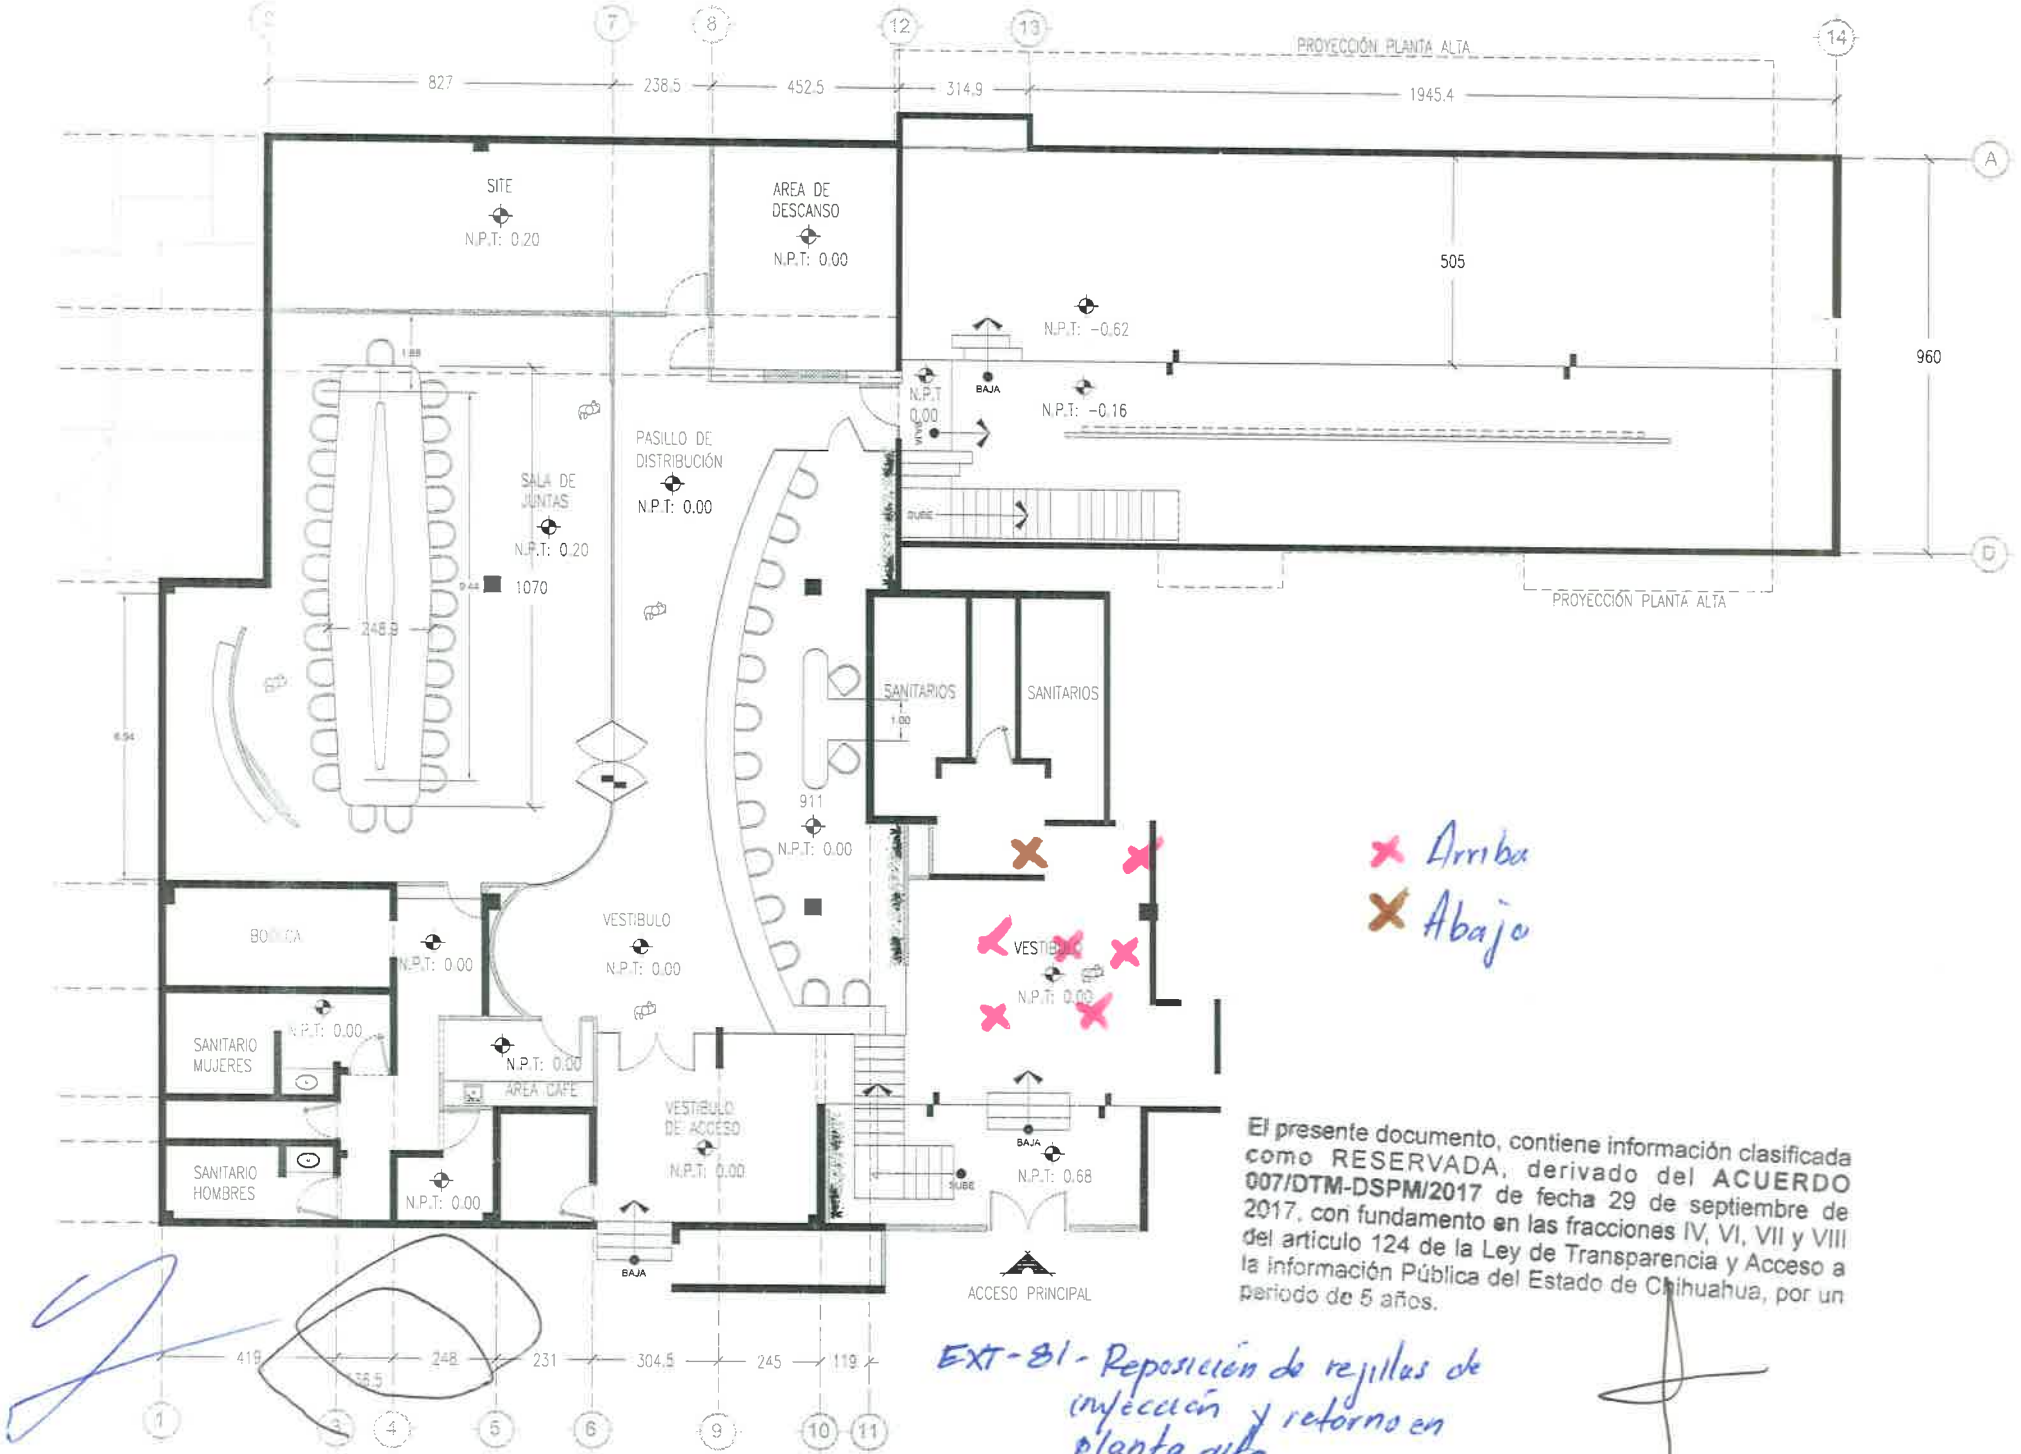

Arriba

Abajo

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-81 - Reposición de rejillas de inyección y retorno en planta alta..



EXT- 81

Reposición de rejillas de inyección y retorno en planta alta y planta baja dimensiones variables (por encontrarse en mal estado) incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-82					
Suministro y aplicación de pintura automotriz de PER de 3"X3" existentes en acceso principal, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		2.00	2.00		
		TOTAL	**2.00**		**2.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

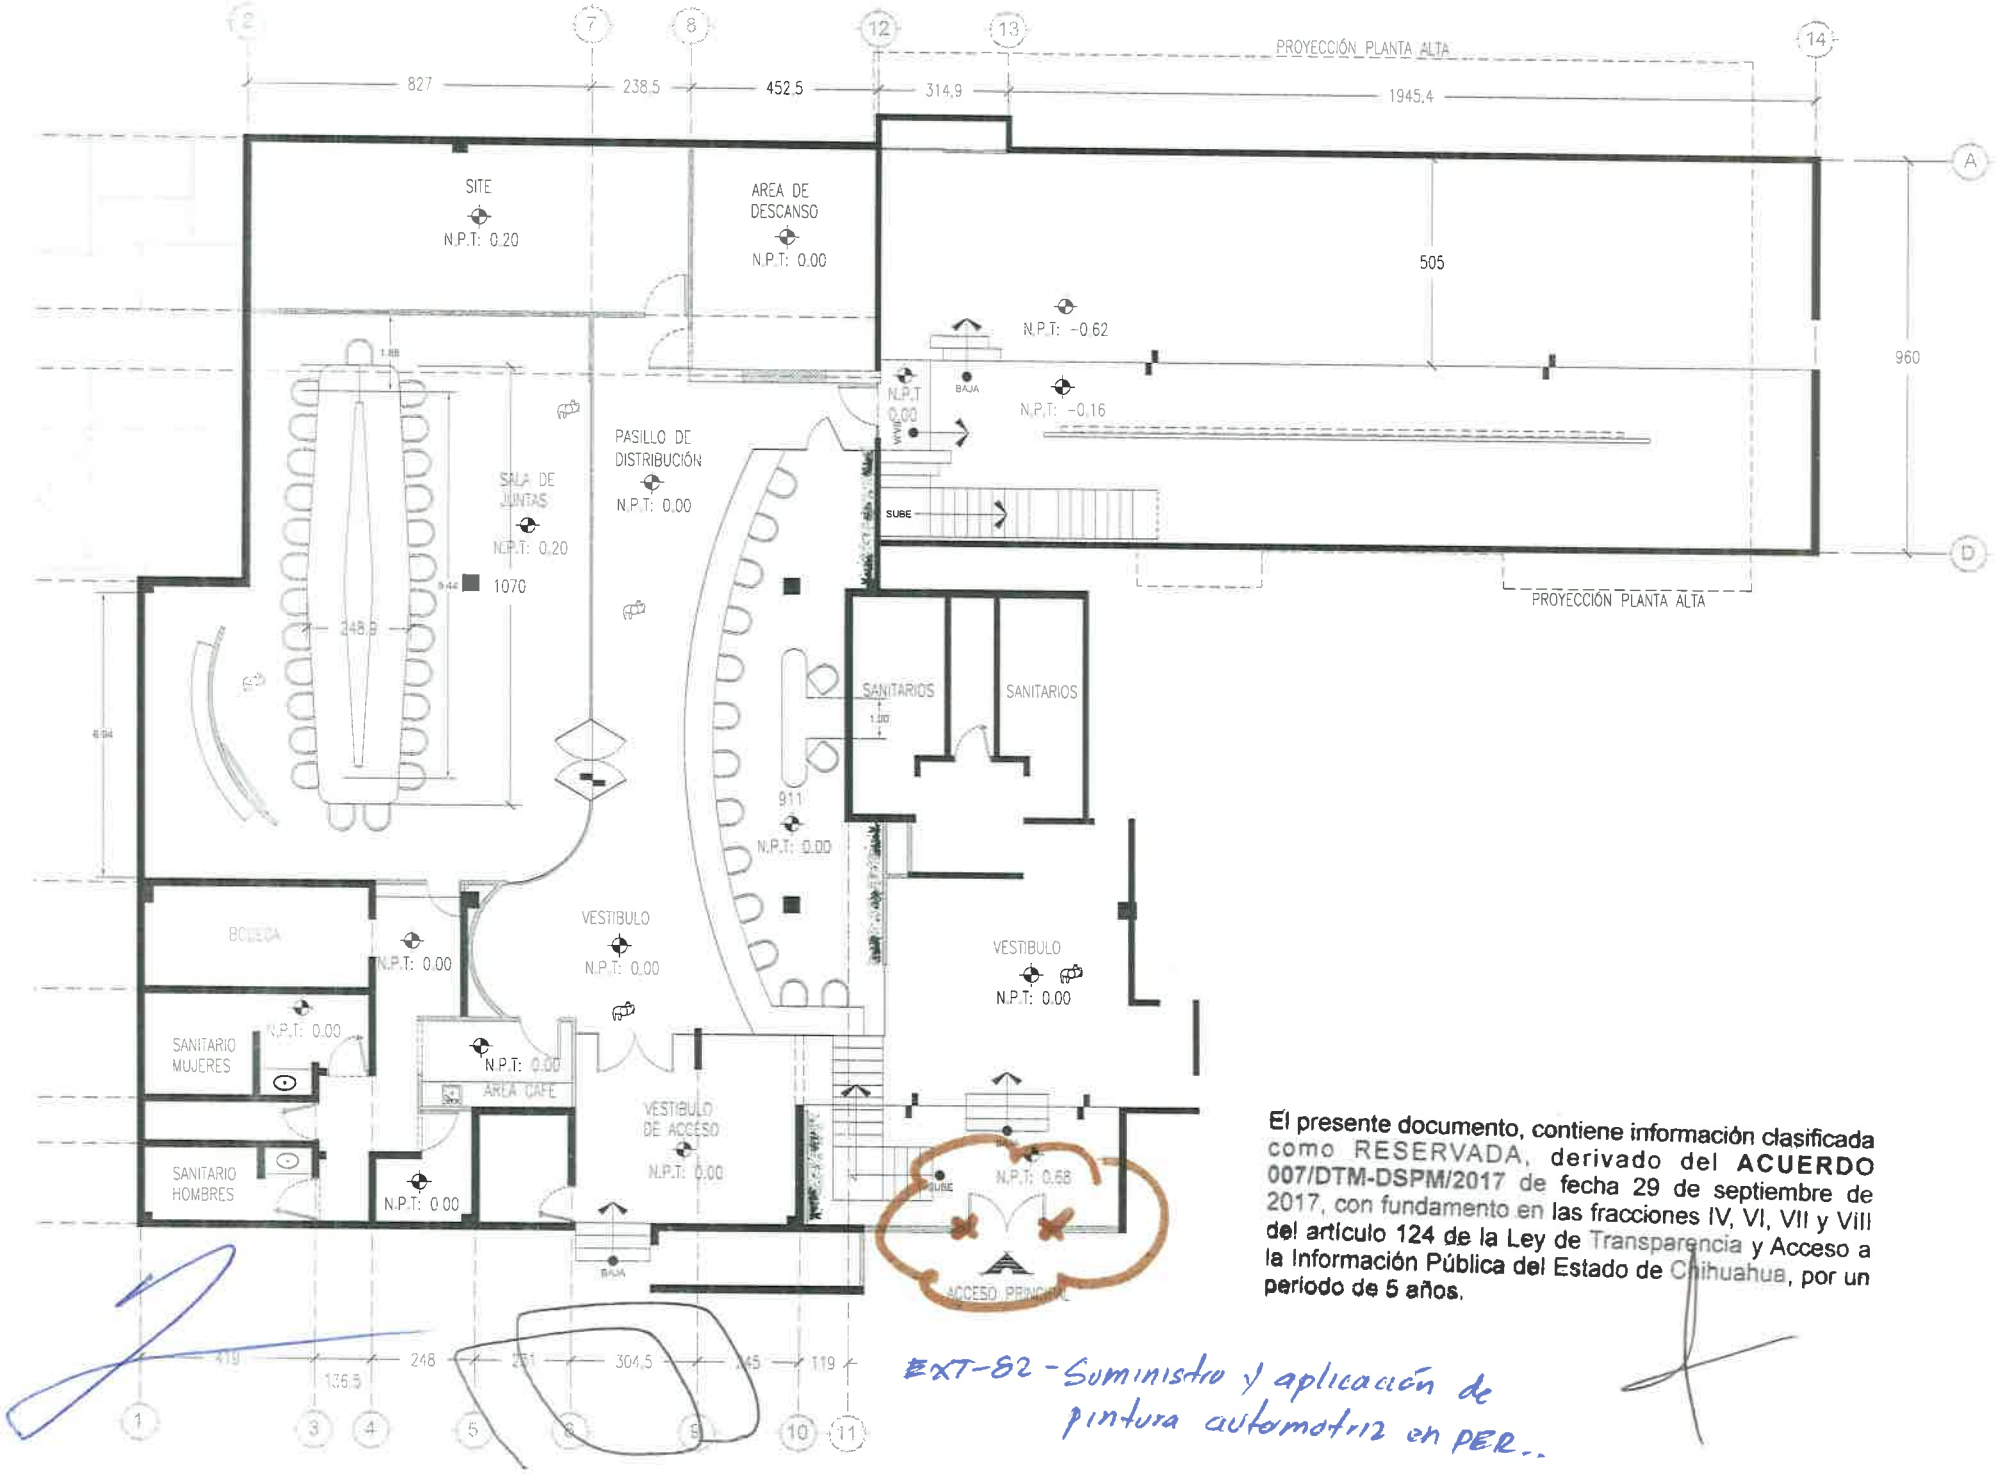

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-82 - Suministro y aplicación de pintura automotriz en PER..

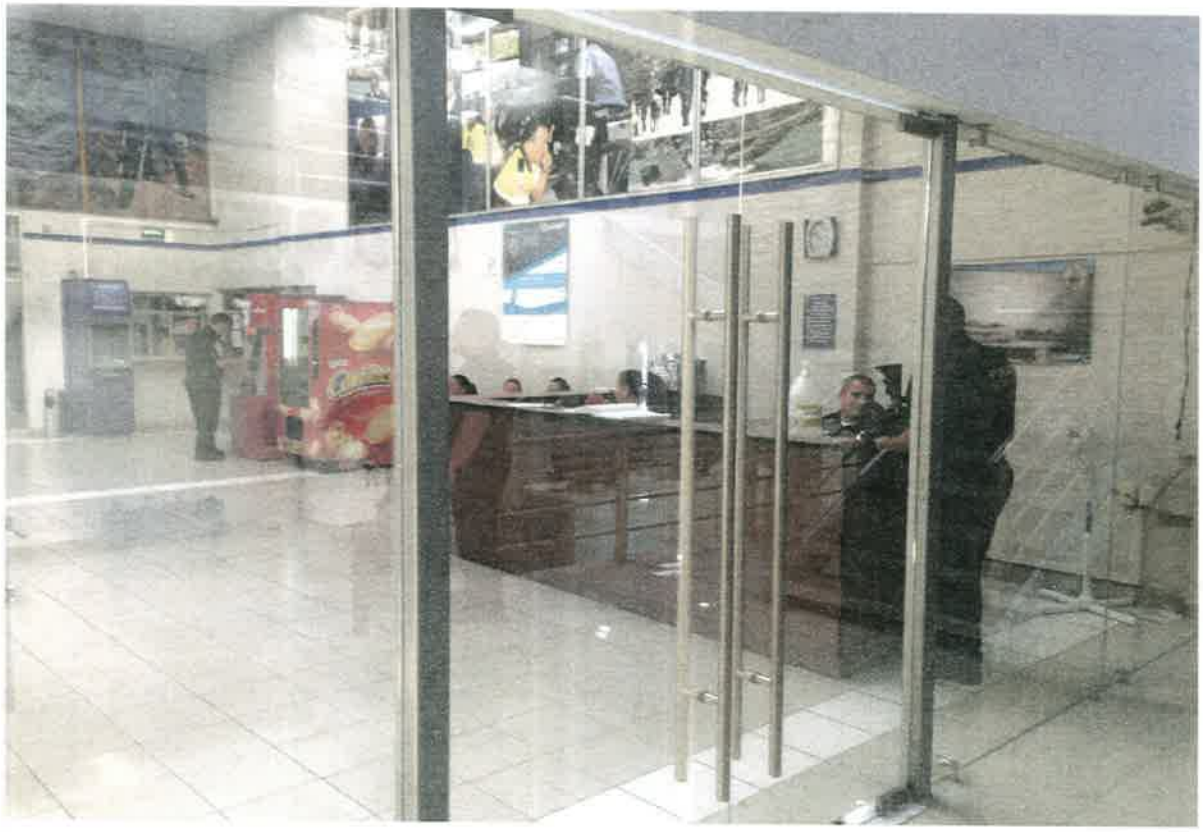

EXT- 82

Suministro y aplicación de pintura automotriz de PER de 3"X3" existentes en acceso principal, incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-83						
	Largo	**Alto**	**Total**			
Suministro y aplicación de textura en muros existentes, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.80	1.20	2.16			
		TOTAL	**2.16**			**2.16**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

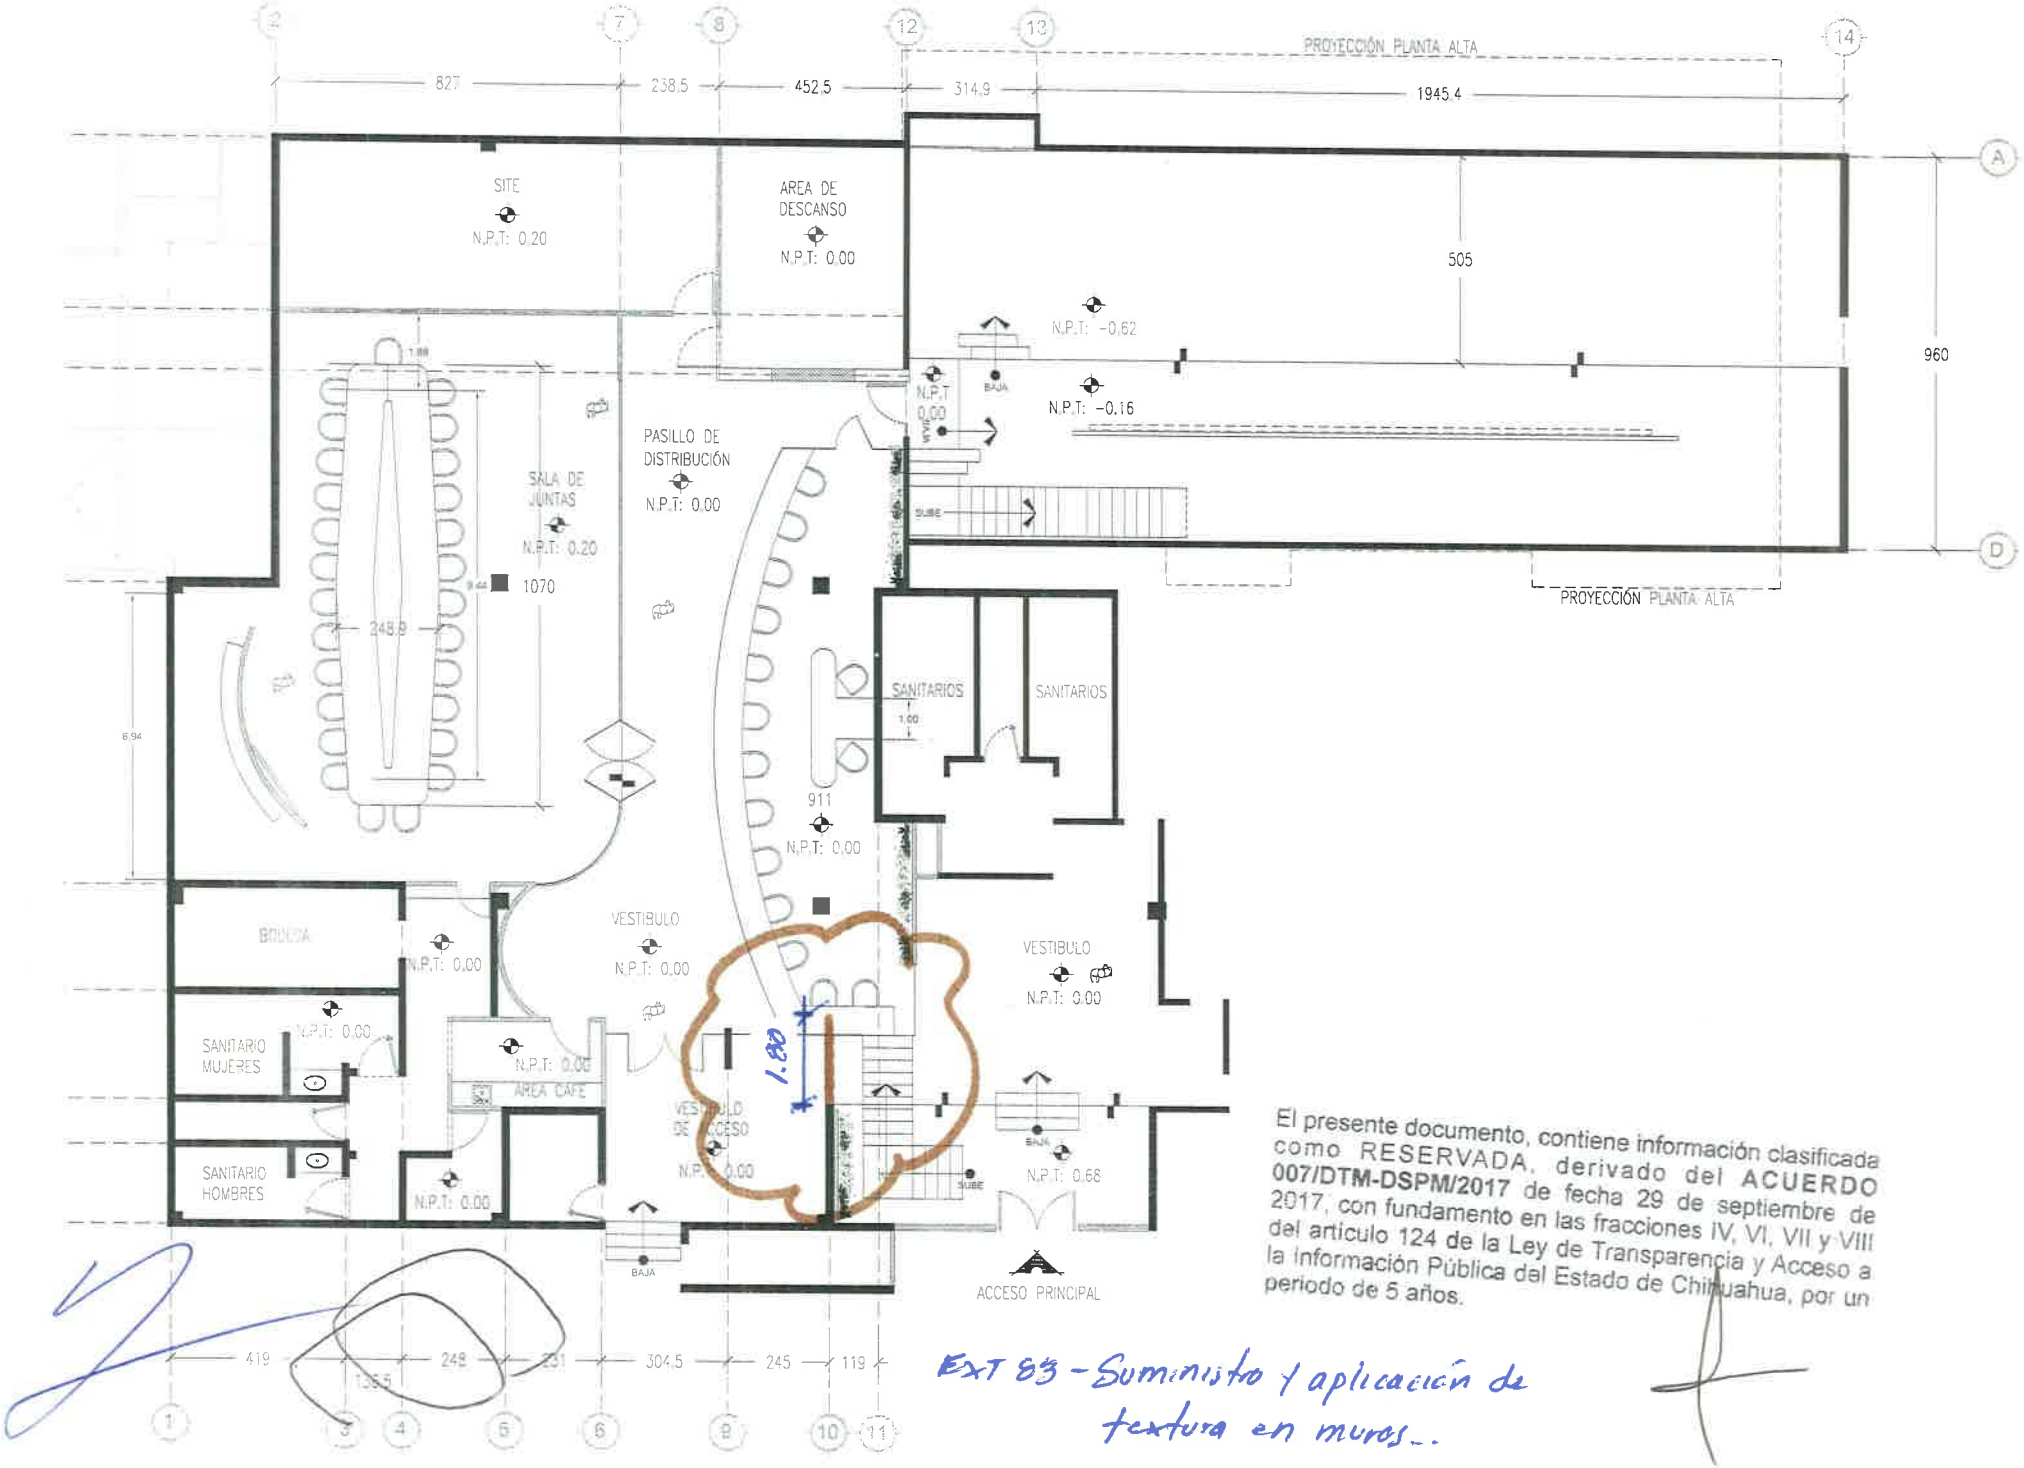

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT 83 - Suministro y aplicación de textura en muros..



EXT- 83 Suministro y aplicación de textura en muros existentes, incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-85					
Suministro y colocación de yuca, incluye suministro de yuca, sembrado, herramienta, mano de obra, materiales, riego por treinta días y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		2.00	2.00		
	TOTAL		**2.00**		**2.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

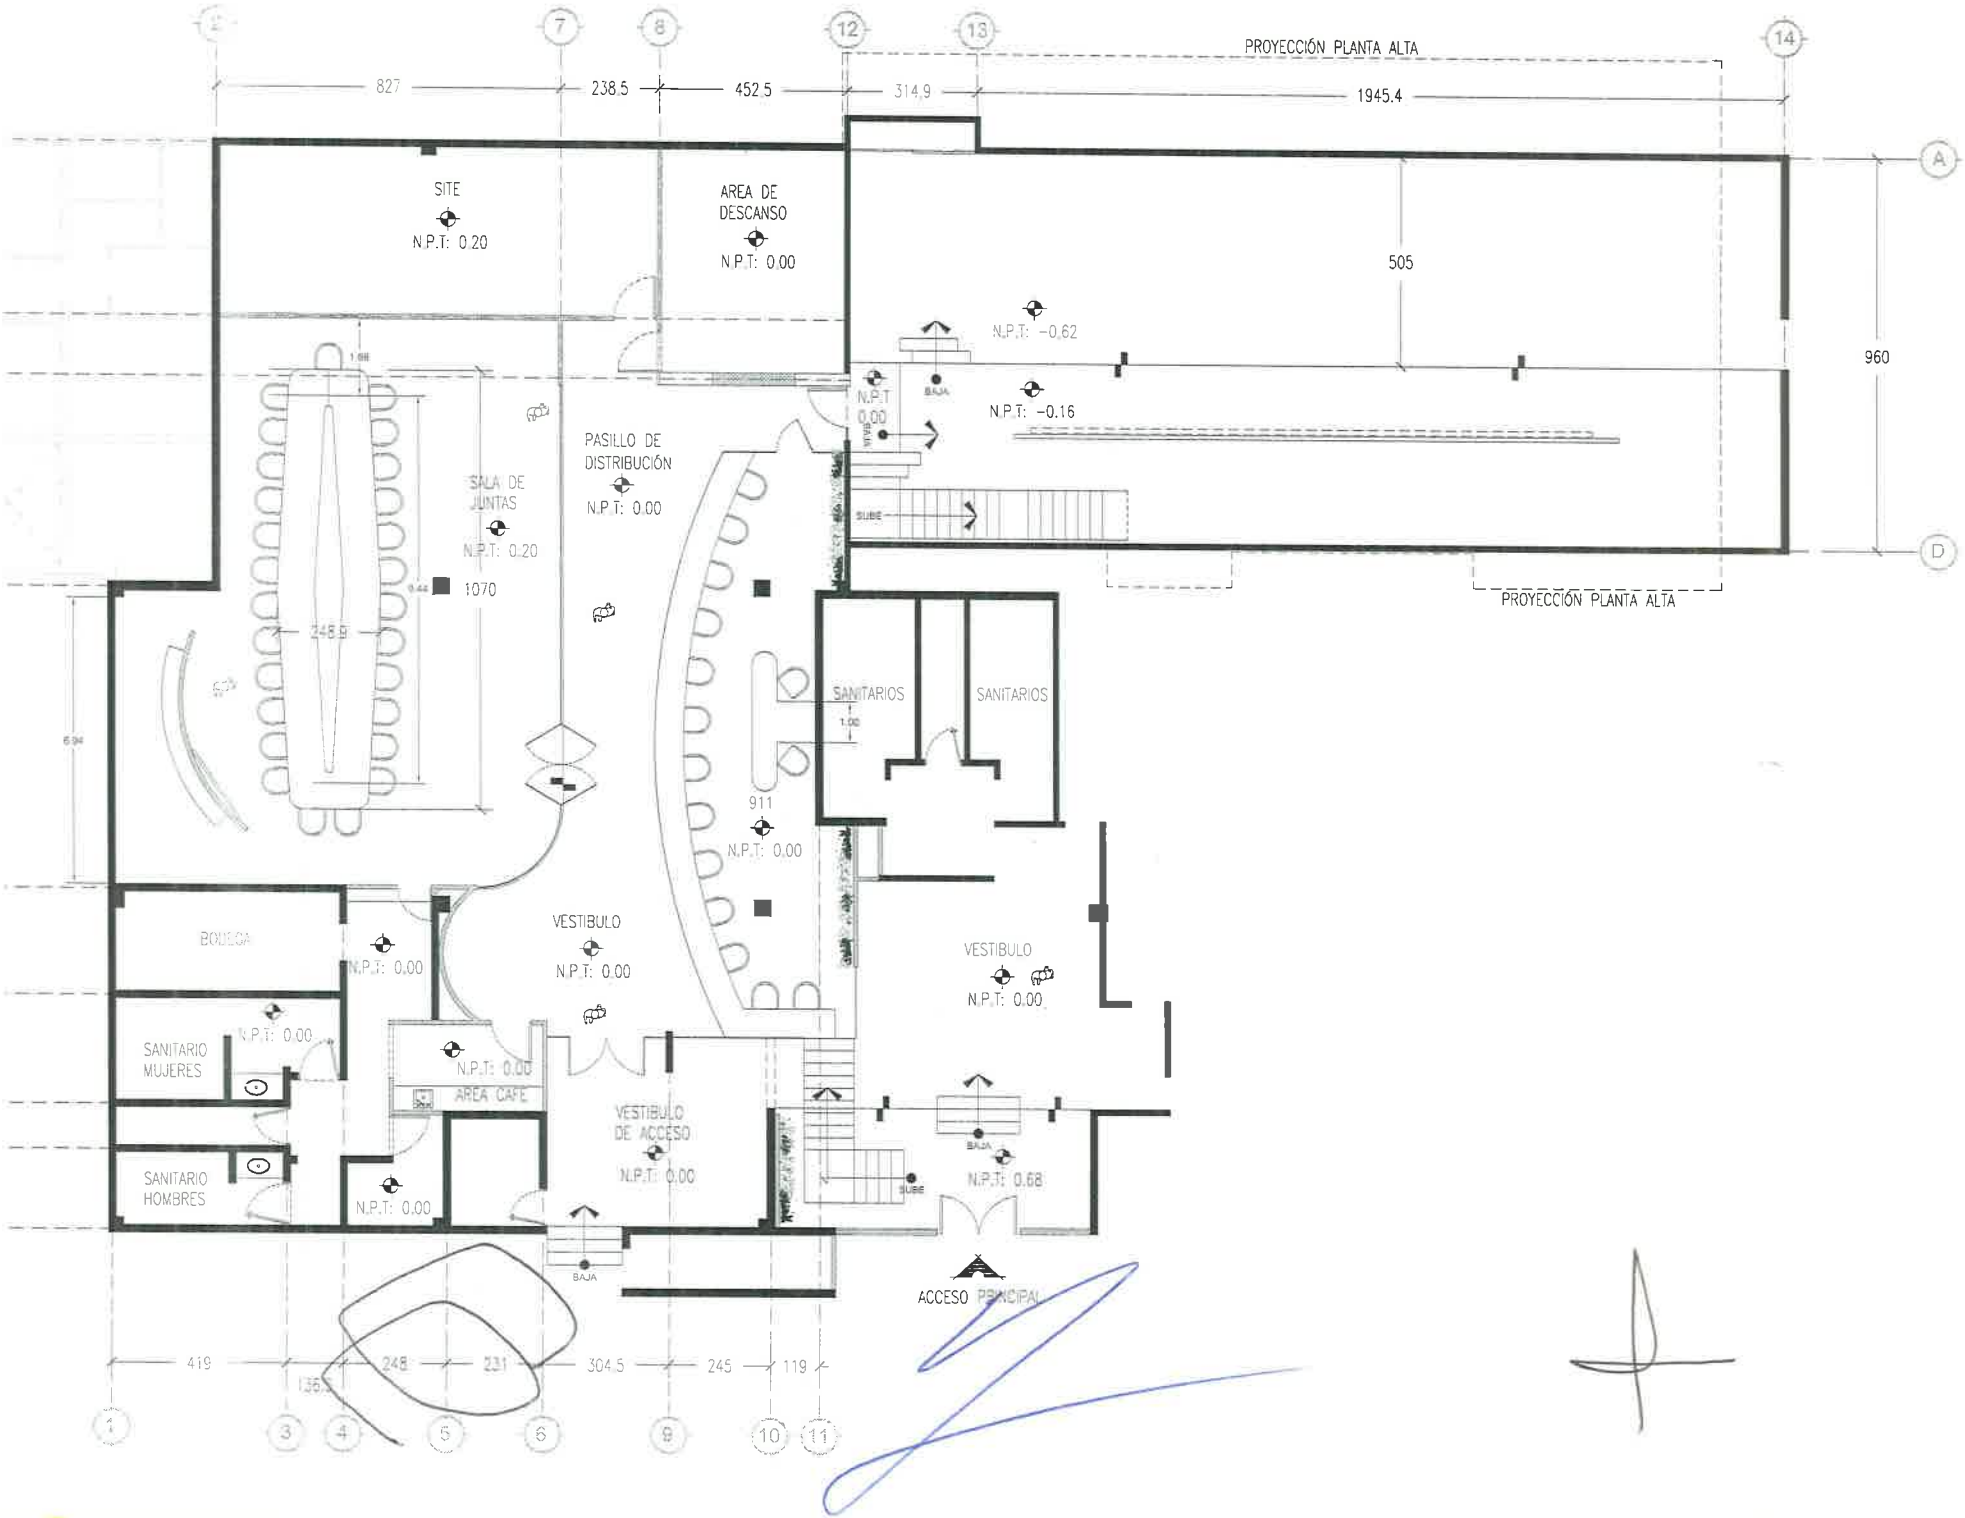
PROYECCIÓN PLANTA ALTA
827
238.5
452.5
314.9
1945.4
505
960
SITE
N.P.T: 0.20
AREA DE DESCANSO
N.P.T: 0.00
N.P.T: -0.62
N.P.T: -0.16
N.P.T 0.00
BAJA
SUBE
PASILLO DE DISTRIBUCIÓN
N.P.T: 0.00
SALA DE JUNTAS
N.P.T: 0.20
1070
248.9
SANITARIOS
SANITARIOS
911
N.P.T: 0.00
VESTIBULO
N.P.T: 0.00
BODEGA
N.P.T: 0.00
SANITARIO MUJERES
N.P.T: 0.00
AREA CAFE
VESTIBULO DE ACCESO
N.P.T: 0.00
SANITARIO HOMBRES
N.P.T: 0.00
VESTIBULO
N.P.T: 0.00
N.P.T: 0.68
ACCESO PRINCIPAL
419
248
231
304.5
245
119
PROYECCIÓN PLANTA ALTA



EXT- 85 Suministro y colocación de yuca, incluye suministro de yuca, sembrado, herramienta, mano de obra, materiales, riego por treinta días y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-86					
Suministro y colocación de peces y alimento. Incluye: selección de peces, alimento necesario por 30 días, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Lote**	**Total**		
		1.00	1.00		
	TOTAL		**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

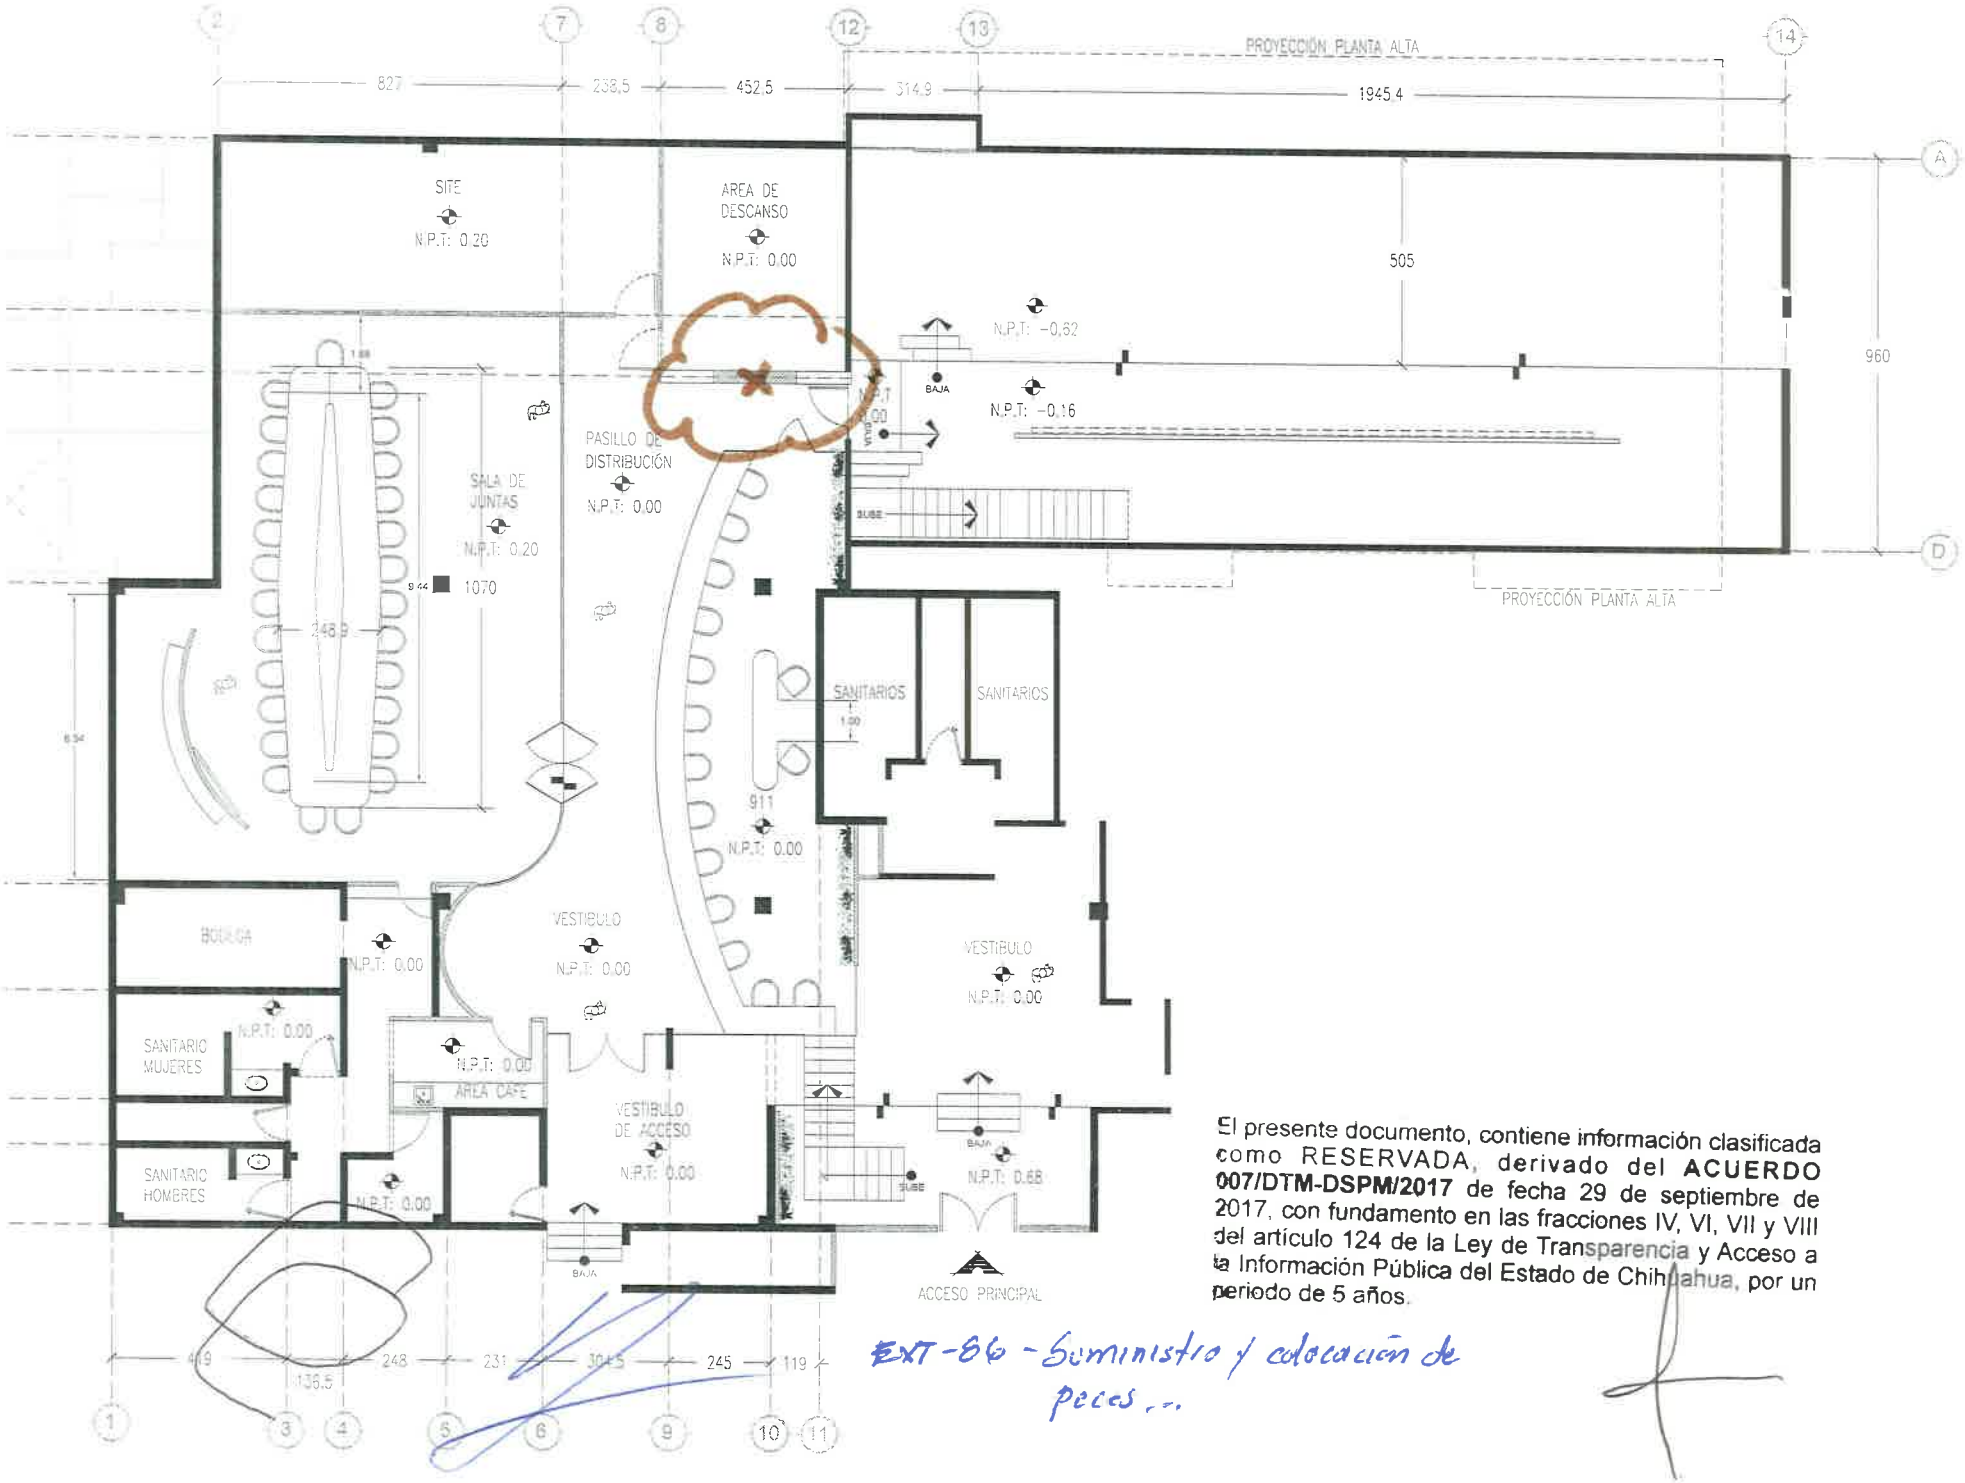

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-86 - Suministro y colocación de pecas...



EXT- 86 Suministro y colocación de peces y alimento. Incluye: selección de peces, alimento necesario por 30 días, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-88					
Cajillo en "U" área de cancel mesa sala de juntas de 0.20 m x 0.10m x 0.19-0.37 m, a base de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 3 5/8", poste metálico 3 5/8", calibre 26 a cada 0.60 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
		10.17	10.17		
	TOTAL		**10.17**		**10.17**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

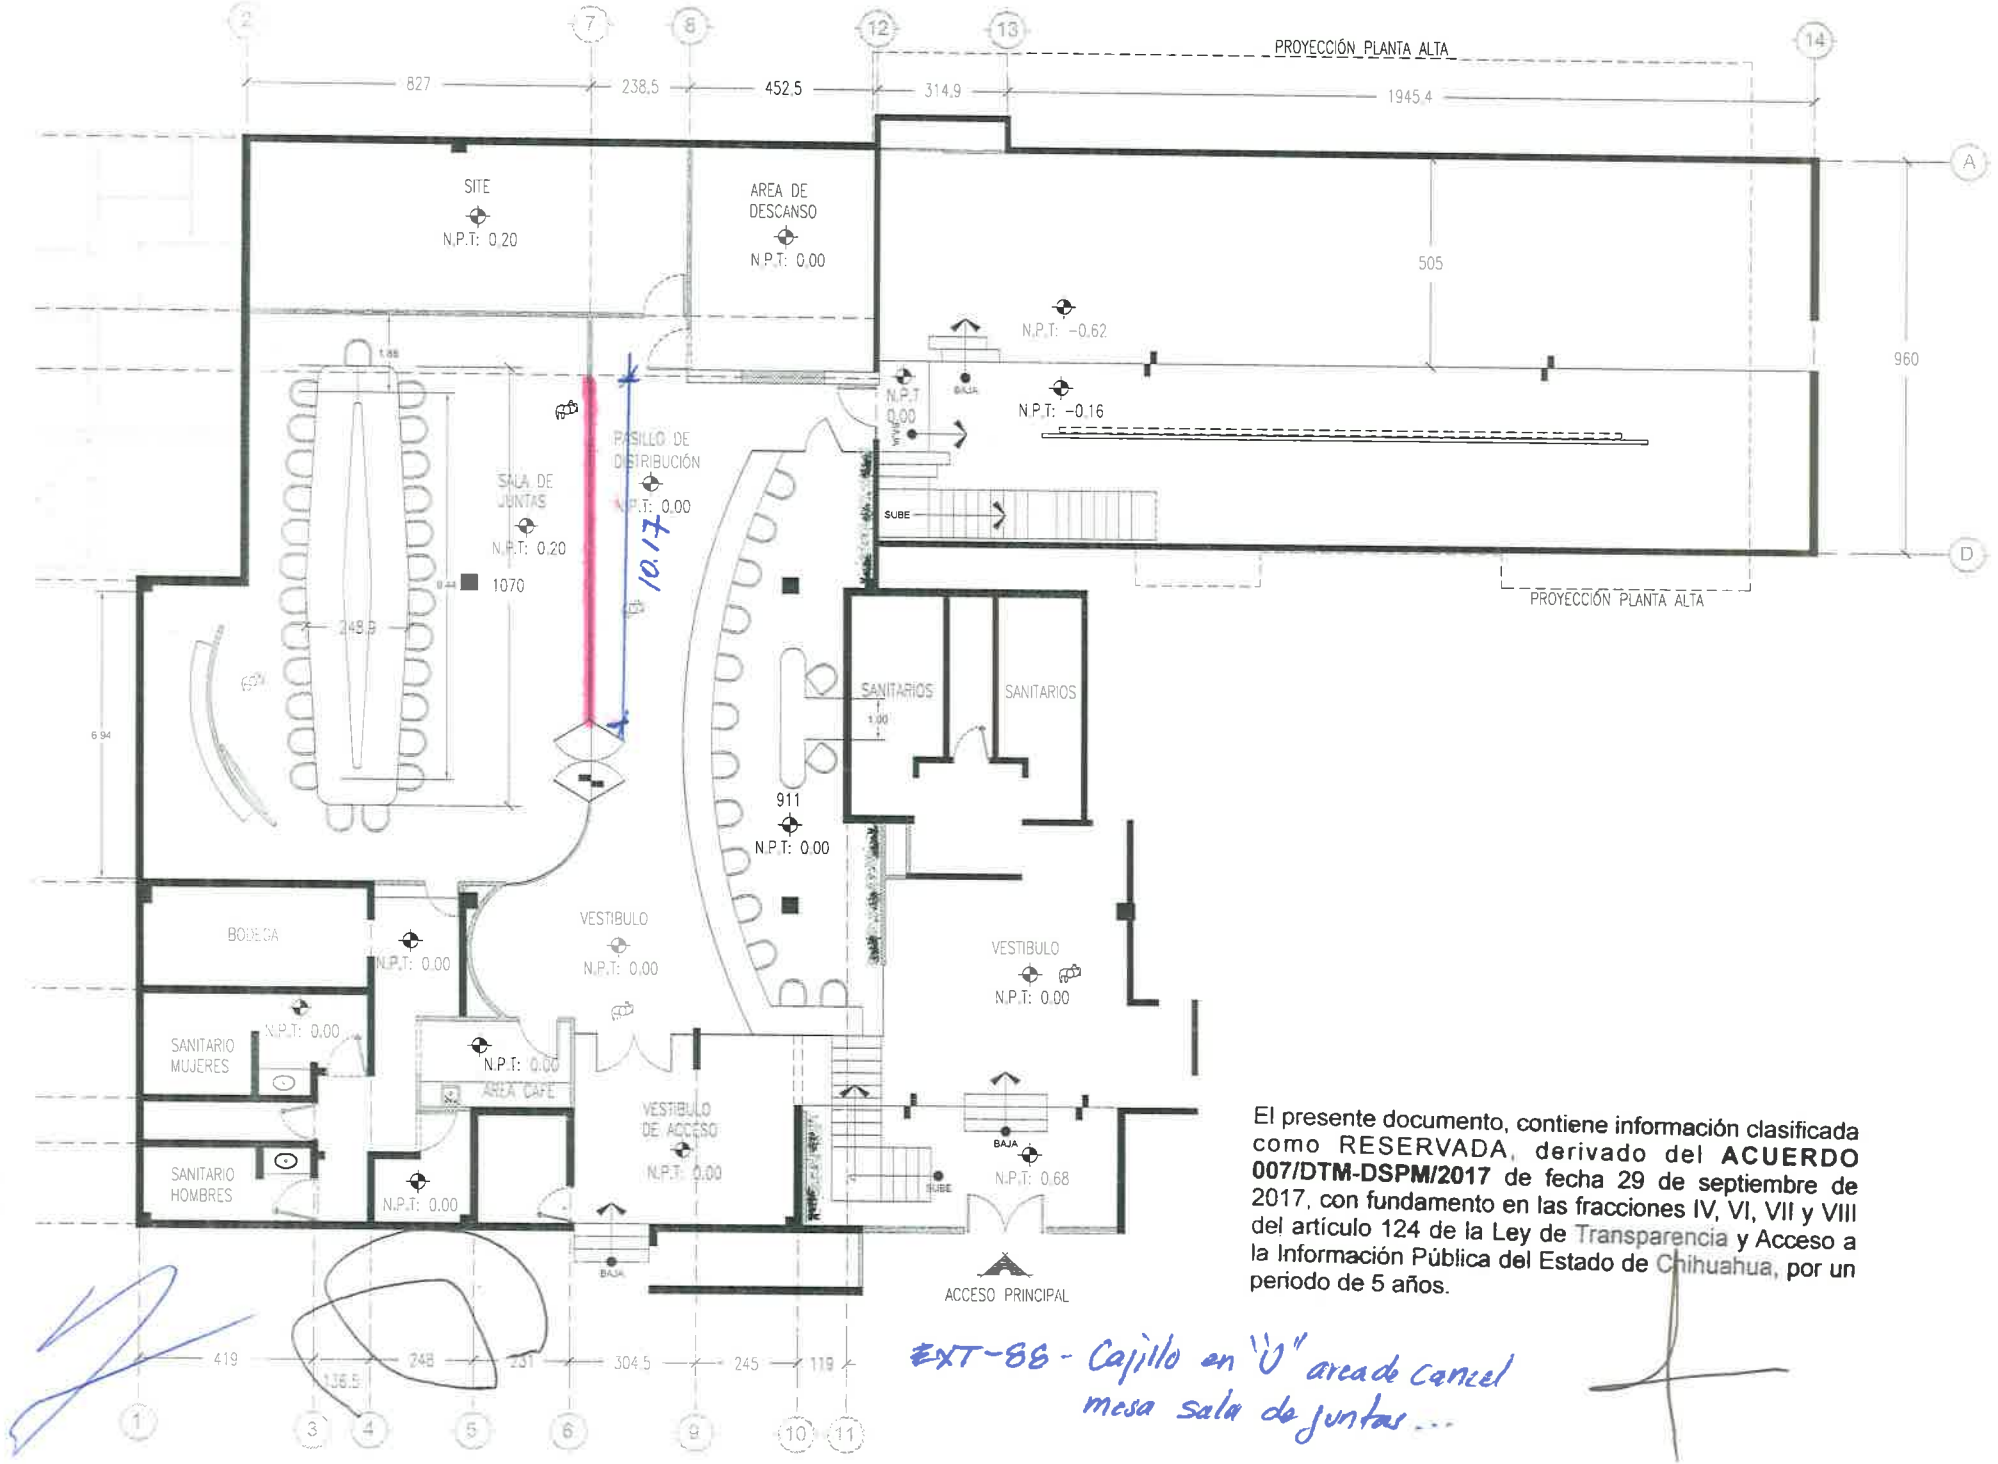

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-88 - Cajillo en "U" area de cancel mesa sala de juntas...



EXT- 88

Cajillo en "U" área de cancel mesa sala de juntas de 0.20 m x 0.10m x 0.19-0.37 m, a base de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 3 5/8", poste metálico 3 5/8", calibre 26 a cada 0.60 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-89						
Nichos en muro de tablaroca de pecera de 25cm x 33cm x 33 cm. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		3.00	3.00			
		TOTAL	**3.00**			**3.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

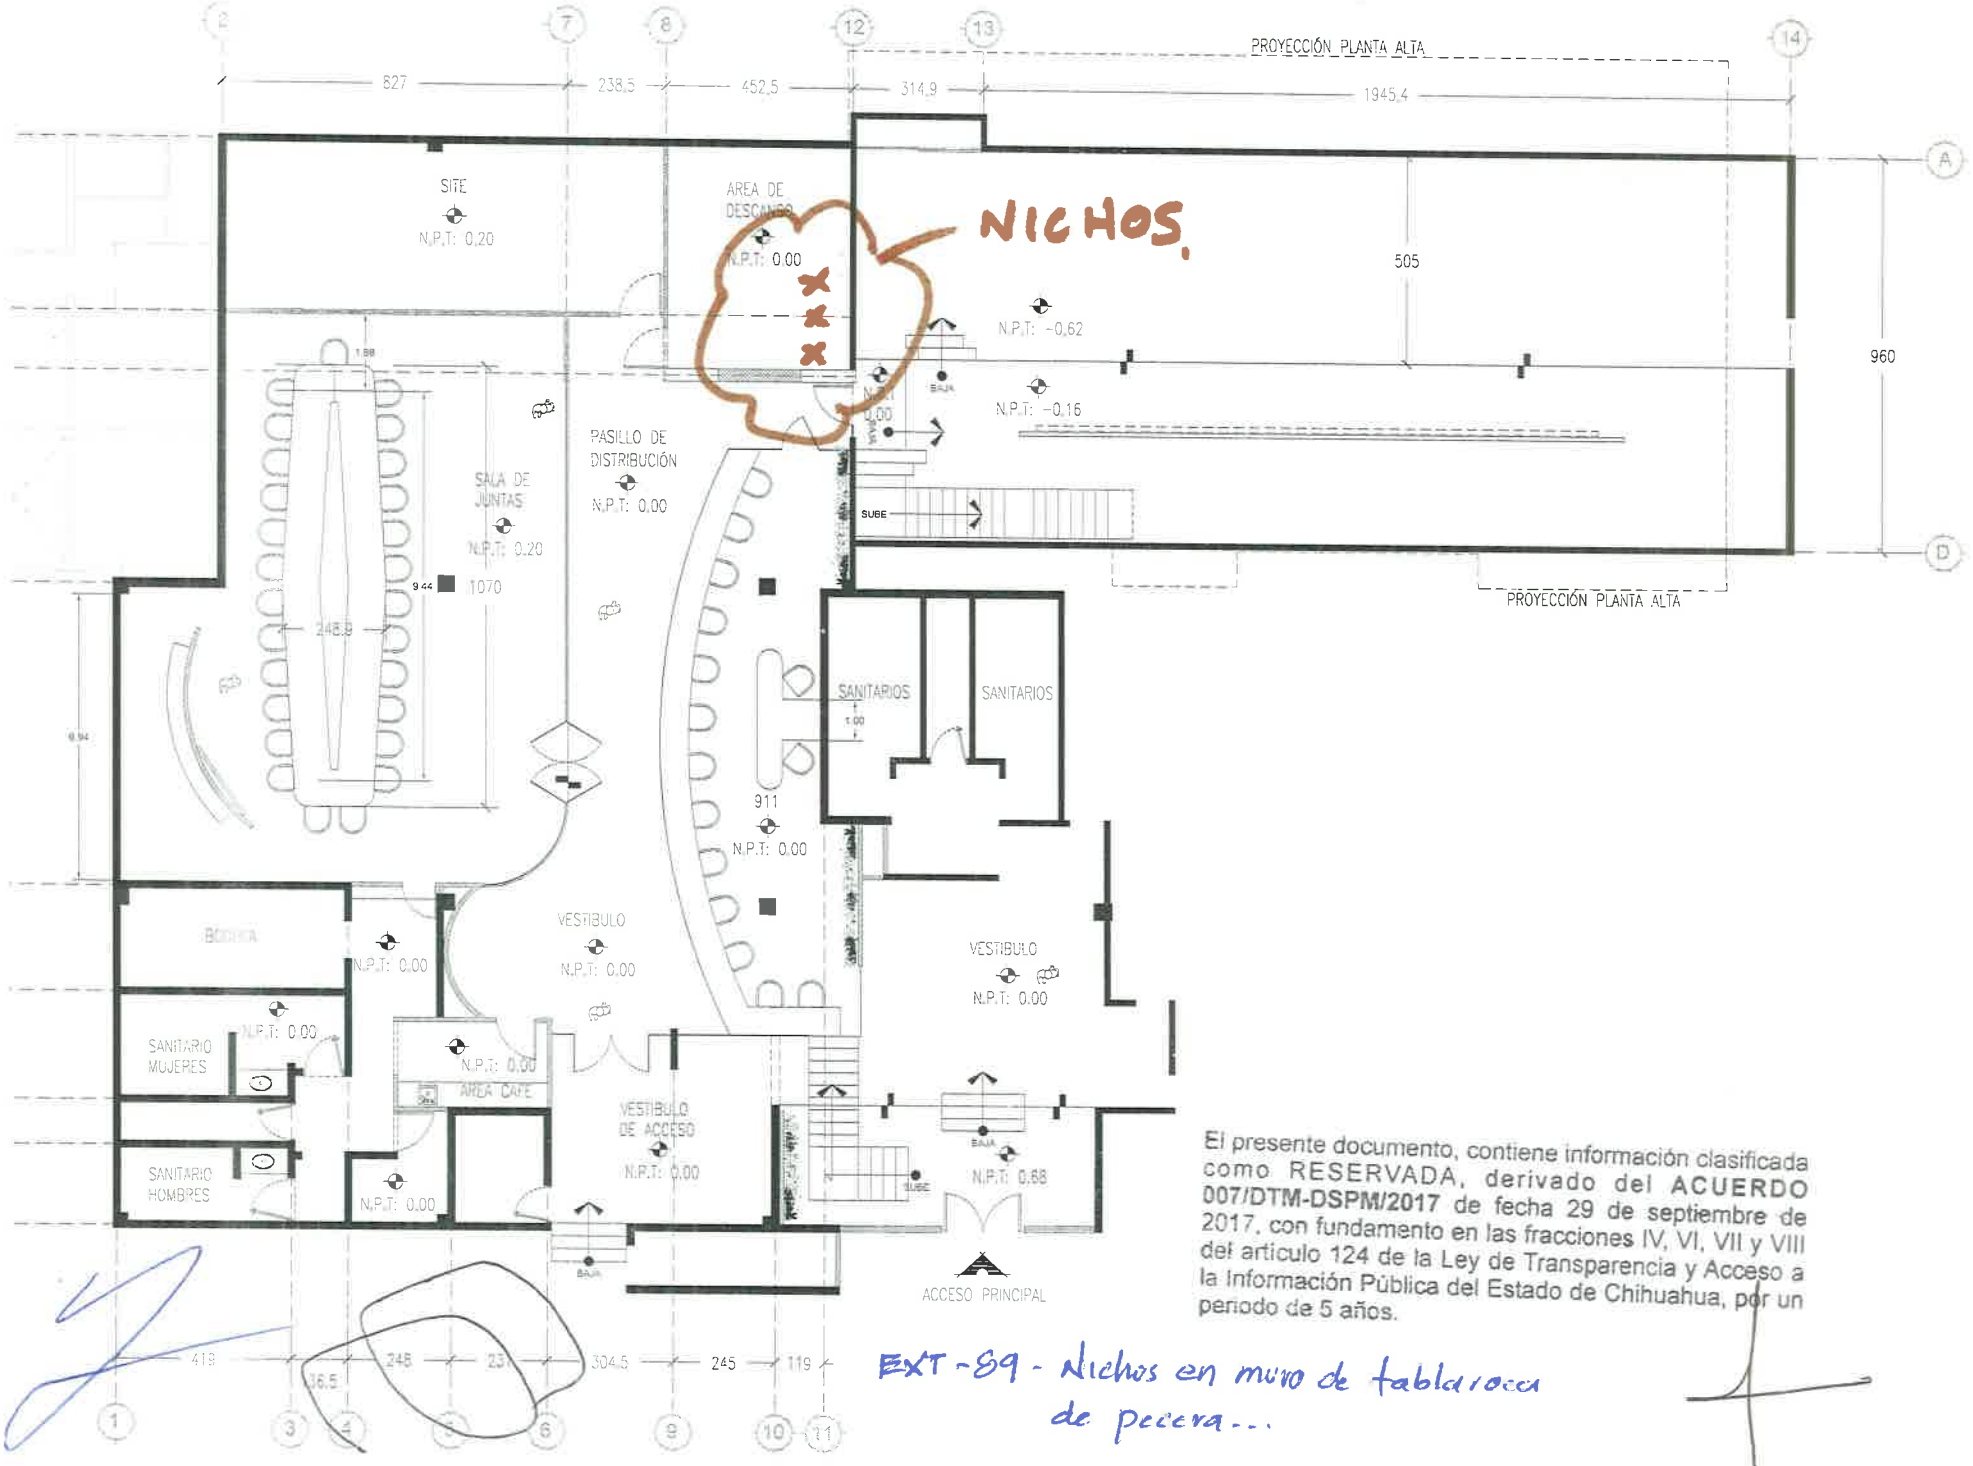

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-89 - Nichos en muro de tablaroca de pecera...

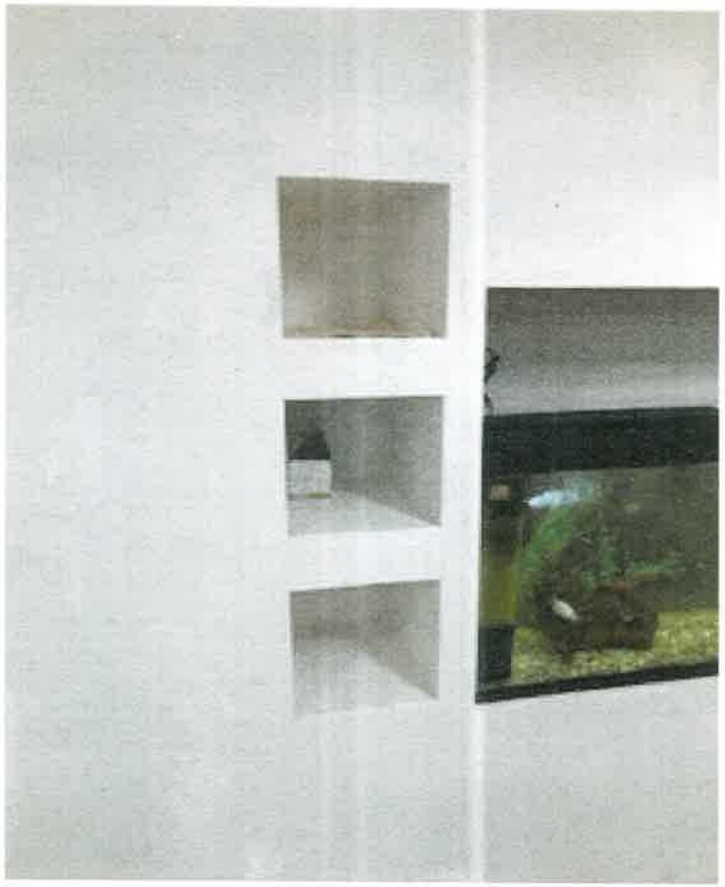

EXT- 89 Nichos en muro de tablaroca de pecera de 25cm x 33cm x 33 cm. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-90					
Hueco con "T" esmaltada para colocación de lámpara de 0.61 m x 0.61m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		6.00	6.00		
		TOTAL	**6.00**		**6.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

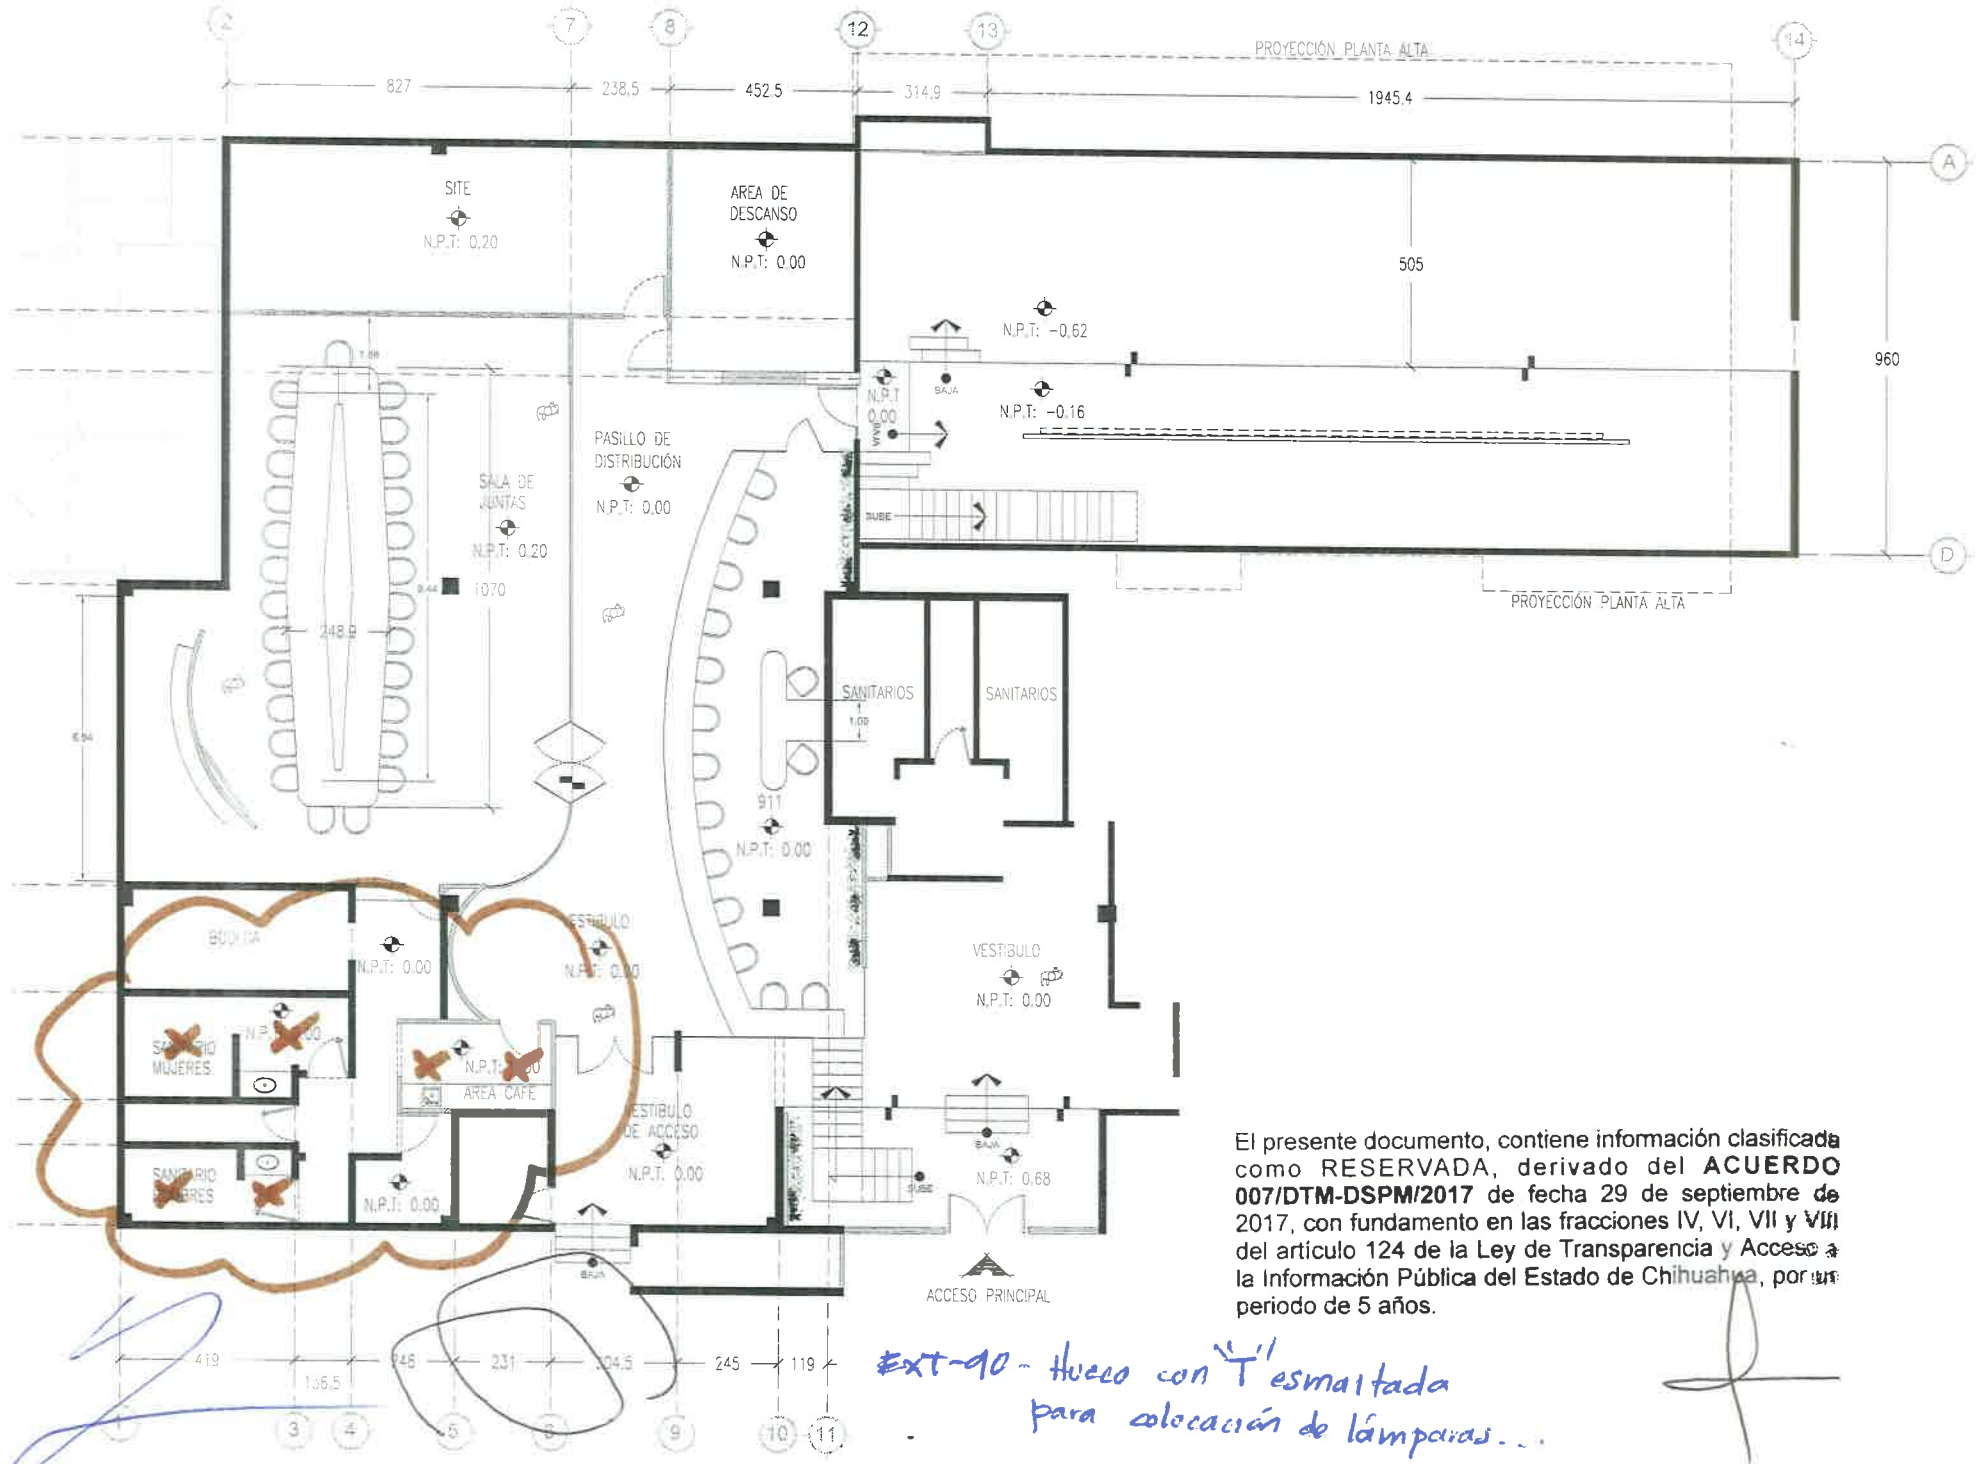

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ext-90 - Hueco con "T" esmaltada para colocación de lámparas...



EXT- 90

Hueco con "T" esmaltada para colocación de lámpara de 0.61 m x 0.61m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-91						
Suministro de alfombra modular modelo Cosmos marca Terza mohawk. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**m2**	**Total**			**1.00**
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONSTRUCCIONES
MARRO
S.A. DE C.V.

26-MARZO-2018

ING. LUIS RICARDO GARCIA FIERRO
Jefe de tecnologías e información de la dirección
de Seguridad Pública Municipal

Por medio de la presente le hago entrega de 1.00 m2. de alfombra modular modelo Cosmos, marca Terza mohauk, mismo modelo que se suministró e instaló en Área 911

Sin mas por el momento quedo de Ud.


ENTREGA

Arq. Graciela Rodríguez García

RECIBE

Pol.3ro. José Hernández Camargo

PROGRESO 102-1 e-mail mr@cmarro.com TELS. Y FAX (614)410-95-50 y (614)410-91-51 CHIHUAHUA, CHIH.

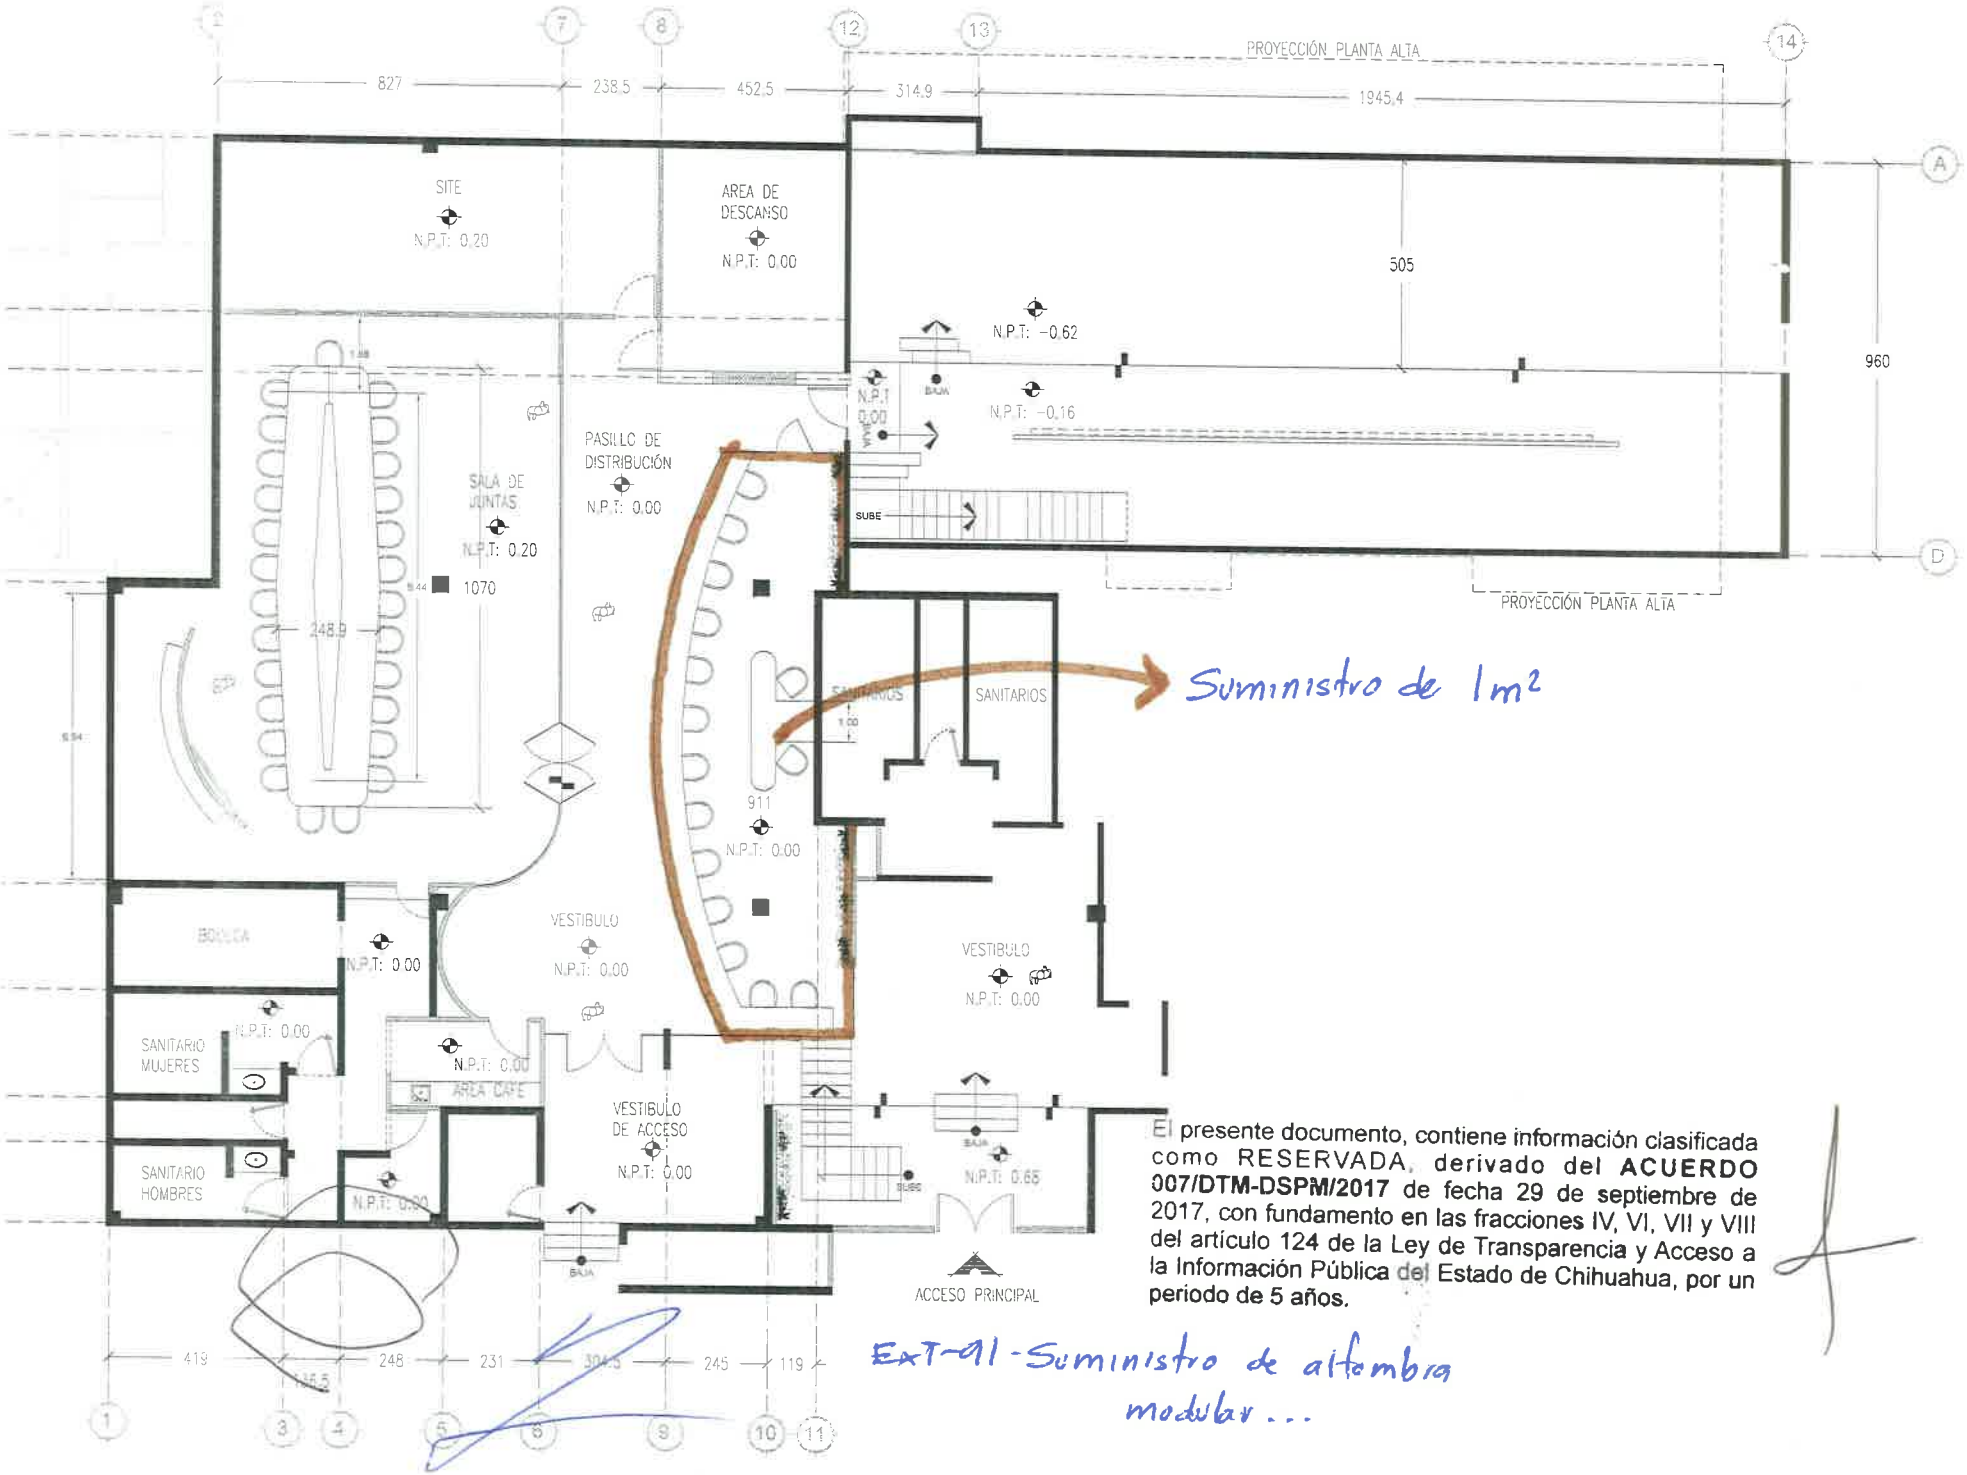

Suministro de 1m²

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-91 - Suministro de alfombra modular...



EXT- 91

Suministro de alfombra modular modelo Cosmos marca Terza mohawk. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-92						
Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm, marca Interceramic, en muro de soporte de barra de comedor de 2.00 m. de largo x 1.03 m de altura x 0.15m de espesor, adhesivo porcelánico, Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			**1.00**


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

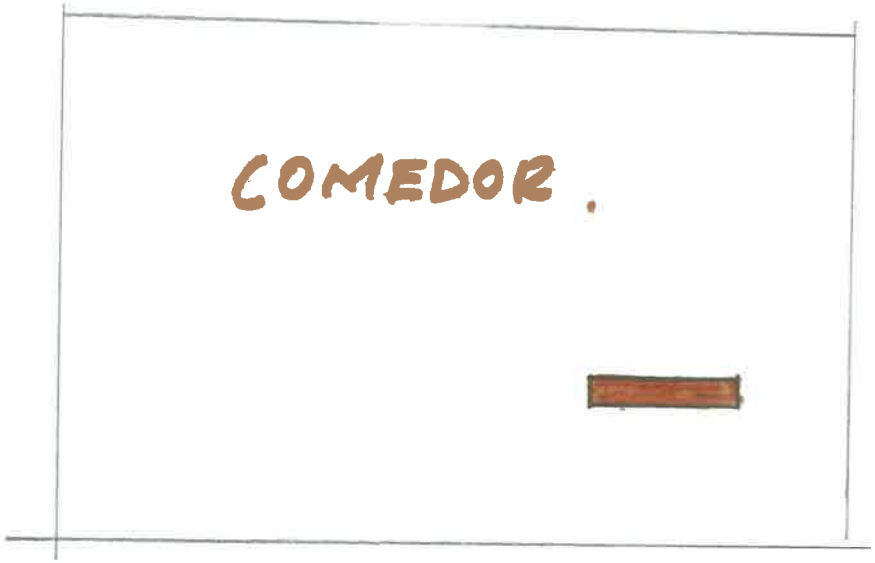

EXT-92 - Suministro y colocación de porcelanato absolute beige...



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 92

Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige de 60 cm x 60 cm, marca Interceramic, en muro de soporte de barra de comedor de 2.00 m. de largo x 1.03 m de altura x 0.15m de espesor, adhesivo porcelánico, Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-93					
Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige, marca Interceramic entre gabinetes de cocina de comedor de 0.54 m de separación, adhesivo porcelánico. Incluye cortes a 45° en área de ventana, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

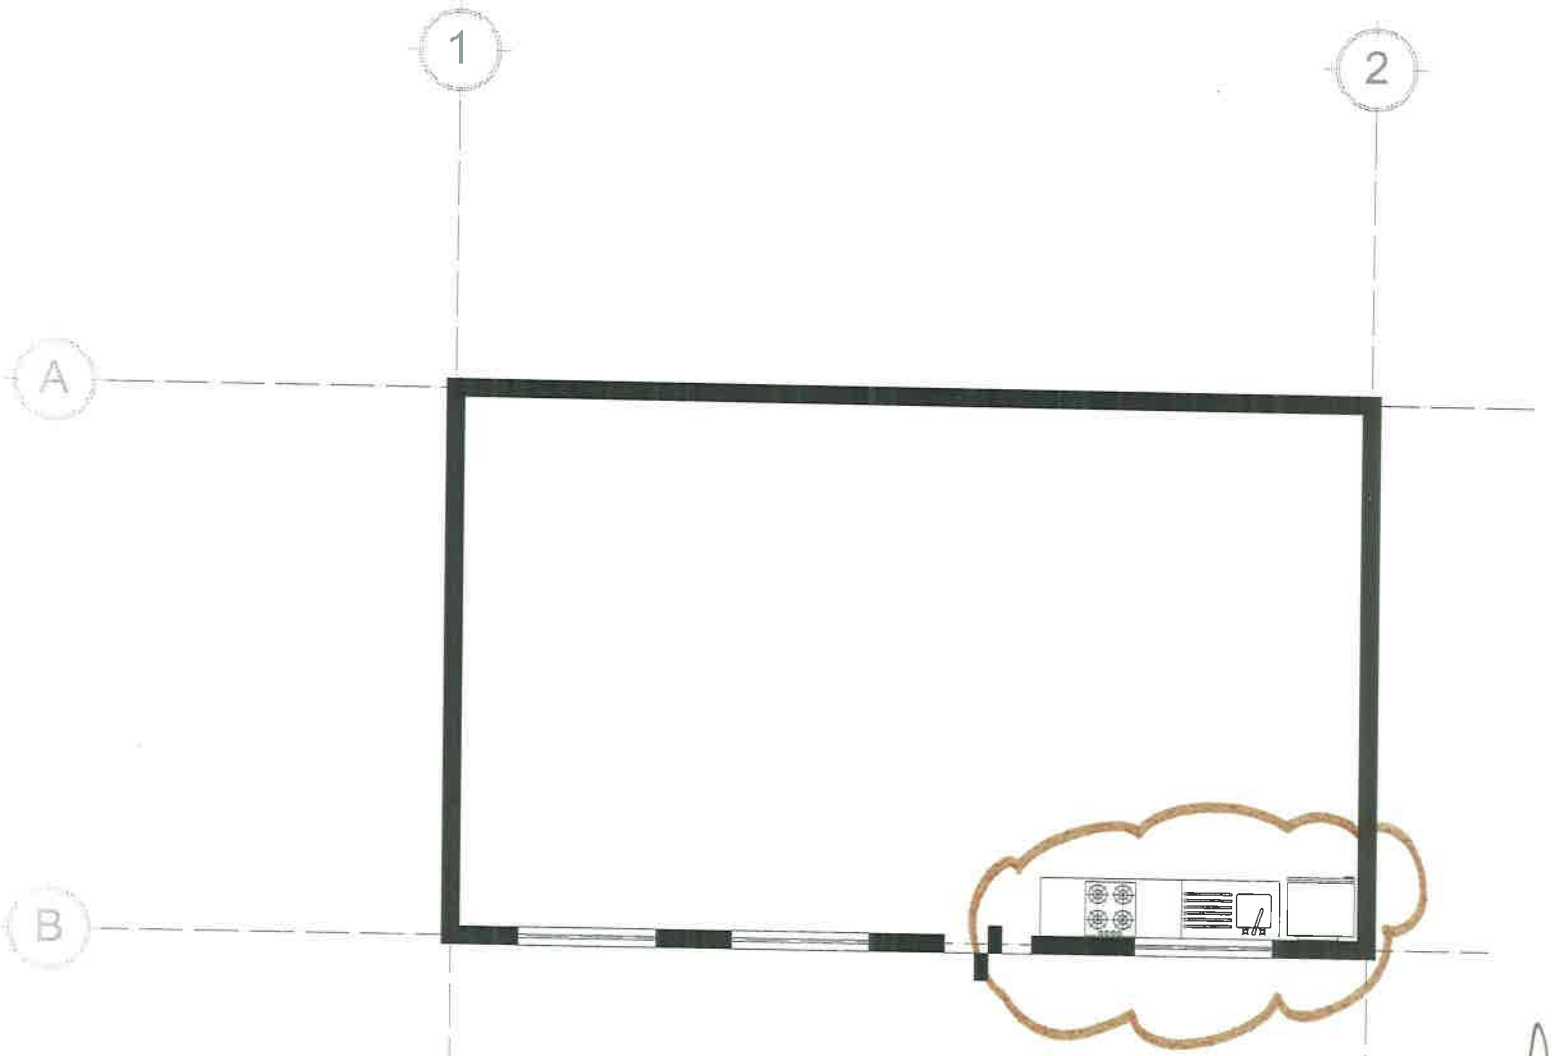

EXT-93 - Suministro y colocación de porcelanato absoluto beige...

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 93

Suministro y colocación de porcelanato Absolute beige, marca Interceramic entre gabinetes de cocina de comedor de 0.54 m de separación, adhesivo porcelánico. Incluye cortes a 45° en área de ventana, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-94					
Pasamanos de acero inoxidable a base de tubular modelo 160, circular de 2", incluye material y mano de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		
	VIDEO WALL				
		2.78	2.78		
		2.78	2.78		
		1.18	1.18		
		1.10	1.10		
		1.00	1.00		
	TOTAL		**8.84**		**8.84**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

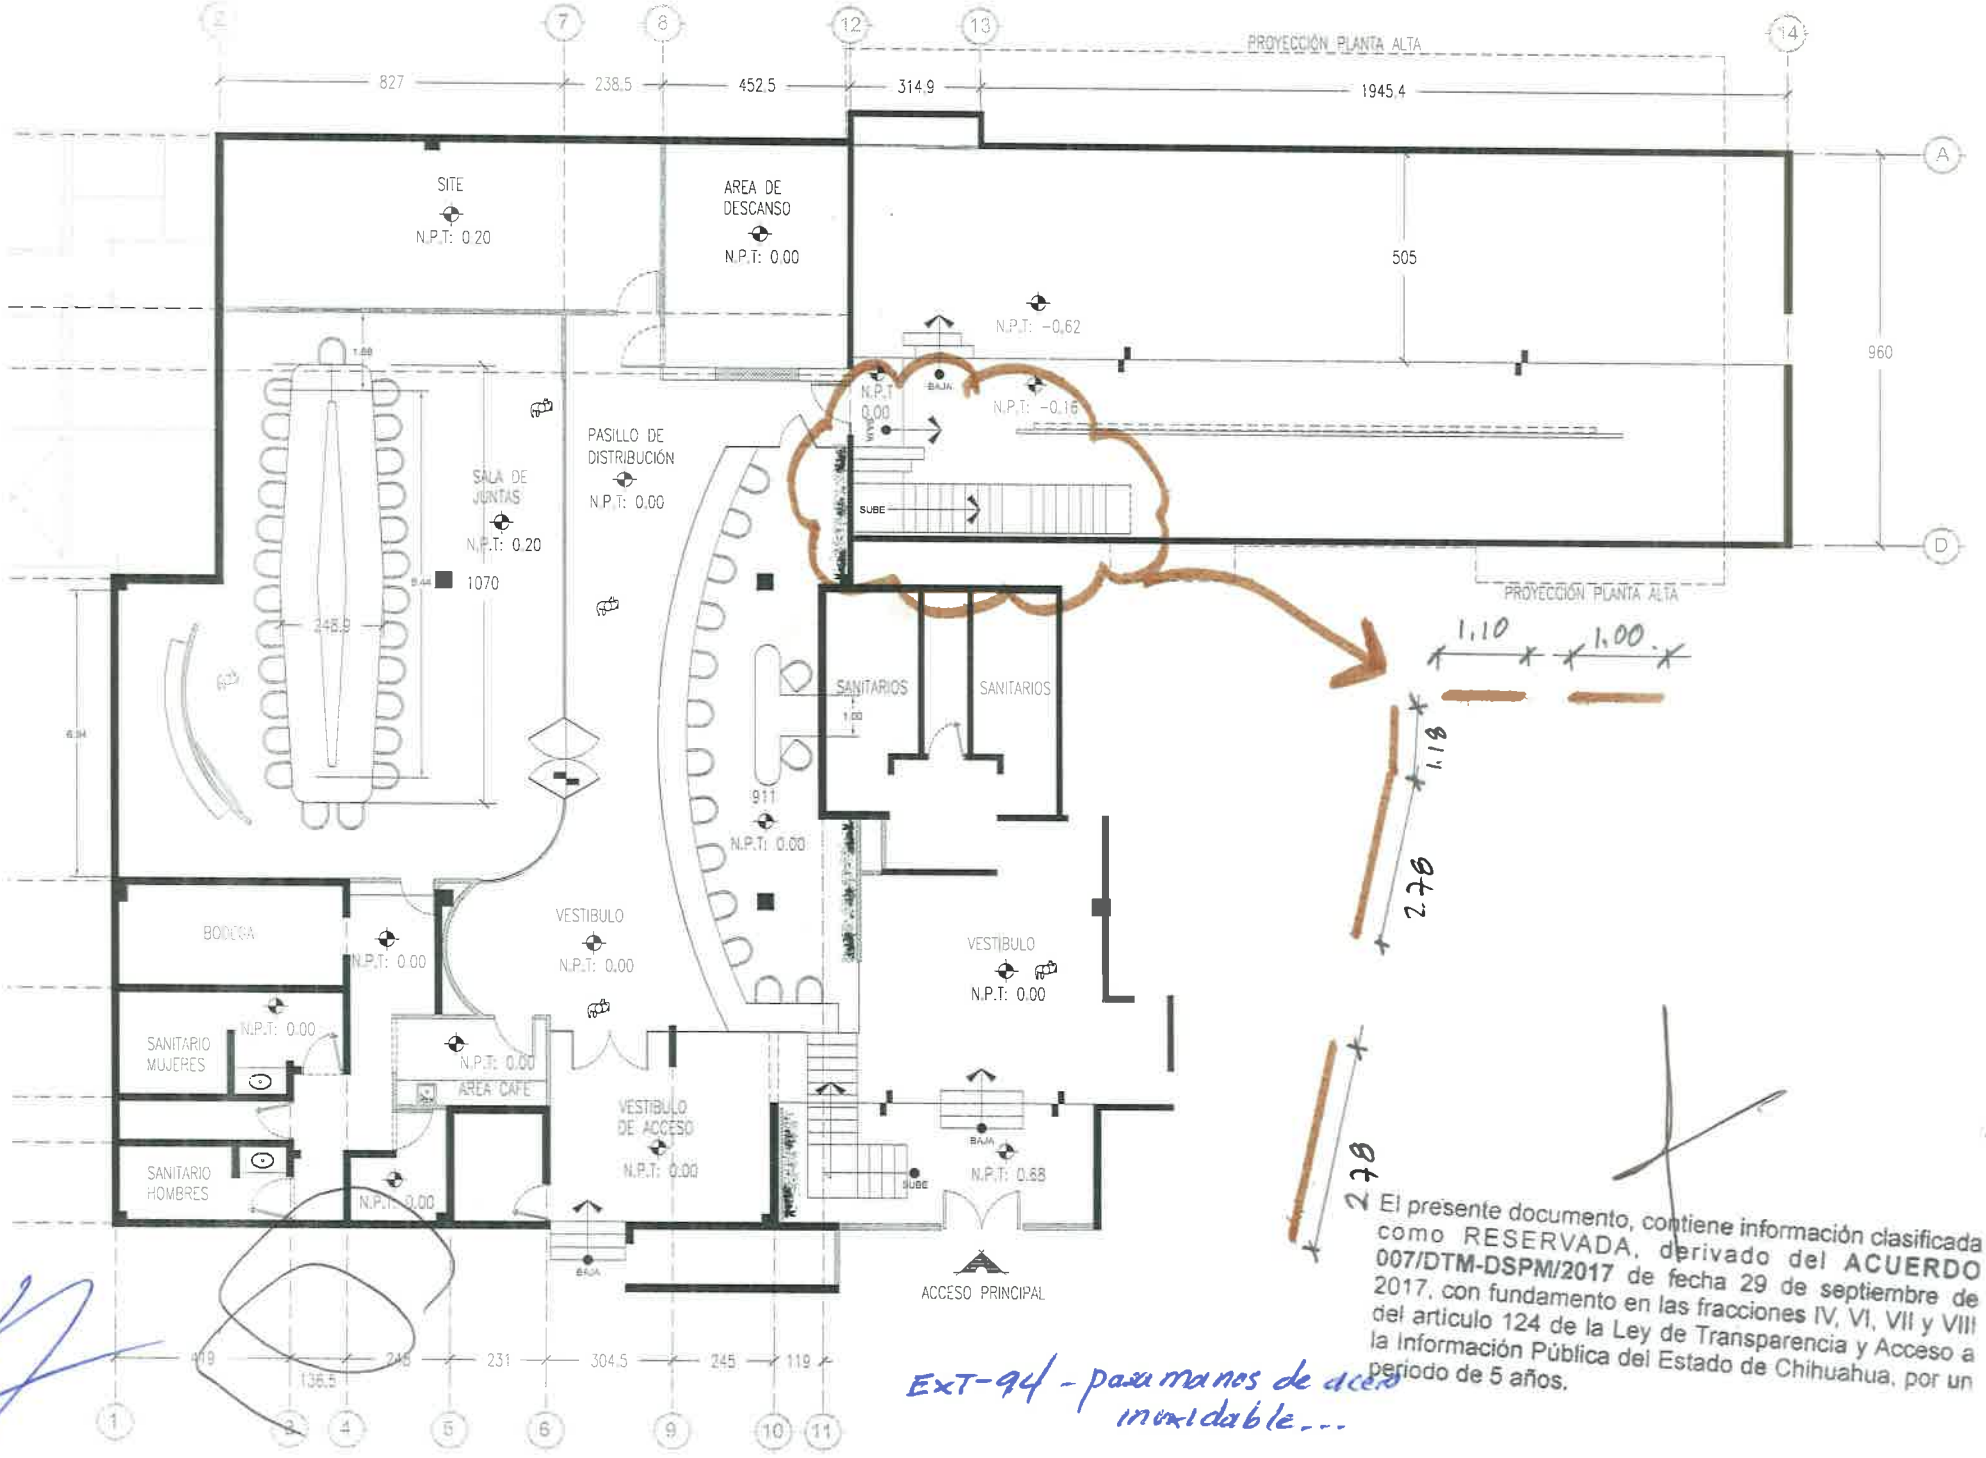

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ext-94 - para manos de acero inoxidable...



EXT- 94

Pasamanos de acero inoxidable a base de tubular modelo 160, circular de 2", incluye material y mano de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-95					
Suministro y colocación de cancel con desarrollo de 2.83 m., incluye: 2 puertas abatibles de 1.00 m de ancho x 2.30 m de altura y 2 fijos de 0.415mts de ancho x 2.30 mts de altura, en pasillo de distribución, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera, material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		
					1.00

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

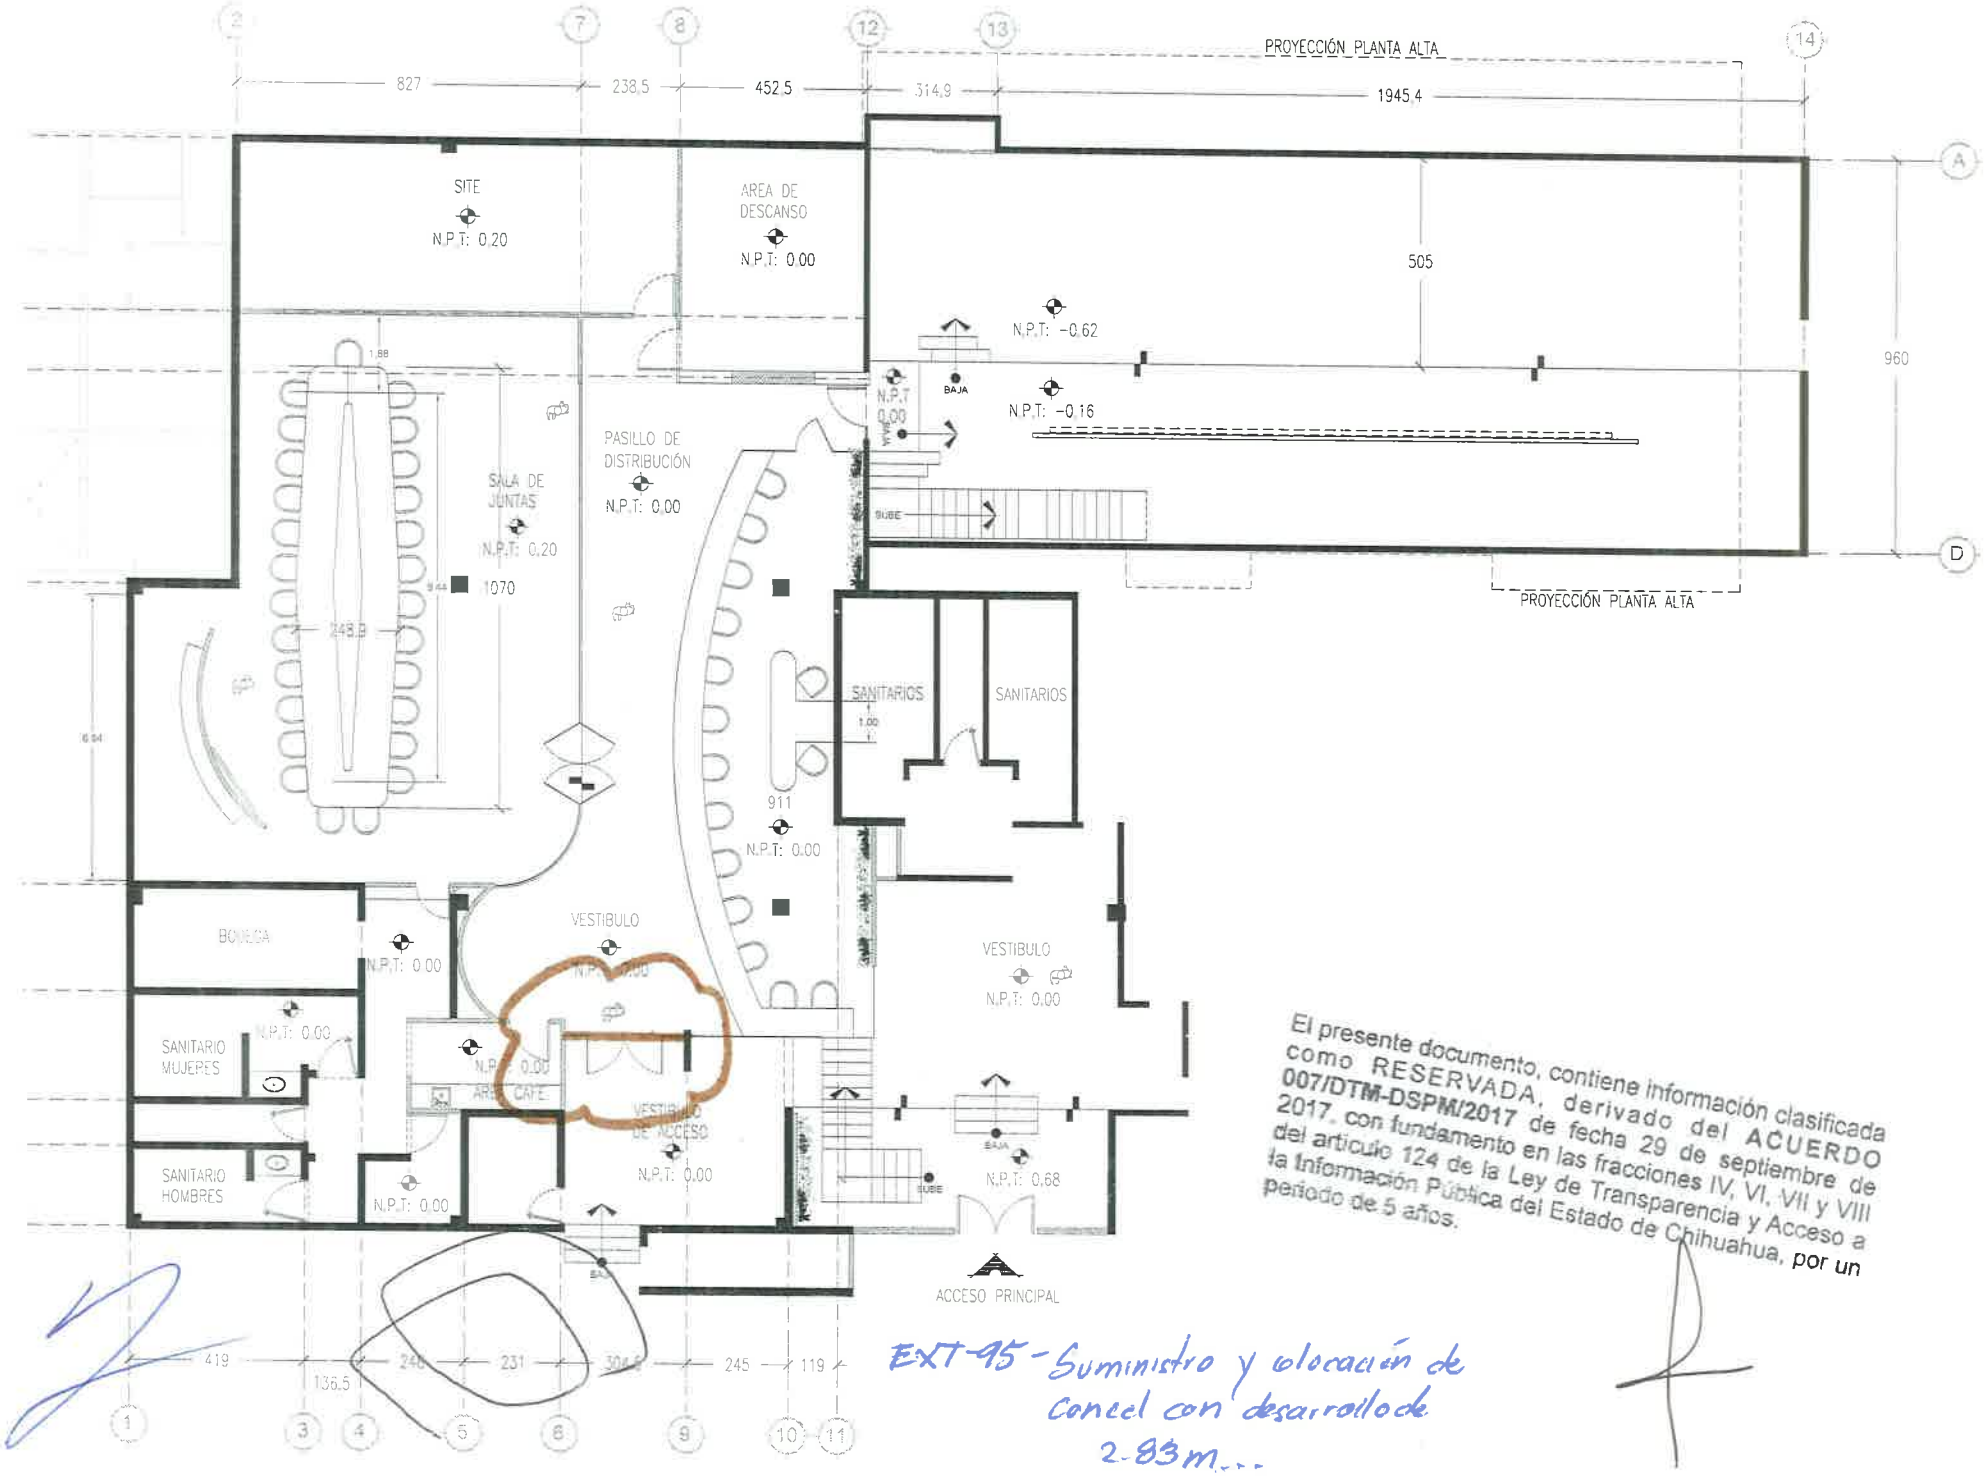

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-95 - Suministro y colocación de cancel con desarrollo de 2.83m...



EXT- 95

Suministro y colocación de cancel con desarrollo de 2.83 m., incluye: 2 puertas abatibles de 1.00 m de ancho x 2.30 m de altura y 2 fijos de 0.415mts de ancho x 2.30 mts de altura, en pasillo de distribución, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera, material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-96					
Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 m de ancho x 2.20 m de altura, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera , mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución en acceso a baños por sala de juntas		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

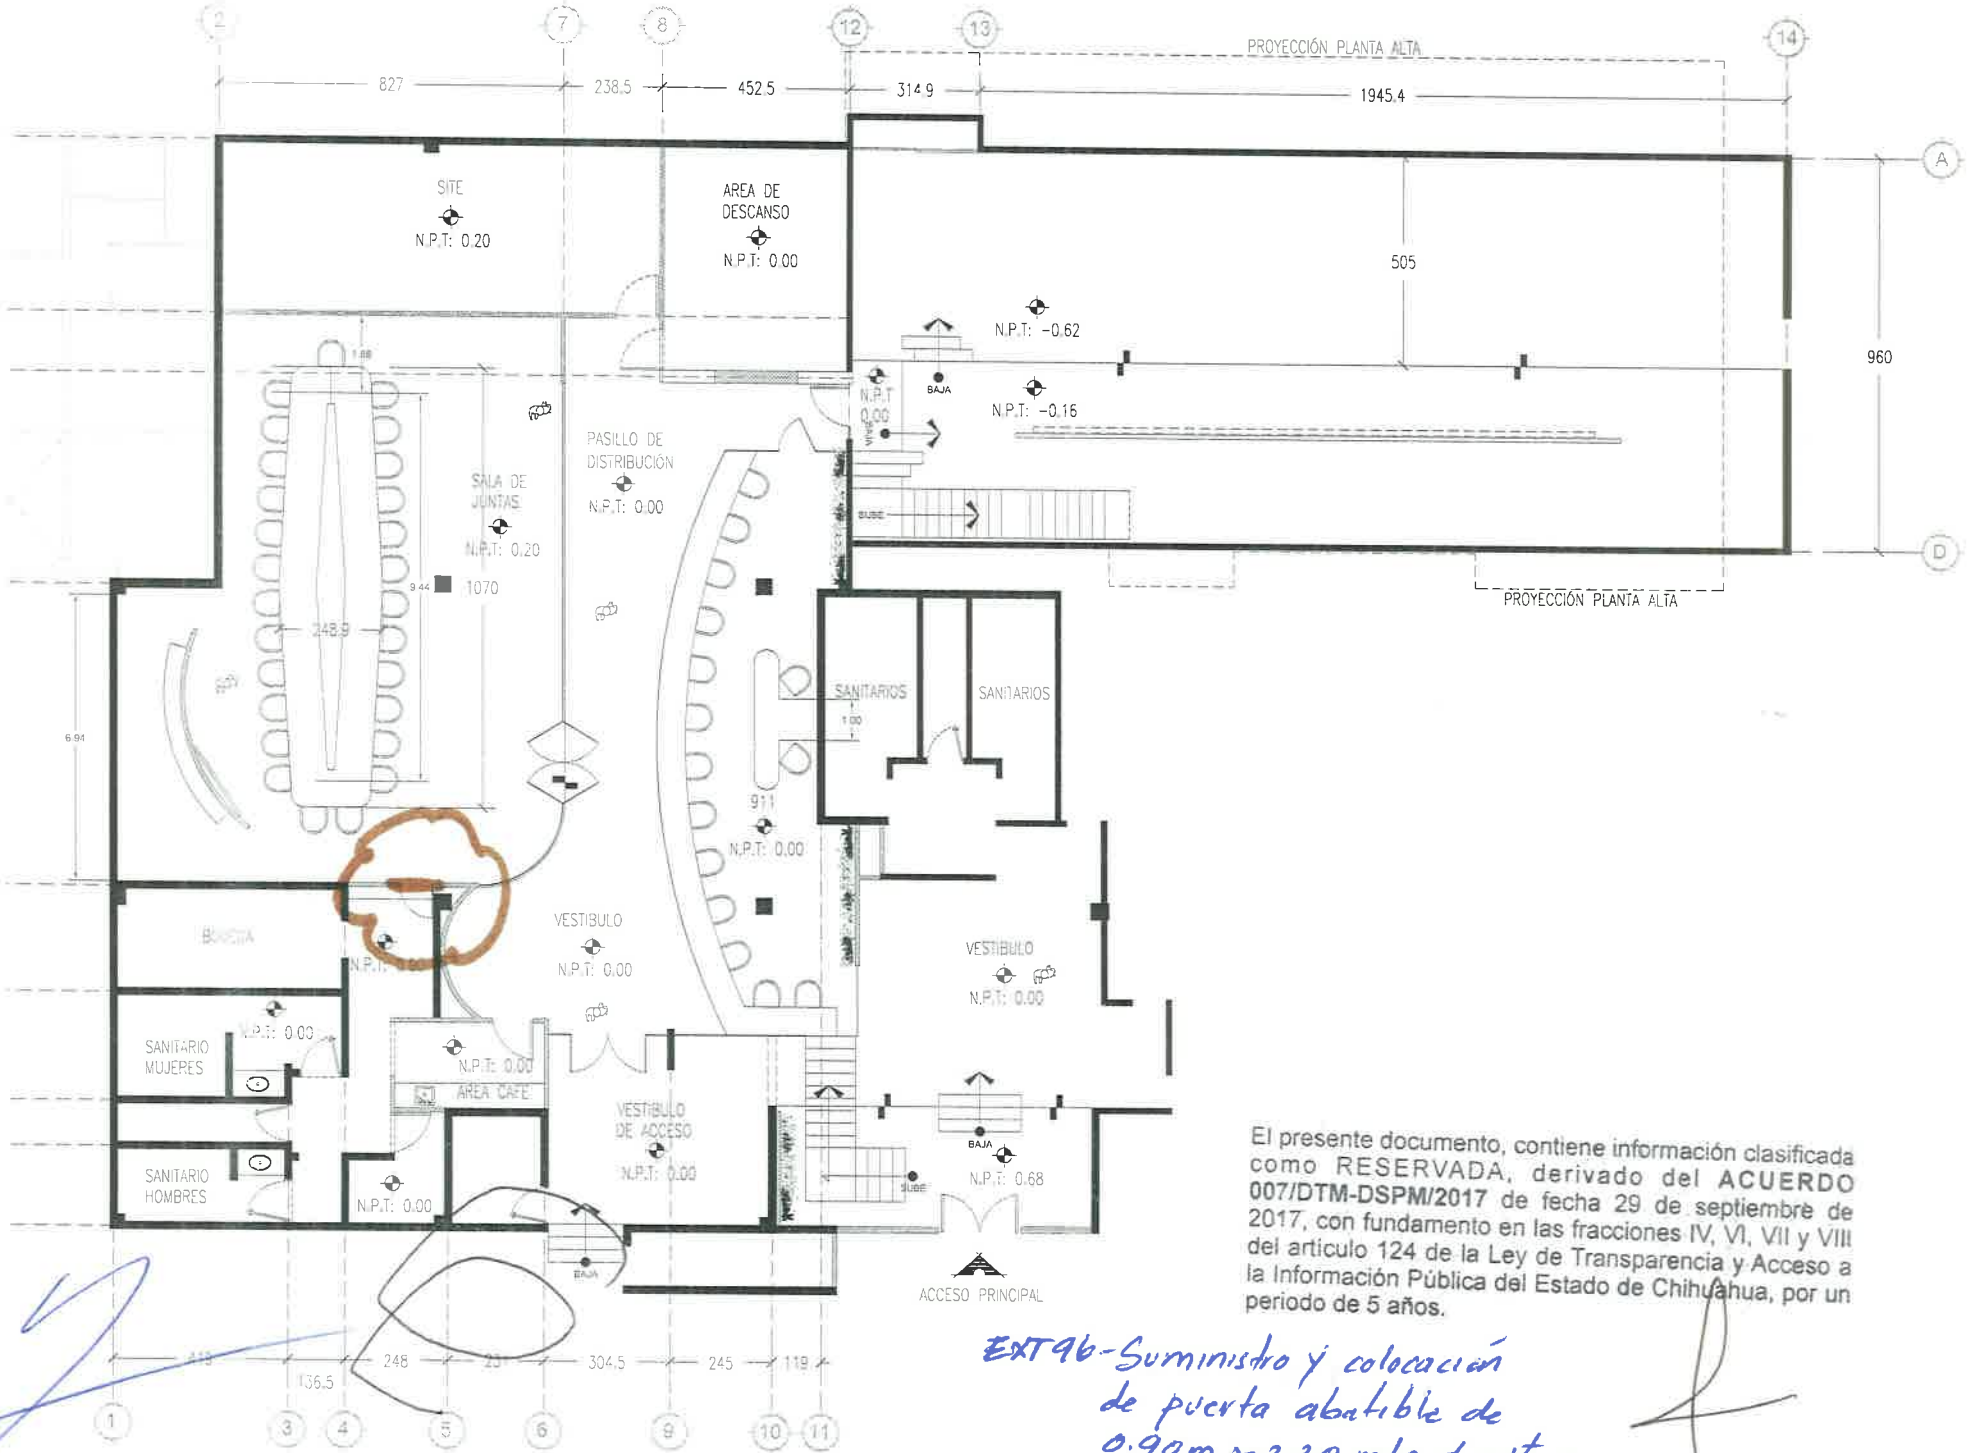

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT96-Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90m x 2.20 mts de altura..



EXT- 96

Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 m de ancho x 2.20 m de altura, a base de cristal templado de 9 mm. Incluye bisagra hidráulica, barra jaladera , mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución en acceso a baños por sala de juntas

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-97					
Suministro y colocación de cancel, en acceso principal de cristal solite claro de 9.5 mm. templado, con herrajes de acero inoxidable compuesto por fijos y 2 puertas, de 6.17 m de desarrollo x 2.25 m de altura, incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		
					1.00

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

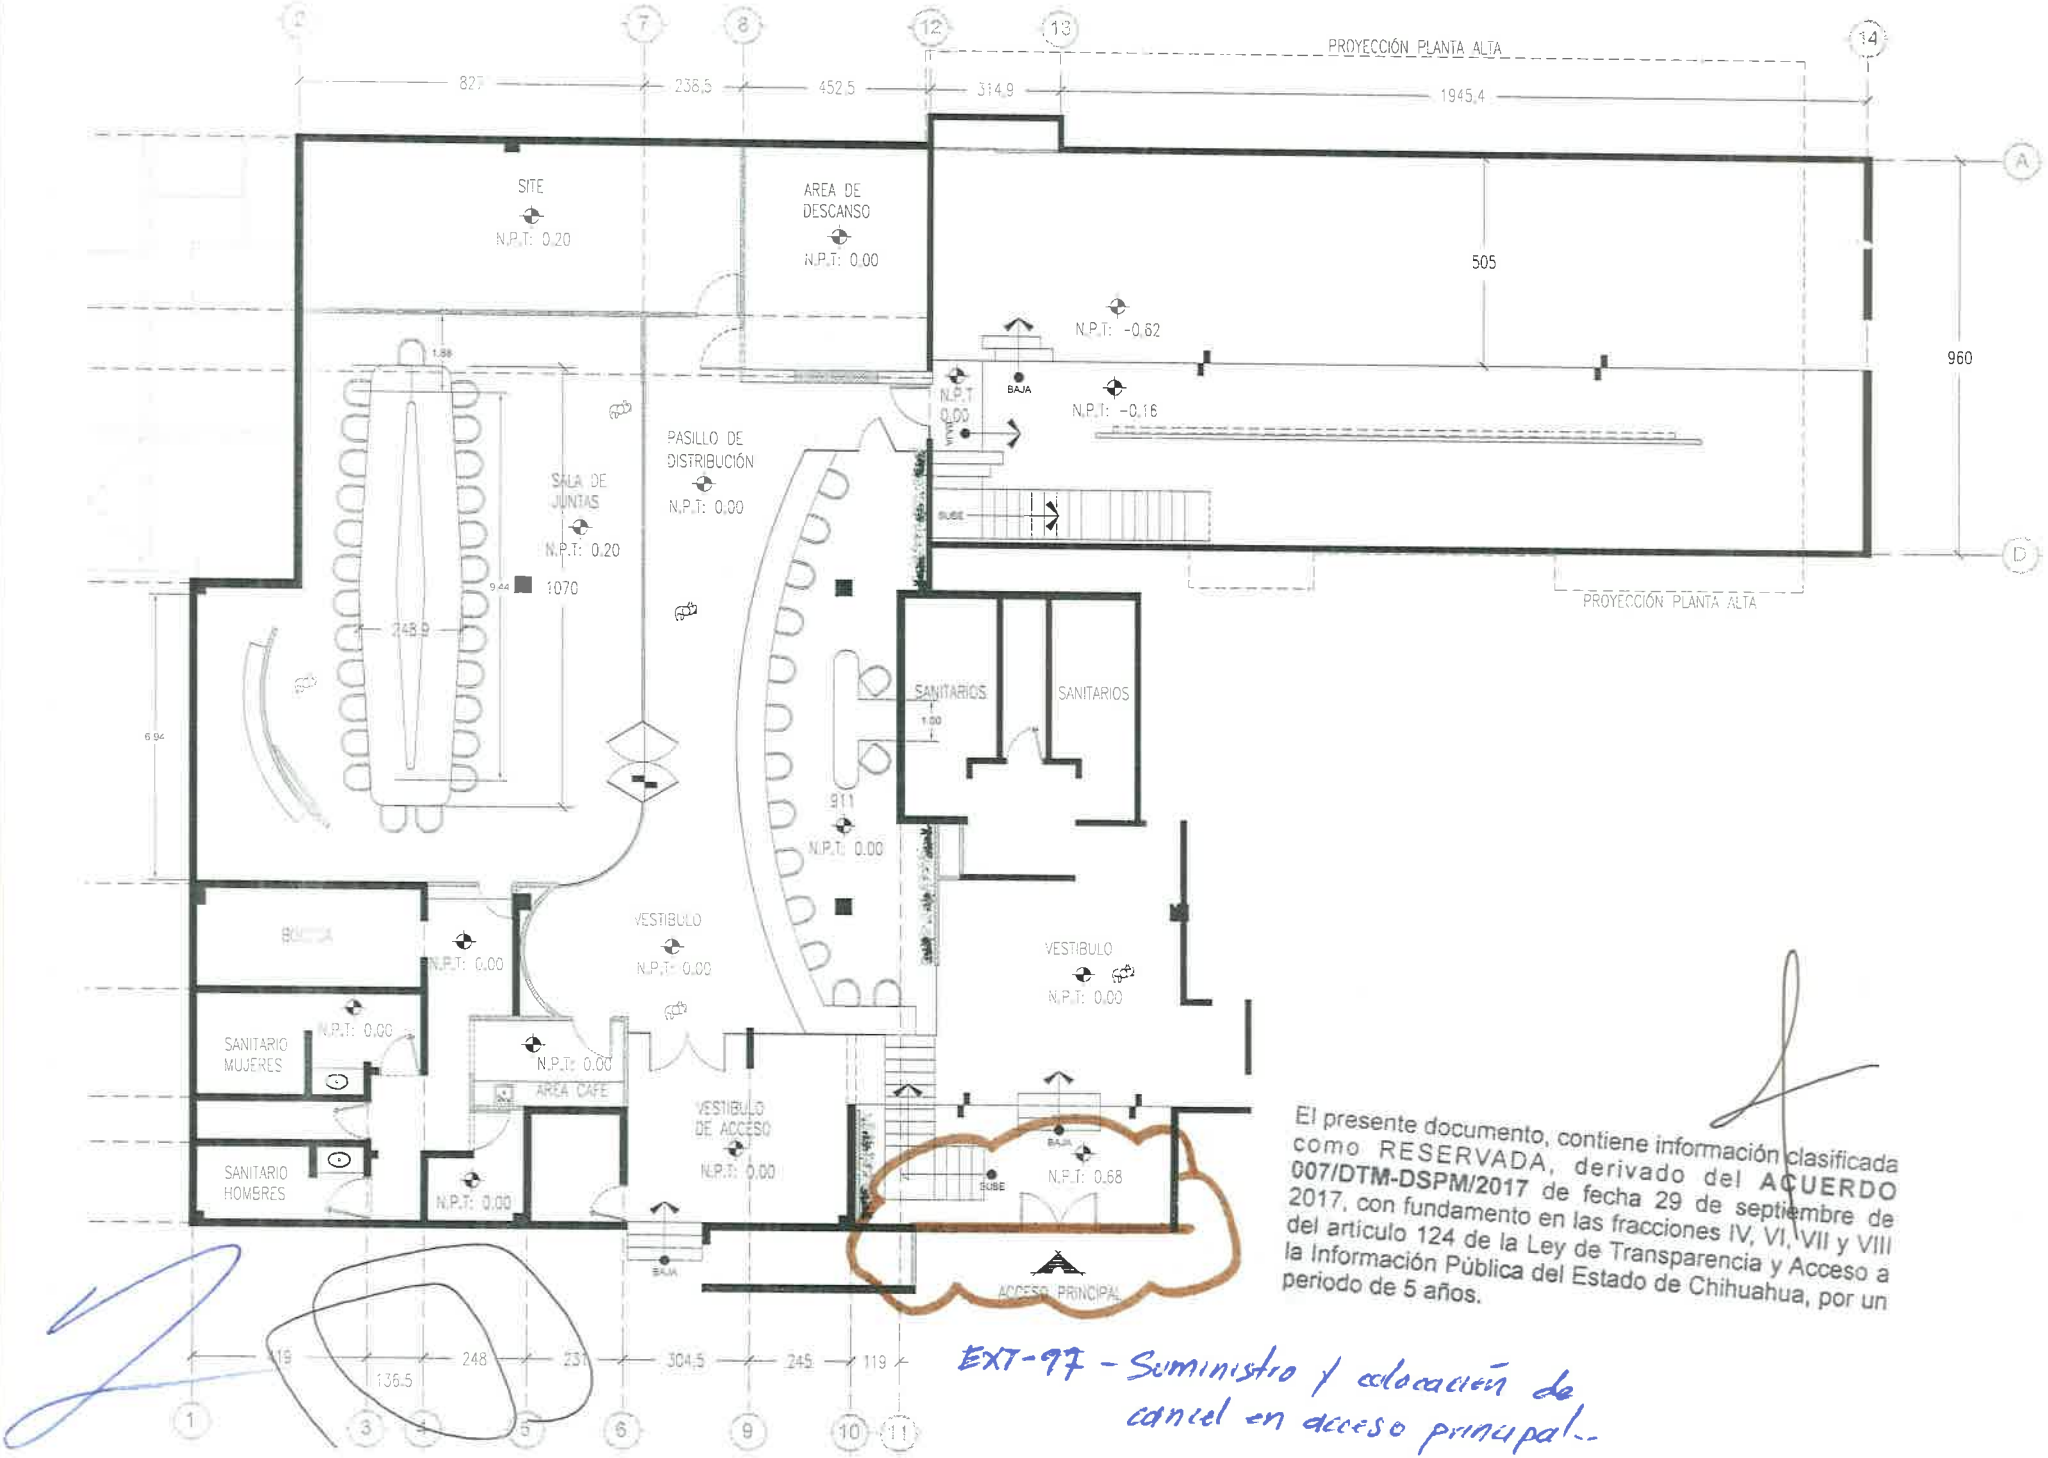

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-97 - Suministro y colocación de cancel en acceso principal.

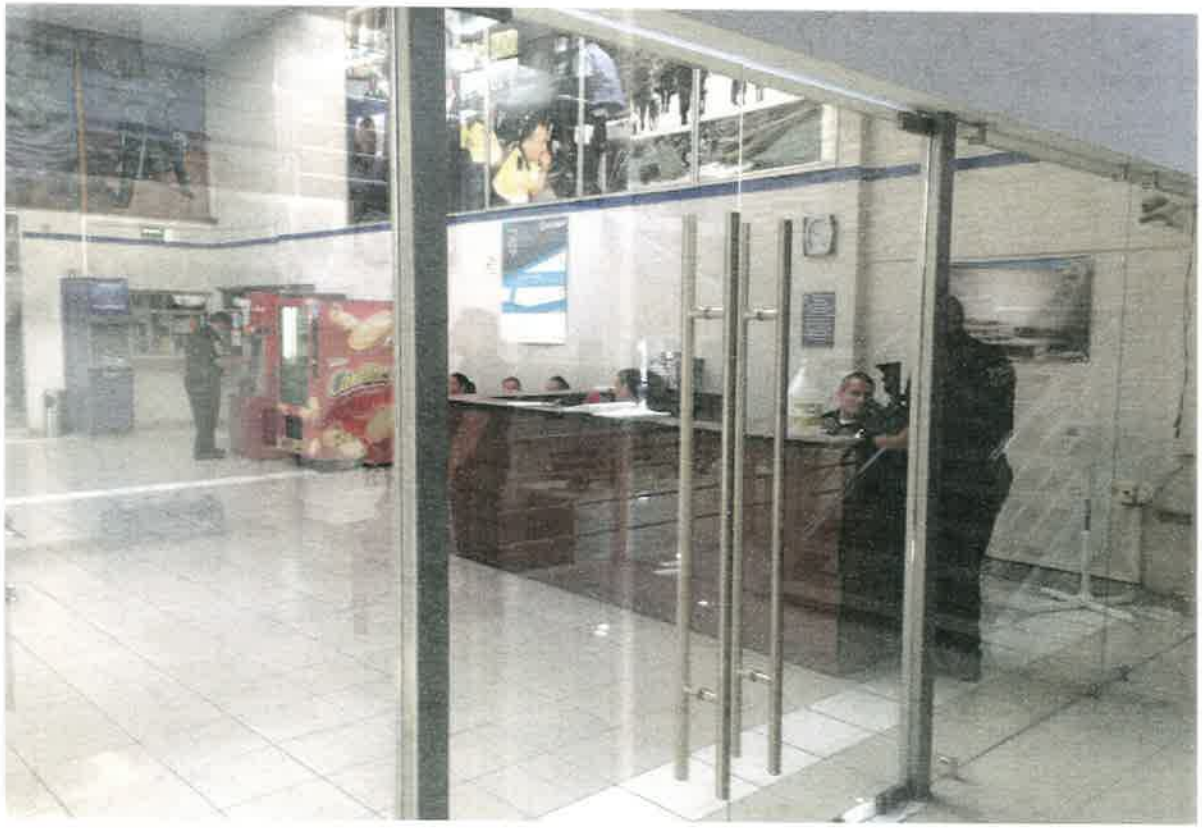

EXT- 97

Suministro y colocación de cancel, en acceso principal de cristal solite claro de 9.5 mm. templado, con herrajes de acero inoxidable compuesto por fijos y 2 puertas, de 6.17 m de desarrollo x 2.25 m de altura, incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-98					
Suministro y colocación de canceles laterales en área 911, de 5.17 m de desarrollo x 2.20 m de altura, y 1.45 m de desarrollo x 2.20 m, de altura, más 1 puerta abatible de 0.90 x 2.20 a base de cristal templado de 9 mm de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		**1.00**
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

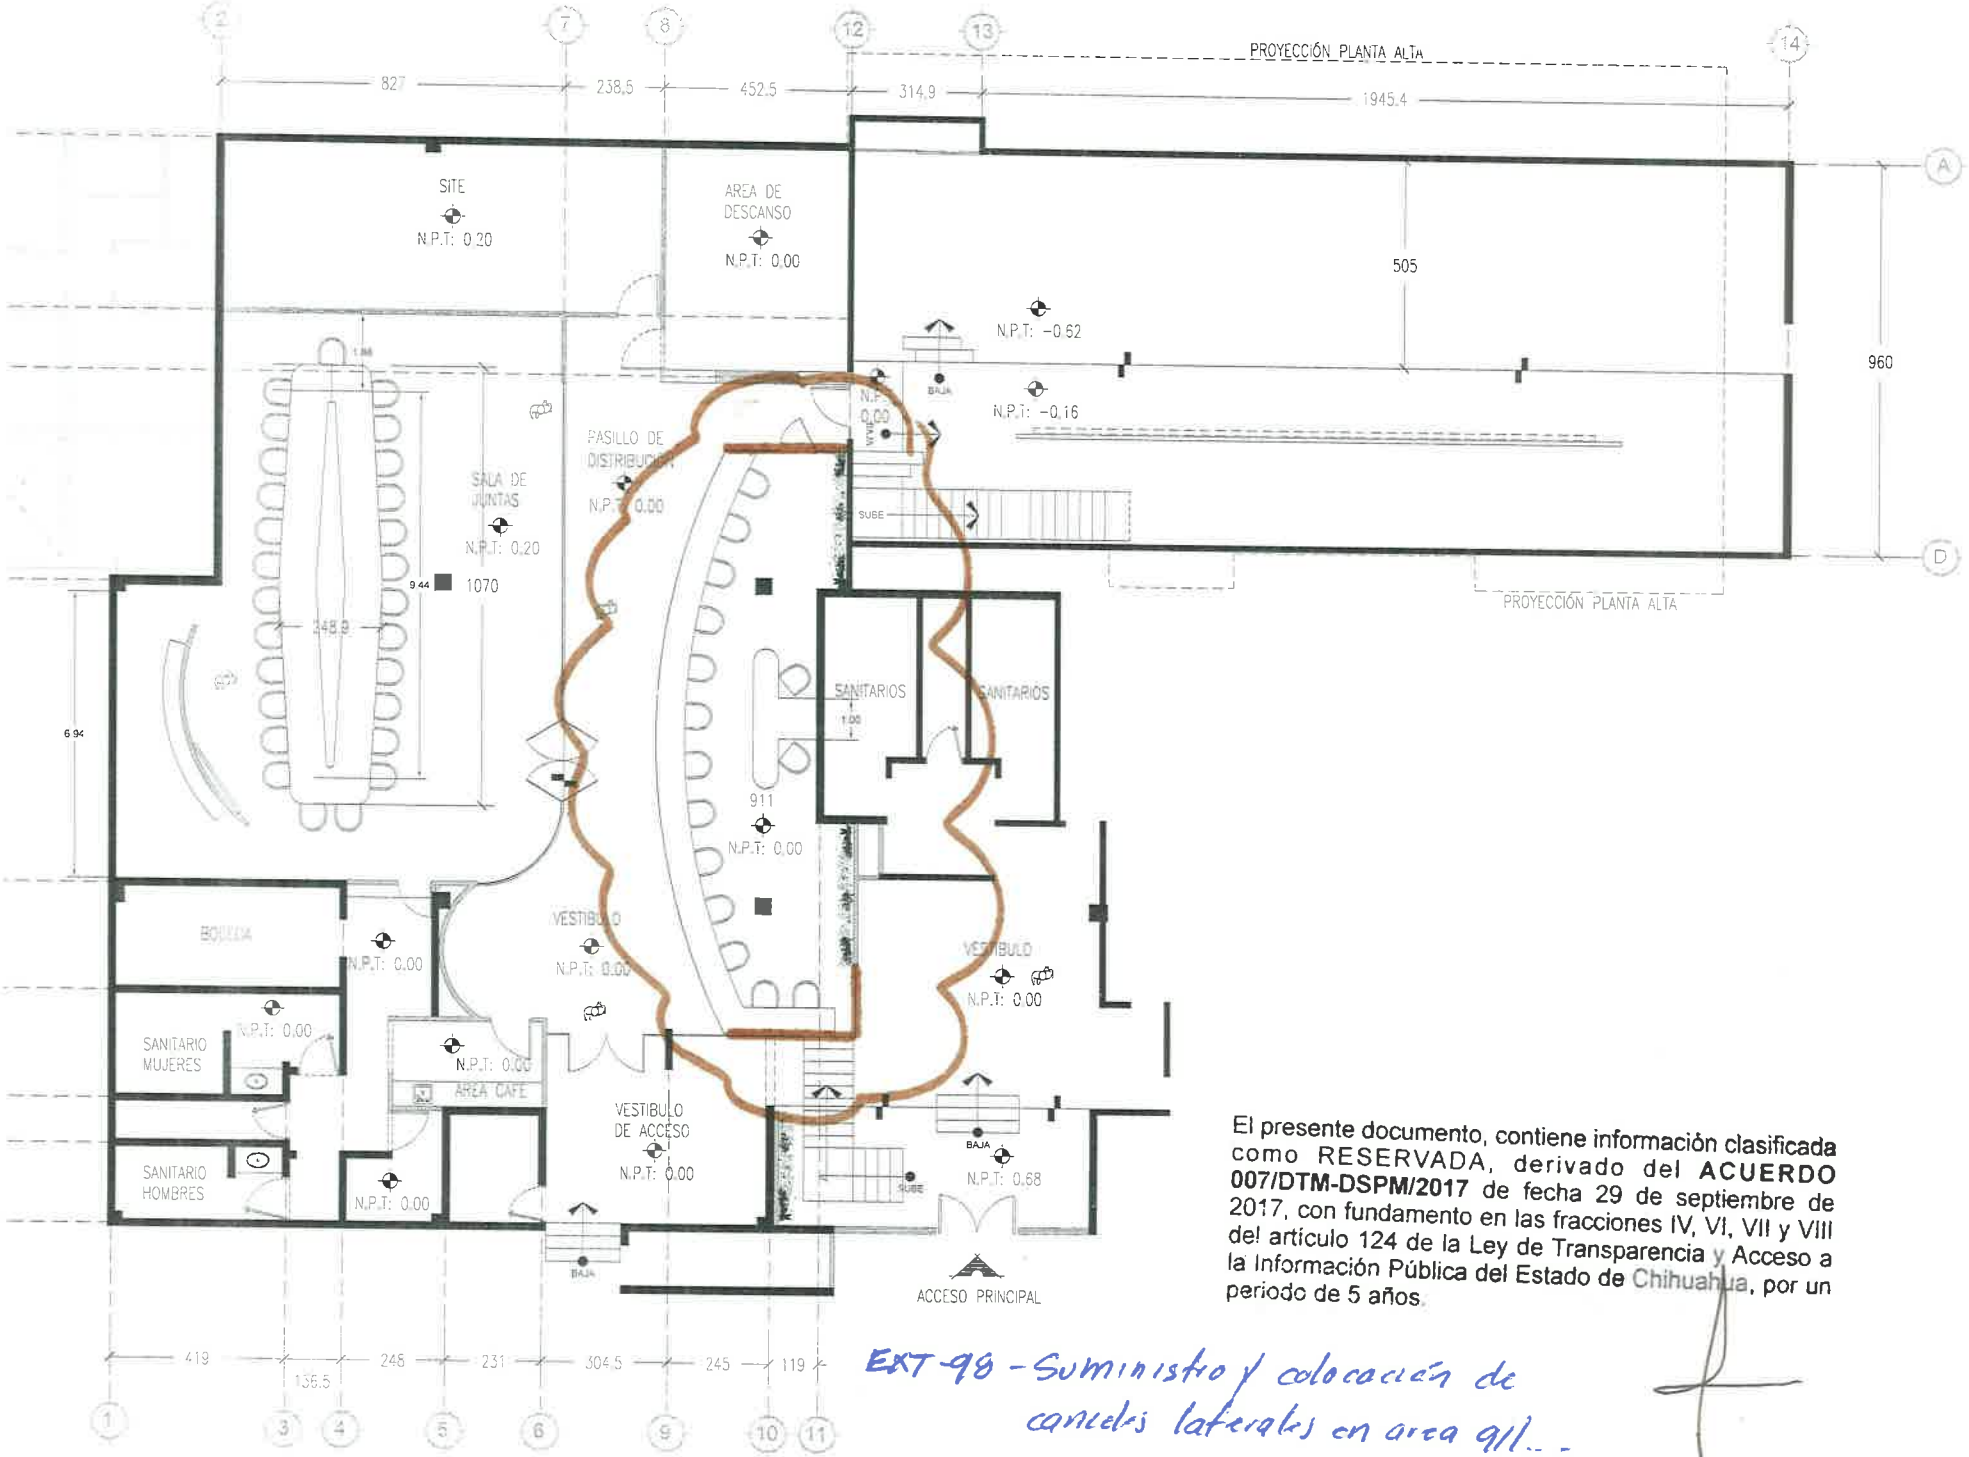

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-98 - Suministro y colocación de cancels laterales en area 911...



EXT- 98

Suministro y colocación de canceles laterales en área 911, de 5.17 m de desarrollo x 2.20 m de altura, y 1.45 m de desarrollo x 2.20 m, de altura, más 1 puerta abatible de 0.90 x 2.20 a base de cristal templado de 9 mm de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-99						
Reinstalación de cancel de aluminio existente en planta alta de 2.72m x 2.30 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

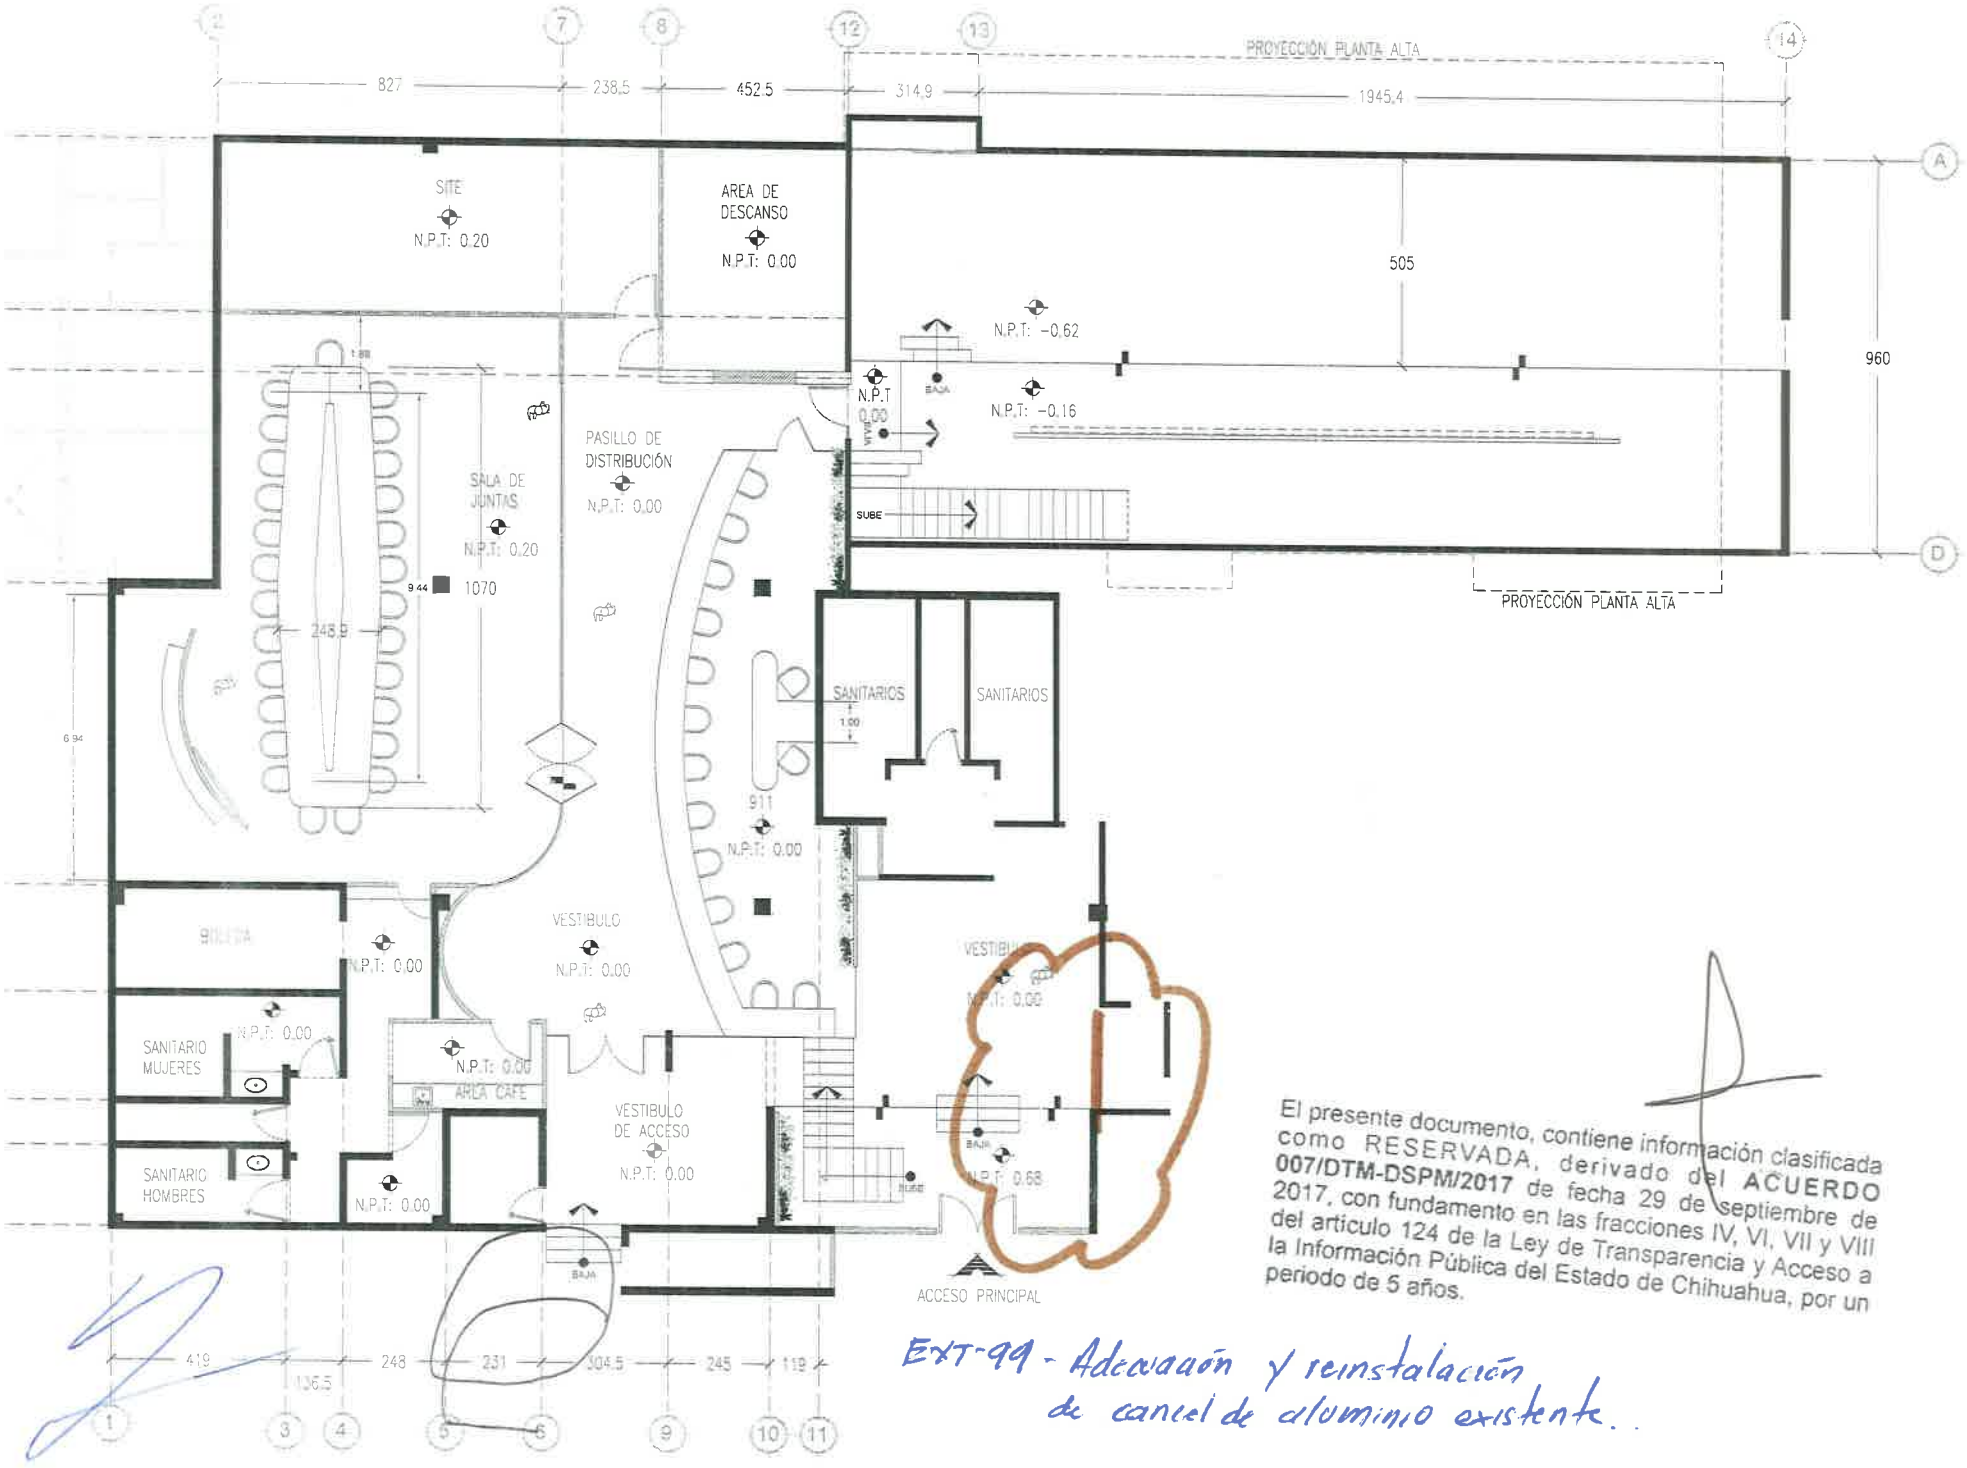

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-99 - Adecuación y reinstalación de cancel de aluminio existente.



EXT- 99

Reinstalación de cancel de aluminio existente en planta alta de 2.72m x 2.30 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-102					
Reacomodo de antenas de radios en azotea. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

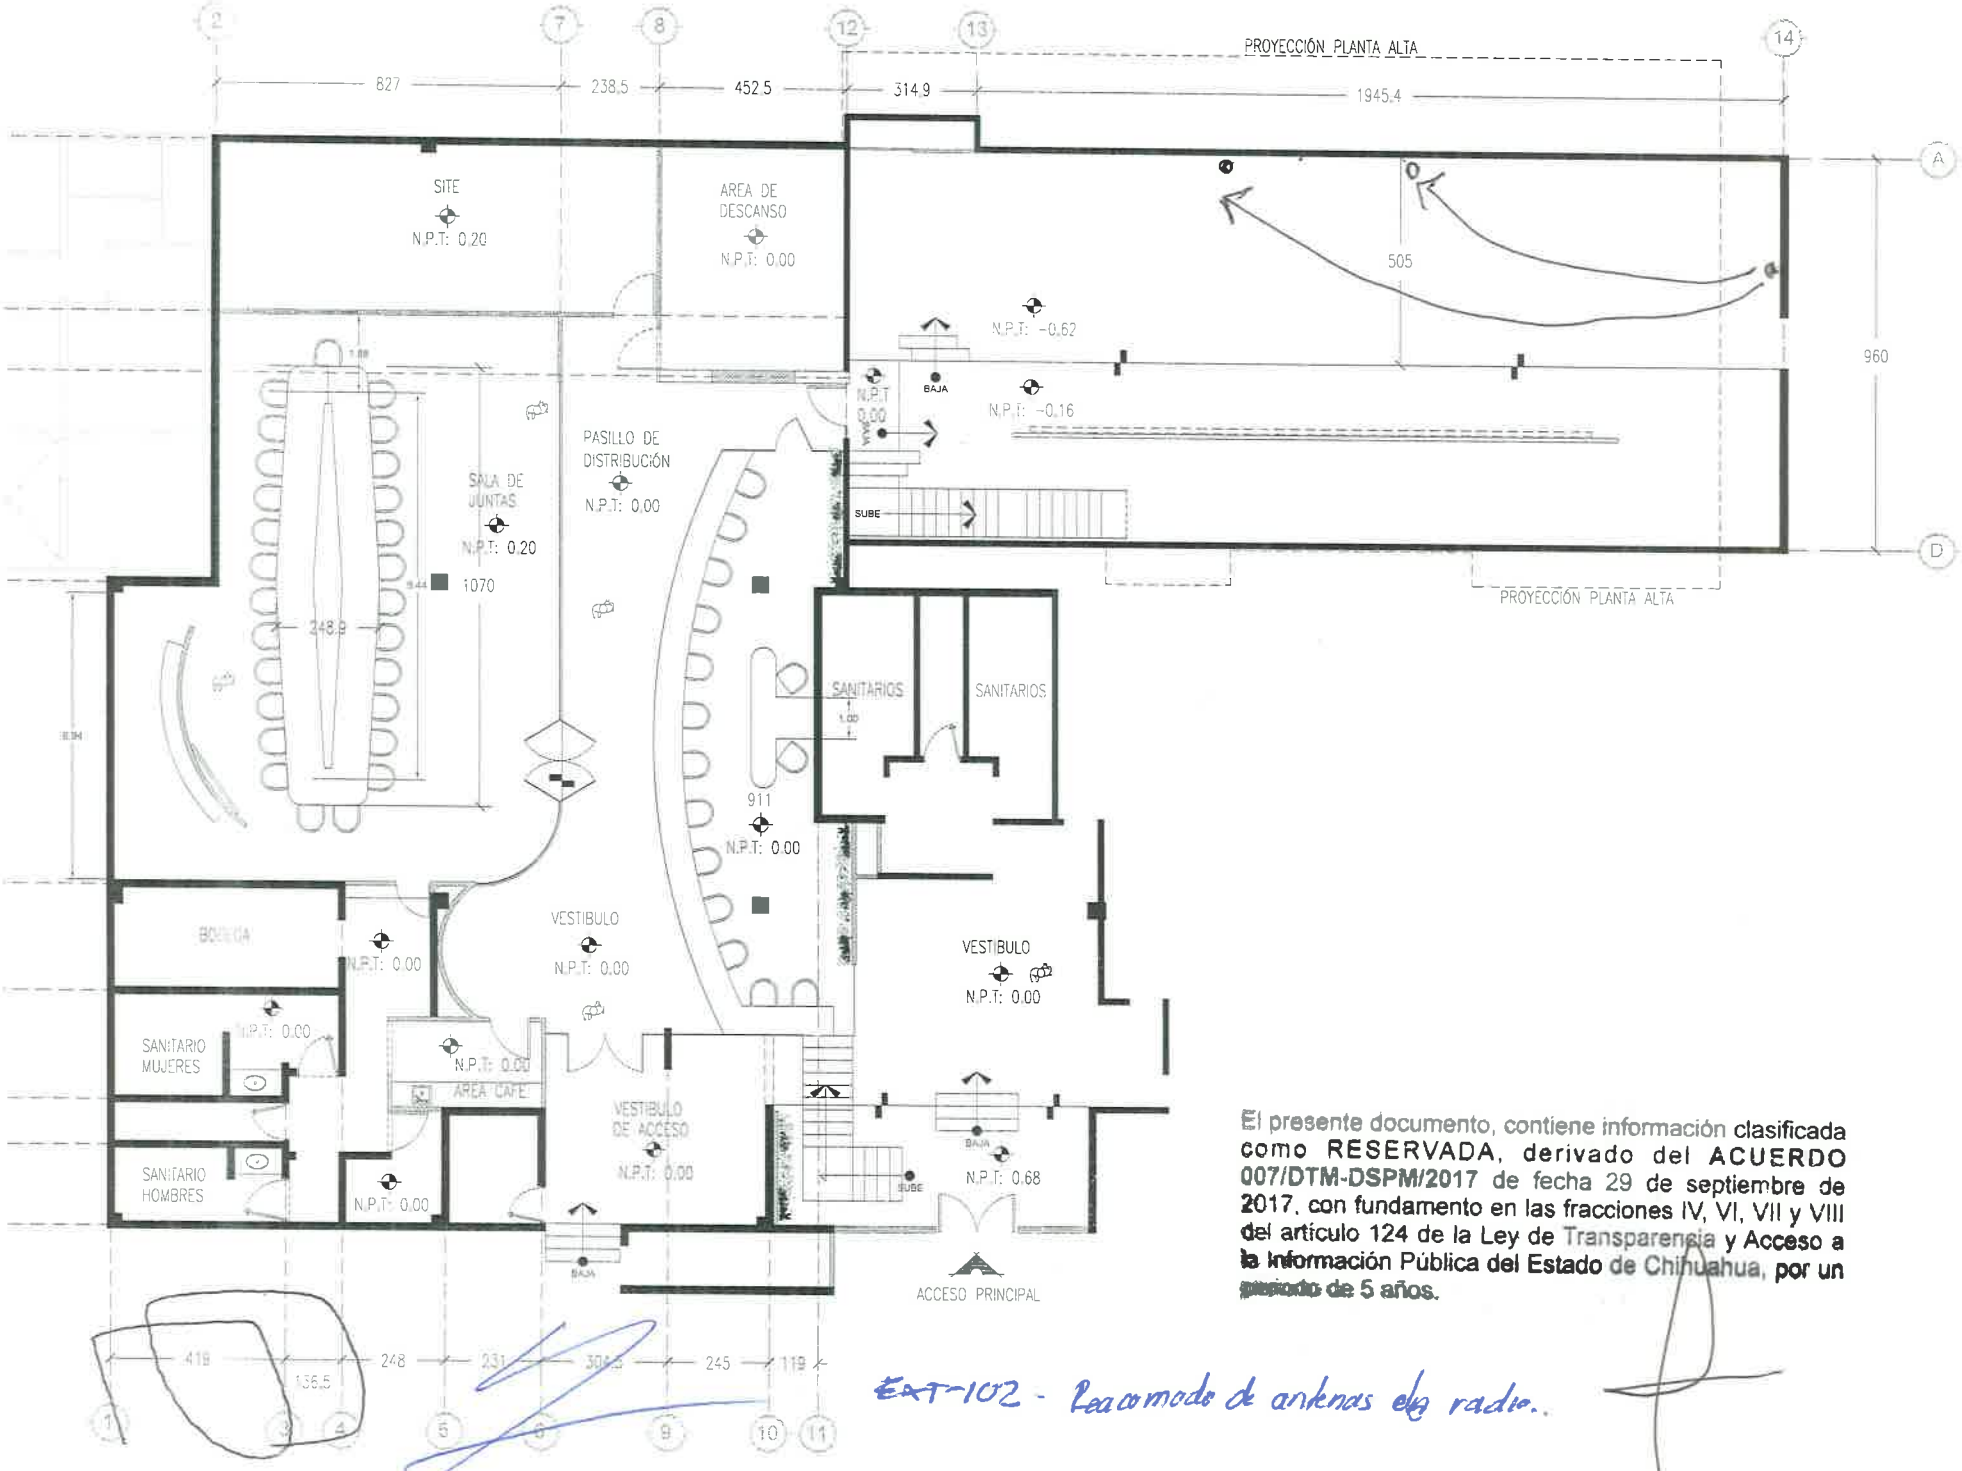

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-102 - Reacomodo de antenas de radio..



EXT- 102 Reacomodo de antenas de radios en azotea. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-104						
Suministro e instalación de desconectador electromecánico de 3Px100Ax240V en gabinete nema 3R para unidad de refrigeración de 15 Toneladas de Refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			1.00

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

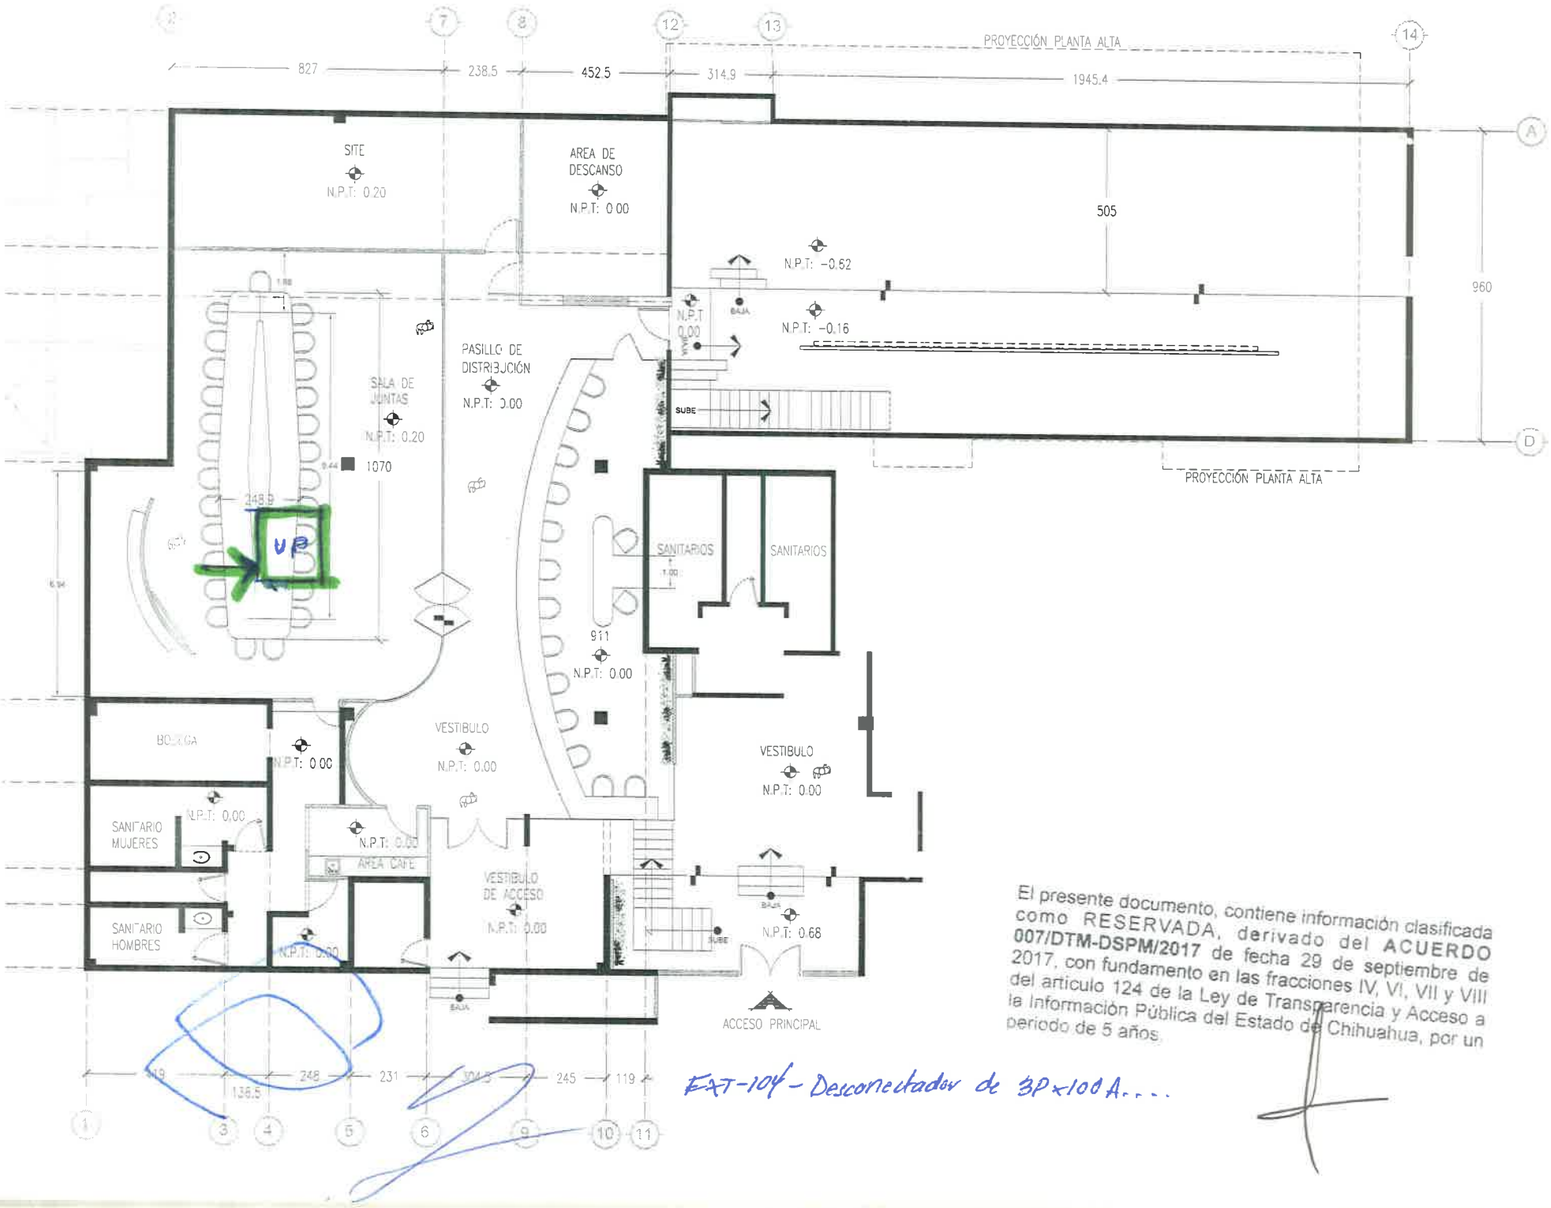

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-104 - Desconectador de 3P x 100 A....



EXT- 104

Suministro e instalación de desconectador electromecánico de 3Px100Ax240V en gabinete nema 3R para unidad de refrigeración de 15 Toneladas de Refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-107						
Suministro e instalación de manguera tipo LED 5050, 120V, atenuable en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		1.40	1.40			
		1.40	1.40			
		10.40	10.40			
		10.40	10.40			
		1.18	1.18			
		1.18	1.18			
		10.05	10.05			
		10.05	10.05			
		TOTAL	**46.06**			**46.06**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

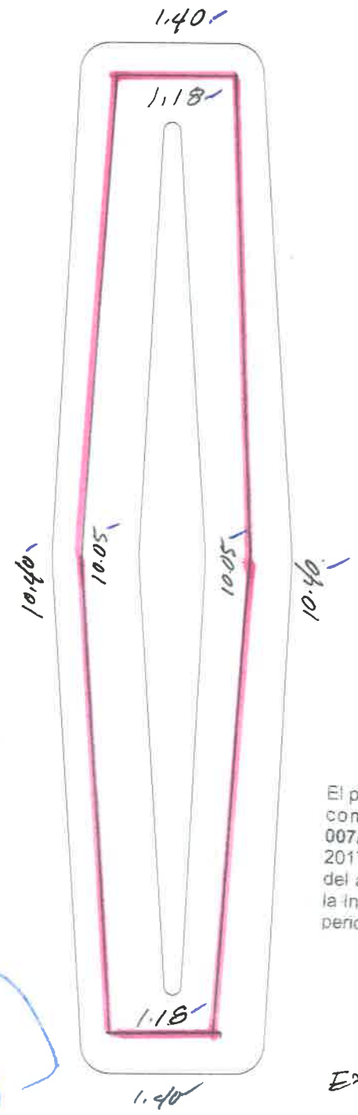

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-107 - alargadera tipo LED 50-50



EXT- 107 Suministro e instalación de manguera tipo LED 5050, 120V, atenuable en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-109					
Suministro e instalación de contacto doble polarizado 120 v., 15 amps, con eliminador de 120 a 5 v. salida USB en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		13.00	13.00		
		TOTAL	**13.00**		**13.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

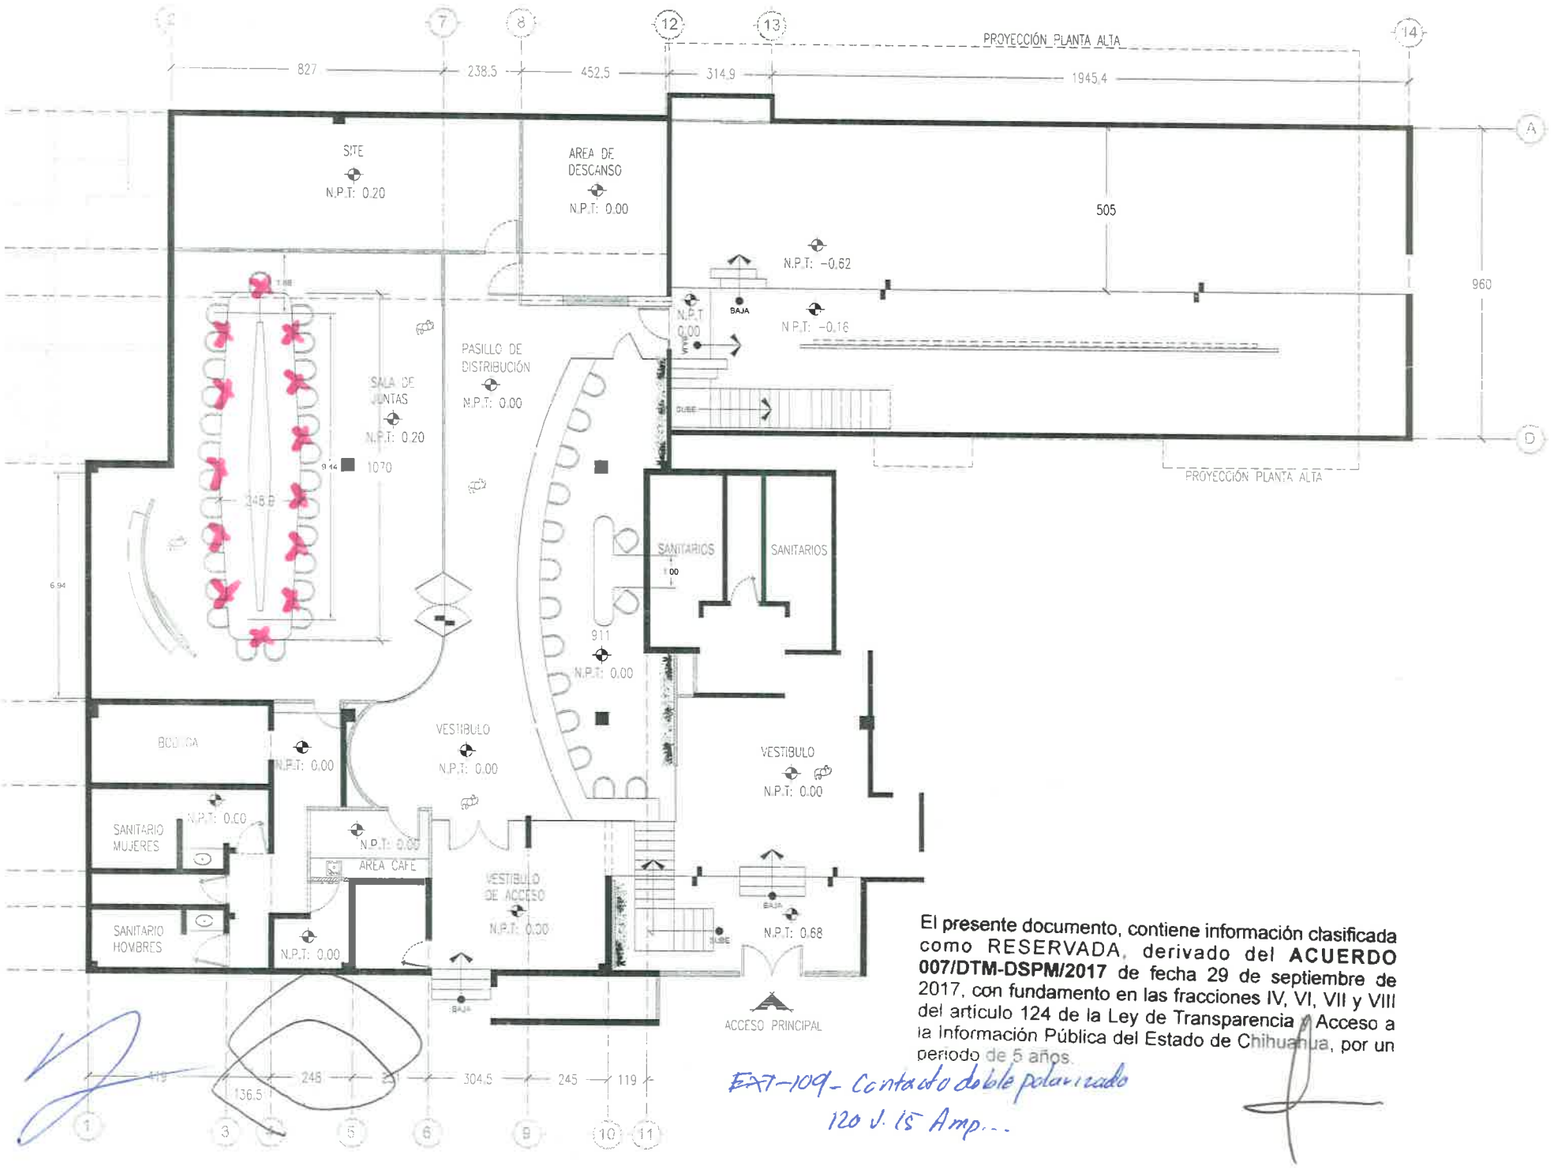

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

E27-109 - Contacto doble polarizado
120 V. 15 Amp...

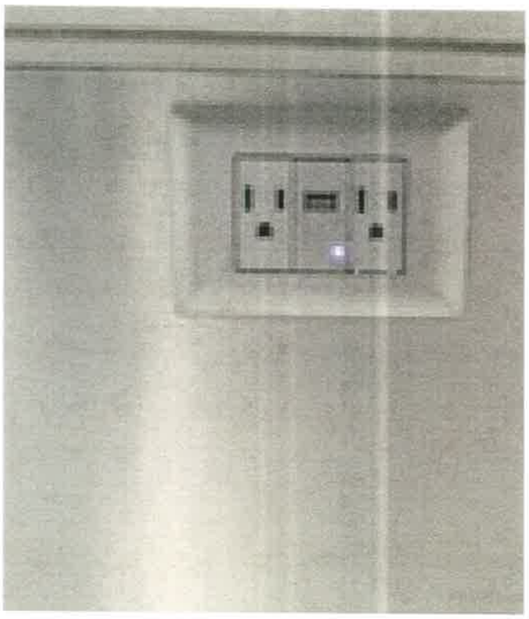

EXT- 109 Suministro e instalación de contacto doble polarizado 120 v., 15 amps, con eliminador de 120 a 5 v. salida USB en mesa de sala de juntas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-112						
Suministro e instalación de contacto cuádruple en mesa de 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**13.00**
		13.00	13.00			
		TOTAL	**13.00**			

ING. LENNN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

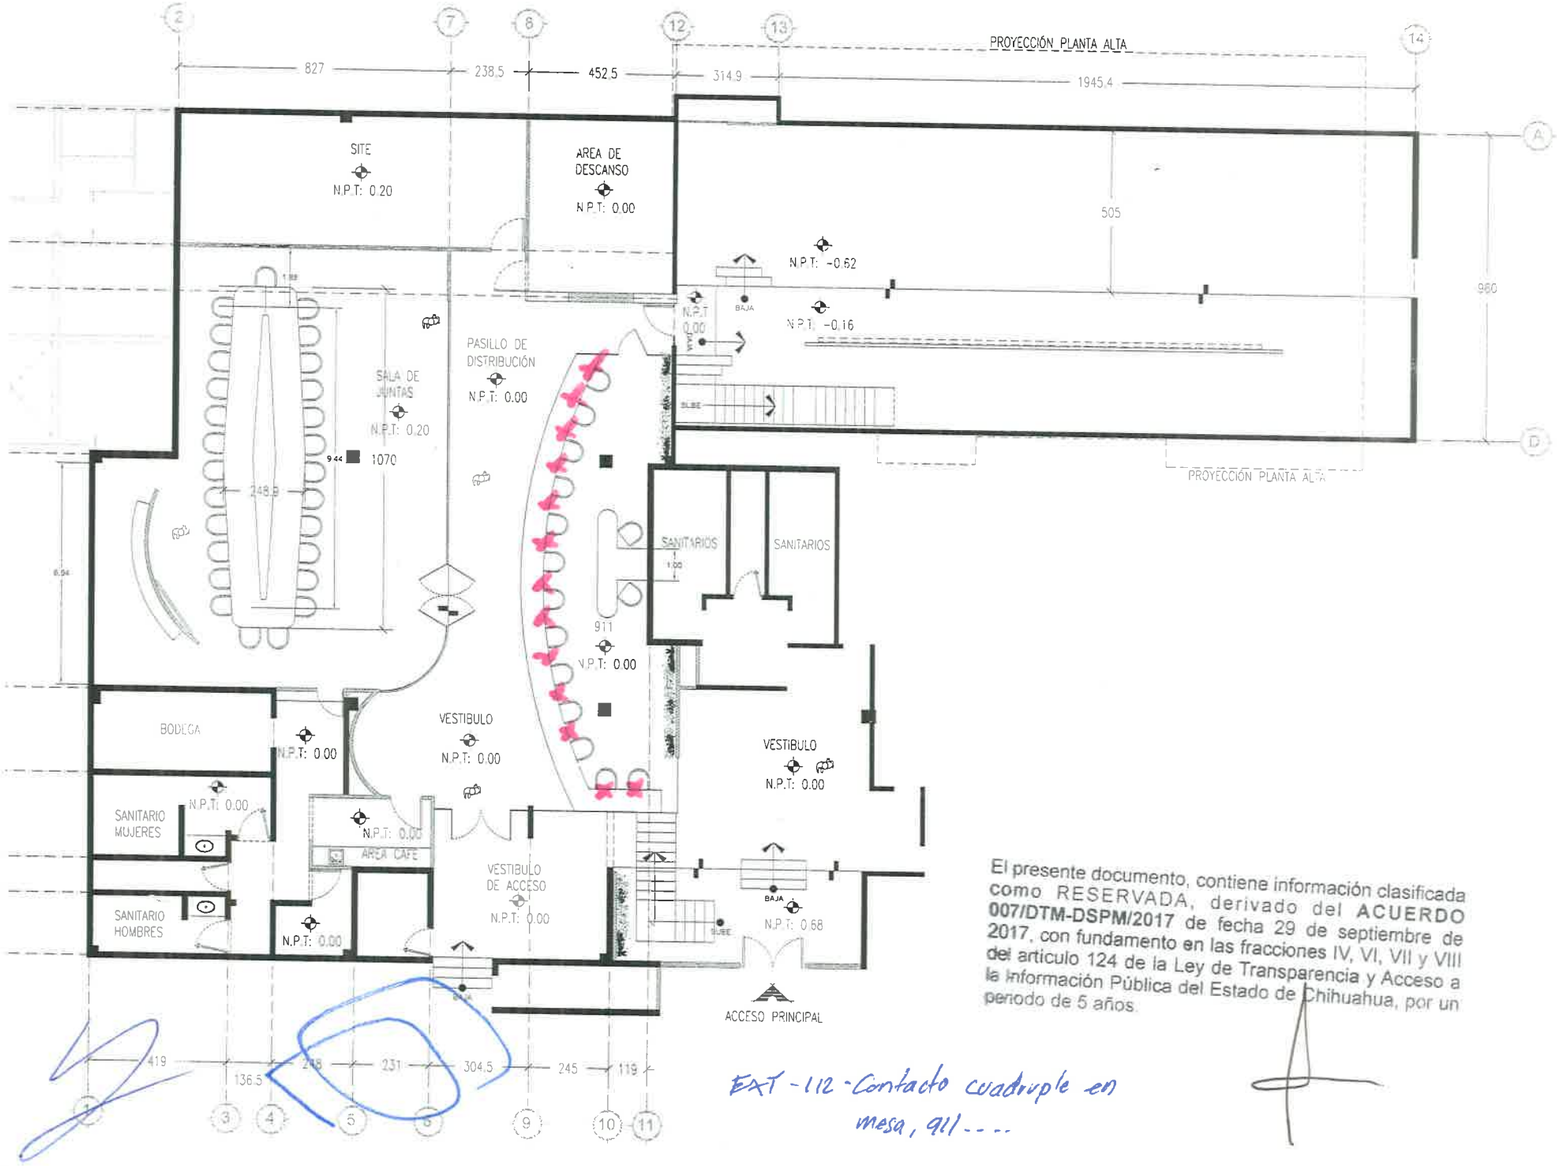

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT - 112 - Contacto cuadruple en mesa, 911 ...



EXT- 112 Suministro e instalación de contacto cuádruple en mesa de 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-113						
Suministro e instalación de registro metálico de 30x30x20cm con tapa en site y 911. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**3.00**
		3.00	3.00			
		TOTAL	**3.00**			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

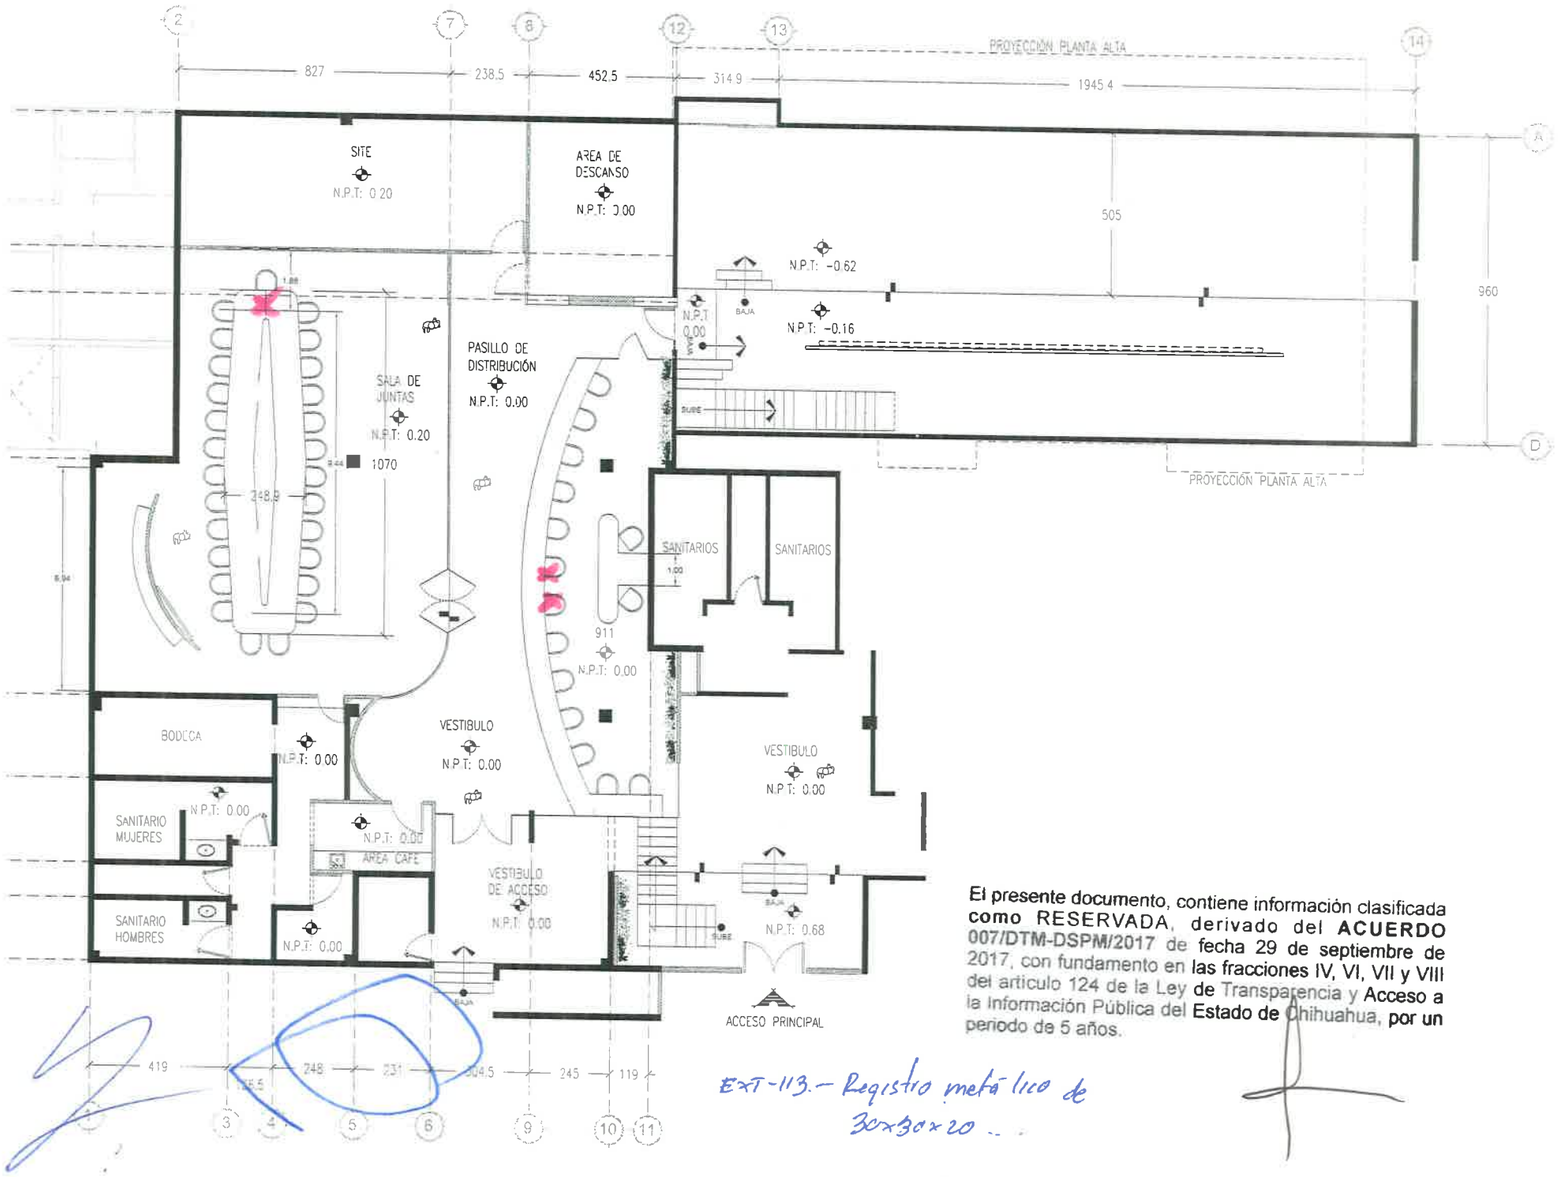

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-113.- Registro metálico de 30x30x20 ...

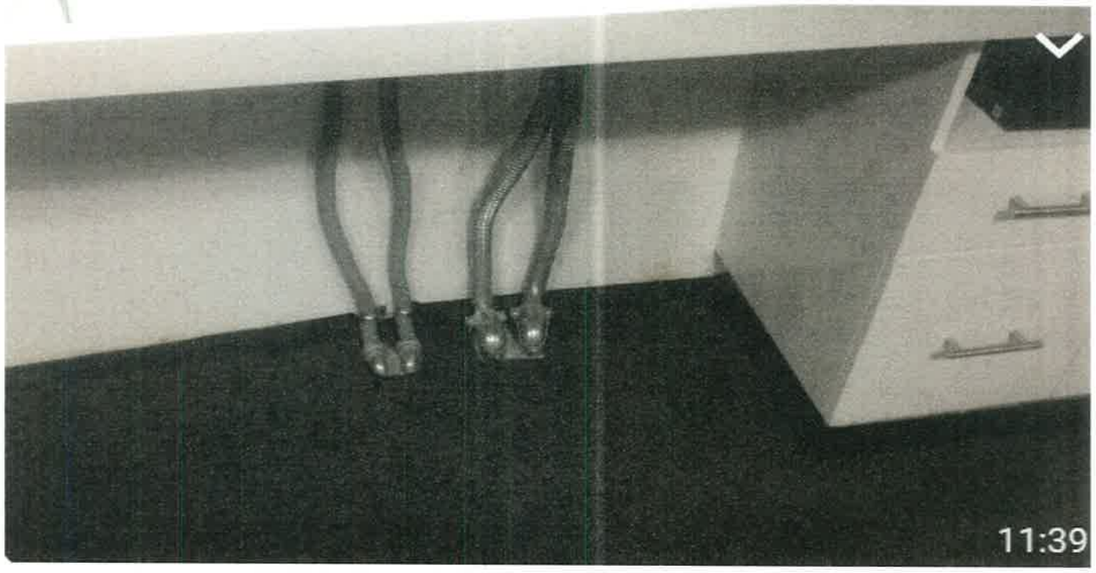

EXT- 113 Suministro e instalación de registro metálico de 30x30x20cm con tapa en site y 911. Incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-116					
		Pieza	**Total**		
Alimentación eléctrica a comedor desde cuarto de sistema contra incendios (adosada a barda perimetral). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

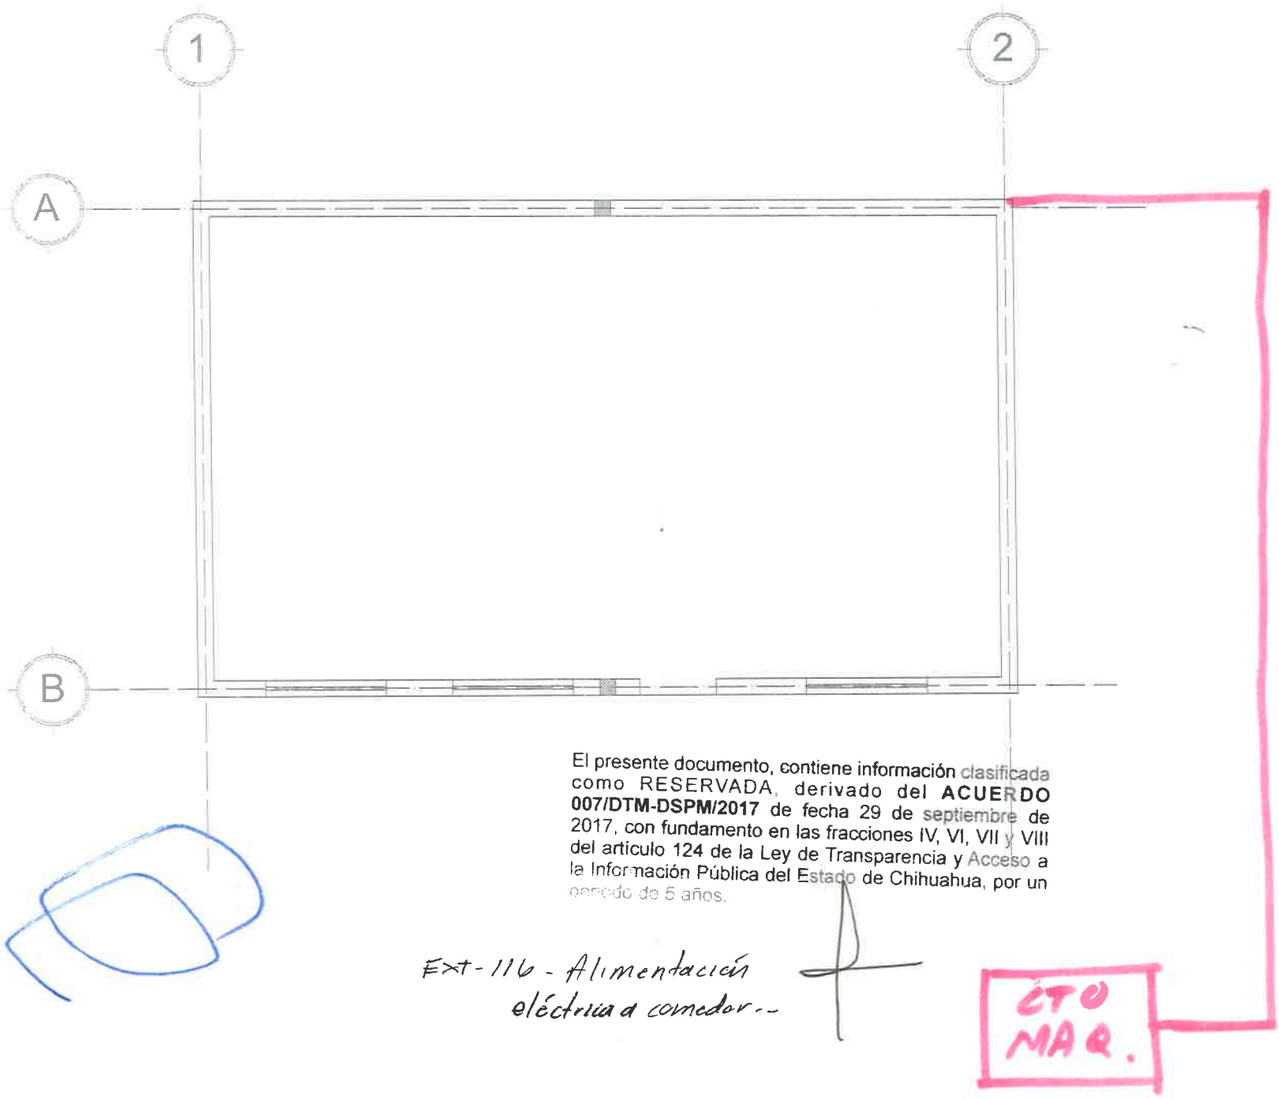

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-116 - Alimentación eléctrica a comedor--

CTO MAQ.



EXT- 116 Alimentación eléctrica a comedor desde cuarto de sistema contra incendios (adosada a barda perimetral). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-117					
Suministro, instalación, conexión, automatización, sincronización y puesta en marcha de mecanismos de elevación para monitores de 21.5". Incluye: monitor de 21.5" en mesa de juntas, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		13.00	13.00		
		TOTAL	**13.00**		**13.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

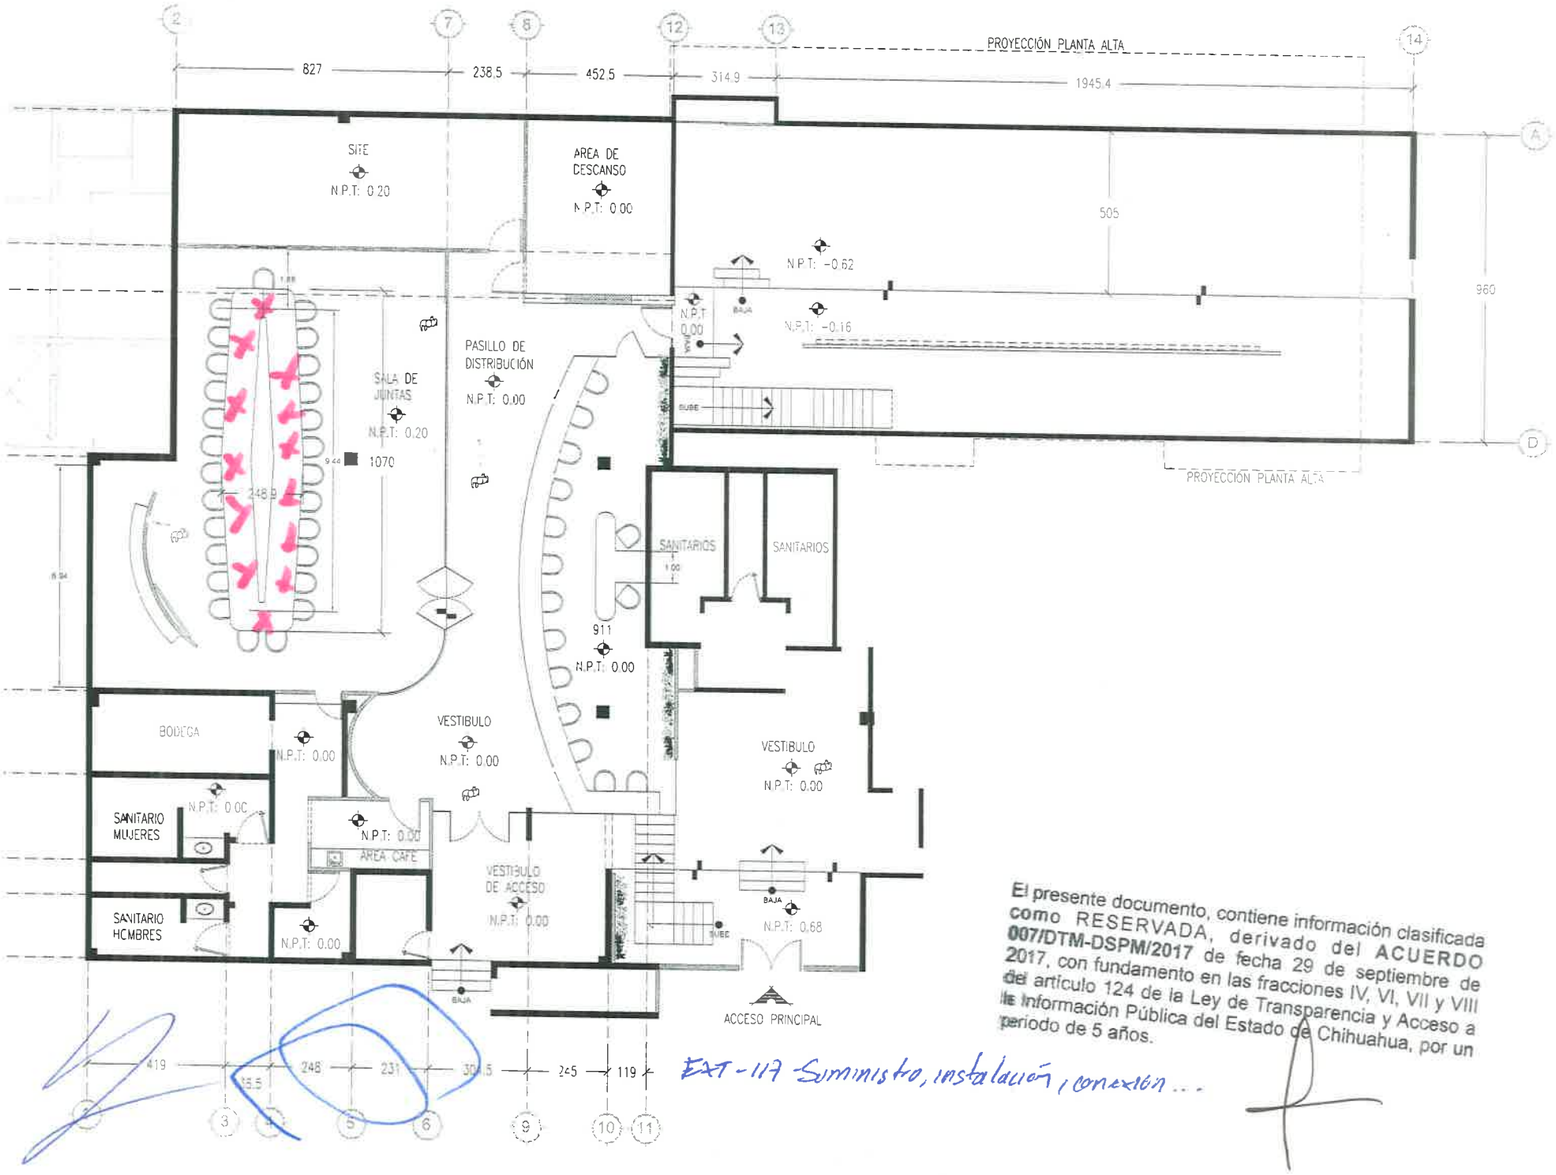

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-117 Suministro, instalación, conexión...





EXT- 117

Suministro, instalación, conexión, automatización, sincronización y puesta en marcha de mecanismos de elevación para monitores de 21.5". Incluye: monitor de 21.5" en mesa de juntas, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-118						
Suministro e instalación de tanque de gas de 300 litros. Incluye: regulador, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**1.00**
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

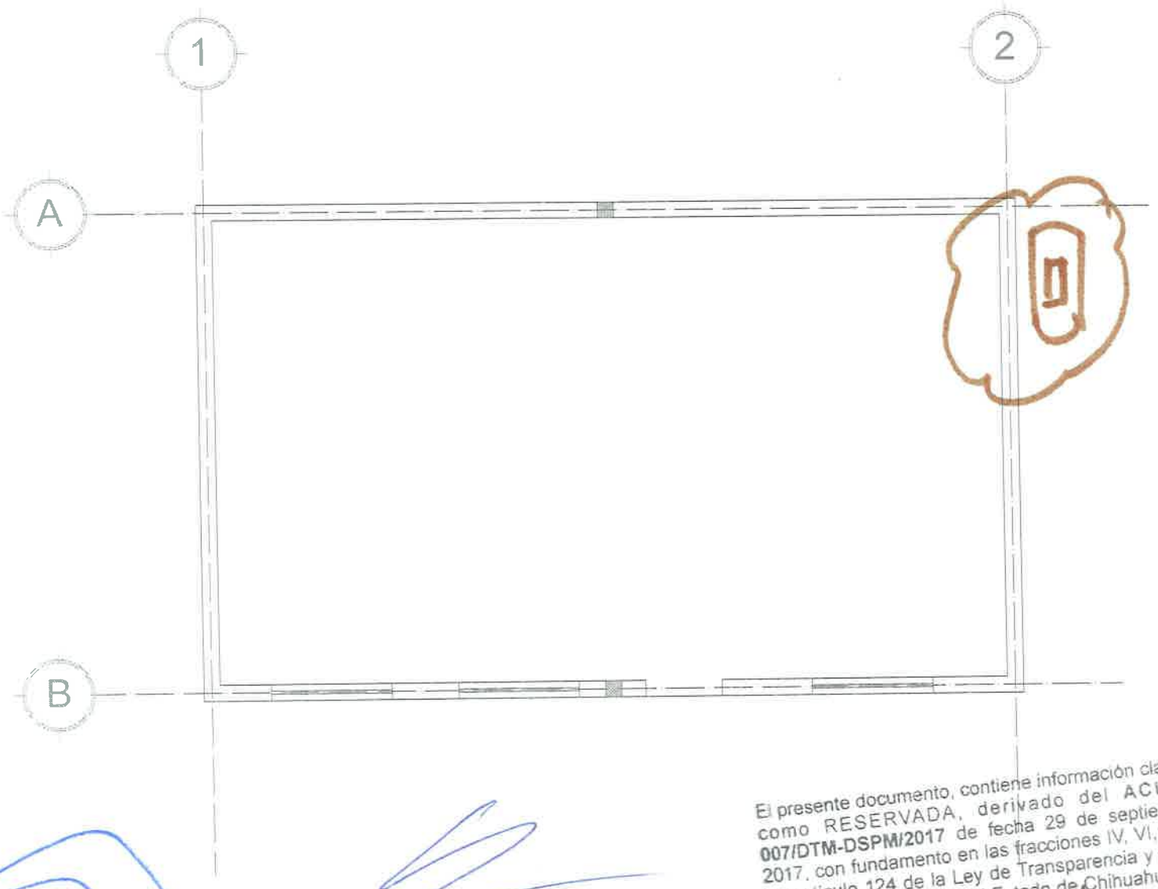

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT - 116 - Suministro e instalación de tanque de gas de 300 lts. -



EXT- 118 Suministro e instalación de tanque de gas de 300 litros. Incluye: regulador, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-120					
Suministro y colocación de cubierta de granito en barra de comedor de 2.80 x 0.80 m. con faldón de 20 cms. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		**2.87**
		2.87	2.87		
		TOTAL	**2.87**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

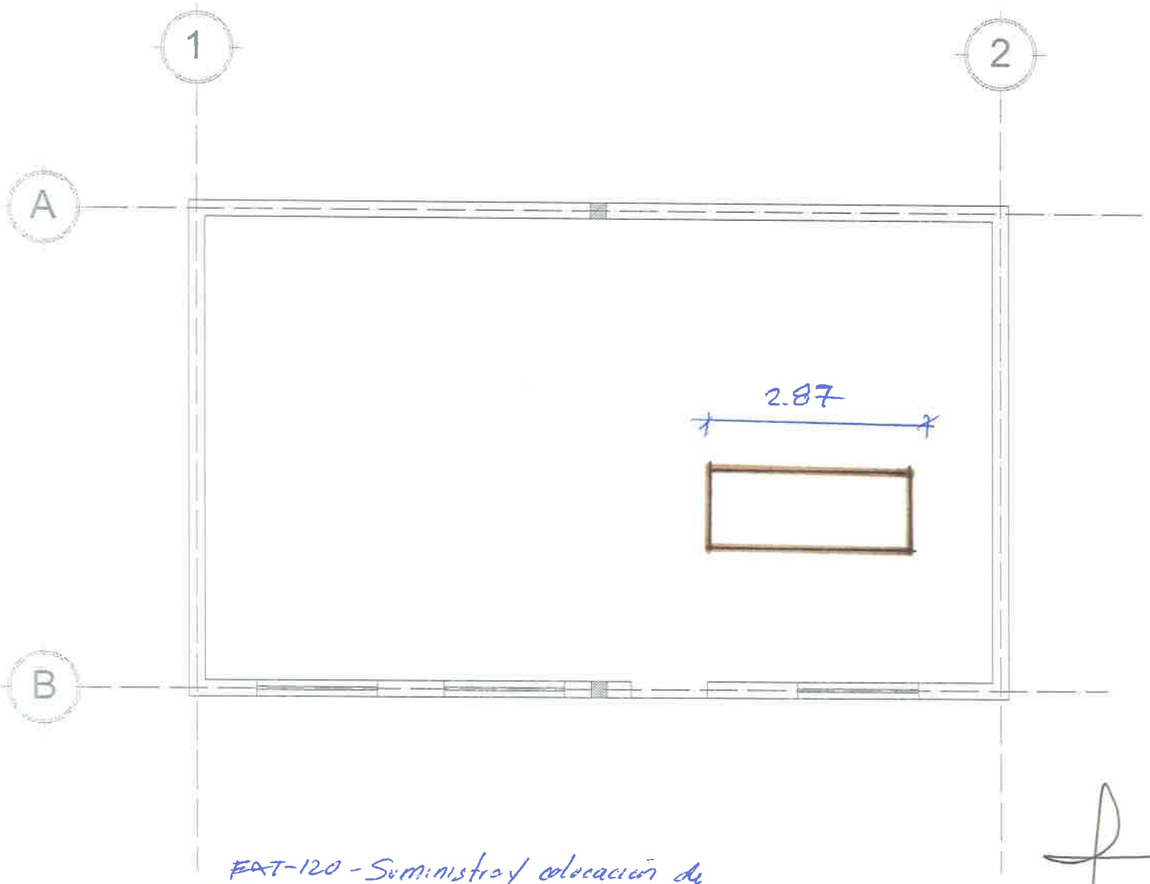

EAT-120 - Suministro y colocación de cubierta de giasnito..

2

10

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 120 Suministro y colocación de cubierta de granito en barra de comedor de 2.80 x 0.80 m. con faldón de 20 cms. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-121					
Salida sanitaria para unidades de refrigeración a base de tubo de PVC de 1". Incluye coples, codos, tees, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		
		3.00	3.00		
		TOTAL	**3.00**		**3.00**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

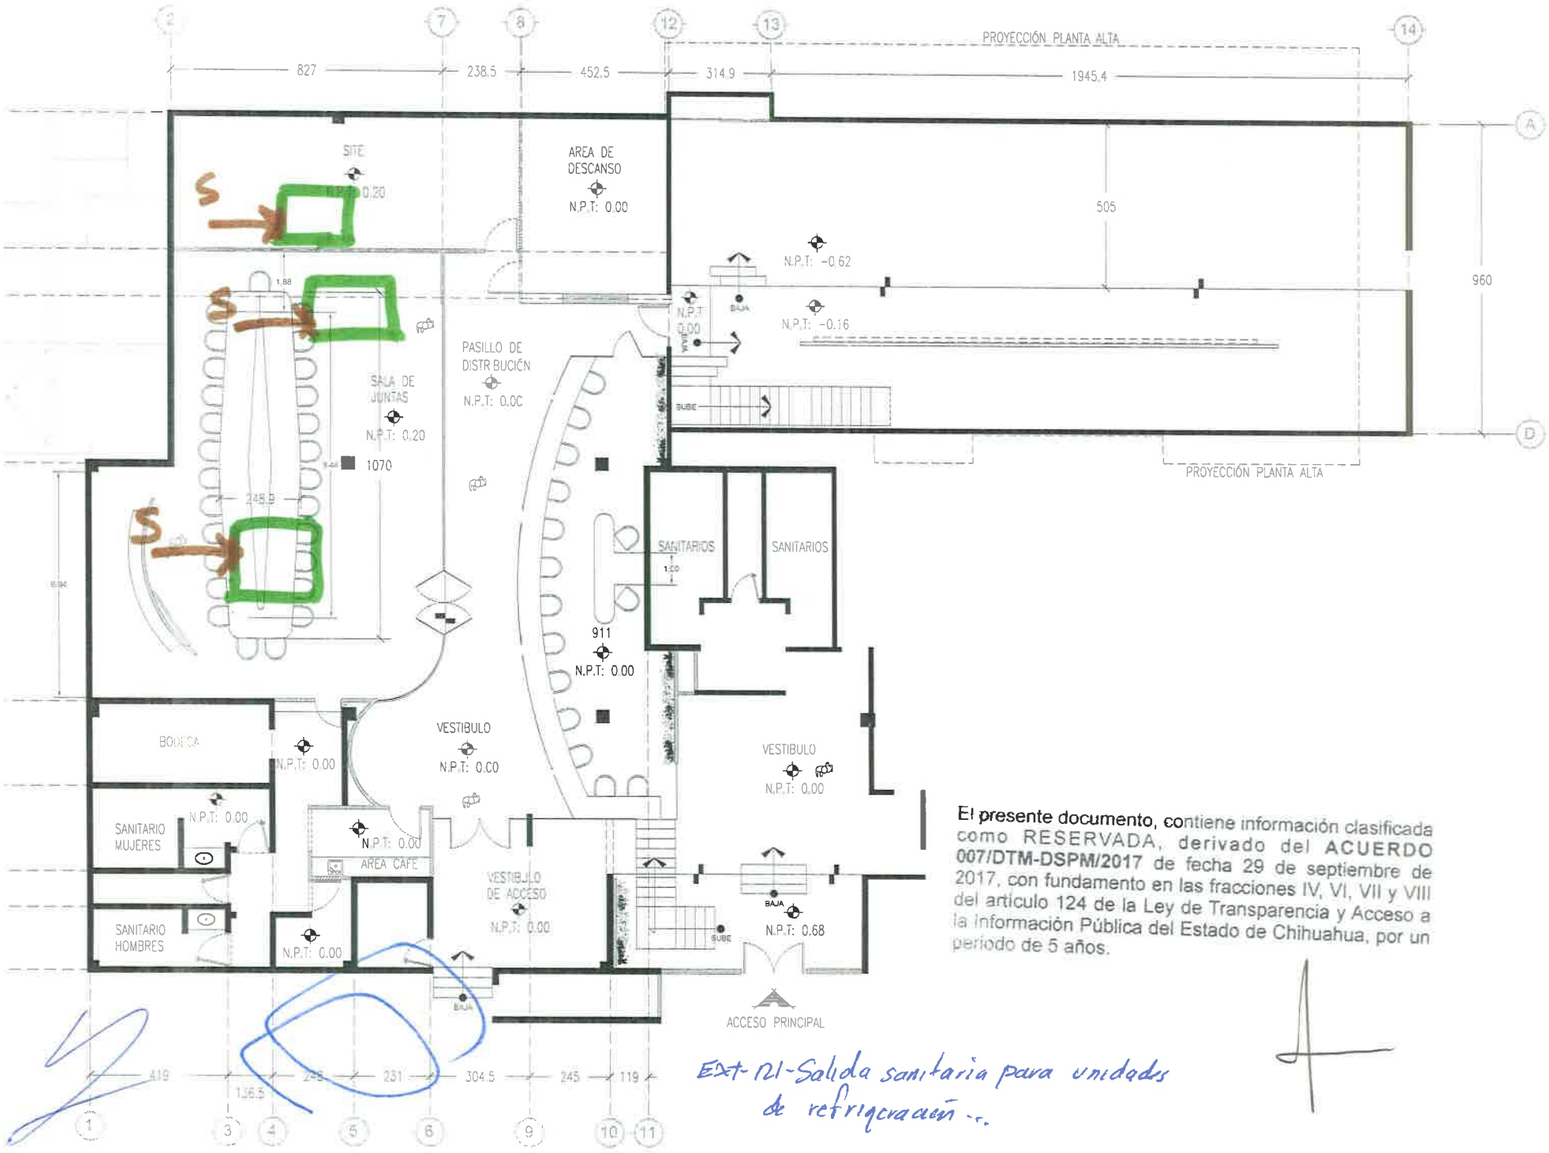

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Ext-N1-Salida sanitaria para unidades de refrigeración...





EXT- 121 Salida sanitaria para unidades de refrigeración a base de tubo de PVC de 1". Incluye coples, codos, tees, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-122					
Suministro e instalación de follaje artificial en muro de vestíbulo principal. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**		**8.00**
		8.00	8.00		
		TOTAL	**8.00**		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



EXT- 122 Suministro e instalación de follaje artificial en muro de vestíbulo principal. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-123						
Suministro e instalación de follaje artificial en muro de vestíbulo principal. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**1.00**
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

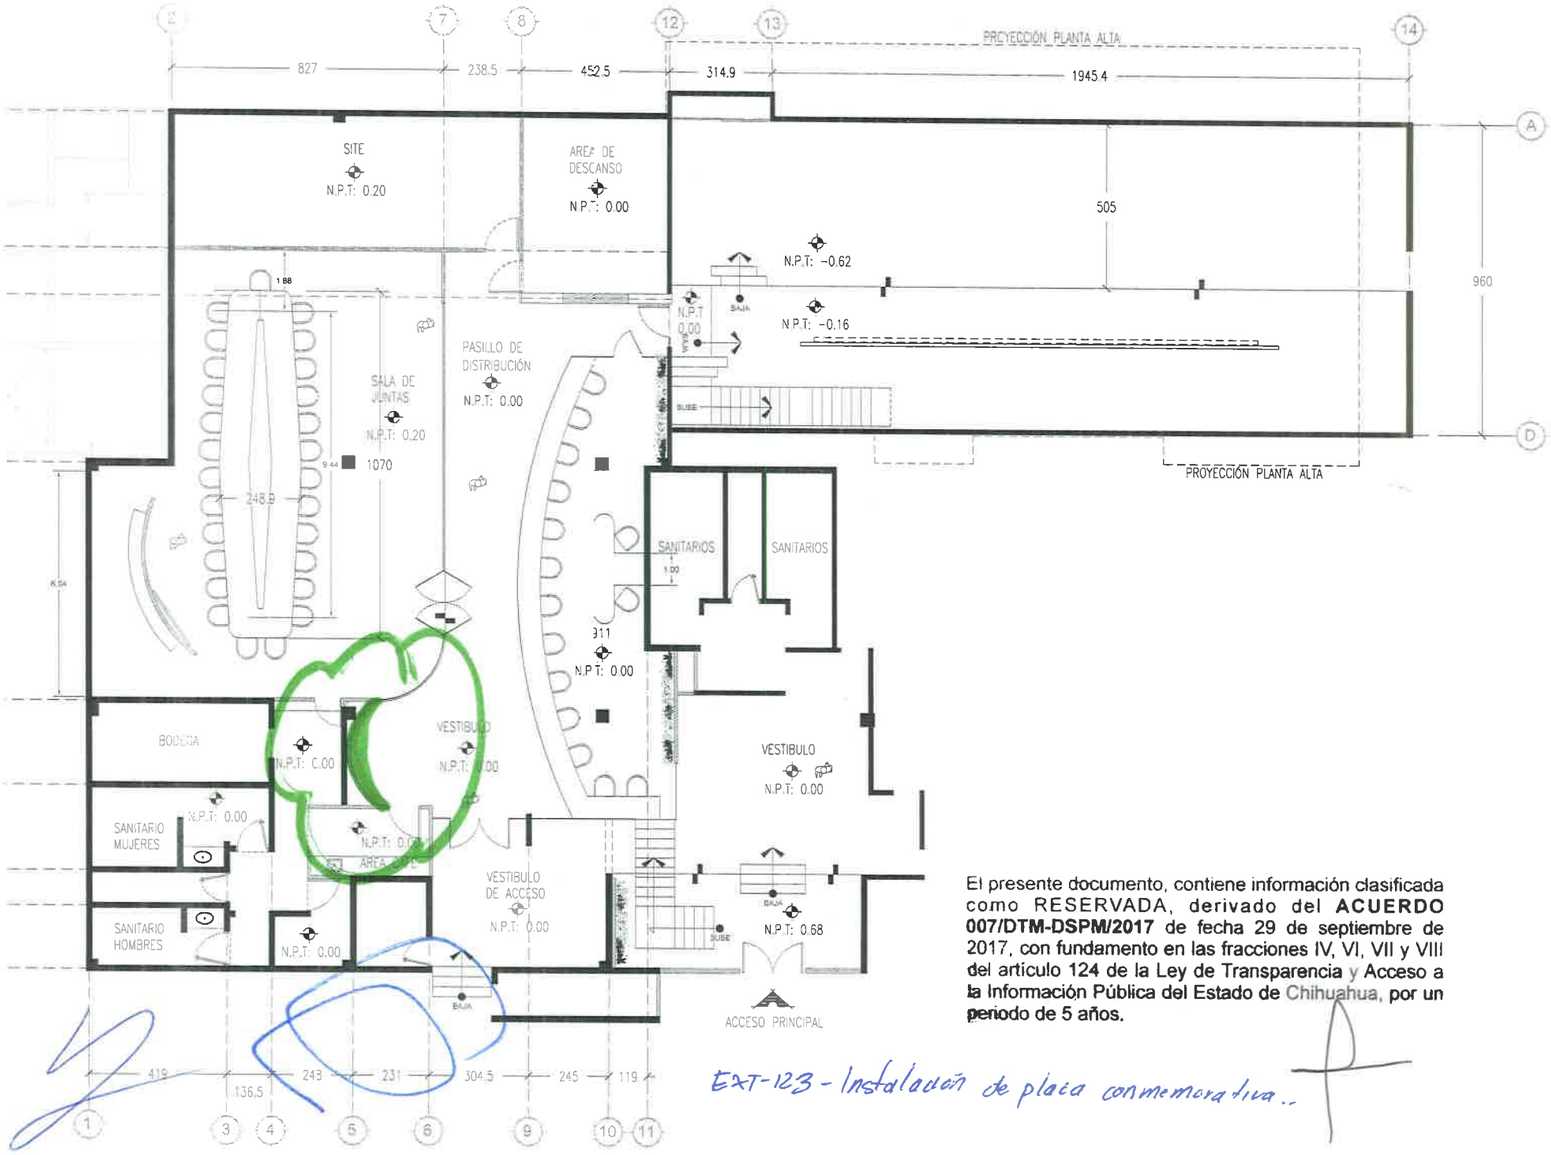

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-123 - Instalación de placa conmemorativa..



EXT- 123 Instalación de placa conmemorativa curva de 1.65 x 0.70 m, (proporcionada por la DSPM), con refuerzo de madera de 1" x 2". Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-124					
Suministro e instalación de tope de piso para puerta. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Pieza	Total		8.00
		8.00	8.00		
		TOTAL	8.00		


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

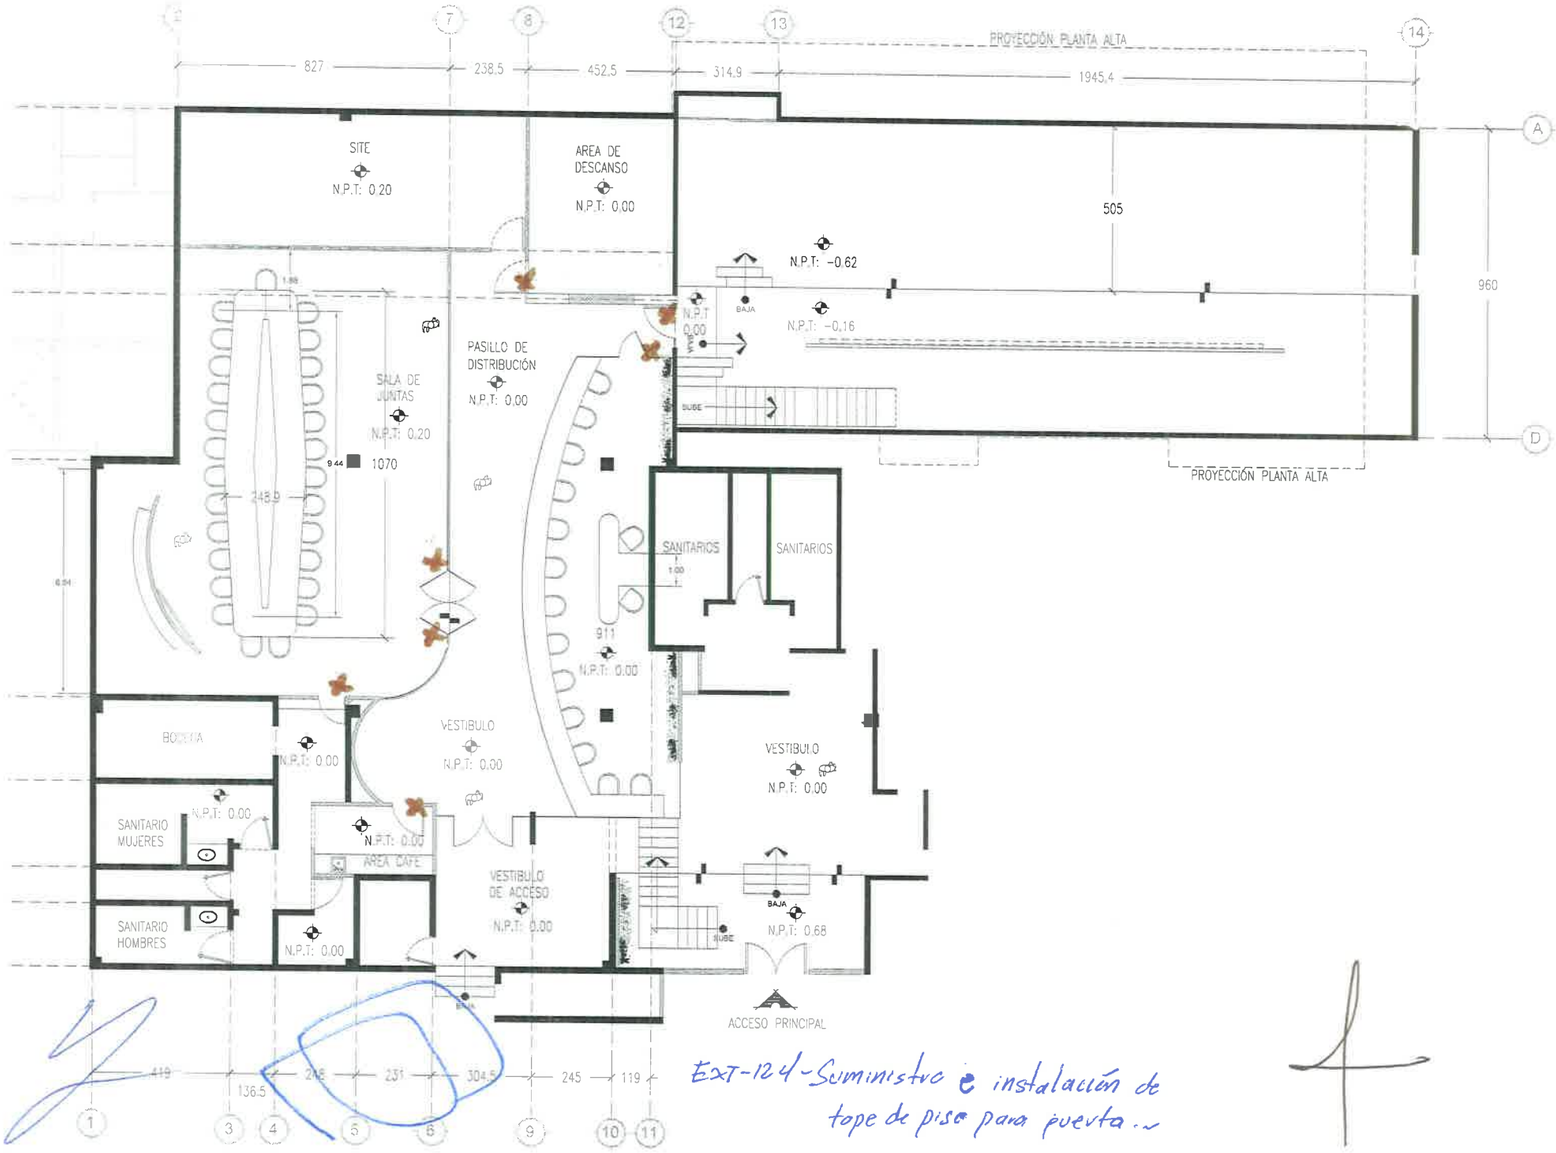

EXT-124 - Suministro e instalación de tope de piso para puerta...

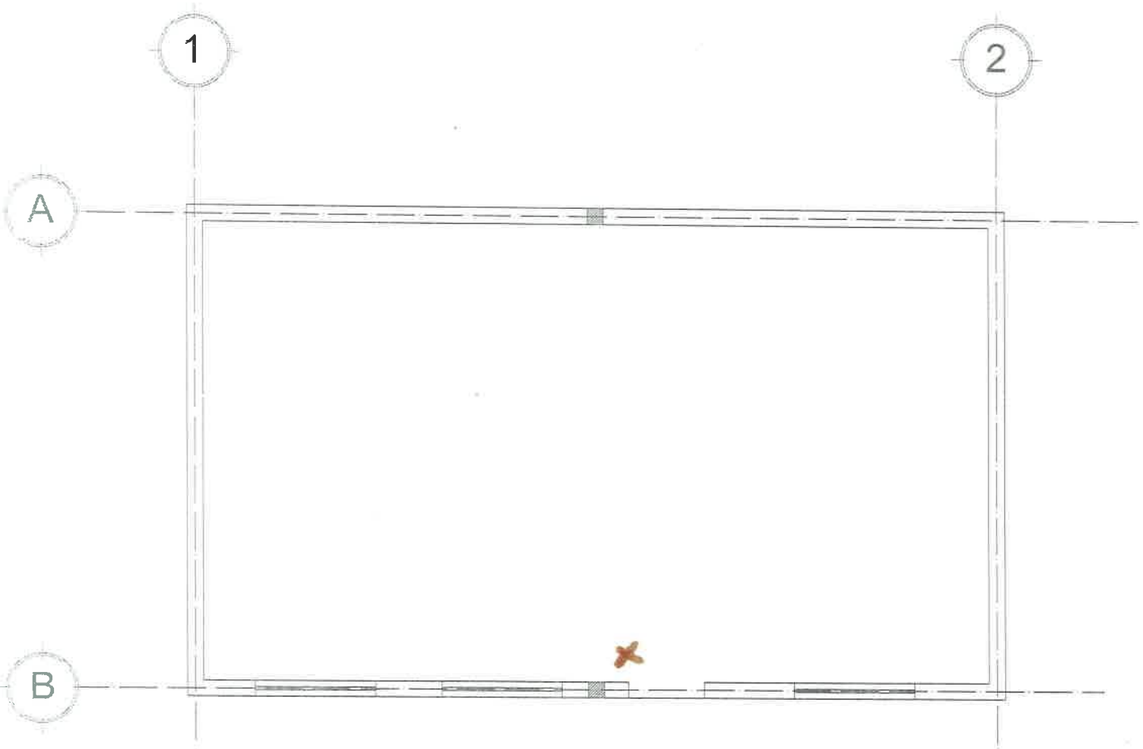

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT -124/ - Suministro e instalación de tope de piso para puerta..



EXT- 124 Suministro e instalación de tope de piso para puerta. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipos, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-126						
Fabricación de Cajillo en "U" a base de Durock de 12 x 20 x 12 cms, para ocultar bajadas de agua pluvial. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			
		3.65	3.65			
		3.66	3.66			
		TOTAL	**7.31**			
						7.31

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



EXT-126 - Cajillo en "U" a base de durock.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO **007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 126 Fabricación de Cajillo en "U" a base de Durock de 12 x 20 x 12 cms, para ocultar bajadas de agua pluvial. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-127					
Reparación de grietas en sala de juntas de dirección y oficinas anexas. Incluye: preparación de la superficie consistente en abrir hueco, colocación de malla de refuerzo y aplanado a base de protecto plus. aplicación de textura, pintura, limpieza general y todo lo necesario para su correcta ejecución		**Pieza**	**Total**		
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		**1.00**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

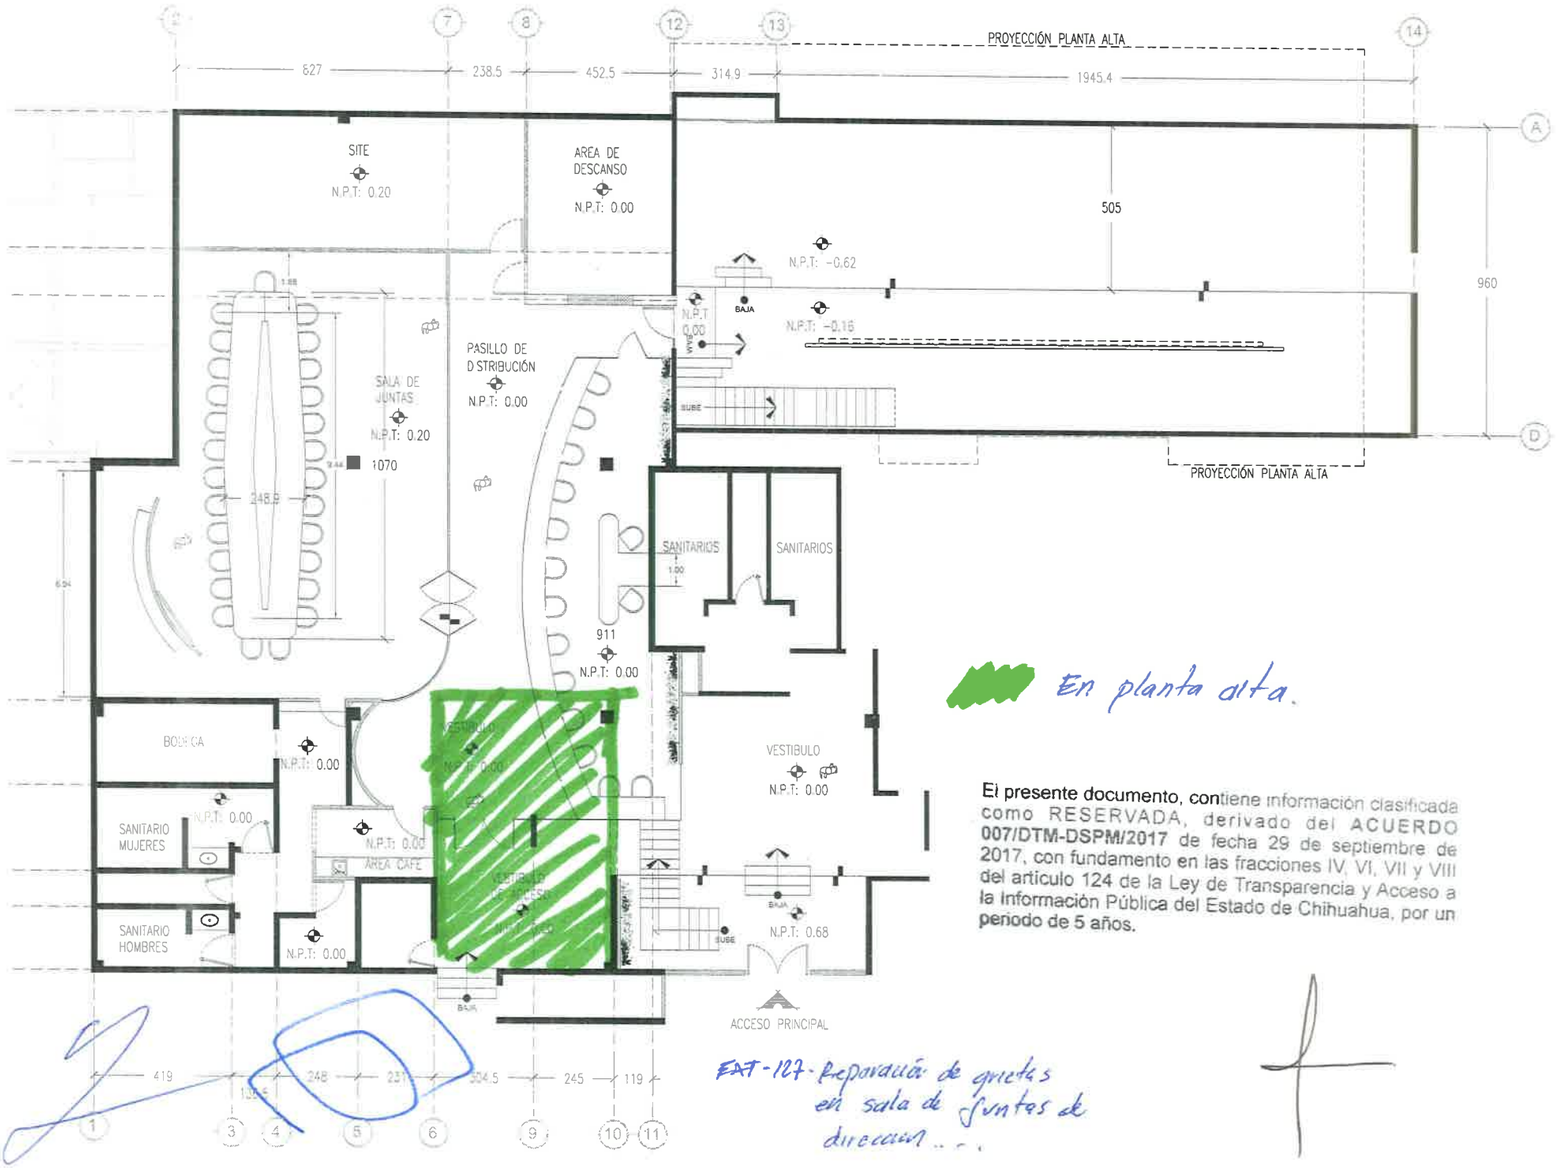

En planta alta.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EAT-127 - Reparación de grietas en sala de juntas de dirección...



EXT- 127

Reparación de grietas en sala de juntas de dirección y oficinas anexas. Incluye: preparación de la superficie consistente en abrir hueco, colocación de malla de refuerzo y aplanado a base de protecto plus, aplicación de textura, pintura, limpieza general y todo lo necesario para su correcta ejecución

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-128					
Suministro de los materiales en MDF y fabricación de cocineta con gabinete en la parte superior de 60 cms. de alto, considerando espacio libre para refrigerador, en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**		**3.67**
		3.67	3.67		
		TOTAL	**3.67**		

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

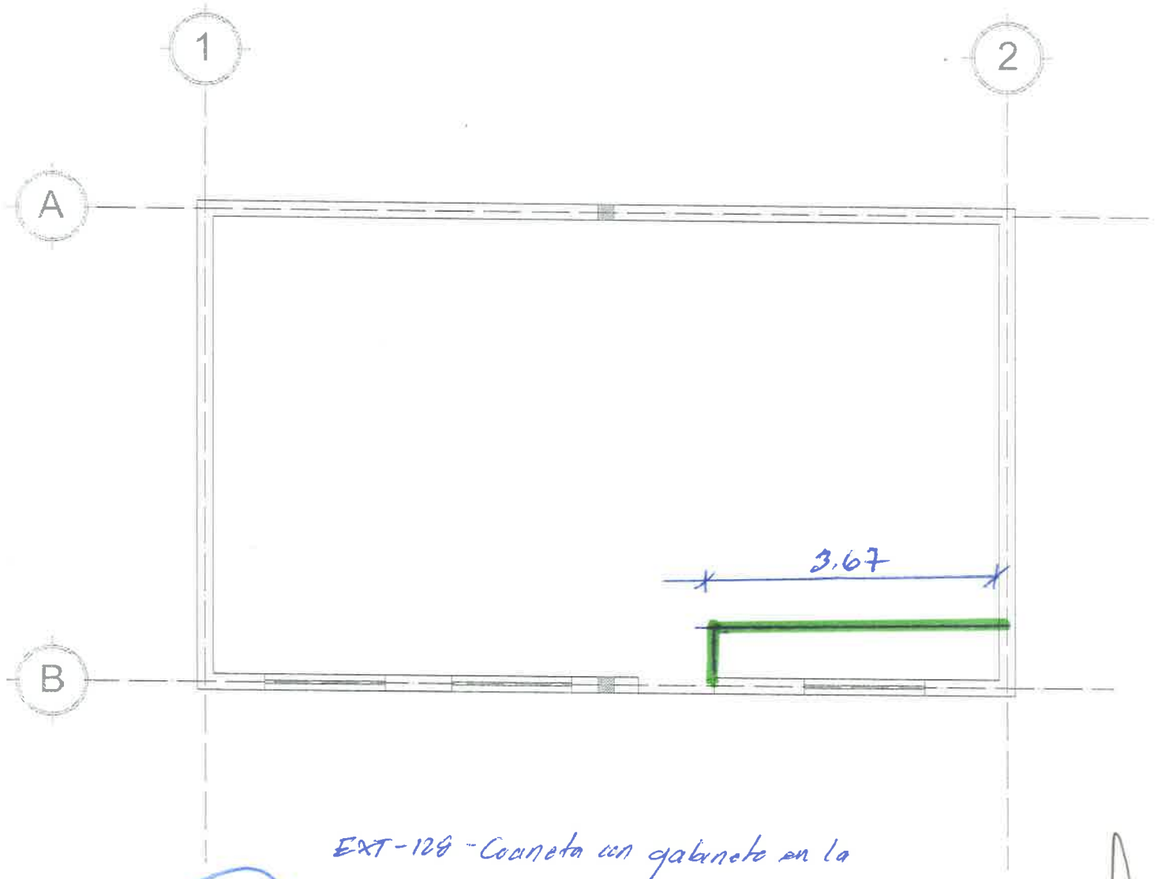

EXT-128 - Cocineta con gabinete en la parte Superior. de 60 cm.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

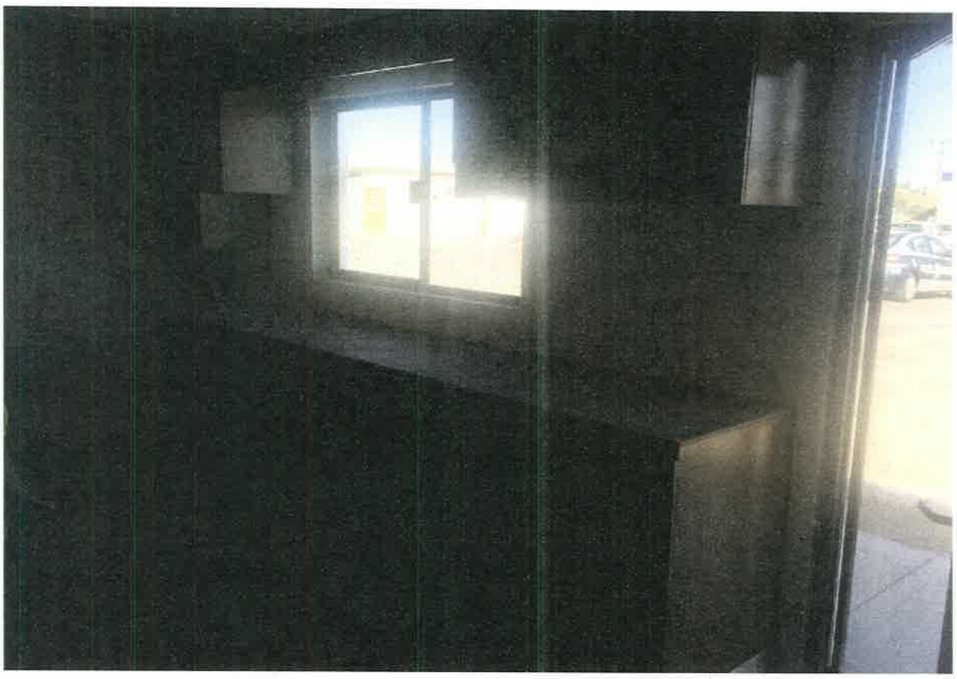

EXT- 128

Suministro de los materiales en MDF y fabricación de cocineta con gabinete en la parte superior de 60 cms. de alto, considerando espacio libre para refrigerador, en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-130						
Preparación de gas para tanque estacionario con tubo de cobre tipo "L" de 13mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Pieza**	**Total**			**1.00**
		1.00	1.00			
		TOTAL	**1.00**			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

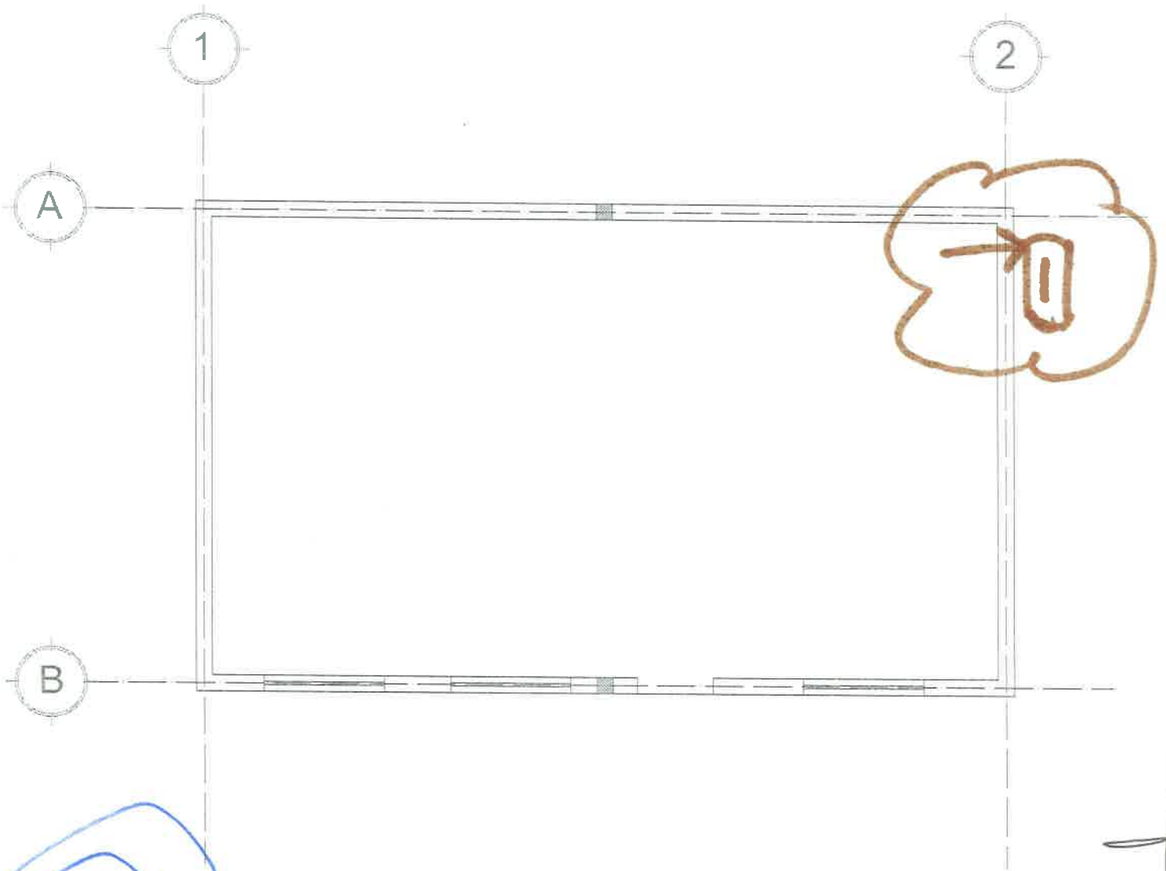

EAT-130 - preparación de gas para tanque estacionario.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



EXT- 130 Preparación de gas para tanque estacionario con tubo de cobre tipo "L" de 13mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-132						
Suministro de los materiales en MDF y fabricación de Cocineta con gabinete en la parte de arriba de 60 cms. de alto, fabricada en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		**Largo**	**Total**			**3.53**
		3.53	3.53			
		TOTAL	**3.53**			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

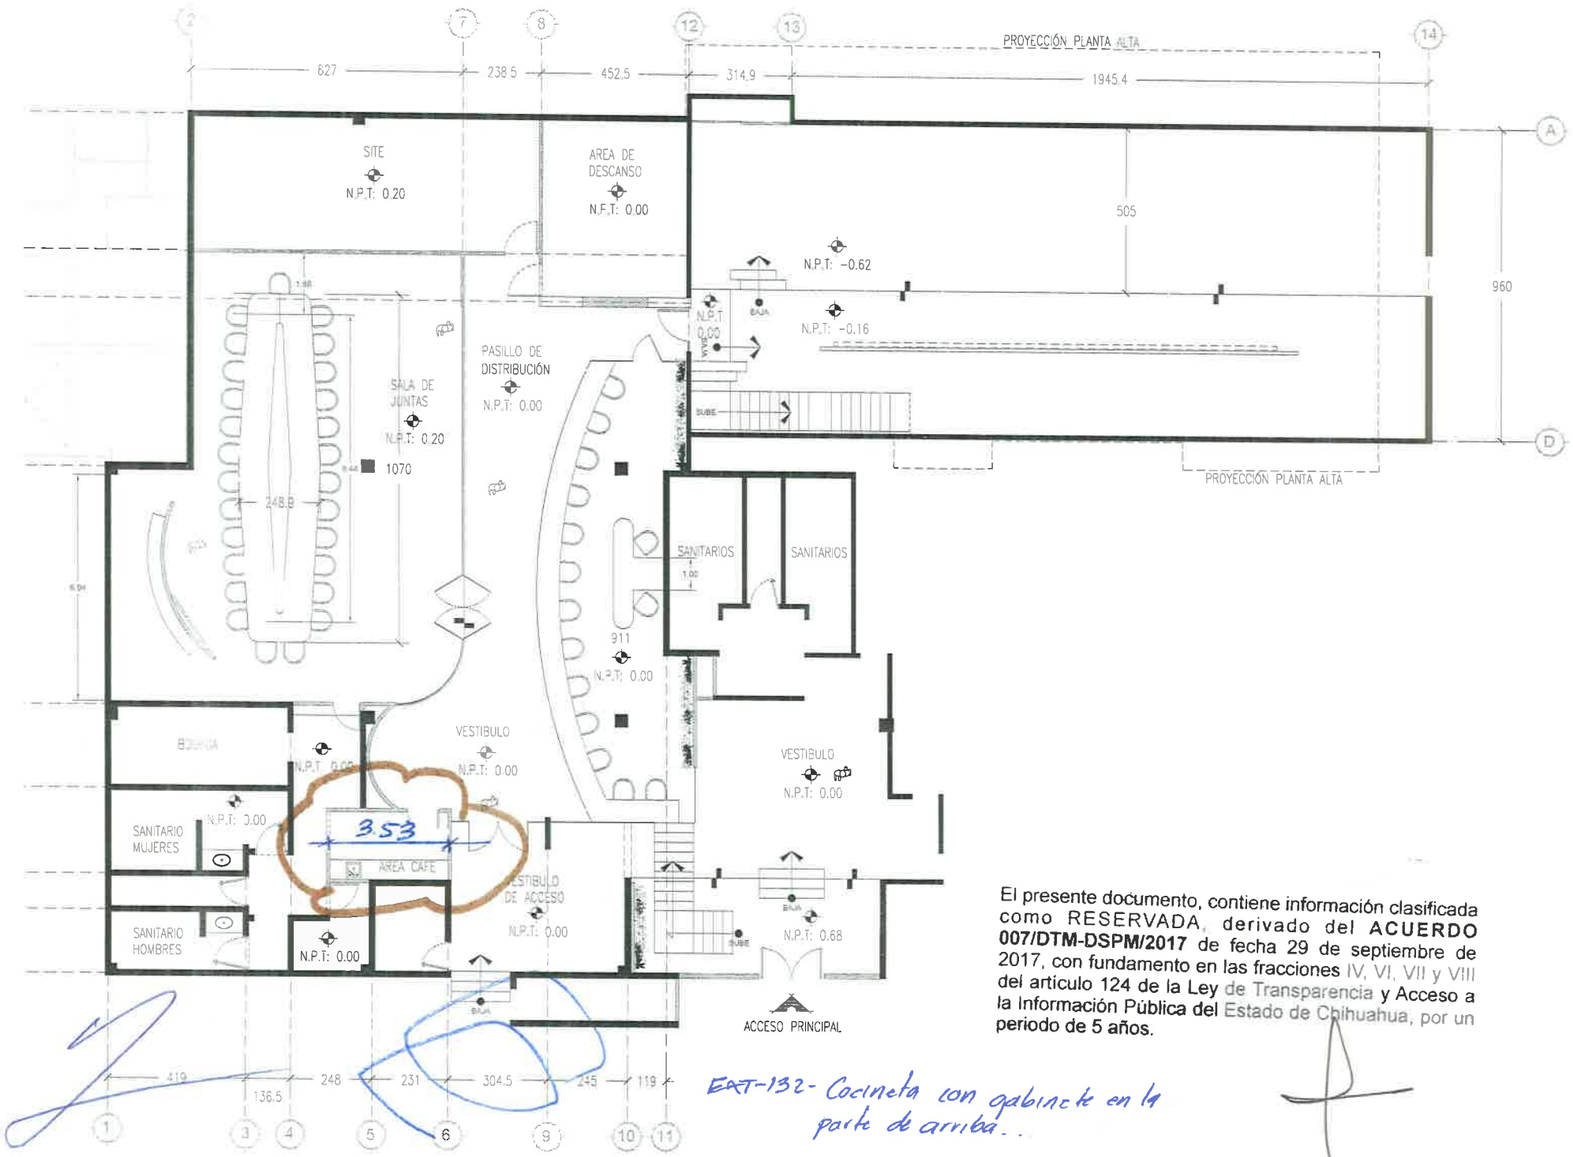

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EAT-132- Cocineta con gabinete en la parte de arriba..



EXT- 132

Suministro de los materiales en MDF y fabricación de Cocineta con gabinete en la parte de arriba de 60 cms. de alto, fabricada en MDF, acabado con poliuretano semi mate color según se indique, rieles y bisagras marca Herrasa, no incluye cubierta de granito ni instalaciones de fontanería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-133						
Muro a una cara pegado a muro de block para generar jardín vertical, con tapas laterales, a base de una capa de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 2 1/2", poste metálico de 2 1/2", calibre 26 a cada 0.60m. Incluye: material, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Alto**	**Total**			
	2.95	2.74	8.08			
	0.10	2.74	0.27			
	0.10	2.74	0.27			
		TOTAL	**8.62**			**8.62**

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 29 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-133						
Muro a una cara pegado a muro de block para generar jardín vertical, con tapas laterales, a base de una capa de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 2 1/2", poste metálico de 2 1/2", calibre 26 a cada 0.60m. Incluye: material, herramienta equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	**Largo**	**Alto**	**Total**			
	2.95	2.74	8.08			
	0.10	2.74	0.27			
	0.10	2.74	0.27			
		TOTAL	**8.62**			**8.62**

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

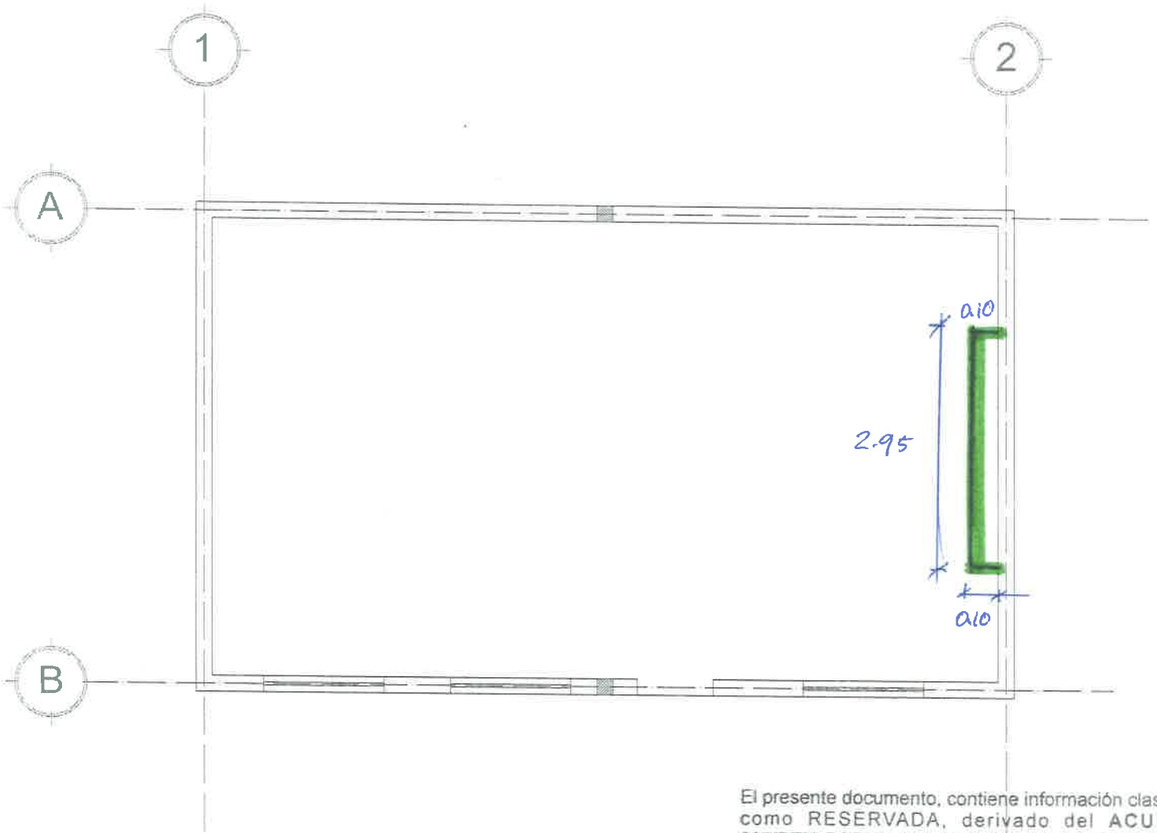

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

EXT-133 - Muro a 1 cara pegado a muro de block ..



EXT- 133

Muro a una cara pegado a muro de block para generar jardín vertical, con tapas laterales, a base de una capa de tablero de yeso de 1/2", tipo regular, marca Tablaroca o similar, bastidor a base de canal de amarre de 2 1/2", poste metálico de 2 1/2", calibre 26 a cada 0.60m. Incluye: material, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 11 PERIODO: 27 al 31 de Marzo de 2018

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXT-139					
Suministro y colocación de puerta abatible, de 0.97 mts de ancho x 2.30 mts de altura, area de site, abatible, a base de vidrio de 6mm, aluminio G2, acabado anodizando natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		**Pieza**	**Total**		**1.00**
		1.00	1.00		
		TOTAL	**1.00**		

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

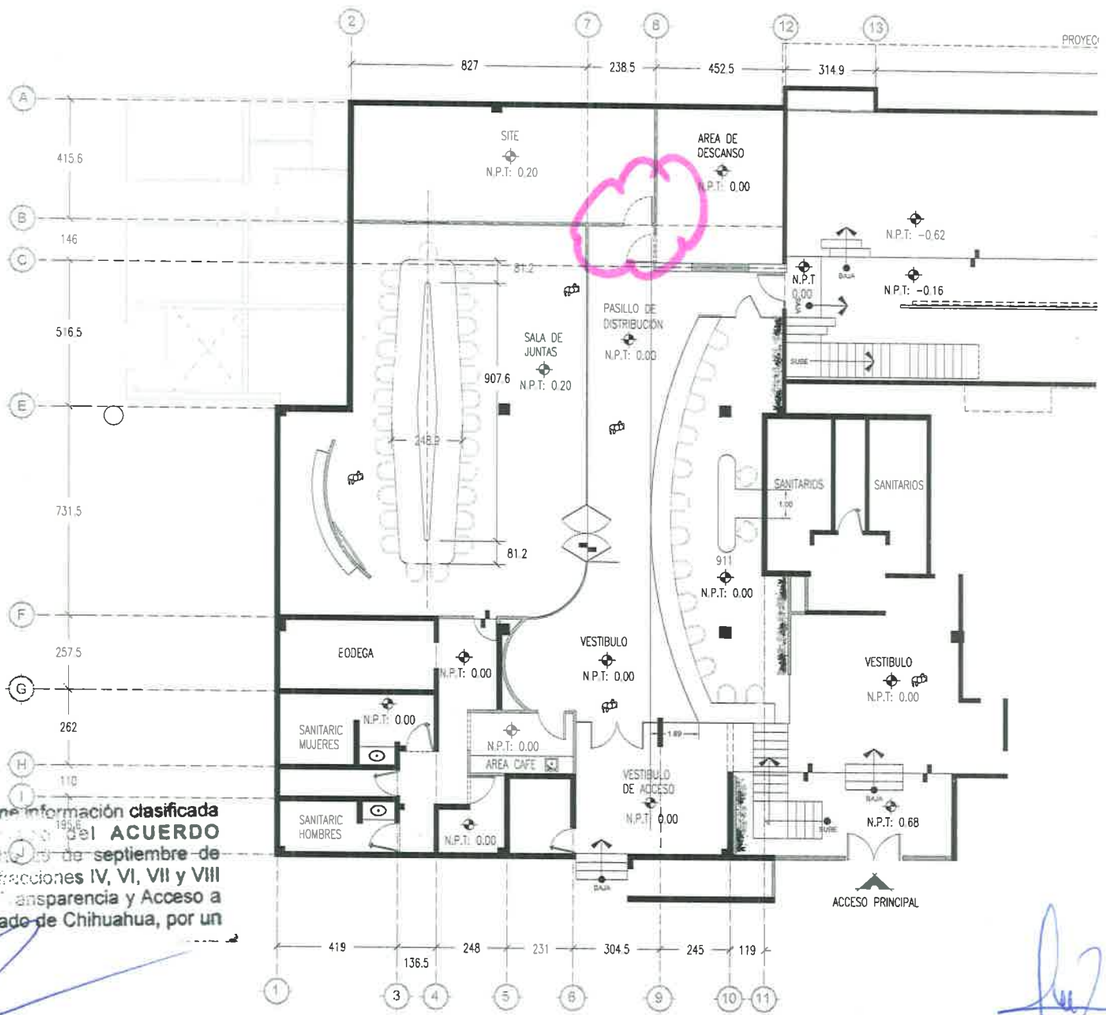

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA [illegible] del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha [illegible] de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley [illegible] Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de **5 años.**

EXT-139 - Suministro y colocación de puerta abatible de 0.97 mts.



EXT- 139

Suministro y colocación de puerta abatible, de 0.97 mts de ancho x 2.30 mts de altura, area de site, abatible, a base de vidrio de 6mm, aluminio G2, acabado anodizando natural. Incluye material, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, taquetes, sellado perimetral, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.
