DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 27 de diciembre de 2018

D A T O S B Á S I C O S

PROYECTO: *"OBRA VIAL DE ADECUACIONES PARA SALIDAS DE FRACCIONAMIENTOS: ROMANZZA-VERSALLES-C4,SOBRE CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 3+300 AL KM 5+000."* ***No CONTRATO 121/2018***

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-PEPD-OP-062

CARACTERISTICAS: *SE TRABAJARA CON TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y ALUMBRADO.*

MONTO DE CONTRATO: *$1,794,028.05* **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S.A. DE C.V.**
FECHA PROGRAMADA DE INICIO **16 DE NOVIEMBRE DE 2018**
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: **16 DE NOVIEMBRE DE 2018**
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DIFERIMENTO EN TIEMPO DE TERMINACION POR REPROGRAMACION:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	$	1,524,923.84	85.00%
REAL:	$	1,794,028.05	100.00%

	POR PARTIDA	PROGR.	REAL		POR PARTIDA	PROGR.	REAL
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

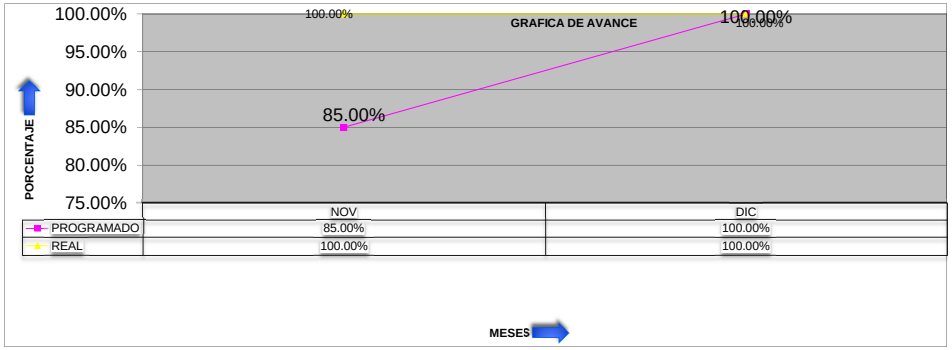

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

AMPLIACION SALIDA ROMANZZA

CONSTRUCCION DE CUNETA EN OBRA DE DRENAJE

CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y DEFENSA

AMPLIACION DE CARRIL SALIDA C4

AMPLIACIACION DE CARRIL FRENTE A CONAGUA

AMPLIACION DE CARRIL FRENTE A GUARDERIA
