DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA abr-17

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: *PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO*

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-021

CARACTERISTICAS: *LEVANTAMIENTO DE DATOS CON EQUIPO GPS, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION MODIFICADO, PROYECTO EN SISPROTER LISTAS DE MATERIALES, INGRESO DE DOCUMENTACION PARA OBTENER EL NO DE DC, SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE OFICIO DE APROVACION DE PROYECTO.*

MONTO DE CONTRATO: $17,400.00 **CON IVA** **CONTRATO** 012/2017

CONTRATISTA: ING. AURORA BLANCO OROZCO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 10 DE MARZO 2017
FECHA DE INICIO DE PROYECTO: 10 DE MARZO 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 08 DE ABRIL 2017

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE DE ENTREGA EN %

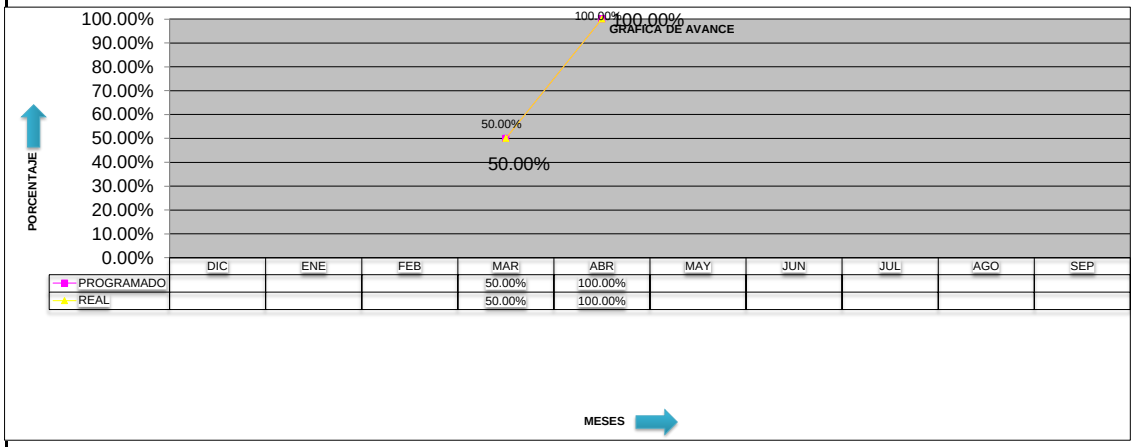

	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
PROGRAMADO				50.00%	100.00%					
REAL				50.00%	100.00%					

ACTIVIDADES

LEVANTAMIENTO DE DATOS CON EQUIPO GPS, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION MODIFICADO, PROYECTO EN SISPROTER LISTAS DE MATERIALES, INGRESO DE DOCUMENTACION PARA OBTENER EL NO DE DC, SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE OFICIO DE APROVACION DE PROYECTO.
