DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 19 de mayo de 2017

D A T O S B Á S I C O S

PROYECTO: *CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA EN PARQUE EL ENCINO KM 7.1*

No CONTRATO 037/2017

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-031

CARACTERISTICAS: *CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE 20 CMS DE ESPESOR, TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y RELLENO, ZAPATA CORRIDA, RODAPIE DE 20 CMS, DALAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO Y MALLA CICLONICA .*

MONTO DE CONTRATO: $100,496.44 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO** $96,961.81

CONTRATISTA: LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 27 DE ABRIL 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 26 DE MAYO 2017

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	$	100,496.44	100.00%
REAL:	$	96,961.81	100.00%

	POR PARTIDA	PROGR.	REAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

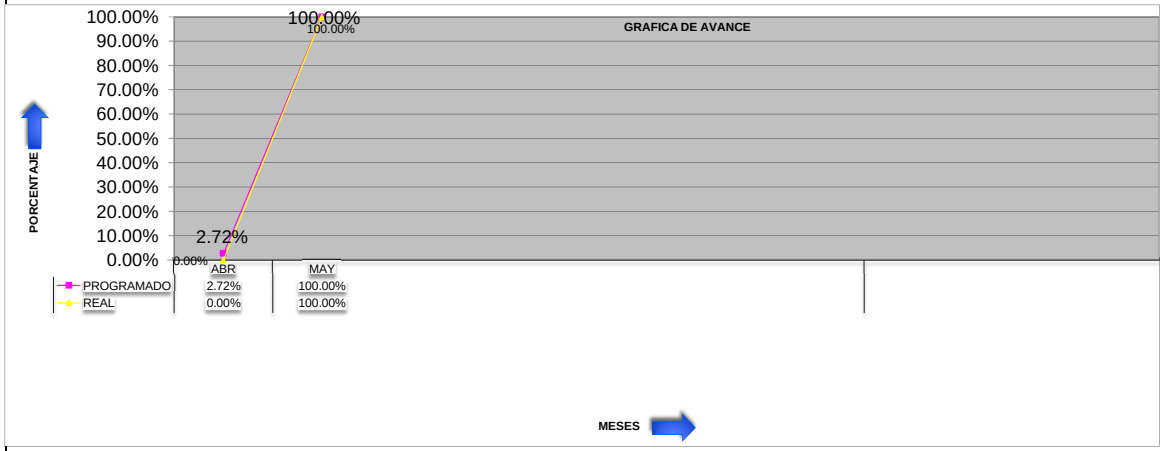

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

EXCAVACION	
PLANTILLA	
ACERO	
ZAPATA	
RODAPIE DE BLOCK	
DALA DESPLANTE	
MURO BLOCK	SE COLOCA MALLA CICLONICA
RELLENO BLOCK	SE REALIZA COLOCACION DE RELLENO DE BLOCK
DALA DE CERAMIENTO	SE REALIZA COLADO DE DALA DE CERRAMIENTO

NOTAS:

SE REALIZA CIMBRADO DE DALA DE CERRAMIENTO

SE REALIZA COLCACION DE RELLENO

SE MUESTRA COLOCACION DE MALLA CICLONICA

SE MUESTRA MALLA CICLONICA
