DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 29 de junio de 2017

D A T O S B Á S I C O S

PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA* ***No CONTRATO 057/2017***

OFICIO DE AUTORIZACION No.

CARACTERISTICAS: *SE TRABAJARA CON LA CONSTRUCCION DE SUB ESTRUCTURA Y ESTRUCTURA DE GAZA (ZAPATA, COLUMNA, MARCOS, CABEZAL, LOSA Y GUARNICION) CON UN ANCHO TOTAL DE 9.80 DE ANCHO, TIERRA ARMADA, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO Y RED ELECTRICA.*

MONTO DE CONTRATO: *$69,770,176.67* **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MERP Y EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V
FECHA PROGRAMADA DE INICIO **22 DE MAYO 2017**
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: **30 DE MAYO 2017**
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: **17 DE DICIEMBRE DE 2017**
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: **32.93%**
REAL: **11%**

	POR PARTIDA	PROGR.	REAL		POR PARTIDA	PROGR.	REAL
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN % 11

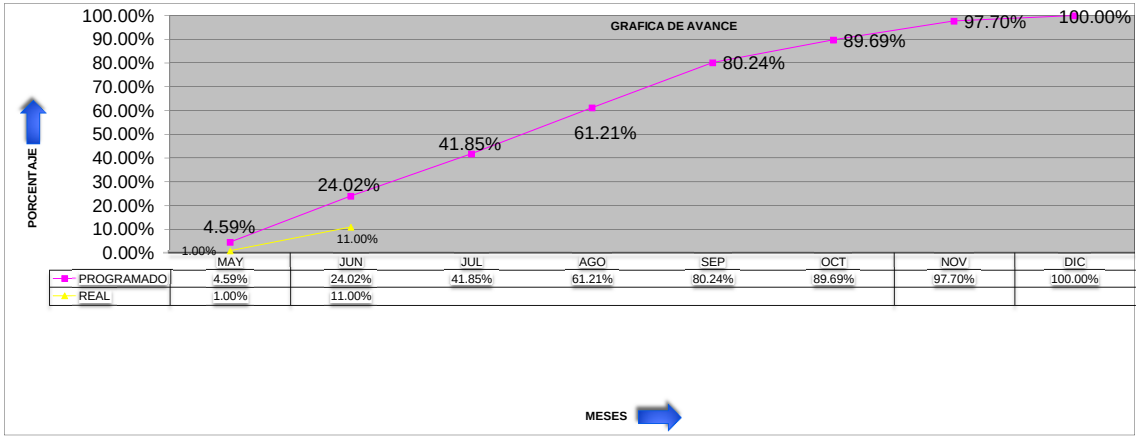

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

OBSERVACIONES:

23 de Junio del 2017

Se continuan los trabajos del armado de zapata del marco eje 2.

Se realiza la afinación y la compactación de la excavación del marco eje 3.

Se hace el colado de la 2 sección de muro del estribo del eje 8 con una altura de 2.10m.

24 de Junio del 2017

Se realiza el colado de la zapata del marco eje 2.

Se hace el colado de la plantilla del marco eje 3.

26 de Junio del 2017

Se colo la primera sección de columna lado izquierdo del marco eje 2.

Se realiza sondeo con retroexcavadora en la pila 4.

Se empieza a colocar el acero de la zapata del marco eje 3.

27 de Junio del 2017

Se continua con el armado de la zapata del marco 3 .

Se saca sondeo para determinar capacidad de carga en el terreno para la pila 4.

Se colo la primera sección de columna lado derecho del marco eje 2.

28 de Junio del 2017

Se empieza a rellenar con material de banco la excavación del marco 2 .

Se realiza el colado de la plantilla de la pila eje 6 con concreto ciclopeo.

29 de Junio del 2017

Se realiza el colado de la zapata del marco eje 3 . CFE realiza los trabajos de movimiento de cableado de

CFE realiza los trabajos de movimiento de cableado de media tensión paralelo al marco eje 2 y eje 3.

Se empieza a colocar acero en la zapata de la pila 6.

CIMBRADO Y COLADO DE ESTRIBO EJE 8

EXCAVACIÓN EN MARCO 3

REUBICACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN (CFE)

ARMADO DE ZAPATA MARCO EJE 3
