DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 29 de junio de 2017

D A T O S B Á S I C O S

PROYECTO: *CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.* *No CONTRATO 060/2017*

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-FED-OP-006

CARACTERISTICAS: *CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD. LONGITUD DE CANALIZACIÓN 235 MTS, ÁREA DE PAVIMENTACIÓN: DE 2,410 M2 DE CONCRETO, 4,700 M2 DE RE-PAVIMENTACIÓN, 450 MTS DE GUARNICIÓN Y 900 M2 DE BANQUETA.*

MONTO DE CONTRATO: $14,531,231.21 CON IVA MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 30 DE MAYO DEL 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 26 DE OCTUBRE 2017

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	$	3,353,347.67	23.08%
REAL:	$	-	0.00%

	POR PARTIDA	PROGR.	REAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

	POR PARTIDA	PROGR.	REAL
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

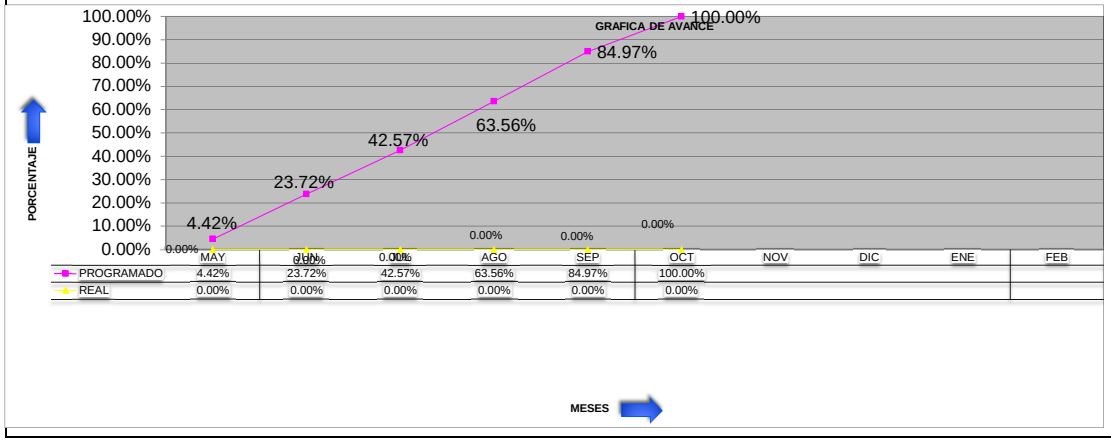

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PRELIMINARES NINGUNO

TERRACERIAS EN VIALIDAD

CANALIZACION

TRABAJOS DIVERSOS

OBRAS DE DRENAJE

PAVIMENTOS

SEÑALAMIENTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES ELECTRICAS

NOTAS: NO SE HA INICIADO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTA OBRA POR LA FALTA DE ENTREGA DE ANTICIPO AL DIA DE HOY

SE MUESTRA CANAL AGUAS ABAJO

SE MUESTRA CANAL AGUAS ABAJO

SE MIESTRA CANAL AGUAS ARRIBA

SE MUESTRA CANAL AGUAS ARRIBA
