DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BASICA

OBRA: **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO (AV. DE LA CANTERA), EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.**

CARACTERISTICAS: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO, UBICADO EN LA AV. LA CANTERA Y AV. SAN FELIPE DE LA COL. SICOMORO, INCLUYE: 1,931.21 M2 DE PASO EN ROLLO, 190.74 ML DE CERCA PERIMETRAL, 1 SISTEMA DE RIEGO QUE INCLUYE 396.00 ML DE TUBO DE PVC, 7.00 CABALLETES DE TIRO, 1.00 CISTERNA DE 5000 LTS DE CAPACIDAD HECHA A BASE DE MUROS DE BLOCK Y LOSA DE CONCRETO, 1.00 ASETA DE HIDRONEUMATICO, 1.00 ESTACIONAMIENTO CON 20.00 CAJONES HECHO A BASE DE CARPET ASFALTICA, 1.00 SISTEMA DE ALUMBRADO QUE INCLUYE 2.00 SUPER POSTES Y 6.00 REFLECTORES.

CONTRATO: 122/2017

MONTO DE CONTRATO: $1,370,227.74

CONTRATISTA: ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 24/08/2017

FECHA DE INICIO REAL: 24/08/2017

FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 21/11/2017

FECHA DE TERMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

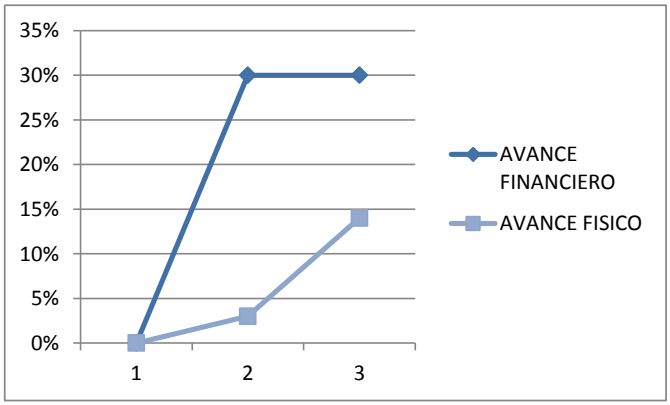

MES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
JULIO	0.00%	0%
AGOSTO	3.00%	30%
SEPTIEMBRE	14.00%	30%
TOTAL:	**14.00%**	**30%**
