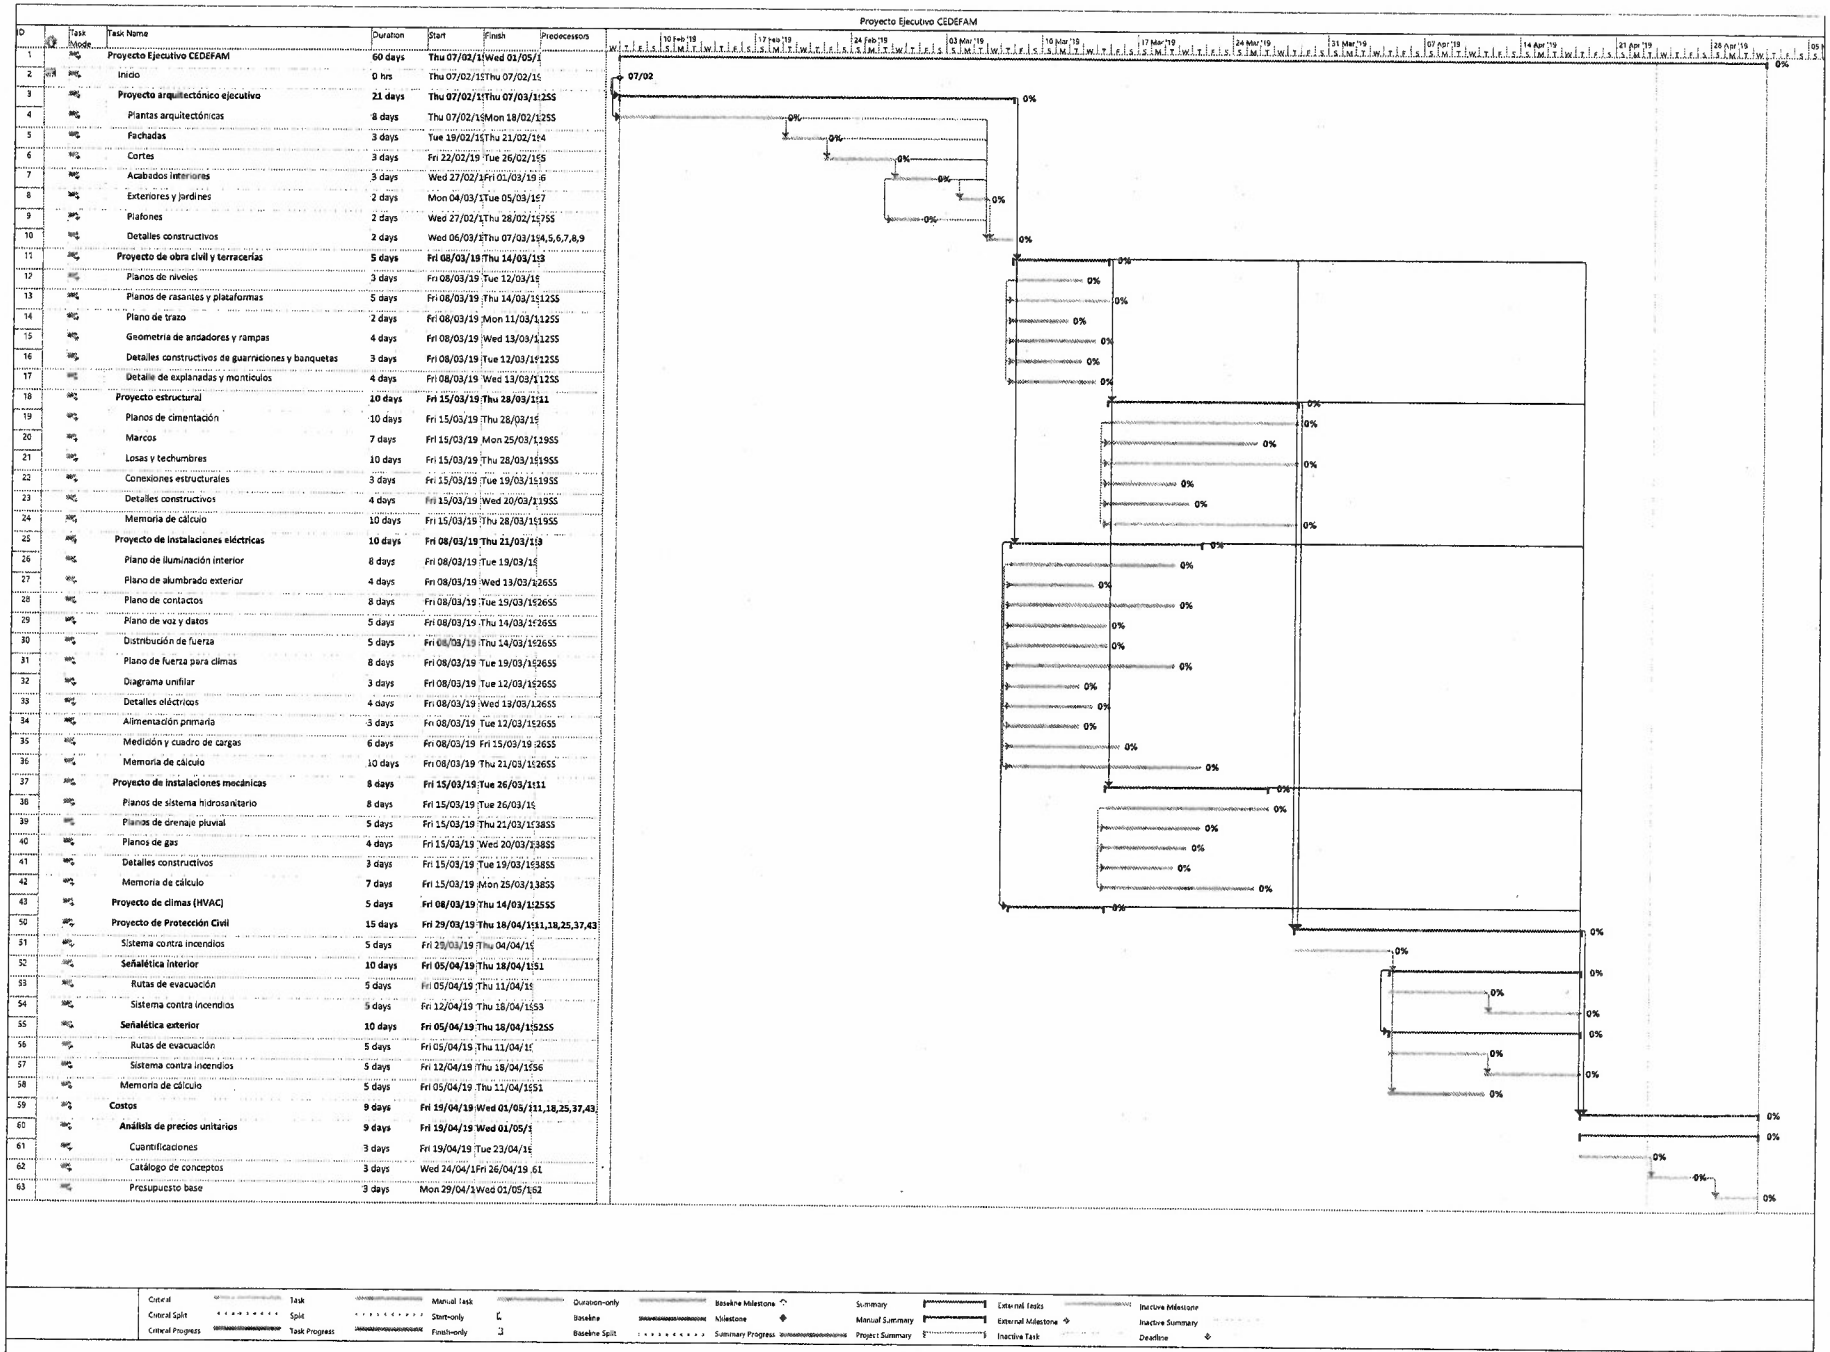


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Proyecto Ejecutivo CEDEFAM**	**60 days**	**Thu 07/02/19**	**Wed 01/05/19**	
2		Inicio	0 hrs	Thu 07/02/19	Thu 07/02/19	
3		**Proyecto arquitectónico ejecutivo**	**21 days**	**Thu 07/02/19**	**Thu 07/03/19**	**2SS**
4		Plantas arquitectónicas	8 days	Thu 07/02/19	Mon 18/02/19	2SS
5		Fachadas	3 days	Tue 19/02/19	Thu 21/02/19	4
6		Cortes	3 days	Fri 22/02/19	Tue 26/02/19	5S
7		Acabados interiores	3 days	Wed 27/02/19	Fri 01/03/19	6
8		Exteriores y jardines	2 days	Mon 04/03/19	Tue 05/03/19	7
9		Plafones	2 days	Wed 27/02/19	Thu 28/02/19	7SS
10		Detalles constructivos	2 days	Wed 06/03/19	Thu 07/03/19	4,5,6,7,8,9
11		**Proyecto de obra civil y terracerías**	**5 days**	**Fri 08/03/19**	**Thu 14/03/19**	
12		Planos de niveles	3 days	Fri 08/03/19	Tue 12/03/19	
13		Planos de rasantes y plataformas	5 days	Fri 08/03/19	Thu 14/03/19	12SS
14		Plano de trazo	2 days	Fri 08/03/19	Mon 11/03/19	12SS
15		Geometría de andadores y rampas	4 days	Fri 08/03/19	Wed 13/03/19	12SS
16		Detalles constructivos de guarniciones y banquetas	3 days	Fri 08/03/19	Tue 12/03/19	12SS
17		Detalle de explanadas y montículos	4 days	Fri 08/03/19	Wed 13/03/19	12SS
18		**Proyecto estructural**	**10 days**	**Fri 15/03/19**	**Thu 28/03/19**	**11**
19		Planos de cimentación	10 days	Fri 15/03/19	Thu 28/03/19	
20		Marcos	7 days	Fri 15/03/19	Mon 25/03/19	19SS
21		Losas y techumbres	10 days	Fri 15/03/19	Thu 28/03/19	19SS
22		Conexiones estructurales	3 days	Fri 15/03/19	Tue 19/03/19	19SS
23		Detalles constructivos	4 days	Fri 15/03/19	Wed 20/03/19	19SS
24		Memoria de cálculo	10 days	Fri 15/03/19	Thu 28/03/19	19SS
25		**Proyecto de instalaciones eléctricas**	**10 days**	**Fri 08/03/19**	**Thu 21/03/19**	**3**
26		Plano de iluminación interior	8 days	Fri 08/03/19	Tue 19/03/19	
27		Plano de alumbrado exterior	4 days	Fri 08/03/19	Wed 13/03/19	26SS
28		Plano de contactos	8 days	Fri 08/03/19	Tue 19/03/19	26SS
29		Plano de voz y datos	5 days	Fri 08/03/19	Thu 14/03/19	26SS
30		Distribución de fuerza	5 days	Fri 08/03/19	Thu 14/03/19	26SS
31		Plano de fuerza para climas	8 days	Fri 08/03/19	Tue 19/03/19	26SS
32		Diagrama unifilar	3 days	Fri 08/03/19	Tue 12/03/19	26SS
33		Detalles eléctricos	4 days	Fri 08/03/19	Wed 13/03/19	26SS
34		Alimentación primaria	3 days	Fri 08/03/19	Tue 12/03/19	26SS
35		Medición y cuadro de cargas	6 days	Fri 08/03/19	Fri 15/03/19	26SS
36		Memoria de cálculo	10 days	Fri 08/03/19	Thu 21/03/19	26SS
37		**Proyecto de instalaciones mecánicas**	**8 days**	**Fri 15/03/19**	**Tue 26/03/19**	**11**
38		Planos de sistema hidrosanitario	8 days	Fri 15/03/19	Tue 26/03/19	
39		Planos de drenaje pluvial	5 days	Fri 15/03/19	Thu 21/03/19	38SS
40		Planos de gas	4 days	Fri 15/03/19	Wed 20/03/19	38SS
41		Detalles constructivos	3 days	Fri 15/03/19	Tue 19/03/19	38SS
42		Memoria de cálculo	7 days	Fri 15/03/19	Mon 25/03/19	38SS
43		**Proyecto de climas (HVAC)**	**5 days**	**Fri 08/03/19**	**Thu 14/03/19**	**25SS**
50		**Proyecto de Protección Civil**	**15 days**	**Fri 29/03/19**	**Thu 18/04/19**	**11,18,25,37,43**
51		Sistema contra incendios	5 days	Fri 29/03/19	Thu 04/04/19	
52		**Señalética interior**	**10 days**	**Fri 05/04/19**	**Thu 18/04/19**	**51**
53		Rutas de evacuación	5 days	Fri 05/04/19	Thu 11/04/19	
54		Sistema contra incendios	5 days	Fri 12/04/19	Thu 18/04/19	53
55		**Señalética exterior**	**10 days**	**Fri 05/04/19**	**Thu 18/04/19**	**52SS**
56		Rutas de evacuación	5 days	Fri 05/04/19	Thu 11/04/19	
57		Sistema contra incendios	5 days	Fri 12/04/19	Thu 18/04/19	56
58		Memoria de cálculo	5 days	Fri 05/04/19	Thu 11/04/19	51
59		**Costos**	**9 days**	**Fri 19/04/19**	**Wed 01/05/19**	**11,18,25,37,43**
60		**Análisis de precios unitarios**	**9 days**	**Fri 19/04/19**	**Wed 01/05/19**	
61		Cuantificaciones	3 days	Fri 19/04/19	Tue 23/04/19	
62		Catálogo de conceptos	3 days	Wed 24/04/19	Fri 26/04/19	61
63		Presupuesto base	3 days	Mon 29/04/19	Wed 01/05/19	62
