



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

EXP: 0320/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	"CONSTRUCCIÓN DE POZO" ESTACIÓN EJIDO FRANCISCO I. MADERO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	MAYO	JUNIO	\$
					1,526.78	1,526,776.92	1,526,776.92								763,388.46
TOTAL					\$	1,526,776.92	\$ 1,526,776.92	\$	\$						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Recibido 17-05-16

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0320/16
FECHA: 04-may-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE POZO" ESTACIÓN EJIDO FRANCISCO I. MADERO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,526,776.92

INVERSIÓN:

SUMA: 1,526,776.92

MUNICIPAL: 1,526,776.92

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.2.1
Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de
agua potable y electrificación.

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,596

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

43.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016


Chihuahua, Chih. 21 de Abril del 2016
Dependencia: Presidencial Municipal
Sección: Dirección de Desarrollo Rural
Oficio: DDR/DI/29/16

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
PRESENTE.-


Por medio del presente me permito enviar a usted para su aprobación el expediente técnico del proyecto de infraestructura y servicios básicos **"CONSTRUCCION DE POZO"** ESTACION EJIDO FRANCISCO I. MADERO con cargo al programa FISM.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

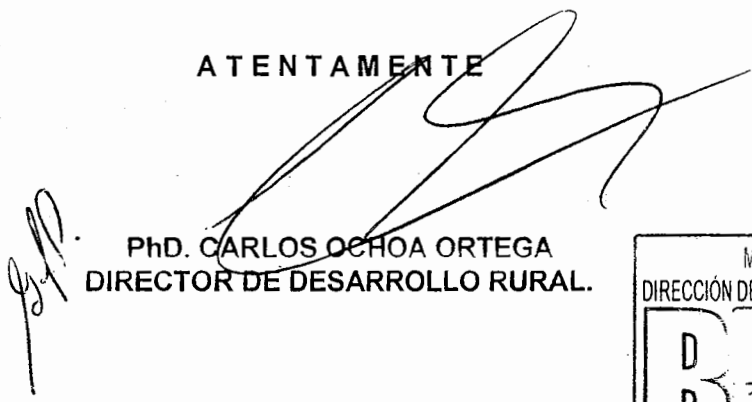
Ph.D. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.

"2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



C. 4a y Ochoa No. 3608 | Teléfono (614) 200-4800
Col. Santa Rosa | Larga Distancia
C.P. 31050 | CAOO/GFP/rgg | (614) 415-8602
Chihuahua, Chih.

www.mpiochihuahua.gob.mx



CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

FECHA : ABRIL DEL 2016

FONDO DE INVERSIÓN : FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE

II.- UBICACIÓN FRNACISCO I. MADERO

ESTADO : CHIHUAHUA

MUNICIPIO : CHIHUAHUA

LOCALIDAD : FRNACISCO I. MADERO

CABECERA MUNICIPAL : SI (X) NO ()

TIPO DE LOCALIDAD : COLONIA POPULAR () POBLADO RURAL (X) ZONA INDÍGENA ()

III.- CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

ESTATUS : NUEVA (X) PROCESO ()

TIPO DE OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCIÓN (X) AMPLIACIÓN () REHABILITACIÓN () EQUIPAMIENTO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN DIRECTA () MIXTA ()

DEPENDENCIA EJECUTORA : PRESIDENCIA MUNICIPAL

IV.- INVERSIONES

COSTO DE LA OBRA			ESTRUCTURA FINANCIERA									
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		OTROS		
INVERSIÓN						DESC.	DIRECTA		EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE
							EFECTIVO	ESPECIE				
A) COSTO TOTAL			\$1,526,776.92				\$1,526,776.92					
B) EJERCIDO ANTERIOR												
C) ESTE EJERCICIO												
D) SALDO (A - B - C)												

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	METAS		
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	%
A) META TOTAL	1	OBRA	
B) META ANTERIOR			
C) META ESTE EJERCICIO			
D) META POR EJECUTAR	1	OBRA	

BENEFICIARIOS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
43	HABITANTES	

V.- VALIDACIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA :

UNA VEZ QUE SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA DEPENDENCIA VALIDA QUE:

SI PROCEDE ()

NO PROCEDE ()

OBSERVACIONES:

Nombre y firma

VI.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA :

El proyecto de perforación de pozo de agua potable consiste en :
 perforación exploratoria a una profundidad total de 300 metros con un diametro de de 12 " y ampliado 22 Mts para
 contrademe sanitario, adomado con tubería acero de 8 X1/4" de diametro y contrademado a 30 Mts con tubería de
 acero de 14 " , con filtro de gravas, cementación sanitaria , lavado, y aforado de 72 horas con bomba de 60 HP

VII.- VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

	2.2.2.1
--	---------

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARA OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE
FRNACISCO I. MADERO

CD. CHIHUAHUA CHIH.
ABRIL 2016

CONCEPTOS DE TRABAJO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO	IMPORTE
MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION	LOTE	1	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00
INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQPO. PERFORACION	LOTE	1	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00
EXCAVACION Y RELLENO DE FOSA PARA LODOS INCLUYE CANAL DE INTERCONEXION.	LOTE	1	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
LODOS DE PERFORACION CON AGUA Y BENTONITA	M3	185	\$ 205.00	\$ 37,925.00
PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIALES				
TIPO 1	M.L.	120	\$ 1,950.00	\$ 234,000.00
TIPO 2	M.L.	100	\$ 2,050.00	\$ 205,000.00
TIPO 3	M.L.	80	\$ 2,150.00	\$ 172,000.00
REGISTRO ELECTRICO	LOTE	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
SUMINISTRO DE TUBO 8" X 1/4 ACERO LISO	M.L.	120	\$ 985.60	\$ 118,272.00
SUMINISTRO DE TUBO 8 1/4 " ACERO RANURADA NORMAL TIPO CANASTILL	M.L.	180	\$ 1,120.00	\$ 201,600.00
SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO PARA CONTRADEME DE 14" / 1/4	M.L.	30	\$ 1,460.00	\$ 43,800.00
COLOCACION DE TUBERIA DE ADEME DE 8" Y 14"	M.L.	330	\$ 85.00	\$ 28,050.00
AMPLIACION DE AGUJERO DE 12" A 22" PARA ALOJAR TUBERIA DE CONTRADEME DE 14"	M.L.	30	\$ 1,550.00	\$ 46,500.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVAS DE 1/4 A 3/16 LAVADA	M3	36	\$ 875.00	\$ 31,500.00
CEMENTACION PARA PROTECCION SANITARIA	M3	6.50	\$ 3,600.00	\$ 23,400.00
ACARREO DE AGUA	LOTE	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
LAVADO DE POZO Y PERFORACION INCLUYE APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS 200 Lts.	LOTE	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
DESARRILLO DE AFORO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA DE COMBUSTION INTERNA NCON 60 HP Y COLUMNA DE 180 Mts. POR UN LAPSO DE 24 HORAS-	LOTE	1.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00
HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE PÓZO CON BOMBA TIPO TURBINA EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS	Has.	48.00	980.00	\$ 47,040.00
ANALISIS CLINICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA	LOTE	1.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
SUB TOTAL				\$1,316,187.00
IVA				\$210,589.92
TOTAL				\$ 1,526,776.92

ING. GERARDO FERNANDEZ PEREZ

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

[illegible]

ORDENADORIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

[illegible]

**CEDULA PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

OBRA : CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE

LOCALIDAD : FRNACISCO I. MADERO

REZAGO SOCIAL (SERVICIOS)

BÁSICOS

AGUA POTABLE	NO
DRENAJE SANITARIO	NO
ELECTRIFICACIÓN	SI

COMPLEMENTARIOS

ALUMBRADO PUBLICO	SI
-------------------	----

PAVIMENTO	NO
-----------	----

NIVEL SOCIO ECONÓMICO (REZAGO SOCIAL)

INGRESO: EL INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ES MENOR AL SALARIO MINIMO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE : LAMINA, BLOCK Y ADOBE

OBJETO DE LA OBRA

LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BASICOS COMO ES EL DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE PROPORCIONA BIENESTAR A SUS HABITANTES, REFLEJADO EN EL SECTOR SALUD PRINCIPALMENTE , GENERANDO ASI UN DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS

BENEFICIARIOS

43 HABITANTE

PROCEDE :

SI

ELABORO:

Phd. CARLOS A. OCHOA ORTEGA

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

VO.BO

Ing. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO

DIRECTOR DE PLANEACION



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION

PRESUPUESTAL:

FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS		PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEF ESPECIE	BENEFICIARIOS EFECTIVO	U. DE M.	CANT		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE	FRNACISCO I. MADERO	C	IT	1527	\$ 1,526,776.92	\$ 1,526,776.92			OBRA	1	100%	05	06	1526.78
TOTAL						\$1,526,776.92	\$1,526,776.92		\$ -						

PdH. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Ing. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO FISM

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE

OBJETIVO:

LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BASICOS COMO ES EL DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE PROPORCIONA BIENESTAR A SUS HABITANTES, REFLEJADO EN EL SECTOR SALUD PRINCIPALMENTE , GENERANDO ASI UN DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS

El proyecto de perforacion de pozo de agua potable consiste en :

DESCRIPCION:

(META, UNIDAD, DETALLE POR META O UNIDAD), LOCALIZACION, BENEFICIARIOS, INVERSION (% PARTICIPACION), ESTRUCTURA FINANCIERA (FONDOS), DURACION.

Descripción:

El proyecto de perforacion de pozo de agua potable consiste en :

perforacion exploratoria a una profundidad total de 300 metros con un diametro de de 12 " y ampliado 22 Mts para contrademe sanitario, ademado con tuberia acero de 8 X1/4" de diametro y contrademado a 30 Mts con tuberia de acero de 14 " , con filtro de gravas, cementacion sanitaria , lavado, y aforado de 72 horas con bomba de 60 HP

Inversión:

1,526,776.92

Estructura Financiera:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,526,776.92

Duración:

MAYO - JUNIO 2016

**A C T A PARA FORMACION
DE COMITE FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR EN LA COMUNIDAD"
Francisco I. Madero, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SIENDO LAS 13 HORAS DEL DIA 6 DE Marzo DEL 2016, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA Escuela LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. GERARDO FERNANDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARÁN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

O R D E N D E L D I A

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL COMO OPERADOR.
- 3.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR** Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASÍ COMO OBSERVANCIA Y APEGO ERICTO A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



COMISARIO DE POLICÍA
EJIDO FRANCISCO I. MADERO

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 1.- SE LEVANTÓ LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE _____ PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACIÓN DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES. FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO No. 1.
- 2.- EN USO DE LA PALABRA EL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TÉCNICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA , SE PROCEDIÓ A SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN DE QUE LOS APOYOS DEL DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2016 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMÁS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LO QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASIMISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Reposicion de pago Agua Potable	obra	1
Construccion de Carretera Francisco I. Madero al Jardin	obra	1



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

COMISARIO DE POLICIA
EJIDO FRANCISCO I. MADERO

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "pozo agua potable" OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEÍSTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR MAYORÍA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Rafael Murga Lozoya
SECRETARIO: Arnulfo Araya Casillas
TESORERO: Rafael G. Villarreal
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: Roman Vazquez
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: Jose P. Orozco

LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL SERAN RESPONSABLES DE SUPERVISAR LAS ACCIONES Y TRABAJOS A EJECUTAR POR LOS BENEFICIARIOS. EL RESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ PRO-PROYECTO, QUEDA FACULTADO LEGALMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA Y A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS, REALICEN LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS APOYOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO COMO PARA QUE INTEGREN Y SUSCRIBAN LA DOCUMENTACIÓN QUE PARA TALES EFECTOS SE REQUIERA.

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:
- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECADANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MISMO.
 - c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACIÓN DE SU SOLICITUD.



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION.

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION**; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACION.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; Y HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NÓMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y Estrictamente NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION** Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES,ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM .

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIÉN ACUERDAN APEGARSE Estrictamente A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRÁN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIADOS.



COMISARIO DE POLICÍA
EJIDO FRANCISCO J. MADERO

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "pozo agua potable" 2016,


- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 15 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON. DAMOS FE. -----

COMITÉ PRO - PRO Y E C T O

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. _____



C. Arnulfo Araujo Casillas

TESORERO

C. Raúl G. Olivas

CONTRALORIA SOCIAL

PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL

C. _____

C. José P. Orozco

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR

POR EL MUNICIPIO

C. _____

C. _____



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

COMISARIO DE POLICIA
EJIDO FRANCISCO I. MADERO

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE
Francisco I. Madero MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
 EL DIA 13 DE Marzo DEL 2016.

NOMBRE
Rafael Murga Lozoya
Arnulfo Araujo Casillas
Raúl B. Olivas C
Roman Vizcarra Chetec
JOSÉ P. OSORCOCH
Roberto Ortiz Gonzales
David Olivas Aguirre L
Margarita Lozoya C
Rafael Ortega C
Salomon Murga
Adolfo O. Murga P
Guillermo Murga Palacios
J. HERIBERTO AGUILAR M.
Pedro Luis Murga Frescas
Andrés Lozoya Ortiz
Luz Elena de la Cruz R
Amalia Cruzado
Mayra Lourdes Murga
Armando Murga

FIRMA

Arnulfo Araujo C.
Raúl B. Olivas C
Roman Vizcarra Chetec
JOSÉ P. OSORCOCH
Roberto Ortiz Gonzales
David Olivas Aguirre L
Margarita Lozoya C
Rafael Ortega C
Salomon Murga
Adolfo O. Murga P
Guillermo Murga Palacios
J. HERIBERTO AGUILAR M.
Pedro Luis Murga Frescas
Andrés Lozoya Ortiz
Luz Elena de la Cruz R
Amalia Cruzado
Mayra Lourdes Murga
Armando Murga



EL C. _____ EN SU CARÁCTER DE
 _____ DEL EJIDO O LOCALIDAD DE _____ DA FÉ
 DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD
 EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA
 COMISARIO DE POLICIA
 EJIDO FRANCISCO I. MADERO

Chihuahua chih. A 2 DE Marzo DEL 2016

PHD. CARLOS OCHOA ORTEGA

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS SU APOYO PARA QUE SE TOME EN CUENTA
A LA COMUNIDAD
DE Francisco I. Madero PARA QUE SEA
INCLUIDA DENTRO DE UN PROGRAMA DE
Perforacion de Pozo para Agua Potable

DE ANTEMANO LE DAMOS LAS GRACIAS POR LA ATENCION BRINDADA A NUESTRA SOLICITUD.

ATENTAMENTE

Rafael Morsca

COMISARIO DE POLICIA
EJIDO FRANCISCO I. MADERO


03 DE ABRIL DEL 2016

ING. JAVIER GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Por medio de la presente me permito pasar un cordial saludo y hacer de su conocimiento que el Ejido Francisco I. Madero sede la superficie de terreno 10 m x 10 m al comité de agua del Ejido en mención, para la perforación de un pozo para abastecimiento de uso público urbano en la localidad de Francisco I. Madero (Calabacillas) Municipio de Chihuahua con las siguientes coordenadas:
28° 45' 53.29" Longitud 106° 18' 39.92".

Sin otro asunto.

ATENTAMENTE



PASCUAL OROZCO CH.

JESUS PASCUAL OROZCO MURGA

COMISARIADO EJIDAL
Francisco I. Madero
Municipalidad de Chihuahua

Roman Vizcarra CH.

SECRETARIO
ROMAN VIZCARRA CHAVEZ

Jorge Armando Zermeno

TESORERO
JORGE ARMANDO ZERMEÑO

ANUEVO MALCA

28°51'49"N

106°20'38"O

CALABAZILLAS

28°45'53.29"N

106°18'39.92"O

Sacramento

Rio del Alameda - Chiriquito

Francisco Villa

Pisto
