



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

EXP: 0343/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS." EJIDO LA HACIENDITA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					93.12	93,117.50	93,117.50								93,117.50
TOTAL						\$ 93,117.50	\$ 93,117.50	\$	\$						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0343/16
FECHA: 11-may-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS." EJIDO LA HACIENDITA.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 93,117.50

INVERSIÓN:

SUMA: 93,117.50

MUNICIPAL: 93,117.50

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 281

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

04.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

Chihuahua, Chih. 6 de Mayo del 2016
Dependencia: Presidencial Municipal
Sección: Dirección de Desarrollo Rural
Oficio: DDR/DI/051/16

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito enviar a usted para su aprobación el expediente técnico del proyecto de infraestructura y servicios básicos **"CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 EJIDO LA HACIENDITA"** con cargo al programa FISM.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PhD. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.

"2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

C. 4a y Ochoa No. 3608
Col. Santa Rosa
C.P. 31050
Chihuahua, Chih. ADO/GFP/rsg.

Teléfono (614) 200-4800
Larga Distancia
(614) 415-8602

www.mpiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO

FECHA : MAYO DEL 2016

FONDO DE INVERSIÓN :

FISM

I.- IDENTIFICACION DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

ESTADO : CHIHUAHUA

MUNICIPIO : CHIHUAHUA

LOCALIDAD : EJIDO LA HACIENDITA

NO DE AGEB en caso de ser en zona urbana

II.- CARACTERISTICAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

ESTATUS : NUEVA (X)

PROCESO ()

TIPO DE OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCION (X) AMPLIACION () REHABILITACION () EQUIPAM. ()

MEJORAMIENTO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN :

CONTRATO (X)

ADMINISTRACION DIRECTA ()

DEPENDENCIA EJECUTORA :

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

III.- INVERSIONES

INVERSION	ESTRUCTURA FINANCIERA								
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	DESC.	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		OTROS	
					DIRECCION	ELECTIVO	ESPECIE	ELECTIVO	ESPECIE
A) COSTO TOTAL	\$93,117.50				\$93,117.50				
B) EJERCIDO ANTERIOR	\$0.00								
C) ESTE EJERCICIO	\$0.00								
D) SALDO (A - B - C)	\$0.00								

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	METAS			HOMBRES	MUJERES	POB. INDÍGENA	VIVIENDAS BENEF.
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	%				
A) META TOTAL	1	OBRA	100				
B) META ANTERIOR							
C) META ESTE EJERCICIO							
D) META POR EJECUTAR	1	OBRA	100				
META DE BENEFICIARIOS	1	OBRA		2	2		1

V.- VALIDACION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA :

UNA VEZ QUE SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA DEPENDENCIA _____ VALIDA QUE:

SI PROCEDE () NO PROCEDE ()

OBSERVACIONES:

Nombre y firma _____

VI.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA :

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS COMPLETOS DE 4X6 MTS. A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS;
EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., PISO DE CONCRETO F''=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, MUROS DE BLOCK DE 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., PUERTAS, VENTANAS ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

VII.- VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.2.2.3

No	Datos del solicitante (nombre, telefono, etc)	Georeferenciacion	Comunidad	Prioridad			Validado			Observaciones
				1	2	3	Cuarto	Cuarto Completo	Baño	
1	MARIA DEL CARMEN AGUIRRE GALVAN	N 28° 38' 02", V 108° 11' 03"	60.-EJIDO LA HACIENDITA					1	1	SI JUSTIFICA; VIVE EN CASA PRESTADA Y EN MALAS CONDICIONES. (FALTA CARTA DE TERRENO)
2	LORETTA RUIZ CORRAL	N 28° 38' 14", V 108° 11' 19"	60.-EJIDO LA HACIENDITA							NO JUSTIFICA; TIENE VIVIENDA EN BUENAS CONDICIONES Y CON ESPACIOS SUFICIENTE, SEGUN
3										
4										
TOTAL							0	1	1	

Nota: Esta validacion fue realizada por el Ing. Gallegos y macario el 07/09/2015 y se complementa con la georeferenciacion.

Cuartos Completos

1

Baños

1

Cuartos Adozados

0



FISM
PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS

LOCALIDAD

EJIDO LA HACIENDITA

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	LU	TOTAL	NO. DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO							
1	Limpieza de Terreno, Incluye: Deshierbe y Acarreo a 20 Mts., La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	63.00	\$8.52	\$536.76	1	\$536.76
2	Trazo y Nivelacion del terreno. (Area de Edificios)	M2	28.06	\$8.52	\$239.07	1	\$239.07
3	Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, Incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagan Sobre Anchos)	M3	8.96	\$135.00	\$1,209.60	1	\$1,209.60
4	Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2, T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor, Incluye:El Suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.36	\$108.80	\$1,344.77	1	\$1,344.77
5	Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O., de 0.60 x 0.15 mts.Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms., f'y=200 kg/cvm2, en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 dias, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecucion	ML	20.60	\$354.97	\$7,312.38	1	\$7,312.38
6	Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	10.98	\$242.11	\$2,658.37	1	\$2,658.37
7	Murete de enrase en cimentacion de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm2.H.en O., TMA 3/4"(19 mm), incluye:los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..	M2	11.75	\$342.96	\$4,029.78	1	\$4,029.78
8	Dala desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	19.00	\$162.74	\$3,092.06	1	\$3,092.06
9	Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm.de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas frias con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Nota: a).-El Piso debera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b).- Considerar en la nivelacion del piso, altura de la puerta de acceso mas las tolerancia entre la parte baja de la puerta y el piso	M2	25.04	\$281.94	\$7,059.78	1	\$7,059.78
SUBTOTAL						1	\$27,482.57

ALBAÑILERIA

10	Castillo de Concreto f'c=200 hg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	28.00	\$176.71	\$4,947.88	1	\$4,947.88
11	Muros de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3. incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	50.52	\$291.61	\$14,732.14	1	\$14,732.14
12	Dala de cerramiento de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	19.00	\$170.16	\$3,233.04	1	\$3,233.04
13	Enjarre exterior a base de stuko color blanco con previa preparacion de superficie donde se aplica incluye; plomo, perfiles, y todo lo necesario para su correcta ejecucion (Enjarre del rodapie debe ser aplanado con rayado vertical)	M2	52.49	\$70.00	\$3,674.30	1	\$3,674.30
14	Aplanado de Yeso en Muros y Plafones (losa) interiores, acabado regleado y con lina Metálica, incluye:El suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de excedentes de concreto, recortes, acarreos, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	76.49	\$81.00	\$6,195.69	1	\$6,195.69
15	Banqueta en la parte exterior del cuarto con una dimension de .60 de ancho y .12 de grosor incluye; nivelacion, compactacion, piso de concreto f'c=150 kg/cm2. Acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	20.60	\$105.00	\$2,163.00	1	\$2,163.00
16	Suministro y colocacion de puerta tipo Multipanel estampada de 2.03 X .90 mts. Incluye: Marco (M-525 prolapsa cal. 20, armado y soldado), 2 bisabrazas, chapas de cerradura cilindrica y cerraja phillips o similar en calidad y todo lo necesario para su correctp funcionamiento.	PIEZA	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	1	\$1,517.04
17	Suministro y colocacion de ventana metalica de 1.50 X 1.00 cms. Inc; Vidrio de 3 mm, portavidrio, sello de silicon, mosquetero, reja y pintura anticorrosiva y pintura de esmalte.	PIEZA	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	1	\$1,517.04
18	Repison de 5 a 7 cm de espesor y 15 cm de ancho, a base de concreto f'c=100 kg/cm2 H. En O., acabado pulido, incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, Cimbra común y Descimbrado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos. (BAJO VENTANA DE 1.50 X 1.0 MTS.)	ML	1.50	\$59.60	\$89.40	1	\$89.40
19	Placa alusiva al programa	PIEZA	1.00	\$300.00	\$300.00	1	\$300.00
SUBTOTAL						1	\$38,823.49

TECHUMBRE

20	Enrase a base de concreto F'c=50 KG/CM2 altura promedio de 11 cms. Incluye trazo, cimbra, preparacion, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ML	19.4	\$61.82	\$1,199.31	1	\$1,199.31
21	Losa de cubierta de 12 cm. de espesor aligerada con caseton de poliestileno expandido de 40x40x7 cm. Con concreto Premezclado y/o echo en obra f'c=200 kg/cm2. de 12 cm. armada con 2 varillas de acero #3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye; cimbrado, descimbrado, Habilitado de Acero, Bastones, Colado y Curado del Concreto con Curafest Rojo de Fester o Similar en Calidad.	M2	28.44	\$577.50	\$16,424.10	1	\$16,424.10
22	Sobre armado para trabe rectangular integral plana de 40 X 12 cms. Colocada al centro del claro largo de 6 mts. Armada con acero Fq= 4,200 KG/CM2 con 7 varillas 3/8" y estribos de 1/4 a 20 cms que incluye: traslapes, cruces, desperdicios, alambre recocido, habilitado del armado, elevacion y colocacion.	ML	4.30	\$198.00	\$851.40	1	\$851.40
23	Pretil de dos hiladas de Ladrillo Adobon de 6 X 12 X 24 cm. asentado con Mortero Cemento-Arena, aplanado con mortero Cemento-Arena 1:3 y Chafan de Mortero, incluye: El Suministro de los Materiales, sus desperdicios y su elevacion a la azotea, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y operacion.	ML	6.70	\$150.00	\$1,005.00	1	\$1,005.00
24	Impermeabilizacion a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicacion, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparacion de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.	M2	28.44	\$131.40	\$3,737.02	1	\$3,737.02
25	Impermeabilizacion de pretil a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicacion, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparacion de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.	M2	1.88	\$65.70	\$123.52	1	\$123.52
SUBTOTAL						1	\$23,340.34

INSTALACION ELECTRICA

26	Salida de Centro con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TW , calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.	SALIDA	3.00	\$370.69	\$1,112.07	1	\$1,112.07
27	Salida para apagador sencillo con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	SALIDA	1.00	\$370.69	\$370.69	1	\$370.69
28	Salida para apagador doble con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	SALIDA	1.00	\$390.73	\$390.73	1	\$390.73
29	Salida para contacto doble con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	SALIDA	3.00	\$400.54	\$1,201.62	1	\$1,201.62
SUBTOTAL						1	\$3,075.11

LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA

30	Limpieza de Pisos de Concreto, Mosaico de pasta, Ceramica, Etc., con Cepillo, Agua y Acido Clorhidrico.	M2	24	\$11.00	\$264.00	1	\$264.00
31	Limpieza de Vidrios y Tabletas por ambas caras. (Con Agua y Jabon)	M2	2	\$10.00	\$15.00	1	\$15.00
32	Limpieza gruesa en el exterior.	M2	9	\$13.00	\$117.00	1	\$117.00
SUBTOTAL						1	\$396.00

ELABORO

ANDRES DUARTE CHAVIRA

TOTAL

1

\$93,117.50



CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

[illegible]

**CEDULA PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN EL PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRA : CONSTRUCCION DE CUÁRTO COMPLETO DE 4X6.

LOCALIDAD : EJIDO LA HACIENDITA

REZAGO SOCIAL (SERVICIOS)

BÁSICOS

AGUA POTABLE	SI
DRENAJE SANITARIO	NO
ELECTRIFICACIÓN	SI

COMPLEMENTARIOS

ALUMBRADO PUBLICO	SI
PAVIMENTO	NO

NIVEL SOCIO ECONÓMICO (REZAGO SOCIAL)

INGRESO: EL INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ES MENOR AL SALARIO MINIMO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE : LAMINA, BLOCK Y ADOBE

OBJETO DE LA OBRA

PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL AL PROPORCIONAR CUARTOS LOS CUALES SE CONVERTIRAN EN UN ESPACIO DIGNO QUE IMPACTARA POSITIVAMENTE EN SU CALIDAD DE VIDA, Y LO MAS IMPORTANTE EN CUESTION DE SALUD TENDRAN BENEFICIOS DIRECTOS YA QUE TENDRAN UN AREA DE CONFORT EN TIEMPOS DONDE LOS CLIMAS SON MUY EXTREMOS.

BENEFICIARIOS

4 HABITANTE

PROCEDE : SI

ELABORO:

VO.BO

PhD. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

NO. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EXEC	AFILIACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS		PRECIOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2016	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT.		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.	EJIDO LA HACIENDITA	C	IT	93.12	\$ 93,117.50	\$ 93,117.50			OBRA	1	100%	06	06	93.12
TOTAL						\$ 93,117.50	\$ 93,117.50								

Rdb. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO FISM

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

OBJETIVO:

PROPORCIONAR INFRAESTRUCURA SOCIAL EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL AL PROPORCIONAR CUARTOS, LOS CUALES SE CONVERTIRAN EN UN ESPACIO DIGNO QUE IMPACTARA POSITIVAMENTE EN SU CALIDAD DE VIDA, Y LO MAS IMPORTANTE EN CUESTION DE SALUD TENDRAN BENEFICIOS DIRECTOS YA QUE TENDRAN UN AREA DE CONFORT EN TIEMPOS DONDE LOS CLIMAS SON MUY EXTREMOS.

DESCRIPCION:

(META, UNIDAD, DETALLE POR META O UNIDAD), LOCALIZACIÓN, BENEFICIARIOS, INVERSION (% PARTICIPACION), ESTRUCTURA FINANCIERA (FONDOS), DURACION.

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS COMPLETOS DE 4X6 MTS. A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS; EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO $F'C=100\text{KG}/\text{CM}^2$, ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., PISO DE CONCRETO $F'C=150\text{KG}/\text{CM}^2$ DE 10CMS DE ESPESOR, MUROS DE BLOCK DE 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., PUERTAS, VENTANAS ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO $F'C=200\text{KG}/\text{CM}^2$ CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

Inversión:

93,117.50



Estructura Financiera:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

93,117.50

Duración:

JUNIO 2016

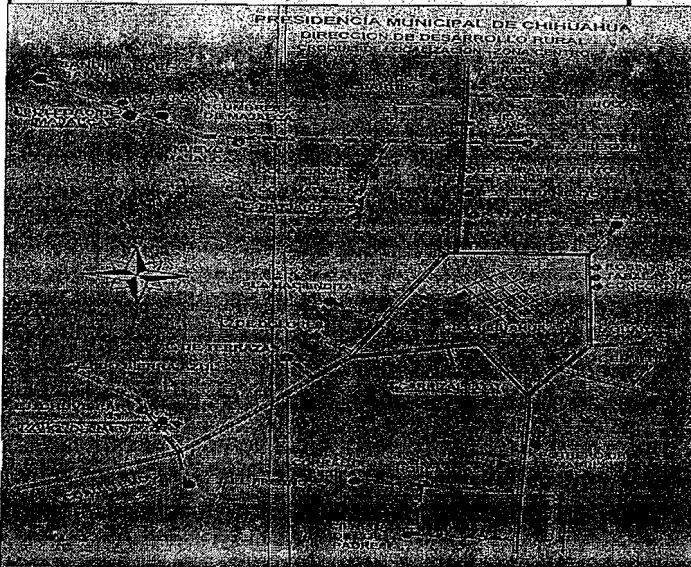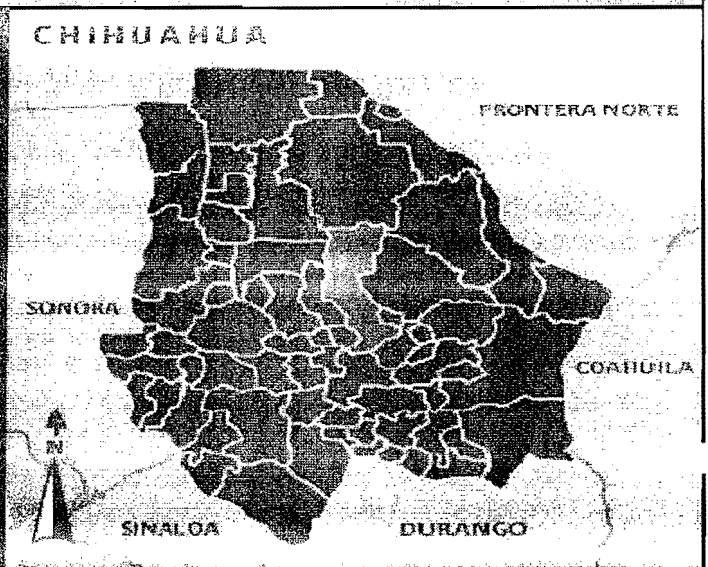OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.**MAPA DE LA LOCALIDAD****MAPA DEL MUNICIPIO****MAPA DE LA UBICACION ESPECIFICA****DESCRIPCION DE LA UBICACION**

ESTADO : CHIHUAHUA
MUNICIPIO : CHIHUAHUA
LOCALIDAD : EJIDO LA HACIENDITA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

Georeferenciacion:

Localidad:



EJIDO LA HACIENDITA

Municipio: Chihuahua 019

N 28 38' 02", W 106 11' 03"

NOMBRE:

MARIA DEL CARMEN AGUIRRE GALVAN



**A C T A PARA FORMACION
DE COMITE FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR EN LA COMUNIDAD"
Elido LA Haciendita, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE Abril DEL 2016, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA La Escuela LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. GERARDO FERNANDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARÁN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

O R D E N D E L D I A

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL COMO OPERADOR.
- 3.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR** Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASÍ COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 1.- SE LEVANTÓ LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE _____ PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACIÓN DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO No. 1.
- 2.- EN USO DE LA PALABRA EL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TÉCNICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA , SE PROCEDIÓ A SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN DE QUE LOS APOYOS DEL DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2016 **OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR** GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMÁS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LO QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASIMISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Construccion de vivienda	Obra	2



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

COMITÉ DE FISCALIZACIÓN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "----- OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION**; Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEÍSTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR MAYORÍA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Guadalupe Albina Chave
SECRETARIO: Maria del Carmen Aguirre
TESORERO: ELSA AGUIRRE GALVAN
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: _____
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: _____

**AYUNTAMIENTO
ERHUAHUA
2013-2014**
**COMISARIO DE POLICIA
EJIDO LA HACIENDA**

LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL SERAN RESPONSABLES DE SUPERVISAR LAS ACCIONES Y TRABAJOS A EJECUTAR POR LOS BENEFICIARIOS. EL RESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ PRO-PROYECTO, QUEDA FACULTADO LEGALMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA Y A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS, REALICEN LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS APOYOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO COMO PARA QUE INTEGREN Y SUSCRIBAN LA DOCUMENTACIÓN QUE PARA TALES EFECTOS SE REQUIERA.

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:
- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MISMO.
 - c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACIÓN DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION.

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACION.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; Y HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NÓMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRUCTAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIÉN ACUERDAN APEGARSE ESTRUCTAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRÁN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIADOS.



COMISARIO DE EJIDOS
EJIDO LA NACIÓN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: " _____ 2016,

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS _____ HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON. DAMOS FE. -----

COMITÉ PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

SECRETARIO

c. Guadalupe Albina Chavez Torres c. Carmen Aguirre Galvan
TESORERO

c. EISA AGUIRRE GALVAN

CONTRALORIA SOCIAL

PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL

c. Denisse Aguirre Galvan
Denisse Aguirre

c. Ma Edwiges Ruiz

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR

POR EL MUNICIPIO

c. X

c. X



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

COMISARIO DE POLICIA

RELACIÓN DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL DIA _____ DE _____ DEL 2016.

NOMBRE
Ramona Aguirre
Julian Olivas P
Rosa M^{te} T. de MTZ
Eduardo Miquel C
Rosa Ema Berrera F
Ramon Barroza Regalado
Trinidad Aguirre Galvan
Blanca Estela Delgado Corral
Ramon Barroza Berrera
JOSE ANTONIO Aguirre G
ROSA MARIA BARRAZA BERRERA
Hilario Aguirre Galvan
Martha Elena Aguirre Galvan

FIRMA
RAMONA AGUIRRE
Julian Olivas P
Rosa M^{te} T de MTZ
Eduardo Miquel C
Rosa Ema Berrera F
Ramon Barroza
Trinidad Aguirre G
Blanca Delgado C.
Ramon Barroza B
JOSE ANTONIO Aguirre G
ROSA MARIA BARRAZA B
Hilario Aguirre G
Martha Elena A G



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015-2016

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. _____

COMISARIO DE POLICIA

DEL EJIDO O LOCALIDAD DE La Hacienda DE FE
DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD
EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

Chihuahua, Chih. 6 de Mayo del 2016
Dependencia: Presidencial Municipal
Sección: Dirección de Desarrollo Rural
Oficio: DDR/DI/051/16

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito enviar a usted para su aprobación el expediente técnico del proyecto de infraestructura y servicios básicos **"CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 EJIDO LA HACIENDITA"** con cargo al programa FISM.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PhD. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.

"2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

C. 4a y Ochoa No. 3608
Cen. Santa Rosa
C.P. 31050
Chihuahua, CGA00/GFP/r/g.

Teléfono (614) 200-4800
Línea Directa
(614) 415-8602

www.mpiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO

FECHA : MAYO DEL 2016

FONDO DE INVERSIÓN :

FISM

I.- IDENTIFICACION DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

ESTADO : CHIHUAHUA

MUNICIPIO : CHIHUAHUA

LOCALIDAD : EJIDO LA HACIENDITA

NO. DE AGEB: en caso de ser en zona urbana

II.- CARACTERISTICAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

ESTATUS : NUEVA (X)

PROCESO ()

TIPO DE OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCION (X) AMPLIACION () REHABILITACION () EQUIPAM. ()

MEJORAMIENTO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN :

CONTRATO (X)

ADMINISTRACION DIRECTA ()

DEPENDENCIA EJECUTORA :

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

III.- INVERSIONES

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	DESC.	ESTRUCTURA FINANCIERA					
					MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		OTROS	
					DIRECTA		EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE
					EFECTIVO	ESPECIE				
A) COSTO TOTAL	\$93,117.50				\$93,117.50					
B) EJERCIDO ANTERIOR	\$0.00									
C) ESTE EJERCICIO	\$0.00									
D) SALDO (A - B - C)	\$0.00									

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	METAS			HOMBRES	MUJERES	POB. INDÍGENA	VIVIENDAS BENEF.
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	%				
A) META TOTAL	1	OBRA	100				
B) META ANTERIOR							
C) META ESTE EJERCICIO							
D) META POR EJECUTAR	1	OBRA	100				
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA					
META DE BENEFICIARIOS	1	OBRA		2	2		1

V.- VALIDACION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA :

UNA VEZ QUE SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA DEPENDENCIA _____ VALIDA QUE:

SI PROCEDE () NO PROCEDE ()

OBSERVACIONES:

Nombre y firma _____

VI.- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA :

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS COMPLETOS DE 4X6 MTS. A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS:
 EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS CON PROFUNDIDAD VARIABLE. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., PISO DE CONCRETO F'=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR MUROS DE BLOCK DE 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., PUERTAS, VENTANAS ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

VII.- VINCULACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCIÓN):

1.2.2.3

No	Datos del solicitante (nombre, telefono, etc)	Georeferenciacion	Comunidad	Prioridad			Validado			Observaciones
				1	2	3	Cuarto	Cuarto Completo	Baño	
1	MARIA DEL CARMEN AGUIRRE GALVAN	N 28° 38' 02", W 106° 11' 03"	60.-EJIDO LA HACIENDITA					1	1	SI JUSTIFICA; VIVE EN CASA PRESTADA Y EN MALAS CONDICIONES. (FALTA CARTA DE TERRENO)
2	LORENA RUIZ CORRAL	N 28° 38' 14", W 106° 11' 19"	60.-EJIDO LA HACIENDITA							NO JUSTIFICA; TIENE VIVIENDA EN BUENAS CONDICIONES Y CON ESPACIOS SUFICIENTE. SEGUN
3										
4										
TOTAL							0	1	1	

Nota: esta validacion fue realizada por el Ing. Gallegos y Macario el 07/09/2015 y se complementa con la georeferenciacion.

Cuartos Completos

1

Baños

1

Cuartos Adozados

0



**FISM
PRESUPUESTO DE OBRA**

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS				LOCALIDAD		EJIDO LA HACIENDITA	
---	--	--	--	------------------	--	----------------------------	--

DESCRIPCION				UNIDAD	CANTIDAD	U.P.	TOTAL	Nº DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO									
1	Limpieza de Terreno, Incluye: Deshierbe y Acarreo a 20 Mts. , La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.			M2	63.00	\$8.52	\$536.76	1	\$536.76
2	Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)			M2	28.06	\$8.52	\$239.07	1	\$239.07
3	Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, Incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagarán Sobre Anchos)			M3	8.96	\$135.00	\$1,209.60	1	\$1,209.60
4	Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2., T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor, Incluye:El Suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			M2	12.36	\$108.80	\$1,344.77	1	\$1,344.77
5	Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. ,de 0.60 x 0.15 mts.Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms., f'y=200 kg/cm2. , en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecución			ML	20.60	\$354.97	\$7,312.38	1	\$7,312.38
6	Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm. , incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.			M3	10.98	\$242.11	\$2,658.37	1	\$2,658.37
7	Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm.H.en O., TMA 3/4" (19 mm), incluye:los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..			M2	11.75	\$342.96	\$4,029.78	1	\$4,029.78
8	Dala desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O. , de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución			ML	19.00	\$162.74	\$3,092.06	1	\$3,092.06
9	Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm.de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas frías con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: a).- El Piso deberá colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b).- Considerar en la nivelación del piso, altura de la puerta de acceso mas las tolerancia entre la parte baja de la puerta y el piso			M2	25.04	\$281.94	\$7,059.78	1	\$7,059.78
SUBTOTAL								1	\$27,482.57

ALBAÑILERIA

10	Castillo de Concreto Fc=200 hg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	28.00	\$176.71	\$4,947.88	1	\$4,947.88
11	Muros de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.52	\$291.61	\$14,732.14	1	\$14,732.14
12	Dala de cerramiento de Concreto Fc=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x15x4), incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	19.00	\$170.16	\$3,233.04	1	\$3,233.04
13	Enjarre exterior a base de stuko color blanco con previa preparación de superficie donde se aplica incluye: plomo, perfiles, y todo lo necesario para su correcta ejecución (Enjarre del rodapie debe ser aplanado con rayado vertical)	M2	52.49	\$70.00	\$3,674.30	1	\$3,674.30
14	Aplanado de Yeso en Muros y Plafones (losa) interiores, acabado regleado y con Ilana Metálica, incluye:El suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de excedentes de concreto, recortes, acarreo, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	76.49	\$81.00	\$6,195.69	1	\$6,195.69
15	Banqueta en la parte exterior del cuarto con una dimension de .60 de ancho y .12 de grosor incluye: nivelación, compactación, piso de concreto Fc=150 kg/cm2. Acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20.60	\$105.00	\$2,163.00	1	\$2,163.00
16	Suministro y colocación de puerta tipo Multipanel estampada de 2'03" X 90 mts. Incluye: Marco (M-525 protapsa cal 20 armado y soldado), 2 bisagras, chapas de cerradura cilíndrica y cerrojo philips o similar en calidad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PIEZA	1.00	\$1,791.08	\$1,971.00	1	\$1,971.00
17	Suministro y colocación de ventana metálica de 1.50' X 1.00 cms. Inc; Vidrio de 3 mm, portavidrio, sello de silicon, mosquitero, reja y pintura anticorrosiva y pintura de esmalte.	PIEZA	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	1	\$1,517.04
18	Repiso de 5 a 7 cm de espesor y 15 cm de ancho, a base de concreto Fc=100 kg/cm2 H. En O., acabado pulido, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, Cimbra común y Descimbrado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. (BAJO VENTANA DE 1.50 X 1.0 MTS.)	ML	1.50	\$59.60	\$89.40	1	\$89.40
19	Placa alusiva al programa	PIEZA	1.00	\$300.00	\$300.00	1	\$300.00
			SUBTOTAL			1	\$38,823.49

TECHUMBRE

20	Enrase a base de concreto F'c=50 KG/CM2 altura promedio de 11 cms incluye trazo, cimbra, preparacion, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ML	19.4	\$61.82	\$1,199.31	1	\$1,199.31
21	Losa de cubierta de 12 cm. de espesor aligerada con caseton de poliestileno expandido de 40x40x7 cm. Con concreto Premezclado y/o echo en obra f'c=200 kg/cm2. de 12 cm. armada con 2 varillas de acero #3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye; cimbrado, descimbrado, Habilitado de Acero, Bastones, Colado y Curado del Concreto con Curafest Rojo de Fester o Similar en Calidad.	M2	28.44	\$577.50	\$16,424.10	1	\$16,424.10
22	Sobre armado para trabe rectangular integral plana de 40 X 12 cms. Colocada al centro del claro largo de 6 mts. Armada con acero Fq= 4,200 KG/CM2 con 7 varillas 3/8" y estribos de 1/4 a 20 cms que incluye: traslapes, cruces, desperdicios, alambre recocido, habilitado del armado, elevacion y colocacion.	ML	4.30	\$198.00	\$851.40	1	\$851.40
23	Pretil de dos hiladas de Ladrillo Adobon de 6 X 12 X 24 cm. asentado con Mortero Cemento-Arena, aplanado con mortero Cemento-Arena 1:3 y Chafan de Mortero, incluye: El Suministro de los Materiales, sus desperdicios y su elevacion a la azotea, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y operacion.	ML	6.70	\$150.00	\$1,005.00	1	\$1,005.00
24	Impermeabilizacion a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicacion, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparacion de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.	M2	28.44	\$131.40	\$3,737.02	1	\$3,737.02
25	Impermeabilizacion de pretil a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicacion, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparacion de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.	M2	1.88	\$65.70	\$123.52	1	\$123.52
SUBTOTAL						1	\$23,340.34

INSTALACION ELECTRICA

26	Salida de Centro con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TW, calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.	SAIDA	3.00	\$370.69	\$1,112.07	1	\$1,112.07
27	Salida para apagador sencillo con caja Galvanizada de 2"x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	SAIDA	1.00	\$370.69	\$370.69	1	\$370.69
28	Salida para apagador doble con caja Galvanizada de 2"x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	SAIDA	1.00	\$390.73	\$390.73	1	\$390.73
29	Salida para contacto doble con caja Galvanizada de 2"x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	SAIDA	3.00	\$400.54	\$1,201.62	1	\$1,201.62
SUBTOTAL						1	\$3,075.11

LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA

30	Limpieza de Pisos de Concreto, Mosaico de pasta, Ceramica, Etc., con Cepillo, Agua y Acido Clorhidrico.	M2	24	\$11.00	\$264.00	1	\$264.00
31	Limpieza de Vidrios y Tabletas por ambas caras. (Con Agua y Jabon)	M2	2	\$10.00	\$15.00	1	\$15.00
32	Limpieza gruesa en el exterior.	M2	9	\$13.00	\$117.00	1	\$117.00
SUBTOTAL						1	\$396.00

ELABORO
ANDRES DUARTE CHAVIRA

TOTAL 1 \$93,117.50

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

FISM

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

[illegible]

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

[illegible]

**CEDULA PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN EL PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

LOCALIDAD : EJIDO LA HACIENDITA

REZAGO SOCIAL (SERVICIOS)

BÁSICOS

AGUA POTABLE	SI
DRENAJE SANITARIO	NO
ELECTRIFICACIÓN	SI

COMPLEMENTARIOS

ALUMBRADO PUBLICO	SI
-------------------	----

PAVIMENTO	NO
-----------	----

NIVEL SOCIO ECONÓMICO (REZAGO SOCIAL)

INGRESO: EL INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ES MENOR AL SALARIO MINIMO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE : LAMINA, BLOCK Y ADOBE

OBJETO DE LA OBRA

PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL AL PROPORCIONAR CUARTOS LOS CUALES SE CONVERTIRAN EN UN ESPACIO DIGNO QUE IMPACTARA POSITIVAMENTE EN SU CALIDAD DE VIDA, Y LO MAS IMPORTANTE EN CUESTION DE SALUD TENDRAN BENEFICIOS DIRECTOS YA QUE TENDRAN UN AREA DE CONFORT EN TIEMPOS DONDE LOS CLIMAS SON MUY EXTREMOS.

BENEFICIARIOS

4 HABITANTE

PROCEDE : SI

ELABORO:

VO.BO

PhD. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA AFECTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS		PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2016	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DEM.	CANT.		INIC. (MES)	FIN. (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.	EJIDO LA HACIENDITA	C	IT	93.12	\$ 93,117.50	\$ 93,117.50			OBRA	1	100%	06	06	93.12
TOTAL						\$ 93,117.50	\$ 93,117.50								


Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO FISM

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

OBJETIVO:

PROPORCIONAR INFRAESTRUCURA SOCIAL EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL AL PROPORCIONAR CUARTOS, LOS CUALES SE CONVERTIRAN EN UN ESPACIO DIGNO QUE IMPACTARA POSITIVAMENTE EN SU CALIDAD DE VIDA, Y LO MAS IMPORTANTE EN CUESTION DE SALUD TENDRAN BENEFICIOS DIRECTOS YA QUE TENDRAN UN AREA DE CONFORT EN TIEMPOS DONDE LOS CLIMAS SON MUY EXTREMOS.

DESCRIPCION:

(META, UNIDAD, DETALLE POR META O UNIDAD), LOCALIZACION, BENEFICIARIOS, INVERSION (% PARTICIPACION), ESTRUCTURA FINANCIERA (FONDOS), DURACION.

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS COMPLETOS DE 4X6 MTS. A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS; EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., PISO DE CONCRETO F''=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, MUROS DE BLOCK DE 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., PUERTAS, VENTANAS ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

Inversión:

93,117.50

Estructura Financiera:

PRESIDENCIA MUNICIPAL


93,117.50

Duración:


JUNIO 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

MAPA DE LA LOCALIDAD

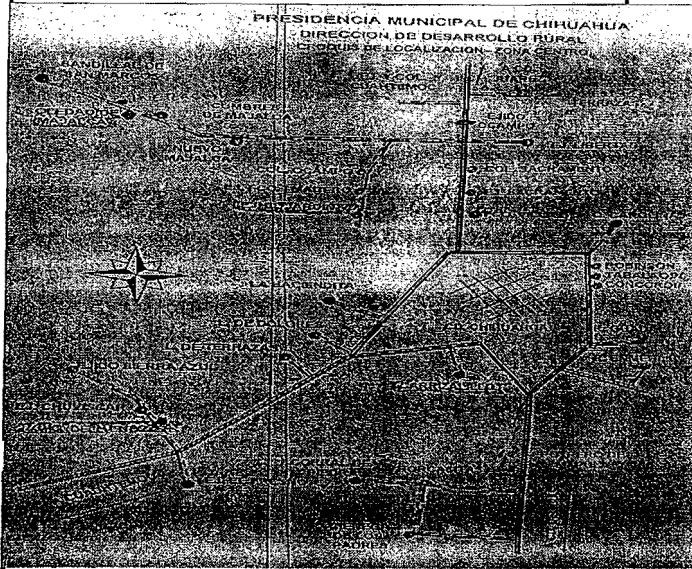

MAPA DEL MUNICIPIO

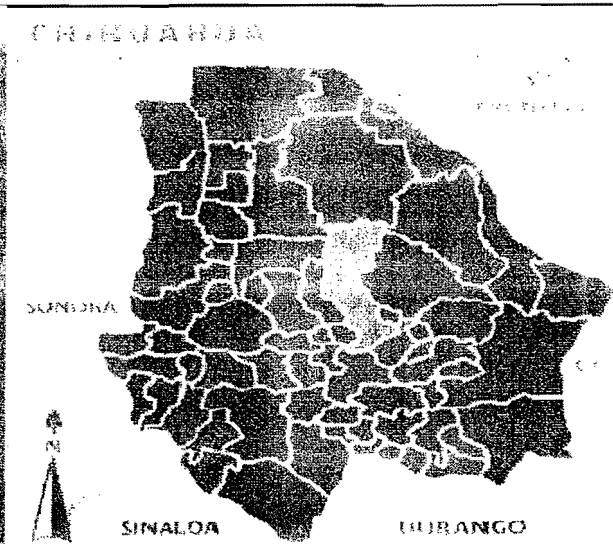

MAPA DE LA UBICACION ESPECIFICA



DESCRIPCION DE LA UBICACION

ESTADO : CHIHUAHUA
MUNICIPIO : CHIHUAHUA
LOCALIDAD : EJIDO LA HACIENDITA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.

Georeferenciacion:

Localidad:


EJIDO LA HACIENDITA

Municipio: Chihuahua 019

N 28 38' 02", W 106 11' 03"

NOMBRE:

MARIA DEL CARMEN AGUIRRE GALVAN

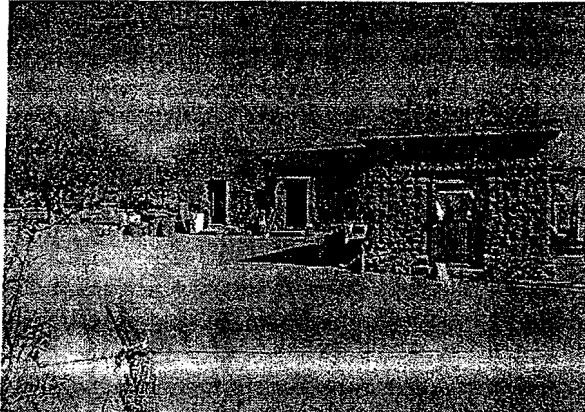

**A C T A PARA FORMACION
DE COMITE FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR EN LA COMUNIDAD"
Elcdo. LA Haciendita, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE Abril DEL 2016, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA La Escuela LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. GERARDO FERNANDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARÁN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL COMO OPERADOR.
- 3.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.**
- 4.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASÍ COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto a las DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



SARIC DE POLICIA
IDITA

-



CONTAMINACIÓN

CONFIDENTIAL

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "----- OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION**; Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEÍSTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR MAYORÍA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Guadalupe Albing Chave
SECRETARIO: Maria del Carmen Aguirre
TESORERO: ELSA AGUIRRE GALVAN
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: _____
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: _____



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
COMISARIO DE POLICIA
EJECUTIVA

LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL SERAN RESPONSABLES DE SUPERVISAR LAS ACCIONES Y TRABAJOS A EJECUTAR POR LOS BENEFICIARIOS. EL RESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ PRO-PROYECTO, QUEDA FACULTADO LEGALMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA Y A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS, REALICEN LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS APOYOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO COMO PARA QUE INTEGREN Y SUSCRIBAN LA DOCUMENTACIÓN QUE PARA TALES EFECTOS SE REQUIERA.

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:
- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MISMO.
 - c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACIÓN DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACION.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; Y HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NÓMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y EstrictAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES,ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM .

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIÉN ACUERDAN APEGARSE EstrictAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRÁN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIADOS.



COMITÉ DE FISM
EJECUTIVO

ANEXO No. 1

RELACIÓN DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL DÍA _____ DE _____ DEL 2016.

NOMBRE
Ramona Aguirre
Julian Olvera P
Rosa M ^c T. de Mtz
Eduardo Martinez C
Rosa Emma Barrera F
Ramon Barroza Regalado
Trinidad Aguirre Galvan
Blanca Estela Deigado Corral
Ramon Barroza Barrera
JOSE ANTONIO Aguirre G
ROSA MARIA BARRAZA BARRERA
Hilario Aguirre Galvan
Martha Elena Aguirre Galvan

FIRMA
RAMONA AGUIRRE
Julian Olvera P
Rosa M ^c T. de Mtz.
Eduardo Martinez C
Rosa Emma Barrera F
Ramon Barroza Regalado
Trinidad Aguirre G
Blanca Deigado C.
Ramon Barroza B
JOSE ANTONIO Aguirre G
ROSA MARIA BARRAZA B
Hilario Aguirre G
Martha Elena A G



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2014-2016

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

COMISARIO DE POLICIA

EL C. _____

DEL EJIDO O LOCALIDAD DE _____

EN SU CARÁCTER DE _____

DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA
