



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE JUNIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0422/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
					400.36	400,355.67	400,355.67								133,451.89
TOTAL					\$	400,355.67	\$	400,355.67	\$						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0422/16
FECHA: 06-jun-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V,
UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: AGEB 6120

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 400,355.67

INVERSIÓN:

SUMA: 400,355.67

FISM: 400,355.67

FEDERAL: _____

ESTATAL: _____

BENEFICIARIOS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,205

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 48

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 27

MUJERES: 72

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

CARACTERISTICAS: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INCLUYE:

- ✓ 88.00 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 195.00 M2 MURO DE BLOCK
- ✓ 195.00 M2 PINTURA VINILICA
- ✓ 158.00 M DE MALLA CICLONICA
- ✓ 1.00 PORTON DE LAMINA CAL. 24

LATITUD: 28° 35' 35.99" N
LONGITUD: 106° 01' 03.34" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 400,355.67 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	
\$	-

ESTATAL	
\$	-

FISM-AGEB 6120	
\$	400,355.67



SUPERVISOR: Contrucción

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: IDENTIFICAR Y APOYAR PLANTELES EDUCATIVOS DONDE EXISTAN NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.	\$120,106.70	\$160,142.27	\$120,106.70	\$400,355.67	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$400,355.67	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$120,106.70	\$160,142.27	\$120,106.70
Acumulado	\$120,106.70	\$280,248.97	\$400,355.67

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
1.- BARDAS PERIMETRALES	\$345,134.20

Sub total:	\$345,134.20
16% I.V.A:	\$55,221.47
Total:	\$400,355.67

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	UNIDAD	Cantidad	P. U.	Importe
1	BARRA PERIMETRAL				
1.1	Excavación manual para zapatas, y de líneas de serviciós, a cualesquiera que sean clasificación y profundidad (incluye el relleno ompactado). por unidad de obra terminada, así como retiro de material sobrante fuera de la obra	m3	88.00	\$145.00	\$12,760.00
1.2	Suministro y colocacion de plantilla de concreto f'c=100kg/cm2 hecha en obra 6cm de espesor.	m2	100.00	\$120.00	\$12,000.00
1.3	Zapata corrida ZC-1 de 0.40x0.20 m., a base de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas de acero No. 3 en el sentido longitudinal y varillas de acero No. 3 @ 0.25 m. en el sentido transversal. Incluye acero para anclaje, cimbrado, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	158.00	\$473.63	\$74,833.54
1.4	Rodapie a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m. mca. GCC o similar en calidad, asentado con mezcla cemento-arena 1:4, y una vs a cada 80 cm en sentido vertical y relleno de concreto f'c=200kg/cm2, acabado con boquilla comun en cualquier nivel. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	95.00	\$255.02	\$24,226.90
1.5	Dala de cerramiento de 20x20cm armada con 4 varillas de 3/8", E de 1/4" @25 cm, y concreto f'c=200 kg/cm2 , incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento P.U.O.T.	m	158.00	\$241.32	\$38,128.56
1.6	Dala de desplante de 20x20cm armada con 4 varillas de 3/8", E de 1/4" @25 cm, y concreto f'c=200 kg/cm2 , incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento P.U.O.T.	m	158.00	\$240.50	\$37,999.00
1.7	Castillo K-1 de 20x20 cm armado con 4vs de 3/8" y E diam. 1/4" a cada 25 cm y concreto f'c=150 kg/cm2, incluye cimbra, armado,colado,curado, material, mano de obra,herramiento,acarreo, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m	90.00	\$225.46	\$20,291.40
1.8	Construccion de muro a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m. mca. GCC o similar en calidad, asentado con mezcla cemento-arena 1:4 acabado con boquilla comun en cualquier nivel. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	195.00	\$355.00	\$69,225.00
1.9	Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros, marca osel o similar ,color por definir P.U.O.T Osel oro o similar en calidad, color a definir en obra, incluye lijado, resanes, sellador vinifico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	195.00	\$59.64	\$11,629.80
1,10	Suministro y colocacion de porton de lamina cal.24 de 4m. De ancho por 2m. De alto, marco de PTR de 2x2" incluye bastidores a cada 50cm de 1"en ambos sentidos ,pasador y todo para su buen funcionamiento.marco pintura y todo para su buen funcionamiento	pza	1.00	\$15,600.00	\$15,600.00
1.11	Suministro y colocacion de malla ciclonica de 10.5 y de 55 x 55 mm de rombo de 1.00 m de altura, estructurada con postes de arranque de 3" cedula 30, postes en linea de 2 1/2"cedula 30 a cada 1.50 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" de diametro exterior cedula 30, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo para su buen funcionamiento. P.U.O.T.	m	158.00	\$180.00	\$28,440.00

SUBTOTAL: \$345,134.20
IVA: \$55,221.47
TOTAL: \$400,355.67

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**


O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24
DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE
NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.**

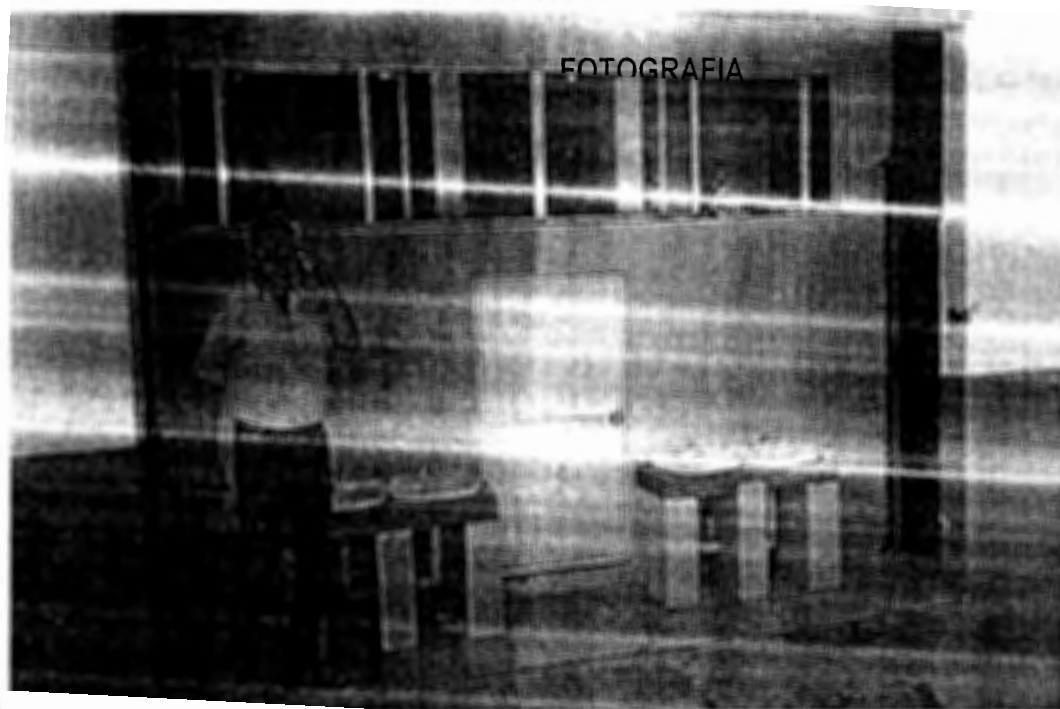

Detalle de Barrera

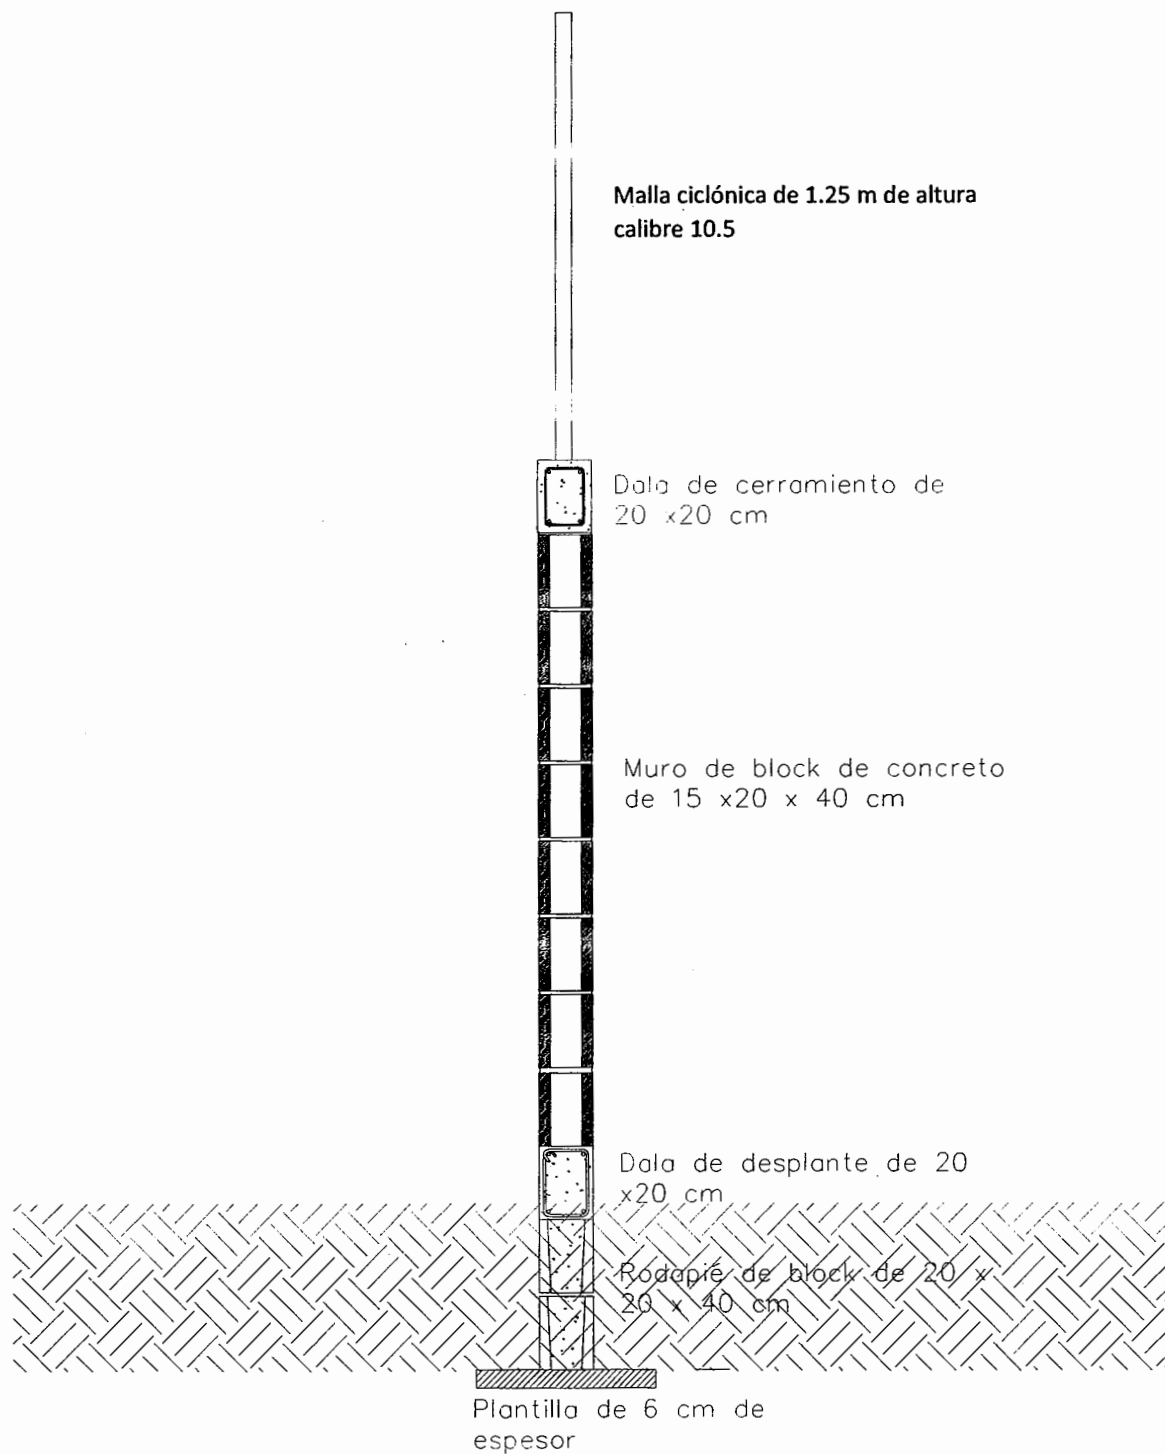

25/04/16
Xochitl
Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016

Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Verme en este
asunto
Favor de entregar
presupuestos el
Viernes 29

Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente



C. Alberto Ávila Cisneros

Director de Educación y Desarrollo Social

2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

PRESIDENCIA
CHIHUAHUA



GOBIERNO
CHIHUAHUA
DIRECCION DE
EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL

10 -

no mas de
lunes

CONSTRUIAMOS
FUTURO

teléfono y correo: 01 614 200 43 00
Col. Soberanía C.P. 31001
Chihuahua, Chih.
www.municipiochihuahua.gob.mx

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO NORTE

<u>Nombre de escuela y clave</u>	<u>Domicilio y colonia</u>	<u>Solicitud de obras</u>
Secundaria Técnica No. 78 CCT 08DST00780	Mina Cerro Colorado No. 3350 Col. Luis Donaldo Colosio	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Primarias "Luis Donaldo Colosio M." y "José Santos Valdés" CCT 08DPR2439K/08DPR2395D	Mina Cerro Colorado s/n Col. Luis Donaldo Colosio	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Jardín de Niños "Karunti" CCT 08DJN2053R	Mineral Urique y Mineral Terrenate Col. Mineral II	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302 CCT 08EPR0577Y	45 ½ y De la Armonía s/n Col. Nuevo Triunfo	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C) 2.- Mejoramiento de sanitarios
Secundaria Estatal 3023 CCT 08EES0024R	Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles Col. El Porvenir	1.- Mejoramiento de sanitarios (Arq. Leyva) 2.- Construcción de bebederos 3.- Construcción de barda Perimetral
Primaria "Repabe Raramuri" CCT 08DPR2319Y	Calle del Alamillo s/n Col. Ampliación Pedro Domínguez	1.- Mejoramiento del Comedor (Ing. De la C)
Jardín de Niños "Teporaca" CCT 08DJN2001L	Mina del Vallecillo s/n Col. Santa Cecilia	1. Mejoramiento del comedor (Arq. Leyva) 2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123W

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático

(Ing. Lizju)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Riojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Lizju)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula

(Ing. Lizju)

Jardín de Niños "Estefanía Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villalobos)

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villalobos)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre

(Ing. Villalobos)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villalobos)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua

(Ing. Villalobos)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donaldo Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villalobos)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor
- 2.- Tanque almacenamiento de agua

(Ing. Villalobos)

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Villalobos)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V

14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA TORIBIO ORTEGA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DIA 02 DE MAYO DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE *Juan Ninos 24 de febrero* LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
 - 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
 - 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
 - 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
 - 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
 - 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
- 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Ana Dalila Ochoa Banda.
SECRETARIO: Jessia Gabriela Corral Renteria
TESORERO: Vanessa Ortiz Marquez
VOCALES: Marisol Ruiz Gallegos.
VOCAL 1: Pamela Edith Domínguez Rodríguez
VOCAL 2: Micaela Espanza G.
VOCAL 3: Gisela Ponce Torres.

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

Ana Dapila Ochoa Banda


SECRETARIO

JESSICA GABRIELA CORREAL RENTERIA
JESSICA CORREAL

TESORERO

c. Vanessa Ortiz Marquez.

VOCALES

c. Marisol Ruiz G.

c. Pamela Dominguez
Rquez 

c.

Micaela Esparza G.

Hirildo Hueso Torres.

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR


C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO


C. ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA TORIBIO ORTEGA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- ~~[Signature]~~ Ana Dalida Ochoa Banda.
- 2.- Jessica Corral Jessica Gabriela Corral Renteria
- 3.- Vanessa Ortiz Marquez Vanessa Ortiz
- 4.- Marisol Ruiz Gallegos Marisol Ruiz G.
- 5.- Pamela Dominguez Rquez [Signature]
- 6.- Micaela Esparza G.
- 7.- ~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~ Torres
- 8.- Lucia Leticia Pineda Fernández [Signature]
- 9.- Ana Maria Armendáriz Grajeda [Signature]
- 10.- Natalia Miranda Delgado [Signature]
- 11.- Maria Teresa Contreras G. [Signature]
- 12.- Socorro Minerva Grajeda Melendez [Signature]

[Signature]

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. *Laura Lela González* EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA
PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

Laura Lela González S.

[Signature]

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0421/16
FECHA: 06-jun-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E,
UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: AGEB 5869

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 913,716.39

INVERSIÓN:

SUMA: 913,716.39

FISM: 913,716.39

FEDERAL: _____

ESTATAL: _____

BENEFICIARIOS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,751

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 220

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 122

MUJERES: 330

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INCLUYE:

- ✓ 540.00 M2 DE MURO DE BLOCK
- ✓ 155.00 M2 DE BANQUETAS
- ✓ 320.00 ML MALLA CICLONICA
- ✓ 165.00 M3 DE EXCAVACIONES

LATITUD: 28° 35' 32.42" N
LONGITUD: 106° 01' 54.88" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 913,716.39 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 550 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM-AGEB 5869
\$ 913,716.39



SUPERVISOR: Contrucción

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: IDENTIFICAR Y APOYAR PLANTELES EDUCATIVOS DONDE EXISTAN NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	Meses			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.	\$274,114.92	\$365,486.55	\$274,114.92	\$913,716.39	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$913,716.39	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$274,114.92	\$365,486.55	\$274,114.92
Acumulado	\$274,114.92	\$639,601.47	\$913,716.39

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA"**
2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y
2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
1.- BARRA	\$787,686.54

Sub total:	\$787,686.54
16% I.V.A:	\$126,029.85
Total:	\$913,716.39

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	BARDA				
1.1	TRAZO Y NIVELACION	M2	320.00	5.65	\$1,808.00
1.2	CORTE DE CONCRETO SIMPLE CON MAQUINA DE DISCO INC. EQUIPO DE CORTE, M. DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	55.00	45.88	\$2,523.40
1.3	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	165.00	157.25	\$25,946.25
1.4	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE	m2	167.00	122.93	\$20,529.31
1.5	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	m2	233.28	447.89	\$104,483.78
1.6	COLOCACION DE DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETOF'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4vs #4 Y ST DEL#3 @ 20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, CONCRETO, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	277.00	295.95	\$81,978.15
1.7	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 4:1 Y ACABADO APARENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	540.00	444.42	\$239,986.80
1.8	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 Vs#3 Y ST DE #2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	320.00	269.95	\$86,384.00
1.9	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR,ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	m2	155.00	226.75	\$35,146.25
1.10	MALLA CICLONICA DE 1.25 MT DE ALTURA CAL 10.5 Y POSTES DE ARRANQUE DE 2 1/2" CAL 30, POSTES DE LINEA DE 1 1/2" CAL 30, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" INC. MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	320.00	194.36	\$62,195.20
1.11	INSTALACION DE ALAMBRE DE NAVAJA INC. MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	320.00	108.00	\$34,560.00
1.12	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2DE SECCION DE 15X20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	305.00	249.74	\$76,170.70
1.13	DEMOLICION DE DALA EXISTENTE DE CONCRETO SIMPLE INC. EQUIPO, MATERIAL, M. DE OBRA RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	35.00	456.42	\$15,974.70

SUBTOTAL: \$787,686.54
IVA: \$126,029.85
TOTAL: \$913,716.39

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA**
"CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C.
EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO
GRANDE.

FOTOGRAFIA



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016

Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Verme en este asunto

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Favor de entregar
presupuestos
Viernes 29


Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

5 Proyectos
5 de la C



Atentamente

PRESIDENC
CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE
Y DESARROLLO

C. Alberto Ávila Cisneros

Director de Educación y Desarrollo Social

2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

10 -
no mas de
Lunes

C. Ciprés y Uribe No. 2503
Col. Satélite, C.P. 31100
Chihuahua, Chih.

Computador 072
Largo Distancia
(614) 200 48 00

www.municipiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO NORTE

<u>Nombre de escuela y clave</u>	<u>Domicilio y colonia</u>	<u>Solicitud de obras</u>
Secundaria Técnica No. 78 CCT 08DST00780	Mina Cerro Colorado No. 3350 Col. Luis Donaldo Colosio <i>S. Colosio</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. De la C)</i>
Primarias "Luis Donaldo Colosio M." y "José Santos Valdés" CCT 08DPR2439K/08DPR2395D	Mina Cerro Colorado s/n Col. Luis Donaldo Colosio <i>H. Colosio</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. De la C)</i>
Jardín de Niños "Karunti" CCT 08DJN2053R	Mineral Urique y Mineral Terrenate Col. Mineral II <i>Escuela</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. De la C)</i>
Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302 CCT 08EPR0577Y	45 ½ y De la Armonía s/n Col. Nuevo Triunfo <i>Triunfo</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. De la C)</i> 2.- Mejoramiento de sanitarios
Secundaria Estatal 3023 CCT 08EES0024R	Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles Col. El Porvenir	1.- Mejoramiento de sanitarios <i>(Arq. Leyva)</i> 2.- Construcción de bebederos 3.- Construcción de barda Perimetral
— Primaria "Repabe Raramuri" CCT 08DPR2319Y	Calle del Alamillo s/n Col. Ampliación Pedro Domínguez <i>Ortiz</i>	1.- Mejoramiento del Comedor <i>(Ing. De la C)</i>
Jardín de Niños "Teporaca" CCT08DJN2001L	Mina del Vallecillo s/n Col. Santa Cecilia	1. Mejoramiento del comedor <i>(Arq. Leyva)</i> 2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123W

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático

(Ing. Leyva)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Riojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula

(Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Estefanía Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donald Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor
- 2.- Tanque almacenamiento de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Villarreal)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo


- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V

14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral

Detalle de Barda

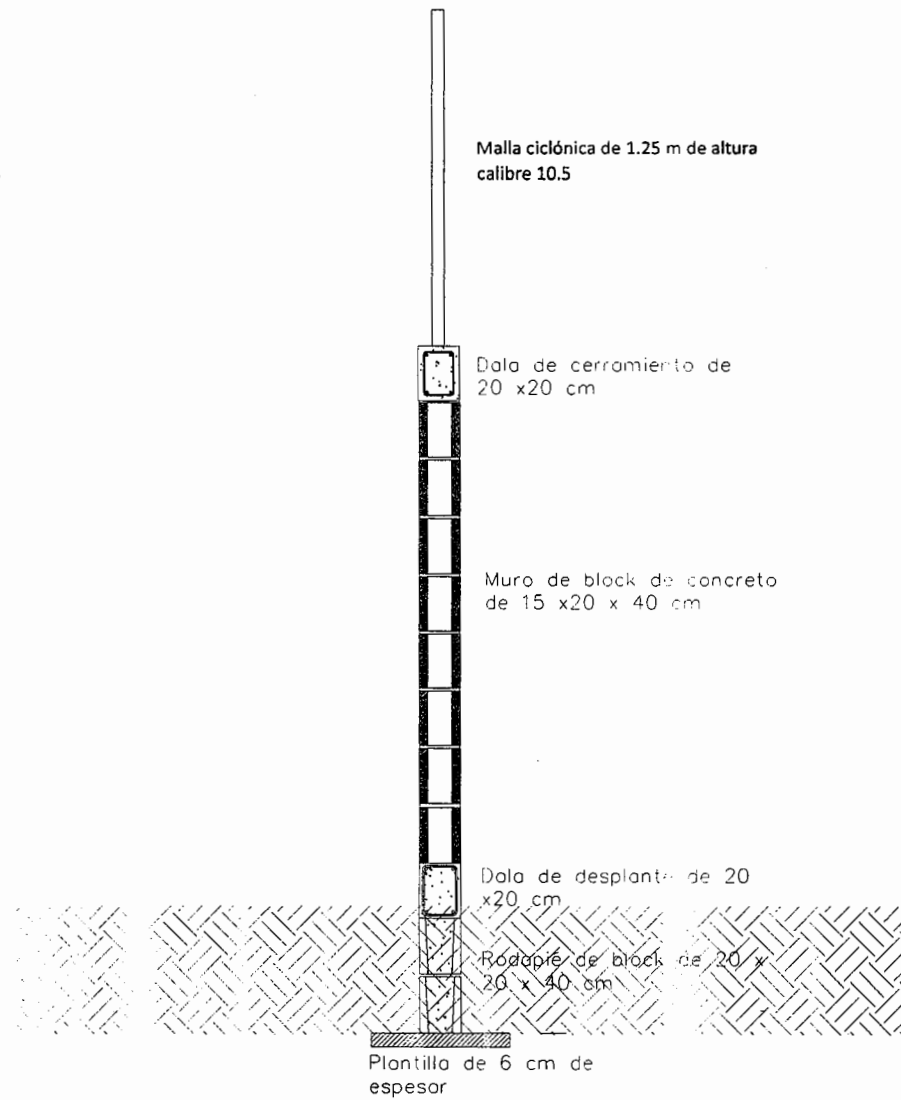

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE COLONIA CUAUHEMOC MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA *26 Mayo - 2016* EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE *Escuela Primaria Chihuahua 2751* LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA



- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
- 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto a las disposiciones y reglas de operación del programa.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2015 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMAS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO, ASI MISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

[illegible]

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Aurea Ludivina Espinoza Jimarez ~~Aurora~~ *AB*

SECRETARIO: Veronica Gonzalez C.

TESORERO: Brenda Arceola

VOCALES: _____

VOCAL 1: Mirle Karim Chavez Diaz

VOCAL 2: Diana Lizbeth Yance Valenzuela *AB*

VOCAL 3: Julia Barragan Mendoza

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y EstrictAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE EstrictAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2015.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

c. *Aurea H.*

SECRETARIO

c. Veronica Gonzalez C.

TESORERO

c. Brenda Arreola

VOCALES


c. Michellarina Chavez Díaz

c. Diana Lizbeth Yañez Valenzuela

c. Julia Bazzaron Mendoza

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR



C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO



C. ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- Mirial Hanna Chavez Díaz
- 2.- Brenda Arreola
- 3.- Veronica Gonzalez C.
- 4.- Maria Ofelia Rivas Diaz
- 5.- Patricia Vigil Gonzalez
- 6.- Irma Mendoza Aragon
- 7.- GPE. Lucia Torres O.
- 8.- Hidalgo Lopez J.
- 9.- Julia Barragan Mendoza
- 10.- Alejandra J. Marquez Charon.
- 11.- Viridiana Marquez C.
- 12.- Perla Maria Zing A.
Aurea Espinoza Jimenez.
Diana Lizabeth Yanez Valenzuela.

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. *Braun Aneola* EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA
PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

2
