



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-084

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000108

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$365,816.76 (TRESCIETOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DÍECISEIS PESOS 76/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
10	OBRAS
0001	OBRA DIRECTA

PROGRAMA	
02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
04	BAÑO

OBRA	
01	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS, COLONIA SOTO.



IMPORTE
RAMO 33

\$365,816.76
\$365,816.76

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-084

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015							
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	BAÑOS	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS., COLONIA SOTO	CIMENTACIÓN Y PISO							
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	6.00	8.52	51.12	9	460.08	
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	3.32	135.00	448.20	9	4,033.80	
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	5.00	108.80	544.00	9	4,896.00	
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2	ML	9.00	354.97	3,194.73	9	28,752.57	
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.50	242.11	363.17	9	3,268.49	
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	4.42	342.96	1,515.88	9	13,642.95	
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8.00	162.74	1,301.92	9	11,717.28	
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO A VUELTA DE PLANA	M2	3.80	253.09	961.74	9	8,655.68	
		ALBAÑILERIA							
	No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000108		SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRAS, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,894.06	1,894.06	9	17,046.54
			SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,155.73	1,155.73	9	10,401.57
			REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PIEZA	1.00	998.89	998.89	9	8,990.01
			SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES	ML	20.00	136.08	2,721.60	9	24,494.40
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLES TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y ARROPE	ML	20.00	161.90	3,238.00	9	29,142.00
			CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12.00	176.71	2,120.52	9	19,084.68
			MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	ML	24.00	235.20	5,644.80	9	50,803.20
			CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8.00	170.16	1,361.28	9	12,251.52
			REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	16.35	97.76	1,598.38	9	14,385.38
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA DE 33X33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PAGA AZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADO INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	8.00	205.90	1,647.20	9	14,824.80
	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO								
		VIVIENDA							
		SUBCLASIFICACIÓN							
		CUARTO PARA BAÑO							
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD							
		CONSTRUCCIÓN							
		DIRECTO							
	SUBTOTAL								276,850.95

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2015

FONDO DE INVERSIÓN :

FISM

I.- IDENTIFICACION DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.

ESTADO : CHIHUAHUA

MUNICIPIO : CHIHUAHUA

LOCALIDAD : COLONIA SOTO

NO. DE AGEB: en caso de ser en zona urbana

II.- CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

ESTATUS : NUEVA (X)

PROCESO ()

TIPO DE OBRA O ACCIÓN :

CONSTRUCCION (X)

AMPLIACION ()

REHABILITACION ()

EQUIPAM. ()

MEJORAMIENTO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN :

CONTRATO (X)

ADMINISTRACION DIRECTA ()

DEPENDENCIA EJECUTORA :

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

III.- INVERSIONES

INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA									
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	DESC.	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		OTROS	
					DIRECTA		EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE
					EFECTIVO	ESPECIE				
A) COSTO TOTAL	\$365,816.76				\$365,816.76					
B) EJERCIDO ANTERIOR	\$0.00									
C) ESTE EJERCICIO	\$0.00									
D) SALDO (A - B - C)	\$0.00									

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	METAS						
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	%				
A) META TOTAL	1	OBRA	100				
B) META ANTERIOR							
C) META ESTE EJERCICIO							
D) META POR EJECUTAR	1	OBRA	100				
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	POB. INDÍGENA	VIVIENDAS BENEF.	
META DE BENEFICIARIOS	1	OBRA	18	18			9

V.- VALIDACION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA :

UNA VEZ QUE SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA DEPENDENCIA _____ VALIDA QUE:

SI PROCEDE () NO PROCEDE ()

OBSERVACIONES:

Nombre y firma

VI.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA :

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 1.5 X 2.5 MTS. A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS:
 EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ZAPATA
 CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE
 DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. DALA DE DESPLANTE DE 15 CMS. PISO DE CONCRETO F" =
 150KG/CMS2 DE 10 CM DE ESPESOR, MURO DE BLOCK DE 15 CM. CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS. PUERTAS, VENTANAS
 ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARRILLA #3 A 20 CMS
 EN AMBOS SENTIDOS.

VII.- VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.2.2.3

FISM
PRESUPUESTO DE OBRA

BAÑO DE 2.5 X 1.5 MTS

BAÑO DE 2.5 X 1.5 MTS						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	No. DE	TOTAL
CIMENTACION Y PISO					BAÑOS	
1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	6	\$8.52	\$51.12	9	\$460.08
2 EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	3.32	\$135.00	\$448.20	9	\$4,033.80
3 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	5	\$108.80	\$544.00	9	\$4,896.00
4 ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS # 3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	9	\$354.97	\$3,194.73	9	\$28,752.57
5 SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.5	\$242.11	\$363.17	9	\$3,268.49
6 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	4.42	\$342.96	\$1,515.88	9	\$13,642.95
7 DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8	\$162.74	\$1,301.92	9	\$11,717.28
8 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA	M2	3.8	\$253.09	\$961.74	9	\$8,655.68
ALBAÑILERIA						
9 TUBERIA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1	1894.06	\$1,894.06	9	\$17,046.54
10 TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1	1155.73	\$1,155.73	9	\$10,401.57
11 REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PIEZA	1	998.89	\$998.89	9	\$8,990.01
12 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.	ML	20	136.08	\$2,721.60	9	\$24,494.40
13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLES, TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y AROPE	ML	20	161.9	\$3,238.00	9	\$29,142.00
14 CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12	176.71	\$2,120.52	9	\$19,084.68
15 MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	ML	24	235.2	\$5,644.80	9	\$50,803.20
16 CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8	170.16	\$1,361.28	9	\$12,251.52
17 REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	16.35	97.76	\$1,598.38	9	\$14,385.38
18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDER DE 33 X 33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	8	205.9	\$1,647.20	9	\$14,824.80
19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80 X 2.10 MTS., INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA.	1	1351.93	\$1,351.93	9	\$12,167.37
20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 60 X 40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA Y PINTURA	PIEZA	1	776.75	\$776.75	9	\$6,990.75
21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC. AS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1	1097.1	\$1,097.10	9	\$9,873.90
22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1	823.72	\$823.72	9	\$7,413.48
23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, TE, LLAVES MEZCLADORAS, REGADERA, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	1	605.3	\$605.30	9	\$5,447.70
TECHUMBRE						
24 ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	8.0	\$61.82	\$494.56	9	\$4,451.04
25 LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEODEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	6.25	\$502.92	\$3,143.25	9	\$28,289.25
26 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	6.25	\$131.40	\$821.25	9	\$7,391.25
27 SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1	400.54	\$400.54	9	\$3,604.86
28 SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1	\$370.69	\$370.69	9	\$3,336.21
\$365,816.76						

TOTAL

\$40,646.31

9

\$365,816.76

ELABORO

ANDRES DUARTE CHAVIRA



CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.
FISM

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS[illegible]

**CEDULA PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN EL PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRA : CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.

LOCALIDAD : COLONIA SOTO

REZAGO SOCIAL (SERVICIOS)

BÁSICOS

AGUA POTABLE	SI
DRENAJE SANITARIO	NO
ELECTRIFICACIÓN	SI

COMPLEMENTARIOS

ALUMBRADO PUBLICO	SI
PAVIMENTO	NO

NIVEL SOCIO ECONÓMICO (REZAGO SOCIAL)

INGRESO: EL INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ES MENOR AL SALARIO MINIMO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE : LAMINA, BLOCK Y ADOBE

OBJETO DE LA OBRA

PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL AL PROPORCIONARLES BAÑOS LOS CUALES SE CONVERTIRAN EN UN ESPACIO DIGNO QUE IMPACTARA POSITIVAMENTE EN SU CALIDAD DE VIDA, Y LO MAS IMPORTANTE EN CUESTION DE SALUD TENDRAN BENEFICIOS DIRECTOS YA QUE TENDRAN UN AREA DE CONFORT EN TIEMPOS DONDE LOS CLIMAS SON MUY EXTREMOS QUE ES UNA DE LA CARACTERISTICA DE LA COLONIA SOTO.

BENEFICIARIOS

36 HABITANTE

PROCEDE : SI

ELABORO:

VO.BO

PhD. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2015

HOJA 1 DE 1

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION


SUBCUENTA:

CUENTA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	URDACION LOCALIDAD	MOD. DE DEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	U. DE M.	CANT		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.	COLONIA SOTO	C	IT	365.8	\$ 365,816.76	\$ 365,816.76		OBRA	1	100%	09	10	365.82
TOTAL						\$ 365,816.76	\$ 365,816.76							


Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO FISM

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.

OBJETIVO:

PROPORCIONAR INFRAESTRUCURA SOCIAL EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL AL PROPORCIONARLES BAÑOS, LOS CUALES SE CONVERTIRAN EN UN ESPACIO DIGNO QUE IMPACTARA POSITIVAMENTE EN SU CALIDAD DE VIDA, Y LO MAS IMPORTANTE EN CUESTION DE SALUD TENDRAN BENEFICIOS DIRECTOS YA QUE TENDRAN UN AREA DE CONFORT EN TIEMPOS DONDE LOS CLIMAS SON MUY EXTREMOS QUE ES UNA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA COLONIA SOTO.

DESCRIPCION:

(META, UNIDAD, DETALLE POR META O UNIDAD), LOCALIZACIÓN, BENEFICIARIOS, INVERSION (% PARTICIPACION), ESTRUCTURA FINANCIERA (FONDOS), DURACION.

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 1.5X2.5 MTS. A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS; EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., PISO DE CONCRETO F''=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, MUROS DE BLOCK DE 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., PUERTAS, VENTANAS ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN LA COLONIA SOTO.

Inversión:

365,816.76



Estructura Financiera:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

365,816.76

Duración:

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015



JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ

N 28° 18' 02.1"

W 106° 08' 26.6"



VALENTIN RODRIGUEZ MENESES

N 28° 17' 57.0"


W 106° 08' 11.3"



OLGA ESCAMILLA ANCHONDO

N 28° 17' 59.9"


W 106° 07' 58.5"

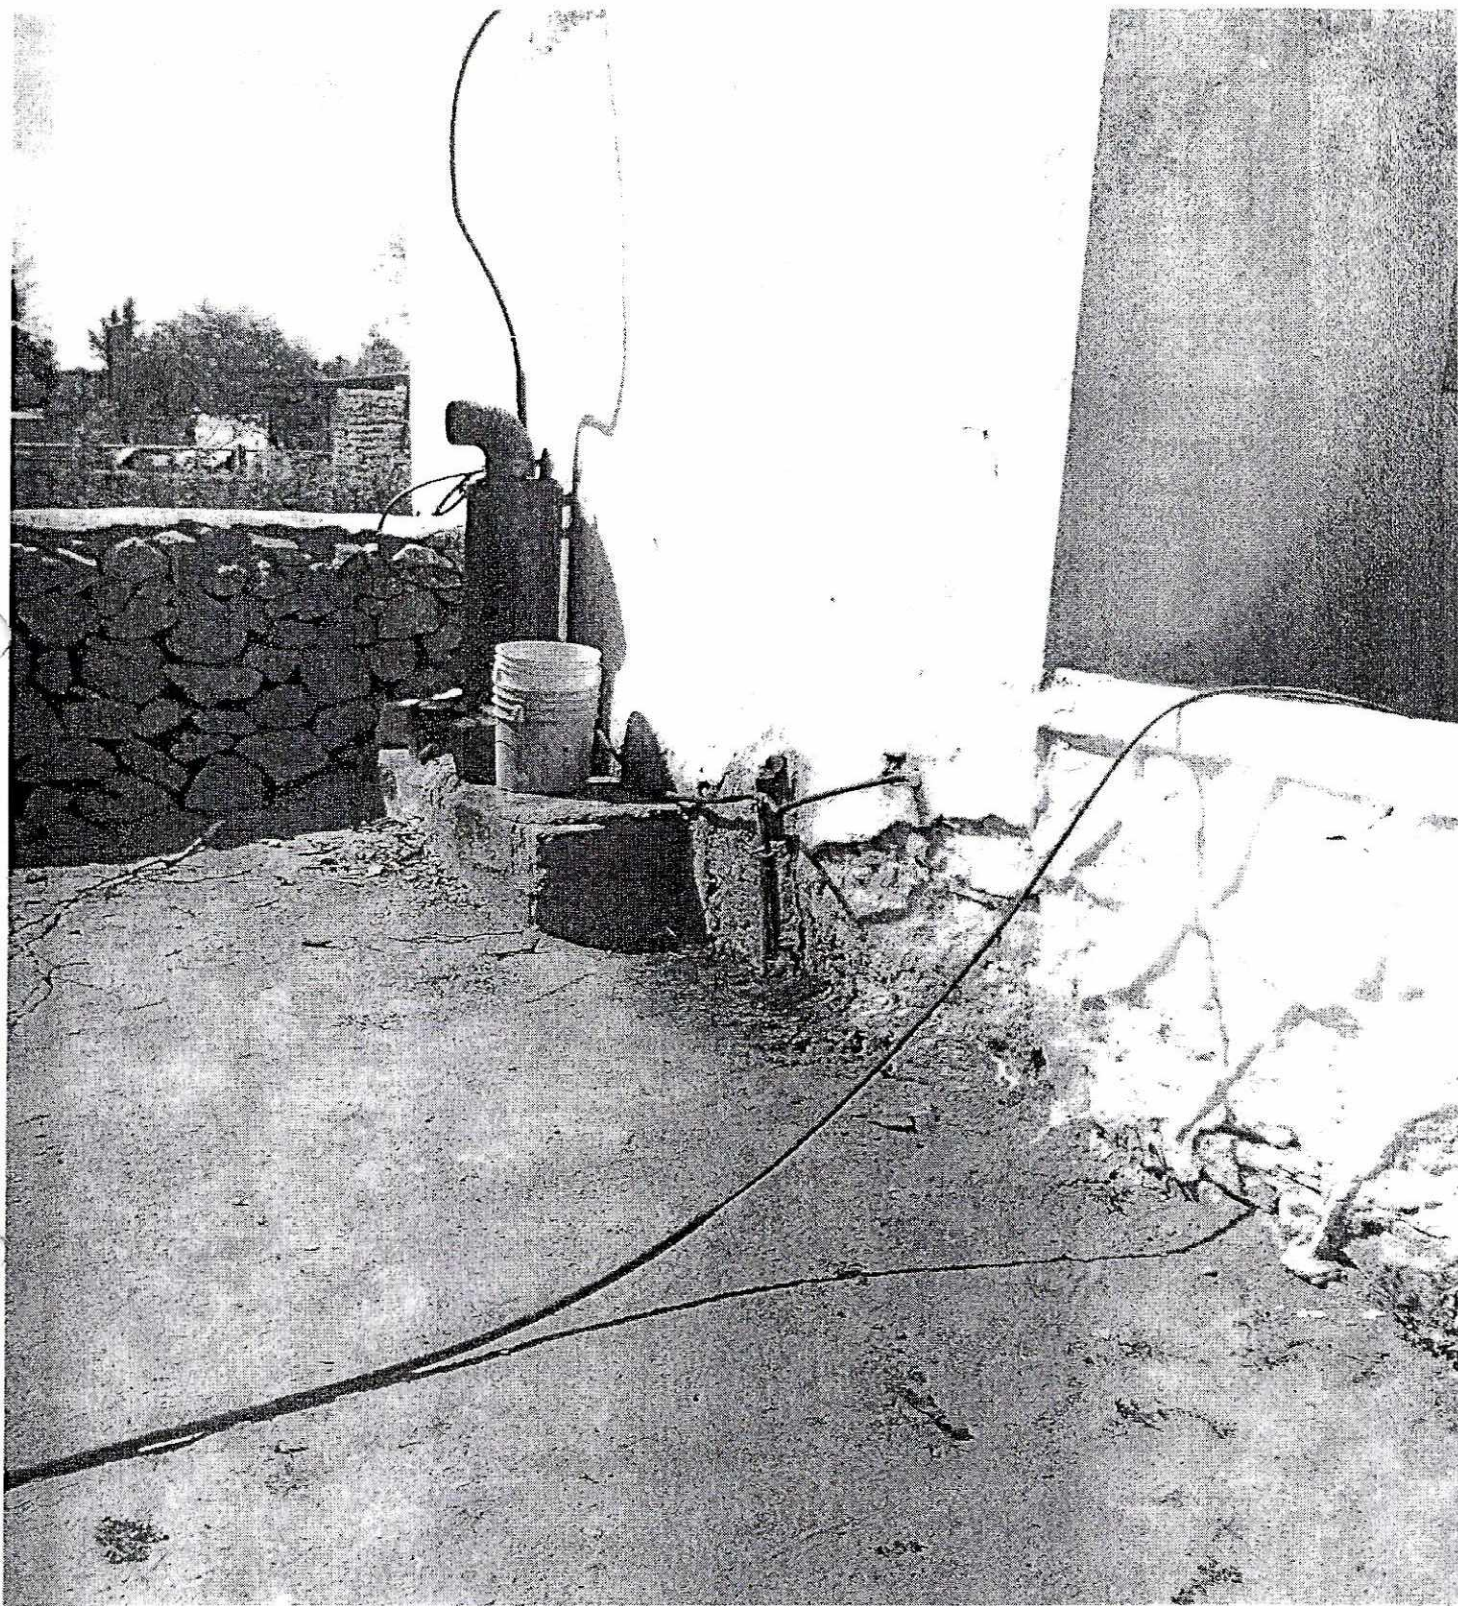

NATIVIDAD ANCHONDO SEAS

N 28° 17' 54.8"

W 106° 07' 40.1"

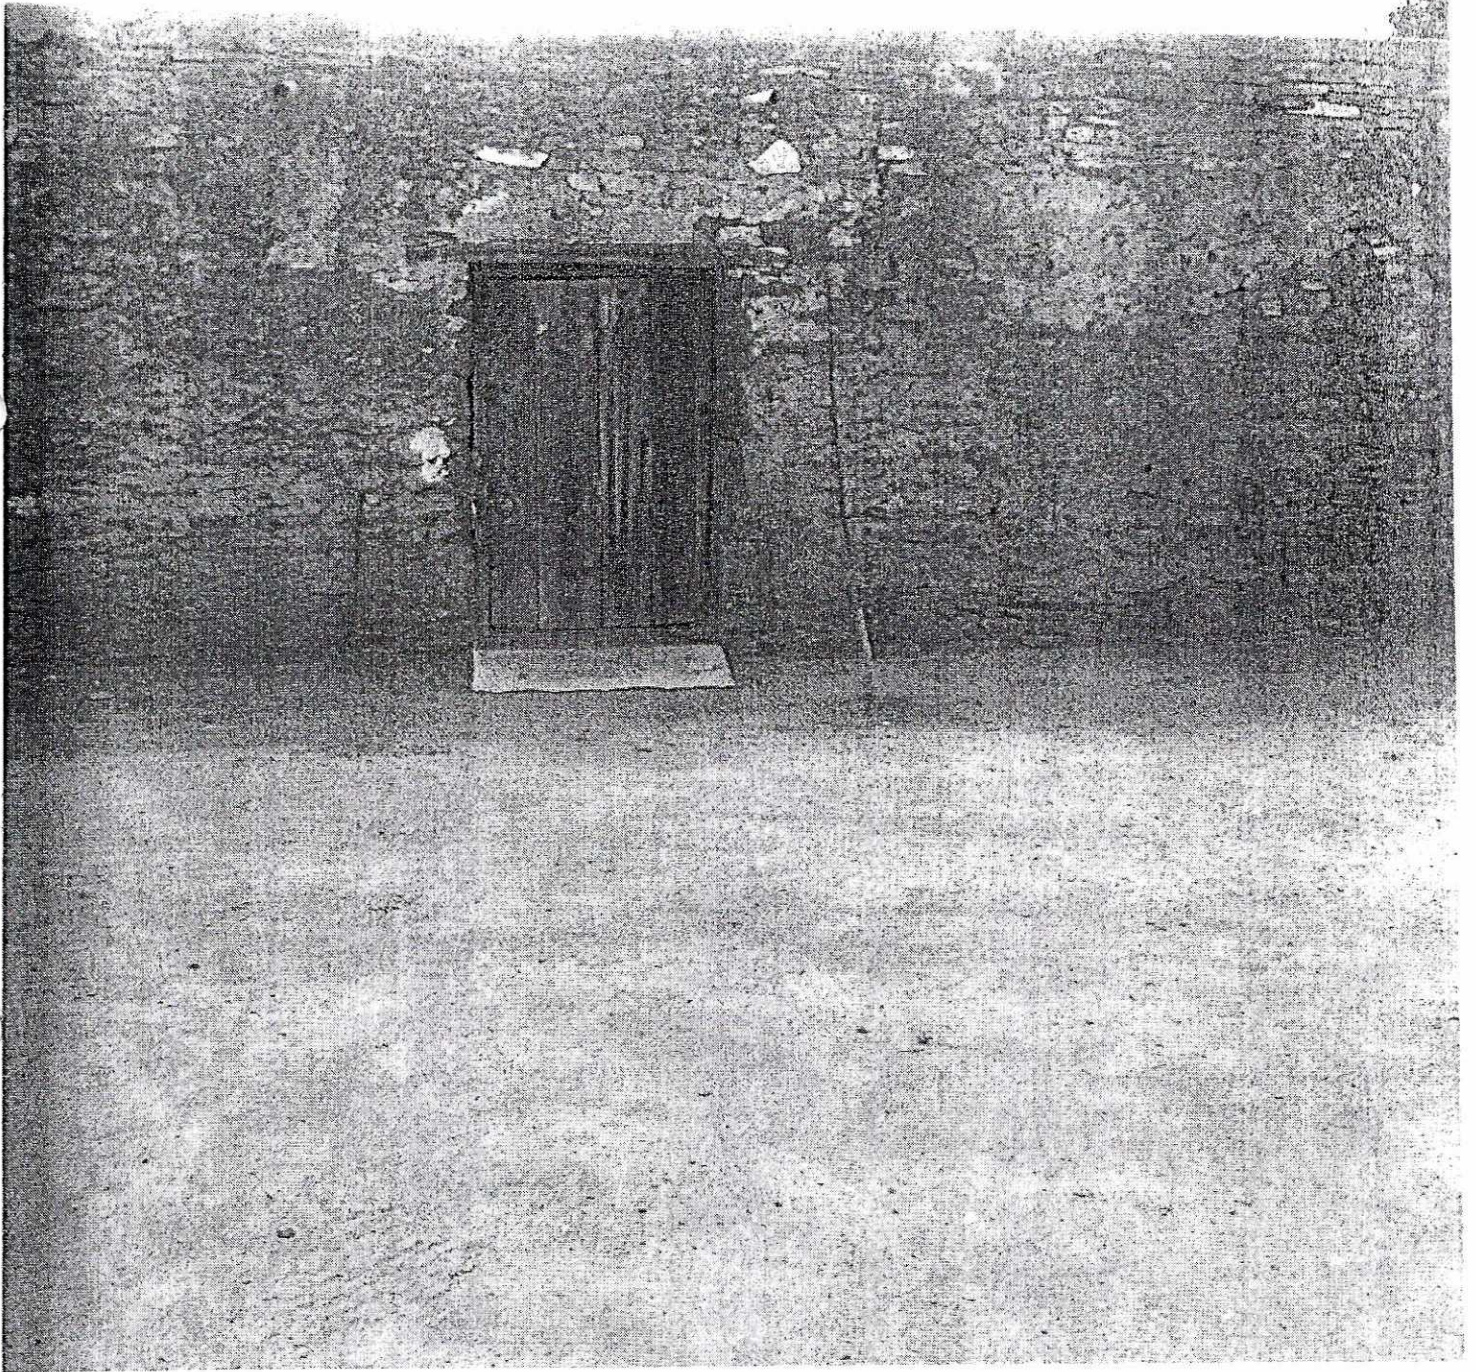

AURELIO PEREZ VALDEZ

N 28° 17' 44.7"


W 106° 08' 18.8"



JUANITA ANCHONDO SEAS

N 28° 17' 57.3"


W 106° 07' 46.8"

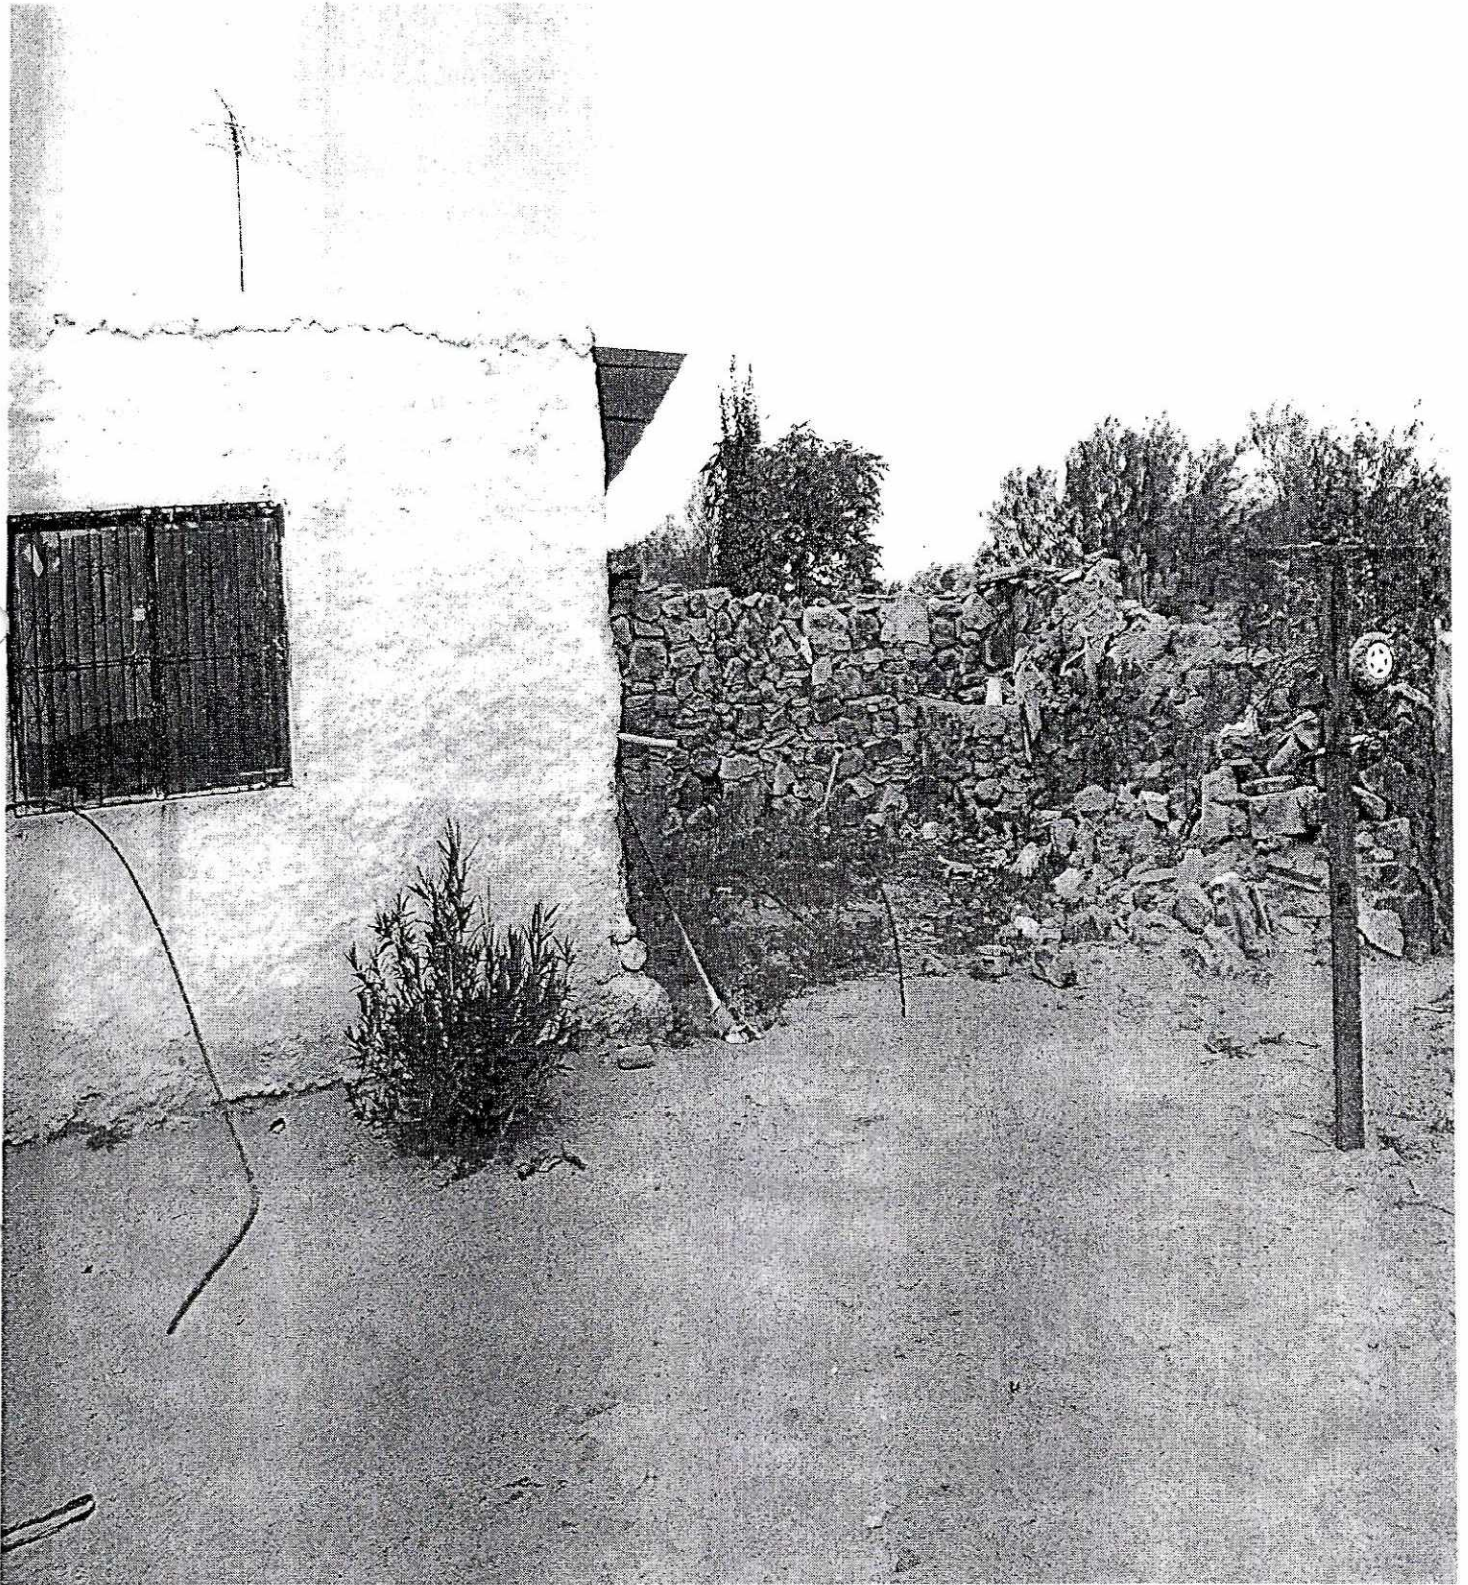

JOSE LUIS CHAVARRIA SIGALA

N 28° 17' 40.3"

W 106° 08' 28.0"



MARIA MONCERRAT COBOS RODRIGUEZ

N 28° 17' 40.7"

W 106° 08' 28.6"



CRISTOBAL PEREZ MENDOZA

N 28° 18' 08.6"

W 106° 07' 59.1"

Chihuahua Chih A 30 DE Julio DEL 2015

PHD. CARLOS OCHOA ORTEGA

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS SU APOYO PARA LA
REHABILITACION y construcción de Cuartos y Baños UBICADO EN LA
COMUNIDAD DE Colonia Soto

DE ANTEMANO LE DAMOS LAS GRACIAS POR LA ATENCION BRINDADA A NUESTRA
SOLICITUD.

ATENTAMENTE

Miguel Angel Chavarria

C. MIGUEL CHAVARRIA COBOS

PRESIDENTE SECCIONAL "COLONIA SOTO"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2012-2016

PRESIDENCIA SECCIONAL
SOTO
