

AD 0027/2023

EXP 0085/23

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-FODESM-OP-025

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000058

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

control

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE ABRIL DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$428,765.40 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$428,765.40

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERÍA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-025

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERIA	PRESUPUESTO PAVIMENTOS CALLE ALMERIA (DE CALLE BARCELONA A CALLE MARBELLA) Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra leminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVS.M, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos TMA 3/8" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye : re nivelación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guarniciones y las esquinas al término de la calle , compactación con rodillo liso al grado fijado , acabado final con neumática , chalfanes en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	1,984.03	25.93	59,677.89
	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000058		m2	1,984.03	160.37	369,087.51
TOTAL						428,765.40

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26
SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL



EXP: 0085/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERIA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 428.77	\$ 428,765.40	\$ -	\$ 428,765.40	\$ -	M2	100%	MAYO	JUNIO	\$ 285,843.60
TOTAL					\$ 428.77	\$ 428,765.40	\$ -	\$ 428,765.40	\$ -					

ING. RODOLFO ARRENDAREZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Chihuahua, Chih., a 13 de marzo de 2023
No. de oficio: SRIA/AT/122/2023

C.P. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
Presente . -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 05/23, celebrada el día 8 de marzo del presente año, mediante el cual se autorizan los proyectos a realizarse a través de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM).

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento


Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**

RAFR/AOB/MCQM/vtb

Subdirección de programación
y presupuesto



Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

71140

Secretaría del Ayuntamiento



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 05/2023

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 8 de marzo del año 2023, dentro del punto número siete del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Francisco Javier Turati Muñoz, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión Especial para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, relativo a los proyectos a realizarse a través de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM)... Al concluir la presentación del dictamen el Secretario del Ayuntamiento lo somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, con veinte votos a favor y un voto en contra del Regidor Alejandro Morán Quintana, se tomó por mayoría de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza a la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2023 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$123,427,400.99 (CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 99/100 M.N.), para los proyectos presentados por la Dirección de Obras Públicas Municipales que se describen a continuación:

No.	Nombre del Proyecto	Importe
1	Construcción de Polideportivo Norte "Luis H. Álvarez", segunda etapa, ubicado en Vialidad Sacramento, entre c. Monte Himalaya y c. Monte San Elías, col. Quintas Carolinas	\$7,549,918.09
2	Bacheo en Avenidas Principales y calles en Colonias	\$17,606,426.99
3	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Ave. Monte Albán	\$2,472,655.91
4	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Montana	\$1,000,000.00
5	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Coruña	\$1,069,734.60
6	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Almería	\$428,765.40
7	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en prolongación Teófilo Borunda, del Periférico de la Juventud a UVM	\$5,000,000.00
8	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Ave. Tecnológico	\$7,000,000.00
9	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Periférico de la Juventud	\$3,646,000.00
10	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de Blvd. Lombardo Toledano tramo entre Ave. Juan Pablo II a vías FFCC	\$4,103,248.91



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-FODESM-OP-026

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000059

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE ABRIL DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,069,734.60 (UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:


CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,069,734.60

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

RECIBIDO
25 ABR 2023
9:47

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-026							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023							
No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA	PRESUPUESTO PAVIMENTOS CALLE CORUÑA (DE CALLE ALMERÍA A C. CARTAGENA) Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su P.VMM, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos TMA 3/8" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye : renivelación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2, suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta , equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, crizados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base, tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guardamontes y las esquinas al término de la calle ,compactación con rodillo liso al grado fiado, acabado final con neumática, chafianes en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	4,950.00	25.93	148,890.06
		No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000059		m2	4,950.00	180.37	920 844.54
TOTAL						1,069,734.60	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26
SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL



EXP: 0054/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,069.73	\$ 1,069,734.60	\$ -	\$ 1,069,734.60	\$ -	M2	100%	MAYO	JULIO	\$ 356,578.20
TOTAL					\$ 1,069.73	\$ 1,069,734.60	\$ -	\$ 1,069,734.60	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ BONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL




Chihuahua, Chih., a 28 de marzo de 2023
No. de oficio: SRIA/AT/164/2023

C.P. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
Presente . -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 06/23, celebrada el día 22 de marzo del presente año, mediante el cual se autorizan los proyectos a realizarse a través de la Dirección de Desarrollo Rural, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM).

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento

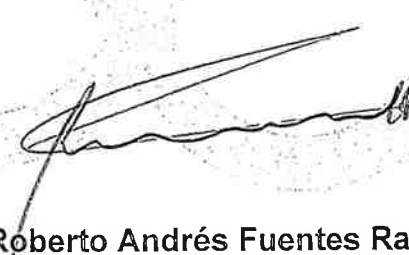
Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**

RAFR/AOB/MQCM/vtb

RECIBIDO
28 MAR 2023

Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

41330

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 05/2023

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 8 de marzo del año 2023, dentro del punto número siete del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Francisco Javier Turati Muñoz, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión Especial para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, relativo a los proyectos a realizarse a través de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM)... Al concluir la presentación del dictamen el Secretario del Ayuntamiento lo somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, con veinte votos a favor y un voto en contra del Regidor Alejandro Morán Quintana, se tomó por mayoría de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza a la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2023 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$123,427,400.99 (CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 99/100 M.N.), para los proyectos presentados por la Dirección de Obras Públicas Municipales que se describen a continuación:

No.	Nombre del Proyecto	Importe
1	Construcción de Polideportivo Norte "Luis H. Álvarez", segunda etapa, ubicado en Vialidad Sacramento, entre c. Monte Himalaya y c. Monte San Elías, col. Quintas Carolinas	\$7,549,918.09
2	Bacheo en Avenidas Principales y calles en Colonias	\$17,606,426.99
3	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Ave. Monte Albán	\$2,472,655.91
4	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Montana	\$1,000,000.00
5	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Coruña	\$1,069,734.60
6	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Almería	\$428,765.40
7	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en prolongación Teófilo Borunda, del Periférico de la Juventud a UVM	\$5,000,000.00
8	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Ave. Tecnológico	\$7,000,000.00
9	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Periférico de la Juventud	\$3,646,000.00
10	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de Blvd. Lombardo Toledano tramo entre Ave. Juan Pablo II a vías FFCC	\$4,103,248.91



CONSTRUCTORA

ASIEL, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA

ASFÁLTICA EN CALLE ALMERÍA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERIA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

OBRA:


No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTOS					
CALLE ALMERÍA (DE CALLE BARCELONA A CALLE MARBELLA)					
3	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	1,984.03	\$ 33.21	\$ 65,889.64
4	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVSM, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos TMA 3/8" con cemento asfáltico PG-76-22 incluye : re nivelación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de los materiales, acarreo y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guarderías y las esquinas al término de la calle ,compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chaflanes en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	1,984.03	\$ 144.97	\$ 287,624.83
SUBTOTAL					353,514.47

SUBTOTAL \$ 353,514.47
IVA \$ 56,562.31
TOTAL \$ 410,076.78

CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL EDUARDO SEYFFERT YBERRI
ADMINISTRADOR UNICO

05/06/2023



CONSTRUCTORA

ASIEL, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE
CORUÑA.

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

OBRA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTOS					
CALLE CORUÑA (DE CALLE ALMERÍA A C. CARTAGENA)					
1	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	4,950.00	\$ 33.21	\$ 164,389.50
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVM, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos TMA 3/8" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye : renivelación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta , equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base, tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guarniciones y las esquinas al término de la calle ,compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática, chafanes en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	4,950.00	\$ 149.70	\$ 741,015.00

SUBTOTAL \$ 905,404.50
IVA \$ 144,864.72
TOTAL \$ 1,050,269.22

CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL EDUARDO SEYFFERT YBERRI
ADMINISTRADOR UNICO

05/06/2023

01108



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO

PADRON UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 25, 27, 28, 29 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ARTICULOS 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO QUE ACREDITA A LA PERSONA FISICA O MORAL ESTAR INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS.

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ASIEL, S. A. DE C.V.	
REP. O APODERADO LEGAL: SEYFFERT YBERRI MIGUEL EDUARDO	EMAIL: asiel@prodigy.net.mx
DOMICILIO: C. ERNESTO TALAVERA NO. 2213. COL. CUARTELES, CP: 31020, CHIHUAHUA, CHIH.	
R.F.C.: CAS-950415-RE5	I.M.S.S.: A80-48665-10
INFORMANT: 08-06173-87	CAPITAL CONTABLE: \$25,148,086.00
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 15 DE ABRIL DE 1996	TELEFONO: (614) 4-33-20-10
	CAMARA: CMIC-74264

No. DE REGISTRO: PUCGE-01037	INSCRIPCION: 12/01/2001	REVALIDACION: 02/02/2023	MODIFICACION:	REEXPECION:	VIGENCIA: FEB-2024
------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	-------------	--------------------

ESPECIALIDADES		ESPECIALIDADES	
CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE	DESCRIPCION
1113 P*	PREFABRICADOS (HIL-POST)	1003 P*	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PIEDRO
1118 P*	PUENTES VEHICULARES CON SUPERESTRUCTURA A BASE DE ELEMENTOS PREFORMADOS O POSTENSADOS	1702 P*	LINEAS Y REDES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION
1117 P*	PUENTES PEATONALES CON SUPERESTRUCTURA A BASE DE ELEMENTOS PREFORMADOS O POSTENSADOS	1703 P*	LINEAS Y REDES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ALTA TENSION
1118 P*	PUENTES VEHICULARES CON SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO	1704 P*	TABLEROS DE FUERZA Y DISTRIBUCION
1122 P*	SUBESTRUCTURA DE LOSAS DE CIMENTACION	1706 P*	SUBESTACIONES
1123 P*	SUPERESTRUCTURA DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRIBOS Y ALEROS	1707 P*	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION (INCLUYE CALEFACCION)
1126 P*	REVESTIMIENTOS EN CANALES Y CAJONES DE ARROYOS Y TIOS	3101 P*	CONDUCCION, REDES Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA
1205 P*	TECHUMBRES Y CUBIERTAS	3102 P*	CONDUCCION, REDES Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE DRENAJE SANITARIO
1206 P*	ELEMENTOS DE PALESA Y CONEXIONES EN GENERAL	3103 P*	EQUIPO DE BOMBEO Y REDOMBO
1205 P*	PUENTES VEHICULARES	3104 P*	POZOS DE VISITA Y REGISTROS
1205 P*	EDIFICACION	3105 P*	TOMAS DOMICILIARIAS
1401 P*	ALUMBRADO PUBLICO	3106 P*	ATARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
1403 P*	GUARNICIONES Y BANQUETAS	3107 P*	DIRAS O DRENANES PLUVIALES
1405 P*	EQUIPAMIENTO DE PARQUES DEPORTIVOS - RECREATIVOS	3202 P*	TELEFONIA, VOZ Y DATOS
1406 P*	PARQUES Y JARDINES	3209 P*	CERCAS DE MALLAS DE ALAMBRE
1501 P*	PRESAS DE ALMACENAMIENTO, DERIVADORAS Y DE CONTENCIÓN	4000 O*	SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES
1502 P*	CANALES		
1503 P*	DESAZOLVES Y DRAGADOS		
1504 P*	OBRAS DE PROTECCION Y ALMACENAMIENTO MEJOR		
1505 P*	TERRACERAS EN VALDADES Y CAMINOS		
1506 P*	TERRACERAS CON USO DE EXPLOSIVOS PARA VALDADES, CAMINOS, Y/O ALPORISTAS		
1507 P*	TERRACERAS EN PLATAFORMAS		
1508 P*	TRABAJOS PRE-AGRICOLAS (SISOLOCO, BARDECHO, RASTREO, NIVELACION, DESMONTES O LIMPIEZA)		
1509 P*	DRENAJE EN VALDADES, CAMINOS Y/O FERROCARRILES		
1601 P*	EN VALDADES URBANAS, VALDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS DE		
1602 P*	EN VALDADES URBANAS, VALDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS DE		
1603 P*	EN VALDADES URBANAS, VALDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS POR		
1604 P*	EN VALDADES URBANAS, VALDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS POR		
1607 P*	MANTENIMIENTO DE VALDADES CON CONCRETO ASFALTICO		

OBSERVACIONES: REVALIDACION 2023-2024.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
MTR. MARIO HUMBERTO VAZQUEZ ROBLES DE CHIHUAHUA

PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE FEBRERO DE 2023

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCTORA
RIO AROS

Lázaro de Baigorri No. 422 Col. San Felipe C.P.31240 Chihuahua, Chih

Tel: (614) 426-59-06 / (614) 426-59-05

asistenterioaros@gmail.com

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERÍA.

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERIA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTOS					
CALLE ALMERÍA (DE CALLE BARCELONA A CALLE MARBELLA)					
3	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluir maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslado de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	1,984.03	\$39.20	\$ 77,773.98
4	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVM, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos PM 3/8" con cemento asfáltico PG-76-22 incluye : re nivelación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de cumplimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo local, formación de almacenamientos, recado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamiento, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guarniciones y las esquinas al término de la calle , compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chiflones en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	1,984.03	\$142.29	\$ 282,307.63
SUBTOTAL					360,081.60

SUBTOTAL \$ 360,081.60

IVA \$ 57,613.06

TOTAL \$ 417,694.66

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

LIC. MARIA ANGELICA ROSAS VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

RFC CRA-850326-UN6



www.riaros.com

30 DE MAYO DE 2023



CONSTRUCTORA
RIO AROS

Lázaro de Baigorri No. 422 Col. San Felipe C.P.31240 Chihuahua, Chih

Tel: (614) 426-59-06 / (614) 426-59-05

asistenterioaros@gmail.com

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA.

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTOS					
CALLE CORUÑA (DE CALLE ALMERÍA A C. CARTAGENA)					
1	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	4,950.00	\$ 39.20	\$ 194,040.00
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVM, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos TMA 3/8" con cemento asfáltico PG-76-22 incluye : renovación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abastecimiento de los materiales, mano de obra, herramienta , equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base, tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guarniciones y las esquinas al término de la calle ,compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática, chaflores en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	4,950.00	\$ 144.76	\$ 716,562.00

SUBTOTAL \$ 910,602.00

IVA \$ 145,696.32

TOTAL \$ 1,056,298.32

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

LIC. MARIA ANGELICA ROSAS VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

RFC CRA-850326-UN6



www.rioaros.com

30/MAYO/2023



CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-810120-DN4

REG. CNIC-22902

CARBONEL # 3702

TELS. 413-45-45 Y 426-57-28

CHIHUAHUA, CHIH.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERÍA.

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERIA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTOS					
CALLE ALMERÍA (DE CALLE BARCELONA A CALLE MARBELLA)					
3	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	1,984.03	\$39.21	\$ 77,793.82
4	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVM, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos TMA 3/8" con cemento asfáltico PG-76-22 incluye : re nivelación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guarniciones y las esquinas al término de la calle ,compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chafleas en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	1,984.03	\$144.56	\$ 286,811.38
SUBTOTAL					364,605.19

SUBTOTAL \$ 364,605.19
IVA \$ 58,336.83
TOTAL \$ 422,942.02

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

teporaca81@yahoo.com.mx

30 DE MAYO DE 2023



CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-810120-DN4

REG. CNIC-22902

CARBONEL # 3702

TELS. 413-45-45 Y 426-57-28

CHIHUAHUA, CHIH.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA.

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTOS					
CALLE CORUÑA (DE CALLE ALMERÍA A C. CARTAGENA)					
1	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 2.50 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	4,950.00	\$39.21	\$ 194,089.50
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su FVM, del banco que elija el contratista de 2.50 cm de espesor compactos TNA 3/8" con cemento asfáltico PG-76-22 incluye : renovación previa al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta , equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base, tendido, compactación con placa las áreas adyacentes a las guarniciones y las esquinas al término de la calle ,compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumático, chaflanes en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	4,950.00	\$145.77	\$ 721,561.50

SUBTOTAL \$ 915,651.00
IVA \$ 146,504.16
TOTAL \$ 1,062,155.16

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. JOSE CARRASCO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

teporaca81@yahoo.com.mx

30/MAYO/2023
