



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

CON/MOL

Depto. De Licitaciones y Control de

Oficio No. D/206/

Asunto: solicitud de re

Chihuahua, Chih., a 11 DE JULIO DEL

Hoja

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU.

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente ob

EXP: 0201/19: Programa integral de fincas abandonadas II etapa. Por un importe de \$ 660,949.01 (seiscien
sesenta mil novecientos cuarenta y nueve pesos 01/100 M.N.), con el número de cuenta contable (1
12359010001-999999-04-08021-131-000-02K0304-61901-2-4-PDAM-000 aprobada en el presupuesto
egresos.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
18 JUL. 2019

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUIAR GARCÍA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/AMJ

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
17 JUL 2019
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 02 DE JULIO DEL 2019

CUENTA:
SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0201/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS II ETAPA	CHIHUAHUA	CONT	IT	660.95	660,949.01	660,949.01	660,949.01	OBRA	100%	AGOSTO	OCTUBRE	220,316.34
TOTAL					\$	660,949.01	\$	660,949.01					\$

[Handwritten signature]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0201/19

FECHA: 02/07/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS II ETAPA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 660,949.01

INVERSIÓN:

SUMA:	660,949.01
MUNICIPAL:	660,949.01
FISM/FAFM/PEPD:	0.00
GOB. EDO.:	0.00
BENEFICIARIOS:	0.00
OTROS:	0.00

PROYECTO PBR: PBR19DU000025

LINEA DE ACCION	
1	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTENSIVO DE DEMOLICIÓN Y TAPIADO DE FINCAS
4	
1	
9	

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

FECHA DE INICIO: AGOSTO

TOTALES DEL AÑO: 1

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,287

FECHA DE TERMINACIÓN: OCTUBRE

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	48	54	102
ADULTOS MAYORES DE 65	6	8	14
ADULTOS ENTRE 35-64	14	16	30
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	10	12	22
ADOLESCENTES DE 14-17	3	5	8
NIÑOS ENTRE 5-13	15	13	28

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OTORGAR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE GENERAN LAS OBRAS Y FINCAS ABANDONADAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS II ETAPA

DESCRIPCIÓN PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS II ETAPA

CARACTERÍSTICAS OTORGAR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE GENERAN LAS OBRAS Y FINCAS ABANDONADAS

LATITUD: 28° 38' 12.17" N
LONGITUD: 106° 4' 34.76" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$660,949.01 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 102 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$660,949.01

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS II ETAPA



Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS II ETAPA	\$220,316.34	\$220,316.34	\$220,316.34	\$660,949.01	1.0000	1.0000
% de Avance	33.33%	33.33%	33.33%			
Acumulado	33.33%	66.66%	100.00%	\$660,949.01	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$220,316.34	\$220,316.34	\$220,316.34
Acumulado	\$220,316.34	\$440,632.67	\$660,949.01

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS II ETAPA



Presupuesto					
Carac 1	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TAPIADOS					
1	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	m2	871.0000	\$ 571.67	\$ 497,924.57
2	RETIRO DE MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA	pza	5.0000	\$ 357.02	\$ 1,785.10
3	DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	pza	110.0000	\$ 452.11	\$ 49,732.10
4	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	102.0000	\$ 199.43	\$ 20,341.86
Total de TAPIADOS				\$	569,783.63
Subtotal de Presupuesto				\$	569,783.63
				Impuesto	\$ 91,165.38
				Total	\$ 660,949.01

No.	EXP.	DIRECCION	COLONIA	DICTAMEN	COSTO
1	5473	PRADERAS DE NEBRASKA No. 13814	PRADERAS DEL SUR	TAPIADO	7059.47
2	5474	PRADERAS DE NEBRASKA No. 13802	PRADERAS DEL SUR	TAPIADO	5819.38
3	5475	PRADERAS DE NEBRASKA No. 13635	PRADERAS DEL SUR	TAPIADO	4653.23
4	5476	PARQUE LA TEJA No. 11871	JARDINES DE ORIENTE	TAPIADO	3629.45
5	5477	PUNTA EL VALLECILLO No. 104	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4772.79
6	5478	PUNTA EL VALLECILLO No. 310	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6939.91
7	5479	PUNTA EL VALLECILLO No. 344	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
8	5480	PUNTA EL VALLECILLO No. 107	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
9	5481	PUNTA MILPILLA No.428	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
10	5482	PUNTA MILPILLAS No. 412	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
11	5483	PUNTA EL DIEZ No. 345	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
12	5484	PUNTA EL DIEZ No. 331	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	5224.9
13	5485	PUNTA EL DIEZ 310	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
14	5486	PUNTA EL DIEZ No. 303	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6820.35
15	5487	PUNTA VALLECILLO No. 910	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6820.35
16	5488	PUNTA VALLECILLO No. 914	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
17	5489	PUNTA VALLECILLO No. 920	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	1342.77
18	5490	PUNTA VALLECILLO No. 922	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
19	5491	PUNTA VALLECILLO No. 924	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4772.79
20	5492	PUNTA VALLECILLO No. 932	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
21	5493	PUNTA VALLECILLO No. 934	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6487.8
22	5494	PUNTA VALLECILLO No. 938	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
23	5495	PUNTA VALLECILLO No. 940	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
24	5496	PUNTA VALLECILLO No. 946	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
25	5497	PUNTA VALLECILLO No. 956	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	1342.77
26	5498	PUNTA VALLECILLO No. 960	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
27	5499	PUNTA CHINIPAS No. 949	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
28	5500	PUNTA CHINIPAS No. 943	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
29	5501	PUNTA CHINIPAS No. 939	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
30	5502	PUNTA CHINIPAS No. 237	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7963.69
31	5503	PUNTA CHINIPAS No. 235	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
32	5504	PUNTA CHINIPAS No. 233	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
33	5505	PUNTA CHINIPAS No. 231	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
34	5506	PUNTA CHINIPAS No. 223	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
35	5507	PUNTA CHINIPAS No. 209	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
36	5508	PUNTA CHINIPAS No. 207	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
37	5509	PUNTA CHINIPAS No.123	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6129.12
38	5510	PUNTA CHINIPAS No. 121	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6129.12
39	5511	PUNTA CHINIPAS No. 109	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6129.12
40	5512	PUNTA CHINIPAS No. 107	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6129.12
41	5513	PUNTA CHINIPAS No. 204	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4533.67
42	5514	PUNTA CHINIPAS No. 206	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4533.67
43	5515	PUNTA CHINIPAS No. 222	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4533.67
44	5516	PUNTA CHINIPAS No. 248	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
45	5517	PUNTA CHINIPAS No. 250	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
46	5518	PUNTA CHINIPAS No. 264	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6820.35

47	5519	PUNTA CHINIPAS No. 947	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
48	5520	PUNTA CHINIPAS No. 943	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
49	5521	PUNTA CHINIPAS No. 941	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
50	5522	PUNTA CHINIPAS No. 935	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
51	5523	PUNTA CHINIPAS No. 928	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	7392.02
52	5524	PUNTA CHINIPAS No. 924	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	1342.77
53	5525	PUNTA CHINIPAS No. 922	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
54	5526	PUNTA CHINIPAS No. 929	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
55	5527	PUNTA CHINIPAS No. 927	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
56	5528	PUNTA CHINIPAS No. 925	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
57	5529	PUNTA CHINIPAS No. 912	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
58	5530	PUNTA CHINIPAS No. 910	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
59	5531	PUNTA CHINIPAS No. 908	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
60	5532	PUNTA CHINIPAS No. 915	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
61	5533	PUNTA CHINIPAS No. 911	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
62	5534	PUNTA CHINIPAS No. 902	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
63	5535	PUNTA CHINIPAS No. 900	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
64	5536	PUNTA CHINIPAS No. 905	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
65	5537	PUNTA SAN LORENZO No. 334	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
66	5538	PUNTA SAN LORENZO No. 332	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6820.35
67	5539	PUNTA SAN LORENZO No. 330	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6820.35
68	5540	PUNTA SAN LORENZO No. 329	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	3509.89
69	5541	PUNTA SAN LORENZO No. 327	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
70	5542	PUNTA SAN LORENZO No. 326	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
71	5543	PUNTA SAN LORENZO No. 324	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
72	5544	PUNTA SAN LORENZO No. 325	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
73	5545	PUNTA SAN LORENZO No. 322	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
74	5546	PUNTA SAN LORENZO No. 318	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	1342.77
75	5547	PUNTA SAN LORENZO No. 316	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
76	5548	PUNTA SAN LORENZO No. 314	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
77	5549	PUNTA SAN LORENZO No. 312	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
78	5550	PUNTA SAN LORENZO No. 315	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
79	5551	PUNTA SAN LORENZO No. 313	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
80	5552	PUNTA SAN LORENZO No. 306	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
81	5553	PUNTA SAN LORENZO No. 401	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
82	5554	PUNTA SAN LORENZO No. 405	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
83	5555	PUNTA SAN LORENZO No. 413	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
84	5556	PUNTA SAN LORENZO No. 296	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	5796.57
85	5557	PUNTA SAN LORENZO No. 292	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	5796.57
86	5558	PUNTA SAN LORENZO No. 140	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
87	5559	PUNTA SAN LORENZO No. 134	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6820.35
88	5560	PUNTA DEL ROSARIO No. 130	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6368.24
89	5561	PUNTA DEL ROSARIO No. 118	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
90	5562	PUNTA DEL ROSARIO No. 116	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
91	5563	PUNTA DEL ROSARIO No. 112	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	6939.91
92	5564	PUNTA DEL ROSARIO No. 110	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	5796.57
93	5565	PUNTA DEL ROSARIO No. 103	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23

94	5566	PUNTA DEL ROSARIO No. 207	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
95	5567	PUNTA DEL ROSARIO No. 205	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
96	5568	PUNTA LA BOQUILLA No. 102	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
97	5569	PUNTA LA BOQUILLA No. 104	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	5010.25
98	5570	PUNTA LA BOQUILLA No. 113	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
99	5571	PUNTA LA BOQUILLA No. 114	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
100	5572	PUNTA LA BOQUILLA No. 135	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4653.23
101	5573	PUNTA LA BOQUILLA No. 124	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12
102	5574	PUNTA LA BOQUILLA No. 207	PUNTA ORIENTE	TAPIADO	4201.12

TOTAL \$ **554,232.3**
 IVA \$88,677.
GRAN TOTAL \$ **642,909.4**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad.
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019


TAPIADO

CALLE: PRADERAS DE NEBRASKA
COLONIA: PRADERAS DEL SUR

No.: 13814

EXP. TAP-01- 5473

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	12	571.67	6860.04
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO				
FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

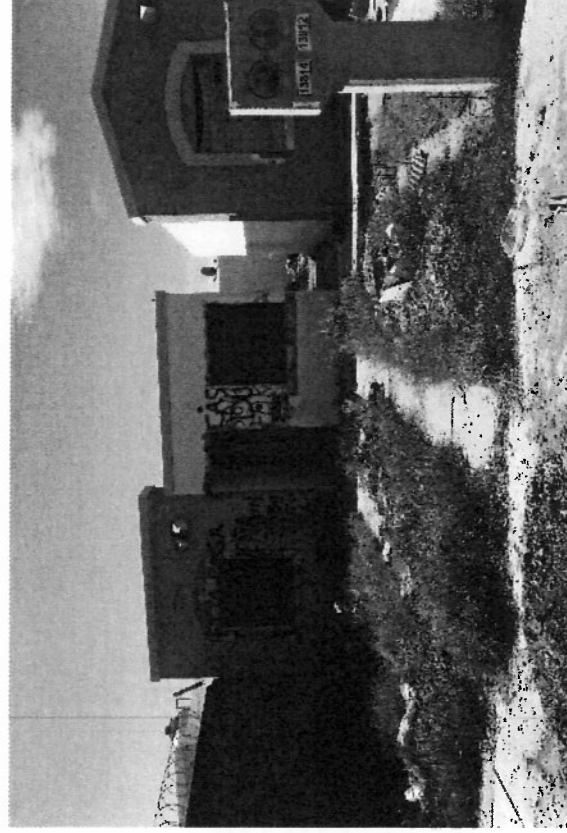TOTAL=**7059.47**

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PRADERAS DE NEBRASKA
COLONIA: PRADERAS DEL SUR


No.: 13802

EXP. TAP-01-5474

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	7	571.67	4001.69
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	357.02	714.04
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

5819.38

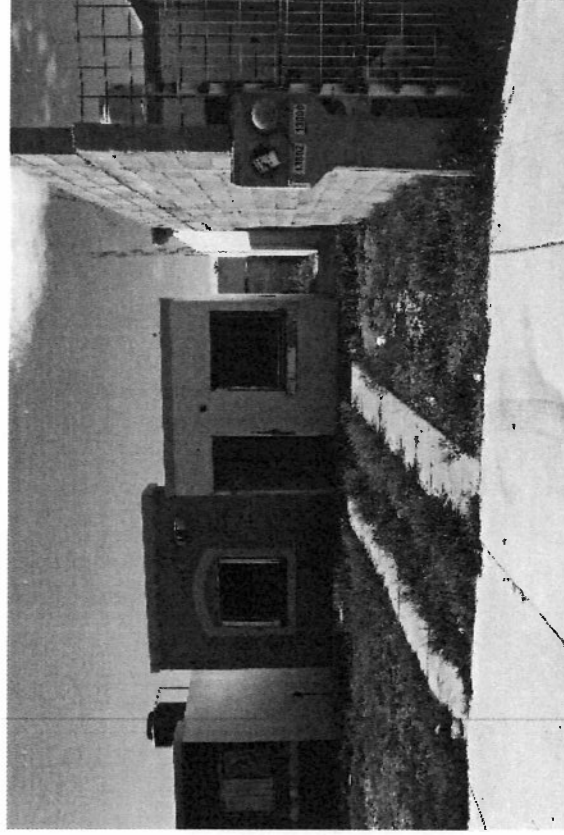

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES****TAPIADO**CALLE: PRADERAS DE NEBRASKA
COLONIA: PRADERAS DEL SUR

No.: 13635

EXP. TAP-01- 5475

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=**4653.23**

**CHIHUAHUA**
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO


CALLE: PARQUE LA TEJA

No.: 11871

COLONIA: JARDINES DE ORIENTE

EXP. TAP-01- 5476

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	8	571.67	4573.36
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

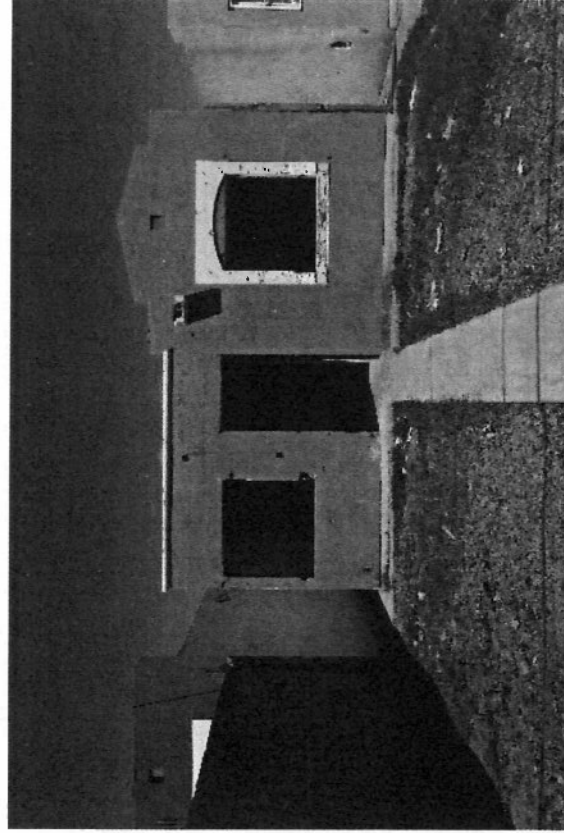TOTAL=**4772.79**

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA EL VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 104

EXP. TAP-01- 5477

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	8	571.67	4573.36
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				5224.9

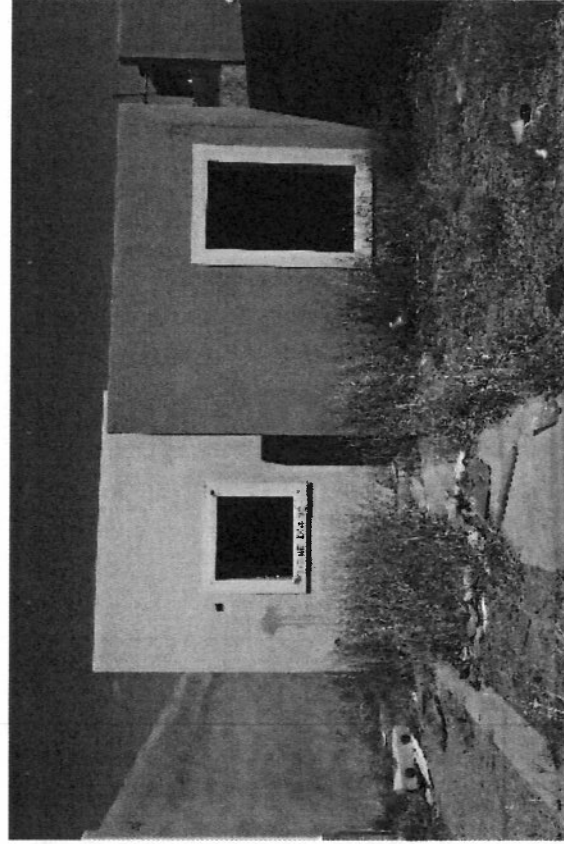

TAPIADOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA EL VALLECILLO
COLONIA:PUNTA ORIENTE

No.: 310

EXP. TAP-01- 5478

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	11	571.67	6288.37
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6939.91





TAPIADO

CALLE: PUNTA EL VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 316

EXP. TAP-01- 5479

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4653.23

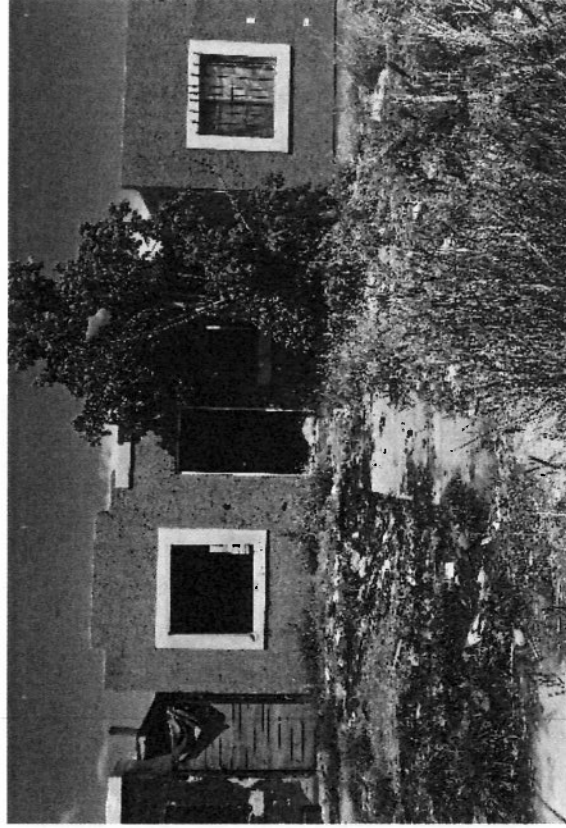



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA EL VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 344

EXP. TAP-01- 5480

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6368.24

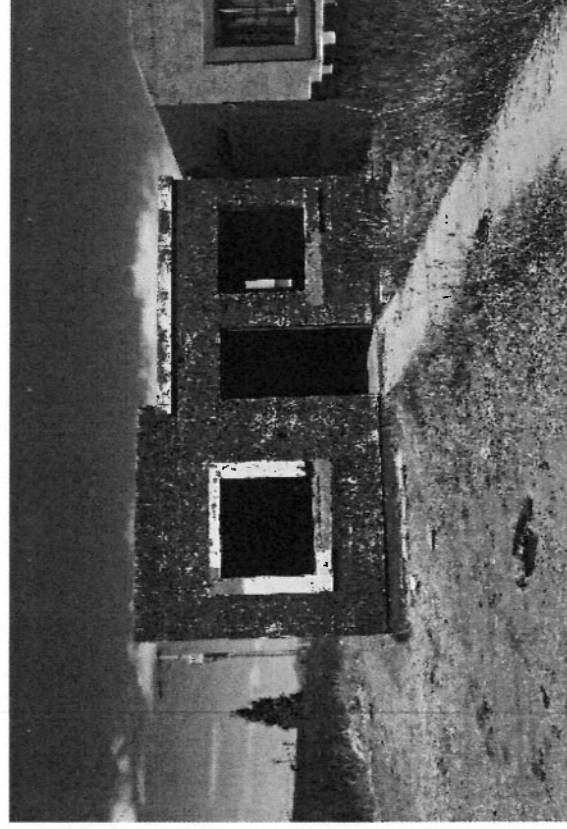



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


CALLE: PUNTA MILPILLAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 428

EXP. TAP-01- 5481

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	12	571.67	6860.04
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				7963.69

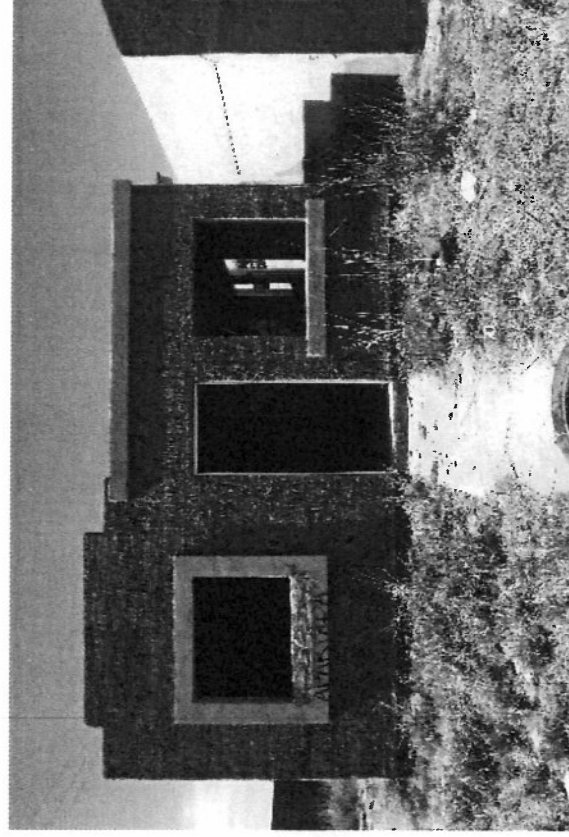

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA MILPILLAS
COLONIA: PUNTA DE ORIENTE


No.: 412

EXP. TAP-01- 5482

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	12	571.67	6860.04
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7963.69

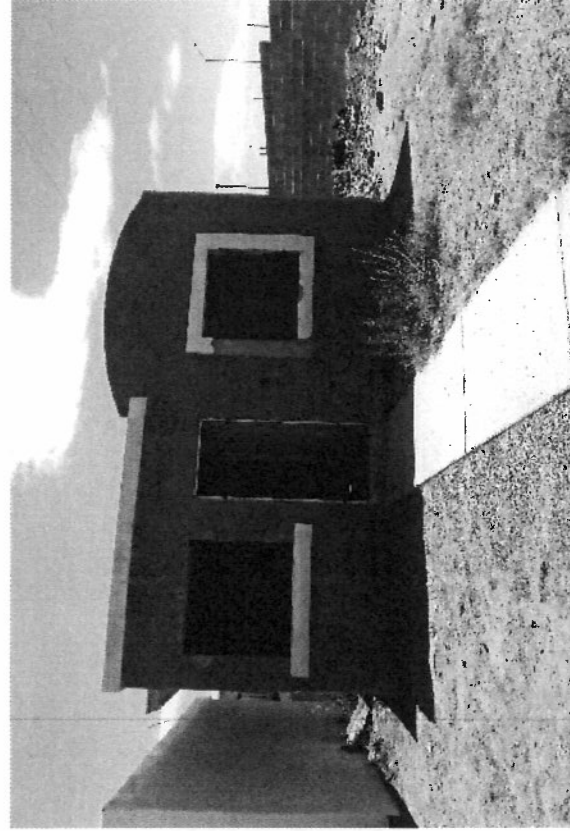



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA EL DIEZ
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 345

EXP. TAP-01- 5483

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6368.24





TAPIADO

CALLE: PUNTA EL DIEZ
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 331

EXP. TAP-01- 5484

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	8	571.67	4573.36
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

5224.9

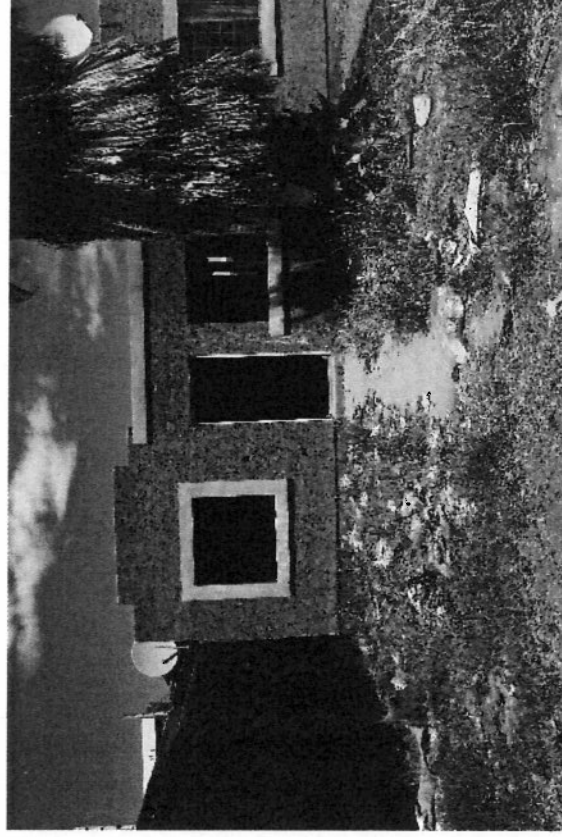



TAPIADO

CALLE: PUNTA EL DIEZ
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 310

EXP. TAP-01- 5485

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	10	571.67	5716.7
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=**6368.24**



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CALLE: PUNTA EL DIEZ
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 303

EXP. TAP-01- 5486

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6820.35





CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 910

EXP. TAP-01- 5487

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6820.35

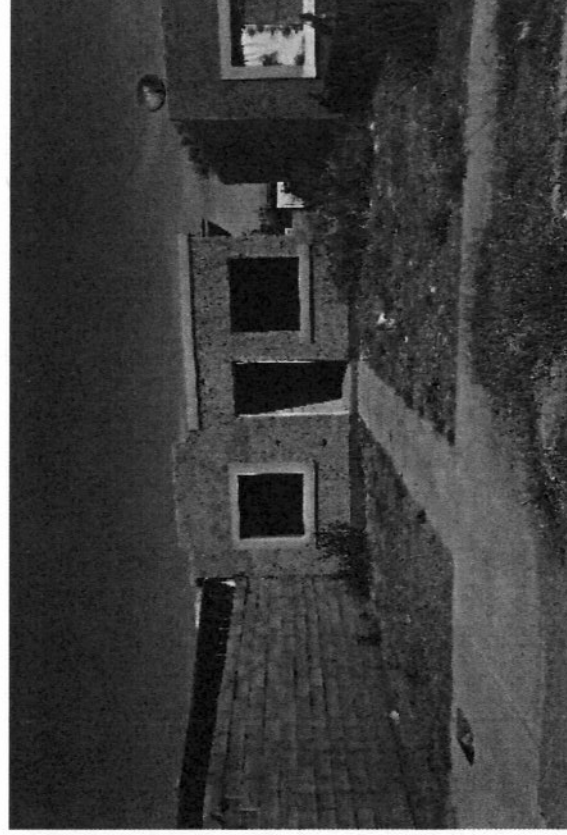



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 914

EXP. TAP-01- 5488

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	12	571.67	6860.04
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7963.69

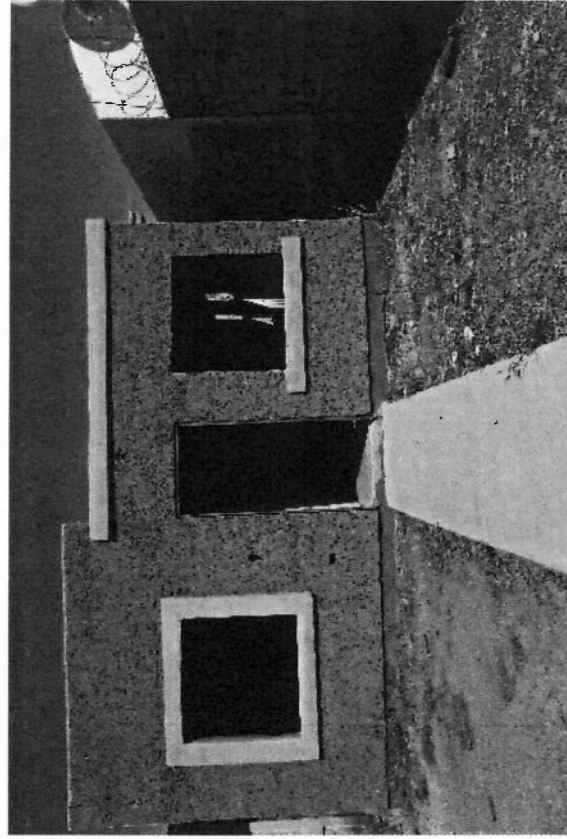

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 920

EXP. TAP-01- 5489

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	2	571.67	1143.34
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

1342.77

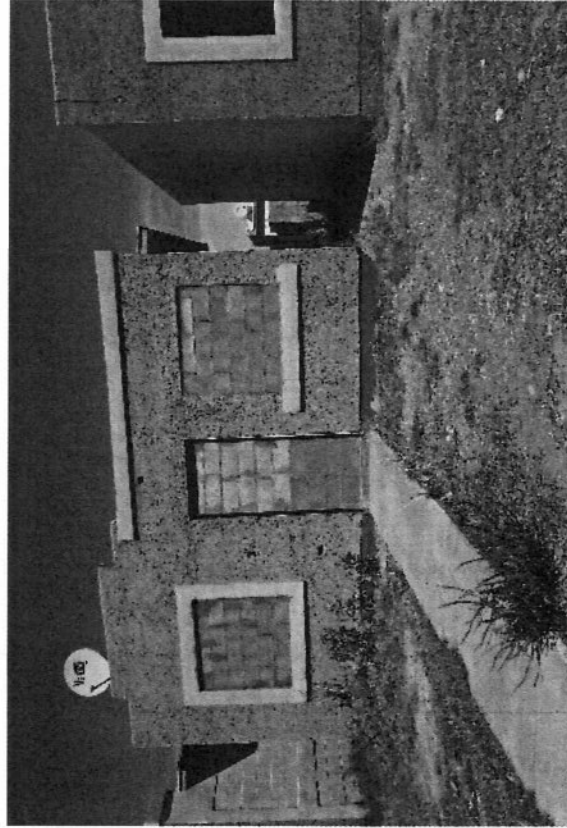

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 922

EXP. TAP-01- 5490

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

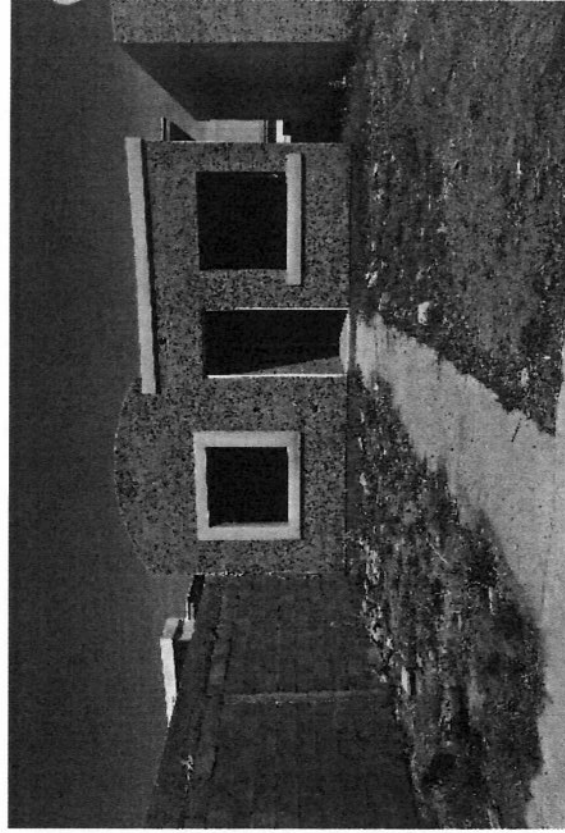


**CHIHUAHUA**
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 924

EXP. TAP-01- 5491

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	8	571.67	4573.36
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

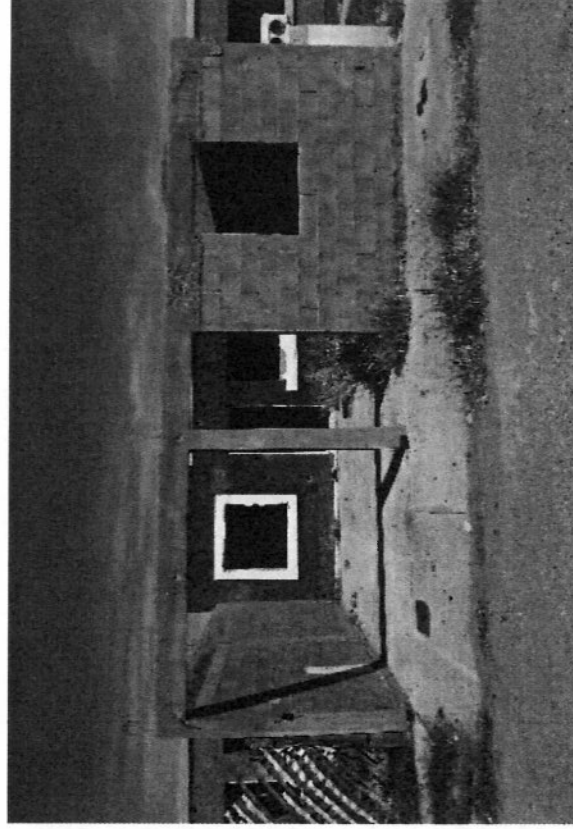TOTAL=**4772.79**

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 932

EXP. TAP-01- 5492

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6368.24

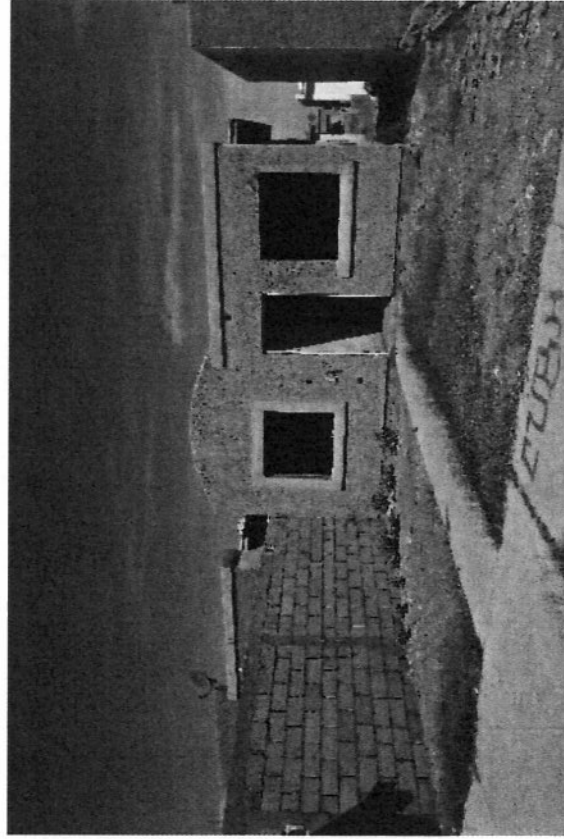

**CHIHUAHUA**
JUNTOS, AÚN, MEJOR CIUDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 934

EXP. TAP-01- 5493

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	0	8.88	0
		1	199.43	199.43

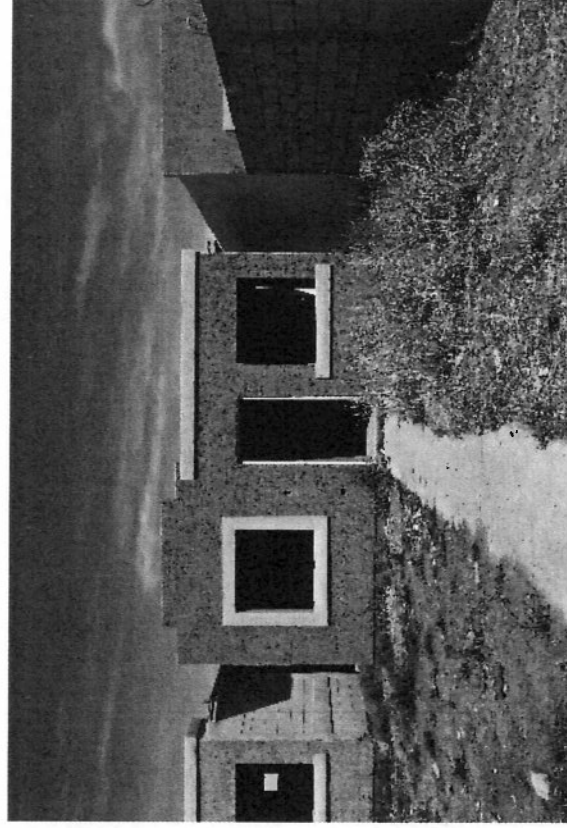TOTAL=**6487.8**

**CHIHUAHUA**
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 938

EXP. TAP-01- 5494

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

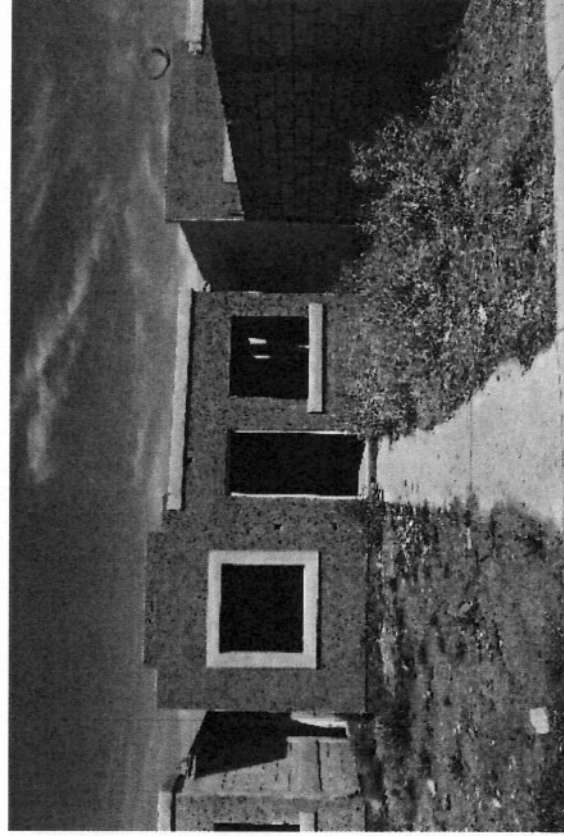TOTAL=**7392.02**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 940

EXP. TAP-01- 5495

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	12	571.67	6860.04
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7963.69

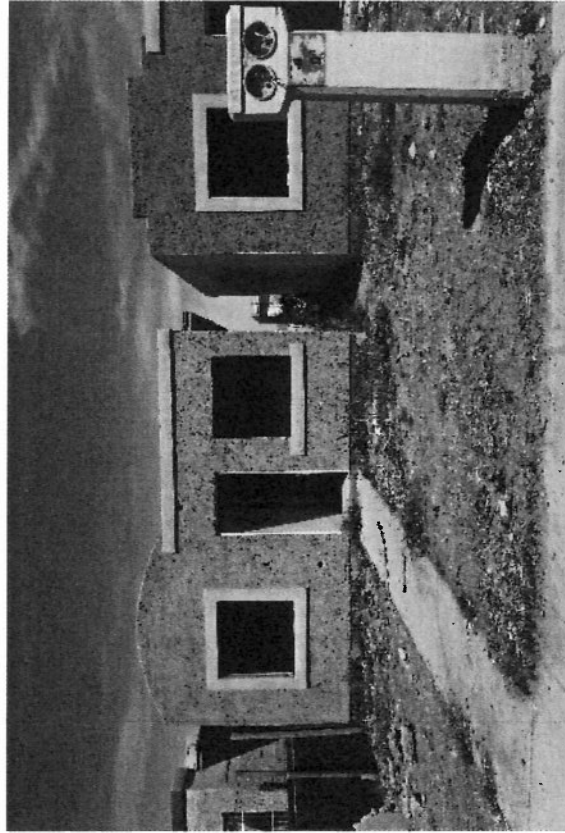



TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 946

EXP. TAP-01- 5496

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	12	571.67	6860.04
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7963.69

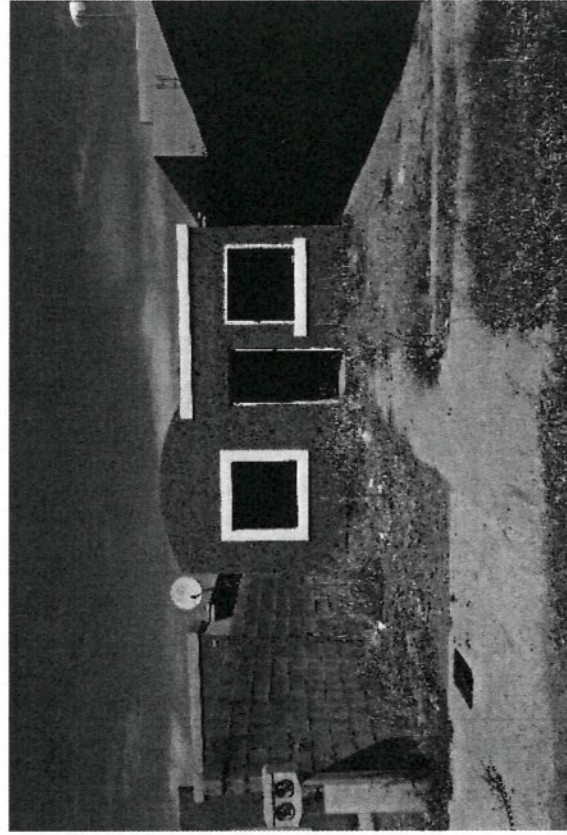




TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 956

EXP. TAP-01- 5497

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	2	571.67	1143.34
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				1342.77

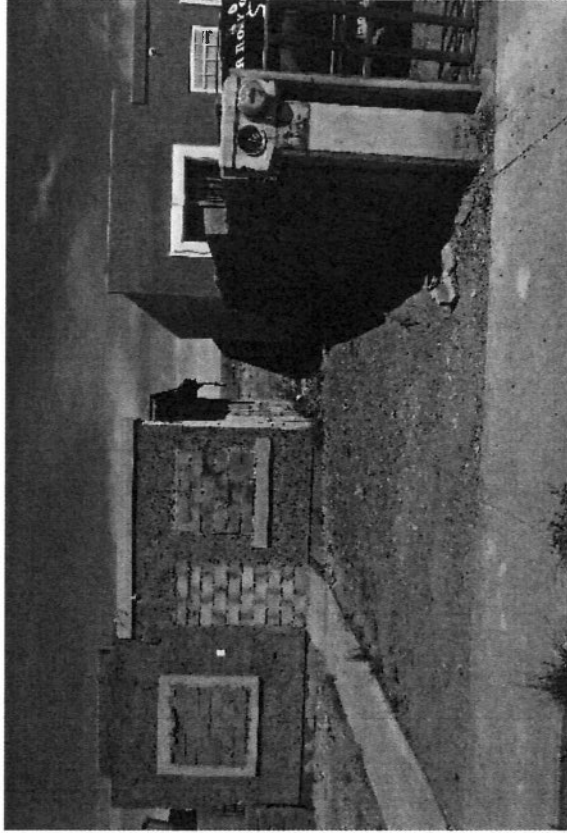

**CHIHUAHUA**
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA VALLECILLO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 960

EXP. TAP-01- 5498

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	7	571.67	4001.69
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO				
FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

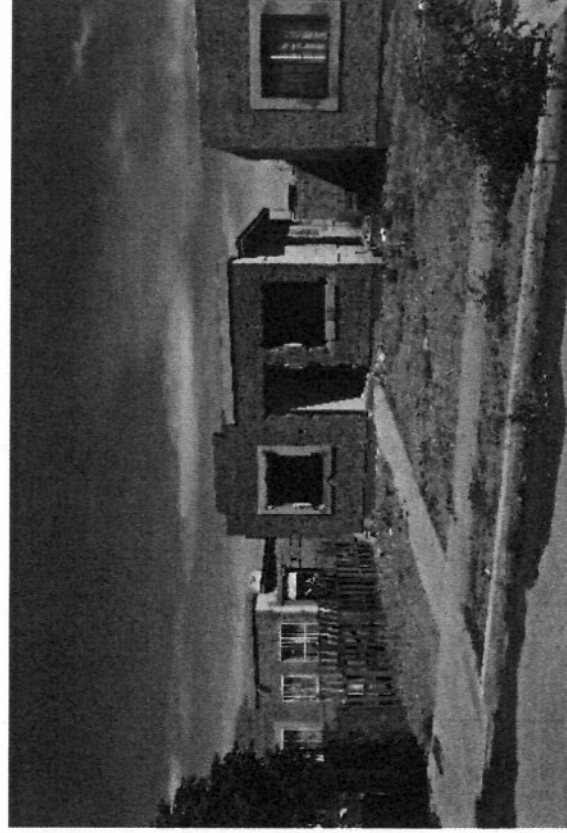




TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 949

EXP. TAP-01- 5499

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				7392.02

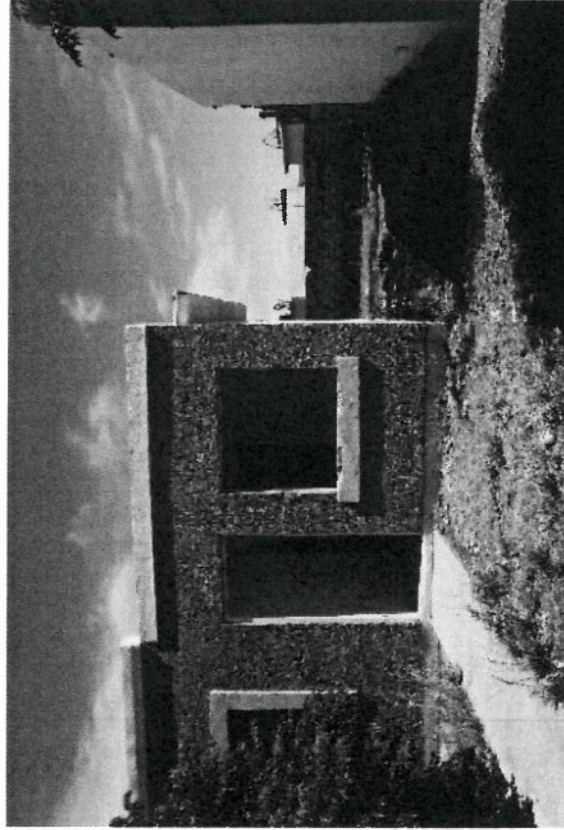

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 943

EXP. TAP-01- 5500

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	12	571.67	6860.04
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7963.69

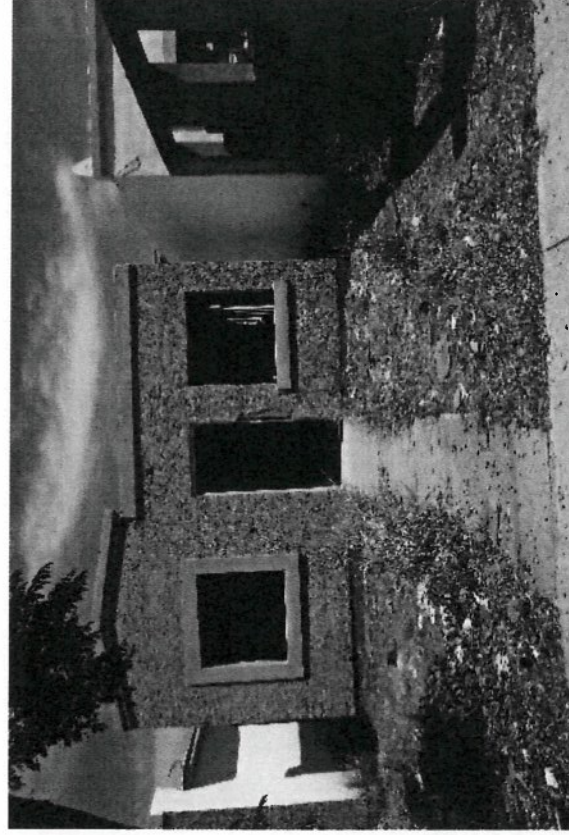



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 939

EXP. TAP-01- 5502

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	12	571.67	6860.04
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				7963.69

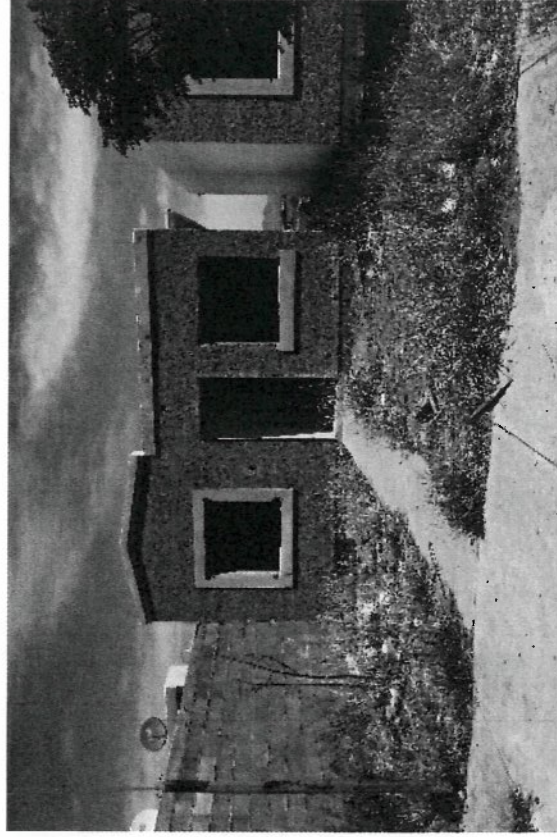



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 237

EXP. TAP-01- 5503

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				7392.02

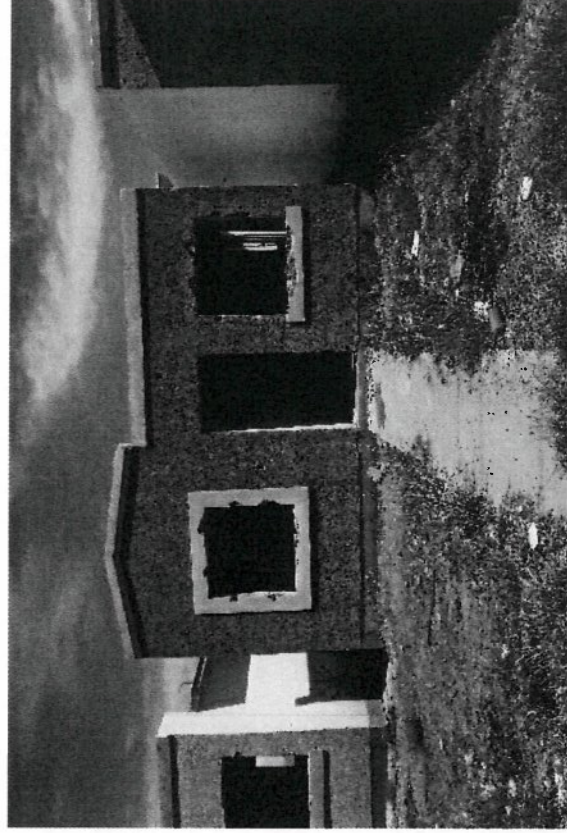



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 235

EXP. TAP-01- 5504

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7392.02






TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 233

EXP. TAP-01- 5505

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

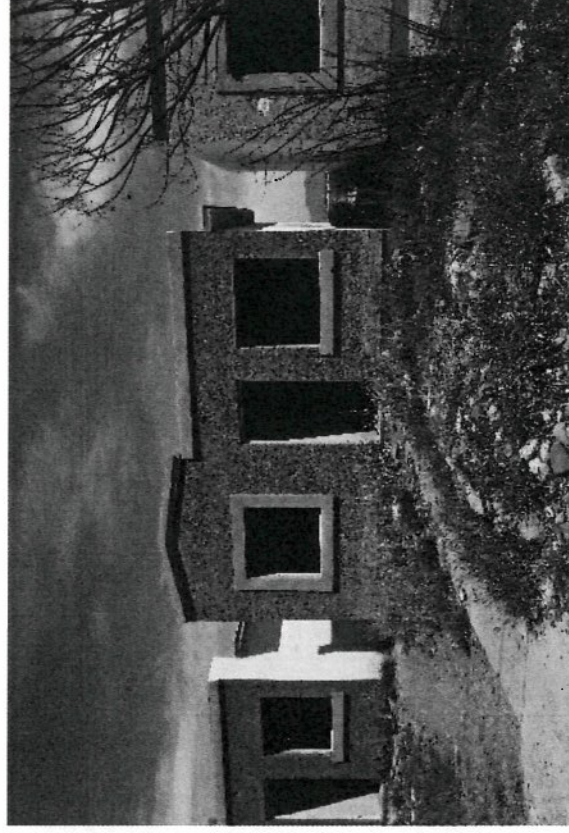TOTAL=**7392.02**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 231

EXP. TAP-01- 5506

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7392.02

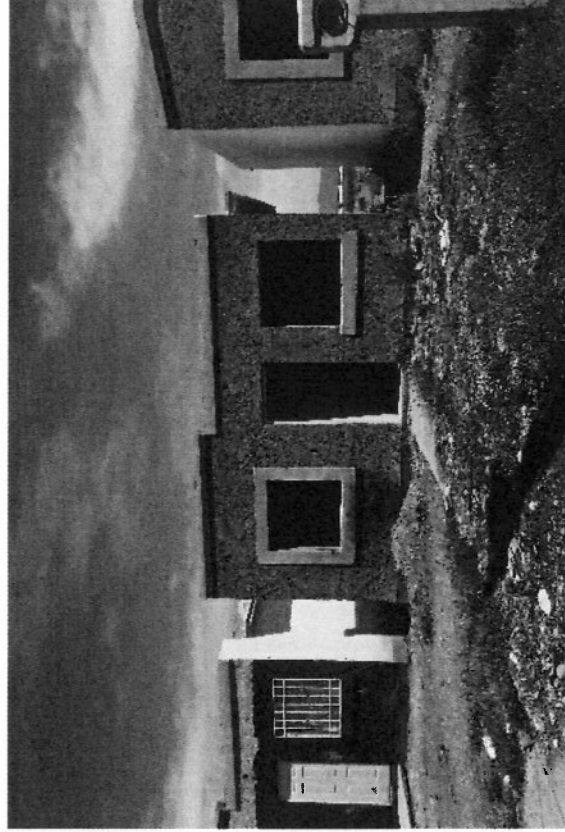

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 223

EXP. TAP-01- 5507

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7392.02

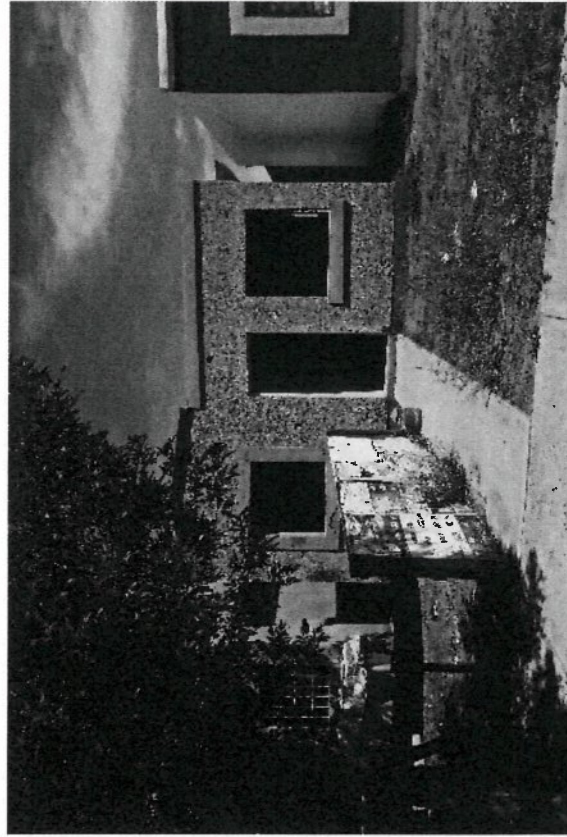

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 209

EXP. TAP-01- 5508

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7392.02

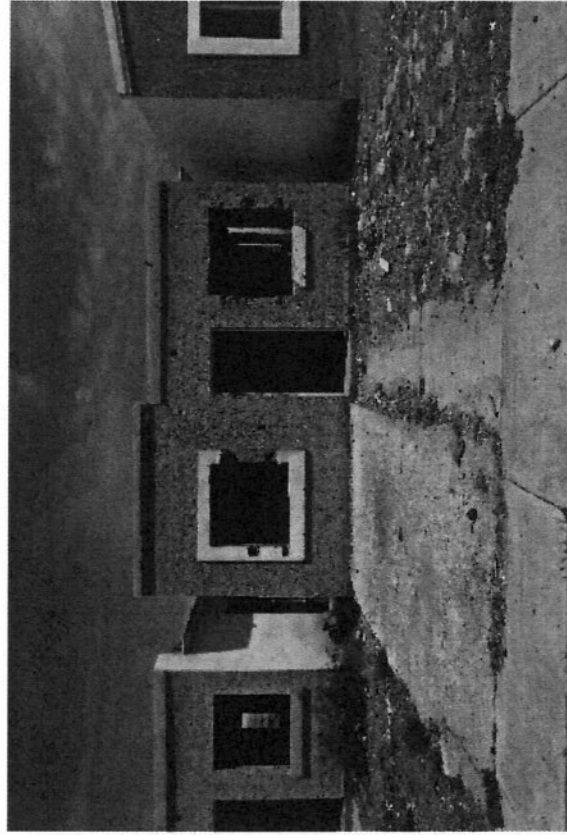


**CHIHUAHUA**
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 207

EXP. TAP-01- 5509

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	11	571.67	6288.37
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				7392.02

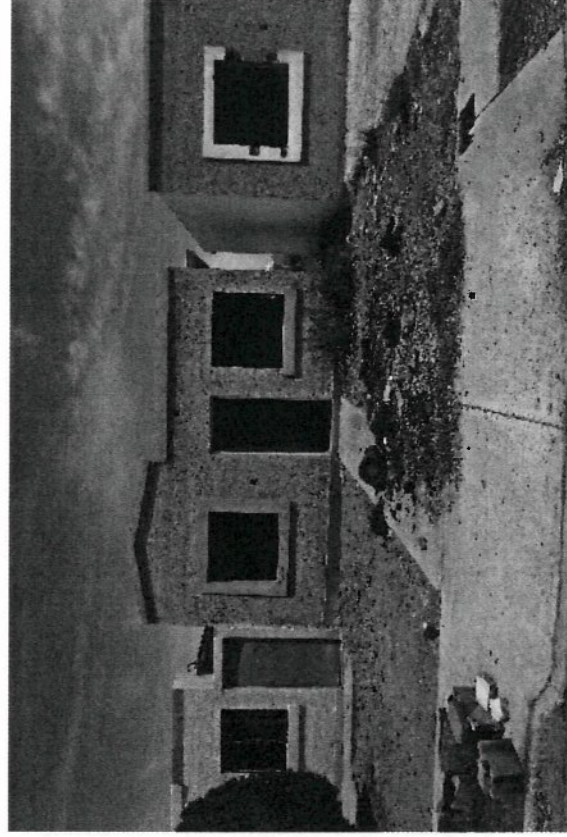



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 123

EXP. TAP-01- 5510

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	8	571.67	4573.36
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	3	452.11	1356.33
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m2	0	8.88	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.				
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6129.12





TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 121

EXP. TAP-01- 5511

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	8	571.67	4573.36
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	3	452.11	1356.33
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6129.12





TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 109

EXP. TAP-01- 5512

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	8	571.67	4573.36
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	3	452.11	1356.33
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6129.12





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2013

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 107

EXP. TAP-01- 5513

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	8	571.67	4573.36
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	3	452.11	1356.33
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=**6129.12**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad.
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 204

EXP. TAP-01- 5514

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	6	571.67	3430.02
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

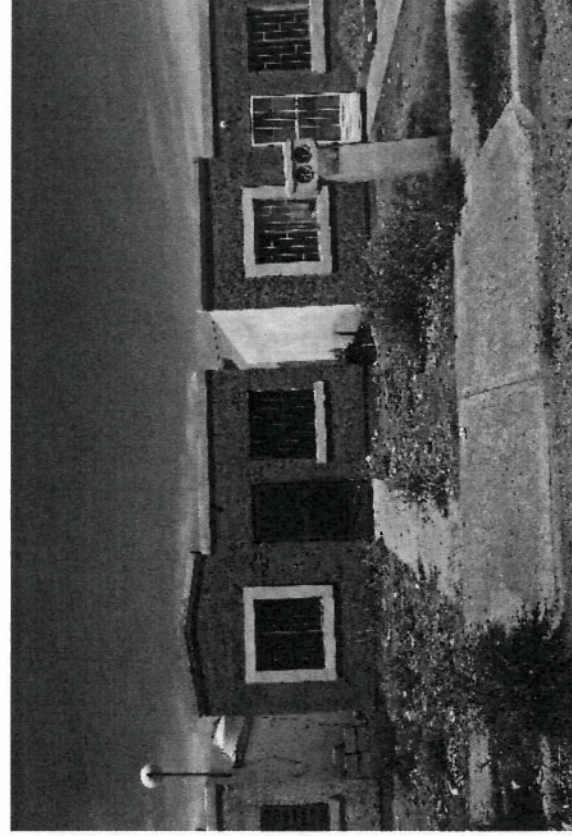TOTAL=**4533.67**

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 206

EXP. TAP-01- 5515

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	6	571.67	3430.02
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4533.67

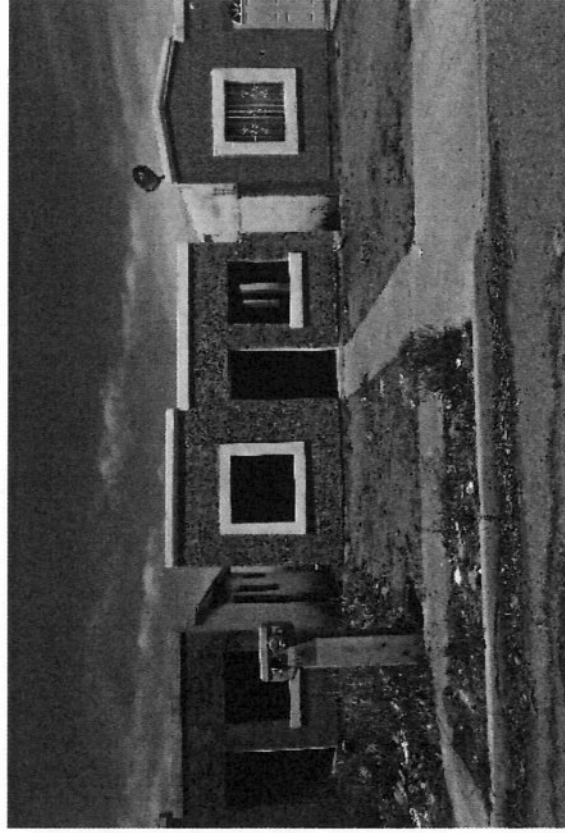



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 222

EXP. TAP-01- 5516

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	6	571.67	3430.02
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4533.67

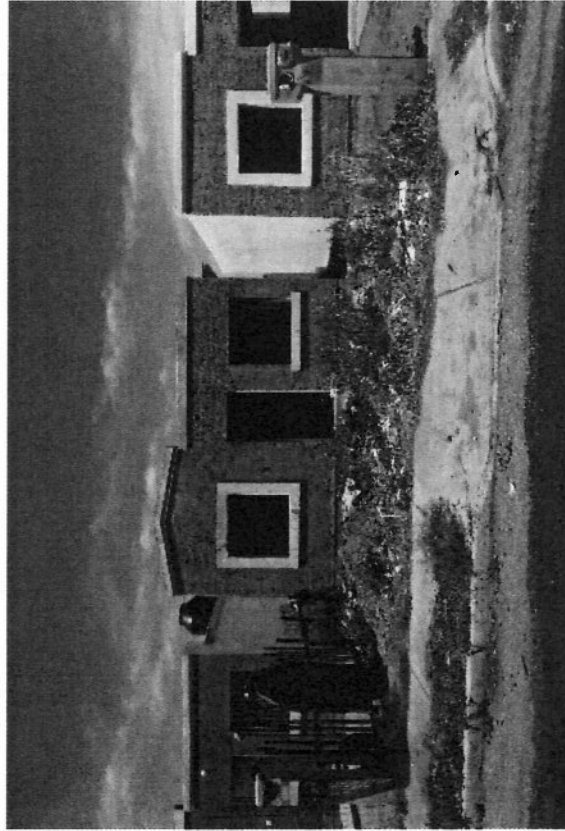

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



TAPIADO

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 248

EXP. TAP-01- 5517

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	0	8.88	0
		1	199.43	199.43

TOTAL=

4653.23

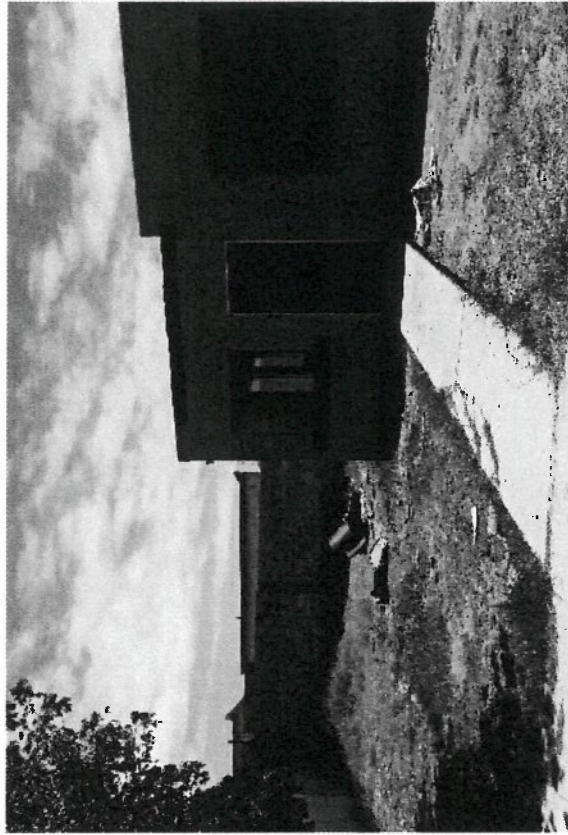

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 250

EXP. TAP-01- 5518

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	11	571.67	6288.37
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7392.02

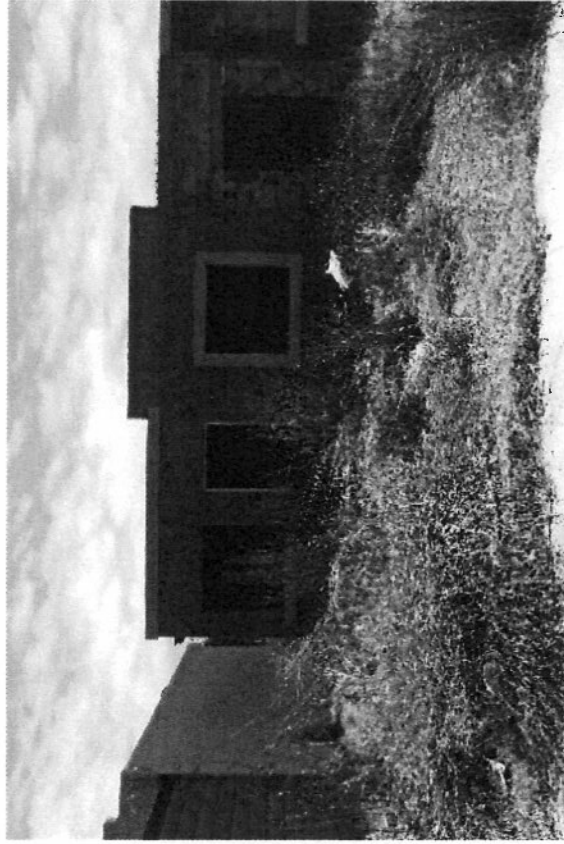

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 264

EXP. TAP-01- 5519

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6820.35



TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 947

EXP. TAP-01- 5520

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

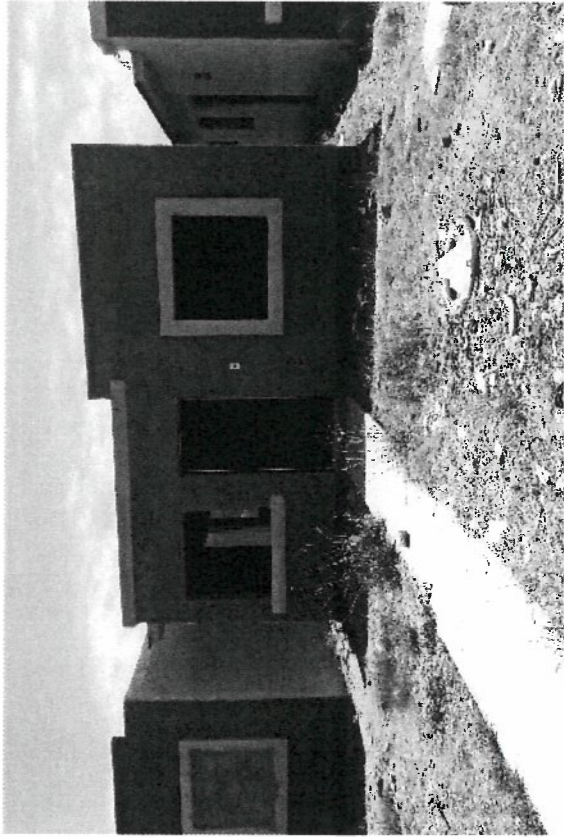

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 943

EXP. TAP-01- 5521

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

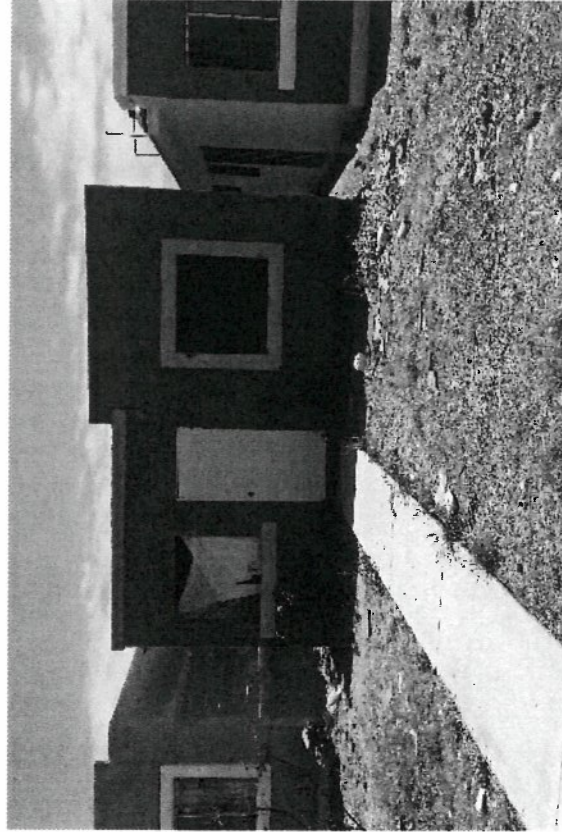

**CHIHUAHUA**
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 941

EXP. TAP-01- 5522

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

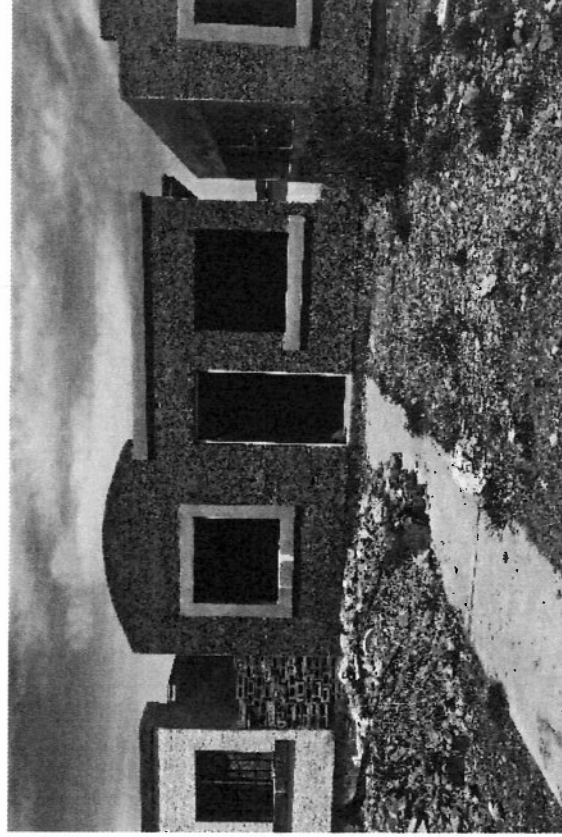TOTAL=**4653.23**

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 935

EXP. TAP-01- 5523

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4653.23

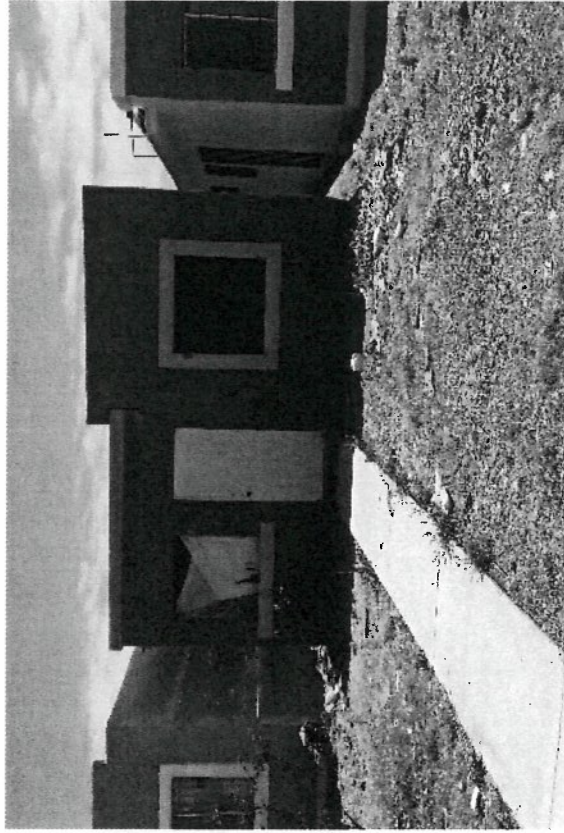

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 928

EXP. TAP-01- 5524

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	11	571.67	6288.37
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

7392.02

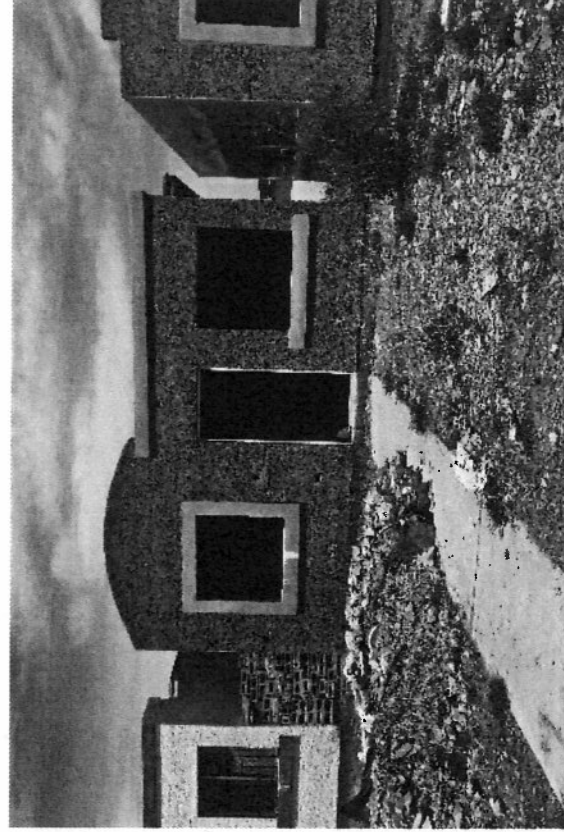



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 924

EXP. TAP-01- 5525

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	2	571.67	1143.34
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				1342.77

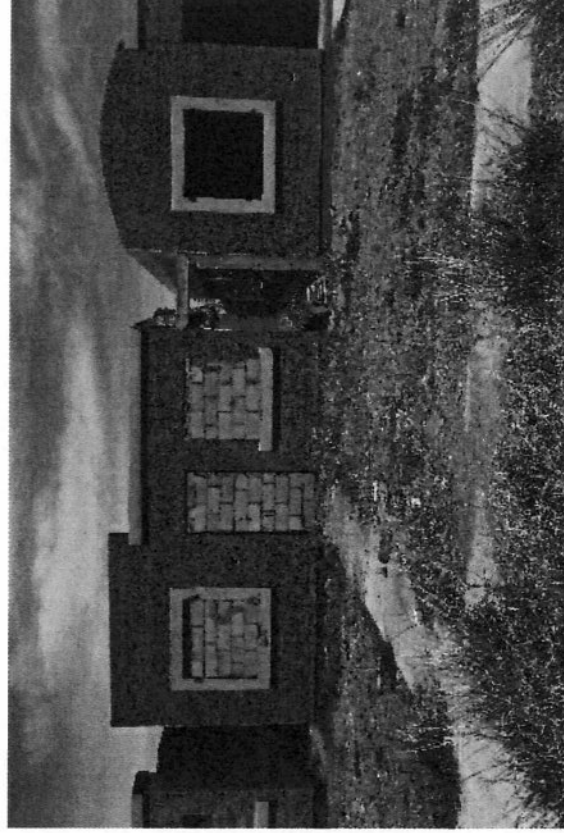

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PPUNTA ORIENTE


No.: 922

EXP. TAP-01- 5526

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

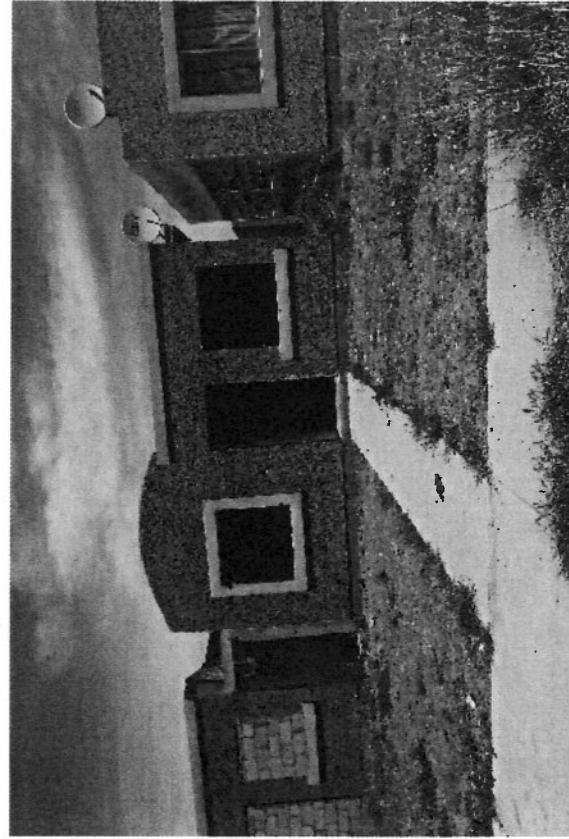



TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 929

EXP. TAP-01- 5527

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.	PIEZA	0	452.11	0
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m3	0	101.74	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m2	0	8.88	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

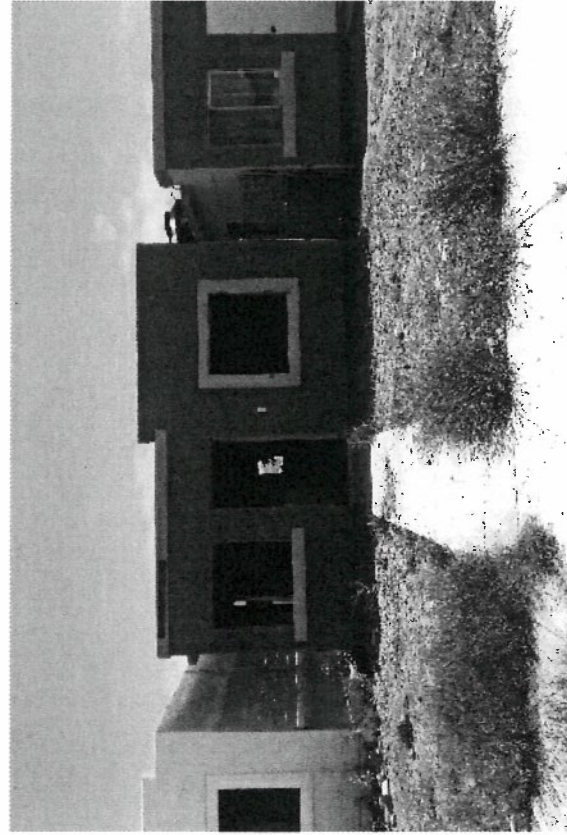

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 927

EXP. TAP-01- 5528

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12



TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 925

EXP. TAP-01- 5529

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

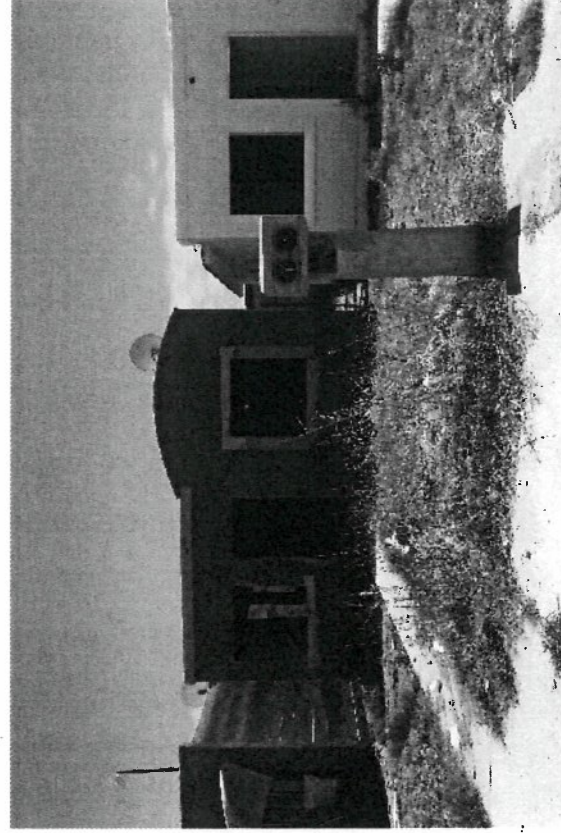



TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 912

EXP. TAP-01- 5530

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

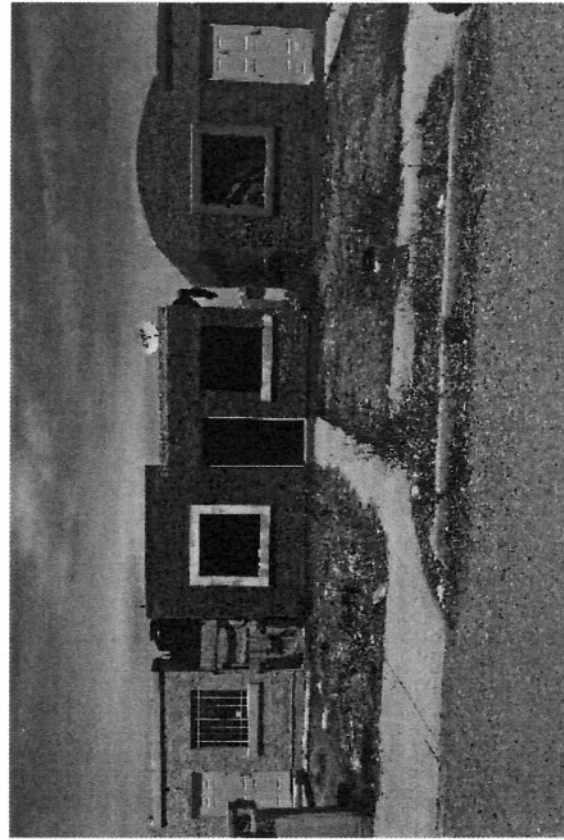




CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 910

EXP. TAP-01- 5531

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

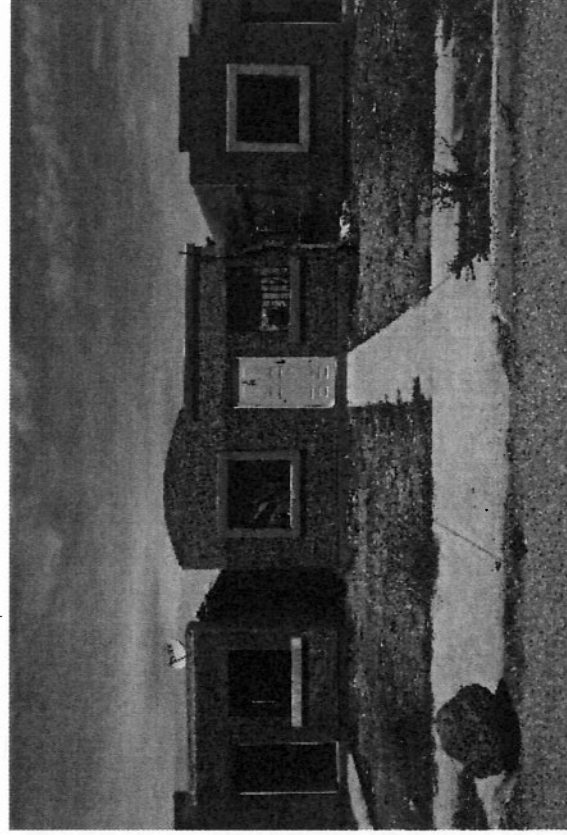TOTAL=**4201.12**

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**CHIHUAHUA**
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 908

EXP. TAP-01- 5532

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4201.12

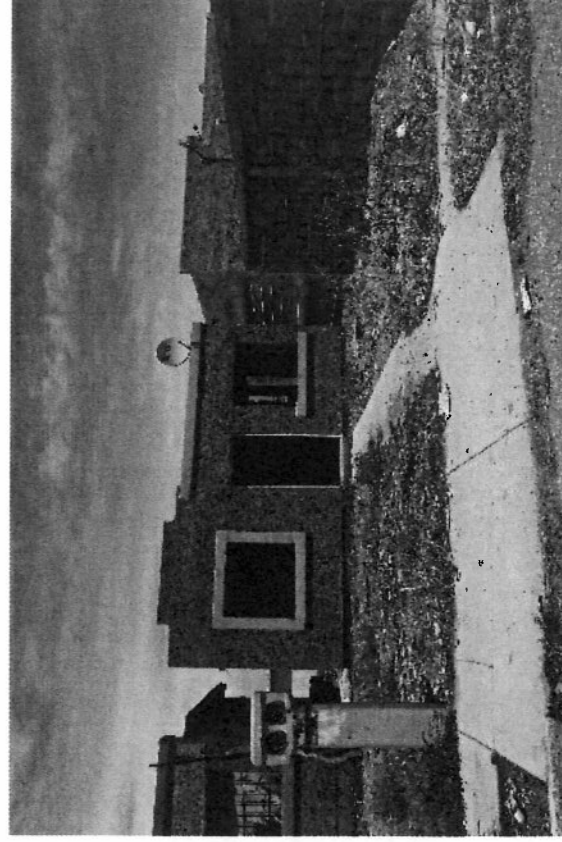

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 915

EXP. TAP-01- 5533

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

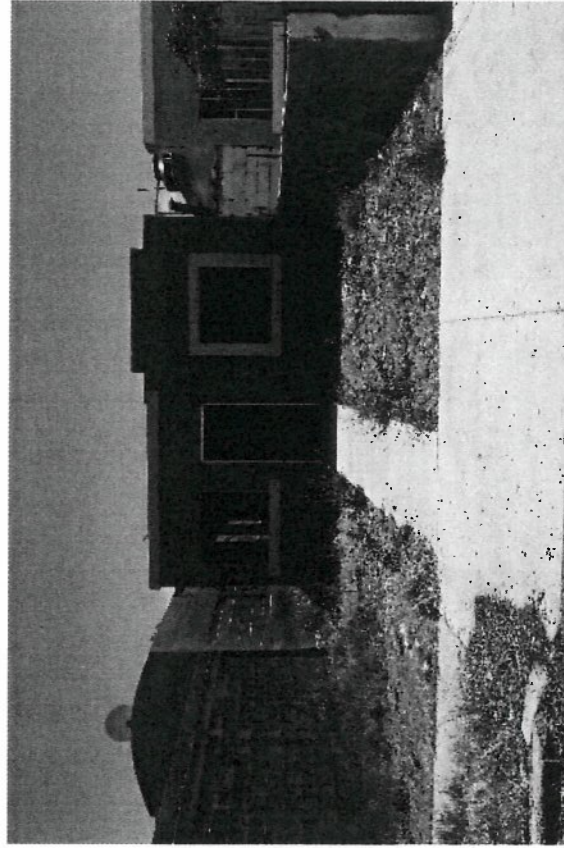

TAPIADOS



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 911

EXP. TAP-01- 5534

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4201.12

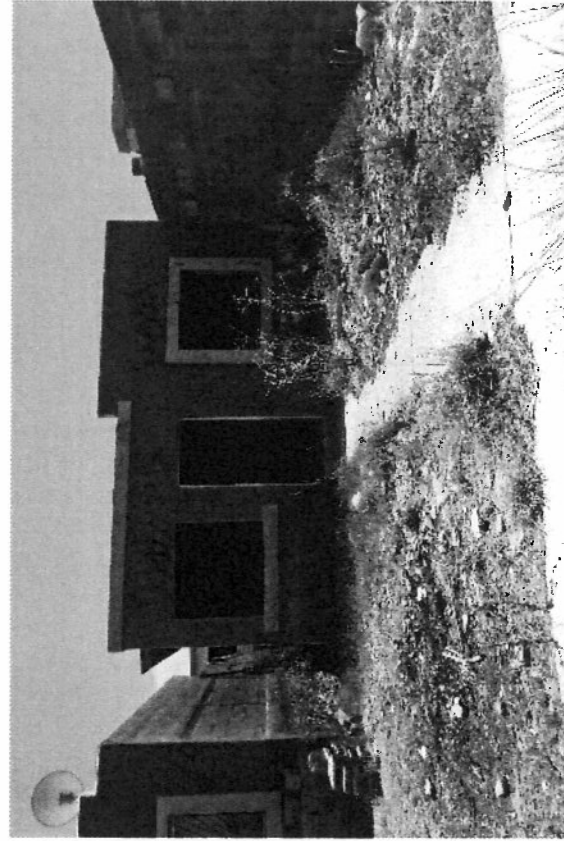



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 902

EXP. TAP-01 - 5535

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

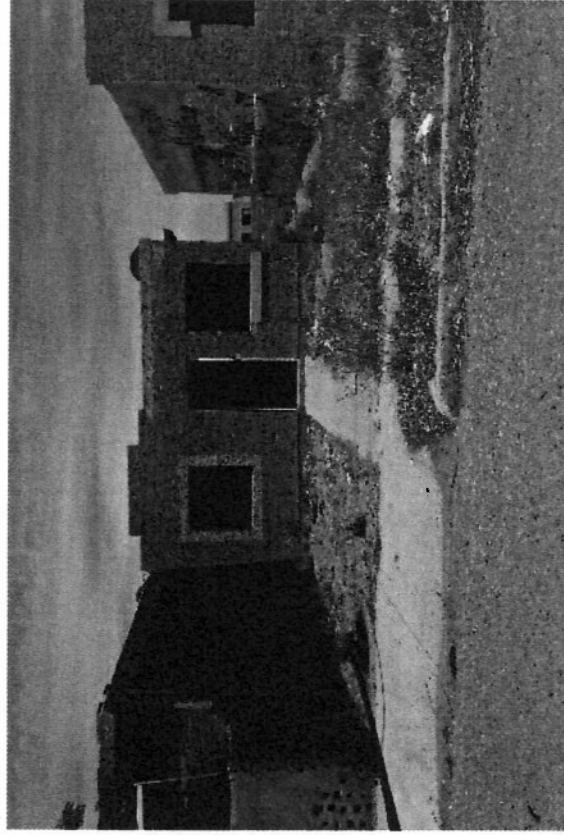



CHIHUAHUA
Juntos, hacia mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



TAPIADO

CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 900

EXP. TAP-01- 5536

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	9	571.67	5145.03
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				5344.46

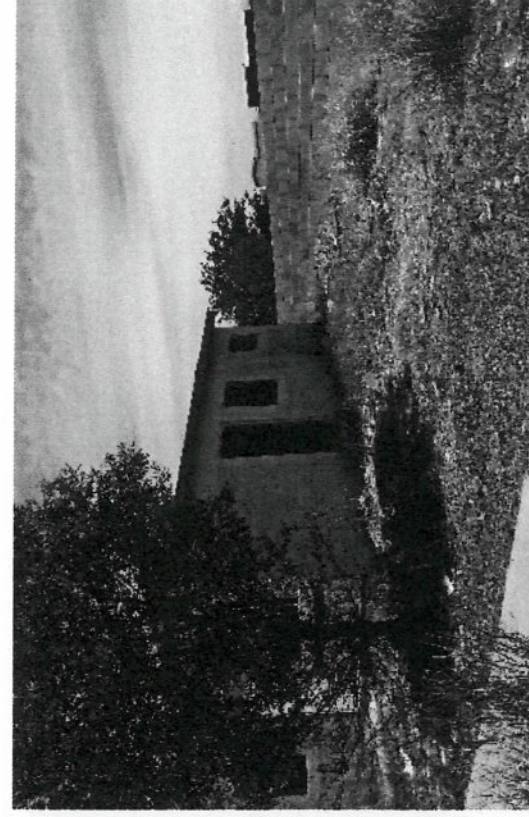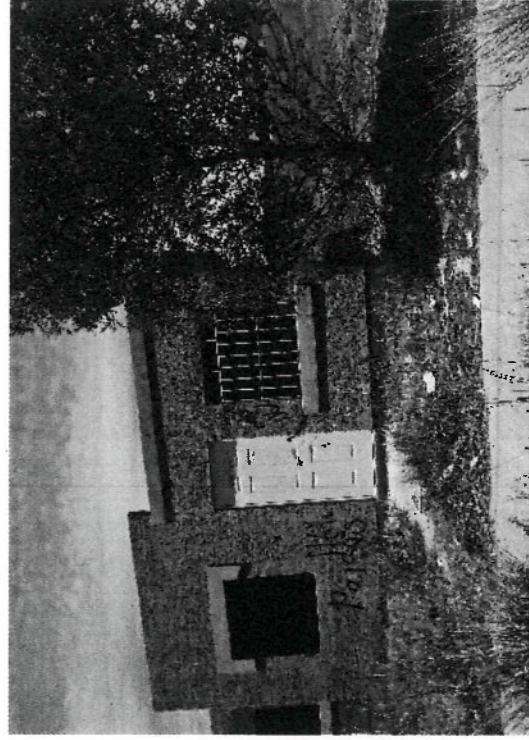

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CHIHUAHUA
Unidos para mejorar la calidad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018CALLE: PUNTA CHINIPAS
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 905

EXP. TAP-01- 5537

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	357.02	714.04
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				5367.27

casa azul con amarillo




TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA DE ORIENTE

No.: 334

EXP. TAP-01- 5538

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	10	571.67	5716.7
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6368.24

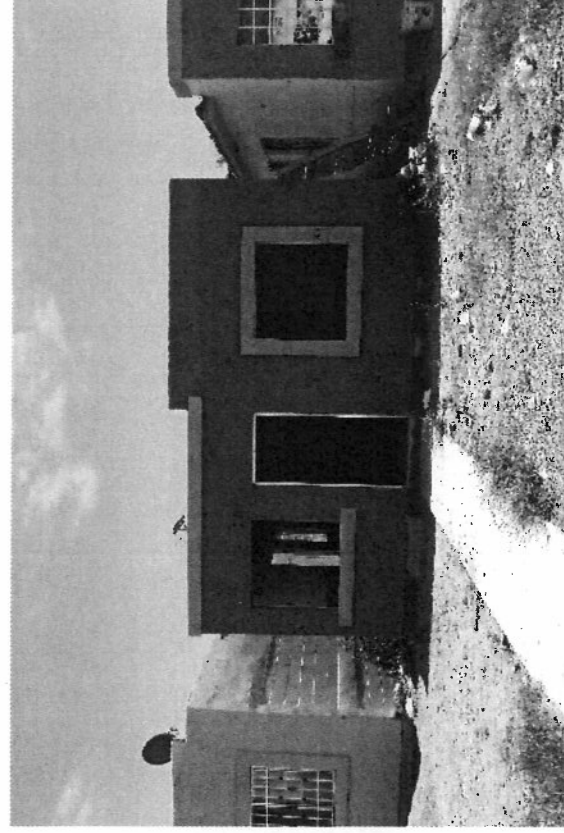



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 332

EXP. TAP-01- 5539

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	10	571.67	5716.7
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

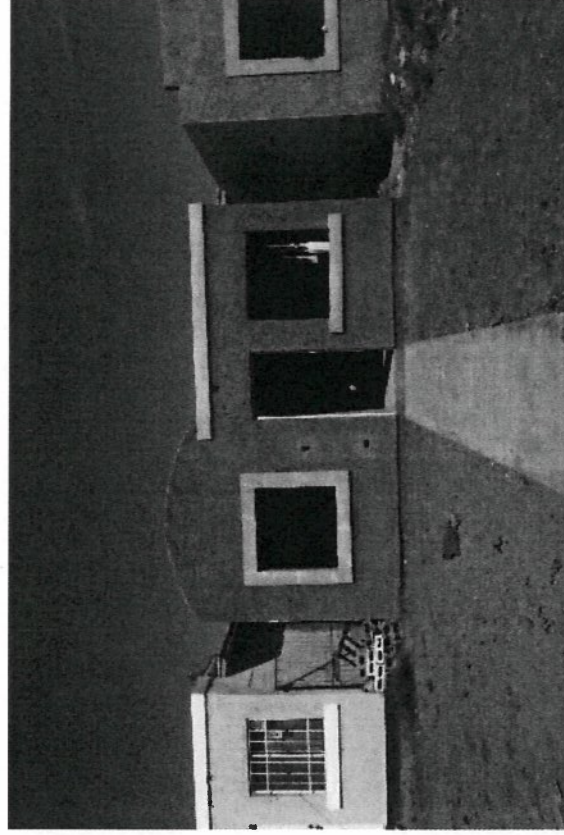TOTAL=**6820.35**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019


TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 330

EXP. TAP-01- 5540

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	10	571.67	5716.7
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	2	452.11	904.22
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

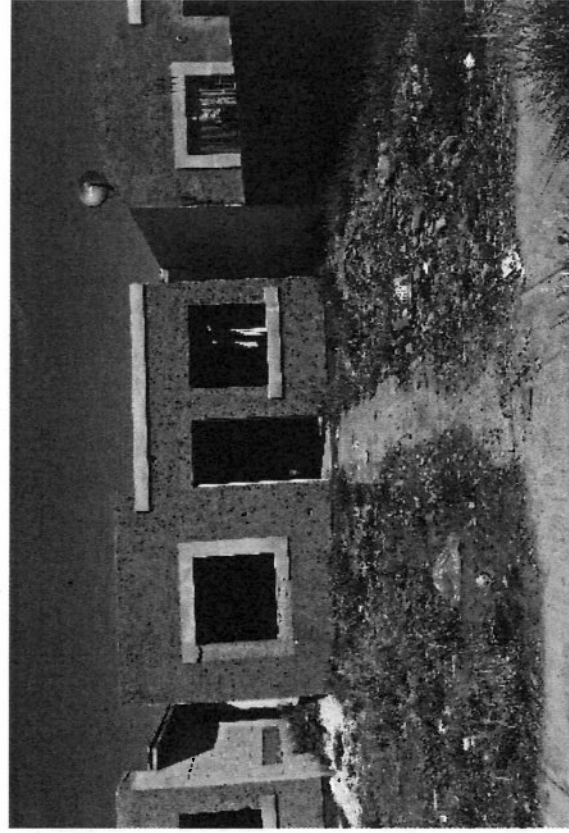TOTAL=**6820.35**

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 329

EXP. TAP-01- 5541

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	5	571.67	2858.35
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	0	8.88	0
		1	199.43	199.43
TOTAL=				3509.89

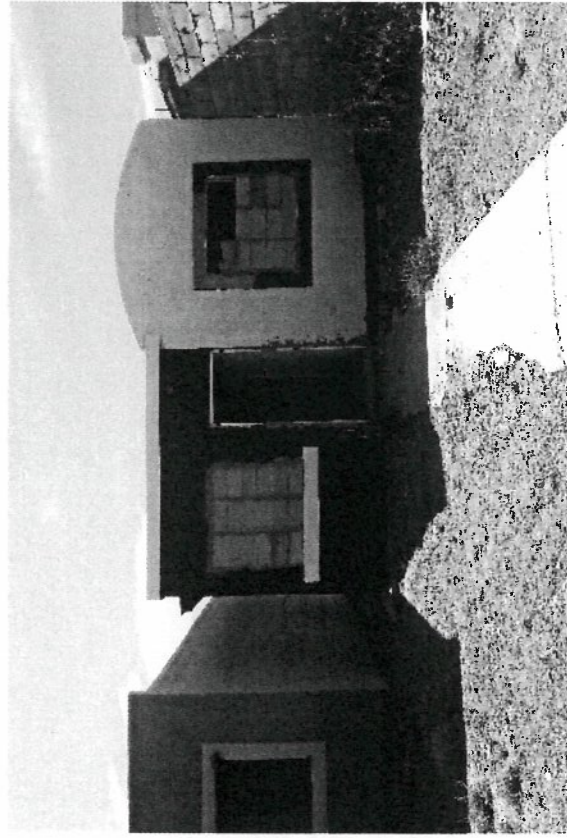


**CHIHUAHUA**
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 327

EXP. TAP-01-5542

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	10	571.67	5716.7
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

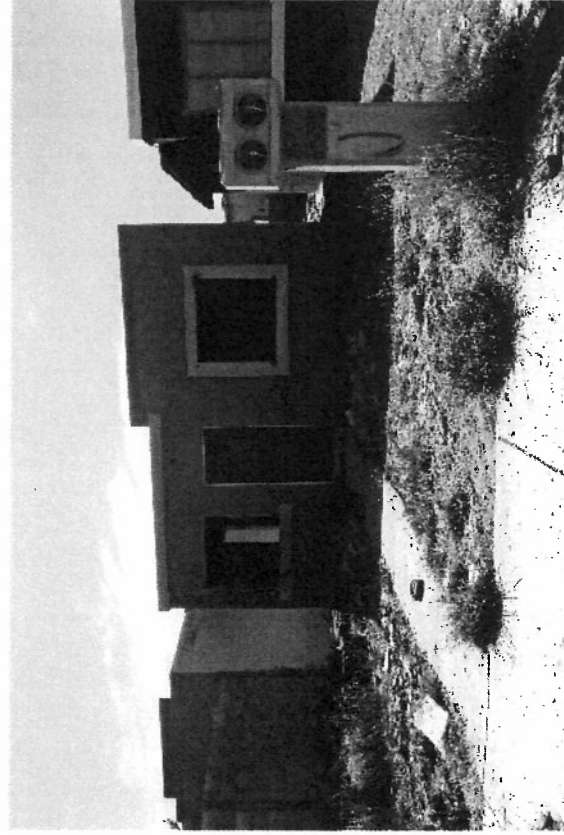TOTAL=**6368.24**

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 326

EXP. TAP-01- 5543

TAPIADO

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6368.24

SIN FOTO

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO

COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 324

EXP. TAP-01- 5544

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6368.24

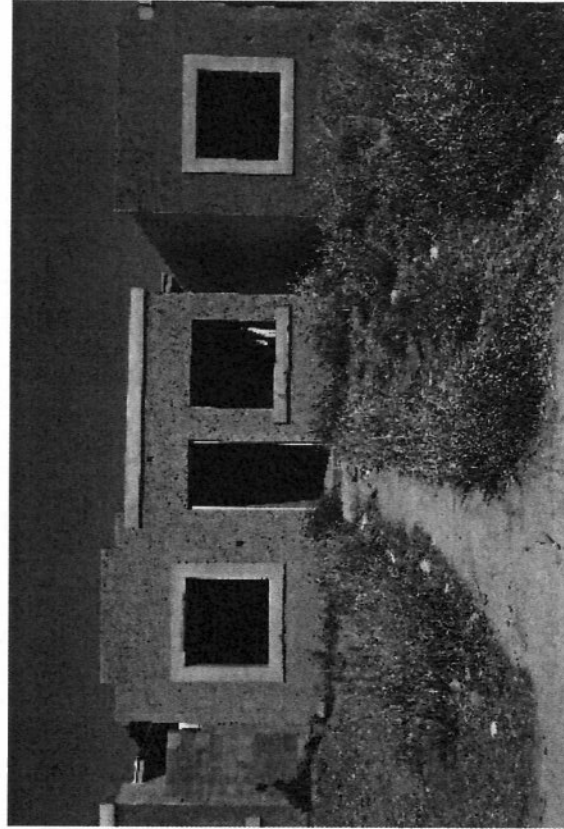

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 325

EXP. TAP-01- 5545

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6368.24



TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 322

EXP. TAP-01- 5546

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA\ RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

6368.24

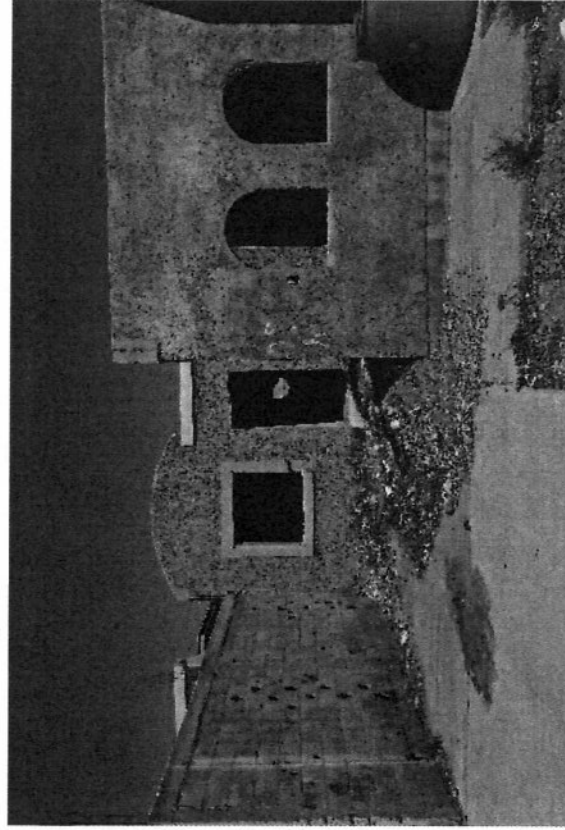

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 318

EXP. TAP-01- 5547

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	2	571.67	1143.34
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

1342.77



TAPIADOS



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 316

EXP. TAP-01- 5548

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

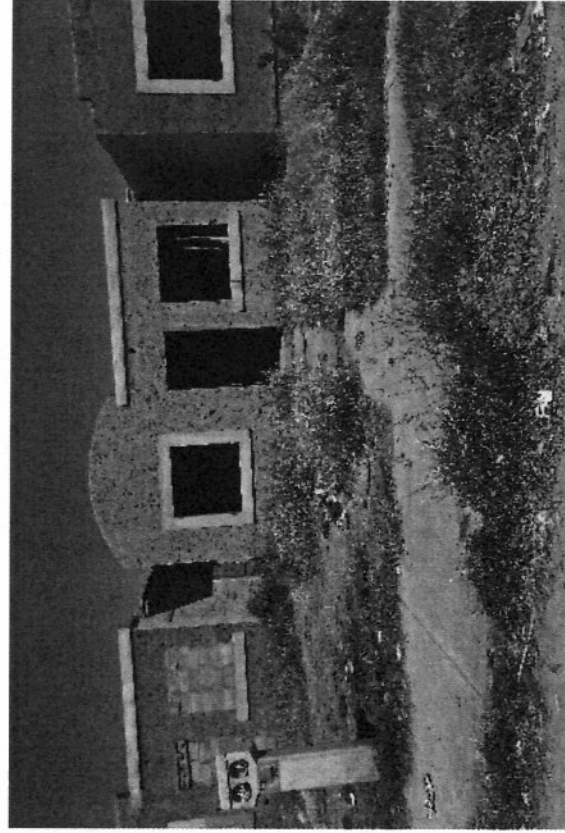

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 314

EXP: TAP-01- 5549

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

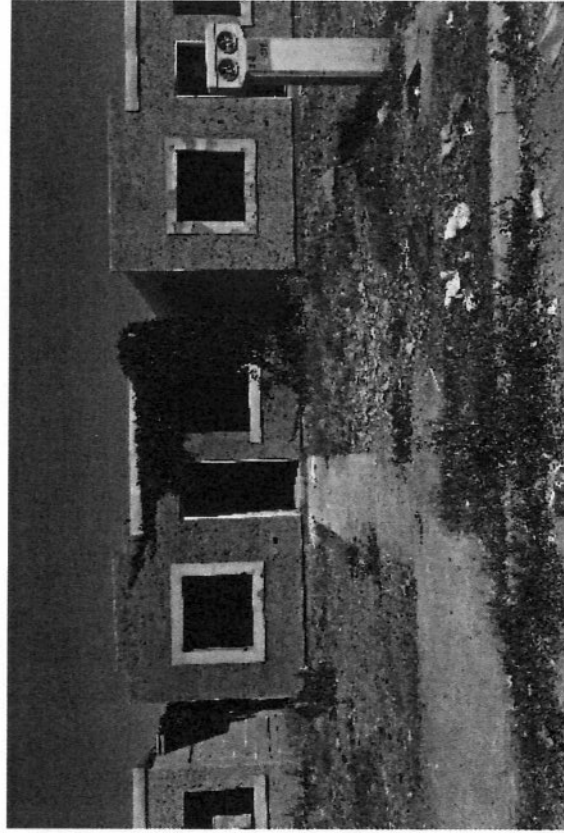

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 312

EXP. TAP-01- 5550

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

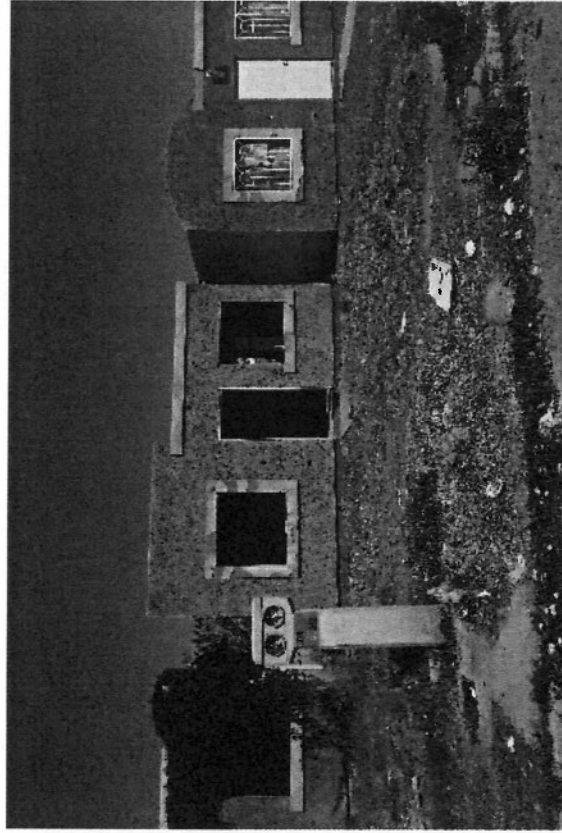

TAPIADOS



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO

COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 315

EXP. TAP-01- 5551

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.	PIEZA	0	452.11	0
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m3	0	101.74	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m2	0	8.88	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12



TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 313

EXP. TAP-01- 5552

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12





CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 306

EXP. TAP-01 - 5553

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12





CHIHUAHUA
Juntos una mayoría
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 401

EXP. TAP-01- 5554

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4201.12

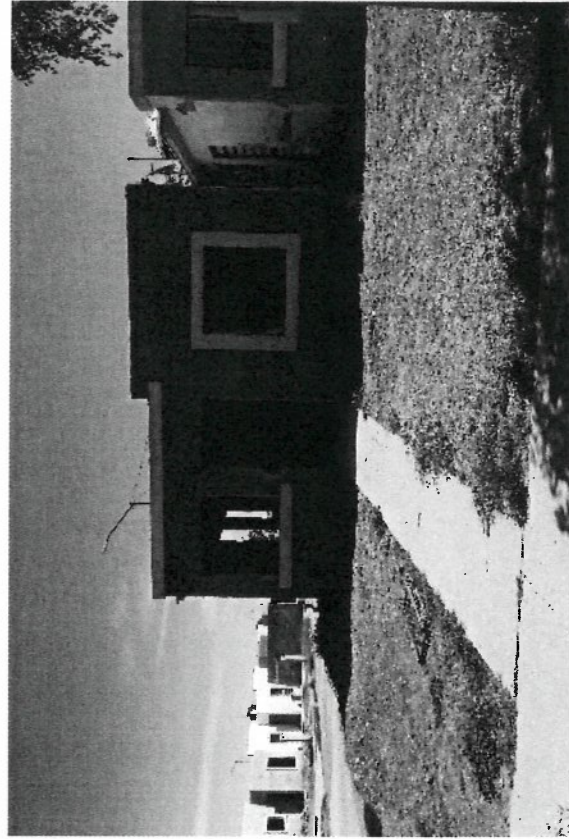

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 405

EXP. TAP-01- 5555

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4653.23

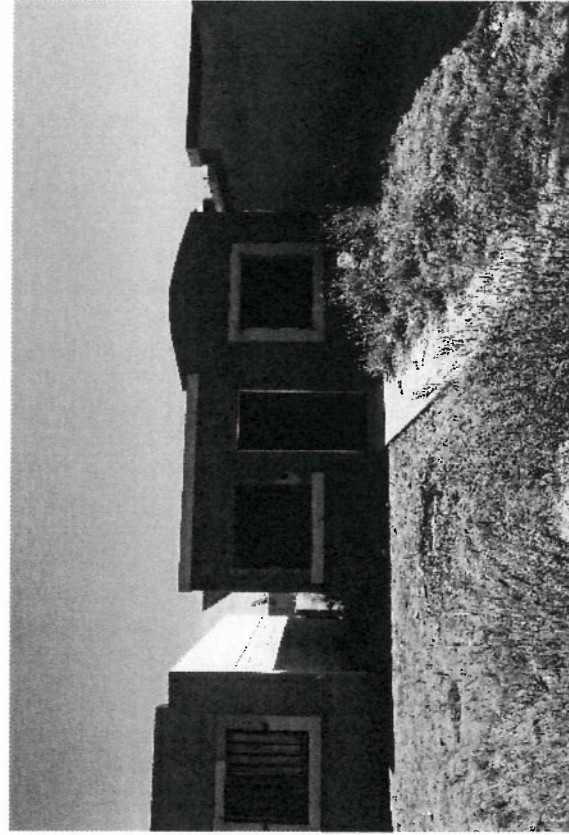

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 413

EXP. TAP-01- 5556

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

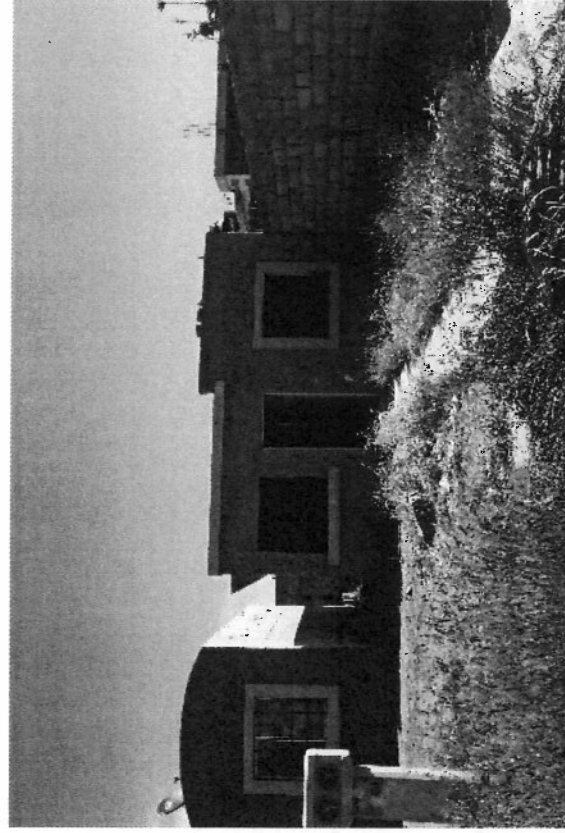

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 296

EXP. TAP-01- 5557

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	9	571.67	5145.03
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

5796.57

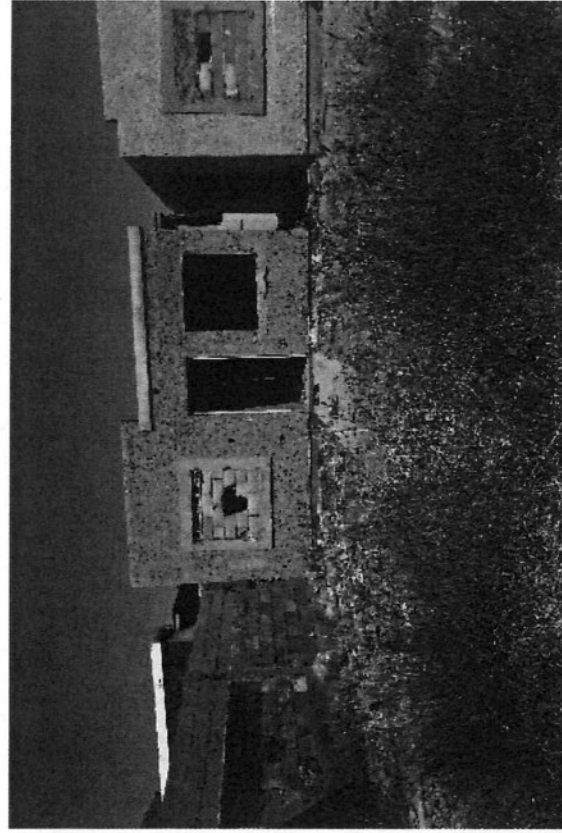

TAPIADOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 292

EXP. TAP-01- 5558

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	9	571.67	5145.03
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

5796.57

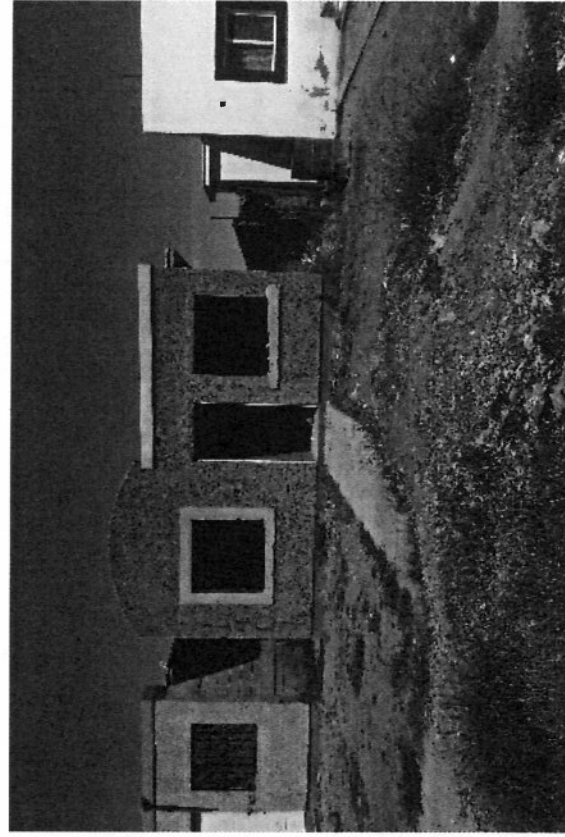

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO

CALLE: PUNTA SAN LORENZO
COLONIA: PUNTA ORIENTE


No.: 140

EXP. TAP-01- 5559

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=

4653.23

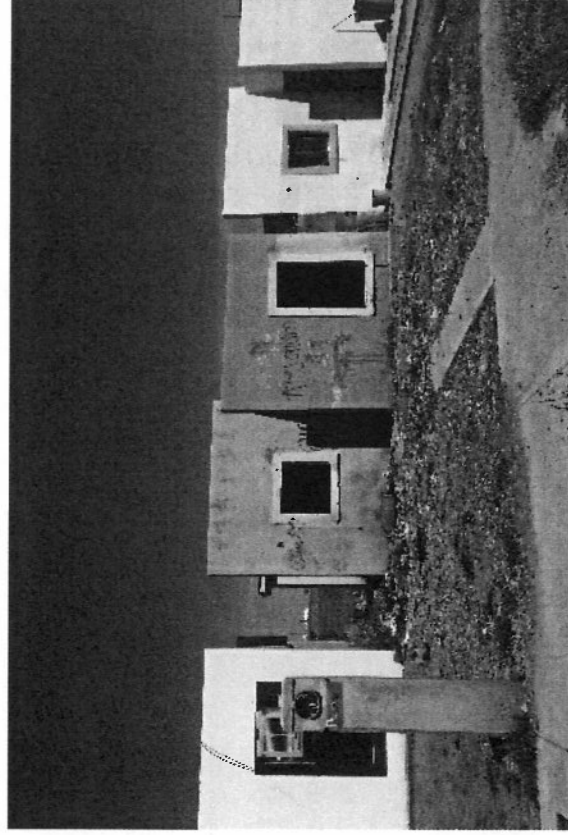

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO


CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2013

CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 134

EXP. TAP-01- 5560

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	10	571.67	5716.7
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO	PIEZA	0	357.02	0
FUERA DE OBRA.				
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.	PIEZA	2	452.11	904.22
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.				
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m2	0	8.88	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.				
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

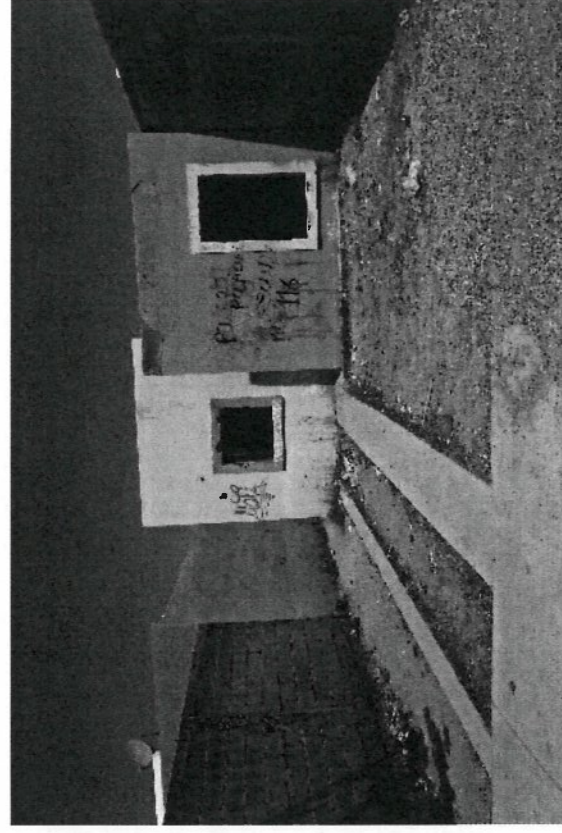TOTAL=**6820.35**



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 130

EXP. TAP-01- 5561

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	10	571.67	5716.7
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6368.24





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 118

EXP. TAP-01- 5562

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4201.12





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 116

EXP. TAP-01- 5563

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

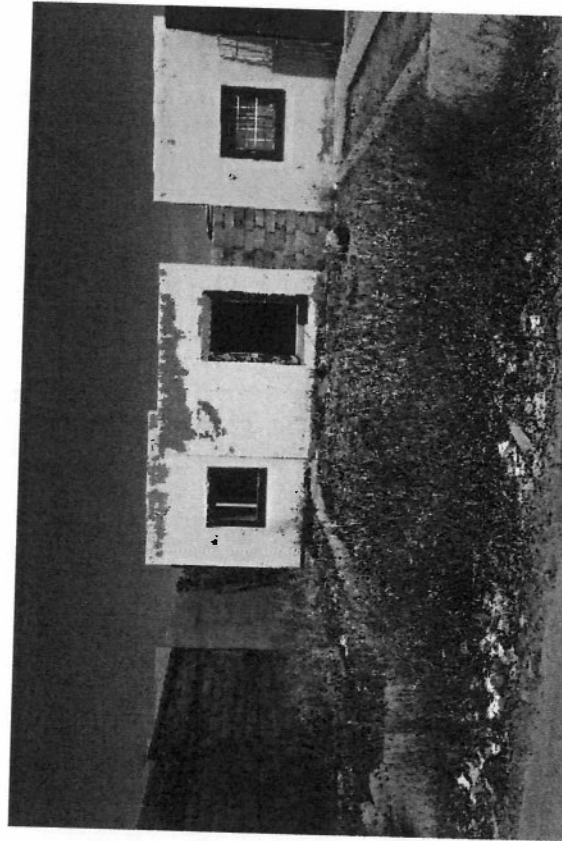

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO


CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 112

EXP. TAP-01- 5564

PRESUPUESTO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	11	571.67	6288.37
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				6939.91

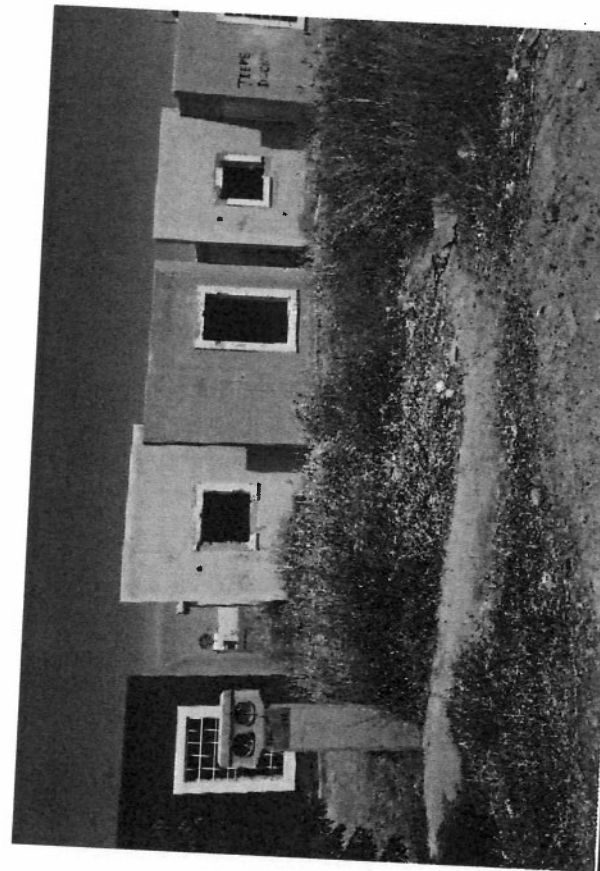

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 110

EXP. TAP-01- 5565

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	9	571.67	5145.03
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO				
FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				5796.57

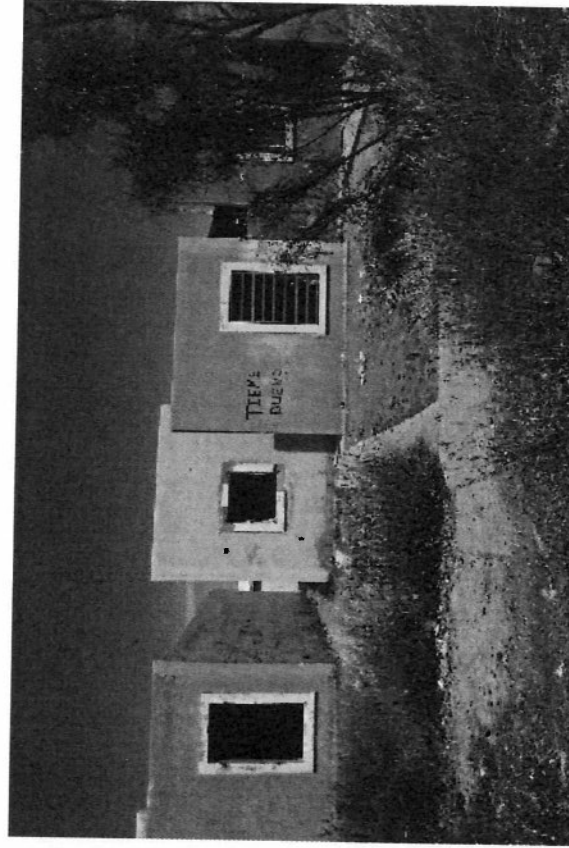

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TAPIADO



CHIHUAHUA
Juntos, un futuro mejor
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 103

EXP. TAP-01- 5566

PRESUPUESTO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23



TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 207

EXP. TAP-01- 5567

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

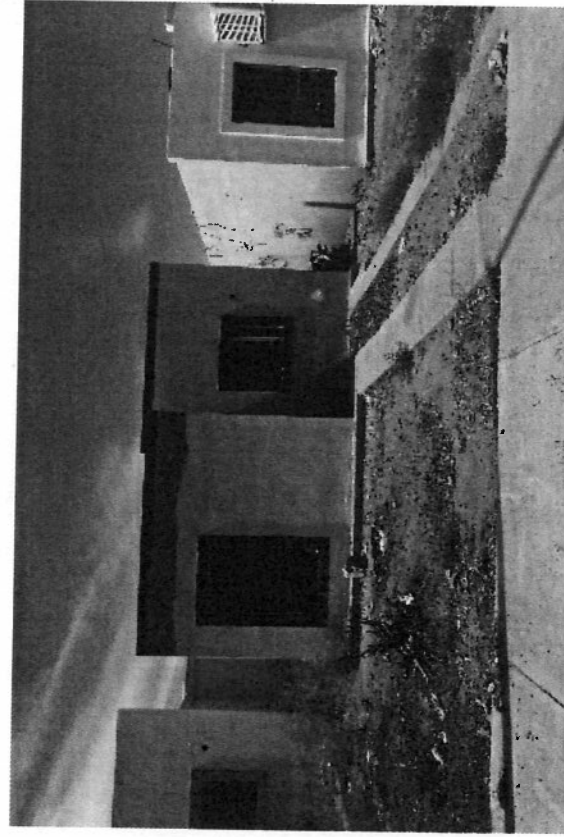


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
TAPIADO

 CALLE: PUNTA DEL ROSARIO
 COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 205

EXP. TAP-01- 5568

PRESUPUESTO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	7	571.67	4001.69
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO				
FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=**4653.23**



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

TAPIADO

CALLE: PUNTA LA BOQUILLA
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 102

EXP. TAP-01- 5569

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE MATERIAL SOBROANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4201.12





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA LA BOQUILLA
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 104

EXP. TAP-01 - 5570

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	357.02	357.02
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=**5010.25**



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

TAPIADO

CALLE: PUNTA LA BOQUILLA
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 113

EXP. TAP-01- 5570

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=**4653.23**

TAPIADOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


TAPIADO

CALLE: PUNTA LA BOQUILLA
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 114

EXP. TAP-01- 5572

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METÁLICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23

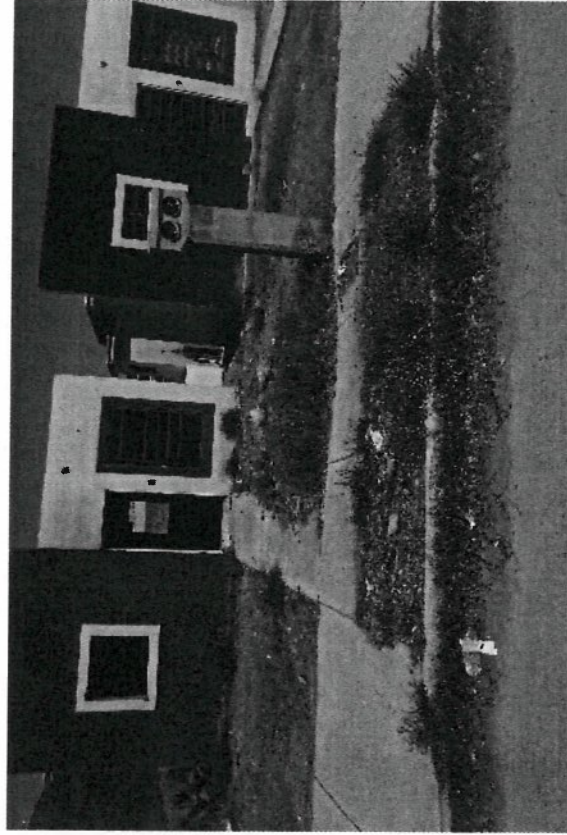



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA LA BOQUILLA
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 123

EXP. TAP-01- 5573

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	7	571.67	4001.69
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	1	452.11	452.11
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	0	8.88	0
		1	199.43	199.43
TOTAL=				4653.23



CHIHUAHUA
Juntos a una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA LA BOQUILLA
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 135

EXP. TAP-01- 5574

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	7	571.67	4001.69
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m3	0	101.74	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
	m3	1	199.43	199.43
TOTAL=				4201.12





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

TAPIADO

CALLE: PUNTA LA BOQUILLA
COLONIA: PUNTA ORIENTE

No.: 207

EXP. TAP-01-5574

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO				
CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE	m2	7	571.67	4001.69
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.				
RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	357.02	0
DESMTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC.				
DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	0	452.11	0
ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0	101.74	0
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y				
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	0	8.88	0
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	1	199.43	199.43

TOTAL=**4201.12**
